













	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA																																																																						
			FECHA 31/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		PERIODO MES: mayo-2025																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 39 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$1.392.470,029																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>05/06/2025</td><td>JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>11/06/2025</td><td>JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>11/06/2025</td><td>JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>12/06/2025</td><td>FABIAN ARANGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>12/06/2025</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>13/06/2025</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>26/06/2025</td><td>CAROLINA PAIPA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/06/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/06/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/06/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/06/2025	FABIAN ARANGO			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL					FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12/06/2025				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	13/06/2025				FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26/06/2025	CAROLINA PAIPA			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/06/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																									
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/06/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/06/2025	JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/06/2025	FABIAN ARANGO																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL																																																																									
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																									
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12/06/2025																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	13/06/2025																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26/06/2025	CAROLINA PAIPA																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																																																																									
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.																																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC NIT.																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 661.761.180 VALOR EN LETRAS: Seiscientos Sesenta y Un Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Cientos Ochenta Pesos M/Cte (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 39 DEL PERIODO mayo-2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</td><td>Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</td><td>Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA</td><td>Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON</td></tr><tr><td>Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV</td><td>Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV</td><td>Matricula profesional No.: 25202-273263 CND</td><td>Matricula Profesional No.: 68202-09246 STD</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha Firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES</td></tr></table>								Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA	Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON	Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 25202-273263 CND	Matricula Profesional No.: 68202-09246 STD	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha Firma:	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES																																										
																																																																									
Firma	Firma	Firma	Firma																																																																						
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA	Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON																																																																						
Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 25202-273263 CND	Matricula Profesional No.: 68202-09246 STD																																																																						
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO																																																																						
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha Firma:																																																																						
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									

Text



CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4
CALLE 11 110-121 P12
Tel: 3106805831
Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co



BORRADOR

Factura electrónica de venta

No. CBMC-23

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	05/06/2025, 00:00
Expedición	05/06/2025, 00:00
Vencimiento	5/07/2025

ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Obras	Acta 39 Ejec may-2025	1.00	282,551,808
2	Administración (23%)	Acta 39 Ejec may-2025	1.00	64,986,916
3	Imprevistos (2%)	Acta 39 Ejec may-2025	1.00	5,651,036
4	Utilidad (5%)	Acta 39 Ejec may-2025	1.00	14,127,590
5	Estudios y diseños (Gestion Social)	Acta 39 Ejec may-2025	1.00	1,025,152,679
6	IVA (19%)		1.00	7,300,267

Total ítem:	6	Total Pagar	1,399,770,296
--------------------	---	--------------------	----------------------

Valor en Letras:

Mil Trescientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Setenta Mil Doscientos
Noventa y Seis Pesos M/Cte

Condiciones de Pago

Valor 1,399,770,296

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS	-	
SAN PEDRO	-	
BUENAVISTA	-	
MAGANGUÉ	1,025,152,679	REEMBOLSO
CICUCO	231,522,000	
TALAIGUA NUEVO	135,795,350	
MOMPOS	-	
SAN FERNANDO	-	
MARGARITA	-	
GUAMAL	-	
EL BANCO	-	
TAMALAMEQUE	-	
PAELITAS	-	

Amortización de Anticipo (53.%) 738,009,116

Valor a Pagar presente Acta 661,761,180

#\$24-02-00;2257 de 2021; ccohen@invias.gov.co#\$


Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA		
												FECHA 1 de 431/05/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 39 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.392.470.029,00 MES mayo-2025														
ACTA FINAL ☐														
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTI: Hasta Julio 31 de 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211.033.526.027,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ - (Según contrato principal)		
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211.033.526.027,00		
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCO/CIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49,00	\$ 1.116,814	\$ 54.723.886	49,00	\$ 54.723.886	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.618,00	\$ 110,698	\$ 179.109.364	1.618,00	\$ 179.109.364	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3	11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1.760,00	\$ 66,815	\$ 117.594.400	1.760,00	\$ 117.594.400	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186.092,00	\$ 10,000	\$ 1.860.920.000	186.092,00	\$ 1.860.920.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819.504,00	\$ 12,000	\$ 9.834.048.000	683.650,46	\$ 8.203.805.528	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1.500,00	\$ 9.747	\$ 14.620.500	1.500,00	\$ 14.620.500	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7	11601	220-1		Terraplenes	m3	777.232,00	\$ 13,000	\$ 10.104.016.000	777.232,00	\$ 10.104.016.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8	11601		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42.272,00	\$ 10,393	\$ 439.332.896	42.272,00	\$ 439.332.896	0,00	\$ -	0,00	\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94.260,00	\$ 78,000	\$ 7.352.280.000	94.260,00	\$ 7.352.280.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35.000,00	\$ 220,000	\$ 7.700.000.000	35.000,00	\$ 7.700.000.000	0,00	\$ -	30,00	\$ 6.600.000
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84.169,00	\$ 240,000	\$ 20.200.560.000	84.169,00	\$ 20.200.560.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31.500,00	\$ 255,000	\$ 8.032.500.000	23.806,71	\$ 6.070.712.200	0,00	\$ -	1.008,80	\$ 257.244.000
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434.784,00	\$ 2,600	\$ 1.130.438.400	434.784,00	\$ 1.130.438.400	0,00	\$ -	13.258,00	\$ 34.470.800
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434.784,00	\$ 1,500	\$ 652.176.000	612.784,00	\$ 919.176.000	3.884,10	\$ 5.826,150	304.587,20	\$ 456.880.800
15	11603		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29.109,00	\$ 878,000	\$ 25.557.702.000	14.556,82	\$ 12.780.890.050	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16	11603		450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19.015,00	\$ 893,000	\$ 16.980.395.000	31.515,00	\$ 28.142.895.000	376,00	\$ 335.768.000	26.162,00	\$ 23.362.666.000
17	11603		450,9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7.000,00	\$ 908,000	\$ 6.356.000.000	7.000,00	\$ 6.356.000.000	0,00	\$ -	399,40	\$ 362.655.200
18	11603		460,1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	7.000,00	\$ 69,000	\$ 483.000.000	32.500,00	\$ 2.242.500.000	372,80	\$ 25.723,200	21.374,80	\$ 1.474.861.200
19	11603		465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8.400,00	\$ 70,000	\$ 588.000.000	8.400,00	\$ 588.000.000	0,00	\$ -	1.594,30	\$ 111.601.000
20	11603		466-13	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5.600,00	\$ 4,000	\$ 22.400.000	55.000,00	\$ 220.000.000	0,00	\$ -	10.153,20	\$ 40.612.800
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30.831,00	\$ 28,888	\$ 890.645.928	30.831,00	\$ 890.645.928	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225,00	\$ 67,076	\$ 15.092.100	225,00	\$ 15.092.100	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120,00	\$ 62,192	\$ 7.463.040	120,00	\$ 7.463.040	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2.210,00	\$ 41,503	\$ 91.721.630	2.210,00	\$ 91.721.630	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355,00	\$ 108,914	\$ 38.664.470	355,00	\$ 38.664.470	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7.314,00	\$ 850,000	\$ 6.216.900.000	7.314,00	\$ 6.216.900.000	0,00	\$ -	103,70	\$ 88.145.000
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6.562,00	\$ 750,000	\$ 4.921.500.000	6.562,00	\$ 4.921.500.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1.448,00	\$ 570,000	\$ 825.360.000	1.448,00	\$ 825.360.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.526.360,00	\$ 6,321	\$ 9.648.121.560	1.526.360,00	\$ 9.648.121.560	0,00	\$ -	5.725,00	\$ 36.187.725
30	11604		661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5.413,00	\$ 610,000	\$ 3.301.930.000	5.413,00	\$ 3.301.930.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
31	11604		671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8.533,00	\$ 704,000	\$ 6.007.232.000	8.533,00	\$ 6.007.232.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
32	11604		673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	17.849,50	\$ 7,500	\$ 133.871.250	17.849,50	\$ 133.871.250	0,00	\$ -	0,00	\$ -
33	11604		673-13	Material granular drenante	m3	4.924,00	\$ 182,000	\$ 896.168.000	4.924,00	\$ 896.168.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
34	11604		673-13	Material de cobertura tipo SBG	m3	985,00	\$ 140,000	\$ 137.900.000	985,00	\$ 137.900.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192.000,00	\$ 1,795	\$ 344.640.000	1.069.184,00	\$ 1.919.185.280	0,00	\$ -	853.022,90	\$ 1.531.176,106
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9.600,00	\$ 22,076	\$ 211.929.600	7.000,00	\$ 154.532.000	0,00	\$ -	4.207,10	\$ 92.875,940
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25.794,00	\$ 8,346	\$ 215.276.724	64.206,00	\$ 535.863,276	0,00	\$ -	19.155,00	\$ 159.867,630
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131,00	\$ 401,294	\$ 52.569.514	1.055,00	\$ 423.365,170	0,00	\$ -	725,00	\$ 290.938,150
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50,00	\$ 329,319	\$ 16.465.950	1.290,00	\$ 424.821,510	0,00	\$ -	531,00	\$ 174.868,389

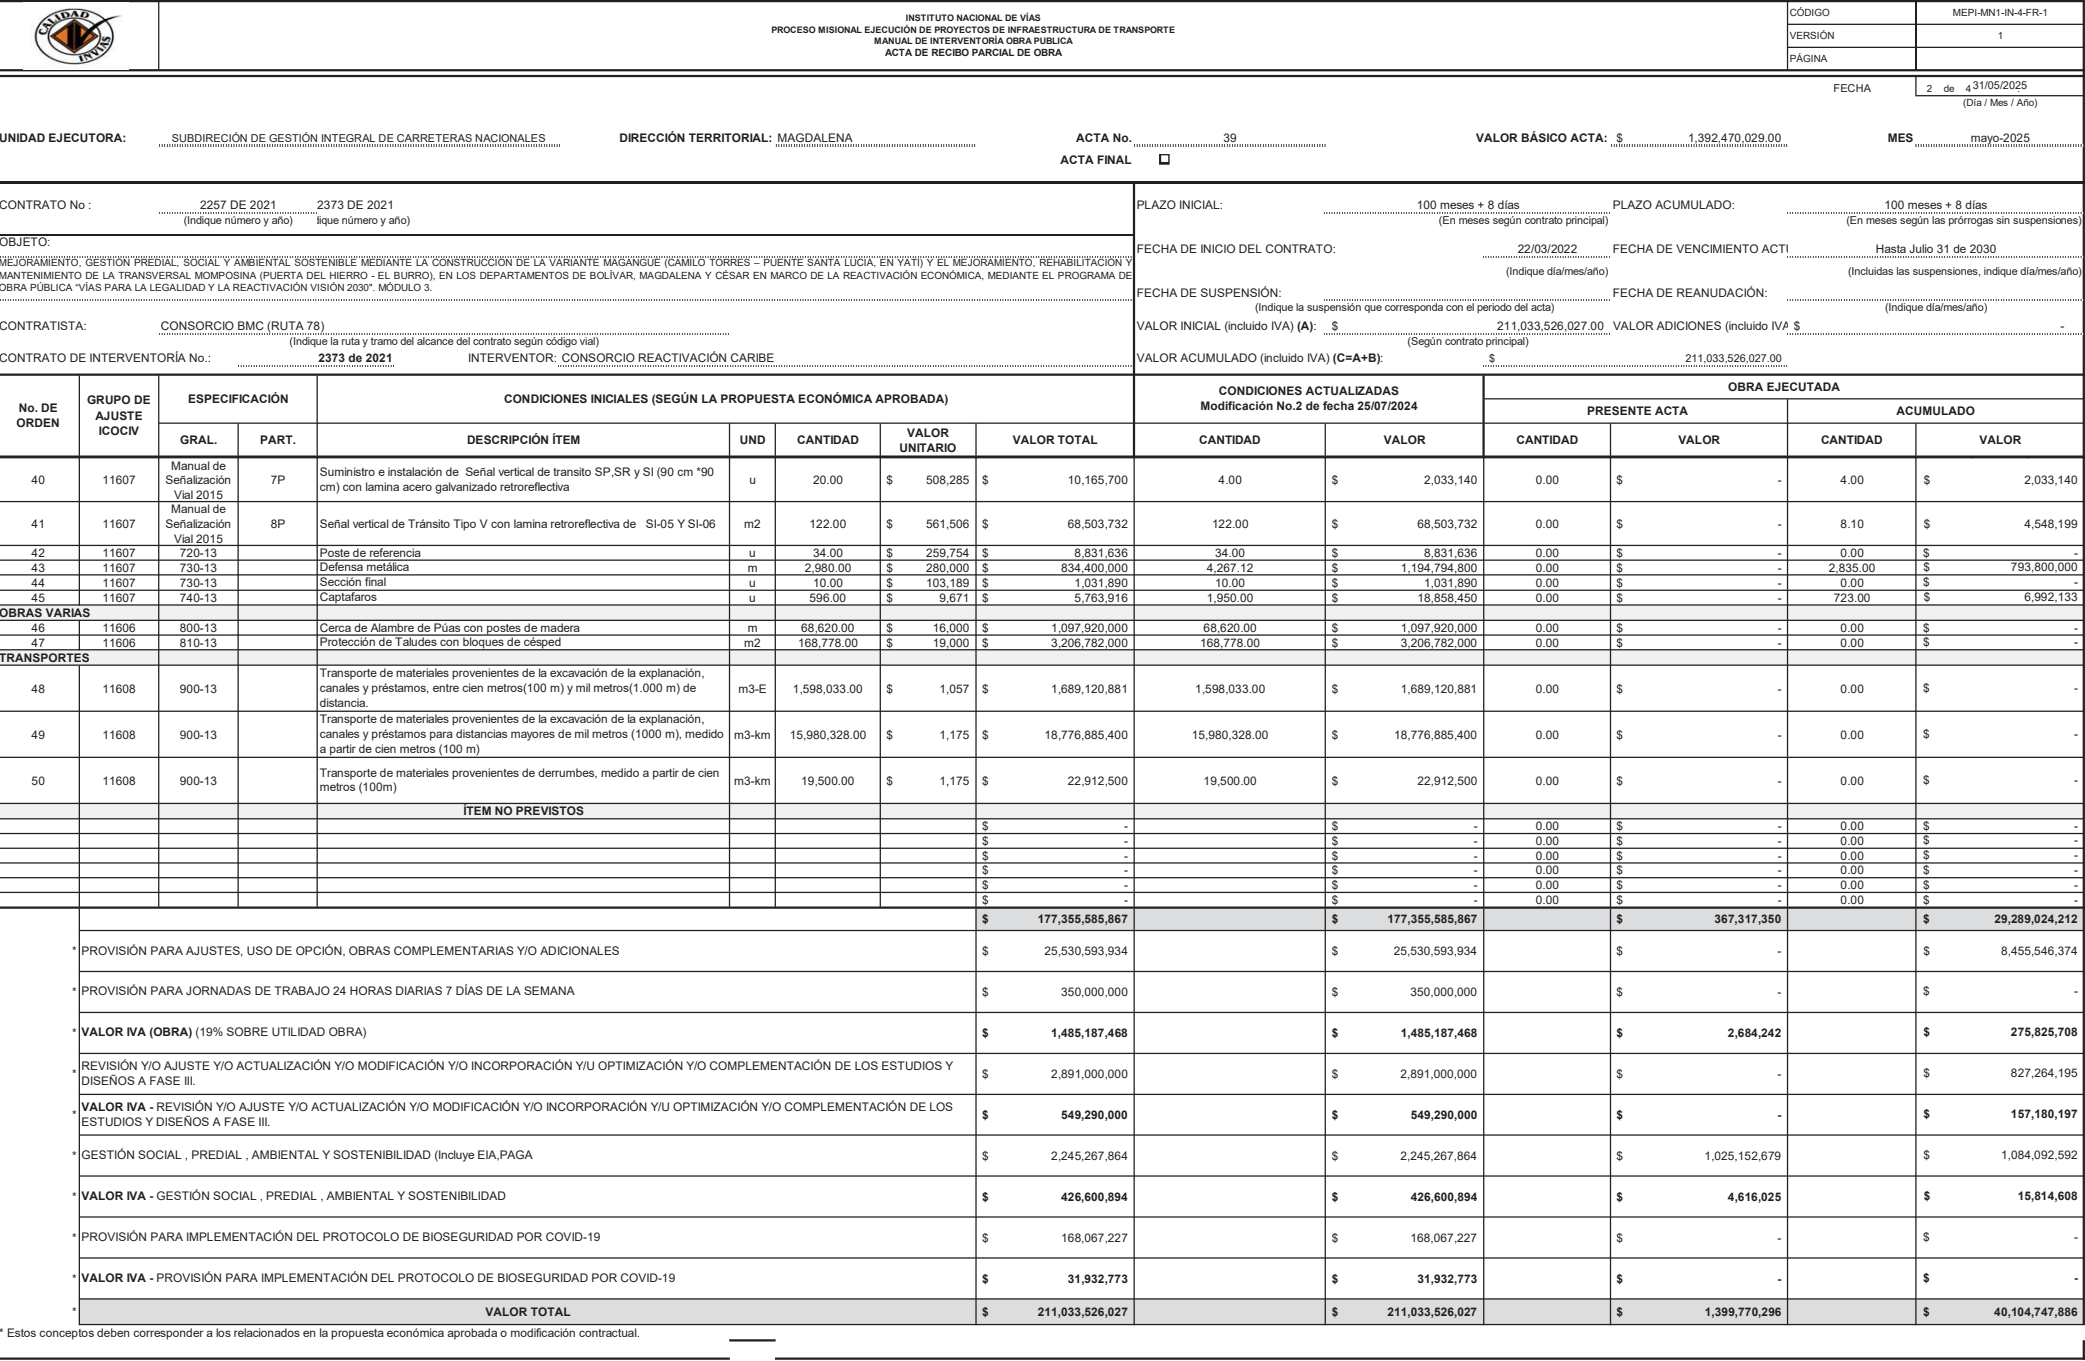

FECHA

3 de 431/05/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

39

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1,392,470,029.00

MES

mayo-2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

2257 DE 2021 2373 DE 2021

(Indique número y año) (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC (RUTA 78)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:

100 meses + 8 días

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

100 meses + 8 días

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTI:

Hasta Julio 31 de 2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 211,033,526,027.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 12,754,916,536.00	100.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 738,009,116.00	53.00%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 4,167,702,882.00	32.68%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 8,587,213,654.00	67.32%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. Anexo 16.3 y 16.13 (aplica para el capítulo de pavimentos asfálticos)

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB TOTAL OBRAS	\$ 367,317,350.00	\$ 2,684,242.00	\$ 370,001,592.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ -	\$ -	\$ -
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (incluye EIA, PAGA	\$ 1,025,152,679.00	\$ 4,616,025.00	\$ 1,029,768,704.00
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1,392,470,029.00	\$ 7,300,267.00	\$ 1,399,770,296.00

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ -	\$ -
SB	\$ -	\$ 6,600,000
B	\$ -	\$ 257,244,000
P	\$ 367,317,350	\$ 25,843,747,800
OA	\$ -	\$ 124,332,725
SCT	\$ -	\$ 3,057,099,687
OV	\$ -	\$ -
T	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 367,317,350	\$ 29,289,024,212

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Vías interurbanas- Preliminares y explanación	\$ -	\$ -
11602-Vías interurbanas- Afirmados, Bases y Subbases	\$ -	\$ 263,844,000
11603-Vías interurbanas- Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ 367,317,350	\$ 25,843,747,800
11604-Vías interurbanas- Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ -	\$ 124,332,725
11605-Vías interurbanas- Obras de Urbanismo	\$ -	\$ -
11606-Vías interurbanas- Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ -	\$ -
11607-Vías interurbanas- Señalización y Control de tránsito	\$ -	\$ 3,057,099,687
11608-Vías interurbanas- Transporte y Sobre acarreos	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 367,317,350	\$ 29,289,024,212

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 1,392,470,029

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 654,460,913

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 661,761,180

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos Sesenta y Un Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

4 de 431/05/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

39

VALOR BÁSICO ACTA: \$

1,392,470,029.00

MES

mayo-2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

2257 DE 2021

2373 DE 2021

(Indique número y año)

líquido número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC (RUTA 78)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:

100 meses + 8 días

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

100 meses + 8 días

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTI:

Hasta Julio 31 de 2030

(Indique día/mes/año)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$

211,033,526,027.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$

-

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$

211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

OBSERVACIONES

1) En la presente acta, se aplica lo establecido en la resolución 320 del 26 de enero del 2022 por el cual el INVIAS adopta el ICOCIV aplicables a los contratos de obra a precios unitarios. Según lo acordado en el acta de reunión 09 del 03 de agosto de 2022.

2) En la presente acta se realizan los siguientes ajustes a los valores de reembolso de la gestión social: 1) Se adicionan \$22.805 pesos de basico para reembolso y 2) se descuentan 134.577 pesos de IVA debido a un error en el cobro de la gestion social en el acta de obra 23, Lo anterior con objeto de llegar a un total acumulado por reembolso de gastos de 1.025.879.252 y un IVA total (IVA de generado por concepto de otros) de 4.754.074 sumando un total de 1.030.633.326 COP reembolsados por concepto de gestión social, valor que coincide con la celda K de la pre-acta social 39.*

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

2025.06.

19

11:05:55

-05'00'

Firma:

Romulo Jimenez Hidalgo

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Firma:

LUGGIALBERTO PUGLIESE MERCADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	<u>39</u>	<u>mayo-2025</u>
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	<u>182525</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>16</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>661,761,180</u>
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	\$ <u>661,761,180</u>


JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 08202-35362 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2257 DE 2021 Contratista CONSORCIO BMC
 Objeto del Contrato **MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.**
 Acta N° 39 Valor basico \$ 1,392,470,029 Período mayo-2025
 Valor Incluido Iva \$ 1,399,770,296

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera			1,029,768,704	1,029,768,704
2	7803	Carretera			370,001,592	370,001,592
3	7804	Carretera			-	-
4	7805	Carretera			-	-
5	7806	Carretera			-	-
7						
TOTALES			-	-	1,399,770,296	1,399,770,296

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	-	-
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	-	-
	MUNICIPIO 3	BUENAVISTA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	1,029,768,704	1,025,152,679
	MUNICIPIO 2	TALAIGUA NUEVO	136,787,700	135,795,350
	MUNICIPIO 3	CICUCO	233,213,892	231,522,000
	MUNICIPIO 4	MOMPOS	-	-
	MUNICIPIO 5	SAN FERNANDO	-	-
	MUNICIPIO 6	MARGARITA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			1,399,770,296	1,392,470,029

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	GUAMAL	-	-
	MUNICIPIO 2	EL BANCO	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 3			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	-	-
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 4			-	-


CONTRATISTA
ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
 DIRECTOR DE OBRA
 Matricula Profesional No.: 68202-55889 STD


INTERVENTOR
JOSÉ LUIS USUGA GOMEZ
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 Matricula profesional No. 08202-35362 ATL


CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, oportuno al periodo del mes de mayo del año 2025, así mismo, los aportes correspondiente a pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de abril de 2025.


Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dado en Bogotá a los (27) días del mes de mayo de 2025.


Atentamente,




CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802



CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141157189535			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115718953 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4		Impuestos de Cali		5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO BMC							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		1 6 9		Valle del Cauca		7 6 Cali 0 0 1	
41. Dirección principal CL 11 100 121 P 12							
42. Correo electrónico facturacion@consorcioibmc.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 1 0 6 8 0 5 8 3 1			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2		4 6 4 2 2 0 2 3 1 2 0 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre BUENO MORALES CARLOS 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
4. Número de formulario			141157189535		
			 (415)7707212489984(8020) 000014115718953 5		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4	Impuestos de Cali		5
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica		3	69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número					
73. Fecha		2 0 2 1, 1 1, 2 3			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		9 8			
76. Fecha de registro		2 0 2 1, 1 1, 2 3			
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde		2 0 2 1, 1 1, 2 3			
81. Hasta		2 0 2 5, 1 2, 3 1			
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141157189535



(415)7707212489984(8020) 000014115718953 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 5 2 6 9 9

4

Impuestos de Cali

5

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4
100. Tipo de documento Cédula de Extranjerí 2 2	101. Número de identificación 4 0 9 8 0 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido HIDALGO	106. Primer nombre ROMULO
107. Otros nombres JOSE	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido ANGULO	106. Primer nombre FRANCISCO
107. Otros nombres JOSE	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido VALLEJO	106. Primer nombre DANIEL
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141157189535



(415)7707212489984(8020) 000014115718953 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 5 2 6 9 9 4

Impuestos de Cali

5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 6 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001				
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5						
				4. Número de formulario 141157189535						
 (415)7707212489984(8020) 000014115718953 5										
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico				
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4		Impuestos de Cali		5				
Revisor Fiscal y Contador										
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV			127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre			131. Otros nombres		
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada					
	135. Fecha de nombramiento									
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV			139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre			143. Otros nombres		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada					
	147. Fecha de nombramiento									
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV			151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 4 9 4 6 4 0					8 6 8 2 0 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre			155. Otros nombres		
	MORENO		FONSÉCA		DIANA			MARCELA		
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada						
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 0 1 0 2								


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
												FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA			
CONTRATO DE OBRA No:		2257 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO BMC			
MES INFORME MENSUAL:		mayo-25										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		2373 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior	
2021		1077321		C-2401-0600-109		20		Propios		2257 de 2021		\$ 917,135,685		\$ 844,174,536	
2022		255422		C-2401-0600-109		11		Nación		2257 de 2021		\$ 8,373,651,753		\$ - 2022	
2023		185423		C-2401-0600-109		11		Nación		2257 de 2021		\$ 18,340,248,963		\$ - 2023	
2024		202424		C-2401-0600-109		11		Nación		2257 de 2021		\$ 18,340,248,963		\$ 10,205,608 2024	
2025		182525		C-2401-0600-109		16		Nación		2257 de 2021		\$ 9,170,124,481		\$ 6,256,829,337 2025	
2026								Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444	
2027								Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444	
2028								Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444	
2029								Nación		2257 de 2021		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444	
2030								Nación		2257 de 2021		\$ 45,850,622,406		\$ 45,850,622,406	
TOTAL												\$ 211,033,526,027		\$ 163,003,325,663	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 211,033,526,027.00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		Anticipo vigencia 2022 Fecha: 11/10/2022
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680	\$ 1,058,619	\$ 145,922,299	\$ 72,961,150	\$ 72,961,149	\$ 4,083,490,656	207621 2021-09-19	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728		X		Saldo por usar RP Propios 2021 \$844.174.685
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000	\$ 49,436,100	\$ 309,626,100	\$ 130,095,000	\$ 179,531,100	\$ 3,953,395,656	255422 2022-02-17	\$ 4,037,668,847	\$ 210,577,977,628		X		Cobro estudios y diseños acta 7 Variante y transversal
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400	\$ 1,434,613	\$ 197,750,013	\$ 98,157,700	\$ 99,592,313	\$ 3,855,237,956	255422 2022-02-17	\$ 3,938,076,534	\$ 210,380,227,615		X		
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,883	\$ 3,553,175	\$ 489,777,058	\$ 8,897,898	\$ 480,879,160	\$ 3,846,340,058	255422 2022-02-17	\$ 3,457,197,374	\$ 209,890,450,557		X		
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470	\$ 13,649,118	\$ 85,486,589	\$ 1,314,626	\$ 84,171,963	\$ 3,845,025,432	255422 2022-02-17	\$ 3,373,025,411	\$ 209,804,963,968		X		Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530	\$ 35,786,981	\$ 224,139,511	\$ 3,446,851	\$ 220,692,660	\$ 3,841,578,581	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457		X		Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal
1	Ajuste Def	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457		X		
2	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457		X		
3	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457		X		
4	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457		X		
5	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,457		X		
6	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961	\$ 117,178	\$ 16,152,139	\$ 293,440	\$ 15,858,700	\$ 3,841,285,141	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,318		X		
7	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,318		X		
8	Ajuste Parc	Octubre de 2022	\$ 11,545,309	\$ 84,370	\$ 11,629,679	\$ 211,280	\$ 11,418,399	\$ 3,841,073,861	255422 2022-02-17	\$ 3,125,055,652	\$ 209,553,042,639		X		
9	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$ 62,011,730	\$ 453,161	\$ 62,464,892	\$ 1,134,815	\$ 61,330,079	\$ 3,839,939,046	255422 2022-02-17	\$ 3,063,725,573	\$ 209,490,577,747		X		
10	Obra	Diciembre de 2022	\$ 2,171,822,784	\$ 15,871,013	\$ 2,187,693,797	\$ 39,744,357	\$ 2,147,949,440	\$ 3,800,194,689	255422 2022-02-17	\$ 1,714,100,635	\$ 207,302,883,950		X		
									185423 2023-02-23	\$ 17,541,924,461	\$ 207,302,883,950		X		
10	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$ 284,496,103	\$ 2,079,010	\$ 286,575,113	\$ 5,206,279	\$ 281,368,834	\$ 3,794,988,410	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,837		X		
11	Obra	Enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,837		X		
12	Obra	Febrero de 2023	\$ 358,798,925	\$ 2,621,992	\$ 361,420,917	\$ 6,566,021	\$ 354,854,896	\$ 3,788,422,389	255422 2022-02-17	\$ 1,077,876,906	\$ 206,654,887,920		X		
13	Obra	Marzo de 2023	\$ 1,038,472,340	\$ 7,588,836	\$ 1,046,061,175	\$ 19,004,044	\$ 1,027,057,132	\$ 3,769,418,345	255422 2022-02-17	\$ 50,819,774	\$ 205,608,826,745		X		
14	Obra	Abril de 2023	\$ 97,744,242	\$ 714,285	\$ 98,458,527	\$ 1,788,720	\$ 96,669,808	\$ 3,767,629,625	255422 2022-02-17	\$ 4,245,170	\$ 205,510,368,218		X		
									185423 2023-02-23	\$ 17,491,829,257	\$ 205,510,368,218		X		
14	Obra	Abril de 2023	\$ 806,399,780	\$ 5,892,920	\$ 812,292,700	\$ 14,757,116	\$ 797,535,584	\$ 3,752,872,509	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,673	\$ 204,698,075,518		X		
15	Obra	Mayo de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,673	\$ 204,698,075,518		X		
16	Obra	Junio de 2023	\$ 80,868,600	\$ 590,963	\$ 81,459,563	\$ 1,479,895	\$ 79,979,668	\$ 3,751,392,615	185423 2023-02-23	\$ 16,614,314,005	\$ 204,616,615,955		X		
16	EyD	Junio de 2023	\$ 306,884,195	\$ 58,307,997	\$ 365,192,192	\$ 5,615,981	\$ 359,576,211	\$ 3,745,776,634	185423 2023-02-23	\$ 16,254,737,794	\$ 204,251,423,763		X		Cobro estudios y diseños acta 16 variantes y transversal
16	Gestión	Junio de 2023	\$ 58,213,340	\$ 11,060,534	\$ 69,273,874	\$ 1,065,304	\$ 68,208,571	\$ 3,744,711,330	185423 2023-02-23	\$ 16,186,529,223	\$ 204,182,149,889		X		Pre-acta gestion predial
17	Obra	Julio de 2023	\$ 109,571,960	\$ 800,718	\$ 110,372,678	\$ 2,005,167	\$ 108,367,511	\$ 3,742,706,163	255422 2022-02-17	\$ -	\$ -		X		Se agota Rp vigencia 2022
									185423 2023-02-23	\$ 16,082,406,882	\$ 204,071,777,211		X		Inicia Rp vigencia 2023


			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8								
													VERSIÓN	1								
													PÁGINA									
													FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA:			SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA									
CONTRATO DE OBRA No:			2257 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO BMC									
MES INFORME MENSUAL:			mayo-25										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			2373 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE									
Anticipo						\$	-		\$	-	\$	4,768,464,730	185423 2023-02-23	\$	11,313,942,152	\$	204,071,777,211				Anticipo vigencia 2023 Fecha: 24/07/2023	
18	Obra	agosto-2023	\$	739,268,400	\$	5,402,346	\$	744,670,746	\$	30,827,492	\$	713,843,254	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,600,098,898	\$	203,327,106,465		X	
9	Ajuste Def	noviembre-2022	\$	4,762,222	\$	34,801	\$	4,797,023	\$	-	\$	4,797,023	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,595,301,875	\$	203,322,309,442		X	
10	Ajuste Def	diciembre-2022	\$	8,696,564	\$	63,552	\$	8,760,116	\$	-	\$	8,760,116	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,586,541,759	\$	203,313,549,326		X	
11	Ajuste Def	enero-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,586,541,759	\$	203,313,549,326		X	
12	Ajuste Def	febrero-2023	\$	47,591,302	\$	347,783	\$	47,939,085	\$	-	\$	47,939,085	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,538,602,674	\$	203,265,610,241		X	
13	Ajuste Def	marzo-2023	\$	139,210,709	\$	1,017,309	\$	140,228,018	\$	-	\$	140,228,018	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,398,374,656	\$	203,125,382,223		X	
14	Ajuste Def	abril-2023	\$	243,894,644	\$	1,782,307	\$	245,676,951	\$	-	\$	245,676,951	\$	8,480,343,401	185423 2023-02-23	\$	10,152,697,705	\$	202,879,705,272		X	
19	Obra	septiembre-2023	\$	1,119,437,000	\$	8,180,501	\$	1,127,617,501	\$	46,680,523	\$	1,080,936,978	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,071,760,727	\$	201,752,087,771		X	
15	Ajuste Def	mayo-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,071,760,727	\$	201,752,087,771		X	
16	Ajuste Def	junio-2023	\$	24,955,635	\$	182,368	\$	25,138,003	\$	-	\$	25,138,003	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,046,622,724	\$	201,726,949,768		X	
17	Ajuste Def	julio-2023	\$	35,188,016	\$	257,143	\$	35,445,159	\$	-	\$	35,445,159	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	9,011,177,565	\$	201,691,504,609		X	
18	Ajuste Def	agosto-2023	\$	245,066,520	\$	1,790,871	\$	246,857,391	\$	-	\$	246,857,391	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	8,764,320,174	\$	201,444,647,218		X	
19	Ajuste Def	septiembre-2023	\$	375,929,407	\$	2,747,176	\$	378,676,583	\$	-	\$	378,676,583	\$	8,433,662,877	185423 2023-02-23	\$	8,385,643,591	\$	201,065,970,635		X	
20	Obra	octubre-2023	\$	463,773,600	\$	3,389,115	\$	467,162,715	\$	19,339,359	\$	447,823,356	\$	8,414,323,518	185423 2023-02-23	\$	7,937,820,235	\$	200,598,807,920		X	
20	Ajuste Def	octubre-2023	\$	157,464,048	\$	1,150,699	\$	158,614,747	\$	-	\$	158,614,747	\$	8,414,323,518	185423 2023-02-23	\$	7,779,205,488	\$	200,440,193,173		X	
21	Obra	noviembre-2023	\$	686,551,600	\$	5,017,108	\$	691,568,708	\$	28,629,202	\$	662,939,506	\$	8,385,694,316	185423 2023-02-23	\$	7,116,265,982	\$	199,748,624,465		X	
21	Ajuste Def	noviembre-2023	\$	220,908,994	\$	1,614,335	\$	222,523,329	\$	-	\$	222,523,329	\$	8,385,694,316	185423 2023-02-23	\$	6,893,742,653	\$	199,526,101,136		X	
22	Obra	diciembre-2023	\$	1,360,284,521	\$	9,940,541	\$	1,370,225,062	\$	56,723,865	\$	1,313,501,197	\$	8,328,970,451	185423 2023-02-23	\$	5,580,241,456	\$	198,155,876,074		X	
22	Ajuste Def	diciembre-2023	\$	407,531,986	\$	2,978,118	\$	410,510,104	\$	-	\$	410,510,104	\$	8,328,970,451	185423 2023-02-23	\$	5,169,731,352	\$	197,745,365,970		X	
23	Gestión	enero-2024	\$	726,573	\$	138,049	\$	864,622	\$	30,298	\$	834,324	\$	8,328,940,153	185423 2023-02-23	\$	5,168,897,028	\$	197,744,501,348		X	Pre-acta social 32
23	Obra	enero-2024	\$	1,711,066,391	\$	12,503,947	\$	1,723,570,338	\$	71,351,469	\$	1,652,218,869	\$	8,257,588,684	185423 2023-02-23	\$	3,516,678,159	\$	196,020,931,010		X	
23	Obra	enero-2024	\$	981,332,484	\$	7,171,276	\$	988,503,760	\$	40,921,565	\$	947,582,195	\$	8,216,667,119	185423 2023-02-23	\$	2,569,095,964	\$	195,032,427,250		X	
23	Ajuste Def	enero-2024	\$	898,072,681	\$	6,562,839	\$	904,635,520	\$	-	\$	904,635,520	\$	8,216,667,119	185423 2023-02-23	\$	1,664,460,444	\$	194,127,791,730		X	
24	Obra	febrero-2024	\$	1,278,694,174	\$	9,344,303	\$	1,288,038,478	\$	53,321,547	\$	1,234,716,931	\$	8,163,345,572	185423 2023-02-23	\$	429,743,513	\$	192,839,753,252		X	
24	Ajuste Def	febrero-2024	\$	154,492,388	\$	1,128,983	\$	155,621,371	\$	-	\$	155,621,371	\$	8,163,345,572	185423 2023-02-23	\$	274,122,141	\$	192,684,131,881		X	
24	Ajuste Def	febrero-2024	\$	278,932,556	\$	2,038,354	\$	280,970,909	\$	-	\$	280,970,909	\$	8,163,345,572	185423 2023-02-23	\$	-	\$	192,403,160,972		X	Se agota Rp vigencia 2023
25	Obra	marzo-2024	\$	1,154,175,146	\$	8,434,357	\$	1,162,609,503	\$	48,129,104	\$	1,114,480,399	\$	8,115,216,468	202424 2024-03-14	\$	18,333,400,197	\$	192,403,160,972		X	Inicia Rp vigencia 2024
25	Ajuste Def	marzo-2024	\$	400,107,068	\$	2,923,859	\$	403,030,927	\$	-	\$	403,030,927	\$	8,115,216,468	202424 2024-03-14	\$	17,218,919,798	\$	191,240,551,469		X	
26	Obra	abril-2024	\$	1,650,244,700	\$	12,059,482	\$	1,662,304,181	\$	70,135,399	\$	1,592,168,782	\$	8,045,081,068	202424 2024-03-14	\$	15,223,720,089	\$	189,175,216,361		X	
26	Ajuste Def	abril-2024	\$	579,186,930	\$	4,232,520	\$	583,419,450	\$	-	\$	583,419,450	\$	8,045,081,069	202424 2024-03-14	\$	14,640,300,639	\$	188,591,796,911		X	
27	Obra	mayo-2024	\$	1,683,335,800	\$	12,301,300	\$	1,695,637,100	\$	84,166,790	\$	1,611,470,310	\$	7,960,914,279	202424 2024-03-14	\$	13,028,830,329	\$	186,896,159,811		X	
27	Ajuste Def	mayo-2024	\$	635,220,840	\$	4,641,998	\$	639,862,838	\$	-	\$	639,862,838	\$	7,960,914,279	202424 2024-03-14	\$	12,388,967,491	\$	186,256,296,973		X	
28	Obra	junio-2024	\$	1,751,535,500	\$	12,799,683	\$	1,764,335,183	\$	140,122,840	\$	1,624,212,343	\$	7,820,791,439	202424 2024-03-14	\$	10,764,755,148	\$	184,491,961,790		X	
28	Ajuste Def	junio-2024	\$	704,069,644	\$	5,145,124	\$	709,214,768	\$	-	\$	709,214,768	\$	7,								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
			FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA	
CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021			CONTRATISTA: CONSORCIO BMC	
MES INFORME MENSUAL: mayo-25			PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021			INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE	
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.				
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO				
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRAS	\$ 29,289,024,212	\$ 214,035,180	\$ 29,503,059,392	
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 8,455,546,374	\$ 61,790,529	\$ 8,517,336,903	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -	
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ 827,264,195	\$ 157,180,196	\$ 984,444,391	
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)*	\$ 1,084,092,592	\$ 15,814,608	\$ 1,099,907,200	
Gestion social*	\$ 1,025,879,252	\$ 4,754,074	\$ 1,030,633,326	
Gestion Predial*	\$ 58,213,340	\$ 11,060,534	\$ 69,273,874	
Gestion ambiental*	\$ -	\$ -	\$ -	
Gestion Sostenibilidad*	\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL	\$ 39,655,927,373	\$ 448,820,513	\$ 40,104,747,886	
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.				
Firma Nombre: ANGELO MARIA ORTEGA MARTINEZ Director de Obra Matrícula Profesional No.: 68202-55889 STD			Firma Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ Director de interventoria Matricula profesional No. 08202-35362 ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.				

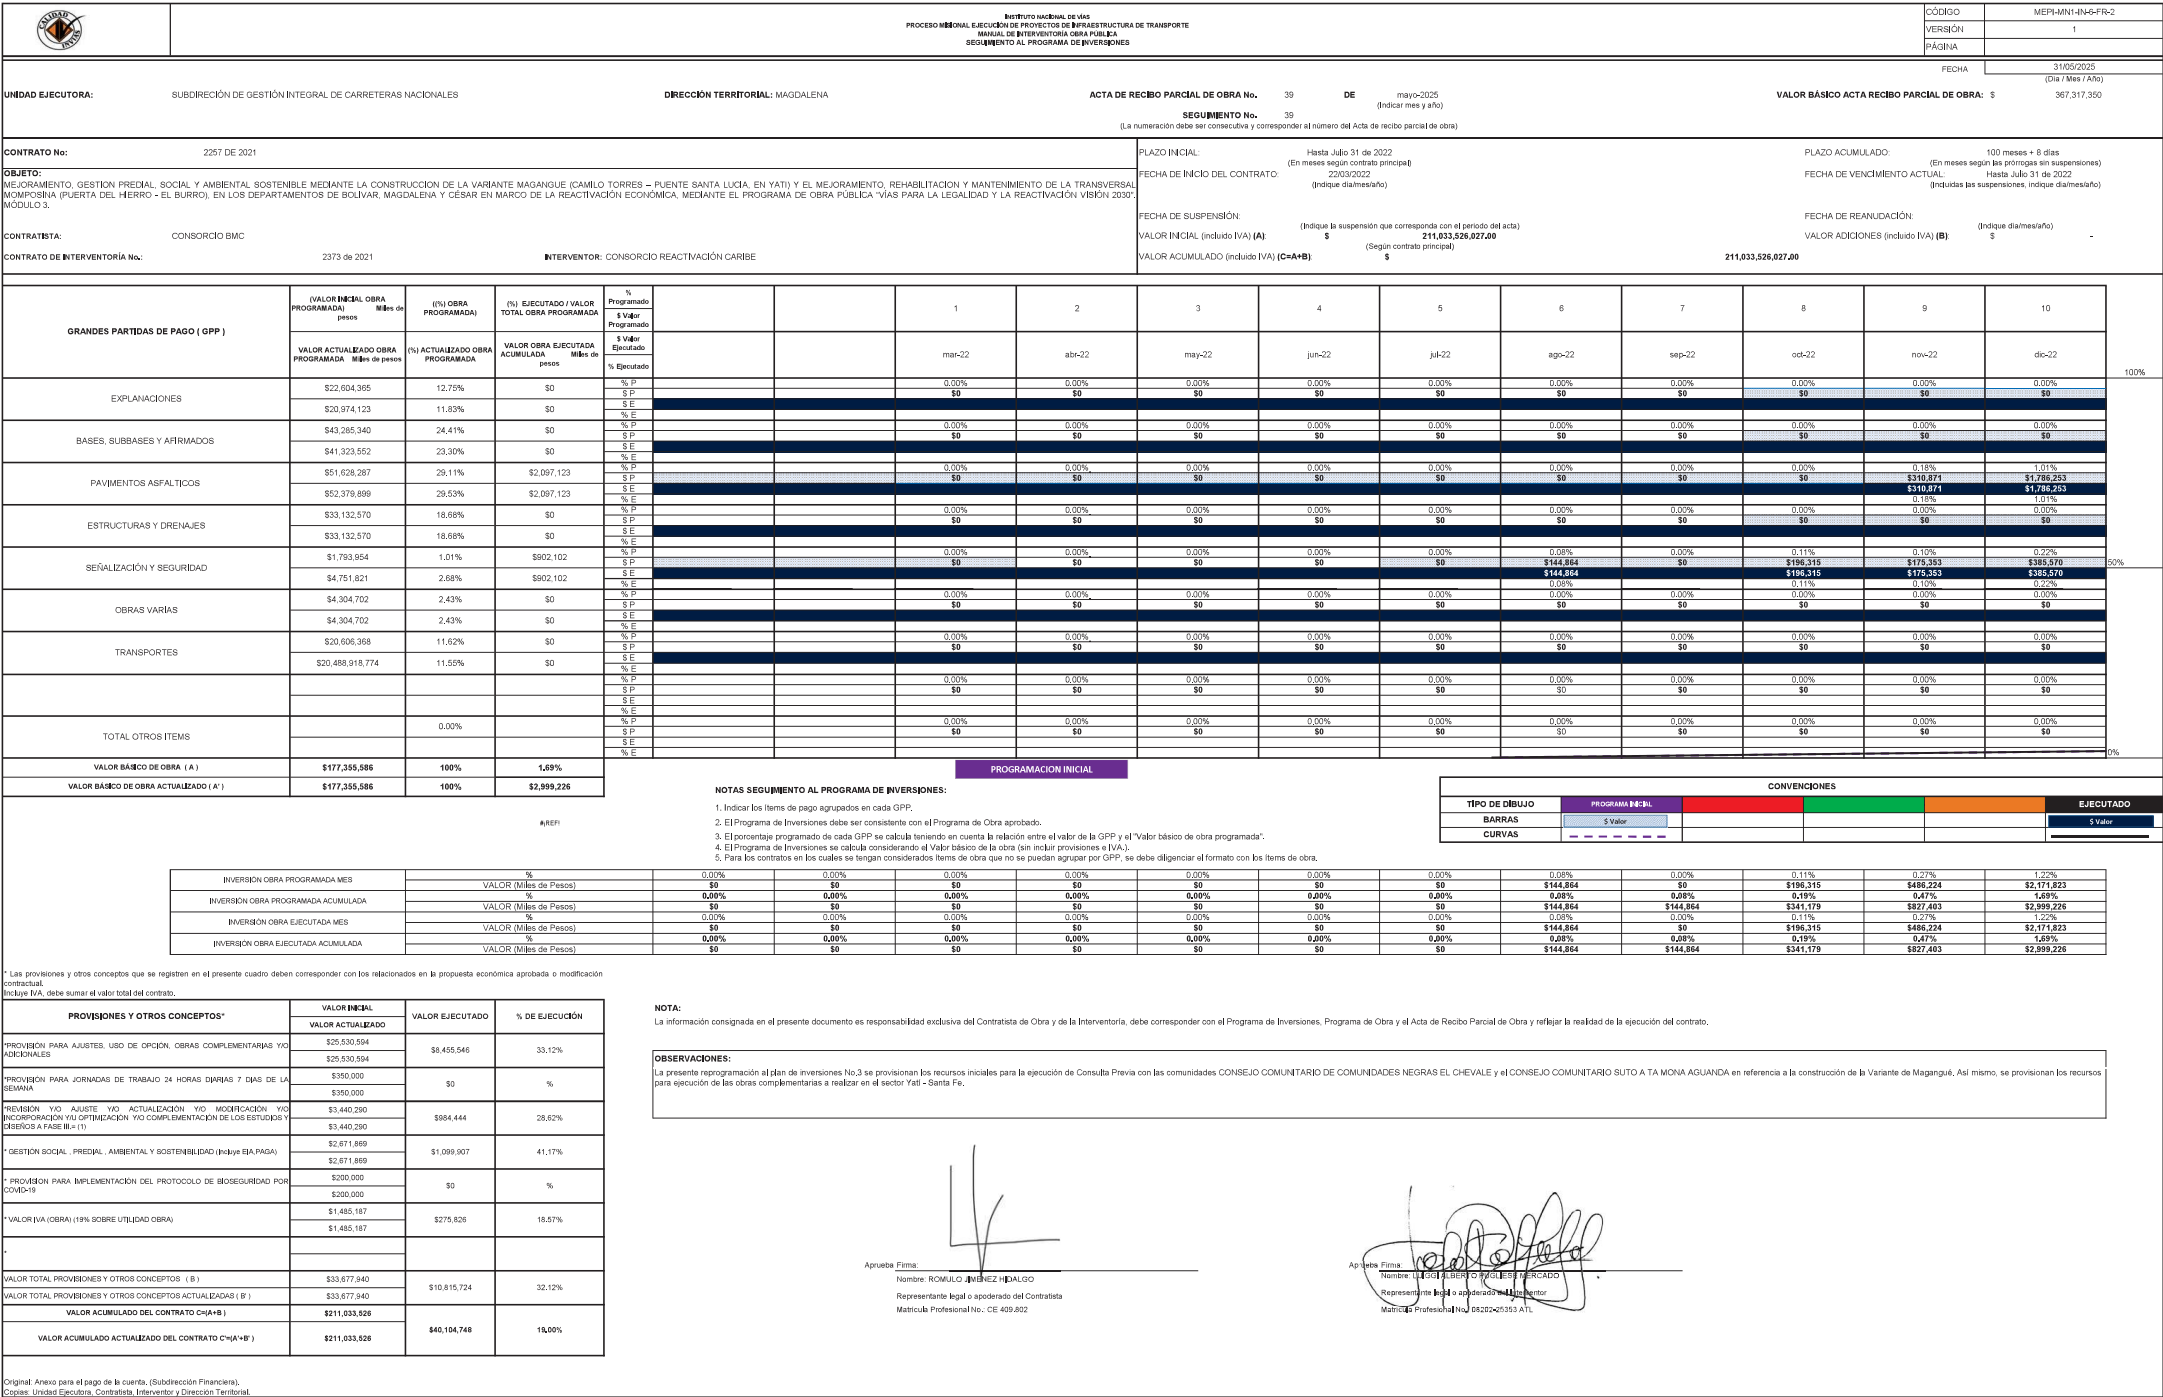

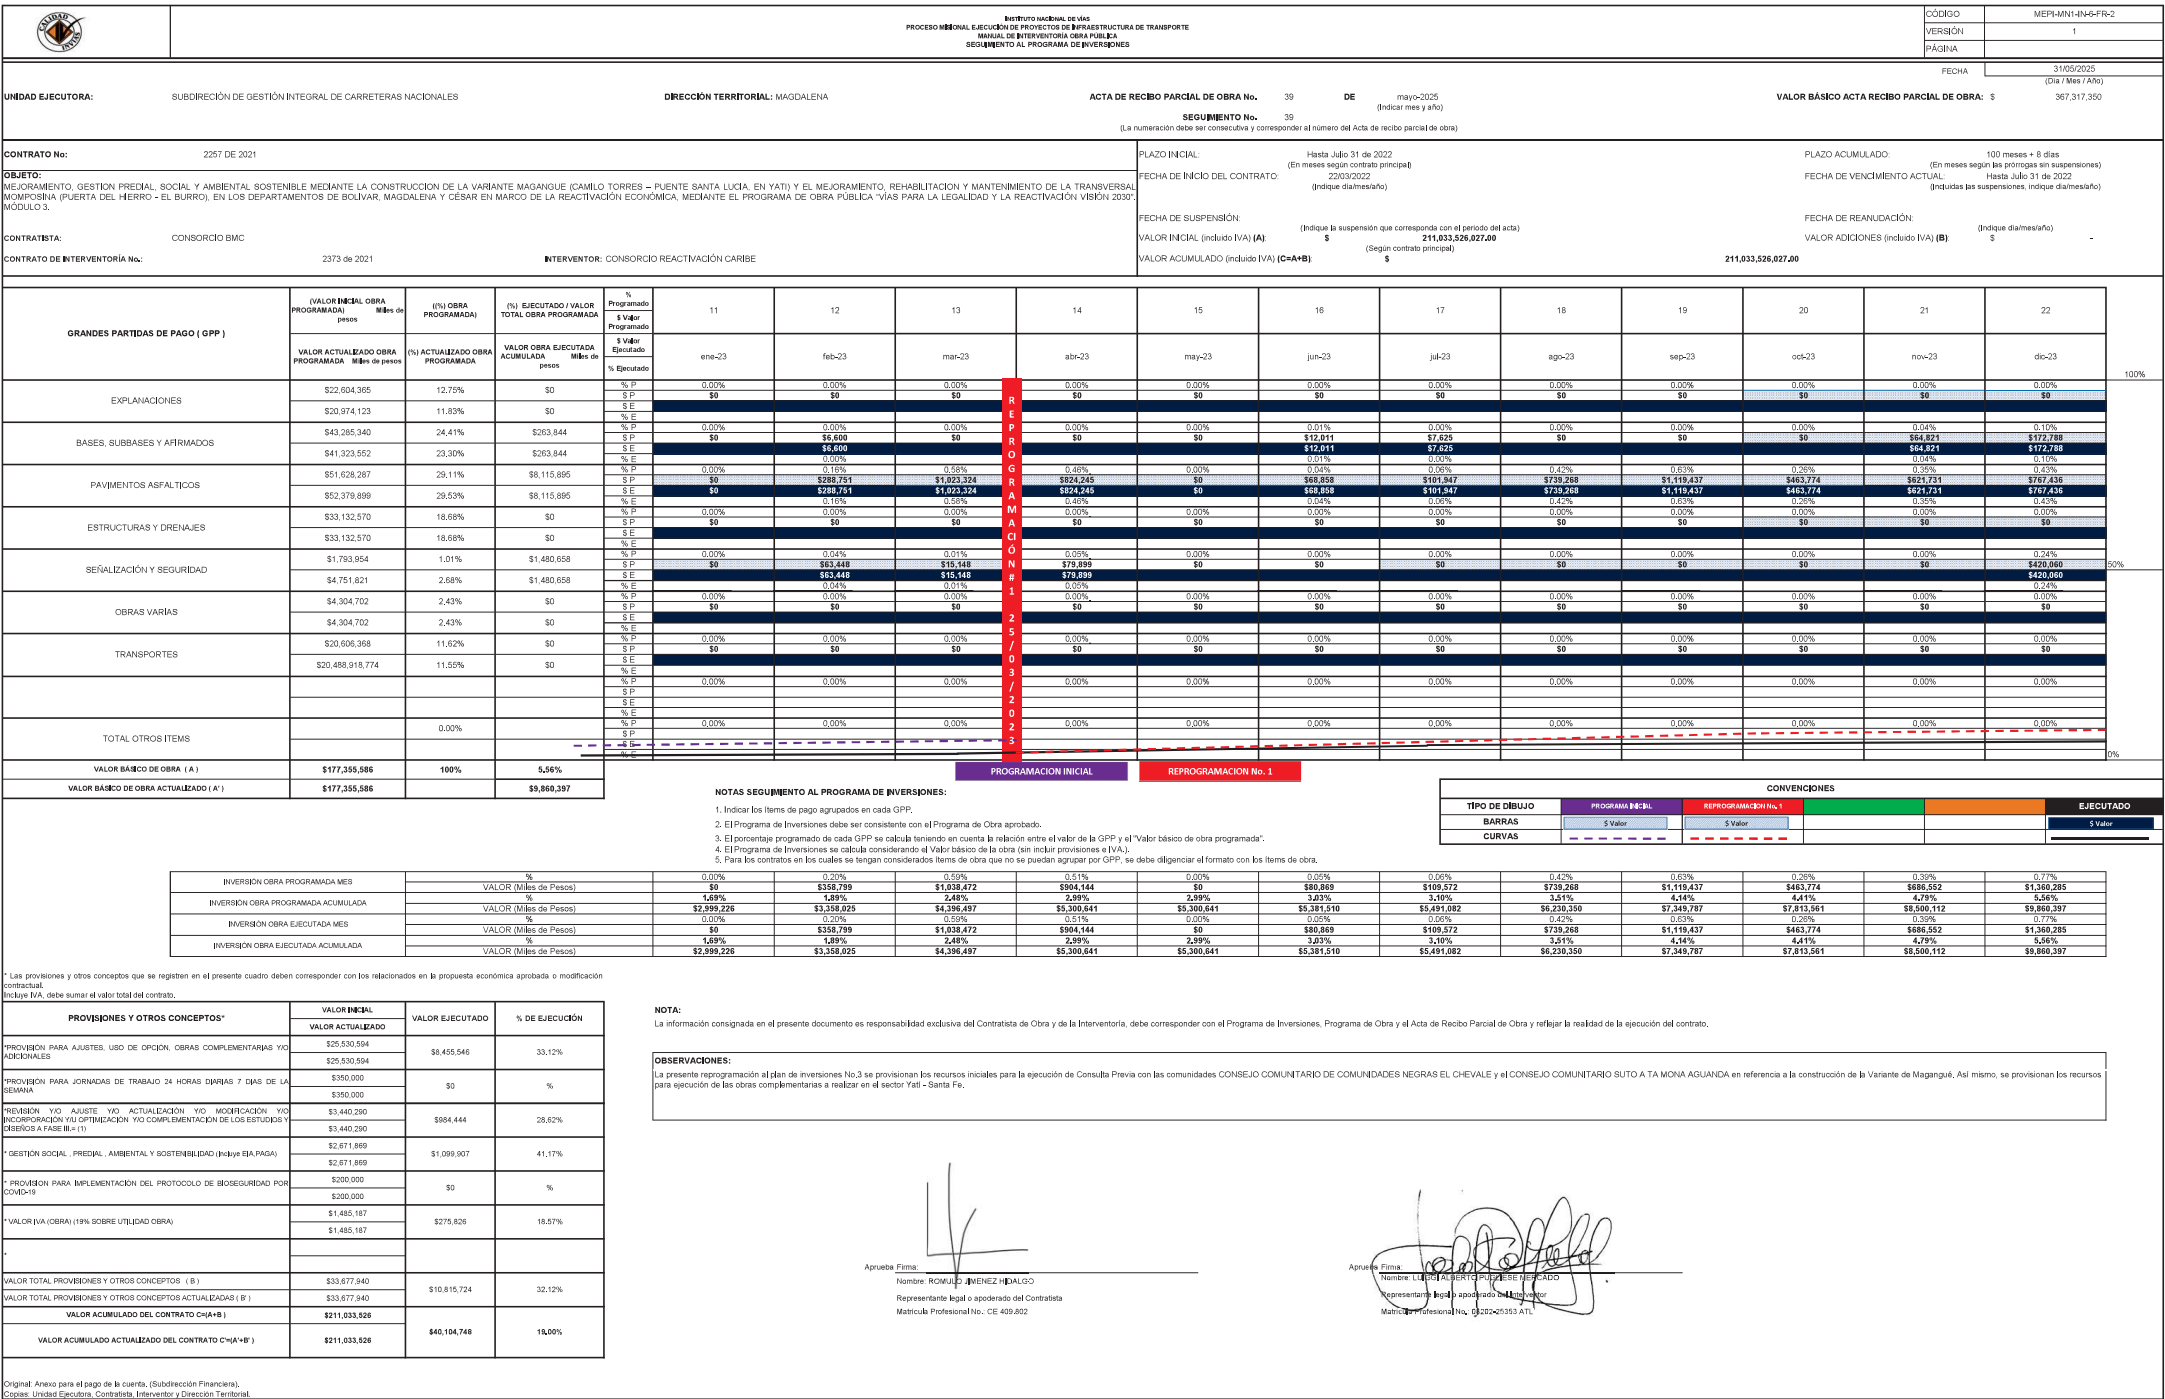

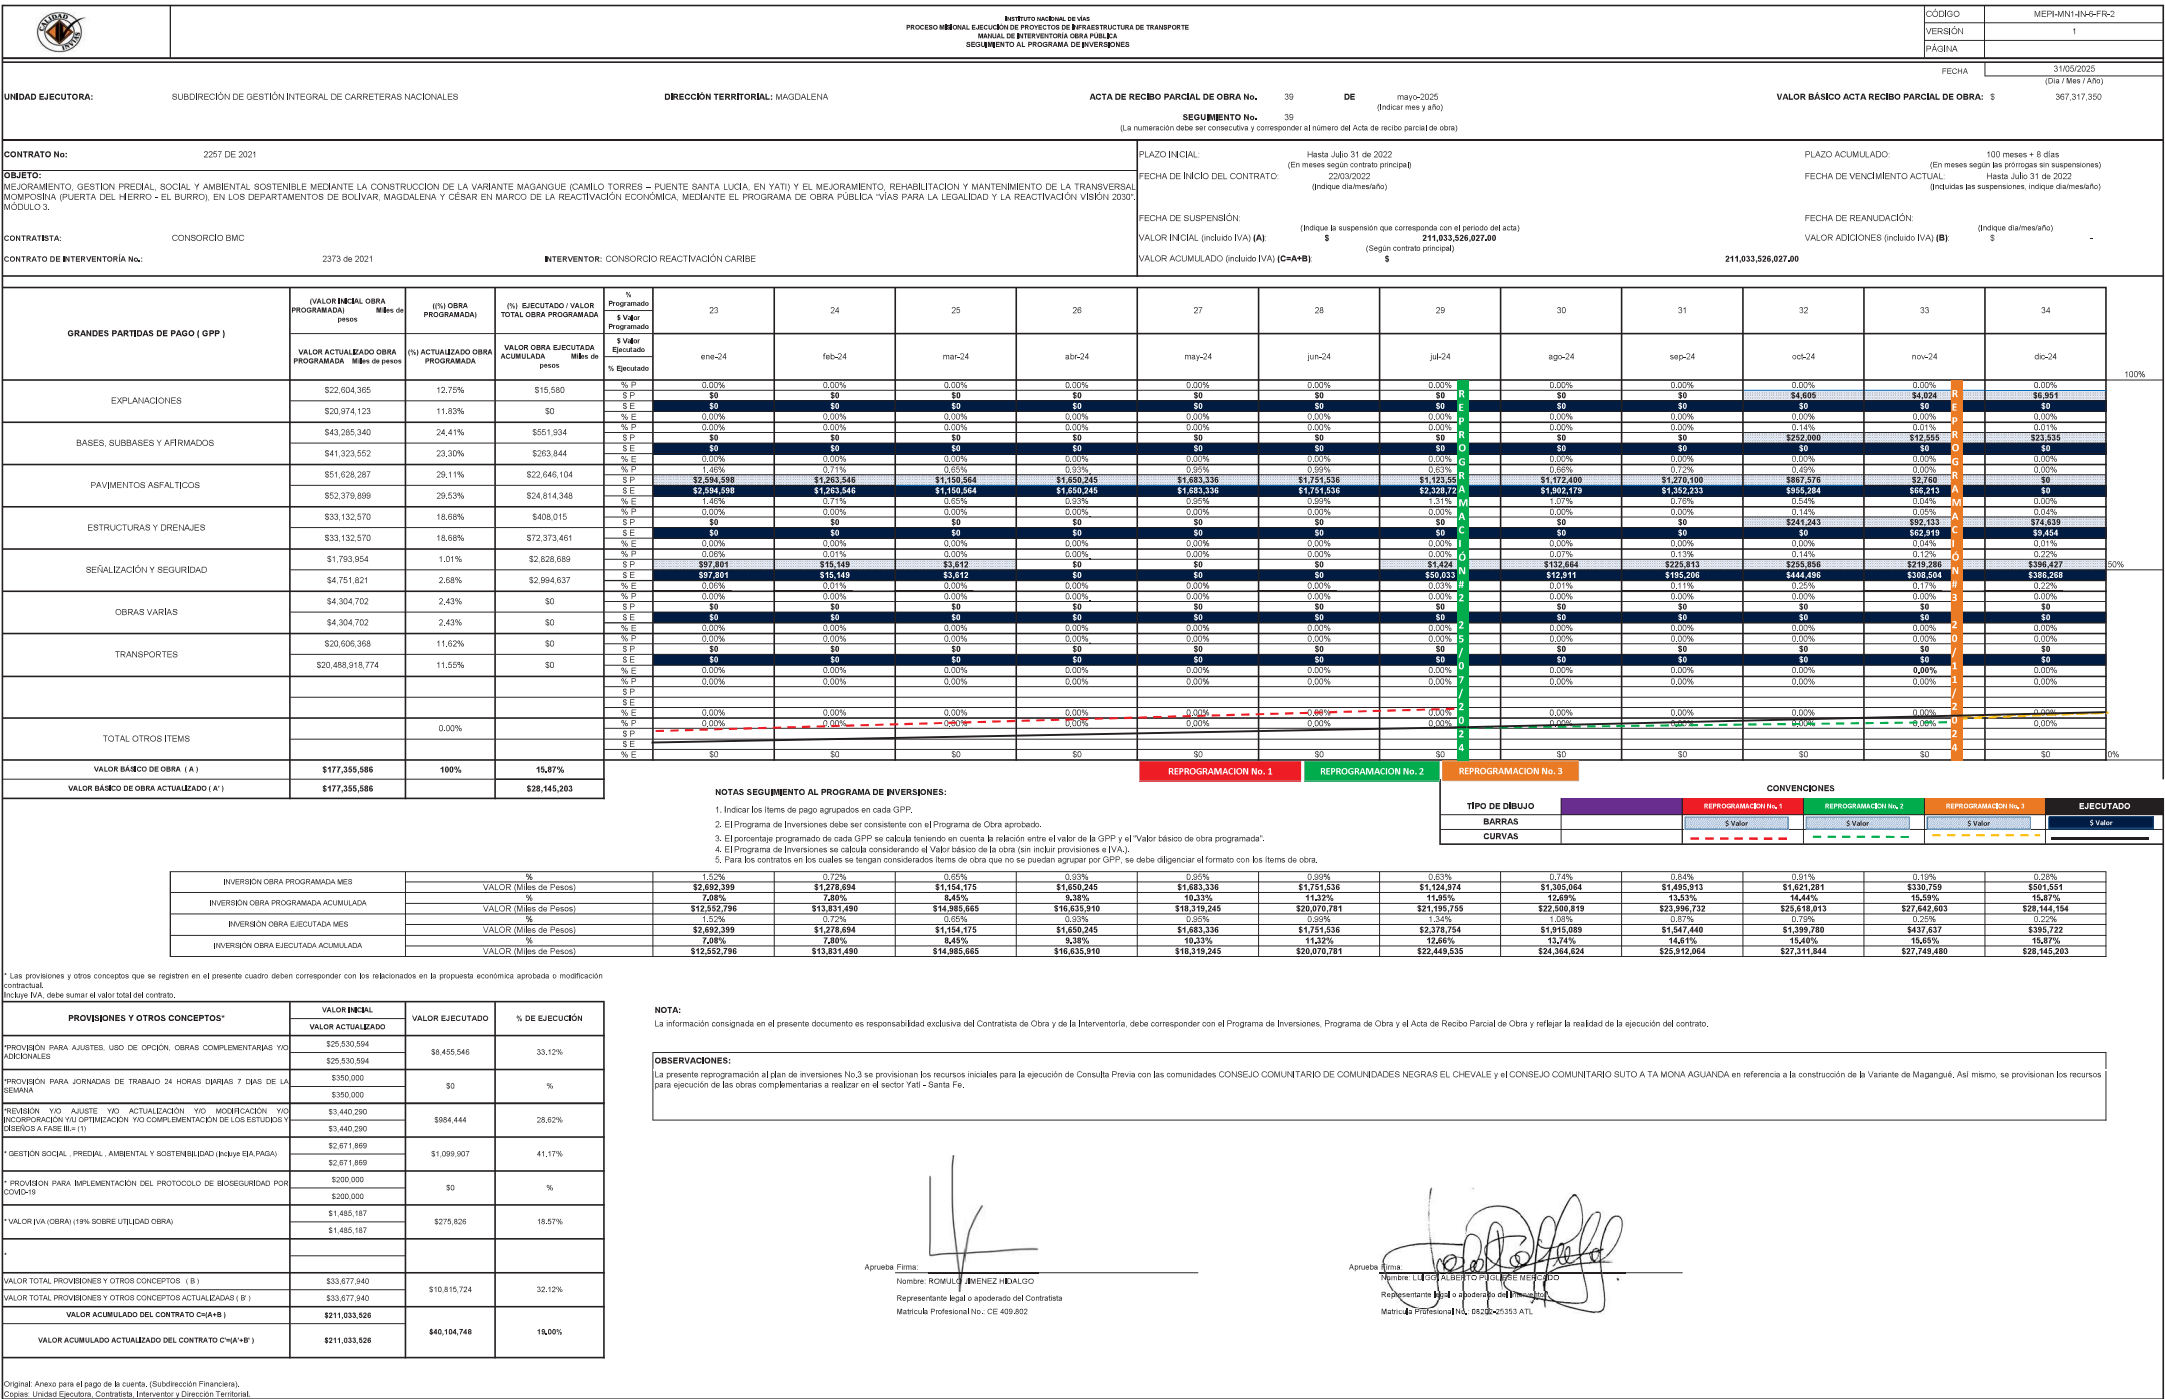

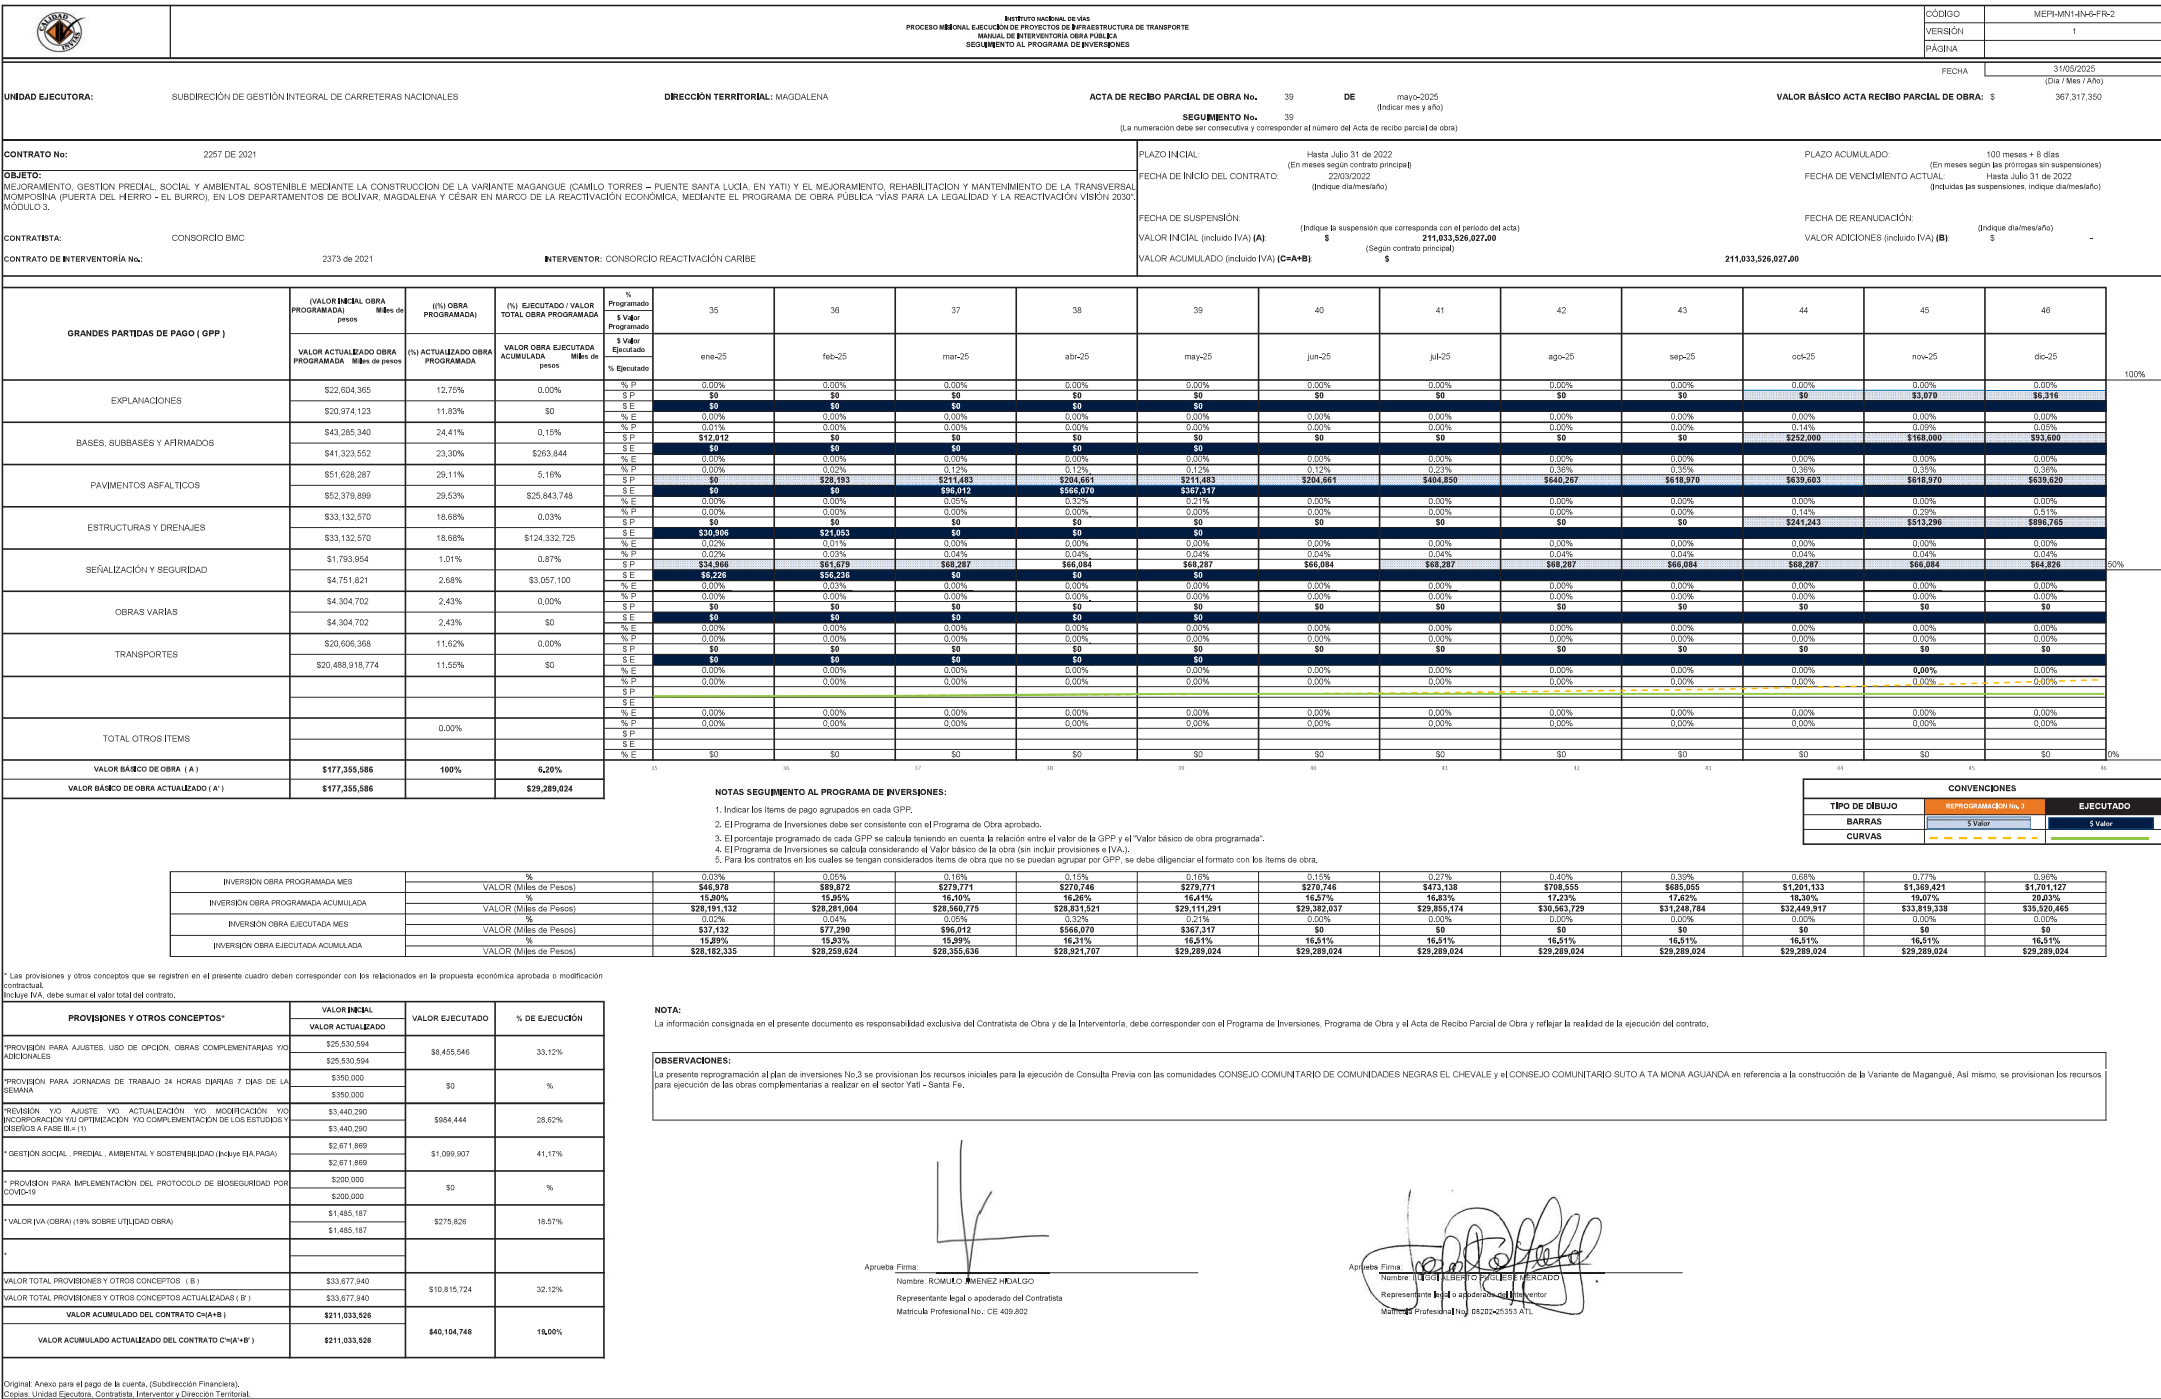

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

39

DE

mayo-2025

FECHA

31/05/2025

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No.

39

(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$

367.317.350

CONTRATO No:

2257 DE 2021

PLAZO INICIAL:

Hasta Julio 31 de 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 211.033.526.027,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)+(A)+(B):

\$ 211.033.526.027,00

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL NOMPÓSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado % Ejecutado	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	MES	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26		dic-26
					% P	% E	% P	% E	% P	% E		% P	% E	% P	% E	% P		% E
EXPLANACIONES	\$22.604.365	12,75%	\$8.155.416	% P	\$968.844	\$875.085	\$776.513	\$751.464	\$776.513	\$751.464		\$548.487	\$548.487	\$530.793	\$548.487	\$530.793	\$548.487	100%
	\$20.974.123	11,83%	\$0	% E														
	\$43.285.340	24,41%	\$0	% P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$41.323.552	23,30%	\$263.844	% E														
	\$51.628.287	29,11%	\$1.590.924	% P	\$55.988	\$50.569	\$86.210	\$83.429	\$86.210	\$191.339		\$212.276	\$212.276	\$177.684	\$183.607	\$177.684	\$172.038	
	\$52.379.899	29,53%	\$25.843.748	% E														
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$33.132.570	18,68%	\$3.363.992	% P	\$285.709	\$256.060	\$285.709	\$276.492	\$285.709	\$276.492		\$285.709	\$276.492	\$285.709	\$276.492	\$285.709	\$276.492	
	\$33.132.570	18,68%	\$124.332.725	% E														
	\$1.793.954	1,01%	\$37.722	% P	\$3.204	\$2.894	\$3.204	\$3.100	\$3.204	\$3.100		\$3.204	\$3.204	\$3.100	\$3.204	\$3.100	\$3.204	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$4.751.821	2,68%	\$3.057.100	% E														50%
	\$4.304.702	2,43%	\$0	% P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	\$4.304.702	2,43%	\$0	% E														
OBRAS VARIAS	\$20.606.368	11,62%	\$8.839.443	% P	\$750.747	\$678.094	\$750.747	\$726.530	\$750.747	\$726.530		\$750.747	\$750.747	\$726.530	\$750.747	\$726.530	\$750.747	
	\$20.488.918,774	11,55%	\$0	% E														
				% P														
TRANSPORTES				% E														
				% P														
				% E														
TOTAL OTROS ITEMS		0,00%		% P														0%
				% E														
				% P														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)					\$177.355.586	100%	16,51%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')					\$177.355.586		\$29.285.024											
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																		
REPROGRAMACION No. 3																		
CONVENCIONES																		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIÓNES															EJECUTADO		
TIPO DE DIBUJO		Nomenclatura										\$ Valor		\$ Valor			
BARRAS		-----										-----		-----			
CURVAS		-----										-----		-----			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MEB	%	1,10%	1,05%	1,07%	1,08%	1,07%	1,10%	1,02%	1,00%	0,97%	1,00%	0,97%	1,00%	0,94%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	\$2.084.491	\$1.864.702	\$1.902.383	\$1.841.016	\$1.902.383	\$1.948.985	\$1.800.422	\$1.801.976	\$1.714.800	\$1.771.753	\$1.714.800	\$1.771.753	\$1.666.185
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MEB	%	\$37.984.956	\$39.449.657	\$41.352.041	\$43.193.057	\$45.095.441	\$47.044.426	\$48.044.848	\$50.645.824	\$52.361.424	\$54.133.177	\$55.847.776	\$57.507.961	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	%	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	\$25.285.024	

Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Proveedores: (Indicar número de contrato del proveedor)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$25.530.584	\$8.455.546	33,12%
	\$25.530.584		
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$350.000	\$0	%
	\$350.000		
*REVISIÓN, Y/O AJUSTE, Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN, Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN, Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III- (1)	\$3.440.290	\$984.444	28,62%
	\$3.440.290		
*GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Indicando EIA, PAGU)	\$2.671.869	\$1.099.907	41,17%
	\$2.671.869		
*PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$200.000	\$0	%
	\$200.000		
*VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$1.485.187	\$275.828	18,57%
	\$1.485.187		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$33.677.940	\$10.815.724	32,12%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$33.677.940		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$211.033.526		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$211.033.526	\$40.104.748	19,00%

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALLE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

Aprobada Firma:

Nombre: ROMULO JIMENEZ HUALGO

Representante legal o apoderado del Contratista

Multicre: Profesional No.: CE 409.802

Aprobada Firma:

Nombre: LUIS FERRER OJEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Multicre: Profesional No.: 0020425353 ATL



CONTRATO No: 2257 DE 2021		PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILLO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSA MONPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2020”.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ -	
CONTRATO DE INTERVENITORÍA No.: 2373 de 2021		INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		211,033,526,027.00	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR) INICIAL OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	100%	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Ejecutado	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27			
	Miles de pesos	Miles de pesos	Miles de pesos	% Ejecutado															
EXPLANACIONES	\$22,604,365	12.70%	\$10,770,637	% P	0.13%	0.11%	0.13%	0.12%	0.13%	0.12%	0.13%	0.13%	0.12%	0.13%	0.12%	0.13%	0.13%		
				\$ P	\$222,115	\$200,620	\$222,115	\$214,950	\$222,115	\$214,950	\$222,115	\$214,950	\$222,115	\$214,950	\$222,115	\$214,950	\$222,115		
				% E															
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$20,974,123	11.83%	\$0	% P	0.68%	0.61%	0.70%	0.69%	0.70%	0.69%	0.70%	0.69%	0.69%	0.68%	0.68%	0.69%	0.68%		
	\$43,285,340	24.41%	\$14,416,932	\$ P	\$1,207,617	\$1,090,209	\$1,348,689	\$1,208,331	\$1,348,689	\$1,208,331	\$1,348,689	\$1,207,617	\$1,168,081	\$1,207,617	\$1,168,081	\$1,207,617	\$1,168,081		
				% E															
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$41,323,552	23.30%	\$263,844	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%		
	\$51,628,287	26.11%	\$1,887,507	\$ P	\$15,519	\$15,324	\$16,966	\$16,419	\$31,464	\$31,952	\$33,017	\$33,017	\$31,952	\$33,017	\$17,972	\$16,966			
				% E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$52,379,899	29.53%	\$25,843,748	% P	0.17%	0.15%	0.17%	0.18%	0.17%	0.18%	0.17%	0.17%	0.18%	0.18%	0.17%	0.18%	0.17%		
	\$33,132,570	18.68%	\$6,871,626	\$ P	\$29,909	\$289,079	\$29,909	\$288,299	\$29,909	\$288,299	\$29,909	\$29,909	\$288,299	\$288,299	\$29,909	\$288,299	\$29,909		
				% E															
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$124,332,725	67.51%	\$124,332,725	% P	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	\$13,793,954	7.43%	\$37,722	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
				% E															
OBRAS VARIAS	\$4,751,621	2.68%	\$3,057,100	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	\$4,304,702	2.43%	\$0	\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
				% E															
TRANSPORTES	\$4,304,702	2.43%	\$0	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	\$20,005,368	11.62%	\$12,683,616	\$ P	\$326,491	\$294,886	\$326,491	\$315,959	\$326,491	\$315,959	\$326,491	\$326,491	\$315,959	\$326,491	\$315,959	\$326,491	\$315,959		
				% E															
TOTAL OTROS ITEMS	\$20,488,918,774	11.55%	\$0	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				\$ P															
				% E															
				\$ P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				% E															
				\$ P															
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																		0%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)																		100%	16.51%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																		100%	\$79,389,034
REPROGRAMACION No. 3																		CONVENCIONES	

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO A 1	\$17,355,586	\$25,285,624
--------------------------------------	--------------	--------------

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicio los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE OBLIGO	CONVENCIÓNES		EJECUTADO
	REPROCESADO	NO REPROCESADO	
BARRAS	5,20%	5,20%	5,20%
CURVAS	5,20%	5,20%	5,20%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%		1.17%		1.18%		1.19%		1.20%		1.21%		1.22%		1.23%		1.24%		1.25%		1.26%		1.27%		1.28%		1.29%		1.30%		1.31%		1.32%		1.33%		1.34%		1.35%		1.36%		1.37%		1.38%		1.39%		1.40%		1.41%		1.42%		1.43%		1.44%		1.45%		1.46%		1.47%		1.48%		1.49%		1.50%		1.51%		1.52%		1.53%		1.54%		1.55%		1.56%		1.57%		1.58%		1.59%		1.60%		1.61%		1.62%		1.63%		1.64%		1.65%		1.66%		1.67%		1.68%		1.69%		1.70%		1.71%		1.72%		1.73%		1.74%		1.75%		1.76%		1.77%		1.78%		1.79%		1.80%		1.81%		1.82%		1.83%		1.84%		1.85%		1.86%		1.87%		1.88%		1.89%		1.90%		1.91%		1.92%		1.93%		1.94%		1.95%		1.96%		1.97%		1.98%		1.99%		2.00%		2.01%		2.02%		2.03%		2.04%		2.05%		2.06%		2.07%		2.08%		2.09%		2.10%		2.11%		2.12%		2.13%		2.14%		2.15%		2.16%		2.17%		2.18%		2.19%		2.20%		2.21%		2.22%		2.23%		2.24%		2.25%		2.26%		2.27%		2.28%		2.29%		2.30%		2.31%		2.32%		2.33%		2.34%		2.35%		2.36%		2.37%		2.38%		2.39%		2.40%		2.41%		2.42%		2.43%		2.44%		2.45%		2.46%		2.47%		2.48%		2.49%		2.50%		2.51%		2.52%		2.53%		2.54%		2.55%		2.56%		2.57%		2.58%		2.59%		2.60%		2.61%		2.62%		2.63%		2.64%		2.65%		2.66%		2.67%		2.68%		2.69%		2.70%		2.71%		2.72%		2.73%		2.74%		2.75%		2.76%		2.77%		2.78%		2.79%		2.80%		2.81%		2.82%		2.83%		2.84%		2.85%		2.86%		2.87%		2.88%		2.89%		2.90%		2.91%		2.92%		2.93%		2.94%		2.95%		2.96%		2.97%		2.98%		2.99%		3.00%		3.01%		3.02%		3.03%		3.04%		3.05%		3.06%		3.07%		3.08%		3.09%		3.10%		3.11%		3.12%		3.13%		3.14%		3.15%		3.16%		3.17%		3.18%		3.19%		3.20%		3.21%		3.22%		3.23%		3.24%		3.25%		3.26%		3.27%		3.28%		3.29%		3.30%		3.31%		3.32%		3.33%		3.34%		3.35%		3.36%		3.37%		3.38%		3.39%		3.40%		3.41%		3.42%		3.43%		3.44%		3.45%		3.46%		3.47%		3.48%		3.49%		3.50%		3.51%		3.52%		3.53%		3.54%		3.55%		3.56%		3.57%		3.58%		3.59%		3.60%		3.61%		3.62%		3.63%		3.64%		3.65%		3.66%		3.67%		3.68%		3.69%		3.70%		3.71%		3.72%		3.73%		3.74%		3.75%		3.76%		3.77%		3.78%		3.79%		3.80%		3.81%		3.82%		3.83%		3.84%		3.85%		3.86%		3.87%		3.88%		3.89%		3.90%		3.91%		3.92%		3.93%		3.94%		3.95%		3.96%		3.97%		3.98%		3.99%		4.00%		4.01%		4.02%		4.03%		4.04%		4.05%		4.06%		4.07%		4.08%		4.09%		4.10%		4.11%		4.12%		4.13%		4.14%		4.15%		4.16%		4.17%		4.18%		4.19%		4.20%		4.21%		4.22%		4.23%		4.24%		4.25%		4.26%		4.27%		4.28%		4.29%		4.30%		4.31%		4.32%		4.33%		4.34%		4.35%		4.36%		4.37%		4.38%		4.39%		4.40%		4.41%		4.42%		4.43%		4.44%		4.45%		4.46%		4.47%		4.48%		4.49%		4.50%		4.51%		4.52%		4.53%		4.54%		4.55%		4.56%		4.57%		4.58%		4.59%		4.60%		4.61%		4.62%		4.63%		4.64%		4.65%		4.66%		4.67%		4.68%		4.69%		4.70%		4.71%		4.72%		4.73%		4.74%		4.75%		4.76%		4.77%		4.78%		4.79%		4.80%		4.81%		4.82%		4.83%		4.84%		4.85%		4.86%		4.87%		4.88%		4.89%		4.90%		4.91%		4.92%		4.93%		4.94%		4.95%		4.96%		4.97%		4.98%		4.99%		5.00%		5.01%		5.02%		5.03%		5.04%		5.05%		5.06%		5.07%		5.08%		5.09%		5.10%		5.11%		5.12%		5.13%		5.14%		5.15%		5.16%		5.17%		5.18%		5.19%		5.20%		5.21%		5.22%		5.23%		5.24%		5.25%		5.26%		5.27%		5.28%		5.29%		5.30%		5.31%		5.32%		5.33%		5.34%		5.35%		5.36%		5.37%		5.38%		5.39%		5.40%		5.41%		5.42%		5.43%		5.44%		5.45%		5.46%		5.47%		5.48%		5.49%		5.50%		5.51%		5.52%		5.53%		5.54%		5.55%		5.56%		5.57%		5.58%		5.59%		5.60%		5.61%		5.62%		5.63%		5.64%		5.65%		5.66%		5.67%		5.68%		5.69%		5.70%		5.71%		5.72%		5.73%		5.74%		5.75%		5.76%		5.77%		5.78%		5.79%		5.80%		5.81%		5.82%		5.83%		5.84%		5.85%		5.86%		5.87%		5.88%		5.89%		5.90%		5.91%		5.92%		5.93%		5.94%		5.95%		5.96%		5.97%		5.98%		5.99%		6.00%		6.01%		6.02%		6.03%		6.04%		6.05%		6.06%		6.07%		6.08%		6.09%		6.10%		6.11%		6.12%		6.13%		6.14%		6.15%		6.16%		6.17%		6.18%		6.19%		6.20%		6.21%		6.22%		6.23%		6.24%		6.25%		6.26%		6.27%		6.28%		6.29%		6.30%		6.31%		6.32%		6.33%		6.34%		6.35%		6.36%		6.37%		6.38%		6.39%		6.40%		6.41%		6.42%		6.43%		6.44%		6.45%		6.46%		6.47%		6.48%		6.49%		6.50%		6.51%		6.52%		6.53%		6.54%		6.55%		6.56%		6.57%		6.58%		6.59%		6.60%		6.61%		6.62%		6.63%		6.64%		6.65%		6.66%		6.67%		6.68%		6.69%		6.70%		6.71%		6.72%		6.73%		6.74%		6.75%		6.76%		6.77%		6.78%		6.79%		6.80%		6.81%		6.82%		6.83%		6.84%		6.85%		6.86%		6.87%		6.88%		6.89%		6.90%		6.91%		6.92%		6.93%		6.94%		6.95%		6.96%		6.97%		6.98%		6.99%		7.00%		7.01%		7.02%		7.03%		7.04%		7.05%		7.06%		7.07%		7.08%		7.09%		7.10%		7.11%		7.12%		7.13%		7.14%		7.15%		7.16%		7.17%		7.18%		7.19%		7.20%		7.21%		7.22%		7.23%		7.24%		7.25%		7.26%		7.27%		7.28%		7.29%		7.30%		7.31%		7.32%		7.33%		7.34%		7.35%		7.36%		7.37%		7.38%		7.39%		7.40%		7.41%		7.42%		7.43%		7.44%		7.45%		7.46%		7.47%		7.48%		7.49%		7.50%		7.51%		7.52%		7.53%		7.54%		7.55%		7.56%		7.57%		7.58%		7.59%		7.60%		7.61%		7.62%		7.63%		7.64%		7.65%		7.66%		7.67%		7.68%		7.69%		7.70%		7.71%		7.72%		7.73%		7.74%		7.75%		7.76%		7.77%		7.78%		7.79%		7.80%		7.81%		7.82%		7.83%		7.84%		7.85%		7.86%		7.87%		7.88%		7.89%		7.90%		7.91%		7.92%		7.93%		7.94%		7.95%		7.96%		7.97%		7.98%		7.99%		8.00%		8.01%		8.02%		8.03%		8.04%		8.05%		8.06%		8.07%		8.08%		8.09%		8.10%		8.11%		8.12%		8.13%		8.14%		8.15%		8.16%		8.17%		8.18%		8.19%		8.20%		8.21%		8.22%		8.23%		8.24%		8.25%		8.26%		8.27%		8.28%		8.29%		8.30%		8.31%		8.32%		8.33%		8.34%		8.35%		8.36%		8.37%		8.38%		8.39%		8.40%		8.41%		8.42%		8.43%		8.44%		8.45%		8.46%		8.47%		8.48%		8.49%		8.50%		8.51%		8.52%		8.53%		8.54%		8.55%		8.56%		8.57%		8.58%		8.59%		8.60%		8.61%		8.62%		8.63%		8.64%		8.65%		8.66%		8.67%		8.68%		8.69%		8.70%		8.71%		8.72%		8.73%		8.74%		8.75%		8.76%		8.77%		8.78%		8.79%		8.80%		8.81%		8.82%		8.83%		8.84%		8.85%		8.86%		8.87%		8.88%		8.89%		8.90%		8.91%		8.92%		8.93%		8.94%		8.95%		8.96%		8.97%		8.98%		8.99%		9.00%		9.01%		9.02%		9.03%		9.04%		9.05%		9.06%		9.07%		9.08%		9.09%		9.10%		9.11%		9.12%		9.13%		9.14%		9.15%		9.16%		9.17%		9.18%		9.19%		9.20%		9.21%		9.22%		9.23%		9.24%		9.25%		9.26%		9.27%		9.28%		9.29%		9.30%		9.31%		9.32%		9.33%		9.34%		9.35%		9.36%		9.37%		9.38%		9.39%		9.40%		9.41%		9.42%		9.43%		9.44%		9.45%		9.46%		9.47%		9.48%		9.49%		9.50%		9.51%		9.52%		9.53%		9.54%		9.55%		9.56%		9.57%		9.58%		9.59%		9.60%		9.61%		9.62%		9.63%		9.64%		9.65%		9.66%		9.67%		9.68%		9.69%		9.70%		9.71%		9.72%		9.73%		9.74%		9.75%		9.76%		9.77%		9.78%		9.79%		9.80%		9.81%		9.82%		9.83%		9.84%		9.85%		9.86%		9.87%		9.88%		9.89%		9.90%		9.91%		9.92%		9.93%		9.94%		9.95%		9.96%		9.97%		9.98%		9.99%		10.00%		10.01%		10.02%		10.03%		10.04%		10.05%		10.06%		10.07%		10.08%		10.09%		10.10%		10.11%		10.12%		10.13%		10.14%		10.15%		10.16%		10.17%		10.18%		10.19%		10.20%		10.21%		10.22%		10.23%		10.24%		10.25%		10.26%		10.27%		10.28%		10.29%		10.30%		10.31%		10.32%		10.33%		10.34%		10.35%		10.36%		10.37%		10.38%		10.39%		10.40%		10.41%		10.42%		10.43%		10.44%		10.45%		10.46%		10.47%		10.48%		10.49%		10.50%		10.51%		10.52%		10.53%		10.54%		10.55%		10.56%		10.57%		10.58%		10.59%		10.60%		10.61%		10.62%		10.63%		10.64%		10.65%		10.66%		10.67%		10.68%		10.69%		10.70%		10.71%		10.72%		10.73%		10.74%		10.75%		10.76%		10.77%		10.78%		10.79%		10.80%		10.81%		10.82%		10.83%		10.84%		10.85%		10.86%		10.87%		10.88%		10.89%		10.90%		10.91%		10.92%		10.93%		10.94%		10.95%		10.96%		10.97%		10.98%		10.99%		11.00%		11.01%		11.02%		11.03%		11.04%		11.05%		11.06%		11.07%		11.08%		11.09%		11.10%		11.11%		11.12%		11.13%		11.14%		11.15%		11.16%		11.17%		11.18%		11.19%		11.20%		11.21%		11.22%		11.23%		11.24%		11.25%		11.26%		11.27%		11.28%		11.29%		11.30%		11.31%		11.32%		11.33%		11.34%	
-------------------------------	--	---	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$25,530,584	\$8,450,546	33,12%
	\$25,530,584		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$350,000	\$0	%
	\$350,000		
RESERVA Y AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O DIAGNÓSTICO A FASE III-A (1)	\$3,430,260	\$884,444	28,82%
	\$3,430,260		
*GESTIÓN SOCIAL, PRECIDA, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EA-PAAG)	\$2,671,869	\$1,099,907	41,17%
	\$2,671,869		
*PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INSEGURIDAD POR COVID-19	\$200,000	\$0	%
	\$200,000		
PROVISIÓN IVA (OBRA) (13% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$1,485,187	\$275,828	18,57%
	\$1,485,187		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (E + F)	\$33,677,940		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (E + F)	\$33,677,940	\$10,816,724	32,12%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO CH4-A)	\$211,033,526		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO CH4-A+B)	\$211,033,526	\$40,104,748	19,00%


La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva de la Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALÉ y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yali - Santa Fe.

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: CE 409,802

Apuntes Firma: 
Nombre: LUGALBERTO GONZALEZ MERCADO
Representante: 
Matrícula Profesional: No. 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

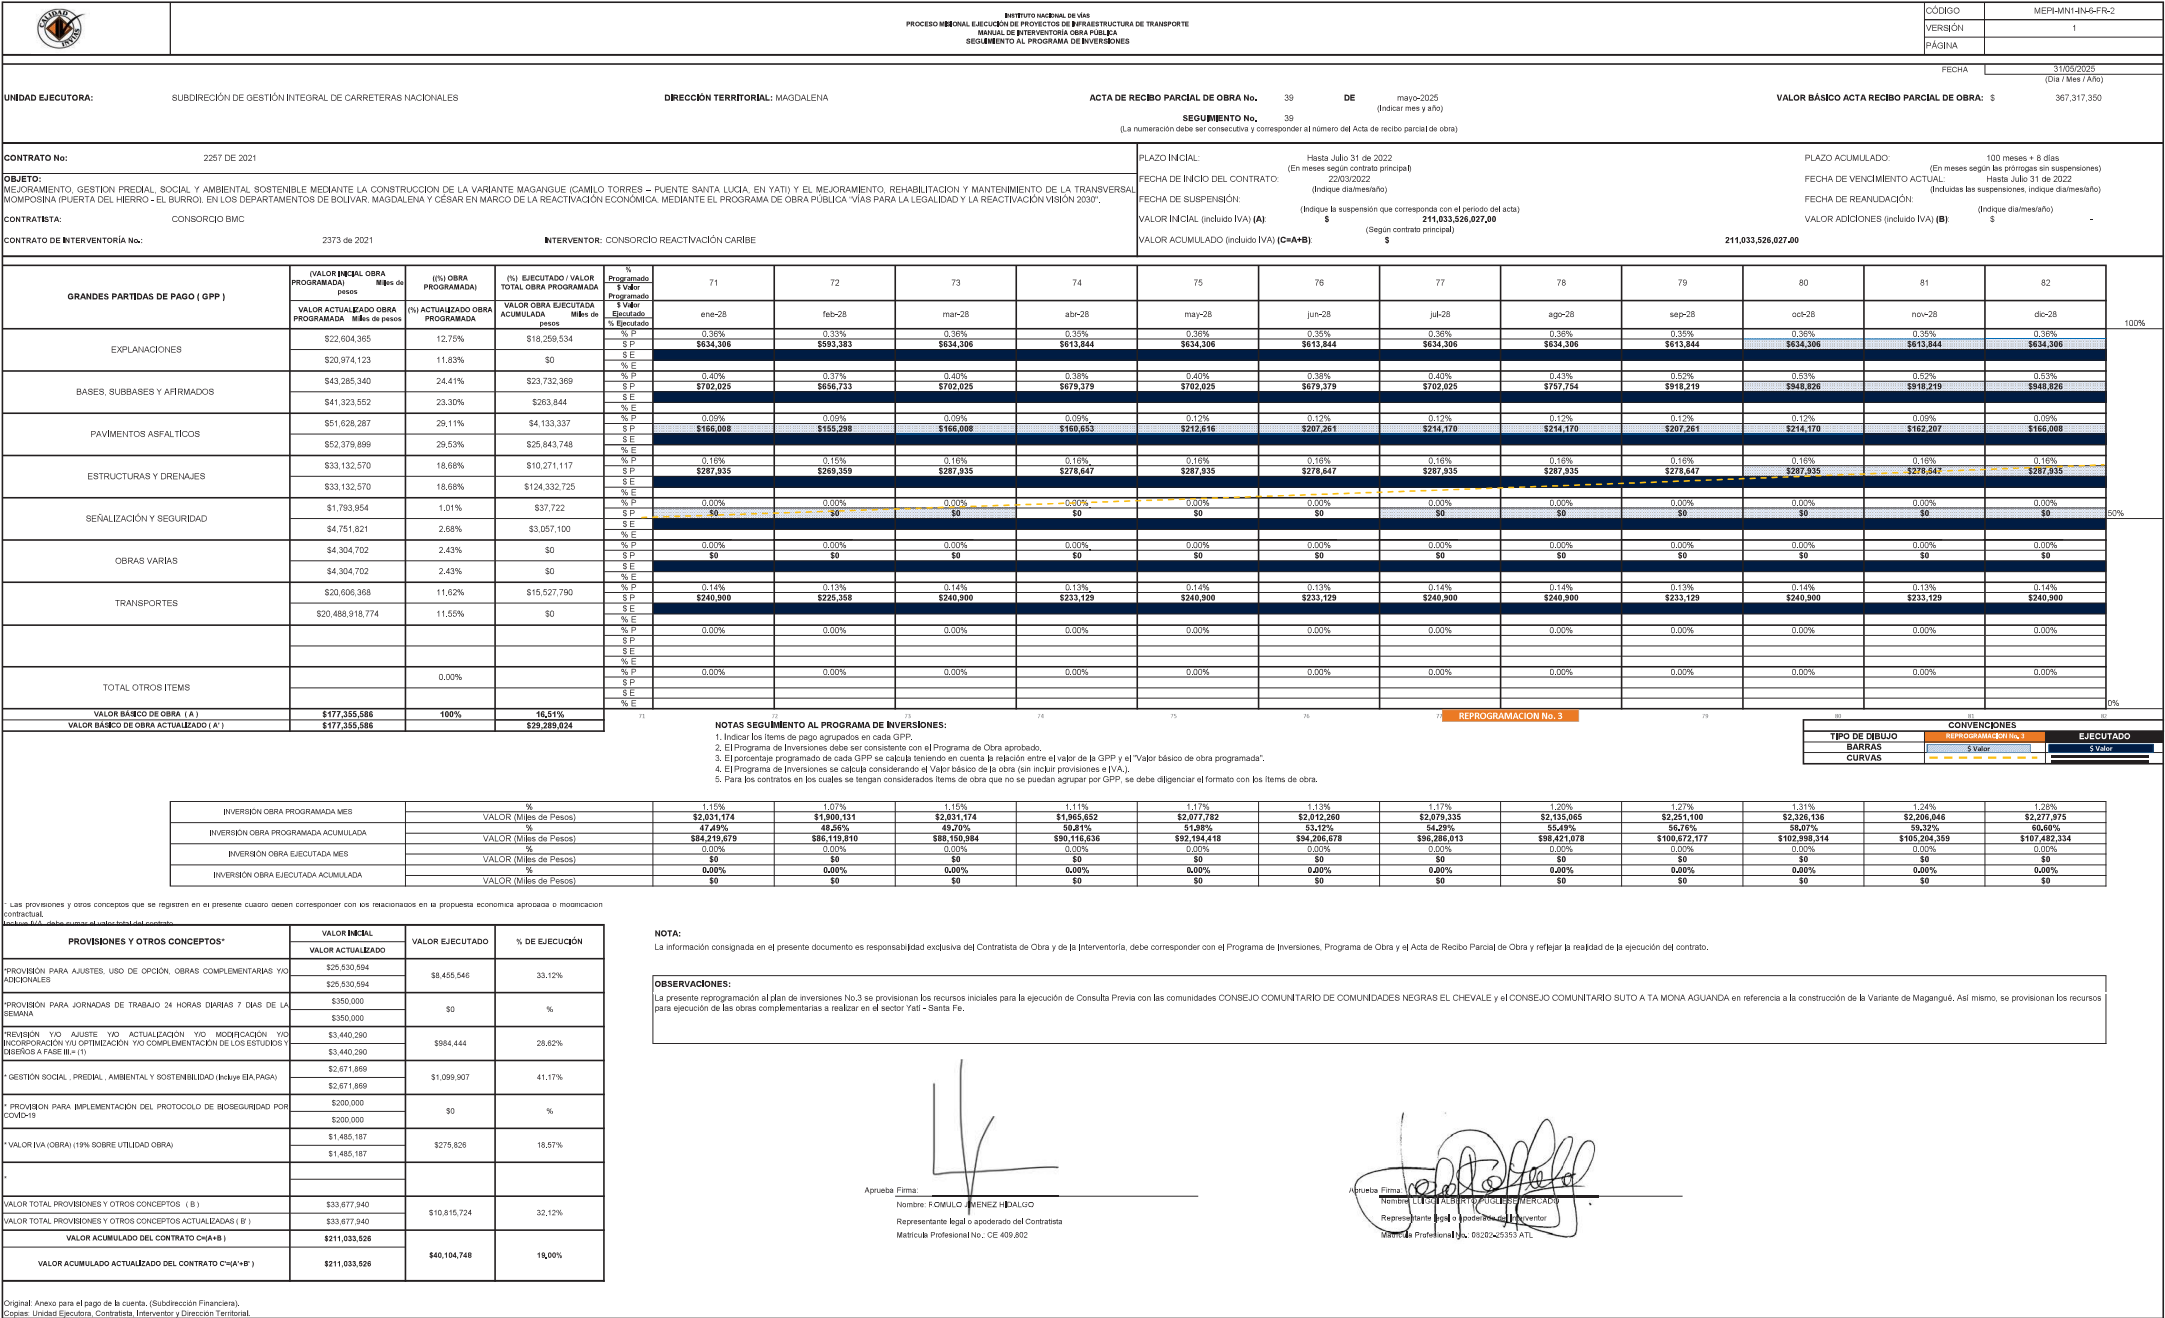

FECHA

31/05/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

39

DE

mayo-2025

(Indicar mes y año)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$

367,317,350

SEGUIMIENTO No.

39

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

2257 DE 2021

PLAZO INICIAL:

Hasta Julio 31 de 2022

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

\$

211,033,526,027.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B)

\$

211,033,526,027.00

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL NOMPESINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

PLAZO ACUMULADO:

100 meses + 8 días

(En meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

Hasta Julio 31 de 2022

(Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

\$

-

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado % Ejecutado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	93	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dici-29	
					% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P	% E	
EXPLANACIONES	\$22,604,365	12.75%	\$20,953,762	% P	0.21%	0.19%	0.21%	0.20%	0.21%	0.20%	0.20%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	100%
	\$20,974,123	11.83%	\$0	% E	\$363,682	\$328,487	\$363,682	\$351,951	\$363,682	\$351,951	\$96,166	\$96,166	\$93,584	\$96,166	\$93,584	\$96,166	
				% E													
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$43,285,340	24.41%	\$36,123,055	% P	0.22%	0.48%	0.51%	0.53%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.61%	0.51%	0.50%	0.51%	
	\$41,323,552	23.30%	\$263,844	% E	\$1,101,717	\$822,518	\$910,645	\$932,821	\$1,176,994	\$1,139,026	\$1,176,994	\$1,176,994	\$1,087,475	\$910,645	\$881,270	\$1,073,588	
				% E													
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$51,628,287	29.11%	\$6,009,073	% P	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	
	\$52,379,899	29.53%	\$25,843,748	% E	\$147,250	\$133,000	\$147,250	\$142,500	\$147,250	\$142,500	\$147,250	\$147,250	\$142,500	\$147,250	\$142,500	\$289,234	
				% E													
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$33,132,570	18.68%	\$14,013,352	% P	0.18%	0.18%	0.18%	0.17%	0.18%	0.17%	0.18%	0.18%	0.17%	0.18%	0.17%	0.18%	
	\$33,132,570	18.68%	\$124,332,725	% E	\$317,834	\$287,076	\$317,834	\$307,581	\$317,834	\$307,581	\$317,834	\$317,834	\$307,581	\$317,834	\$307,581	\$317,834	
				% E													
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	\$1,793,954	1.01%	\$37,722	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50%
	\$4,751,821	2.68%	\$3,057,100	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				% E													
OBRAS VARIAS	\$4,304,702	2.43%	\$0	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	\$4,304,702	2.43%	\$0	% E	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				% E													
TRANSPORTES	\$20,606,368	11.62%	\$20,488,918	% P	0.48%	0.43%	0.48%	0.46%	0.48%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	\$20,488,918,774	11.55%	\$0	% E	\$847,718	\$765,681	\$847,718	\$820,372	\$847,718	\$820,372	\$1,946	\$1,946	\$1,883	\$1,946	\$1,883	\$1,946	
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS				% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
				% E													
				% E													
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$177,355,586	100%	\$6,51%														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$177,355,586		\$25,285,824														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REPROGRAMACION No. 3

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACION No. 1	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	\$ Valor	\$ Valor

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	1.83%	1.32%	1.48%	1.48%	1.61%	1.59%	0.88%	1.08%	0.92%	0.80%	1.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,778,201	\$2,336,762	\$2,587,129	\$2,555,225	\$2,853,478	\$2,761,430	\$1,740,189	\$1,740,189	\$1,832,503	\$1,473,841	\$1,426,298
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	62.47%	63.49%	66.39%	66.39%	68.80%	69.59%	70.53%	71.51%	72.43%	73.27%	75.07%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$110,260,535	\$112,597,297	\$115,184,427	\$117,739,652	\$120,593,129	\$123,354,559	\$126,834,938	\$128,467,441	\$129,941,282	\$131,367,579	\$133,146,247
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratada.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
*PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$25,530,584	\$8,455,546	33.12%
	\$25,530,584		
*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$350,000	\$0	%
	\$350,000		
*REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/O OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III» (1)	\$3,440,290	\$984,444	28.82%
	\$3,440,290		
* GESTION SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Indique B/A/PAG)	\$2,671,869	\$1,099,907	41.17%
	\$2,671,869		
* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$200,000	\$0	%
	\$200,000		
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$1,485,187	\$275,828	18.57%
	\$1,485,187		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$33,677,940	\$10,815,724	32.12%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$33,677,940		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(A+B)	\$211,033,526		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C(A+B')	\$211,033,526	\$40,104,748	19.00%

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALLE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yati - Santa Fe.



Aprobada Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: CE 409.802



Aprobada Firma:
Nombre: LUIS ROBERTO ORTIZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 9322425953 ATL

FECHA

31/05/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 DE mayo-2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 367.317.350

SEGUIMIENTO No. 39

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

2257 DE 2021

PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL NOMBOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 211.033.526.027,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) \$ 211.033.526.027,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) MILES de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA MILES de pesos	% Programado \$ Valor Programado % Ejecutado	94 ene-29	95 feb-29	96 mar-29	97 abr-29	98 may-29	99 jun-29	100 jul-29		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA MILES de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA MILES de pesos	% Ejecutado	% P	% E	% P	% E	% P	% E	% P		
EXPLANACIONES	\$22.604.365	12,75%	\$20.953.762	% P 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100%	
	\$20.974.123	11,83%	\$0	% E 0,00%									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$43.285.340	24,41%	\$40.498.006	% P 0,76%	\$1.386.348	\$1.292.727	\$655.777	\$611.037	\$468.462	\$0	\$0		
	\$41.323.552	23,30%	\$263.844	% E 0,34%									
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$51.628.287	29,11%	\$23.208.241	% P 0,89%	\$1.672.821	\$3.309.004	\$3.663.541	\$2.959.402	\$2.905.328	\$2.787.072	\$0		
	\$52.379.899	29,53%	\$25.843.748	% E 1,87%									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$33.132.570	18,68%	\$31.314.495	% P 1,83%	\$0	\$2.590.486	\$2.535.923	\$3.250.486	\$3.145.631	\$2.397.586	\$2.320.631		
	\$33.132.570	18,68%	\$124.332.725	% E 1,68%									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$1.793.954	1,01%	\$1.058.997	% P 0,00%	\$159.245	\$143.834	\$159.245	\$154.108	\$159.245	\$154.108	\$101.459	50%	
	\$4.751.821	2,68%	\$3.057.100	% E 0,08%									
OBRAS VARIAS	\$4.304.702	2,43%	\$4.304.702	% P 0,36%	\$632.444	\$571.240	\$632.444	\$612.043	\$632.444	\$612.043	\$612.043		
	\$4.304.702	2,43%	\$0	% E 0,36%									
TRANSPORTES	\$20.606.368	11,62%	\$20.488.919	% P 0,00%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
	\$20.488.918,774	11,55%	\$0	% E 0,00%									
TOTAL OTROS ITEMS				% P 0,00%									
				% E 0,00%									
				% P 0,00%									
				% E 0,00%									
				% P 0,00%									
				% E 0,00%									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$177.355.586	100%	\$6.51%										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$177.355.586		\$25.285,624										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REPROGRAMACION No. 3

CONVENCIONES	
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACION No. 3
BARRAS	\$ Valor
CURVAS	\$ Valor

INVERSION OBRA PROGRAMADA MEB	%	3,85%	4,63%	4,71%	4,22%	3,70%	3,31%	0,40%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$7.091.844	\$8.212.728	\$8.361.493	\$7.482.222	\$6.563.465	\$5.873.954	\$745.832					
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	79,42%	83,65%	88,37%	92,59%	96,29%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	\$140.148.291	\$146.261.019	\$156.722.512	\$164.204.734	\$170.768.199	\$175.642.053	\$177.355.586					
INVERSION OBRA EJECUTADA MEB	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Verificar: 0,00% (sin tener en cuenta el valor total del contrato).

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
*PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$25.530.584	\$8.455.546	33,12%
	\$25.530.584		
*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$350.000	\$0	%
	\$350.000		
*REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III» (1)	\$3.440.290	\$984.444	28,62%
	\$3.440.290		
*GESTION SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Indicóe BIA,PAGA)	\$2.671.869	\$1.099.907	41,17%
	\$2.671.869		
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$200.000	\$0	%
	\$200.000		
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$1.485.187	\$275.828	18,57%
	\$1.485.187		
*			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$33.677.940	\$10.815.724	32,12%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$33.677.940		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$211.033.526		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$211.033.526	\$40.104.748	19,00%

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

Aprobado Firmo:

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Aprobado Firma:

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 0326242593 ATL

PREACTA DE OBRA No. 39											may-25	
CONTRATO No. 2257 DE 2021												
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.												
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78)						INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE						
FECHA DE INICIO: 22/03/2022						PERIODO: mayo-2025		TRANSVERSAL MOMPOSINA				
FECHA DE TERMINACION: Hasta Julio 31 de 2030						CARRETERA: 78						
No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		TOTAL PREACTA	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANEACIONES												
1	200.2	200-13	0	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116.814.00	\$ 54,723.886.00	49.00	\$ 54,723.886.00	0.00	\$ 0.00
2	201.7	201-13	0	Demolición de Estructuras	m³	1,618.00	\$ 110.698.00	\$ 179,109.364.00	1,618.00	\$ 179,109.364.00	0.00	\$ 0.00
3	201.15	201-13	0	Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66.815.00	\$ 117,594.400.00	1,760.00	\$ 117,594.400.00	0.00	\$ 0.00
4	210.1.1	210-13	0	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m³	186,092.00	\$ 10.000.00	\$ 1,860,920.000.00	186,092.00	\$ 1,860,920.000.00	0.00	\$ 0.00
5	210.1.2	210-13	0	Excavación sin clasificar de préstamos	m³	819,504.00	\$ 12.000.00	\$ 9,834,048.000.00	683,650.46	\$ 8,203,805.528.00	0.00	\$ 0.00
6	211.1	211-13	0	Remoción de Derrumbes	m³	1,500.00	\$ 9,747.00	\$ 14,620.500.00	1,500.00	\$ 14,620.500.00	0.00	\$ 0.00
7	220.1	220-1	0	Terraplenes	m³	777,232.00	\$ 13.000.00	\$ 10,104,016.000.00	777,232.00	\$ 10,104,016.000.00	0.00	\$ 0.00
8	230.1P	0	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m³	42,272.00	\$ 10.393.00	\$ 439,332.896.00	42,272.00	\$ 439,332.896.00	0.00	\$ 0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
9	311.1	311-13	0	Afirmado	m³	94,260.00	\$ 78.000.00	\$ 7,352,280.000.00	94,260.00	\$ 7,352,280.000.00	0.00	\$ 0.00
10	320.1	320-13	0	Subbase Granular clase A	m³	35,000.00	\$ 220.000.00	\$ 7,700.000.000.00	35,000.00	\$ 7,700.000.000.00	0.00	\$ 0.00
11	330.1	330-13	0	Base granular clase A	m³	84,169.00	\$ 240.000.00	\$ 20,200.560.000.00	84,169.00	\$ 20,200.560.000.00	0.00	\$ 0.00
12	330.4	330-13	0	Base granular para bacheo clase A	m³	31,500.00	\$ 255.000.00	\$ 8,032.500.000.00	31,500.00	\$ 8,032.500.000.00	0.00	\$ 0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS												
13	420.2	420-13	0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m²	434,784.00	\$ 2.600.00	\$ 1,130.438.400.00	434,784.00	\$ 1,130.438.400.00	0.00	\$ 0.00
14	421.1	421-13	0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m²	434,784.00	\$ 1.500.00	\$ 652.176.000.00	434,784.00	\$ 652.176.000.00	3884.10	\$ 5,826.150.00
15	450.1P	0	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m³	29,109.00	\$ 878.000.00	\$ 25,557.702.000.00	29,109.00	\$ 25,557.702.000.00	0.00	\$ 0.00
16	450.2P	0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m³	19,015.00	\$ 893.000.00	\$ 16,980.395.000.00	19,015.00	\$ 16,980.395.000.00	376.00	\$ 335,748.000.00
17	450.9P	0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m³	7,000.00	\$ 908.000.00	\$ 6,356.000.000.00	7,000.00	\$ 6,356.000.000.00	0.00	\$ 0.00
18	460.1P	0	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m³	7,000.00	\$ 69.000.00	\$ 483.000.000.00	20.000.00	\$ 1,380.000.000.00	372.80	\$ 25,723.200.00
19	465.1	465-13	0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m³	8,400.00	\$ 70.000.00	\$ 588.000.000.00	8,400.00	\$ 588.000.000.00	0.00	\$ 0.00
20	466.1	466-13	0	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4.000.00	\$ 22.400.000.00	40.000.00	\$ 160.000.000.00	0.00	\$ 0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
21	600.1.1	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m³	30,831.00	\$ 28.888.00	\$ 890,645.928.00	30,831.00	\$ 890,645.928.00	0.00	\$ 0.00
22	600.2.1	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m³	225.00	\$ 67,076.00	\$ 15,092.100.00	225.00	\$ 15,092.100.00	0.00	\$ 0.00
23	600.2.4	600-13	0	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m³	120.00	\$ 62,192.00	\$ 7,463.040.00	120.00	\$ 7,463.040.00	0.00	\$ 0.00
24	610.1	610-13	0	Reellenos para Estructuras con suelo	m³	2,210.00	\$ 41.503.00	\$ 91,721.630.00	2,210.00	\$ 91,721.630.00	0.00	\$ 0.00
25	610.2	610-13	0	Releño para estructuras con recebo	m³	355.00	\$ 108,914.00	\$ 38,664.470.00	355.00	\$ 38,664.470.00	0.00	\$ 0.00
26	630.3	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m³	7,314.00	\$ 850.000.00	\$ 6,216.900.000.00	7,314.00	\$ 6,216.900.000.00	0.00	\$ 0.00
27	630.4	630-13	0	Concreto clase 21 MPA	m³	6,562.00	\$ 750.000.00	\$ 4,921.500.000.00	6,562.00	\$ 4,921.500.000.00	0.00	\$ 0.00
28	630.6	630-13	0	Concreto clase 14 MPA	m³	1,448.00	\$ 570.000.00	\$ 825.360.000.00	1,448.00	\$ 825.360.000.00	0.00	\$ 0.00
29	640.1	640-13	0	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6.321.00	\$ 9,648,121.560.00	1,526,360.00	\$ 9,648,121.560.00	0.00	\$ 0.00
30	661.1	661-13	0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610.000.00	\$ 3,301.930.000.00	5,413.00	\$ 3,301.930.000.00	0.00	\$ 0.00
31	671.3	671-13	0	Cunetas de concreto "vacadas in situ; incluye la conformación de la superficie de agua.	m³	8,533.00	\$ 704.000.00	\$ 6,007,232.000.00	8,533.00	\$ 6,007,232.000.00	0.00	\$ 0.00
32	673.1	673-13	0	Geotextil Tipo II no tejido	m²	17,849.50	\$ 7.500.00	\$ 133,871.250.00	17,849.50	\$ 133,871.250.00	0.00	\$ 0.00
33	673.2	673-13	0	Material granular drenante	m³	4,924.00	\$ 182.000.00	\$ 896.168.000.00	4,924.00	\$ 896.168.000.00	0.00	\$ 0.00
34	673.3	673-13	0	Material de cobertura tipo 5BG	m³	985.00	\$ 140.000.00	\$ 137.900.000.00	985.00	\$ 137,900.000.00	0.00	\$ 0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												
35	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192.000.00	\$ 1,795.00	\$ 344,640.000.00	319,184.00	\$ 572,935.280.00	0.00	\$ 0.00
36	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m²	9,600.00	\$ 22,076.00	\$ 211,929.600.00	3,900.00	\$ 86,096.400.00	0.00	\$ 0.00
37	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346.00	\$ 215,276.724.00	54,206.00	\$ 452,403.276.00	0.00	\$ 0.00
38	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y sl (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	131.00	\$ 401,294.00	\$ 52,569.514.00	555.00	\$ 222,718.170.00	0.00	\$ 0.00
39	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319.00	\$ 16,465,950.00	490.00	\$ 161,366.310.00	0.00	\$ 0.00
40	7P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	20.00	\$ 508,285.00	\$ 10,165.700.00	4.00	\$ 2,033.140.00	0.00	\$ 0.00
41	8P	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retrorreflectiva de SI-05 Y SI-06	m²	122.00	\$ 561,506.00	\$ 68,503.732.00	122.00	\$ 68,503,732.00	0.00	\$ 0.00
42	720.1	720-13	0	Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754.00	\$ 8,831.636.00	34.00	\$ 8,831.636.00	0.00	\$ 0.00
43	730.1	730-13	0	Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280.000.00	\$ 834.400.000.00	2,767.12	\$ 774,794.800.00	0.00	\$ 0.00
44	730.2	730-13	0	Sección final	u	10.00	\$ 103,189.00	\$ 1,031,890.00	10.00	\$ 1,031,890.00	0.00	\$ 0.00
45	740.1	740-13	0	Captafaros	u	596.00	\$ 9,671.00	\$ 5,763.916.00	1,500.00	\$ 14,506.500.00	0.00	\$ 0.00

Firma: 
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR

SOPORTE DE ACTA

MEMORIA CANTIDADES DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

TRAMO: RUTA 7803

HORARIO: 7:00 a. m. 5:00 a. m.

FECHA: 26-04-2025 - 25-05-2025

LLUVIAS:


INICIO: 5+038

FIN: 6+943

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]			ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 39								
2	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+042.2	6+052.4	10.2	3.1			31.6	Parqueo de pavimento
3	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+042.2	6+052.4	10.2	1			10.2	Parqueo de pavimento
4	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+059.4	6+064.0	4.6	3.55			16.3	Parqueo de pavimento
5	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+097.4	6+100.0	2.6	2.32			6.0	Parqueo de pavimento
6	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+164.7	6+174.0	9.3	3.5			32.6	Parqueo de pavimento
7	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+190.0	6+224.7	34.7	3.5			121.5	Parqueo de pavimento
8	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+233.5	6+266.5	33	3			99.0	Parqueo de pavimento
9	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+271.1	6+299.3	28.2	3.5			98.7	Parqueo de pavimento
10	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+313.1	6+330.6	17.5	3.5			61.3	Parqueo de pavimento parcial falta 13m
11	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+330.6	6+343.6	13	3.5			45.5	Se finaliza parqueo de pavimento
12	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+123.2	6+175.5	52.3	3.4			177.8	Parqueo de pavimento
13	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+175.5	6+295.5	120	3.3			396.0	Parqueo de pavimento
14	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+343.6	6+353.1	9.5	3.5			33.3	Parqueo de pavimento
15	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+374.1	6+394.6	20.5	3.5			71.8	Parqueo de pavimento
16	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+295.5	6+393.5	98	3.65			357.7	Parqueo de pavimento
17	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+427.5	6+478.0	50.5	3.42			172.7	Parqueo de pavimento
18	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	5+037.5	5+090.8	53.3	4.5			239.9	Parqueo de pavimento
19	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	5+090.8	5+131.0	40.2	4.8			193.0	Parqueo de pavimento
20	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	5+051.5	5+089.0	37.5	4.2			157.5	Parqueo de pavimento
21	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+427.5	6+478.0	50.5	3.5			176.8	Parqueo de pavimento
22	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+493.0	6+514.4	21.4	3.5			74.9	Parqueo de pavimento
23	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+493.0	6+539.0	46	3.42			157.3	Parqueo de pavimento
24	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+578.0	6+593.6	15.6	3.9			60.8	Parqueo de pavimento
25	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+593.6	6+632.4	38.8	3.45			133.9	Parqueo de pavimento
26	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+708.0	6+733.0	25	3.45			86.3	Parqueo de pavimento
27	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+857.0	6+863.0	6	3.1			18.6	Parqueo de pavimento
28	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+525.8	6+539.1	13.3	3.47			46.2	Parqueo de pavimento
29	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+578.0	6+622.7	44.7	3.41			152.4	Parqueo de pavimento
30	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+708.0	6+718.0	10	3.4			34.0	Parqueo de pavimento
31	Imprimación CRR-1 Eje ruta 7803	6+759.0	6+766.0	7	1.00			7.0	Parqueo de pavimento
32	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+771.0	6+773.1	2.1	1.88			3.9	Parqueo de pavimento
33	Imprimación CRR-1 Eje ruta 7803	6+789.0	6+795.0	6	1.00			6.0	Parqueo de pavimento
34	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+801.2	6+805.4	4.2	3.82			16.0	Parqueo de pavimento
35	Imprimación CRR-1 Izquierda ruta 7803	6+857.0	6+942.8	85.8	3.50			300.3	Parqueo de pavimento
36	Imprimación CRR-1 Derecha ruta 7803	6+863.0	6+942.8	79.8	3.6			287.3	Parqueo de pavimento
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
TOTAL EJECUTADO								3,884.1	

Acumulado Acta parcial de obra 37	300,703.1
Facturado Actas Anteriores	300,703.1
Valor Presente Acta	3,884.1
Valor Acumulado Presente Acta	304,587.2


Firma:
Nombre: Aguilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR


Firma:
Nombre: JOSÉ LUIS USUGA GÓMEZ
Ingeniero Director de Interventoría
Matrícula No.: 08202-55362 ATL

FORMATO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS
F08-T V:0



FECHA: 26-04-2025 - 25-05-2025			
TRAMO: RUTA 7803			
MEMORIA CANTIDADES DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA			
	INICIO	5+037.5	FIN
			6+942.8

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO



Imagen 1: Parqueo de pavimento ruta 7803 Margen Izquierda PR05+319.5 - PR05+438.5



Imagen 2: Parqueo de pavimento ruta 7803 Margen Derecha PR06+123.2 - PR06+175.5



Imagen 3: Parqueo de pavimento ruta 7803 Margen Derecha PR06+295.5 - PR06+393.5



Imagen 4: Parqueo de pavimento Ruta 7803 margen Derecha PR05+090.8 - PR05+131



Imagen 5: Parqueo de pavimento Ruta 7803 margen Izquierda PR06+427.7 - PR06+478



Imagen 6: Parqueo de pavimento Ruta 7803 margen Izquierda PR06+857 - PR06+942.8

Firma:

Nombre: Arquinio Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matricula No.: 22202-210255COR


Firma

Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Ingeniero Director de Interventoria
Matricula No. 08202-35362 ATL

SOPORTE DE ACTA		MEMORIA CANTIDADES DE MEZCLA MDC-19							
TRAMO: RUTA 7803		HORARIO:		7:00 a. m.		5:00 a. m.			
FECHA: 26-04-2025 -25-05-2025		LLUVIAS:		INICIO:		5+038		FIN: 6+943	
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]	Espesor [m]		VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 39								
2	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+042.2	6+052.4	10.2	3.1	0.100		3.2	Parqueo de pavimento
3	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+042.2	6+052.4	10.2	1	0.100		1.0	Parqueo de pavimento
4	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+059.4	6+064.0	4.6	3.55	0.100		1.6	Parqueo de pavimento
5	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+097.4	6+100.0	2.6	2.32	0.100		0.6	Parqueo de pavimento
6	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+164.7	6+174.0	9.3	3.5	0.095		3.1	Parqueo de pavimento
7	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+190.0	6+224.7	34.7	3.5	0.113		13.7	Parqueo de pavimento
8	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+233.5	6+266.5	33	3	0.123		12.2	Parqueo de pavimento
9	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+271.1	6+299.3	28.2	3.5	0.100		9.9	Parqueo de pavimento
10	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+313.1	6+330.6	17.5	3.5	0.10		5.8	Parqueo de pavimento parcial falta 13m
11	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+330.6	6+343.6	13	3.5	0.10		4.3	Se finaliza parqueo de pavimento
12	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+123.2	6+175.5	52.3	3.4	0.10		18.3	Parqueo de pavimento
13	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+175.5	6+295.5	120	3.3	0.10		37.6	Parqueo de pavimento
14	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+343.6	6+353.1	9.5	3.5	0.10		3.2	Parqueo de pavimento
15	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+374.1	6+394.6	20.5	3.5	0.10		6.8	Parqueo de pavimento
16	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+295.5	6+393.5	98	3.65	0.10		34.0	Parqueo de pavimento
17	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+427.5	6+478.0	50.5	3.42	0.09		15.5	Parqueo de pavimento
18	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	5+037.5	5+090.8	53.3	4.5	0.08		19.7	Parqueo de pavimento
19	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	5+090.8	5+131.0	40.2	4.8	0.08		15.4	Parqueo de pavimento
20	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	5+051.5	5+089.0	37.5	4.2	0.09		13.4	Parqueo de pavimento
21	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+427.5	6+478.0	50.5	3.5	0.10		17.7	Parqueo de pavimento
22	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+493.0	6+514.4	21.4	3.5	0.09		6.7	Parqueo de pavimento
23	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+493.0	6+539.0	46	3.42	0.11		17.3	Parqueo de pavimento
24	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+578.0	6+593.6	15.6	3.9	0.13		8.0	Parqueo de pavimento
25	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+593.6	6+632.4	38.8	3.45	0.10		13.0	Parqueo de pavimento
26	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+708.0	6+733.0	25	3.45	0.10		8.2	Parqueo de pavimento
27	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+857.0	6+863.0	6	3.1	0.10		1.9	Parqueo de pavimento
28	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+525.8	6+539.1	13.3	3.47	0.09		4.2	Parqueo de pavimento
29	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+578.0	6+622.7	44.7	3.41	0.12		17.5	Parqueo de pavimento
30	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+708.0	6+718.0	10	3.4	0.08		2.7	Parqueo de pavimento
31	Mezcla mdc-19 margen Eje ruta 7803	6+759.0	6+766.0	7	1.00	0.09		0.6	Parqueo de pavimento
32	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+771.0	6+773.1	2.1	1.88	0.09		0.4	Parqueo de pavimento
33	Mezcla mdc-19 margen Eje ruta 7803	6+789.0	6+795.0	6	1.00	0.09		0.5	Parqueo de pavimento
34	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+801.2	6+805.4	4.2	3.82	0.092		1.5	Parqueo de pavimento
35	Mezcla mdc-19 margen Izquierda ruta 7803	6+857.0	6+942.8	85.8	3.50	0.102		30.6	Parqueo de pavimento
36	Mezcla mdc-19 margen Derecha ruta 7803	6+863.0	6+942.8	79.8	3.6	0.09		25.9	Parqueo de pavimento
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
							TOTAL EJECUTADO	376.0	

Acumulado Acta parcial de obra 38	25,786.0
Facturado Actas Anteriores	25,786.0
Valor Presente Acta	376.0
Valor acumulado presente acta	26,162.0

Firma: 
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matricula No.: 72203-710255COR

Firma: 
Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Ingeniero Director de Interventoria
Matricula No. 08202-85368 ATL

FORMATO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS
F08-T V:0



FECHA: 26-04-2025 -25-05-2025	
TRAMO: RUTA 7803	
MEMORIA CANTIDADES DE MEZCLA MDC-19	
INICIO	5+037.5
FIN	6+942.8

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO



Imagen 1: Parqueo de pavimento ruta 7803 Margen Izquierda PRO5+319.5 - PRO5+438.5



Imagen 2: Parqueo de pavimento ruta 7803 Margen Derecha PRO6+123.2 - PRO6+175.5



Imagen 3: Parqueo de pavimento ruta 7803 Margen Derecha PRO6+295.5 - PRO6+393.5



Imagen 4: Parqueo de pavimento Ruta 7803 margen Derecha PRO5+090.8 - PRO5+131



Imagen 5: Parqueo de pavimento Ruta 7803 margen Izquierda PRO6+427.7 - PRO6+478



Imagen 6: Parqueo de pavimento Ruta 7803 margen Derecha PRO6+863 - PRO6+942.8

Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-210255COR

Firma:
Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Ingeniero Director de Interventoria
Matrícula No. 08202-85362 ATL

MEMORIA CANTIDADES DE FRESADO									
SOPORTE DE ACTA									
TRAMO: RUTA 7803		HORARIO:		7:00 a. m. 5:00 a. m.					
FECHA: 26-04-2025 - 25-05-2025		LLUVIAS:		INICIO:		5+038		FIN: 6+943	
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
N°	ACTIVIDAD	PR INICIO	PR FIN	Longitud [m]	Ancho [m]	Espesor [m]		VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
1	ACTA PARCIAL DE OBRA 39								
2	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+042.2	6+052.4	10.2	1	0.10		1.0	Parqueo de pavimento, primera capa
3	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+059.4	6+064.0	4.6	3.55	0.10		1.6	Parqueo de pavimento, primera capa
4	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+097.4	6+100.0	2.6	2.3	0.10		0.6	Parqueo de pavimento, primera capa
5	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+164.7	6+174.0	9.3	3.5	0.10		3.1	Parqueo de pavimento, primera capa
6	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+190.0	6+224.7	34.7	3.5	0.11		13.7	Parqueo de pavimento, primera capa
7	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+233.5	6+266.5	33.0	3	0.12		12.2	Parqueo de pavimento
8	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+271.1	6+299.3	28.2	3.5	0.10		9.9	Parqueo de pavimento
9	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+313.1	6+343.6	30.5	3.5	0.10		10.1	Parqueo de pavimento
10	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+123.2	6+175.5	52.3	3.4	0.10		18.3	Parqueo de pavimento
11	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+175.5	6+295.5	120	3.3	0.095		37.6	Parqueo de pavimento
12	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+343.6	6+353.1	9.5	3.5	0.095		3.2	Parqueo de pavimento
13	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+374.1	6+394.6	20.5	3.5	0.095		6.8	Parqueo de pavimento
14	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+295.5	6+393.5	98	3.65	0.095		34.0	Parqueo de pavimento
15	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+427.5	6+478.0	50.5	3.42	0.09		15.5	Parqueo de pavimento
16	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	5+037.5	5+090.8	53.3	4.5	0.082		19.7	Parqueo de pavimento
17	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	5+090.8	5+131.0	40.2	4.8	0.08		15.4	Parqueo de pavimento
18	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	5+051.5	5+089.0	37.5	4.2	0.085		13.4	Parqueo de pavimento
19	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+427.5	6+478.0	50.5	3.5	0.1		17.7	Parqueo de pavimento
20	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+493.0	6+514.4	21.4	3.5	0.09		6.7	Parqueo de pavimento
21	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+493.0	6+539.0	46	3.42	0.11		17.3	Parqueo de pavimento
22	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+578.0	6+593.6	15.6	3.9	0.132		8.0	Parqueo de pavimento
23	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+593.6	6+632.4	38.8	3.45	0.097		13.0	Parqueo de pavimento
24	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+708.0	6+733.0	25	3.45	0.095		8.2	Parqueo de pavimento
25	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta 7803	6+857.0	6+863.0	6	3.1	0.1		1.9	Parqueo de pavimento
26	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+525.8	6+539.1	13.3	3.47	0.09		4.2	Parqueo de pavimento
27	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+578.0	6+622.7	44.7	3.41	0.115		17.5	Parqueo de pavimento
28	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta 7803	6+708.0	6+718.0	10	3.4	0.08		2.7	Parqueo de pavimento
29	Fresado de pavimento Margen Eje Ruta	6+759.0	6+766.0	7	1	0.09		0.6	Parqueo de pavimento
30	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta	6+771.0	6+773.1	2.1	1.88	0.09		0.4	Parqueo de pavimento
31	Fresado de pavimento Margen Eje Ruta	6+789.0	6+795.0	6	1	0.09		0.5	Parqueo de pavimento
32	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta	6+801.2	6+805.4	4.2	3.82	0.092		1.5	Parqueo de pavimento
33	Fresado de pavimento Margen Izquierda Ruta	6+857.0	6+942.8	85.8	3.5	0.102		30.6	Parqueo de pavimento
34	Fresado de pavimento Margen Derecha Ruta	6+863.0	6+942.8	79.8	3.6	0.09		25.9	Parqueo de pavimento
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
TOTAL EJECUTADO								372.8	
Viene de Acumulados acta parcial de obra 38								21,002.0	
Facturado Actas Anteriores								21,002.0	
Valor Presente Acta								372.8	
Acumulado presente acta								21,374.8	

Firma:
Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara
Ingeniero Residente de Obra
Matricula No.: 22.022-210/551-COR

Firma:
Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Ingeniero Director de Interventoria
Matricula No. 08.022-15162-AJ

FORMATO
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS EJECUTADAS PROYECTOS
F08-T V:0



FECHA: 26-04-2025 - 25-05-2025

TRAMO: RUTA 7803

MEMORIA CANTIDADES DE FRESADO

INICIO

5+037.5

FIN

6+942.8

ASPECTOS RELEVANTES EN CAMPO



Imagen 1: Fresado de pavimento ruta 7803 margen Izquierda PR6+190 - PR06+224.7



Imagen 2: Fresado de pavimento ruta 7803 margen Derecha PR06+123.2 - PR06+175.5



Imagen 3: Fresado de pavimento ruta 7803 margen Derecha PR06+295.5 - PR06+393.5



Imagen 4: Fresado de pavimento ruta 7803 margen Derecha PR05+037.5 - PR05+090.8



Imagen 5: Fresado de pavimento ruta 7803 margen Izquierda PR06+427.5 - PR06+478



Imagen 6: Fresado de pavimento ruta 7803 margen Izquierda PR06+857 - PR06+942.8

Firma:

Nombre: Aquilino Jose Perez Vergara

Ingeniero Residente de Obra


Matricula No.: 22202-210255COR

Firma:


Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ

Ingeniero Director de Interventoria

Matricula No. 08202-35562 ATL

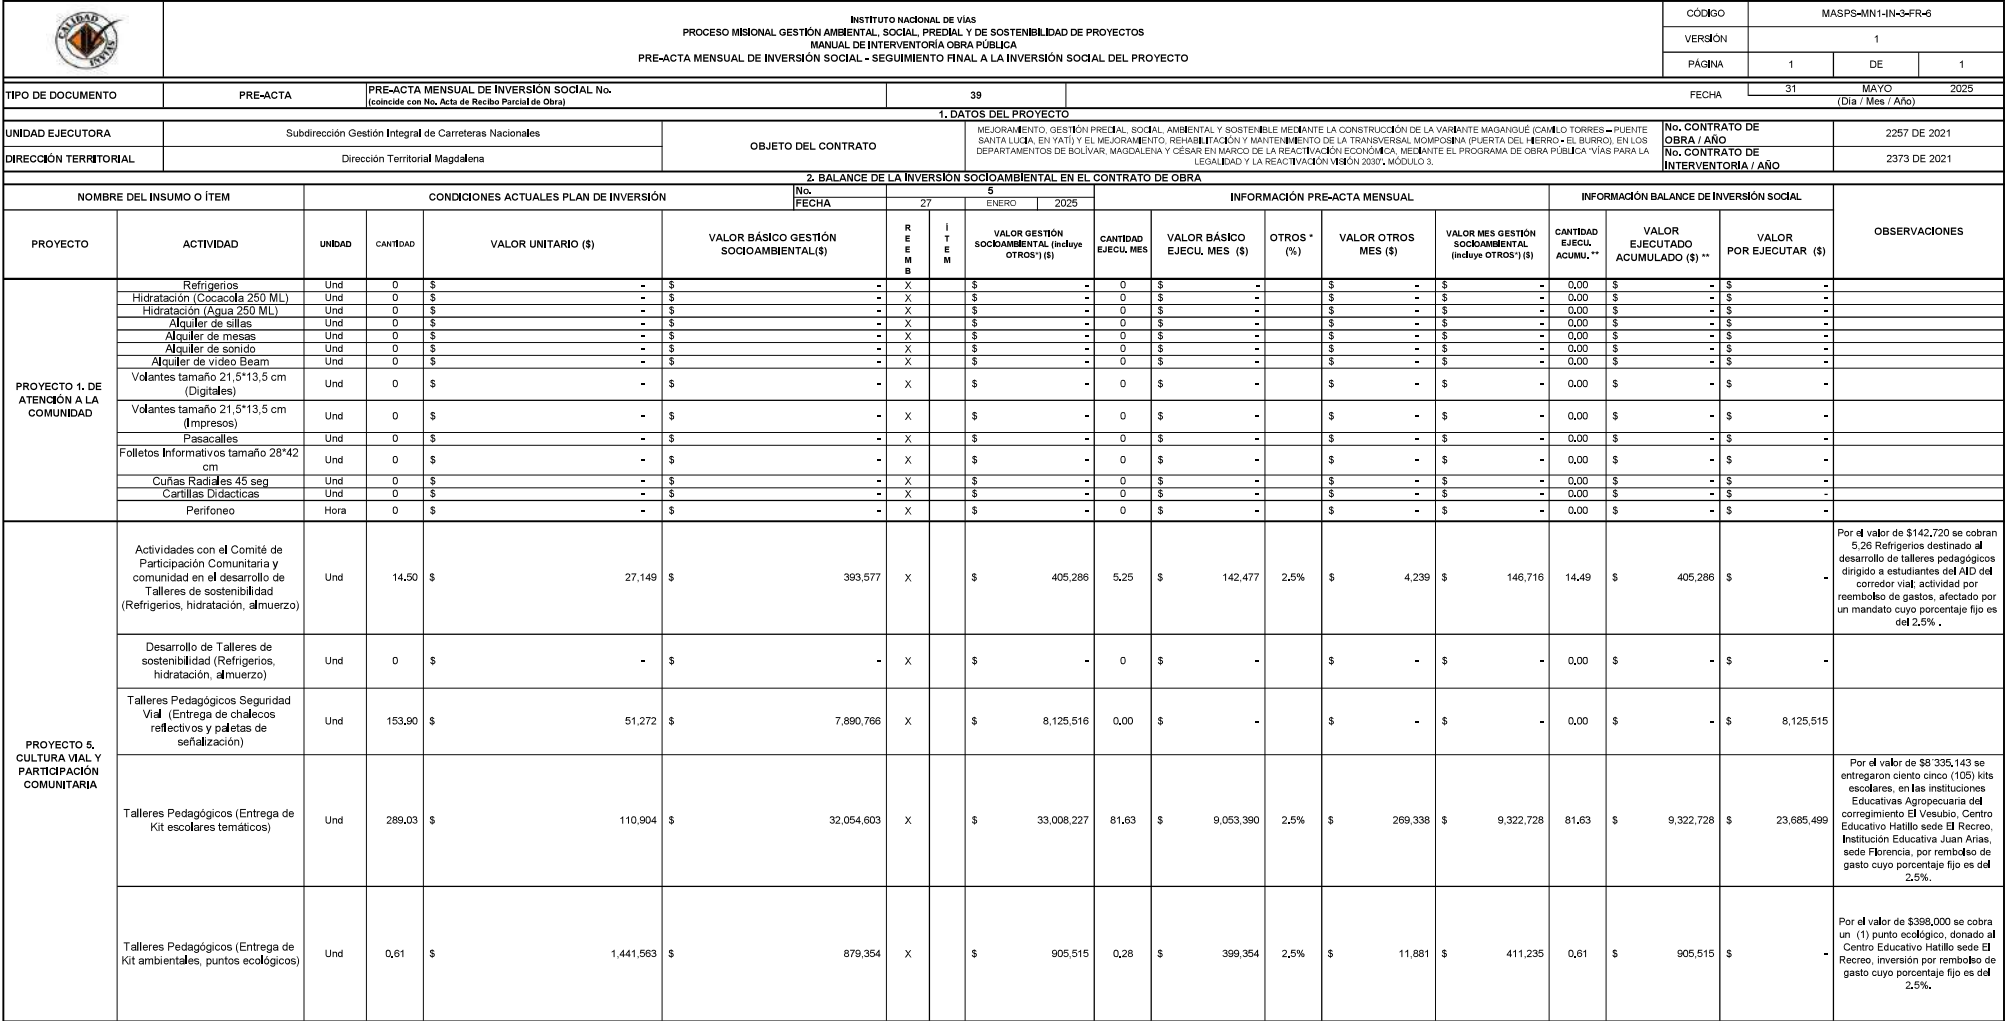

[illegible]

4. RESUMEN									
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	1,000,126,707	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	\$	-		
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	\$	1,000,126,707	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	\$	25,003,167		
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	4,750,602	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	\$	1,029,880,476		
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	\$	1,029,880,476	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	\$	-		
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	1,571,961,558	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$	1,030,633,326		
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	2,002,594,884	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		39,60%		
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES									
La interventoría da concepto de aprobación al cobro de la Pre Acta social N°39, por un valor de \$1.029.880.476, correspondiente al 39,60% del presupuesto de la gestión social asignado por plan de inversión versión cinco; dicho monto justificado en el suministro de refrigerios destinados a Talleres pedagógicos, entrega de kits escolares a instituciones educativas del AID, la donación de un Punto Ecológico a una de las Instituciones ubicadas en la ruta 7802 y en el marco del proceso de Consulta previa se reconoce el pago de la asesoría Técnica asociado a la fase de aprestamiento para B2G Consultores SAS, con el Concejo Comunitario de Comunidades Negras (CCCN) SUTO A TA MUNA AGUANDA y CCCN CHEVALE, adicional a esto se reconoció el pago a los Consejos Comunitarios por la culminación de la ruta metrológica y el desarrollo de la reunión de conciliación de impactos y formulación de medidas de manejo con el CCCN SUTO A TA MONA AGUANDA.									
6. FIRMAS									
Firma:  Nombre: Romulo Jimenez Hidalgo Representante Legal Contratista CE: 409,802		Firma:  Nombre: Marisabel Tovar Sierra Profesional Social Contratista Matricula Profesional No.: 289441122-1		Firma:  Nombre: Ing. Lugo Asato Rodriguez Mayado Representante Legal Interventoria Matricula Profesional No.:		Firma:  Nombre: Johana P. Lastra Gonzalez Profesional Social Interventoria Matricula Profesional No.:			
☐ Apoderado		☐ Apoderado		☐ Apoderado		☐ Apoderado			
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social Vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.									
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.									



Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-034464

Fecha: 2025-05-27 10:13:01

SEÑOR(A):

JOSE LUIS USUGA GOMEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

CALLE 79B No 42E-239 APTO 703 BARRIO CIUDAD JARDIN

c.reactivacioncaribe@gmail.com

BARRANQUILLA, ATLANTICO

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-054480-Pre-acta social No.39 mayo 2025. CO 2257-2021 CI 2373-2021. Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 3.

Respetado Ingeniero Úsuga.

En cumplimiento de las responsabilidades establecidas para la interventoría y conforme a lo estipulado en el Manual de Interventoría, el Consorcio Reactivación Caribe, mediante el radicado N.º 2025E-VUVRAZ-054480 del 22 de mayo de 2025 y a través de la comunicación interna N.º 184-1-2014, remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el formato de **Pre-Acta Mensual de Inversión Social (MASPS-MN1-IN-3-FR-6)**, fecha 31 de mayo de 2025 correspondiente al **CO-2257-2021, CI2373-2021** "Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental y sostenible mediante la construcción de la variante Magangué (camilo torres - puente santo lucia, en Yatí) y el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la transversal Momposina (puerta del hierro - el burro), en los departamentos de Bolívar, Magdalena y César en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3.

La interventoría revisó y aprobó debidamente el documento enviado. Posteriormente, esta Subdirección realizó la evaluación documental de la **Pre-Acta Mensual de Inversión Social N.º 39**, correspondiente al mes de mayo de 2025, por un valor de **\$1.029.880.476**. Tras esta revisión, se concluye que **no hay objeción** al contenido presentado, por lo cual se remite copia del documento a la Unidad Ejecutora para los fines pertinentes y la continuación del trámite según sus competencias.

Es importante resaltar que, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente, los valores y cantidades consignados en el formato **Pre-Acta Mensual de Inversión Social (MASPS-MN1-IN-3-FR-6)**, son **responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra**, quien los valida mediante la firma del documento. Asimismo, el Interventor **revisó, verificó, certificó y aprobó** las actividades sociales ejecutadas por el contratista.

Las anteriores observaciones se emiten en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Subdirección y sus gestores, conforme al Manual de Interventoría, el Manual de Contratación y demás disposiciones

vigentes, sin perjuicio de las acciones que puedan ser requeridas por parte de la supervisión del Interventor o el Contratista en el marco de sus respectivas competencias.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: YENNY ALEXANDRA OLARTE ROJAS
Revisado por: HILDUARA MILENA BARRERA - COORDINADORA AREA SOCIAL
Aprobado por:

Copia Interna a: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (1000016), CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (1120200)
Copia Externa a:



				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA										MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																				
														1																																				
														FECHA:																																				
														31/05/2025 (Día / Mes / Año)																																				
UNIDAD EJECUTORA:				SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL:						MAGDALENA																														
CONTRATO DE OBRA No:				2257 DE 2021										CONTRATISTA:				CONSORCIO BMC																																
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:				mayo-2025										PROYECTO:				CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:				2373 de 2021										INTERVENTOR:				CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE																																
NOMBRE ARL:				AXA COLPATRIA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:				COMFENALCO																																
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																		
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
54	Victor Antonio Barreto Huertas	92.070.337	Operador	\$ 1.600.000	X			X	X	X	X	X																					SUELOS INGENIERIA	\$ 1.600.000	\$ 111.400	V	NUEVA EPS	33384637	\$ 64.000	COLPENSIONES	33384637	\$ 256.000	\$ 64.000	0	0	RETIRO 10/05/2025				
55	Dailyn Antonio Thomas Lopez	1.042.439.604	Operador	\$ 1.500.000	X			X	X	X	X	X																					SUELOS INGENIERIA	\$ 1.500.000	\$ 104.400	V	SALUD TOTAL	33384637	\$ 60.000	PORVENIR	33384637	\$ 240.000	\$ 60.000	0	0	RETIRO 10/05/2025				
56	Oscar David Martinez Ortega	1.064.722.025	Ingeniero Residente	\$ 1.423.500	X			X	X																								AYG - ARCA	\$ 1.523.500	\$ 106.100	V	NUEVA EPS	77760745	\$ 190.500	PORVENIR	77760745	\$ 243.800	\$ 61.000	0	0	RETIRO 06/05/20225				
57	Hamed Mejia Chica	77.101.913	Oficial	\$ 1.423.500					X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X												AYG - ARCA	\$ 1.717.484	\$ 119.600	V	COOSALUD	7670749327	\$ 68.700	PORVENIR	7670749327	\$ 274.800	\$ 68.700	0	0					
58	Jorge Andres Carrascal Perez	1.069.468.639	Ingeniero Residente	\$ 2.600.000					X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X												AYG - ARCA	\$ 2.600.000	\$ 181.000	V	SANITAS	77760745	\$ 325.000	COLPENSIONES	77760745	\$ 416.000	\$ 104.000	0	0					
Firma: Firma:																																																		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial. Nombre: ING. ANGE MARIA CRISTINA MARTINEZ Director de Obra Matrícula Profesional No. 68202-55889 STD Nombre: JOSE LUIS USUGUA GOMEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 05202-35367 ATL																																																		

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE
Con NIT 901553549-2

Actuando en calidad de Interventor designado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS para el Contrato de Obra N° 2257 de 2021, cuyo objeto es:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

Certifica que durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de mayo de 2025, esta Interventoría ha revisado la documentación presentada por el Consorcio BMC referente al pago de aportes de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y los aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) correspondientes al personal directa e indirectamente vinculado a la ejecución del Contrato de Obra N° 2257 de 2021, evidenciando el cumplimiento y estar al día con la totalidad de sus obligaciones.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Barranquilla, a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2025.


LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
C.C. No. 8.739.219 de Barranquilla
