

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000154

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090
CR 7 C 12508
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

03/07/2025

Forma de Pago:

CREDITO A 30 DÍAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1.0000	\$557,328,016.00	\$0		\$557,328,016
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1.0000	\$111,465,604.00	\$0		\$111,465,604
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1.0000	\$27,866,401.00	\$0		\$27,866,401
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$27,866,401.00	\$5,294,616		\$33,161,017
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$129,784,418.00	-\$129,784,418

TOTALES	\$724,526,422.00	\$5,294,616	-\$129,784,418.00	\$600,036,620
---------	------------------	-------------	-------------------	---------------

Notas

24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 44 DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO ENERO 2025

jmeneses
Elaborado

mforero
Aprobado

Recibido

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		1 DE 4			
														FECHA		04/02/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No. 44		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 724 526 422.00		MES ENERO DE 2025	
														ACTA FINAL		☐	
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ -	
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 13/01/2025		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
EXP-1																	
EXPLANACIONES																	
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934.00		\$ -		\$ -		\$ -			
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00		\$ -	183.00	\$ 20 753 664.00			
2.1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		2 837.10	\$ 321 749 836.80	12.00	\$ 1 360 896.00	2 440.0	\$ 276 715 520.00			
2.2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		491.00	\$ 55 683 328.00		\$ -	35.0	\$ 3 969 280.00			
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636	\$ 77 295 960.00	1 592.80	\$ 110 916 220.80	8.00	\$ 557 088.00	1 554.0	\$ 108 214 344.00			
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579	\$ 397 395 768.00	96.00	\$ 1 207 584.00		\$ -	96.0	\$ 1 207 584.00			
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270.00	153 183.00	\$ 1 531 064 085.00		\$ -	150 183.0	\$ 1 501 079 085.00			
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747	\$ 13 158 450.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00		\$ -	783.0	\$ 7 631 901.00			
7 (1-11601)	1	220-1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330.00	191 726.00	\$ 2 389 864 590.00	259.20	\$ 3 230 928.00	190 334.2	\$ 2 372 515 803.00			
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609	\$ 48 271 746.00	142.70	\$ 2 655 504.30		\$ -	128.0	\$ 2 381 952.00			
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521	\$ 269 229 237.00		\$ -		\$ -		\$ -			
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880.00	49 680.00	\$ 4 251 316 320.00		\$ -	44 578.0	\$ 3 814 717 772.00			
GRN-2																	
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																	
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927	\$ 603 832 968.00	618 923.00	\$ 573 741 621.00	47 870.00	\$ 44 375 490.00	594 246.0	\$ 550 866 042.00			
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000.00	28 303.00	\$ 3 336 216 125.00	-90.00	\$ (10 608 750.00)	26 170.0	\$ 3 084 788 750.00			
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900.00	47 741.00	\$ 7 938 039 293.00	157.10	\$ 26 121 488.00	43 170.3	\$ 7 178 055 292.00			
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00		\$ -	9 810.0	\$ 1 767 928 770.00			
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680.00		\$ -		\$ -		\$ -			
PAV-3																	
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00		\$ -	58 559.0	\$ 158 694 890.00			
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991	\$ 879 171 843.00	59 081.00	\$ 117 630 271.00		\$ -	59 081.0	\$ 117 630 271.00			
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00		\$ -	5 980.8	\$ 4 922 497 440.00			
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000.00	4 166.20	\$ 3 429 824 150.00		\$ -	4 166.2	\$ 3 429 824 150.00			
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676.00	423.10	\$ 367 156 448.70	4.00	\$ 3 471 108.00	292.1	\$ 253 477 662.00			
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.00	\$ 72 822	\$ 189 337 200.00	283.00	\$ 20 608 626.00		\$ -	148.0	\$ 10 777 656.00			
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894	\$ 205 124 400.00	103.00	\$ 8 126 082.00		\$ -	103.0	\$ 8 126 082.00			
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342	\$ 15 197 000.00		\$ -		\$ -		\$ -			
EYD-4																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573.00			
24.1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		60 753.00	\$ 1 984 618 251.00	822.60	\$ 26 871 874.00	58 355.2	\$ 1 906 289 318.00			
24.2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		8 000.00	\$ 261 336 000.00		\$ -	2 803.5	\$ 91 581 935.00			
24.3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		3 945.00	\$ 128 871 315.00		\$ -	3 932.1	\$ 128 449 911.00			
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832	\$ 115 845 888.00	8 739.50	\$ 391 809 264.00		\$ -	8 147.6	\$ 365 273 203.00			
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520	\$ 155 629 760.00		\$ -		\$ -		\$ -			
26.1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -			
26.2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -			
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660.00		\$ -		\$ -		\$ -			
27.1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		72.00	\$ 159 889 896.00		\$ -	32.0	\$ 71 062 176.00			
27.2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		381.60	\$ 847 416 448.80		\$ -	379.1	\$ 841 864 716.00			
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840.00		\$ -		\$ -		\$ -			
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00		\$ -	474.0	\$ 419 187 588.00			
29.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		4 563.00	\$ 4 035 343 806.00	-71.20	\$ (62 966 574.00)	3 968.8	\$ 3 509 855 906.00			
29.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		1 180.00	\$ 1 043 547 160.00	29.40	\$ 26 000 243.00	354.7	\$ 313 683 201.00			
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092.00	734.00	\$ 768 129 532.00	-21.00	\$ (21 976 458.00)	570.7	\$ 597 236 409.00			
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00	0.60	\$ 431 400.00	55.9	\$ 40 192 100.00			
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00		\$ -	126.0	\$ 63 542 556.00			
32.1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		594.00	\$ 299 557 764.00	-1.70	\$ (857 320.00)	507.7	\$ 256 036 156.00			
32.2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		85.00	\$ 42 866 010.00	2.50	\$ 1 260 765.00	12.4	\$ 6 253 394.00			
32.3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		45.00	\$ 22 693 770.00		\$ -	7.9	\$ 3 984 017.00			
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906	\$ 121 679 184.00	1 791.00	\$ 825 482 646.00	-2.00	\$ (921 812.00)	1 521.6	\$ 701 314 570.00			
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017	\$ 55 897 734.00		\$ -		\$ -		\$ -			
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 827.80		\$ -	37 305.1	\$ 200 626 828.00			
35.1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		440 000.00	\$ 2 366 320 000.00	623.90	\$ 3 355 334.00	387 180.9	\$ 2 082 258 880.00			
35.2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		160 000.00	\$ 860 480 000.00	-304.50	\$ (1 637 601.00)	31 403.5	\$ 168 888 023.00			
35.3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		134 164.00	\$ 721 533 992.00	635.30	\$ 3 416 643.00	133 382.3	\$ 717 330 009.00			
35.4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		80 000.00	\$ 430 240 000.00	1 022.40	\$ 5 498 467.00	66 581.7	\$ 358 076 383.00			
35.5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		105 000.00	\$ 564 690 000.00	2 176.10	\$ 11 703 066.00	90 982.8	\$ 489 305 498.00			
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224.00		\$ -		\$ -		\$ -			
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00		\$ -	1 909.8	\$ 22 421 052.00			
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00		\$ -	55 628.5	\$ 20 248 774.00			
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00		\$ -	55 628.5	\$ 238 423 751.00			
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037	\$ 544 029 600.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00	-23.00	\$ (15 640 851.00)	1 665.0	\$ 1 132 261 605.00			


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSION		1							
												PÁGINA		2 DE 4							
														FECHA		04/02/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No. 44		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 724 526 422.00		MES ENERO DE 2025					
														ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTI 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR INICIAL (incluido Iv \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ -			
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 13/01/2025		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621	\$ 13 857 168.00	108.00	\$ 7 195 068.00		\$ -		\$ -							
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113	\$ 114 339 000.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00	-21.20	\$ (807 996.00)	11 335.0	\$ 432 010 855.00							
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979	\$ 3 408 257 844.00		\$ -		\$ -		\$ -							
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00		\$ -	46 848.0	\$ 379 140 864.00							
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140	\$ 1 383 627 600.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00	-12.70	\$ (1 881 378.00)	26 103.2	\$ 3 866 928 048.00							
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371	\$ 910 792 740.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00	2.00	\$ 368 742.00	5 484.5	\$ 1 011 182 750.00							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																					
47 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794	\$ 340 276 950.00	130 701.00	\$ 234 477 594.00	-157.40	\$ (282 376.00)	44 130.6	\$ 79 170 296.00							
48 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987	\$ 5 098 895.00	483.40	\$ 28 997 715.80	34.00	\$ 2 039 558.00	269.0	\$ 16 136 503.00							
49 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346	\$ 216 269 898.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00	-810.00	\$ (6 760 260.00)	5 239.0	\$ 43 724 694.00							
50 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	\$ 398 008	\$ 177 511 568.00	376.00	\$ 149 651 008.00	-27.00	\$ (10 746 216.00)	164.0	\$ 65 273 312.00							
51 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033	\$ 743 681 273.00	888.00	\$ 289 517 304.00	56.00	\$ 18 257 848.00	404.0	\$ 131 717 332.00							
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373	\$ 23 494 316.00	46.00	\$ 11 747 158.00		\$ -	11.0	\$ 2 809 103.00							
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532	\$ 592 006 176.00	4 770.00	\$ 1 099 637 640.00		\$ -	3 470.0	\$ 799 946 040.00							
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00		\$ -	68.0	\$ 7 016 852.00							
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031	\$ 38 157 692.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00	432.00	\$ 9 517 392.00	2 231.0	\$ 49 151 161.00							
OBRAS VARIAS																					
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228	\$ 137 366 580.00		\$ -		\$ -		\$ -							
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00		\$ -	3 076.0	\$ 57 936 460.00							
TRANSPORTE																					
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a metros (100m)	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175	\$ 5 701 721 575.00	13 539 716.56	\$ 15 909 166 962.70	20 299.60	\$ 23 852 030.00	13 139 202.9	\$ 15 438 563 472.00							
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00		\$ -	2 832.70000	\$ 3 328 423.00							
	NP			ÍTEM NO PREVISTOS						\$ -		\$ -									
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009	\$ -	188 170.00	\$ 7 340 323 530.00	259.20	\$ 10 111 133.00	186 778.2	\$ 7 286 030 804.00							
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230	\$ -	36 542.40	\$ 31 179 071 952.00	178.50	\$ 152 301 555.00	30 537.3	\$ 28 055 340 479.00							
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00		\$ -	71.0	\$ 136 566 725.00							
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165	\$ -	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00	-67.70	\$ (620 471.00)	145 400.9	\$ 1 332 599 249.00							
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420	\$ -	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00	9.10	\$ 7 274 722.00	6 722.3	\$ 5 373 941 066.00							
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1 478	\$ -	109 000.00	\$ 161 102 000.00		\$ -	15 369.0	\$ 22 715 382.00							
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153 337	\$ -	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00	-85.10	\$ (13 048 979.00)	15 872.5	\$ 2 433 841 533.00							
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg		\$ 8 056	\$ -	5 655.00	\$ 45 556 680.00		\$ -	5 015.4	\$ 40 404 062.00							
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsi-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u		\$ 4 665 181	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00		\$ -	8.0	\$ 37 321 448.00							
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2 124 081	\$ -	74.40	\$ 158 031 626.40		\$ -	18.0	\$ 38 233 458.00							
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13 401	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.40		\$ -	51 217.4	\$ 686 364 377.00							
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251 064	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00	-15.40	\$ (3 866 386.00)	199.0	\$ 49 961 736.00							
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177 821	\$ -	433.00	\$ 76 996 493.00		\$ -	423.0	\$ 75 218 283.00							
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156	\$ -	65.00	\$ 6 575 140.00		\$ -	55.0	\$ 5 563 580.00							
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15 624	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00	1 701.00	\$ 26 576 424.00	98 087.0	\$ 1 532 511 288.00							
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533	\$ -	5 000.00	\$ 107 665 000.00		\$ -	2 592.0	\$ 55 813 536.00							
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37 179	\$ -	92 378.00	\$ 3 434 521 662.00		\$ -	78 499.0	\$ 2 918 514 321.00							
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m		\$ 13 537	\$ -	10 785.00	\$ 145 996 545.00		\$ -	843.6	\$ 11 419 813.00							
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m		\$ 7 209	\$ -	10 675.00	\$ 76 956 075.00	496.00	\$ 3 575 664.00	6 099.7	\$ 43 972 737.00							
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrán Planar - ancho 0,5 m	m		\$ 21 337	\$ -	2 720.80	\$ 58 053 709.60		\$ -	632.4	\$ 13 493 519.00							
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81 263	\$ -	333.00	\$ 27 060 579.00		\$ -	233.0	\$ 18 934 279.00							
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297 167	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00		\$ -	2 080.0	\$ 618 107 360.00							
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2 731 282	\$ -	91.80	\$ 250 731 687.60		\$ -	91.8	\$ 250 731 688.00							
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		\$ 42 370	\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00		\$ -	4 957.0	\$ 210 028 090.00							
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 124 988	\$ -	4.00	\$ 499 952.00		\$ -		\$ -							
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 194 455	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00		\$ -	8.0	\$ 1 555 640.00							
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 974 124	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00		\$ -		\$ -							
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 1 727 076	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00		\$ -	12.0	\$ 20 724 912.00							
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68 446	\$ -	1 602.00	\$ 109 650 492.00		\$ -	914.0	\$ 62 559 644.00							
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50 750	\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00		\$ -	225.0	\$ 11 418 750.00							
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u		\$ 5 153 478	\$ -	72.00	\$ 371 050 416.00		\$ -	51.0	\$ 262 827 378.00							
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$ 110 223	\$ -	280.00	\$ 30 862 440.00	32.00	\$ 3 527 136.00	156.0	\$ 17 194 788.00							
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		\$ 186 708	\$ -	3 640.00	\$ 679 617 120.00	-9.00	\$ (1 680 372.00)	2 970.0	\$ 554 522 760.00							
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$ 74 897	\$ -	2 750.00	\$ 205 966 750.00		\$ -	2 663.0	\$ 199 450 711.00							
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139 817	\$ -	3 441.00	\$ 481 110 297.00		\$ -	3 330.0	\$ 465 590 610.00							
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237 003	\$ -	1 180.00	\$ 279 663 540.00		\$ -	913.0	\$ 216 383 739.00							
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 29 841	\$ -	4 019.50	\$ 119 945 899.50		\$ -	4 019.5	\$ 119 945 900.00							

Handwritten signature and initials.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1										
												VERSIÓN		1										
												PÁGINA		3 DE 4										
												FECHA		04/02/2025 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CÓRDOBA			ACTA No.		44		VALOR BÁSICO ACTA: \$		724 526 422.00		MES		ENERO DE 2025			
												ACTA FINAL		☐										
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE					VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930					VALOR ADICIONES (incluido IVA# \$ -				
															(Según contrato principal)									
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930														
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 13/01/2025		OBRA EJECUTADA													
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR										
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación).	u		\$ 24 636 607	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00		\$ -	2.0	\$ 49 273 214.00										
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)	u		\$ 1 684 913	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00		\$ -	2.0	\$ 3 369 826.00										
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/Est		\$ 1 149	\$ -	227 504.00	\$ 261 402 096.00		\$ -	218 772.0	\$ 251 369 028.00										
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones ni llenos)	m		\$ 5 378 493	\$ -	23.10	\$ 124 243 188.30		\$ -		\$ -										
101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro interior	m		\$ 1 303 788	\$ -	46.10	\$ 60 104 626.80		\$ -	33.8	\$ 44 068 034.00										
102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		\$ 286 941	\$ -	13 335.00	\$ 3 826 358 235.00	1 308.00	\$ 375 318 828.00	6 012.0	\$ 1 725 089 292.00										
103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		\$ 294 848	\$ -	2 616.00	\$ 771 322 368.00	300.00	\$ 88 454 400.00	1 000.0	\$ 294 848 000.00										
104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey	u		\$ 286 505	\$ -	16.00	\$ 4 584 080.00		\$ -	4.0	\$ 1 146 020.00										
105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		\$ 25 925	\$ -	19 167.00	\$ 496 904 475.00		\$ -	2 045.8	\$ 53 037 365.00										
AJUSTE AL PESO										\$ 4.70				\$ -										
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 145 115 522 331.00		\$ 138 423 541 186.00		\$ 724 526 422.00		\$ 120 673 700 031.00										
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 18 736 504 837.00		\$ 25 693 562 634.00		\$ -		\$ 20 623 389 087.00										
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 650 475 331.00		\$ -		\$ -		\$ -										
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 164 502 502 499.00		\$ 164 117 103 820.00		\$ 724 526 422.00		\$ 141 297 089 118.00										
* VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 1 202 133 672.00		\$ 1 199 317 297.00		\$ 5 294 616.00		\$ 1 032 555 651.00										
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)								\$ 165 704 636 171.00		\$ 165 316 421 117.00		\$ 729 821 038.00		\$ 142 329 644 769.00										
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1 150 000 000.00		\$ 1 388 218 000.00		\$ -	83%	\$ 1 149 647 954.00										
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)								\$ 218 500 000.00		\$ 263 761 420.00		\$ -		\$ 218 433 112.00										
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 1 368 500 000.00		\$ 1 651 979 420.00		\$ -		\$ 1 368 081 066.00										

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										<table><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEPI-MN1-IN-4-FR-1</td></tr><tr><td>VERSIÓN</td><td>1</td></tr><tr><td>PÁGINA</td><td>4 DE 4</td></tr></table>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	VERSIÓN	1	PÁGINA	4 DE 4																						
CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																								
VERSIÓN	1																																								
PÁGINA	4 DE 4																																								
												<table><tr><td>FECHA</td><td>04/02/2025 (Día / Mes / Año)</td></tr></table>		FECHA	04/02/2025 (Día / Mes / Año)																										
FECHA	04/02/2025 (Día / Mes / Año)																																								
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No.		44		VALOR BÁSICO ACTA: \$		724 526 422.00		MES		ENERO DE 2025																			
												ACTA FINAL		☐																											
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACT: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE										VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ -									
																						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171 472 677 930																			
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 13/01/2025				OBRA EJECUTADA																									
																PRESENTE ACTA				ACUMULADO																					
				GRAL.		PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM						UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR									
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 724 526 422																																									
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 594 742 004																																									
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 600 036 620												VALOR EN LETRAS:												SEISCIENTOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTEPESOS M/CTE																	
												(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																													
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																									
OBSERVACIONES																																									
NOTAS: A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																									
Para constancia de lo anterior firman																																									
												Firma: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: REPRESENTANTE LEGAL Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT												 Firma: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ Nombre: REPRESENTANTE LEGAL Interventor Matrícula Profesional No.: 25202-084198																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																									

ϕ

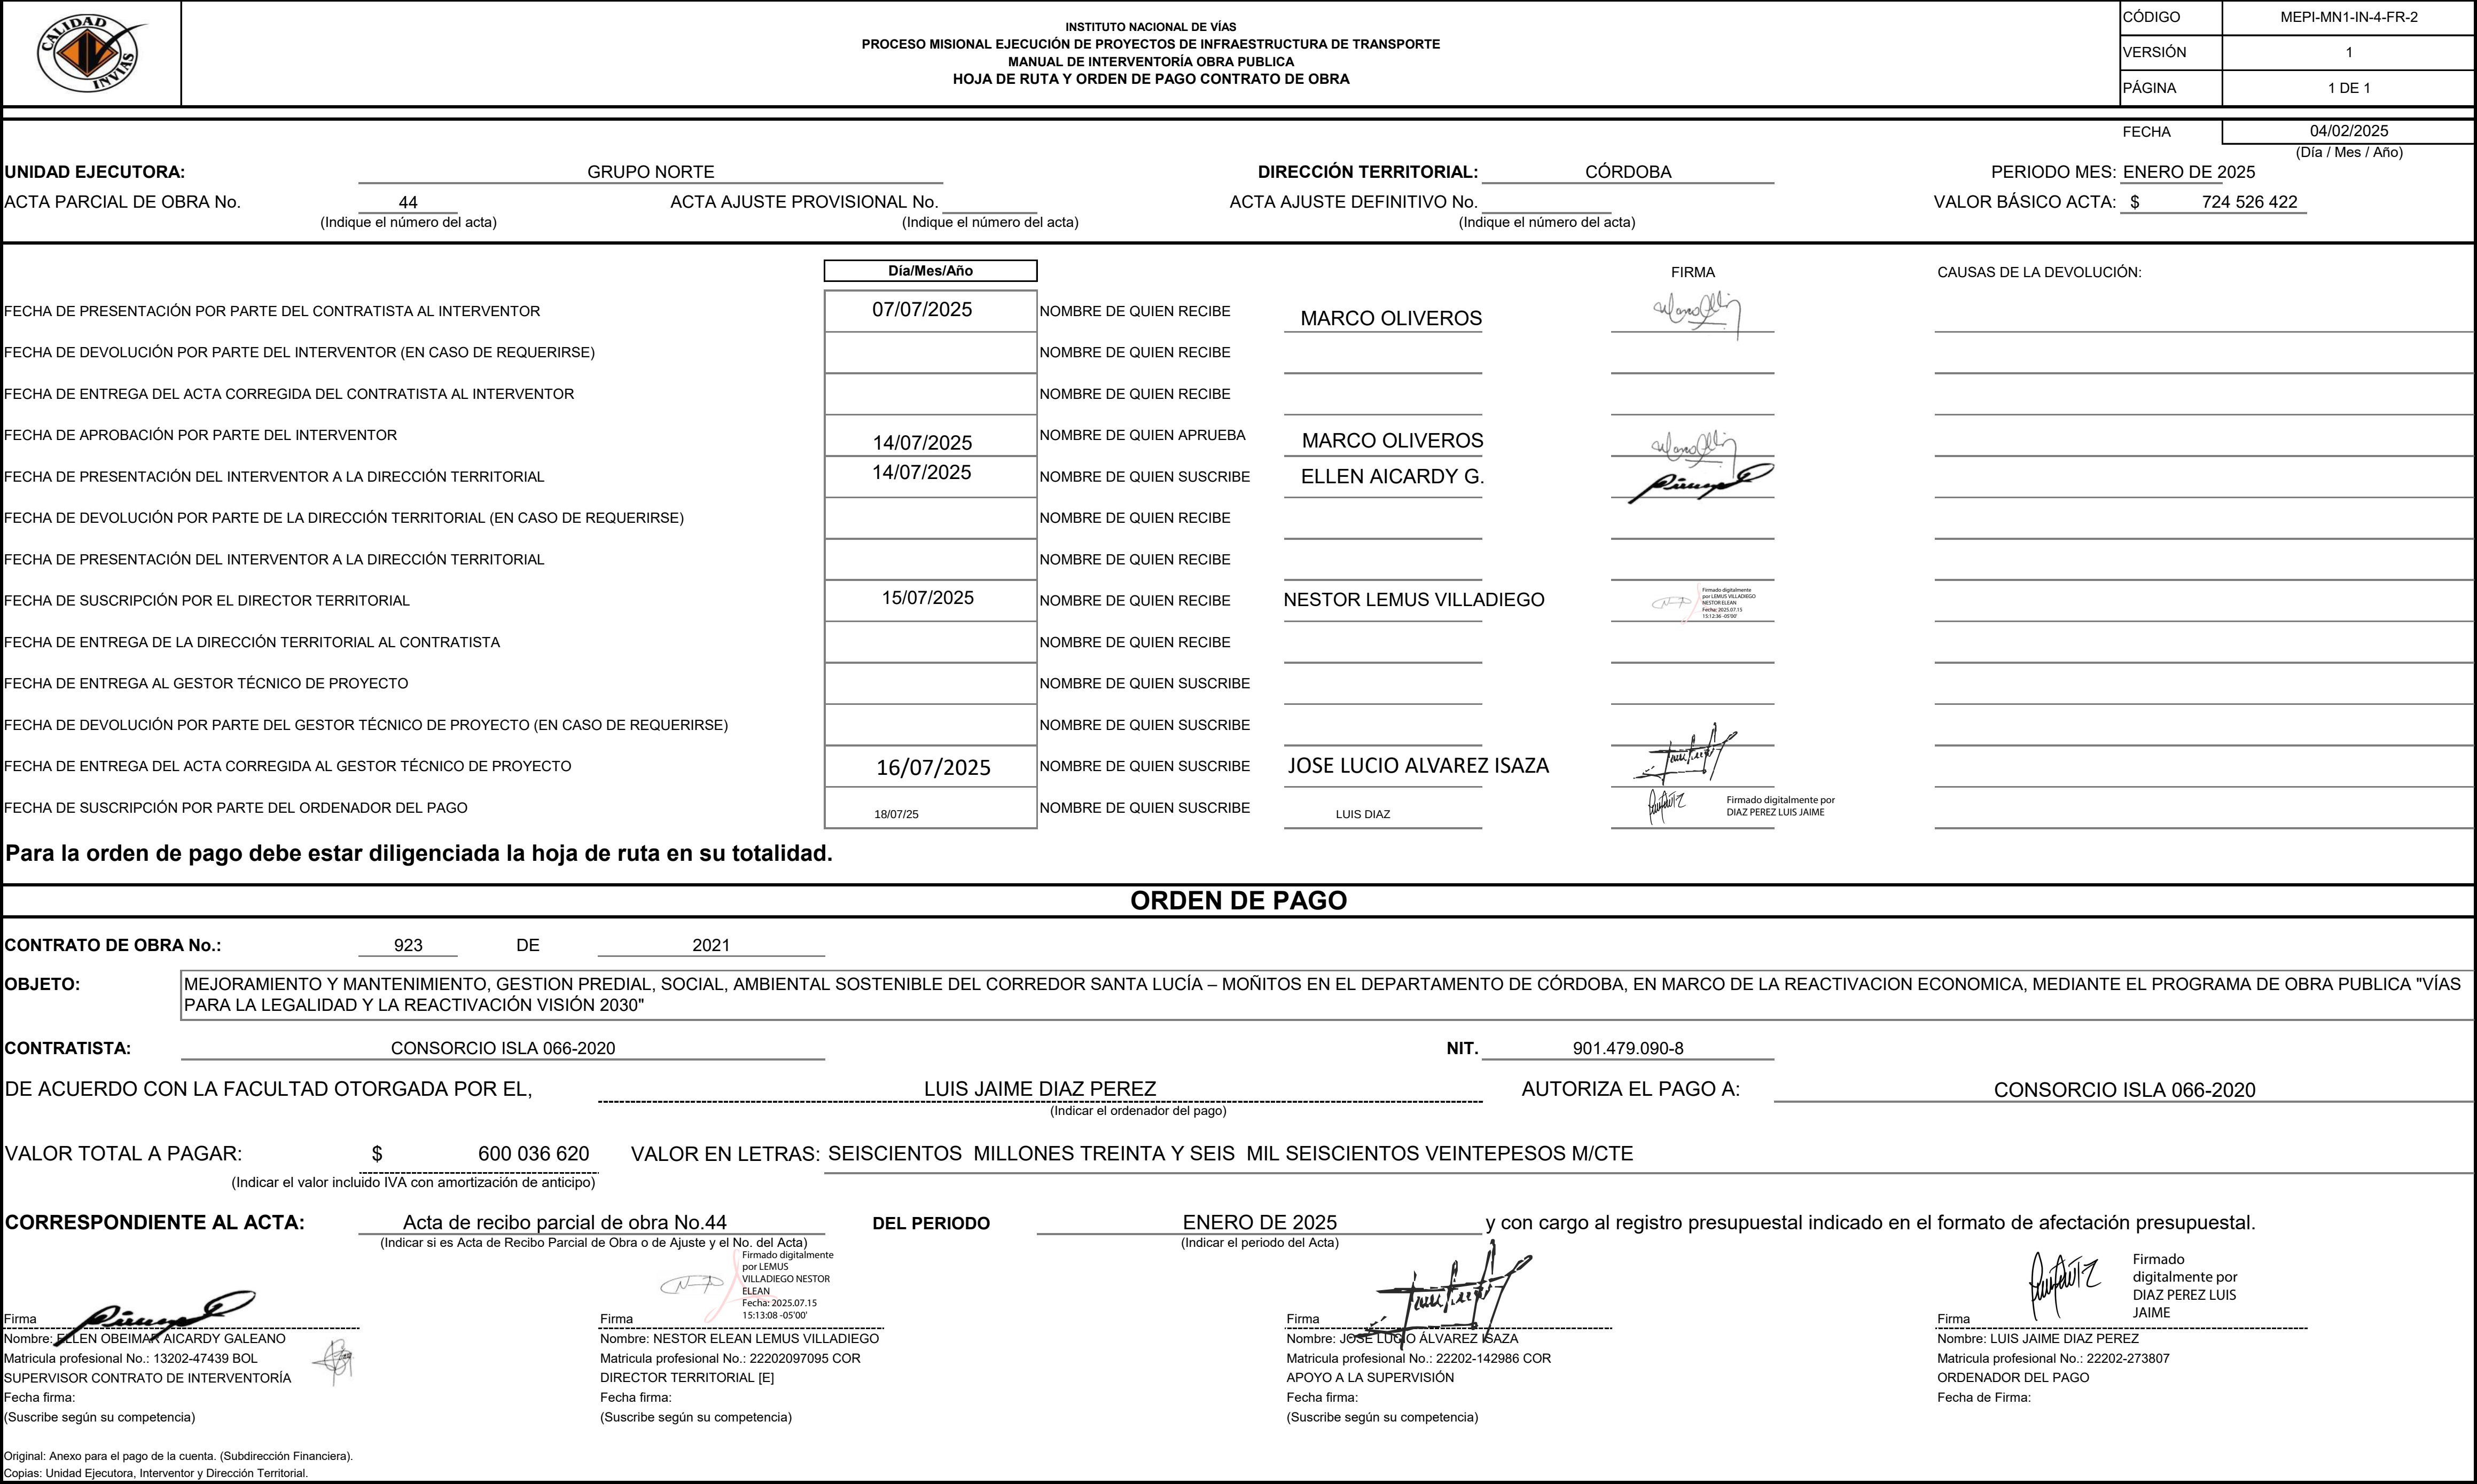

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

44

Valor basico: \$

724 526 422

Período:

ENERO DE 2025

Valor Incluido Iva: \$

729 821 038

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 729 821 038	\$ 0	\$ 0.00	\$ 729 821 038
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 729 821 038	\$ 0	\$ 0.00	\$ 729 821 038

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 105 751 068	\$ 104 983 879
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 391 767 933	\$ 388 925 783
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 232 302 037	\$ 230 616 760
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 0	\$ 0
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 729 821 038	\$ 724 526 422

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT



ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	44	ENERO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? VIATICOS ☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$600 036 620.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
				TOTAL ACTA	\$600 036 620.00

Nombre: JOSE LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 3 de Febrero de 2025

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Enero de 2025, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, febrero de 2025

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de enero de 2025 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.


Atentamente,




Marco Aurelio Oliveros García

Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141140452882			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9014790908				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO ISLA 066-2020							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 70 F 127 A 90							
42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6046040111		45. Teléfono 2 3115297695	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4210	20210412						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 714485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141140452882			
 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 2 1 8				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro						84. Nacional privado	
76. Fecha de registro						1 0 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil						85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 2 1 0 2 1 8				0 . 0 %	
81. Hasta		2 0 2 6 1 0 1 8				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141140452882			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141140452882



(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A		120. Valor capital del socio 85,786,338,965			
121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8		123. Fecha de retiro		

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido		119. Razón social ISMOCOL S.A.		120. Valor capital del socio 85,786,338,965			
121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 2 1 8		123. Fecha de retiro			

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido		119. Razón social		120. Valor capital del socio			
121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro			

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido		119. Razón social		120. Valor capital del socio			
121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro			

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido		119. Razón social		120. Valor capital del socio			
121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141140452882			
 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	FORERO		BAYONA		MONICA		YUSLIN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 2 0 6 1 8							
