

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000173

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090
CR 7 C 12508
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

12/09/2025

Forma de Pago:

CREDITO A 30 DÍAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1.0000	\$528,018,264.00	\$0		\$528,018,264
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1.0000	\$105,603,652.00	\$0		\$105,603,652
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1.0000	\$26,400,914.00	\$0		\$26,400,914
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$26,400,913.00	\$5,016,173		\$31,417,086
VS0056	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1.0000	\$0.00	\$0		\$0
VS0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.0000	\$0.00	\$0		\$0
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$74,181,814.00	-\$74,181,814

TOTALES	\$686,423,743.00	\$5,016,173	-\$74,181,814.00	\$617,258,102
---------	------------------	-------------	------------------	---------------

Notas

24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 51 DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO AGOSTO 2025

jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA					
														1 DE 4			
												FECHA		04/09/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No. 51		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 686 423 743.00		MES AGOSTO DE 2025	
ACTA FINAL																	
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTA: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
								VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
EXPLANACIONES																	
1 (1-11601)	EXP-1	1	200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934.00		\$ -		\$ -		\$ -			
2 (1)	1		201-13	Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00		\$ -	183.0	\$ 20 753 664.00			
2,1 (1-11601)	1		201-13	Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		2 837.10	\$ 321 749 837.00		\$ -	2 689.0	\$ 304 954 112.00			
2,2 (1-14101)	1		201-13	Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		935.00	\$ 106 036 480.00	347.00	\$ 39 352 576.00	550.0	\$ 62 374 400.00			
3 (1-11601)	1		201.13	Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636	\$ 77 295 960.00	1 612.80	\$ 112 308 941.00		\$ -	1 612.0	\$ 112 253 232.00			
4 (1-11601)	1		210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579	\$ 397 395 768.00	96.00	\$ 1 207 584.00		\$ -	96.0	\$ 1 207 584.00			
5 (1-11601)	1		210-13	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270.00	156 360.30	\$ 1 562 821 199.00		\$ -	154 172.0	\$ 1 540 949 140.00			
6 (1-11601)	1		211-13	Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747	\$ 13 158 450.00	1 350.00	\$ 13 158 450.00		\$ -	783.0	\$ 7 631 901.00			
7 (1-11601)	1		220.1-13	Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330.00	193 191.70	\$ 2 408 134 541.00		\$ -	192 337.2	\$ 2 397 483 198.00			
8 (1-11601)	1		221-13	Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609	\$ 48 271 746.00	142.70	\$ 2 655 504.00		\$ -	128.0	\$ 2 381 952.00			
9 (1-11601)	1		231-13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521	\$ 269 229 237.00		\$ -		\$ -		\$ -			
10 (1-11601)	1		236-13	Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880.00	50 673.40	\$ 4 336 325 532.00		\$ -	44 965.0	\$ 3 847 834 910.00			
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES																	
11 (2-11602)	GRN-2	2	310-13	Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927	\$ 603 832 968.00	708 088.99	\$ 656 398 494.00	1 496.00	\$ 1 386 792.00	605 558.0	\$ 561 352 266.00			
12 (2-11602)	2		311-13	Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000.00	28 303.00	\$ 3 336 216 125.00		\$ -	27 166.0	\$ 3 202 192 250.00			
13 (2-11602)	2		320-13	Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900.00	46 112.30	\$ 7 667 230 458.00		\$ -	43 392.9	\$ 7 215 067 662.00			
14 (2-11602)	2		330-13	Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00		\$ -	9 810.0	\$ 1 767 928 770.00			
15 (2-11602)	2		330-13	Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680.00		\$ -		\$ -		\$ -			
PAV-3																	
16 (8-11603)	8		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00		\$ -	58 559.0	\$ 158 694 890.00			
17 (8-11603)	8		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991	\$ 879 171 843.00	119 921.00	\$ 238 762 711.00	1 323.00	\$ 2 634 093.00	60 404.0	\$ 120 264 364.00			
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00		\$ -	5 980.8	\$ 4 922 497 440.00			
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000.00	9 037.30	\$ 7 439 957 225.00	236.00	\$ 194 287 000.00	4 402.2	\$ 3 624 111 150.00			
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676.00	658.10	\$ 571 084 044.00		\$ -	292.1	\$ 253 477 662.00			
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2 600.00	\$ 72 822	\$ 189 337 200.00	514.00	\$ 37 430 508.00	143.00	\$ 10 413 546.00	291.0	\$ 21 191 202.00			
22 (8-11601)	8		465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894	\$ 205 124 400.00	103.00	\$ 8 126 082.00		\$ -	103.0	\$ 8 126 082.00			
23 (8-11603)	8		466-13	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342	\$ 15 197 000.00		\$ -		\$ -		\$ -			
EVD-4																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
24 (6)	6		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573.00			
24,1 (6-11604)	6		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		61 791.80	\$ 2 018 552 731.00	66.50	\$ 2 172 356.00	58 854.3	\$ 1 922 593 418.00			
24,2 (6-11606)	6		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		7 039.00	\$ 229 943 013.00		\$ -	3 174.4	\$ 103 698 125.00			
24,3 (6-14101)	6		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		4 145.00	\$ 135 404 715.00		\$ -	3 944.6	\$ 128 858 248.00			
25 (6-11604)	6		610-13	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832	\$ 115 845 888.00	9 739.50	\$ 436 641 264.00		\$ -	8 379.6	\$ 375 674 227.00			
26 (6)	6		610-13	Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520	\$ 155 629 760.00		\$ -		\$ -		\$ -			
26,1 (6-11604)	6		610-13	Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -			
26,2 (6-11606)	6		610-13	Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -			
27 (7)	7		621-13	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660.00		\$ -		\$ -		\$ -			
27,1 (7-11606)	7		621-13	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		32.00	\$ 71 062 176.00		\$ -	32.0	\$ 71 062 176.00			
27,2 (7-14102)	7		621-13	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		421.60	\$ 936 244 169.00		\$ -	419.6	\$ 931 802 783.00			
28 (7-14102)	7		621-13	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840.00		\$ -		\$ -		\$ -			
29 (6)	6		630-13	Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00		\$ -	474.0	\$ 419 187 588.00			
29,1 (6-11604)	6		630-13	Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		4 563.00	\$ 4 035 343 806.00	54.90	\$ 48 551 474.00	4 136.1	\$ 3 657 809 668.00			
29,2 (6-11606)	6		630-13	Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		1 180.00	\$ 1 043 547 160.00		\$ -	375.9	\$ 332 431 676.00			
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092.00	734.00	\$ 768 129 532.00		\$ -	584.8	\$ 611 992 030.00			
31 (6-11604)	6		630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000.00	115.90	\$ 83 332 100.00	0.10	\$ 71 900.00	59.8	\$ 42 996 200.00			
32 (6)	6		630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00		\$ -	126.0	\$ 63 542 556.00			
32,1 (6-11604)	6		630-13	Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		594.00	\$ 299 557 764.00	1.50	\$ 756 459.00	521.4	\$ 262 945 148.00			
32,2 (6-11606)	6		630-13	Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		85.00	\$ 42 866 010.00		\$ -	19.6	\$ 9 884 398.00			
32,3 (6-14101)	6		630-13	Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		45.00	\$ 22 693 770.00		\$ -	12.4	\$ 6 253 394.00			
33 (6-11604)	6		630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906	\$ 121 679 184.00	1 811.00	\$ 834 700 766.00	1.60	\$ 737 450.00	1 578.2	\$ 727 401 849.00			
34 (4-14104)	4		632-13	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017	\$ 55 897 734.00		\$ -		\$ -		\$ -			
35 (4)	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00		\$ -	37 305.1	\$ 200 626 828.00			
35,1 (4-11604)	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		440 000.00	\$ 2 366 320 000.00	3 350.80	\$ 18 020 602.00	400 833.8	\$ 2 155 684 176.00			
35,2 (4-11606)	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		88 000.00	\$ 473 264 000.00		\$ -	41 740.0	\$ 224 477 720.00			
35,3 (4-14102)	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		146 726.40	\$ 789 094 579.00		\$ -	133 382.3	\$ 717 330 009.00			

								INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
								VERSIÓN 1							
								PÁGINA				2 DE 4			
										FECHA		04/09/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA				ACTA No. 51		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 686 423 743.00		MES AGOSTO DE 2025			
										ACTA FINAL ☐					
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTA: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		85 000.00	\$ 457 130 000.00		\$ -	68 472.6	\$ 368 245 643.00	
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		121 494.90	\$ 653 399 572.00	1 025.50	\$ 5 515 139.00	97 545.8	\$ 524 601 312.00	
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224.00		\$ -		\$ -		\$ -	
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00		\$ -	1 909.8	\$ 22 421 052.00	
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00		\$ -	55 628.5	\$ 20 248 774.00	
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00		\$ -	55 628.5	\$ 238 423 751.00	
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037	\$ 544 029 600.00	1 879.00	\$ 1 277 789 523.00		\$ -	1 675.0	\$ 1 139 061 975.00	
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621	\$ 13 857 168.00	108.00	\$ 7 195 068.00		\$ -		\$ -	
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113	\$ 114 339 000.00	12 200.00	\$ 464 978 600.00	30.30	\$ 1 154 824.00	11 441.8	\$ 436 081 323.00	
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979	\$ 3 408 257 844.00		\$ -		\$ -		\$ -	
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093	\$ 620 611 705.00	49 070.00	\$ 397 123 510.00		\$ -	47 697.0	\$ 386 011 821.00	
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140	\$ 1 383 627 600.00	26 775.00	\$ 3 966 448 500.00	47.90	\$ 7 095 906.00	26 373.0	\$ 3 906 896 220.00	
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371	\$ 910 792 740.00	5 750.00	\$ 1 060 133 250.00	2.00	\$ 368 742.00	5 487.5	\$ 1 011 735 863.00	
		SYG-5		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						\$ -					
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794	\$ 340 276 950.00	138 370.60	\$ 248 236 856.00		\$ -	44 130.6	\$ 79 170 296.00	
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987	\$ 5 098 895.00	483.40	\$ 28 997 716.00	14.00	\$ 839 818.00	477.0	\$ 28 613 799.00	
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346	\$ 216 269 898.00	18 110.00	\$ 151 146 060.00		\$ -	6 099.0	\$ 50 902 254.00	
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	\$ 398 008	\$ 177 511 568.00	376.00	\$ 149 651 008.00		\$ -	216.0	\$ 85 969 728.00	
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033	\$ 743 681 273.00	888.00	\$ 289 517 304.00		\$ -	716.0	\$ 233 439 628.00	
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373	\$ 23 494 316.00	46.00	\$ 11 747 158.00		\$ -	11.0	\$ 2 809 103.00	
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532	\$ 592 006 176.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00		\$ -	3 470.0	\$ 799 946 040.00	
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00		\$ -	68.0	\$ 7 016 852.00	
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031	\$ 38 157 692.00	4 582.00	\$ 100 946 042.00	34.00	\$ 749 054.00	2 640.0	\$ 58 161 840.00	
		OBRA-6		OBRAS VARIAS						\$ -					
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228	\$ 137 366 580.00		\$ -		\$ -		\$ -	
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00		\$ -	3 076.0	\$ 57 936 460.00	
		TRANS-7		TRANSPORTE						\$ -					
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175	\$ 5 701 721 575.00	13 664 519.59	\$ 16 055 810 523.00		\$ -	13 284 908.4	\$ 15 609 767 323.00	
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00		\$ -	2 832.70000	\$ 3 328 423.00	
		NP		ÍTEM NO PREVISTOS						\$ -		\$ -			
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009	\$ -	188 990.90	\$ 7 372 346 018.00		\$ -	188 512.2	\$ 7 353 672 410.00	
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230	\$ -	34 634.30	\$ 29 551 023 789.00	7.80	\$ 6 655 194.00	30 849.4	\$ 26 321 633 562.00	
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00		\$ -	71.0	\$ 136 566 725.00	
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165	\$ -	152 940.00	\$ 1 401 695 100.00	204.20	\$ 1 871 493.00	145 879.0	\$ 1 336 981 035.00	
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420	\$ -	7 003.00	\$ 5 598 338 260.00		\$ -	6 772.2	\$ 5 413 832 124.00	
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1 478	\$ -	85 000.00	\$ 125 630 000.00		\$ -	15 369.0	\$ 22 715 382.00	
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153 337	\$ -	20 516.00	\$ 3 145 861 892.00	197.00	\$ 30 207 389.00	16 128.7	\$ 2 473 126 472.00	
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg		\$ 8 056	\$ -	5 655.00	\$ 45 556 680.00		\$ -	5 053.5	\$ 40 710 996.00	
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u		\$ 4 665 181	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00		\$ -	8.0	\$ 37 321 448.00	
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2 124 081	\$ -	74.40	\$ 158 031 626.00		\$ -	18.0	\$ 38 233 458.00	
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13 401	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.00		\$ -	51 217.4	\$ 686 364 377.00	
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251 064	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00		\$ -	221.3	\$ 55 560 463.00	
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177 821	\$ -	433.00	\$ 76 996 493.00		\$ -	423.0	\$ 75 218 283.00	
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156	\$ -	65.00	\$ 6 575 140.00		\$ -	55.0	\$ 5 563 580.00	
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15 624	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00	385.00	\$ 6 015 240.00	112 598.0	\$ 1 759 231 152.00	
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533	\$ -	5 000.00	\$ 107 665 000.00		\$ -	3 179.0	\$ 68 453 407.00	
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37 179	\$ -	94 378.00	\$ 3 508 879 662.00	386.00	\$ 14 351 094.00	92 038.0	\$ 3 421 880 802.00	
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m		\$ 13 537	\$ -	10 785.00	\$ 145 996 545.00	72.00	\$ 974 664.00	1 104.6	\$ 14 952 970.00	
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m		\$ 7 209	\$ -	10 675.00	\$ 76 956 075.00		\$ -	6 099.7	\$ 43 972 737.00	
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrán Planar - ancho 0,5 m	m		\$ 21 337	\$ -	1 479.90	\$ 31 576 626.00		\$ -	632.4	\$ 13 493 519.00	
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$ 81 263	\$ -	333.00	\$ 27 060 579.00		\$ -	233.0	\$ 18 934 279.00	
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$ 297 167	\$ -	2 080.00	\$ 618 107 360.00		\$ -	2 080.0	\$ 618 107 360.00	
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$ 2 731 282	\$ -	91.80	\$ 250 731 688.00		\$ -	91.8	\$ 250 731 688.00	

[Handwritten signature]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA					
3 DE 4																	
FECHA												04/09/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No. 51		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 686 423 743.00		MES AGOSTO DE 2025	
ACTA FINAL														☐			
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930				VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		\$ 42 370	\$ -	4 957.00	\$ 210 028 090.00		\$ -	4 957.0	\$ 210 028 090.00			
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 124 988	\$ -	4.00	\$ 499 952.00		\$ -	4.0	\$ 499 952.00			
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 194 455	\$ -	8.00	\$ 1 555 640.00		\$ -	8.0	\$ 1 555 640.00			
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 974 124	\$ -	10.00	\$ 9 741 240.00		\$ -		\$ -			
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$ 1 727 076	\$ -	12.00	\$ 20 724 912.00		\$ -	12.0	\$ 20 724 912.00			
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$ 68 446	\$ -	1 602.00	\$ 109 650 492.00		\$ -	914.0	\$ 62 559 644.00			
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$ 50 750	\$ -	225.00	\$ 11 418 750.00		\$ -	225.0	\$ 11 418 750.00			
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u		\$ 5 153 478	\$ -	62.00	\$ 319 515 636.00		\$ -	52.0	\$ 267 980 856.00			
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$ 110 223	\$ -	280.00	\$ 30 862 440.00		\$ -	177.0	\$ 19 509 471.00			
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		\$ 186 708	\$ -	4 140.00	\$ 772 971 120.00	171.00	\$ 31 927 068.00	3 740.0	\$ 698 287 920.00			
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$ 74 897	\$ -	2 950.00	\$ 220 946 150.00		\$ -	2 734.6	\$ 204 813 336.00			
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$ 139 817	\$ -	3 540.00	\$ 494 952 180.00		\$ -	3 429.0	\$ 479 432 493.00			
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$ 237 003	\$ -	1 180.00	\$ 279 663 540.00		\$ -	913.0	\$ 216 383 739.00			
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 29 841	\$ -	4 019.50	\$ 119 945 900.00		\$ -	4 019.5	\$ 119 945 900.00			
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación).	u		\$ 24 636 607	\$ -	2.00	\$ 49 273 214.00		\$ -	2.0	\$ 49 273 214.00			
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)	u		\$ 1 684 913	\$ -	2.00	\$ 3 369 826.00		\$ -	2.0	\$ 3 369 826.00			
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/Est		\$ 1 149	\$ -	229 635.00	\$ 263 850 615.00		\$ -	225 667.0	\$ 259 291 383.00			
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones ni llenos)	m		\$ 5 378 493	\$ -	26.00	\$ 139 840 818.00		\$ -		\$ -			
101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro interior	m		\$ 1 303 788	\$ -	52.00	\$ 67 796 976.00		\$ -	33.8	\$ 44 068 034.00			
102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		\$ 286 941	\$ -	13 969.00	\$ 4 008 278 829.00	124.00	\$ 35 580 684.00	11 624.0	\$ 3 335 402 184.00			
103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		\$ 294 848	\$ -	3 232.00	\$ 952 948 736.00	36.00	\$ 10 614 528.00	3 088.0	\$ 910 490 624.00			
104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey	u		\$ 286 505	\$ -	20.00	\$ 5 730 100.00		\$ -	14.0	\$ 4 011 070.00			
105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		\$ 25 925	\$ -	22 210.40	\$ 575 804 620.00	574.00	\$ 14 880 950.00	9 629.7	\$ 249 649 973.00			
106 (4-11606)	6		623.1.1P	Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4"	m		\$ 202 715	\$ -	4 805.00	\$ 974 045 575.00	756.00	\$ 153 252 540.00	3 831.0	\$ 776 601 165.00			
107 (6-11606)	6		811.2P	Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm	m2		\$ 69 464	\$ -	4 341.60	\$ 301 584 902.00	662.00	\$ 45 985 168.00	3 351.0	\$ 232 773 864.00			
AJUSTE AL PESO										-\$ 2.85				\$ -			
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 145 115 522 331.00		\$ 142 725 952 599.00		\$ 686 423 743.00		\$ 126 925 257 370.00			
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 18 736 504 837.00		\$ 28 638 192 076.00		\$ -		\$ 22 838 193 088.00			
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 650 475 331.00		\$ -		\$ -		\$ -			
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 164 502 502 499.00		\$ 171 364 144 675.00		\$ 686 423 743.00		\$ 149 763 450 458.00			
* VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 1 202 133 672.00		\$ 1 252 276 442.00		\$ 5 016 173.00		\$ 1 094 425 216.00			
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)								\$ 165 704 636 171.00		\$ 172 616 421 117.00		\$ 691 439 916.00		\$ 150 857 875 674.00			
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1 150 000 000.00		\$ 1 388 218 000.00		\$ -		\$ 1 149 647 954.00			
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)								\$ 218 500 000.00		\$ 263 761 420.00		\$ -		\$ 218 433 112.00			
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 1 368 500 000.00		\$ 1 651 979 420.00		\$ -		\$ 1 368 081 066.00			
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)								\$ 3 759 541 759.00		\$ 4 504 277 393.00		\$ -		\$ 3 347 160 350.00			
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ 640 000 000.00		\$ -		\$ -		\$ -			
* VALOR TOTAL								\$ 171 472 677 930.00		\$ 178 772 677 930.00		\$ 691 439 916.00		\$ 155 573 117 090.00			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																	
AIU 30 % Utilidad 5 %																	
		Valor				%											
Valor Anticipo Otorgado		\$ 14 343 935 268.00				8.720%											
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 74 181 814.00				10.807%											
Valor Amortizado Acumulado		\$ 13 164 969 756.00				91.781%											
Valor Saldo por Amortizar		\$ 1 178 965 512.00				8.219%											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

4 DE 4

FECHA

04/09/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA No.

51

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 686 423 743.00

MES

AGOSTO DE 2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

923 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

51 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

55 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTA:

31/12/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IV:

\$ 171 472 677 930

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA:

\$ 7 300 000 000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 178 772 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 686 423 743	\$ 5 016 173	\$ 691 439 916
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 686 423 743	\$ 5 016 173	\$ 691 439 916

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 686 423 743

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 612 241 929

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 617 258 102

VALOR EN LETRAS:

SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 39 352 576	\$ 8 297 824 093
SB, B Y A	\$ 1 386 792	\$ 12 746 540 948
P	\$ 207 334 639	\$ 9 108 362 790
OA	\$ 84 444 852	\$ 21 370 137 537
SCT	\$ 1 588 872	\$ 1 346 029 540
OV	\$ -	\$ 57 936 460
T	\$ -	\$ 15 613 095 728
NP	\$ 352 316 012	\$ 58 385 330 274
TOTAL	\$ 686 423 743	\$ 126 925 257 370

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 39 352 576	\$ 15 732 278 366
2 Sub-bases y bases	\$ 1 386 792	\$ 12 746 540 948
3 Transporte de materiales	\$ -	\$ 15 892 635 903
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 70 480 007	\$ 9 982 411 596
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ 896 392 467
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 365 158 418	\$ 58 607 652 154
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ 1 921 149 140
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 210 045 950	\$ 11 146 196 796
TOTAL	\$ 686 423 743	\$ 126 925 257 370

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ

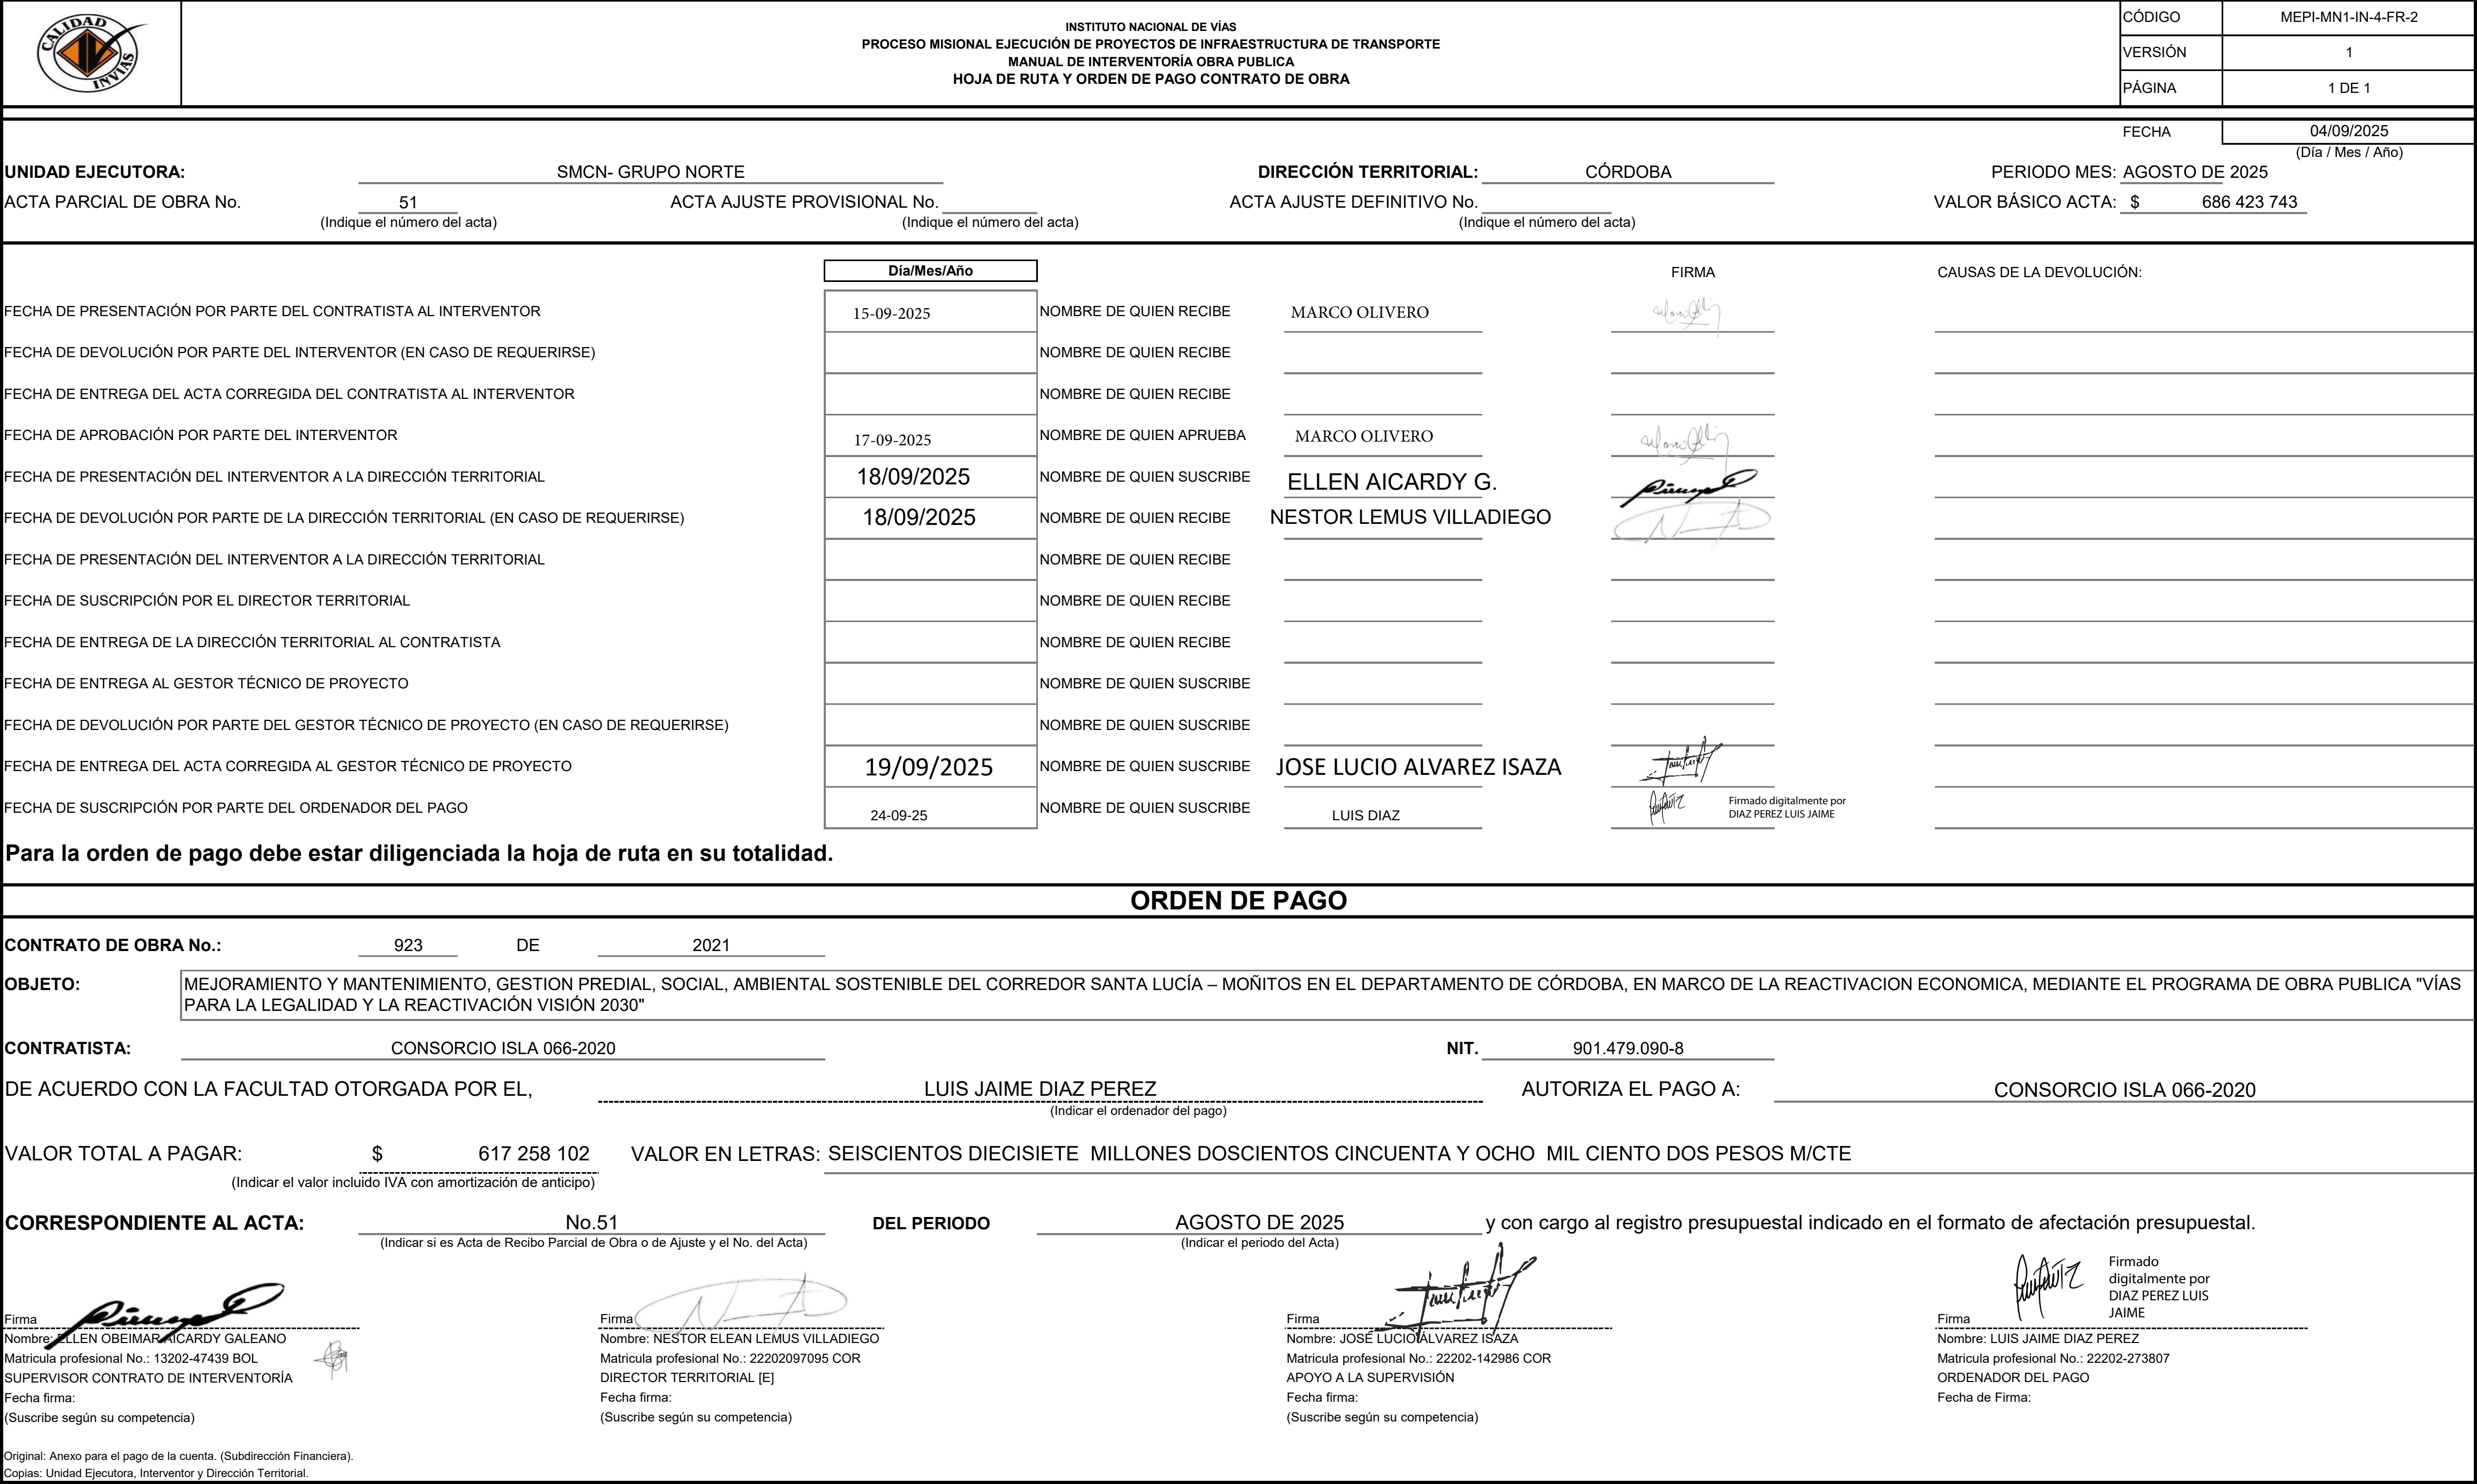
REPRESENTANTE LEGAL

Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	51	AGOSTO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? VIATICOS ☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>177424</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	<u>177424</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401017-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$258,978,880.00
No. COMPROMISO	<u>177424</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	<u>118225</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$358,279,222.00
No. COMPROMISO	<u>118225</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401017-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	<u>118225</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	<u>388225</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	<u>388225</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-96-51102D-2401029-02</u>	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
TOTAL ACTA				\$617,258,102.00	

Nombre: **JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA**
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

51

Valor basico: \$

686 423 743

Período:

AGOSTO DE 2025

Valor Incluido Iva: \$

691 439 916

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 691 439 916	\$ 0	\$ 0.00	\$ 691 439 916
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 691 439 916	\$ 0	\$ 0.00	\$ 691 439 916

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 386 030 905	\$ 383 230 376
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 71 425 743	\$ 70 907 573
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 178 806 363	\$ 177 509 180
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 55 176 905	\$ 54 776 614
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 691 439 916	\$ 686 423 743

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT



ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198





BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 4 de Septiembre de 2025

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Agosto de 2025, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, septiembre de 2025

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3

Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de agosto de 2025 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.


Atentamente,




Marco Aurelio Oliveros García

Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141140452882			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9014790908				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO ISLA 066-2020							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 70 F 127 A 90							
42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6046040111		45. Teléfono 2 3115297695	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4210	20210412						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 714485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141140452882			
 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 2, 1 8				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 0 2, 1 8					
81. Hasta		2 0 2 6, 1 0, 1 8					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141140452882			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141140452882



(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


9 0 1 4 7 9 0 9 0 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 0 0 2 3 3 8 8 1	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9	
115. Primer apellido	119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1, 0 2, 1 8	123. Fecha de retiro		
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 9 0 2 0 9 1 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	119. Razón social ISMOCOL S.A.	120. Valor capital del socio 85,786,338,965	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1, 0 2, 1 8	123. Fecha de retiro		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141140452882			
 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		149. Número de identificación 1 3 1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 2 7 2 4 8 7 T
	152. Primer apellido FORERO		153. Segundo apellido BAYONA		154. Primer nombre MONICA		155. Otros nombres YUSLIN
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 6 1 8						
