

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000179

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090
CR 7 C 12508
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

24/11/2025

Forma de Pago:

CREDITO A 30 DÍAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1.0000	\$541,985,289.00	\$0		\$541,985,289
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1.0000	\$108,397,057.00	\$0		\$108,397,057
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1.0000	\$27,099,266.00	\$0		\$27,099,266
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	\$27,099,264.00	\$5,148,860		\$32,248,124
CS0018	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0000	\$55,000,000.00	\$10,450,000		\$65,450,000
VS0056	REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	1.0000	\$2,649,000.00	\$0		\$2,649,000
VS0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.0000	\$66,225.00	\$12,583		\$78,808
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO				\$102,671,525.00	-\$102,671,525
TOTALES			\$762,296,101.00	\$15,611,443	-\$102,671,525.00	\$675,236,019

Notas

24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$
ACTA DE OBRA 53 DEL CONTRATO 923 DE 2021
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO OCTUBRE 2025

jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

		INSTITUCION NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA							CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
									VERSIÓN		1				
									PÁGINA						
FECHA											1 06/11/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN- GRUPO NORTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CÓRDOBA		ACTA No. 53		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 762 296 101.00		MES OCTUBRE DE 2025	
ACTA FINAL															
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 04/11/2025		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	EXP-1			EXPLANACIONES											
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	\$ 1 187 326	\$ 10 685 934.00		\$ -		\$ -		\$ -	
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	\$ 113 408	\$ 20 980 480.00	183.00	\$ 20 753 664.00		\$ -	183.0	\$ 20 753 664.00	
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		3 181.50	\$ 360 807 552.00	159.00	\$ 18 031 872.00	2 892.0	\$ 327 975 936.00	
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113 408		1 000.00	\$ 113 408 000.00		\$ -	550.0	\$ 62 374 400.00	
3 (1-11601)	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	\$ 69 636	\$ 77 295 960.00	1 612.00	\$ 112 253 232.00		\$ -	1 612.0	\$ 112 253 232.00	
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	\$ 12 579	\$ 397 395 768.00	96.00	\$ 1 207 584.00		\$ -	96.0	\$ 1 207 584.00	
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	\$ 9 995	\$ 1 376 771 270.00	159 890.90	\$ 1 598 109 546.00	687.00	\$ 6 866 565.00	156 386.0	\$ 1 563 078 070.00	
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	\$ 9 747	\$ 13 158 450.00	1 171.00	\$ 11 413 737.00		\$ -	783.0	\$ 7 631 901.00	
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	\$ 12 465	\$ 1 968 996 330.00	193 521.40	\$ 2 412 244 251.00		\$ -	192 337.2	\$ 2 397 483 198.00	
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	\$ 18 609	\$ 48 271 746.00	128.00	\$ 2 381 952.00		\$ -	128.0	\$ 2 381 952.00	
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	\$ 7 521	\$ 269 229 237.00		\$ -		\$ -		\$ -	
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	\$ 85 574	\$ 6 770 614 880.00	48 139.00	\$ 4 119 446 786.00		\$ -	44 965.0	\$ 3 847 834 910.00	
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES						\$ -					
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	\$ 927	\$ 603 832 968.00	786 639.90	\$ 729 215 187.00	61 183.00	\$ 56 716 641.00	743 796.0	\$ 689 498 892.00	
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	\$ 117 875	\$ 1 216 470 000.00	28 378.50	\$ 3 345 115 688.00	205.00	\$ 24 164 375.00	27 371.0	\$ 3 226 356 625.00	
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	\$ 166 273	\$ 19 503 822 900.00	46 292.70	\$ 7 697 226 107.00		\$ -	43 392.9	\$ 7 215 067 662.00	
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	\$ 180 217	\$ 14 258 769 040.00	9 810.00	\$ 1 767 928 770.00		\$ -	9 810.0	\$ 1 767 928 770.00	
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	\$ 192 624	\$ 1 987 879 680.00		\$ -		\$ -		\$ -	
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFALTICOS						\$ -					
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	\$ 2 710	\$ 1 196 662 830.00	58 559.00	\$ 158 694 890.00		\$ -	58 559.0	\$ 158 694 890.00	
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	\$ 1 991	\$ 879 171 843.00	119 921.00	\$ 238 762 711.00		\$ -	63 296.0	\$ 126 022 336.00	
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	\$ 823 050	\$ 30 768 901 200.00	5 980.80	\$ 4 922 497 440.00		\$ -	5 980.8	\$ 4 922 497 440.00	
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	\$ 823 250	\$ 22 797 439 000.00	4 780.20	\$ 3 935 299 650.00		\$ -	4 525.2	\$ 3 725 370 900.00	
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	\$ 867 777	\$ 4 328 471 676.00	558.10	\$ 484 306 344.00		\$ -	391.1	\$ 339 387 585.00	
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 600.00	\$ 72 822	\$ 189 337 200.00	529.00	\$ 38 522 838.00		\$ -	390.0	\$ 28 400 580.00	
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	\$ 78 894	\$ 205 124 400.00	103.00	\$ 8 126 082.00		\$ -	103.0	\$ 8 126 082.00	
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3 500.00	\$ 4 342	\$ 15 197 000.00		\$ -		\$ -		\$ -	
	EYD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$ -					
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	\$ 32 667	\$ 1 028 095 824.00	10 719.00	\$ 350 157 573.00		\$ -	10 719.0	\$ 350 157 573.00	
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		61 191.80	\$ 1 998 952 531.00	6.10	\$ 199 269.00	58 935.2	\$ 1 925 236 178.00	
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		4 753.50	\$ 155 282 585.00		\$ -	3 174.4	\$ 103 698 125.00	
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		4 021.60	\$ 131 373 607.00		\$ -	3 944.6	\$ 128 858 248.00	
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	\$ 44 832	\$ 115 845 888.00	8 887.30	\$ 398 435 434.00		\$ -	8 391.3	\$ 376 198 761.00	
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	\$ 157 520	\$ 155 629 760.00		\$ -		\$ -		\$ -	
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -	
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3		\$ 157 520			\$ -		\$ -		\$ -	
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	620.00	\$ 2 220 693	\$ 1 376 829 660.00		\$ -		\$ -		\$ -	
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		32.00	\$ 71 062 176.00		\$ -	32.0	\$ 71 062 176.00	
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2 220 693		419.60	\$ 931 802 783.00		\$ -	419.6	\$ 931 802 783.00	
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1 580.00	\$ 2 877 598	\$ 4 546 604 840.00		\$ -		\$ -		\$ -	
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	\$ 884 362	\$ 1 994 236 310.00	474.00	\$ 419 187 588.00		\$ -	474.0	\$ 419 187 588.00	
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		4 501.40	\$ 3 980 867 107.00	1.60	\$ 1 414 979.00	4 146.6	\$ 3 667 095 469.00	
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 884 362		598.60	\$ 529 379 093.00		\$ -	375.9	\$ 332 431 676.00	
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	\$ 1 046 498	\$ 1 521 608 092.00	684.20	\$ 716 013 932.00		\$ -	584.8	\$ 611 992 030.00	
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	\$ 719 000	\$ 3 491 464 000.00	66.50	\$ 47 813 500.00	0.90	\$ 647 100.00	61.7	\$ 44 362 300.00	
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	\$ 504 306	\$ 90 775 080.00	126.00	\$ 63 542 556.00		\$ -	126.0	\$ 63 542 556.00	
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		576.10	\$ 290 530 687.00	0.70	\$ 353 014.00	523.0	\$ 263 752 038.00	
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		28.90	\$ 14 574 443.00		\$ -	19.6	\$ 9 884 398.00	
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 504 306		15.00	\$ 7 564 590.00		\$ -	12.4	\$ 6 253 394.00	
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	\$ 460 906	\$ 121 679 184.00	1 695.20	\$ 781 327 851.00		\$ -	1 578.2	\$ 727 401 849.00	
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	\$ 548 017	\$ 55 897 734.00		\$ -		\$ -		\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
												VERSIÓN		1									
												PÁGINA											
												FECHA		2026/11/2025 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA:		SMCN- GRUPO NORTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CÓRDOBA		ACTA No.		53		VALOR BÁSICO ACTA: \$		762 296 101.00		MES		OCTUBRE DE 2025	
												ACTA FINAL											
CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)								
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										VALOR INICIAL (incluido IV \$ 171 472 677 930 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 7 300 000 000.00								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE					VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 178 772 677 930								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 04/11/2025		OBRA EJECUTADA												
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR									
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	\$ 5 378	\$ 5 419 104 054.00	37 305.10	\$ 200 626 828.00		\$ -	37 305.1	\$ 200 626 828.00									
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		422 439.50	\$ 2 271 879 631.00	16.00	\$ 86 048.00	401 384.5	\$ 2 158 645 841.00									
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		53 840.60	\$ 289 554 747.00		\$ -	41 740.0	\$ 224 477 720.00									
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		133 382.30	\$ 717 330 009.00		\$ -	133 382.3	\$ 717 330 009.00									
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		80 594.30	\$ 433 436 145.00		\$ -	68 472.6	\$ 368 245 643.00									
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5 378		130 149.00	\$ 699 941 322.00	23 098.60	\$ 124 224 271.00	128 750.6	\$ 692 420 727.00									
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	\$ 1 991 463	\$ 95 590 224.00		\$ -		\$ -		\$ -									
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 11 740	\$ 759 871 500.00	1 909.80	\$ 22 421 052.00		\$ -	1 909.8	\$ 22 421 052.00									
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	\$ 364	\$ 23 559 900.00	55 628.50	\$ 20 248 774.00		\$ -	55 628.5	\$ 20 248 774.00									
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	\$ 4 286	\$ 277 411 350.00	55 628.50	\$ 238 423 751.00		\$ -	55 628.5	\$ 238 423 751.00									
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	\$ 680 037	\$ 544 029 600.00	1 719.00	\$ 1 168 983 603.00		\$ -	1 675.0	\$ 1 139 061 975.00									
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	\$ 66 621	\$ 13 857 168.00		\$ -		\$ -		\$ -									
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	\$ 38 113	\$ 114 339 000.00	11 841.80	\$ 451 326 523.00	3.00	\$ 114 339.00	11 444.8	\$ 436 195 662.00									
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	\$ 626 979	\$ 3 408 257 844.00		\$ -		\$ -		\$ -									
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	\$ 8 093	\$ 620 611 705.00	47 964.80	\$ 388 179 126.00		\$ -	47 697.0	\$ 386 011 821.00									
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	\$ 148 140	\$ 1 383 627 600.00	26 651.30	\$ 3 948 123 582.00	14.70	\$ 2 177 658.00	26 387.7	\$ 3 909 073 878.00									
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	\$ 184 371	\$ 910 792 740.00	5 537.50	\$ 1 020 954 413.00	5.00	\$ 921 855.00	5 501.5	\$ 1 014 317 057.00									
	SYG-5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										\$ -									
47 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	\$ 1 794	\$ 340 276 950.00	147 490.60	\$ 264 598 136.00		\$ -	44 130.6	\$ 79 170 296.00									
48 (8-11607)	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	\$ 59 987	\$ 5 098 895.00	794.00	\$ 47 629 678.00		\$ -	483.0	\$ 28 973 721.00									
49 (8-11607)	8		Manual de Señalización	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	\$ 8 346	\$ 216 269 898.00	19 145.00	\$ 159 784 170.00		\$ -	6 223.0	\$ 51 937 158.00									
50 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	\$ 398 008	\$ 177 511 568.00	309.00	\$ 122 984 472.00		\$ -	216.0	\$ 85 969 728.00									
51 (4-11607)	4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	\$ 326 033	\$ 743 681 273.00	750.00	\$ 244 524 750.00		\$ -	716.0	\$ 233 439 628.00									
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	\$ 255 373	\$ 23 494 316.00	27.00	\$ 6 895 071.00		\$ -	11.0	\$ 2 809 103.00									
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	\$ 230 532	\$ 592 006 176.00	3 470.00	\$ 799 946 040.00		\$ -	3 470.0	\$ 799 946 040.00									
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	\$ 103 189	\$ 17 129 374.00	68.00	\$ 7 016 852.00		\$ -	68.0	\$ 7 016 852.00									
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	\$ 22 031	\$ 38 157 692.00	3 082.00	\$ 67 899 542.00		\$ -	2 640.0	\$ 58 161 840.00									
	OBRA-6			OBRAS VARIAS										\$ -									
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	\$ 111 228	\$ 137 366 580.00		\$ -		\$ -		\$ -									
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	\$ 18 835	\$ 126 401 685.00	3 076.00	\$ 57 936 460.00		\$ -	3 076.0	\$ 57 936 460.00									
	TRANS-7			TRANSPORTE										\$ -									
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a	m3-km	4 852 529.00	\$ 1 175	\$ 5 701 721 575.00	13 667 687.70	\$ 16 059 533 048.00	15 103.70	\$ 17 746 848.00	13 301 423.5	\$ 15 629 172 566.00									
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	\$ 1 175	\$ 22 207 500.00	18 900.00	\$ 22 207 500.00		\$ -	2 832.70000	\$ 3 328 423.00									
	NP			ÍTEM NO PREVISTOS										\$ -									
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		\$ 39 009	\$ -	189 696.40	\$ 7 399 866 868.00		\$ -	188 512.2	\$ 7 353 672 410.00									
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		\$ 853 230	\$ -	34 560.30	\$ 29 487 884 769.00	183.10	\$ 156 226 413.00	31 135.3	\$ 26 565 572 019.00									
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		\$ 1 923 475	\$ -	71.00	\$ 136 566 725.00		\$ -	71.0	\$ 136 566 725.00									
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		\$ 9 165	\$ -	147 731.20	\$ 1 353 956 448.00	5.30	\$ 48 575.00	145 884.3	\$ 1 337 029 610.00									
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 799 420	\$ -	7 054.00	\$ 5 639 108 680.00	2.40	\$ 1 918 608.00	6 784.9	\$ 5 423 984 758.00									
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en	m		\$ 1 478	\$ -	30 049.00	\$ 44 412 422.00		\$ -	15 369.0	\$ 22 715 382.00									
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		\$ 153 337	\$ -	19 087.80	\$ 2 926 865 989.00		\$ -	16 128.7	\$ 2 473 126 472.00									
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatación Box	kg		\$ 8 056	\$ -	5 053.50	\$ 40 710 996.00		\$ -	5 053.5	\$ 40 710 996.00									
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60	u		\$ 4 665 181	\$ -	8.00	\$ 37 321 448.00		\$ -	8.0	\$ 37 321 448.00									
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		\$ 2 124 081	\$ -	71.40	\$ 151 659 383.00		\$ -	18.0	\$ 38 233 458.00									
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		\$ 13 401	\$ -	51 217.40	\$ 686 364 377.00		\$ -	51 217.4	\$ 686 364 377.00									
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		\$ 251 064	\$ -	312.00	\$ 78 331 968.00		\$ -	221.3	\$ 55 560 463.00									
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		\$ 177 821	\$ -	423.00	\$ 75 218 283.00		\$ -	423.0	\$ 75 218 283.00									
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		\$ 101 156	\$ -	55.00	\$ 5 563 580.00		\$ -	55.0	\$ 5 563 580.00									
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		\$ 15 624	\$ -	114 900.00	\$ 1 795 197 600.00		\$ -	112 598.0	\$ 1 759 231 152.00									
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		\$ 21 533	\$ -	3 858.00	\$ 83 074 314.00		\$ -	3 179.0	\$ 68 453 407.00									
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m2		\$ 37 179	\$ -	95 054.90	\$ 3 534 046 127.00	745.00	\$ 27 698 355.00	93 078.0	\$ 3 460 546 962.00									

FECHA

30/11/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

ACTA No.

53

VALOR BÁSICO ACTA:

\$762 296 101.00

MES

OCTUBRE DE 2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :
(Indique número y año)

923 DE 2021

PLAZO INICIAL:

51 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

55 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

23/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTU

31/12/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO ISLA 066-2020
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1050 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO VIAL NORTE

VALOR INICIAL (incluido IV \$

171 472 677 930

VALOR ADICIONES (incluido IVA \$

7 300 000 000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

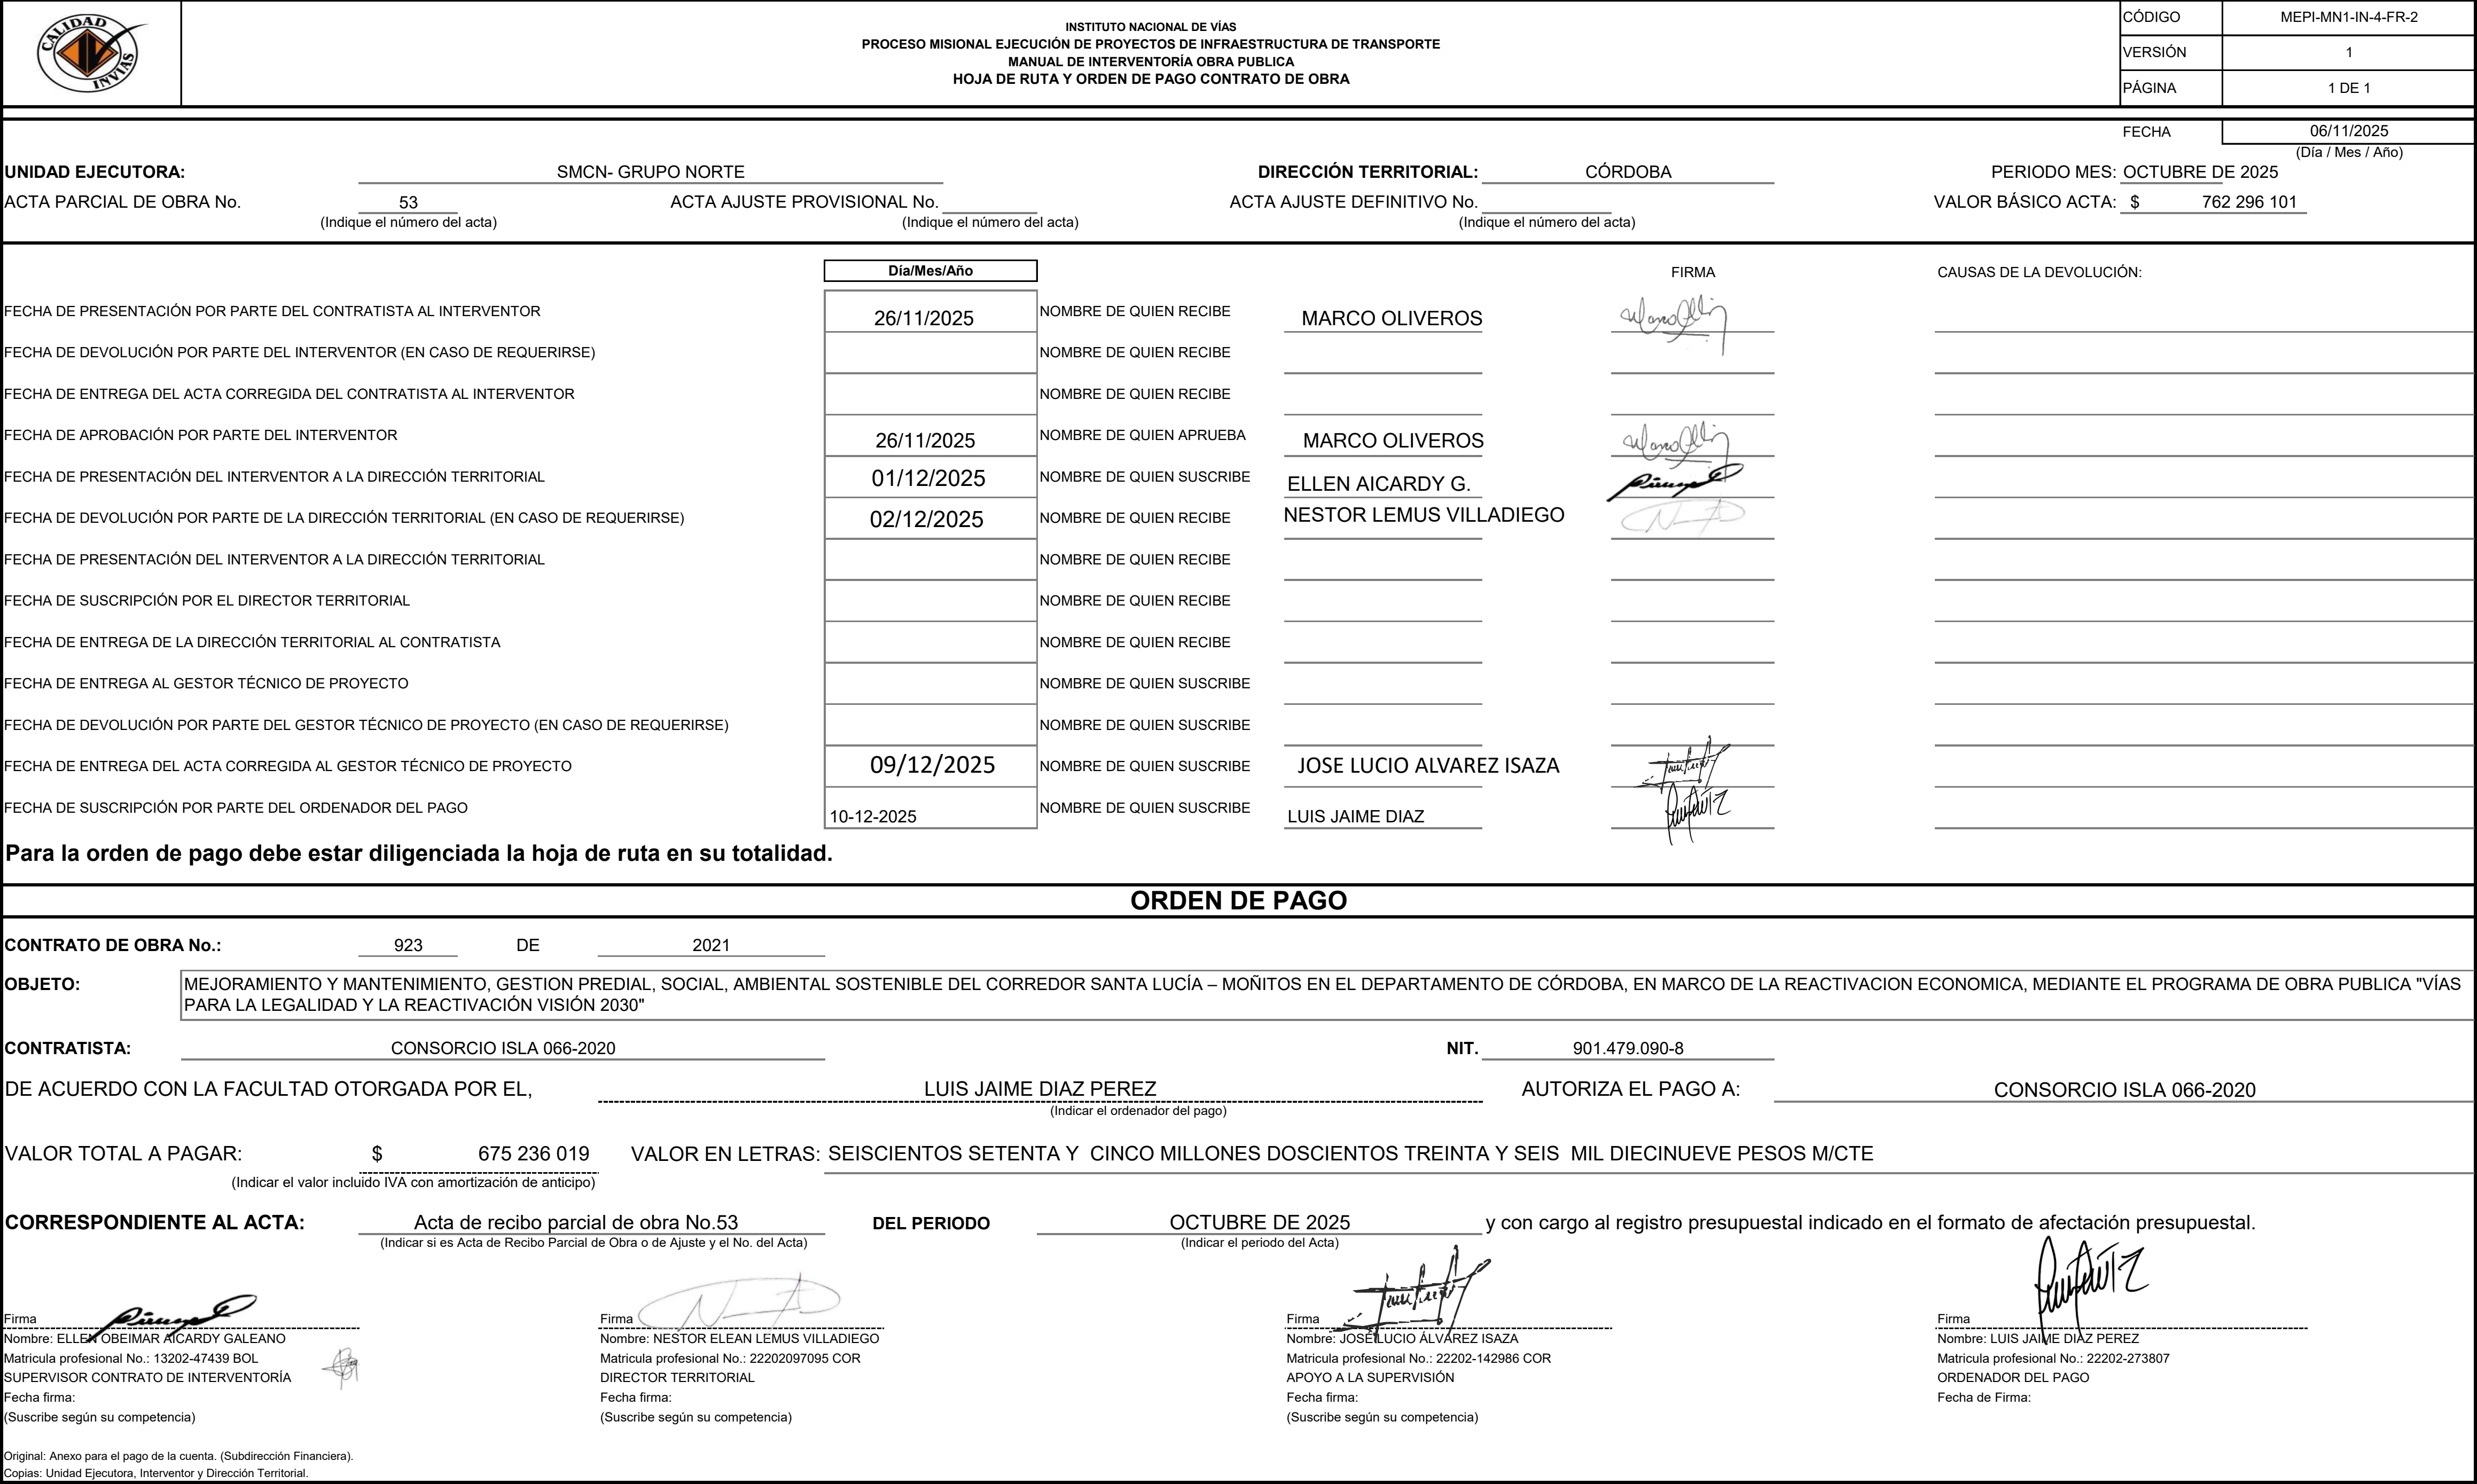
\$178 772 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 04/11/2025		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)	m		\$13 537	\$-	3 785.00	\$51 237 545.00		\$-	1 104.6	\$14 952 970.00
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye suministro de postes de madera)	m		\$7 209	\$-	10 675.00	\$76 956 075.00	30.00	\$216 270.00	6 229.7	\$44 909 907.00
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrán Planar - ancho 0,5 m	m		\$21 337	\$-	632.40	\$13 493 519.00		\$-	632.4	\$13 493 519.00
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		\$81 263	\$-	233.00	\$18 934 279.00		\$-	233.0	\$18 934 279.00
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		\$297 167	\$-	2 724.80	\$809 720 642.00		\$-	2 080.0	\$618 107 360.00
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		\$2 731 282	\$-	91.80	\$250 731 688.00		\$-	91.8	\$250 731 688.00
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		\$42 370	\$-	4 957.00	\$210 028 090.00		\$-	4 957.0	\$210 028 090.00
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$124 988	\$-	4.00	\$499 952.00		\$-	4.0	\$499 952.00
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$194 455	\$-	8.00	\$1 555 640.00		\$-	8.0	\$1 555 640.00
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$974 124	\$-	10.00	\$9 741 240.00		\$-		\$-
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.	u		\$1 727 076	\$-	12.00	\$20 724 912.00		\$-	12.0	\$20 724 912.00
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		\$68 446	\$-	914.00	\$62 559 644.00		\$-	914.0	\$62 559 644.00
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		\$50 750	\$-	225.00	\$11 418 750.00		\$-	225.0	\$11 418 750.00
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	u		\$5 153 478	\$-	52.00	\$267 980 856.00		\$-	52.0	\$267 980 856.00
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$110 223	\$-	177.00	\$19 509 471.00		\$-	177.0	\$19 509 471.00
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		\$186 708	\$-	3 911.00	\$730 214 988.00		\$-	3 740.0	\$698 287 920.00
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		\$74 897	\$-	2 979.90	\$223 185 570.00	31.00	\$2 321 807.00	2 765.6	\$207 135 143.00
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		\$139 817	\$-	3 540.00	\$494 952 180.00		\$-	3 429.0	\$479 432 493.00
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		\$237 003	\$-	1 065.00	\$252 408 195.00		\$-	913.0	\$216 383 739.00
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$29 841	\$-	4 019.50	\$119 945 900.00		\$-	4 019.5	\$119 945 900.00
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación).	u		\$24 636 607	\$-	3.00	\$73 909 821.00	1.00	\$24 636 607.00	3.0	\$73 909 821.00
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)	u		\$1 684 913	\$-	2.00	\$3 369 826.00		\$-	2.0	\$3 369 826.00
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/Est		\$1 149	\$-	233 701.00	\$268 522 449.00	50.00	\$57 450.00	225 717.0	\$259 348 833.00
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones ni llenos)	m		\$5 378 493	\$-	26.00	\$139 840 818.00		\$-		\$-
101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro interior	m		\$1 303 788	\$-	49.70	\$64 798 264.00		\$-	33.8	\$44 068 034.00
102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		\$286 941	\$-	11 804.00	\$3 387 051 564.00		\$-	11 624.0	\$3 335 402 184.00
103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		\$294 848	\$-	3 136.00	\$924 643 328.00		\$-	3 088.0	\$910 490 624.00
104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey	u		\$286 505	\$-	14.00	\$4 011 070.00		\$-	14.0	\$4 011 070.00
105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		\$25 925	\$-	19 706.00	\$510 878 050.00		\$-	10 741.7	\$278 478 573.00
106 (4-11606)	6		623.1.1P	Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4"	m		\$202 715	\$-	9 484.00	\$1 922 549 060.00	927.00	\$187 916 805.00	4 758.0	\$964 517 970.00
107 (6-11606)	6		811.2P	Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm	m2		\$69 464	\$-	8 361.30	\$580 809 343.00	718.00	\$49 875 152.00	4 069.0	\$282 649 016.00
108 (6-11603)	6		12P	Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con masilla asfáltica, Brea,	m		\$79 812	\$-	3 793.30	\$302 750 860.00		\$-		\$-
109 (6-11603)	6		13P	Cosido cruzado y sello de fisuras en Losas de MR con adhesivo epóxico de alta	m		\$90 030	\$-	9 167.90	\$825 386 037.00		\$-		\$-
110 (6-11603)	6		14P	Cosido cruzado, cajeo y resane de fisuras en Losas de MR con mortero de alta	m		\$104 951	\$-	773.50	\$81 179 599.00		\$-		\$-
111 (8-11603)	8		450.2.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 con grano caucho T1	m3		\$1 114 401	\$-	2 024.00	\$2 255 547 624.00		\$-		\$-
112 (8-11603)	8		450.3P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC 10	m3		\$1 100 816	\$-	1 012.00	\$1 114 025 792.00		\$-		\$-
113 (8-11603)	8		15P	Geomalla Pavimentos Asfálticos 110 kN/m	m2		\$16 588	\$-	20 240.00	\$335 741 120.00		\$-		\$-
114 (4-11607)	4		710.1.3P	Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47A Proximidad de	u		\$549 248	\$-	8.00	\$4 393 984.00		\$-		\$-
115 (4-11607)	4		710.1.4P	Suministro e instalación de señal vertical de transito tipo SP-47B Ubicación de	u		\$590 664	\$-	10.00	\$5 906 640.00		\$-		\$-
116 (4-11607)	4		710.1.5P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito (75cm x 75cm) tipo Duplex	u		\$754 522	\$-	13.00	\$9 808 786.00		\$-		\$-
117 (4-11607)	4		710.1.6P	Suministro e instalación de señal vertical SI-27. "Reducción de Calzada".	u		\$1 192 816	\$-	4.00	\$4 771 264.00		\$-		\$-
118 (4-11607)	4		710.1.7P	Suministro e instalación de señal vertical SI-28. Tablero en lámina galvanizada	u		\$793 805	\$-	10.00	\$7 938 050.00		\$-		\$-
119 (4-11607)	4		710.1.8P	Marcador de obstáculo vertical (Sencillo)	u		\$276 719	\$-	222.00	\$61 431 618.00		\$-		\$-
120 (4-11607)	4		720.1P	Señal vertical poste de referencia SI-04 doble cara, lámina galvanizada calibre	u		\$558 775	\$-	30.00	\$16 763 250.00		\$-		\$-

AJUSTE AL PESO				-\$ 3.00			
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)				\$	145 115 522 331.00	\$	142 725 952 599.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				\$	18 736 504 837.00	\$	704 580 876.00
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)				\$	650 475 331.00	\$	-
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				\$	164 502 502 499.00	\$	-
* VALOR IVA (OBRA) (E)				\$	1 202 133 672.00	\$	704 580 876.00
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				\$	165 704 636 171.00	\$	5 148 860.00
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				\$	1 150 000 000.00	\$	709 729 736.00
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)				\$	218 500 000.00	\$	55 000 000.00
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				\$	1 368 500 000.00	\$	10 450 000.00
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)				\$	3 759 541 759.00	\$	65 450 000.00
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)				\$	640 000 000.00	\$	2 727 808.00
* VALOR TOTAL				\$	171 472 677 930.00	\$	-
				\$	178 772 677 930.00	\$	777 907 544.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

ma



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

53

Valor basico: \$

762 296 101

Período:

OCTUBRE DE 2025

Valor Incluido Iva: \$

777 907 544

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	\$ 777 907 544	\$ 0	\$ 0.00	\$ 777 907 544
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 777 907 544	\$ 0	\$ 0.00	\$ 777 907 544

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1		CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1		MONTERIA	\$ 496 071 641	\$ 486 116 224
800.096.805-6	MUNICIPIO 2		SAN PELAYO	\$ 186 386 648	\$ 182 646 146
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	\$ 83 002 735	\$ 81 336 994
800.065.474-9	MUNICIPIO 4		MOÑITOS	\$ 12 446 520	\$ 12 196 737
TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA				\$ 777 907 544	\$ 762 296 101

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				



SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT



ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	53	OCTUBRE DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? VIATICOS ☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$675 236 019.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	388225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00
No. COMPROMISO	388225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401029-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$0.00

TOTAL ACTA \$675 236 019.00

Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR



BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 11 de Noviembre de 2025

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:**

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Octubre de 2025, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020



Montería, noviembre de 2025

REFERENCIA Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de octubre de 2025 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.


Atentamente,





Marco Aurelio Oliveros García


Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141140452882			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9014790908				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO ISLA 066-2020							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 70 F 127 A 90							
42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6046040111		45. Teléfono 2 3115297695	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4210	20210412						
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 714485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141140452882			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 0 2, 1 8				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 0 2, 1 8					
81. Hasta		2 0 2 6, 1 0, 1 8					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141140452882			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 1 4 2 9 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RAMIREZ		105. Segundo apellido ARROYAVE		106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 5 6 7 8 0 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ESCOBAR		105. Segundo apellido SAAVEDRA		106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141140452882			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
3 1		8 0 0 2 3 3 8 8 1		4		COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
						1 6 9	
119. Razón social LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
85,786,338,965		5 0		2 0 2 1 0 2 1 8			
111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
3 1		8 9 0 2 0 9 1 7 4		1		COLOMBIA	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
						1 6 9	
2119. Razón social ISMOCOL S.A.							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
85,786,338,965		5 0		2 0 2 1 0 2 1 8			
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
3119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
4119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
5119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141140452882			
 (415)7707212489984(8020) 000014114045288 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 9 0 9 0		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 2 7 2 4 8 7 T
	152. Primer apellido FORERO		153. Segundo apellido BAYONA		154. Primer nombre MONICA		155. Otros nombres YUSLIN
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 6 1 8						
