

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME


24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN PARA AMBIENTES Y/O ÁREAS DE SERVICIO SANITARIO EXISTENTES EN EL PISO 5 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CODIGO BPIN	N/A	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	23 DE DICIEMBRE DE 2025
INFORMACIÓN CONTRACTUAL		FUENTES DE FINANCIACIÓN	
No. CONTRATO	535 DE 2025	RECURSOS PROPIOS	\$ 194.877.405,00
CONTRATISTA	ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS	MINISTERIO DE SALUD U OTROS	\$ -
NIT	901.706.929-6	VALOR TOTAL	\$ 194.877.405,00
VALOR INICIAL	\$ 194.877.405,00	CODIGO RUBRO	2.3.2.01.01.001.02.08.02
VALOR ADICIONAL	\$ -	NOMBRE RUBRO	INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO
VALOR TOTAL	\$ 194.877.405,00	CDP INICIAL	1352
ANTICIPO	\$ -	RP INICIAL	2046
PLAZO INICIAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	CDP ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	RP ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y CINCO (05) DÍAS	% AVANCE FINANCIERO	
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR INICIAL	\$ 194.877.405,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR ADICIONAL	\$ -
ESTADO CONTRATO A LA FECHA	TERMINADO	VALOR TOTAL	\$ 194.877.405,00
SUSPENSIÓN	NO APLICA	ANTICIPO ENTREGADO	\$ -
REINICIO	NO APLICA	NUEVO SALDO	\$ 194.877.405,00
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE FEBRERO DE 2026	VALOR PAGADO	\$ -
% AVANCE FÍSICO ACTUAL	100,00%	VALOR EN TRÁMITE	\$ -
% AVANCE PROGRAMADO	100,00%	% AVANCE FINANCIERO	0,00%
% AVANCE FÍSICO ANTERIOR	0,00%	VALOR RESTANTE POR PAGAR	100,00%
% AVANCE PROGRAMADO ANTERIOR	0,00%	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	NO APLICA
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO	100,00%	% AMORTIZADO DEL ANTICIPO	NO APLICA
% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	100,00%	OBSERVACIONES FINANCIERAS	
INTERVENTOR	NO APLICA	NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME	
SUPERVISOR	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	BRAINER ALFONSO JURADO ZAMBRANO		

GRAFICA No 1. AVANCE FÍSICO

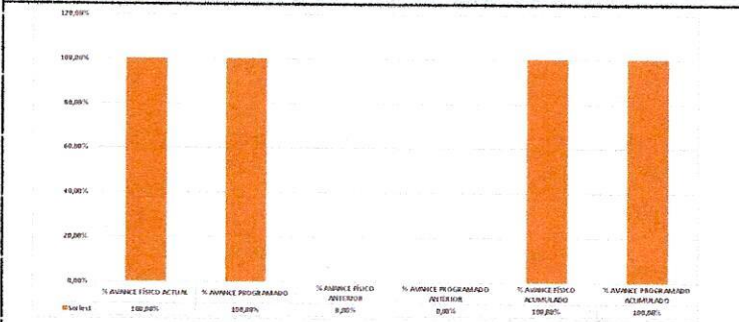

GRAFICA. AVANCE FINANCIERO

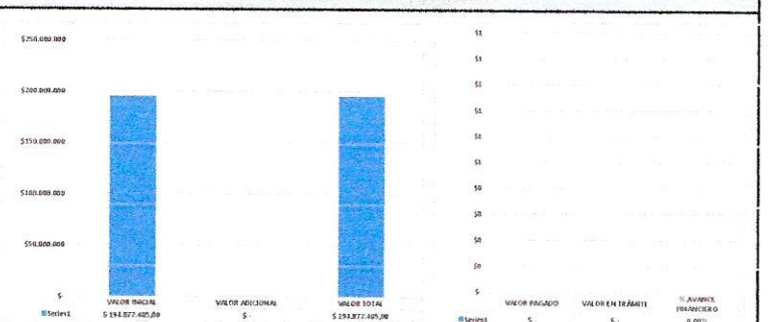

OBSERVACIONES

Para el presente periodo de ejecución del 24 de diciembre de 2025 al 05 de febrero de 2026, el contrato de obra No. 535 de 2025 presenta un avance físico acumulado del 100% vs un avance programado acumulado del 100%, presentando un estado de terminado del presente contrato.

El 31 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta No. 1 Prórroga al contrato No. 535 de 2025, se realiza la presente prórroga en las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERO: - PRORROGAR el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato No. 535 de 2025 hasta el 05 de febrero de 2026.

El 05 de febrero de 2026 se suscribió el Acta No. 2 Modificatoria al contrato No. 535 de 2025, se realizan las siguientes modificaciones mediante las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. - MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA - LITERAL B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: A. ACTIVIDADES A REALIZAR, estableciendo las cantidades requeridas para cada uno de los ítems así (...). SEGUNDA - MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, en lo referente al cuadro del presupuesto quedando de la siguiente manera así (...).

El 05 de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Terminación del Contrato de Obra No. 535 de 2025 con pendientes administrativos y técnicos.

RELACIÓN DE PÓLIZAS

CONCEPTO DE PÓLIZA	No DE PÓLIZA	ASEGURADORA	CUANTÍA	DESDE	HASTA	APROBADA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	NB-100424244	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	\$ 116.926.443,00	24/12/2025	5/02/2031	31/12/2025
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	NB-100112888	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	\$ 284.700.000,00	23/12/2025	5/02/2026	31/12/2025

[Firma manuscrita]

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión i
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME

24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026


CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025

RELACION DE PERSONAL MINIMO EXIGIDO


DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL	NOMBRE DEL PROFESIONAL	C.C	DEDICACIÓN	PERIODO
RESIDENTE DE OBRA	SARA LUCIA ROBLES RODRIGUEZ	1.099.208.255	100%	24/12/2025 - 05/02/2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ÍTEM 1.01 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, DEMOLICIÓN DE FRISO, DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS, DEMOLICIÓN DE MEDIACAÑAS Y ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

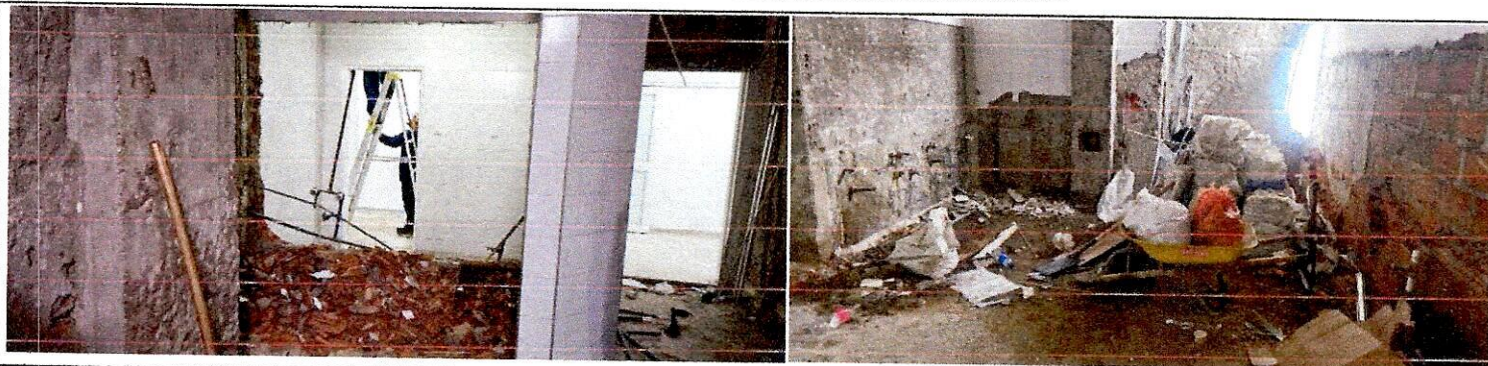

ÍTEM 1.02 DEMOLICIÓN DE MUROS EN DRYWALL O FIBROCEMENTO A DOS CARAS. INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

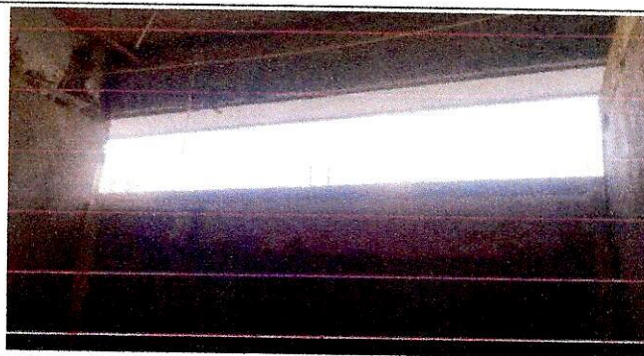

ÍTEM 1.03 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES (INCLUYE DEMOLICION FRISO) Y ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

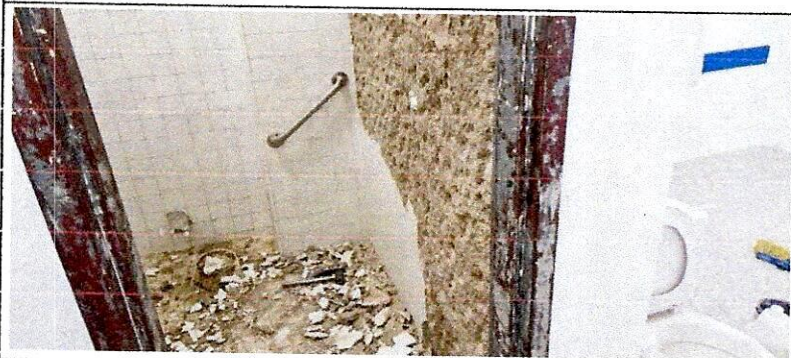

[Handwritten signature]

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME

24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


ÍTEM 1.04 DESMONTE DE LAVAMANOS CONVENCIONAL. INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS



ÍTEM 1.05 DESMONTE DE APARATO SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL Y/O CONVENCIONAL. INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS E ÍTEM 1.06 DESMONTE DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA



ÍTEM 1.08 DESMONTE DE REDES ELÉCTRICAS. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, APARATOS Y CABLEADO DISTANCIAS ENTRE 0 Y 15 METROS, INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

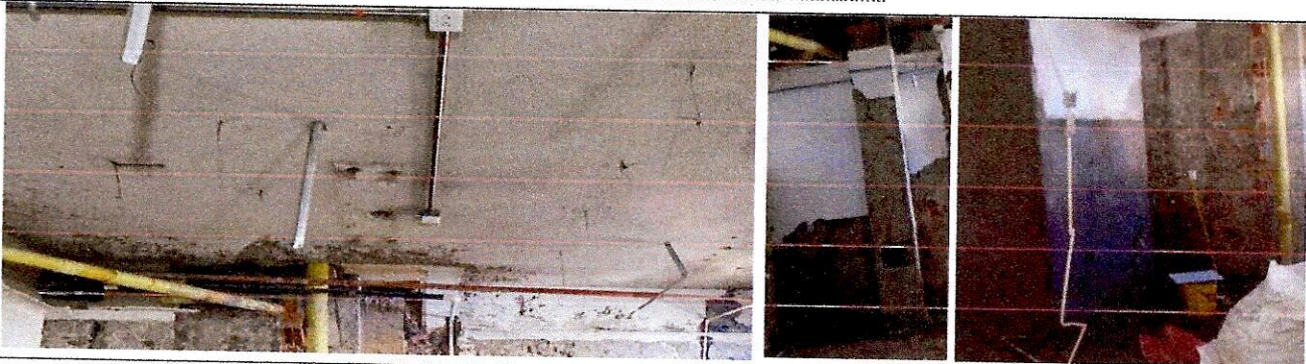

ÍTEM 1.09 DESMONTE DE REDES HIDRÁULICAS DISTANCIA ENTRE 0 Y 20 METROS. INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS E ÍTEM 1.10 DESMONTE DE REDES SANITARIAS DISTANCIA ENTRE 0 Y 20 METROS. INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS



[Handwritten signature]


INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FU-47, Versión i
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME


1
24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


ÍTEM 1.11 DESMONTE DE PUERTAS Y/O VENTANAS. INCLUYE RETIRO DE MARCOS. INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

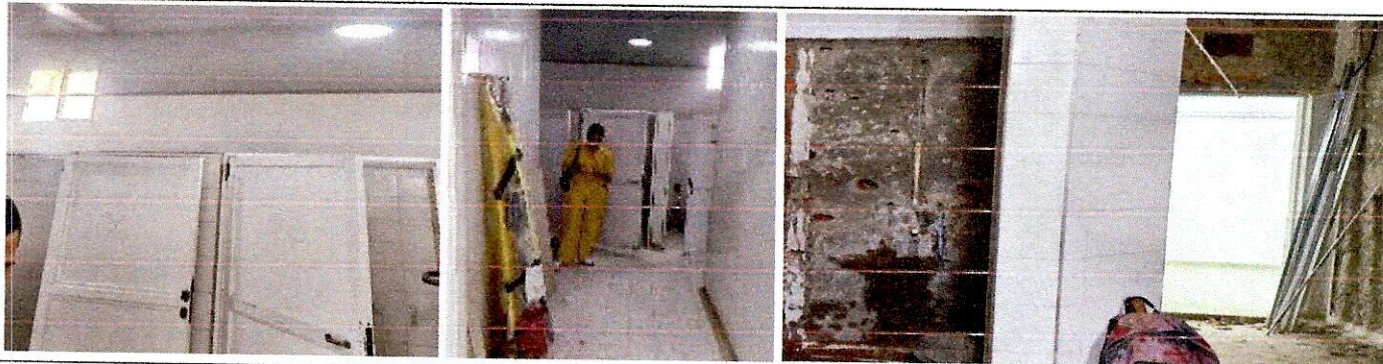

ÍTEM 1.16 PERFORACIÓN EN PLACA PARA RED SANITARIA D=3". INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

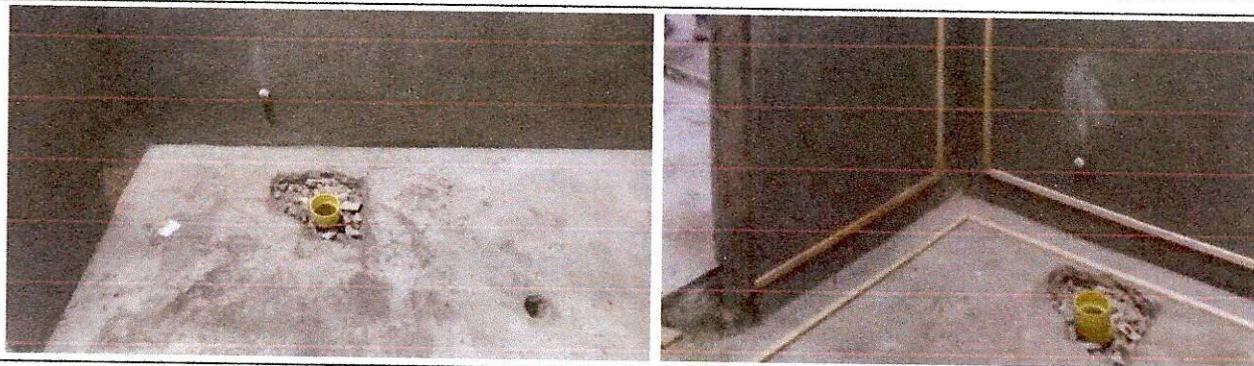

ÍTEM 1.17 PERFORACIÓN EN PLACA PARA RED SANITARIA D=5". INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

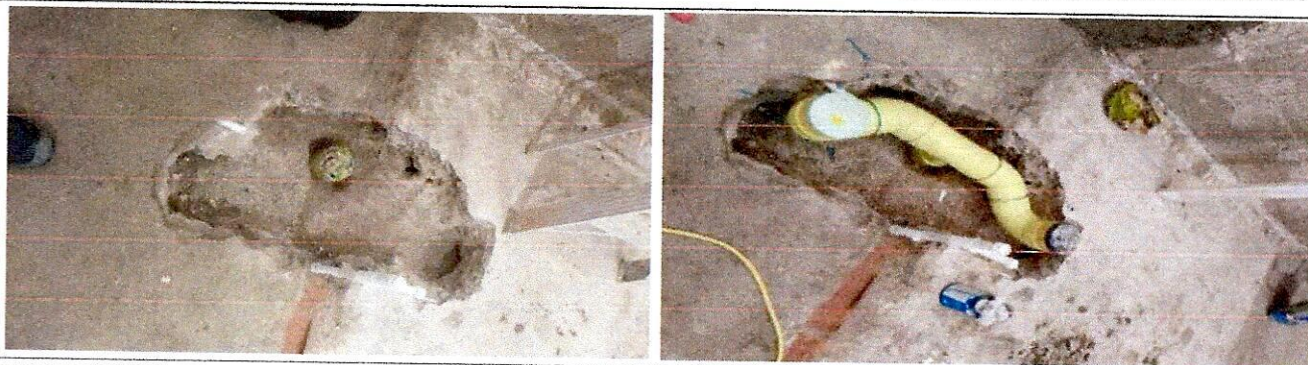

ÍTEM 1.20 DESMONTE DE DUCHAS, INCLUYE RETIRO DE MEZCLADOR, TUBERÍA Y ACCESORIOS. INCLUYE ACARREO INTERNO HASTA ÁREA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA DEPÓSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS



[Handwritten signature]

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión i
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME


24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


ITEM 1.21 TRASLADO DE BAJANTE AGUAS NEGRAS INCLUYE CORTE DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO. INCLUYE INSTALACION DE ACCESORIO DE LIMPIEZA, CAMBIO DE TUBERIA EXISTENTE Y CONTINGENCIA. INCLUYE : 2 SEMICODOS, 1 YEE, 1 TAPON DE PRUEBA EN 4",.




ITEM 2.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CON VARILLA DE 1/2" LONG - 0,40M Y EPÓXICO DE FIJACIÓN, EMBEDIDA 10 CM EN PLACA DE CONCRETO EXISTENTE

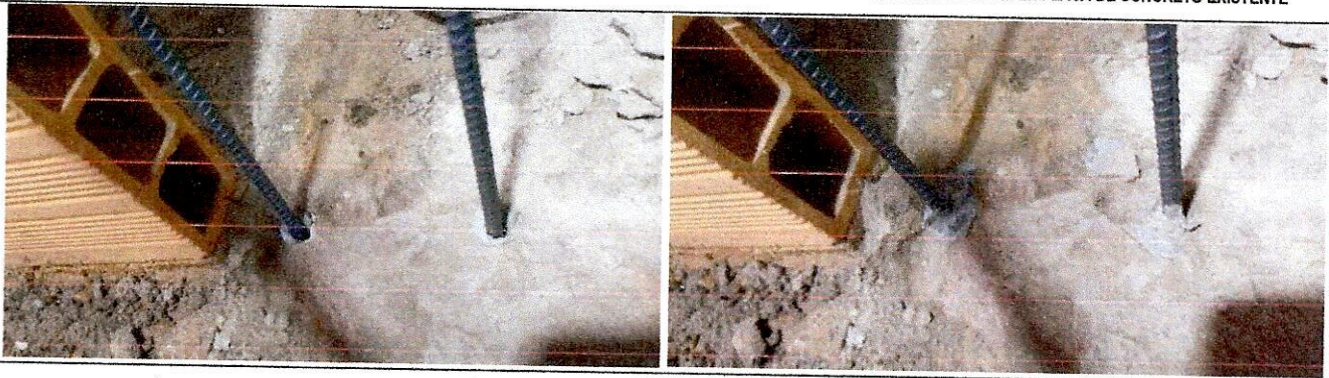

ITEM 2.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS DE 0,10 X 0,20 M, INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA

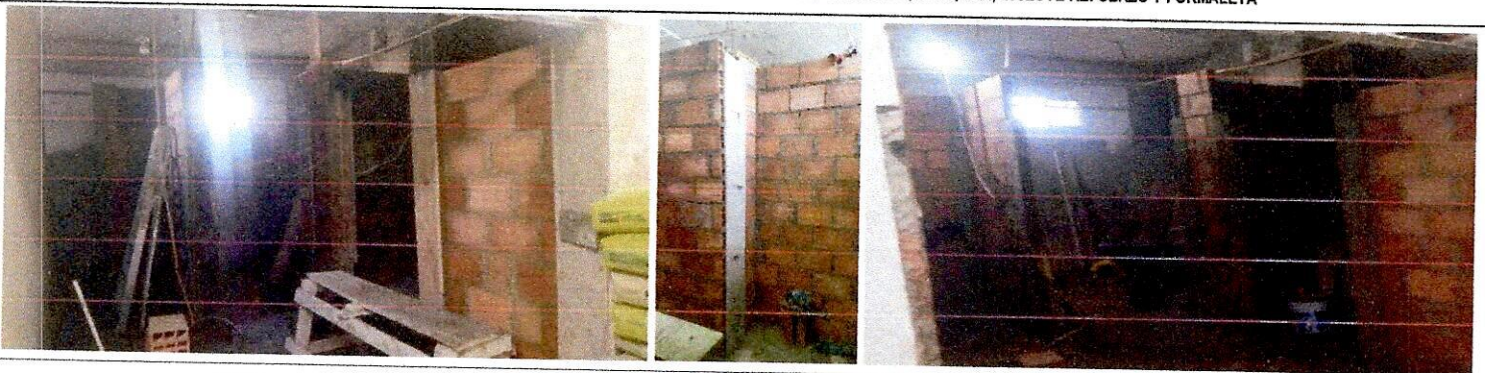

ITEM 2.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE AMARRE DE 0,10 X 0,20 M, INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA

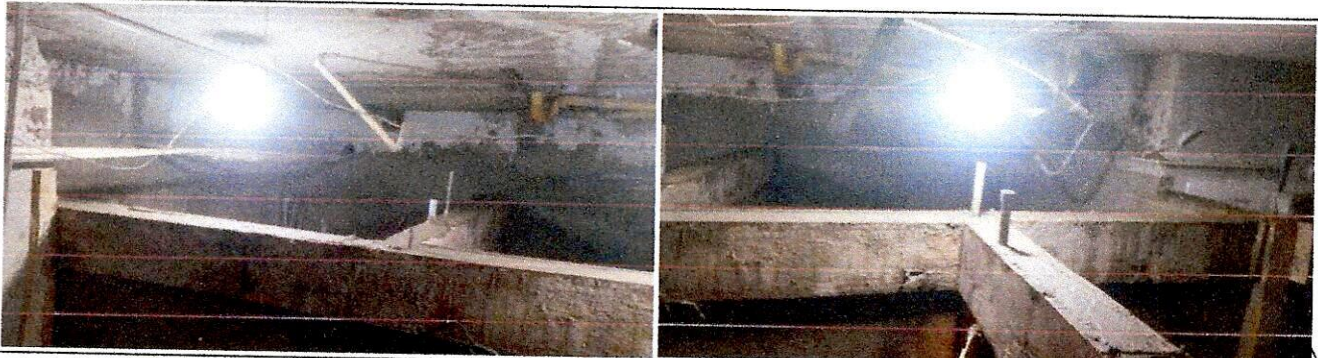

[Handwritten signature]

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión i
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO



No. INFORME

PERIODO DEL INFORME

1

24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


ÍTEM 2.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTEL DE 0,12 X 0,15 M. INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA




ÍTEM 3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA D=1/2" (LAVAMANOS-LAVAP-LAVADERO-ORINAL-SAN). INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN



ÍTEM 3.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P D=1/2" RDE 9. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTERÍA

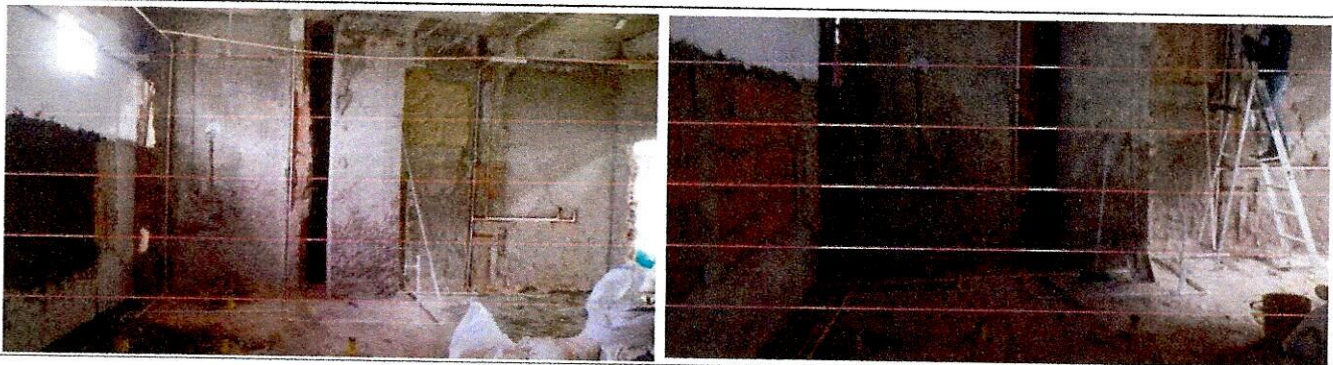

ÍTEM 3.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P D=3/4" RDE 11. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTERÍA

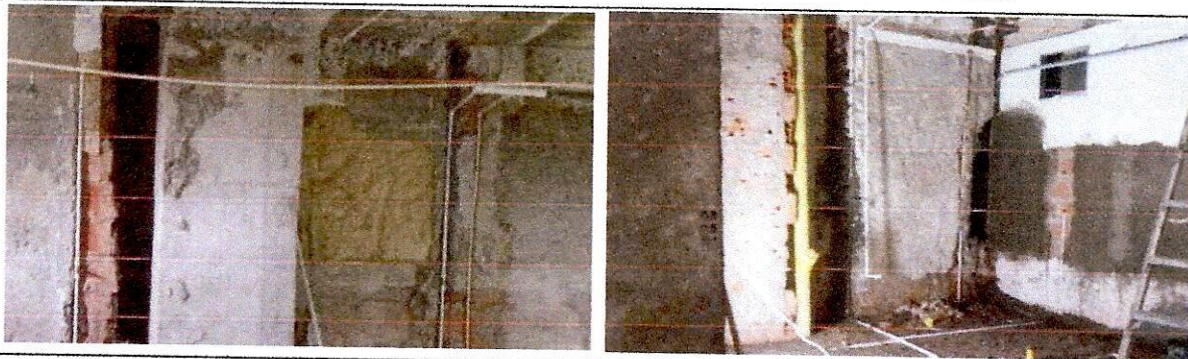

[Handwritten signature]

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME

1
24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


ÍTEM 3.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO D=3/4"




ÍTEM 3.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO D=2", INCLUYE SIFON



ÍTEM 3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO D=4"

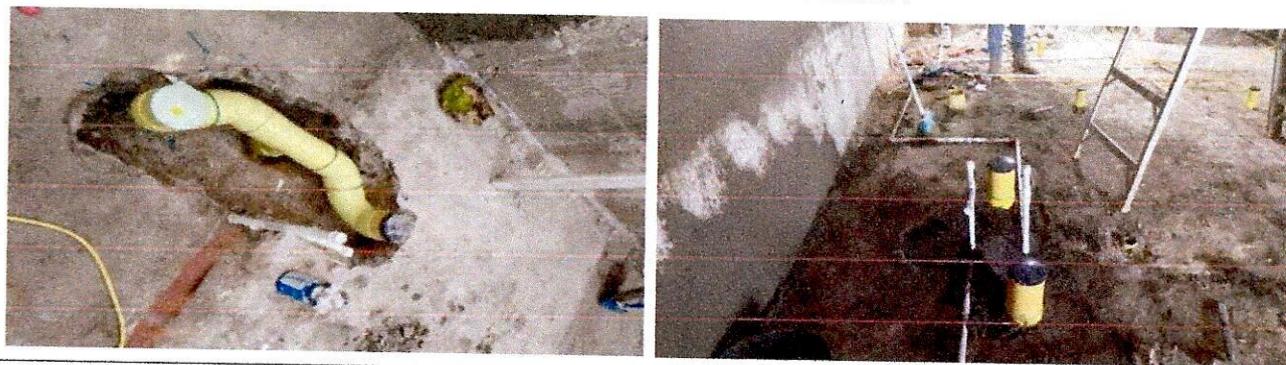

ÍTEM 3.21 EMPALME DE TUBERIA PRESIÓN DE 1 1/2" A 3/4"

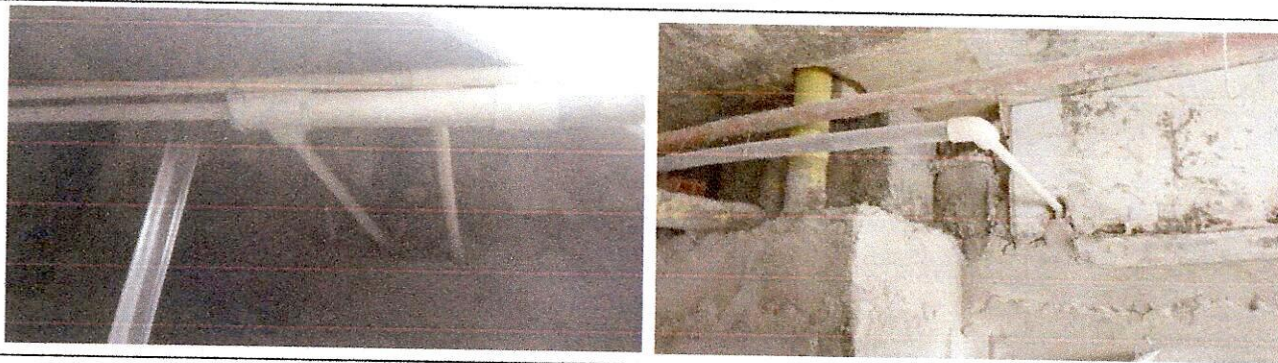

[Handwritten signature]


INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME

1
24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


ÍTEM 4.01 E ÍTEM 4.02 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN FIBROCEMENTO UNA CARA, EN LÁMINA DE 8 MM. INCLUYE ACABADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL

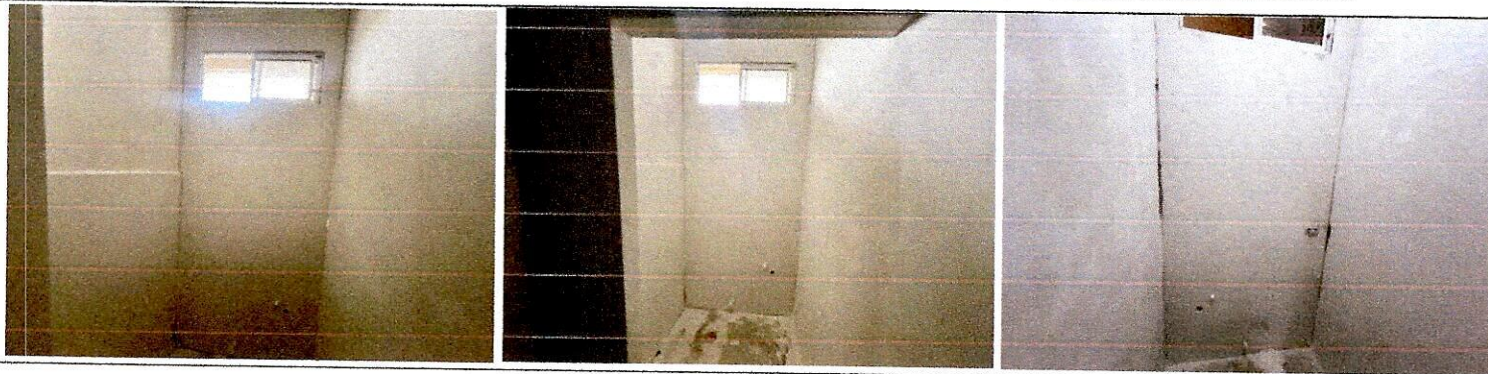


ÍTEM 4.03 E ÍTEM 4.04 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA H-10 LADRILLO COCIDO (10X30X20CM), INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA DE 3/8"



ÍTEM 5.01 E ÍTEM 5.02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FRISO IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

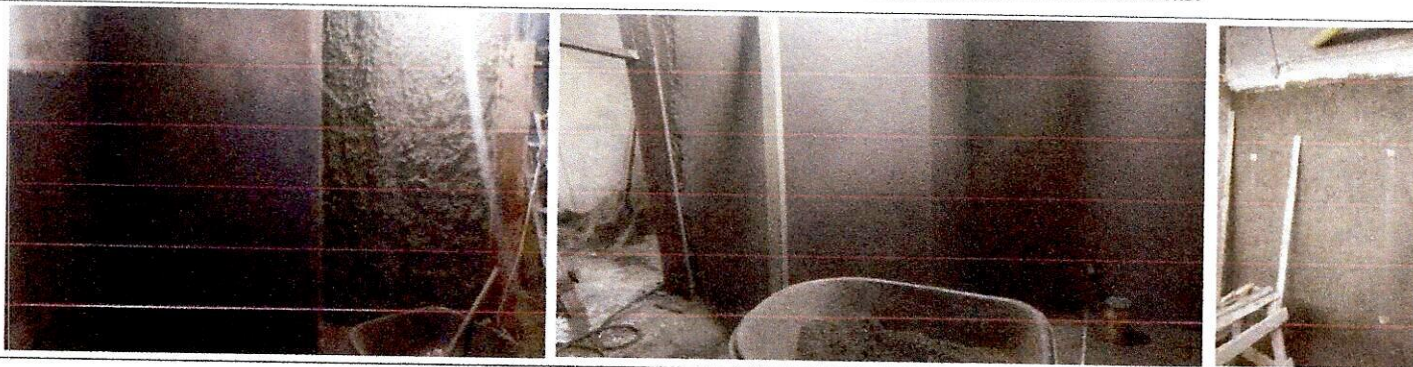

ÍTEM 6.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

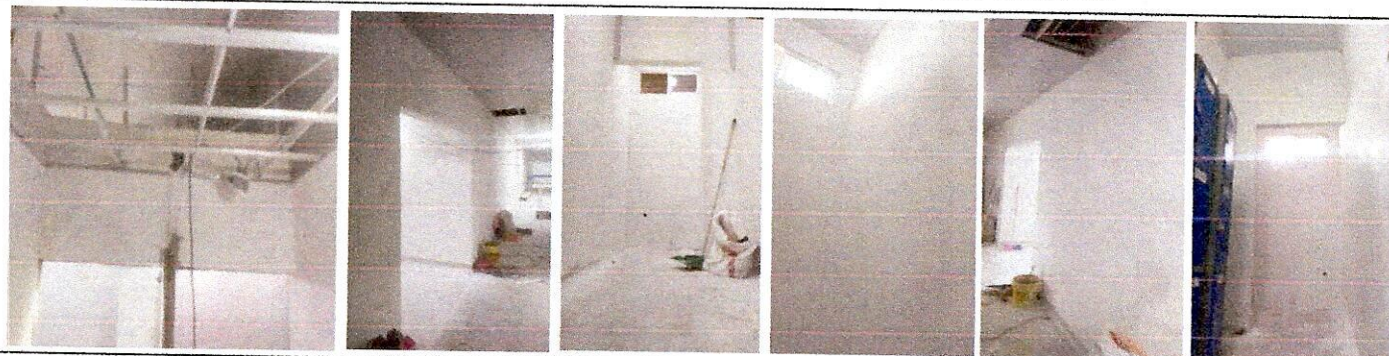

[Handwritten signature]


INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME

24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025

ÍTEM 6.02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL SOBRE MUROS A TRES MANOS. INCLUYE UNA MANO DE PINTURA TIPO 1 COMO BASE ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA ANTIBACTERIAL

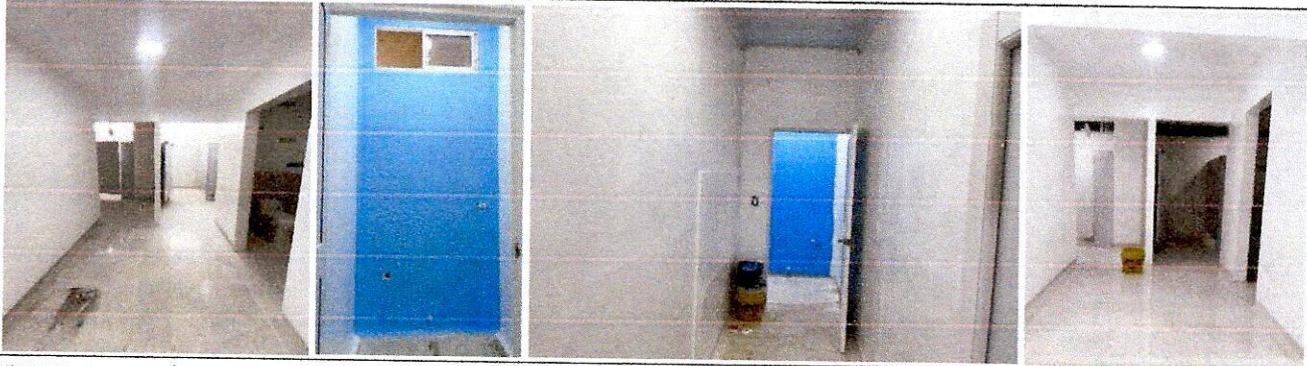


ÍTEM 6.03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL BAJO TECHO A TRES MANOS (CARACTERÍSTICAS BRILLANTES Y COLOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD). INCLUYE UNA MANO DE PINTURA TIPO II COMO BASE ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA ANTIBACTERIALANTIBACTERIALANTIBACTERIAL



ÍTEM 7.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN ESPESOR HASTA E=6 CM



ÍTEM 7.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN CERÁMICA TRAFICO 5

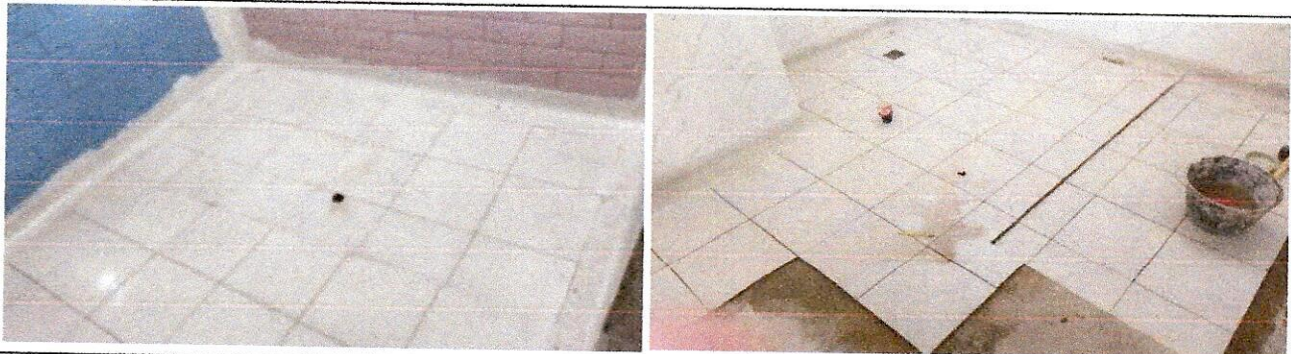

Handwritten signature


INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME


24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025

ÍTEM 8.03 E ÍTEM 8.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE MUROS EN CERÁMICA TIPO RECTIFICADO

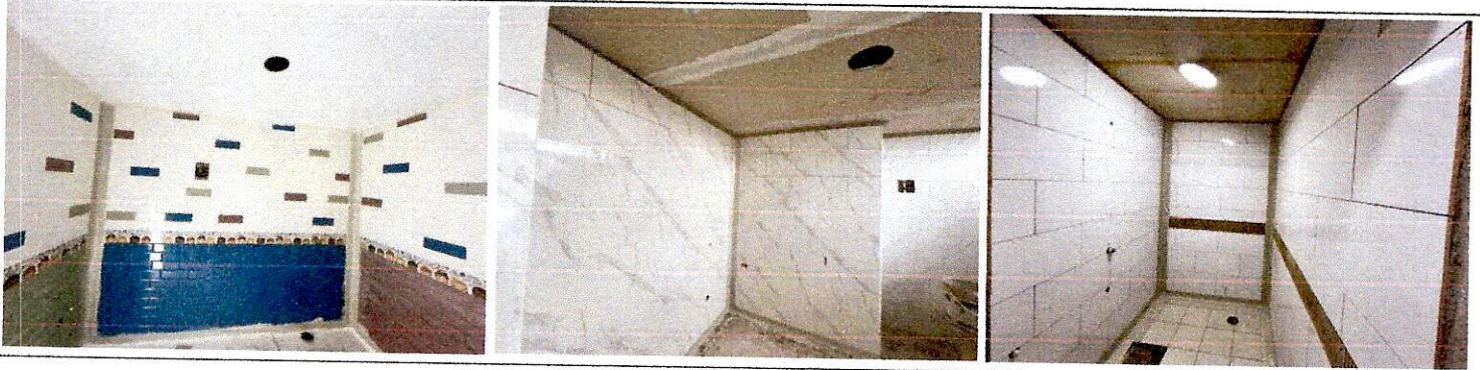

ÍTEM 8.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA SEGÚN DISEÑO

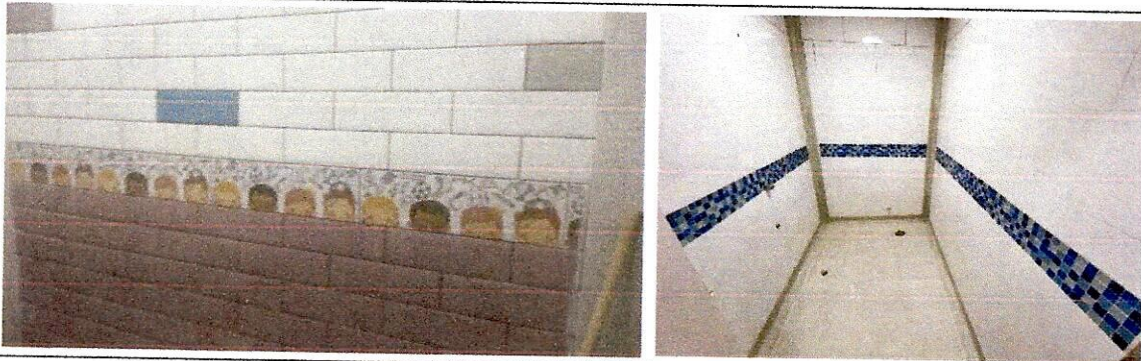

ÍTEM 8.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN YESO LATEX (MURO-MURO, MURO-TECHO)



ÍTEM 9.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL TIPO TANQUE. INCLUYE BRIDA, GRIFERÍA, ACTIVIDADES DE CONEXIÓN A DESAGÜE, VÁLVULA REGULADORA DE PASO DE 1/2" Y MATERIAL DE PEGA A PISO EXISTENTE



[Handwritten signature]

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME

1
24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025

ÍTEM 9.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE BRIDA, GRIFERÍA, ACTIVIDADES DE CONEXIÓN A DESAGÜE, VÁLVULA REGULADORA DE PASO DE 1/2" Y MATERIAL DE PEGA A PISO EXISTENTE



ÍTEM 9.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO KIDDY O SIMILAR INSTITUCIONAL. INCLUYE BRIDA, GRIFERÍA, ACTIVIDADES DE CONEXIÓN A DESAGÜE, VÁLVULA REGULADORA DE PASO DE 1/2" Y MATERIAL DE PEGA A PISO EXISTENTE



ÍTEM 9.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL PARA ADULTOS, ANCLAJE A PARED, INCLUYE GRIFERÍA (PUSH/DESCARGA), ACTIVIDADES DE CONEXIÓN A DESAGÜE Y VÁLVULA REGULADORA DE PASO 1/2"



ÍTEM 9.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TELEFONO



[Handwritten signature]


INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME


24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025


ÍTEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO, A=0.25M. INCLUYE DILATACIÓN

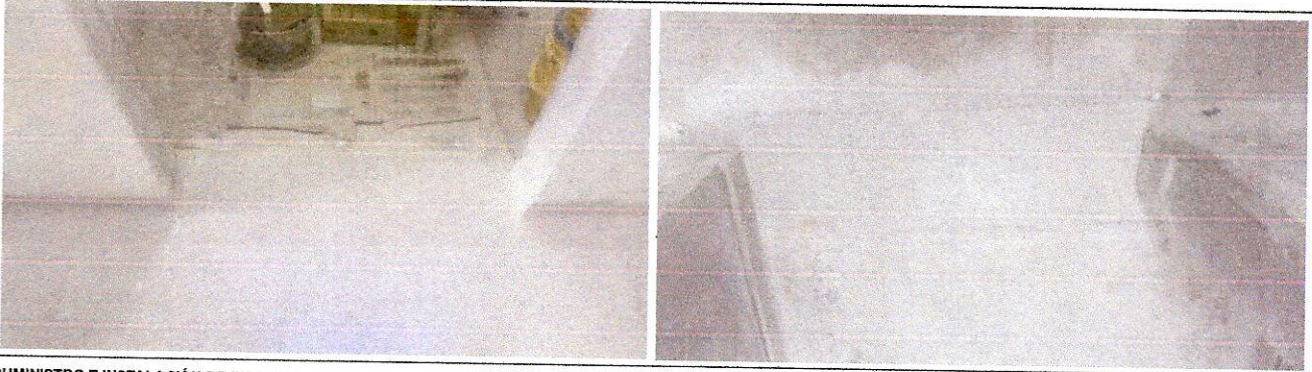


ÍTEM 7.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL. INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, CRISTALIZADA Y DILATACION PLASTICA (FORMATO 33X33 Y/O 30 X30 CM)

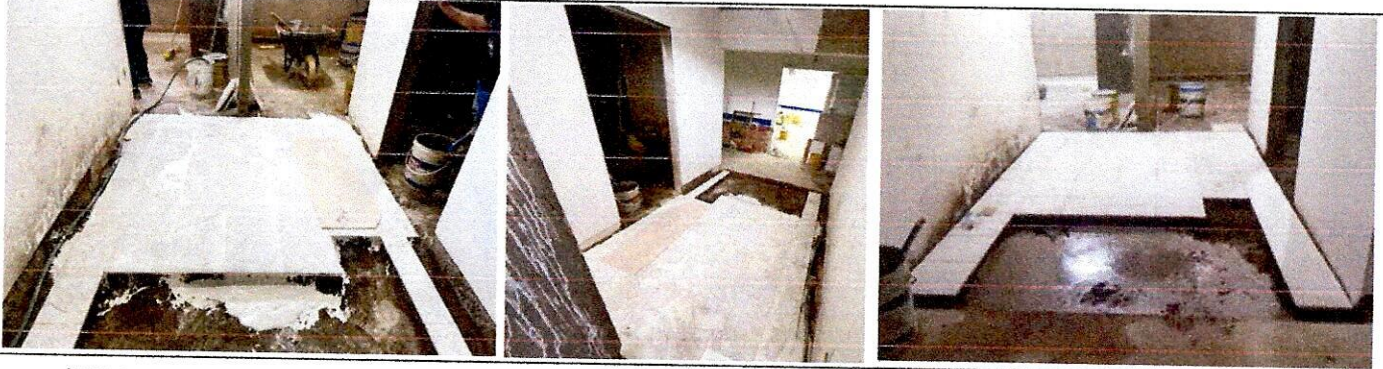

ÍTEM 8.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO (MURO-PISO). INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y CRISTALIZADA Y DILATACION PLASTICA

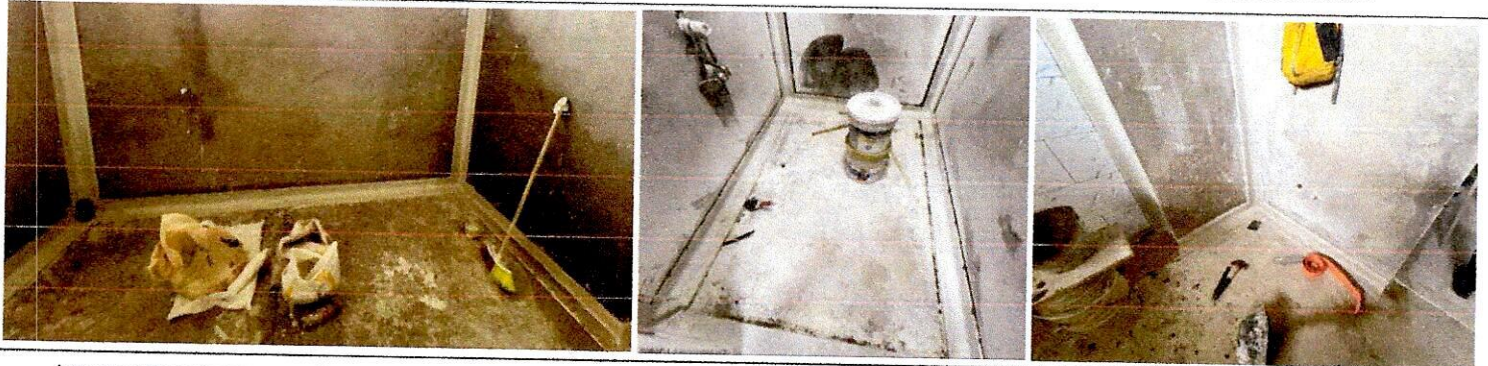

ÍTEM 8.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO (MURO-MURO MURO -TECHO). INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y CRISTALIZADA Y DILATACION PLASTICA

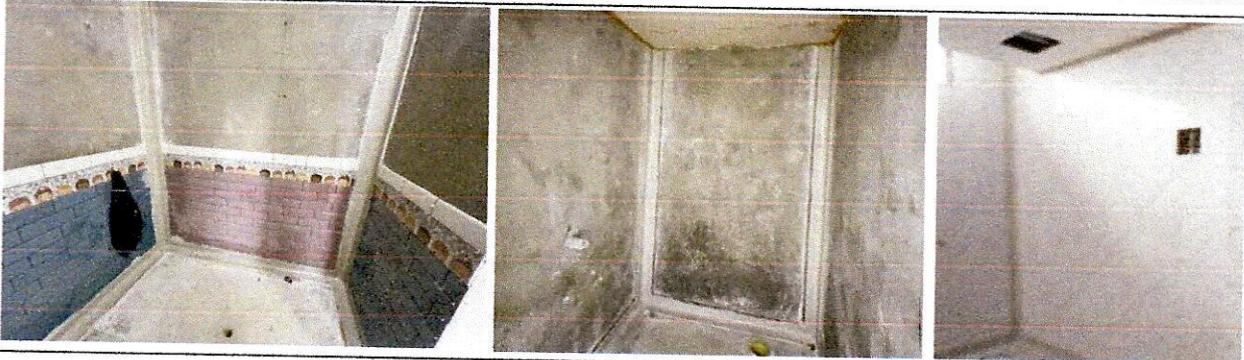

[Handwritten signature]

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME



1
24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025

ÍTEM 9.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PARED INSTITUCIONAL. INCLUYE GRIFERIA, ANCLAJE A PARED, TUBERÍAS DE CONEXIÓN, TUBERÍA DE DESAGÜE Y VÁLVULA REGULADORA DE PASO DE 1/2"




ÍTEM 9.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN TIPO PARAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO (BISAGRAS, SEGUROS, PINES, ÁNGULOS Y PLATINAS)

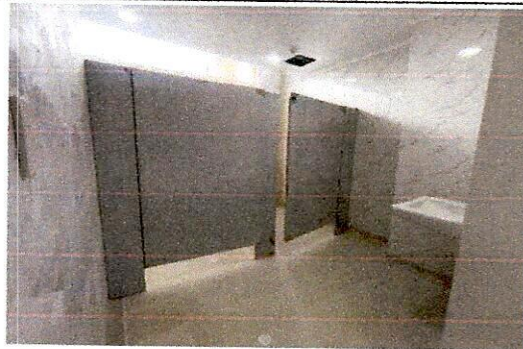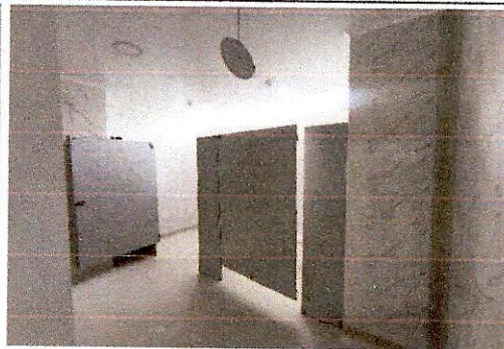

ÍTEM 9.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y/O BATIENTE PARA AMBIENTES DE BAÑOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE ANCLAJE, INCLUYE MARCO (BISAGRAS, PINES, ÁNGULOS PLATINAS ENTRE OTROS) . SEGÚN COLOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD. CONSTRUIDA EN MATERIAL ANTIBACTERIAL Y CON PROPIEDADES RESISTENTES A LA HUMEDAD. INCLUYE PEGATINA ALUSIVA AL AMBIENTE



ÍTEM 10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO O SIMILAR EN LÁMINA DE 6 MM. INCLUYE ESTRUCTURA, ACABADO Y REVESTIMIENTO EN PINTURA ANTIBACTERIAL

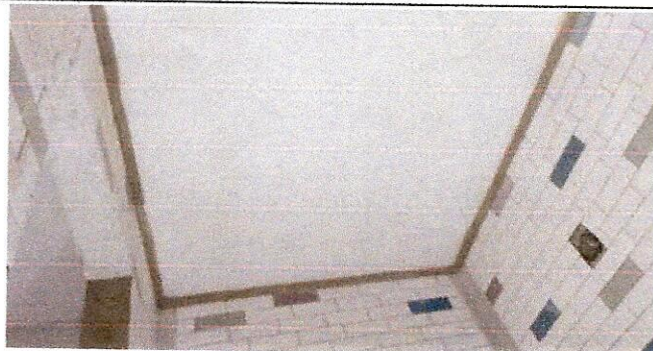

[Handwritten signature]

INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA Y/O INTERVENTORIA
GAF-IFR-FO-47, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

No. INFORME
PERIODO DEL INFORME



1
24 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 535 DE 2025

ÍTEM 11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN



ÍTEM 12.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL. INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL

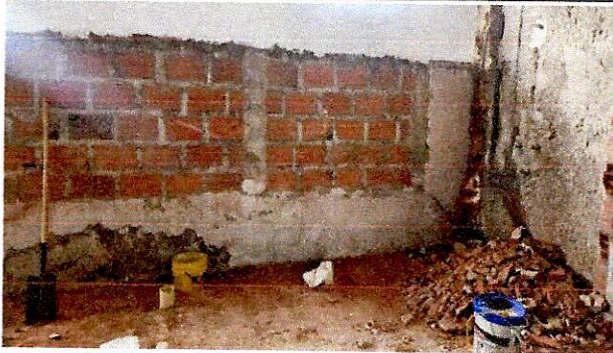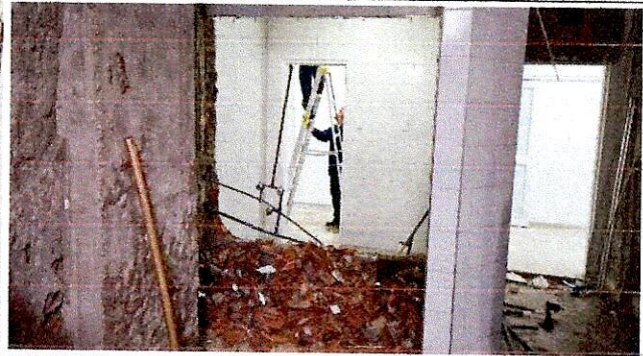

ÍTEM 12.02 RETIRO DE MATERIAL SOBANTE. INCLUYE TRASLADO A ESCOMBRERA Y/O SITIO AUTORIZADO



VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESE HUS
Supervisor

BRAINER ALFONSO JURADO ZAMBRANO
INGENIERO CIVIL
Apoyo Técnico a la Supervisión - CPS
