


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 1 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA – URGENCIA MANIFIESTA
N° DE CONTRATO	UM-SP-001-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C. NO. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ.
CONTRATISTA CC/ NIT	INGEOBRAS QHSE SAS NIT. NO. 900.629.789 LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C. NO. 1.048.849.895 DE GARAGOA - BOYACA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA QUEBRADA LA ARGENTINA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR PROCESOS DE SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN EN MASA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BOCATOMA Y TARABITAS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA CRISTALINA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 067 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$306.412.427,86) M/CTE.
CDP	202510002 DE 02 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	202510007 DE 07 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS – 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR CC / NIT	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C. 1.022.441.323 de BOGOTÁ ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ C.C No. 1.018.434.016 DE BOGOTÁ
INTERVENTOR CC / NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA N°1	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 Plazo: Cuarenta (40) días – 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DE LA ADICION N°1	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$84.515.855,73) M/CTE
CDP ADICION No. 1	202511021 de 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
RP ADICION No. 1	202511026 de 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$390'928.283,59) M/CTE.
PLAZO TOTAL	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS
SUSPENSION No 1	Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Plazo: veinte (20) días calendario – 11 enero de 2026

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE Santa María	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 2 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

AMPLIACION No1 A LA SUSPENSION No1	Fecha: 09 DE ENERO DE 2026 Plazo: Diez (10) días calendario – 21 enero de 2026
REINICIO No 1	Fecha: 21 DE ENERO DE 2026 Plazo por ejecutar: ocho (08) días calendario
PRORROGA No 2	Fecha: 26 DE ENERO DE 2026 Plazo: Treinta (30) días calendario – 27 de febrero 2026
PERIODO DE EJECUCION	29 DE ENERO DE 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	10 MARZO DE 2026

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

❖ ADRIAN RIVERA BALLESTEROS

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-09	2025/11/26	\$38,900
SALUD	2025-10	2025/11/26	\$9,800
RIESGOS PROFESIONALES	2025-09	2025/11/26	\$17,650
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$121.500
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$30,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$52,900
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	45,000
SALUD	2025-12	2026/01/16	11,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	19,900
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	45,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	11,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	19,900
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	\$18.700
SALUD	2026-2	2026/02/17	\$4.700
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	\$8.200

❖ FREDY ALEXANDER DUARTE PEREZ

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-09	2025/11/26	\$184,750
SALUD	2025-10	2025/11/26	\$46,333
RIESGOS PROFESIONALES	2025-09	2025/11/26	\$80,350
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$121,500
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$30,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$52,900
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	227,800
SALUD	2025-12	2026/01/16	57,000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	99,100

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 3 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		



PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	174,700
SALUD	2026-01	2026/01/19	76,000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	76,000
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ OSMAR FABIAN MORALES NOVOA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-09	2025/11/26	\$186,300
SALUD	2025-10	2025/11/26	\$46,333
RIESGOS PROFESIONALES	2025-09	2025/11/26	\$80,350
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$121,500
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$30,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$52,900
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$227,800
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$57,000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$99,100
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$174,700
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$43,700
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$76,000
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-09	2025/11/26	\$40,450
SALUD	2025-10	2025/11/26	\$10,233
RIESGOS PROFESIONALES	2025-09	2025/11/26	\$17,650
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$121,500
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$30,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$52,900
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$45,600
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$11,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$19,900
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$38,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$9,500
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$16,600
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	\$18.700
SALUD	2026-2	2026/02/17	\$4.700
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	\$8.200

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 4 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

❖ CARLOS JULIO CRUZ VERA



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-09	2025/11/20	\$7,800
SALUD	2025-10	2025/11/20	\$2,000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-09	2025/11/20	\$3,500
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$121,500
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$30,400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$52,900
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$227800
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$57000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$99100
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100

❖ ENRIQUE TORRES SEGURA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$53,200
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$13,300
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$23,200
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$227800
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$57000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$99100
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ WILLIAM ERNESTO ALGARRA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$53,200
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$13,300
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$23,200
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$227800
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$57000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$99100
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 5 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
-----------------------	---------	------------	---------

❖ LUIS ENRIQUE GARCIA



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-10	2025/11/20	\$15,200
SALUD	2025-11	2025/11/20	\$3,800
RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025/11/20	\$6,700
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$227800
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$57000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$99100
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ DANY LEONARDO CRUZ VERA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$83600
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$20900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$36400
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ HECTOR JULIO CRUZ VERA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$83600
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$20900
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$36400
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 6 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

❖ JOSE LEONARDO MARTINEZ RODRIGUEZ

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-11	2026/01/16	\$197400
SALUD	2025-12	2026/01/16	\$49400
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2026/01/16	\$85900
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ MAURICIO LOZANO

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ LUIS ALBERTO CUFÍÑO GOMEZ



ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$76,000
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100
PENSIÓN	2026-01	2026/02/17	93.400
SALUD	2026-2	2026/02/17	23.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026/02/17	40.700

❖ JOSE GUILLERMO TOLOZA PARRA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	N/A
SALUD	2026-01	2026/01/19	\$19000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$33100

❖ ADONAY TORRES SEGURA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025-12	2026/01/19	\$38,000

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 7 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

SALUD	2026-01	2026/01/19	\$9,500
RIESGOS PROFESIONALES	2025-12	2026/01/19	\$16,600

2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

AMPAROS QUE CUBRE	VALOR DE LA GARANTÍA	SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	10% Del valor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato y 4 meses más.	
	\$39.092.828,36	Desde: 26/enero/2026	Hasta: 05/julio/2026
ESTABILIDAD DE OBRA	20% Del valor del Contrato	Un término no inferior a 2 años a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe la obra	
	\$78.185.656,72	Desde: 05/marzo/2026	Hasta: 05/marzo/2028
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% Del valor del Contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más	
	\$19.546.414,18	Desde: 26/enero/2026	Hasta: 05/mayo/2029

3. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPAROS QUE CUBRE	VALOR DE LA GARANTÍA	SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONALES	200 smmlv	Plazo de ejecución del contrato.	
	\$350.181.000,00	Desde: 04/octubre/2025	Hasta: 05/marzo/2026



4. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL MISMO CONTRATISTA.

NOMBRE Y CEDULA	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
N/A	N/A	N/A

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 0	\$ 306.412.427,86
VALOR ANTICIPO	\$ 0	\$ 0
VALOR ADICIONAL N°1	\$ 0	\$ 84.515.855,73
VALOR ACTAS CANCELADAS	\$ 298.286.627,52	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 92.641.656,07	\$ 0
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 390.928.283,59	\$ 390.928.283,59

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 8 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

6. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

7. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES

9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
		100 %



10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, FACTURA N°FE64, CERTIFICADO BANCARIO, RUT Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			








11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

SE REALIZA INFORME DE SUPERVISIÓN CONFORME AL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS..

- La prestación de los servicios se cumple a cabalidad acorde a los compromisos acordados por la entidad.

<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 9 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		

12. REGISTRO FOTOGRAFICOS

   	  
<p>ANTES: QUEBRADA LA ARGENTINA</p>	<p>DESPUES: QUEBRADA LA ARGENTINA</p>



ANTES: CUJA CRUCE QUEBRADA LA CRISTALINA

DESPUES: CUJA CRUCE QUEBRADA LA CRISTALINA



ANTES: CUBIERTA TANQUES BOCATOMA

DESPUES: CUBIERTA TANQUES BOCATOMA

<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 12 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		





ANTES: CUJA BOCATOMA CRISTALINA

DESPUES: CUJA BOCATOMA CRISTALINA




<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 13 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		

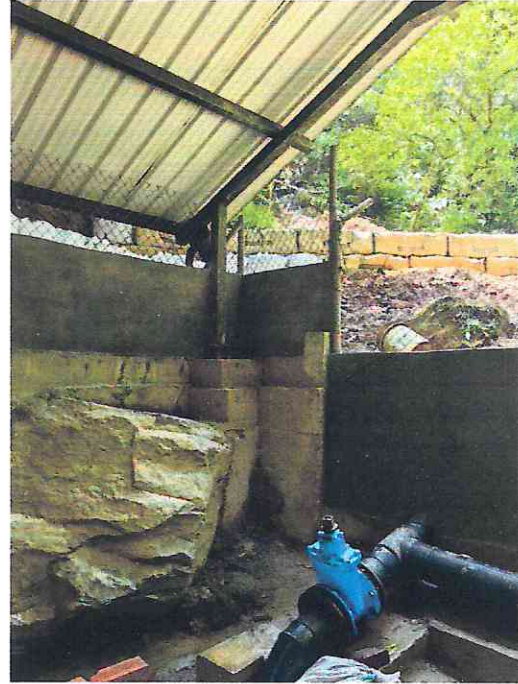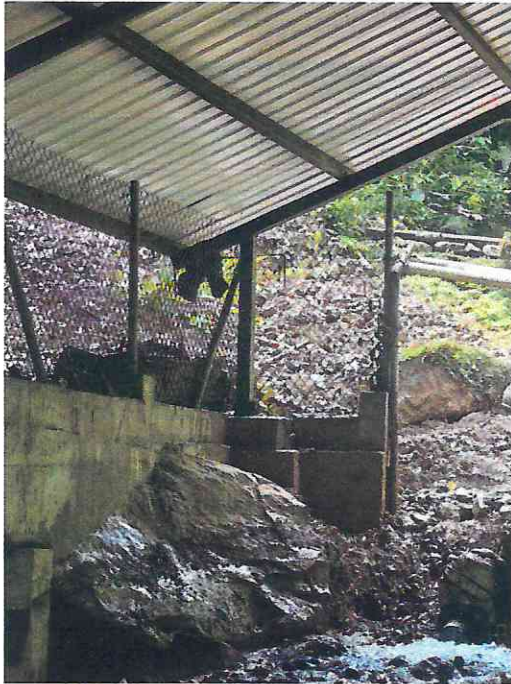



ANTES: CERRAMIENTO TANQUES BOCATOMA

DESPUES: CERRAMIENTO MURO EN LADRILLO,
COLUMNAS EN CONCRETO BOCATOMA
CRISTALINA

<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 14 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		




<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 15 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		





ANTES: PASO ELEVADO RED ADUCCION
BOCATOMA

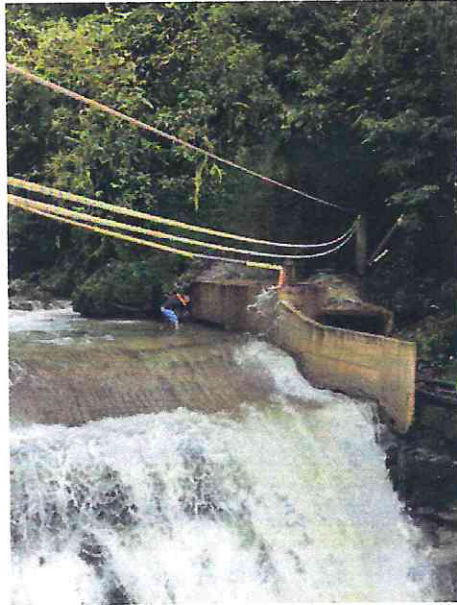DESPUES: PASO ELEVADO RED ADUCCION
BOCATOMA





ANTES: ESTRUCTURA DE CAPTACION
BOCATOMA



DESPUES: PASO ELEVADO RED ADUCCION
BOCATOMA

<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 16 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		







<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 17 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		



<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 18 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		



<p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</p> 	<p>REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA</p>	<p>FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</p>		
	<p>GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>Versión: 02</p>	<p>Pág. 19 de 20</p>	
	<p>PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</p>	<p>Fecha: 25/07/2023</p>		

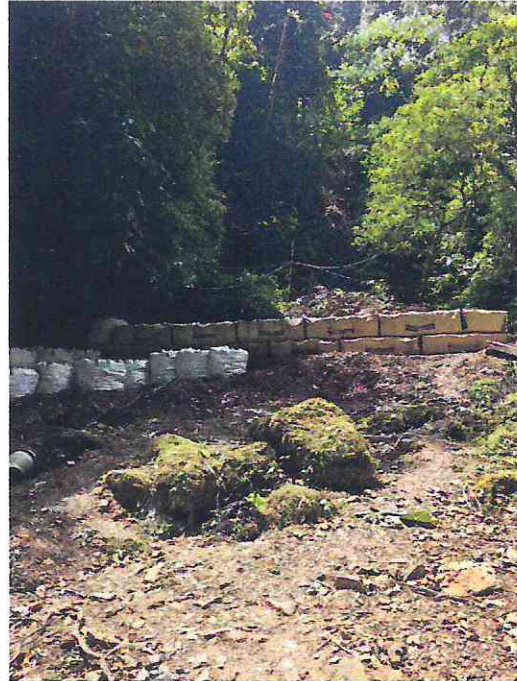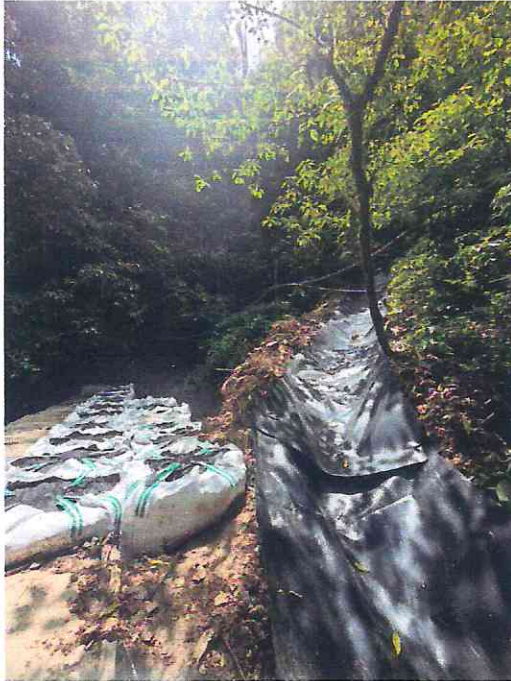





ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 20 de 20	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de marzo de 2026


DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
 secretario de Planeación e Infraestructura




BRAIAM ALEXIS MARTINEZ
 Director unidad de servicios públicos.

PROYECTÓ	REVISÓ		APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ	RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ
Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Director USPD	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 1 de 3	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA – URGENCIA MANIFIESTA
Nº DE CONTRATO	UM-SP-001-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C. NO. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ.
CONTRATISTA CC/ NIT	INGEOBRAS QHSE SAS NIT. NO. 900.629.789 LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C. NO. 1.048.849.895 DE GARAGOA - BOYACA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA QUEBRADA LA ARGENTINA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR PROCESOS DE SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN EN MASA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BOCATOMA Y TARABITAS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA CRISTALINA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 067 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$306.412.427,86) M/CTE.
CDP	202510002 DE 02 DE OCTUBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	202510007 DE 07 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS – 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR CC / NIT	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C. 1.022.441.323 de BOGOTÁ ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ C.C No. 1.018.434.016 DE BOGOTÁ
INTERVENTOR CC / NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA Nº1	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 Plazo: Cuarenta (40) días – 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DE LA ADICION Nº1	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$84.515.855,73) M/CTE
CDP ADICION No. 1	202511021 de 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 2 de 3	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		



RP ADICION No. 1	202511026 de 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$390'928.283,59) M/CTE.
PLAZO TOTAL	OCHENTA Y CINCO (85) DIAS
SUSPENSION No 1	Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Plazo: veinte (20) días calendario – 11 enero de 2026
AMPLIACION No1 A LA SUSPENSION No1	Fecha: 09 DE ENERO DE 2026 Plazo: Diez (10) días calendario – 21 enero de 2026
REINICIO No 1	Fecha: 21 DE ENERO DE 2026 Plazo por ejecutar: ocho (08) días calendario
PRORROGA No 2	Fecha: 26 DE ENERO DE 2026 Plazo: Treinta (30) días calendario – 27 de febrero 2026
PERIODO DE EJECUCION	29 DE ENERO DE 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	10 MARZO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de alcalde Municipal y representante legal del municipio de Santa María, el Arq. **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en calidad de secretario de Planeación e Infraestructura y el Ing. **BRAIAM ALEXIS MARTINEZ** como director de la Unidad de Servicios Públicos, Supervisores del Contrato y **LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA**, identificada con C.C. No. 1.048.849.895 de Garagoa, representante legal de INGEOBRAS QHSE SAS identificado con NIT: 900.629.789, en calidad de CONTRATISTA,, con el fin de celebrar la presente acta **PAGO FINAL** de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 0	\$ 306.412.427,86
VALOR ANTICIPO	\$ 0	\$ 0
VALOR ADICIONAL N°1	\$ 0	\$ 84.515.855,73
VALOR ACTAS CANCELADAS	\$ 298.286.627,52	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 92.641.656,07	\$ 0
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 390.928.283,59	\$ 390.928.283,59

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS (**\$ 92.641.656,07**) M/CTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 3 de 3	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023		

Se deja constancia que la ejecución contractual a la fecha corresponde a un 100%, en constancia de lo anterior, se recibe de conformidad para que el Ordenador del Gasto de la orden de materializar el pago correspondiente por parte de la Tesorería Municipal.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

Alcalde,



RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA
Alcalde Municipal
supervisor

El Supervisor,



DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
supervisor

El Supervisor,








BRAIAM ALEXIS MARTINEZ
Director unidad de servicios públicos.

el contratista,



INGEOBRAS QHSE S.A.S
NIT: 900.629.789
R/LEGAL: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ		APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ	RUBÉN DARIO GONZÁLEZ
Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Director USPD	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	Pág. 1 de 2
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 25/07/2023	

Santa María (Boyacá), 10 de marzo de 2026

Dra. **ERIKA MARCELA DIAZ**
 Tesorera Municipal
 Santa María


Ref.: AUTORIZACIÓN DE PAGO

Cordial saludo,

De manera atenta, solicito adelantar el procedimiento de pago o desembolso por valor de **NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$ 92.641.656,07) M/CTE.** por concepto de **ACTA PAGO FINAL**, con base en la siguiente información:

N° DE CONTRATO	UM-SP-001-2025
CONTRATISTA CC/ NIT	INGEOBRAS QHSE SAS NIT. No. 900629789 LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C. No. 1048849895 de Garagoa
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$390.928.283,59) M/CTE.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA QUEBRADA LA ARGENTINA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS GENERADOS POR PROCESOS DE SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN EN MASA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BOCATOMA Y TARABITAS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA LA CRISTALINA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 067 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025.

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO DE RUBRO
202510007	2.3.2.01.01.001.03.16.01 290	Ampliación de sistemas de alcantallado pluvial y sanitario / SGP Apsb 11 Doc V.Act + Ult V.an / VIV	\$ 72.809.548,84	\$ 72.809.548,84	\$ 0,00	\$ 0,00
202510007	2.3.2.01.01.001.03.16.01 702	Ampliación de sistemas de alcantallado pluvial y sanitario / Superavit SGP APSB / VIVIENDA, CIUDADYT	\$ 94.078.655,16	\$ 94.078.655,16	\$ 0,00	\$ 0,00
202510007	2.3.2.01.01.001.03.08.01 290	Construcción, ampliación y mantenimiento de sistema de acueductos / SGP Apsb 11 Doc	\$ 54.908.306,86	\$ 54.908.306,86	\$ 0,00	\$ 0,00

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		FORMATO: AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 02	Pág. 2 de 2
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 25/07/2023	




		V.Act + Ult V.an				
202510007	2.3.2.01.01.001.03.08.01 702	Construcción, ampliación y mantenimiento de sistema de acueductos / Superavit SGP APSB / VIVIENDA, CI	\$ 80.000.000,00	\$ 71.874.199,66	\$ 8.125.800,34	\$ 0,00
202510007	2.3.2.01.01.001.03.08.01 703	Construcción, ampliación y mantenimiento de sistema de acueductos / Superavit Rendimientos SGP-APSB	\$ 4.615.917,00	\$ 4.615.917,00	\$ 0,00	\$ 0,00
202511026	2.3.2.01.01.001.03.08.01 290	Construcción, ampliación y mantenimiento de sistema de acueductos / SGP Apsb 11 Doc V.Act + Ult V.an	\$ 84.515.855,73	\$ 0,00	\$ 84.515.855,73	\$ 0,00

Nota

Lo anterior se pagara conforme a la resolución N° 623 del 31 de diciembre 2025, por medio de la cual se constituyen las reservas presupuestales excepcionales del municipio de Santa María Boyaca de la vigencia fiscal (2025).

Atentamente,


RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
 Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ		APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	ING. BRAIAM ALEXIS MARTINEZ	ERIKA MARCELA DIAZ
Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Director USP	Cargo: Tesorera
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo.
