

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 02
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER"

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	CONSORCIO ASO MSP 24		
IDENTIFICACIÓN:	901.880.711	DV:	1
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4220	RESPONSABILIDAD DIAN:	RÉGIMEN COMÚN
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO.		
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA	DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA		
NÚMERO DE CONTRATO:	LP-AGSOC-040-2024	FECHA:	29/10/2024
OBJETO:	"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER"		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de CUATRO (04) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el		
VALOR:	667.247.835,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	LP-AGSOC-040-2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-00168	22/07/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-00247	31/10/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: REG REGALIAS SGR 2.3.2.01.01.001.03.08.01.01 : BPIN 2023687550049 Ampliación de la red de acueducto urbano hacia la vereda Caraota en el municipio del Socorro Santander. Por valor de (\$667.247.835,00).		
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	BY-100046780	RCE NÚMERO: LP-AGSOC-040-2024
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA		
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	7/11/2024	FECHA EXPEDICIÓN RCE:	01/11/2024
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	8/11/2024	FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	08/11/2024

FORMA DE PAGO: El pago del valor del contrato se hará de la siguiente manera:

A. El valor del contrato será cancelado mediante actas parciales de ejecución hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, la empresa cancelará al contratista, mediante actas de entregas parciales por avance de obra el cual resulta de multiplicar el valor unitario por las cantidades efectivamente ejecutadas en el periodo de cobro, previa presentación del informe de actividades con sus respectivos soportes de ejecución de obra, acreditación del pago de obligaciones asumidas por parte del Contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA y visto bueno por parte del supervisor del contrato.

B. Un diez por ciento (10%) una vez se suscriba la respectiva acta de liquidación.

NOTA 1. VALOR: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 2. DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

FECHA DE INICIO CONTRATO:	12/11/2024	PERIODO DE COBRO:	12/02/2025		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	23/06/2025		23/06/2025		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO	FEBRERO	ABRIL	MARZO
	NUMERO PLANILLA:	76578329	76200481	76589976	77470487
			8635181013		8635207020
			32755367		32764016
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO
	NUMERO PLANILLA:	76589976	76200481	76589976	77470487
			8635181013		8635207020
			32755367		32764016
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO
	NUMERO PLANILLA:	76589976	76200481	76589976	77470487
			8635181013		8635207020
			32755367		32764016

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
EJECUTAR LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER	Como parte de las evidencias del cumplimiento del objeto contractual correspondiente al periodo de cobro en mención, se presenta el informe técnico de avance de obra correspondiente al acta parcial 02 para el periodo del 12 de febrero de 2025 al 23 de junio de 2025. Además, se adjunta el acta parcial No. 02, donde se detallan las cantidades ejecutadas de las actividades realizadas durante dicho periodo y las memorias de cantidades respectivas. Cada memoria incluye el registro fotográfico que documenta la ejecución de las actividades desarrolladas. Asimismo, se anexa Informe de Supervisión No. 02, el cual certifica las labores de control y vigilancia realizadas durante este periodo de cobro.



Versión: 03

Fecha: Julio 2021

Página: 1 de 1

AS-100-06.06.5

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		667.247.835.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0.00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	25 de marzo de 2025		420.972.717.00
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	3 de marzo de 2026		246.275.118.00
VALOR POR COBRAR:			0.00
SUMAS IGUALES		667.247.835.00	667.247.835.00

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO: 24-00247	31/10/2025	SI
APORTES PARAFISCALES:		N/A
APORTES FIC: CERTIFICACIÓN DE PAGO EXPEDIDA POR EL SENA	3/03/2026	SI
FACTURA O CUENTA DE COBRO: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEAS2 DEL 18/02/2026		SI
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS: SEGUNDO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DESCONTADO POR LA EMPRESA	

ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONSTRUDENCO S.A.S.	901.667.352
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO	13.722.007
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	GUILLERMO ANDRÉS BELTRÁN PRADA	1.100.948.704
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	MARIA CAMILA SOLANO MARTINEZ	1.032.458.052

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
SOCIAL	EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO PERMITE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER, CON ESTA INICIATIVA, SE FORTALECERÁ LA COBERTURA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA VEREDA

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: SI
SE ANEXA DE IGUAL FORMA, LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025:
76688765 - 77801648 - 8636446939 - 33314117 - 80039573 - 78613365 - 8636843991 - 33937150

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el día : 3 de marzo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBY JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO ASP MSP 24 identificado con el NIT 901880711, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
LP-AGSOC-040-2024	AMP RED ACUEDUCTO URBANO	SOCORRO	1.668,120	2025-06	25-FEB-2026	156946384
		Total	1.668,120			

Expedido por el SENA, a los tres (03) días del mes de Marzo de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.


Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-03-03

Generado por : Wilder Yamid Ávila Suescun

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresanos.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 495878593 y el Número de Certificado: 471161



 AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	INFORME	Código: GD-F-012
		Versión: 02
		Fecha: 12/01/2021
		Páginas: 1 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. LP-AGSOC-040-2024
PERIODO DE EJECUCION: 12/02/2025 – 23/06/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EJECUTADO		
CONTRATO	LP-AGSOC-040-2024 del 29 de octubre de 2024	
OBJETO	"AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER"	
CONTRATANTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A. – E.S.P.	
EJECUTOR	CONSORCIO ASO MSP 24 NIT. 901.880.711-1 R.L. SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ C.C. No. 37.947.973 de El Socorro	
INTERVENTORÍA	MOMENTUM TRANSFORMA S.A.S NIT. 901.423.730-2 R.L. CARLOS ARTURO BELTRAN BELTRAN C.C. No. 74.082.042 de Sogamoso	
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$667.247.835,00) MONEDA CORRIENTE.	
SUPERVISOR	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA – Director Operativo y Proyectos – Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12 de noviembre de 2024	
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será de CUATRO (04) MESES contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.	
SUSPENSIÓN 01	04 DE MARZO DE 2025	45 DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSIÓN 01	16 DE ABRIL DE 2025	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN 01	30 DE ABRIL DE 2025	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025
REINICIO 01	16 DE MAYO DE 2025	
PRÓRROGA 01	22 DE MAYO DE 2025	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES	

FEHCA DE TERMINACIÓN FINAL 23 DE JUNIO DE 2025


1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las responsabilidades de Supervisión asignadas al Contrato de Obra No. LP-AGSOC-040-2024 del 8 de noviembre de 2024 cuyo objeto es **“AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER”** se realizó el seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **12 de febrero de 2025 al 23 de junio de 2025**. Este informe detalla las cantidades ejecutadas por el contratista en dicho lapso, las cuales han sido revisadas y avaladas por la Interventoría al igual que por la Supervisión.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La zona de la obra se encuentra localizado en la vereda Caraota del municipio de Socorro– Santander.



	INFORME	Código: GD-F-012
		Versión: 02
		Fecha: 12/01/2021
		Páginas: 3 de 14

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR

De acuerdo con el anexo técnico del contrato de obra No. LP-AGSOC-040-2024, se presenta la siguiente información que resume el tipo de intervenciones a ejecutar:

La ampliación de la red de acueducto urbano hacia la vereda Caraota, comprende: Localización y replanteo con equipo topográfico, la demolición de losa maciza con el fin de realizar las Excavaciones en material común en seco a máquina y mano y aquellas correspondientes en roca, con el fin de instalar la tubería de PVC Presión de 2" RDE 21 en 4911,21 ML, tubería de PVC Presión de 1" RDE 21 en 117,22 ML y tubería de PVC Presión de 1/2" RDE 13,5 en 936,14 ML, complementando su funcionamiento con la construcción de las estructuras de los pasos elevados y la conexión de las domiciliarias a los hogares correspondientes.

4. ACTUACIONES DEL CONTRATO


El contrato de obra fue suspendido el 4 de marzo de 2025 y reiniciado el 16 de mayo de 2025. Posteriormente, el 22 de mayo de 2025 se otorgó una prórroga por el término de un mes, estableciéndose como fecha proyectada de finalización del contrato el 23 de junio de 2025.

5. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES EJECUTADAS

A continuación, se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas en el período de cobro mencionado, junto con el avance acumulado de las actividades correspondientes, teniendo presente el balance de mayores y menores cantidades suscrito el 23 de mayo de 2025:

AVANCE DE EJECUCION			
OBJETO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER		
CONTRATO DE OBRA:	LP-AGSOC-040-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CD-AGSOC-041-2024
VALOR DE LA OBRA:	\$667.247.835,00	VALOR DE INTERVENTORIA:	\$36.392.580,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASO MSP 24	CONTRATISTA:	MOMENTUM TRANSFORMA S.A.S.
PERIODO DE EJECUCION:	12 DE FEBRERO DE 2025 AL 23 DE JUNIO DE 2025	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO:	100,00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAP.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.2	Demolición de losa maciza (Incluye retiro y disposición final)	ml	34,47	\$2.057.825,00
1.3	Retiro de piedra labor en zonas de zanja de tubería	ml	5,05	\$116.700,00
CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
2.1	Excavación en material común en seco a maquina	m3	136,91	\$3.339.164,00
2.2	Excavación en material común en seco a mano	m3	136,64	\$3.789.049,00
2.3	Excavación en roca	m3	68,38	\$6.133.282,00
2.4	Conformación de la zanja con cama de arena o material granular fino	m3	99,46	\$1.807.387,00
2.5	Relleno para zanja con material seleccionado de la excavación compactado al 90% por capas no mayor a 10 cm	m3	310,22	\$8.232.907,00
2.6	Relleno para zanja con material de préstamo (recebo) compactado 90% por capas no mayor a 10 cm	m3	134,89	\$9.987.282,00
CAP.3	RED DE DISTRIBUCION			
3.1	Suministro e instalación de tubería de PVC Presión de 2" RDE 21	ml	1011,21	\$33.744.078,00
3.4	Válvula de cierre metálico 2"	und	6,00	\$1.949.958,00
3.8	Caja de inspección para válvulas 60x60 cm	und	23,00	\$9.763.017,00
CAP.4	DOMICILIARIAS			
4.1	Suministro e instalación de tubería de PVC Presión de 1/2" RDE 13,5	ml	900,00	\$11.262.600,00
4.2	Collarín Derivación PVC 2" A 1/2"	und	30,00	\$902.040,00
4.3	Medidor de agua volumétrico JSM 1/2"	und	50,00	\$4.960.450,00
4.4	Caja para medidor en concreto más tapa hierro	Und	50,00	\$5.358.200,00
4.5	Válvulas para medidores 1/2" (Incluye registro de corte antifraude, check anti retorno y válvula de corte)	Und	50,00	\$4.388.600,00
CAP.5	ESTRUCTURAS DE PASOS AEREOS			
5.1	Concreto clase F para solado de limpieza espesor 0.05 cm	m2	3,00	\$86.151,00
5.2	Concreto ciclópeo 60-40 (Concreto clase D 60% - Piedra rajón 40%)	m3	5,00	\$1.766.565,00
5.3	Concreto clase D para cimentación, pedestal y macizo	m3	5,70	\$3.054.630,00
5.4	Guaya de acero para paso aereo	ml	37,00	\$2.585.042,00
5.6	Acero de refuerzo de 60000 PSI – 420 Mpa	Und	120,00	\$845.400,00
CAP.6	COMPONENTES VARIOS			
6.1	Construcción de pavimento en piedra labor con ancho promedio de 70 cm	ml	5,00	\$396.500,00
6.2	Construcción de pavimento rígido con ancho promedio de 70 cm	ml	34,47	\$3.862.708,00

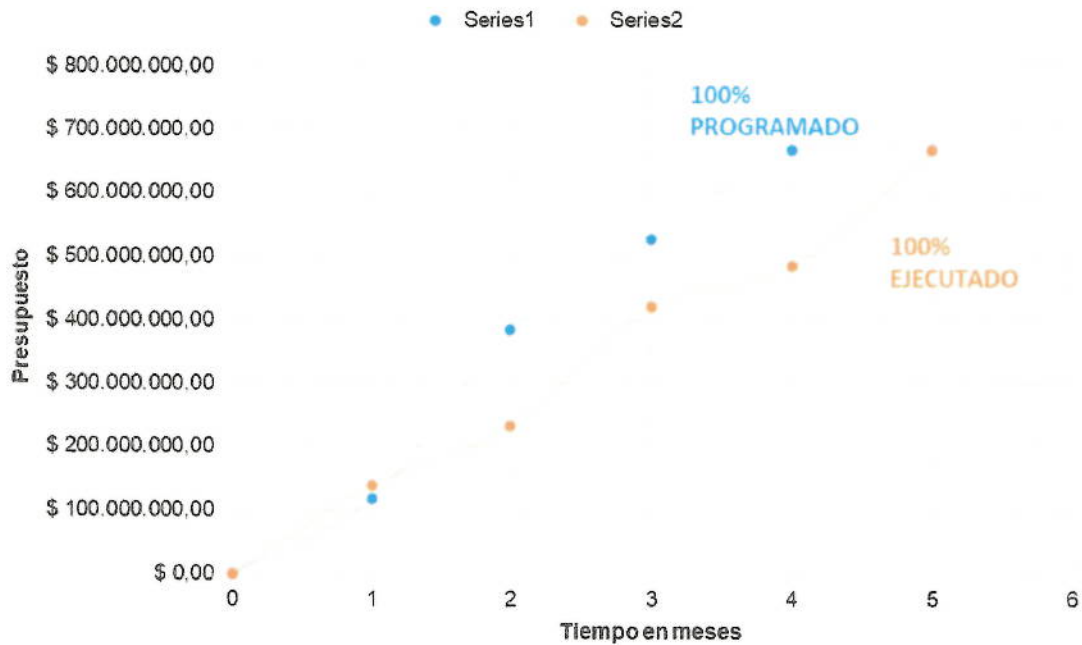
	INFORME	Código: GD-F-012
		Versión: 02
		Fecha: 12/01/2021
		Páginas: 5 de 14

ITEMS NO PREVISTOS				
INP01	Válvula ventosa hd cámara sencilla doble efecto de 1" roscada, incluye (collarín hd de 2" x 1", niple galvanizado de 1" x 5 cm rosca x rosca, válvula bola de palanca de 1" roscada)	Und	11,00	\$7.406.652,00
INP02	Estacion de macromedidor de agua TW 2" extremo bridado con ccesorioes de instalación	Und	1,00	\$2.540.321,00
INP03	Estación reguladora de presión Tipo 2 SIN BYPASS incluye (válvulas bola BCE 1", válvula HD CE EB 2", válvula reguladora en hd de 2 pulgadas bridada, acople brida universal de 2" filtro en yee HD 2, BR, ventosas HD roscada de 1" doble acción).	Und	5,00	\$42.210.580,00
INP04	Cercha metálica aéreo 2	ml	20,00	\$8.855.140,00


Durante el periodo contemplado del **12 de febrero de 2025 al 23 de junio de 2026**, el proyecto tuvo un avance financiero de **\$246.275.118,00**, correspondiente a un **36.91%** del valor del proyecto. Así las cosas, se tiene un avance financiero acumulado desde **12 de noviembre de 2024 al 23 de junio de 2025** de **\$667.247.835,00**, correspondiente a un **100%** del valor del proyecto.

6. SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA

CONTRASTE DE PRESUPUESTO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA VS PROGRAMACION DE OBRA DE CONTRATISTA						
PROYECYO: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER						
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ASO MSP 24						
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: MOMENTUM TRANSFORMA S.A.S.						
PANORAMA GENERAL DE TRACYECTORA DEL CONTRATO DE OBRA						
MES	PROGRAMADO		EJECUTADO		DIFERENCIA	
	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	% ACUMUALDO	VALOR ACUMULADO	% ACUMUALDO
0	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
1	\$ 116.701.646,34	17,49%	\$ 138.889.499,00	20,82%	\$ 22.187.852,66	3,33%
2	\$ 384.668.376,88	57,65%	\$ 233.911.547,00	35,06%	-\$ 150.756.829,88	-22,59%
3	\$ 525.924.743,55	78,82%	\$ 420.972.717,00	63,09%	-\$ 104.952.026,55	-15,73%
4	\$ 667.247.835,00	100,00%	\$ 484.284.053,30	72,58%	-\$ 182.963.781,70	-27,42%
5	\$ 667.247.835,00	100,00%	\$ 667.247.835,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO; MES 05

7. PERSONAL DE OBRA
Personal de obra

Cargo	Nombre	No. Planilla	Mes
Director de obra	Oscar Mauricio Rojas Camargo	76200481	Febrero
		77470847	Marzo
		77801648	Mayo
		78613365	Junio
Residente de obra	Juan Luis Beltrán Beltrán	76568329	Febrero
		76589976	Marzo
		78688768	Mayo
		80039573	Junio
Profesional auxiliar	Guillermo Andrés Beltrán Prada	863518103	Febrero
		8635207020	Marzo
		8636446939	Mayo
		8636843991	Junio
Profesional SISO o HSEQ	María Camila Solano Martínez	32755367	Febrero
		32764016	Marzo
		33314117	Mayo

	INFORME	Código: GD-F-012
		Versión: 02
		Fecha: 12/01/2021
		Páginas: 7 de 14

		33937150	Junio
--	--	----------	-------

8. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Pólizas del contrato de obra de cumplimiento No, **BY-100046780** expedida el **03 de febrero de 2026** por la empresa **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** la cual cuenta con los siguientes amparos:

Contrato No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-AGSOC-040-2024		
Contratista / Tomador:	CONSORCIO ASO MSP 24		
	Nit 901.880.711-1		
	RL/ SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ		
	C.C. 37.947.973		
Beneficiario y/o asegurado	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.		
	NIT. 900.639.462-8		
Compañía aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
	NIT. 860.037.013-6		
Póliza Número:	B-100046780	Anexo:	8
Certificación:	36219462		
Fecha de expedición de la póliza	03 E FEBRERO DE 2026		

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

AMPAROS ASEGURADOS				
Descripción	Valor a Asegurar	Vigencia	Valor Asegurado	Vigencia Asegurada
Cumplimiento General del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que les impongan	Veinte (20%) por ciento del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato (plazo del contrato y seis meses más)	\$142.721.484,00	12/11/2024-24/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la	Diez (10%) por ciento del valor del contrato	Plazo del contrato y tres (03) años más	\$71.360.742,00	12/11/2024-24/06/2028

ejecución del contrato.				
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Veinte (20%) por ciento del valor del componente de obra contratado	Cinco (05) años a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo del componente de obra	\$142.721.484,00	24/11/2025-24/11/2030

ACLARACIONES DEL ANEXO No. 8 DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES B-100046780:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UNA DURACIÓN DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Mes 4 (12/2/2025 – 3/3/2025)





Excavaciones en roca



Relleno de zanja con material granular fino y/o Recebo



Tuberías acometidas hidráulicas



Instalación de tubería RDE 21 de 2"

Mes 5 (16/5/2025 – 23/06/2026)



Excavaciones en material como en seco a maquina



Excavación para cajas de válvulas



Relleno de zanja con material granular fino y/o Recebo



Corte de pavimento



Cajas domiciliarias



Construcción de pavimento





10. OBSERVACIONES GENERALES

- Se verificó que las cantidades ejecutadas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y corresponden a lo avalado por la Interventoría.
- Todas las actividades fueron supervisadas en conjunto con la Interventoría, asegurando la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se recomienda mantener el ritmo de trabajo para garantizar la entrega de la obra dentro de los plazos establecidos.
- La Supervisión designada por Aguas del Socorro S.A. E.S.P. ejerció el control y vigilancia de temas técnicos, administrativos, financieros y jurídicos sobre el Contrato de Obra No. LP-AGSOC-040-2024 del 29 de octubre de 2024 durante el desarrollo de las actividades de dicho contrato para el periodo de ejecución mencionado.

	INFORME	Código: GD-F-012
		Versión: 02
		Fecha: 12/01/2021
		Páginas: 14 de 14

11. CONCLUSIÓN

En la dinámica realizada por parte de la supervisión de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. para el proyecto cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA VEREDA CARAOTA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER", es válido afirmar que a la fecha el proyecto presenta un avance de ejecución **100%**.

Desde el inicio de las obras hasta la fecha de este informe, han transcurrido un total de 150 días calendario de un total de 150 días establecidos en el contrato más la prórroga, correspondiente al **100%** del tiempo total de ejecución del proyecto.


Con base en las verificaciones realizadas, se certifica que las cantidades ejecutadas durante los períodos comprendidos entre el 12 de febrero de 2025 y el 3 de marzo de 2025, y entre el 16 de mayo y el 23 de junio de 2025, han sido debidamente revisadas y cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato. En consecuencia, se aprueba el presente pago por un valor de **\$246.275.118,00**.

Atentamente,



DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA

Director Operativo y Proyectos Aguas del Socorro S.A. E.S.P.

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Jeyson Julián Leon Rueda	Contratista Aguas del Socorro S A E S P	
<small>Los arriba firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director Operativo y Proyectos.</small>			
