

Neiva, 16 de marzo de 2026

Oficio No. INT-155-2025-012**Señor****CAMILO ANDRÉS CERQUERA VARGAS**

Secretario de Desarrollo Económico e Infraestructura

Supervisor del contrato

MUNICIPIO DE TERUEL – HUILA

Teruel – Huila

Ref. Contrato de Interventoría No. 155 de 2025 – “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

Asunto: Remisión acta final y de liquidación del contrato de la referencia.

Cordial saludo,

En atención al contrato de la referencia, me permito remitir para su revisión, validación y trámite interno la cuenta de cobro correspondiente al Acta Final del Contrato de Interventoría No. 155 de 2025, junto con los documentos soporte que consolidan el cobro desde los componentes técnico, administrativo y financiero del contrato.

A continuación, se relacionan los documentos anexos, indicando el número de folios que los componen:

No.	Nombre del archivo/ documento	Folios (desde - hasta)
1.	Formato único de radicación de cuentas FURC y factura original	2 - 3
2.	Certificado bancario	4
3.	Informe de actividades del periodo de cobro	5 - 25
4.	Acta de recibo final (Formato Word)	26
5.	Acta final (Formato Excel)	27
6.	Póliza según acta final y recibo de pago	28 - 30
7.	Relación de SS y planillas	31 - 35
8.	Certificación de parafiscales por el contador: Se anexa documento de identidad, tarjeta profesional y vigencia de JCC.	36 - 38
9.	Acta de liquidación proyectada	39 - 41

No.	Nombre del archivo/ documento	Folios (desde - hasta)
10.	Paz y salvo municipal	42

Atentamente,



DANIELA CARRILLO TAVERA

Representante Legal

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.

Interventor

Folios 42 -

No.	Nombre del archivo/ documento	Folios (desde - hasta)
10.	Paz y salvo municipal	42



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Municipio de Teruel

Código: SH-C29-P02-F01

Fecha Aprobación: 19 de diciembre de 2024

FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC

Versión: 1

Página 1 de 1

RADICADO INTERNO

FECHA DE RECIBIDO

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 155 DE 2025

Form fields for contract details including Tipo de contrato (DE INTERVENTORÍA), Proveedor (CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.), Dirección (Calle 9 #3-50 OF 228), and other administrative data.

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Form fields for SAP system configuration, including Cuenta Bancaria (457-129635-77) and Banco (BANCOLOMBIA).

3- Información Tributaria

Tax information form including Responsable de IVA, Gran Contribuyente, and Retefuente Honorarios.

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

Form fields for electronic invoicing obligation (SI/NO).

5- Información del Compromiso

Objeto: (Copiar tal cual aparece en el contrato) INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 'CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)

TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato. Los pagos parciales se realizarán por un valor de hasta el noventa por ciento (90%) del monto total del contrato...

Información Presupuestal Inicial:

Table with 4 columns: Fecha de Inicio, 12, 11, 2025.

Table with 4 columns: CDP, RP, Recurso y/o fuente, Nombre del Recurso y/o fuente. Values: 425, 625, Nación, Sistema General de Regalías (SGR).

Información Presupuestal Adicional:

Form fields for suspension and addition information.

Table with 4 columns: CDP, RP, Recurso y/o fuente, Nombre del Recurso y/o fuente.

6- Clase de Pago

Form fields for payment class, including Unico Pago, Pago No. (02), Total de pagos (02), and Periodo (De 23/12/2025 to 11/02/2026).

Form fields for Anticipo (N/A) and Valor Anticipo (N/A).

Table with 2 columns: Field (Valor Inicial del contrato, Valor Adición, etc.) and Value (53.814.465,60, etc.).

Table with 6 columns: Cuenta 1 through Cuenta 6, with values for Cuenta 1 and 2.

7- Pago de Seguridad Social

Table with 5 columns: Periodos Pagados, Pago ARL, Pago Pensión, Pago Salud, and Número de Planillas de Seguridad Social.

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato...

Form fields for signatures of the Contractor, Interventor, and Supervisor.

9- Firmas por parte de Revisor de cuenta y Contabilidad

Form fields for the Auditor's signature and approval.



CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
NIT 900.116.571-8
CALLE 18A 6 37
Tel: (608) 3138113711
Neiva - Colombia
construmacingenierossas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 160

Señores	MUNICIPIO DE TERUEL		
NIT	891.180.181-9	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2026, 11:47
Expedición	18/03/2026, 11:47
Vencimiento	18/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL CTO 155 DE 2025	1.00	5,381,446.56

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Otros \$ 5,381,446.56


Observaciones:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Total Bruto	4,522,224.00
IVA 19%	859,222.56
Total a Pagar	5,381,446.56

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103209359 aprobado en 20251215 prefijo FE desde el número 147 al 200 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 313771a77d12a33b255df69d677bd56c44ecb406680e4043adbe1429adc8e6112ed3bda4082b5eb8809f5e4e8227f5a0

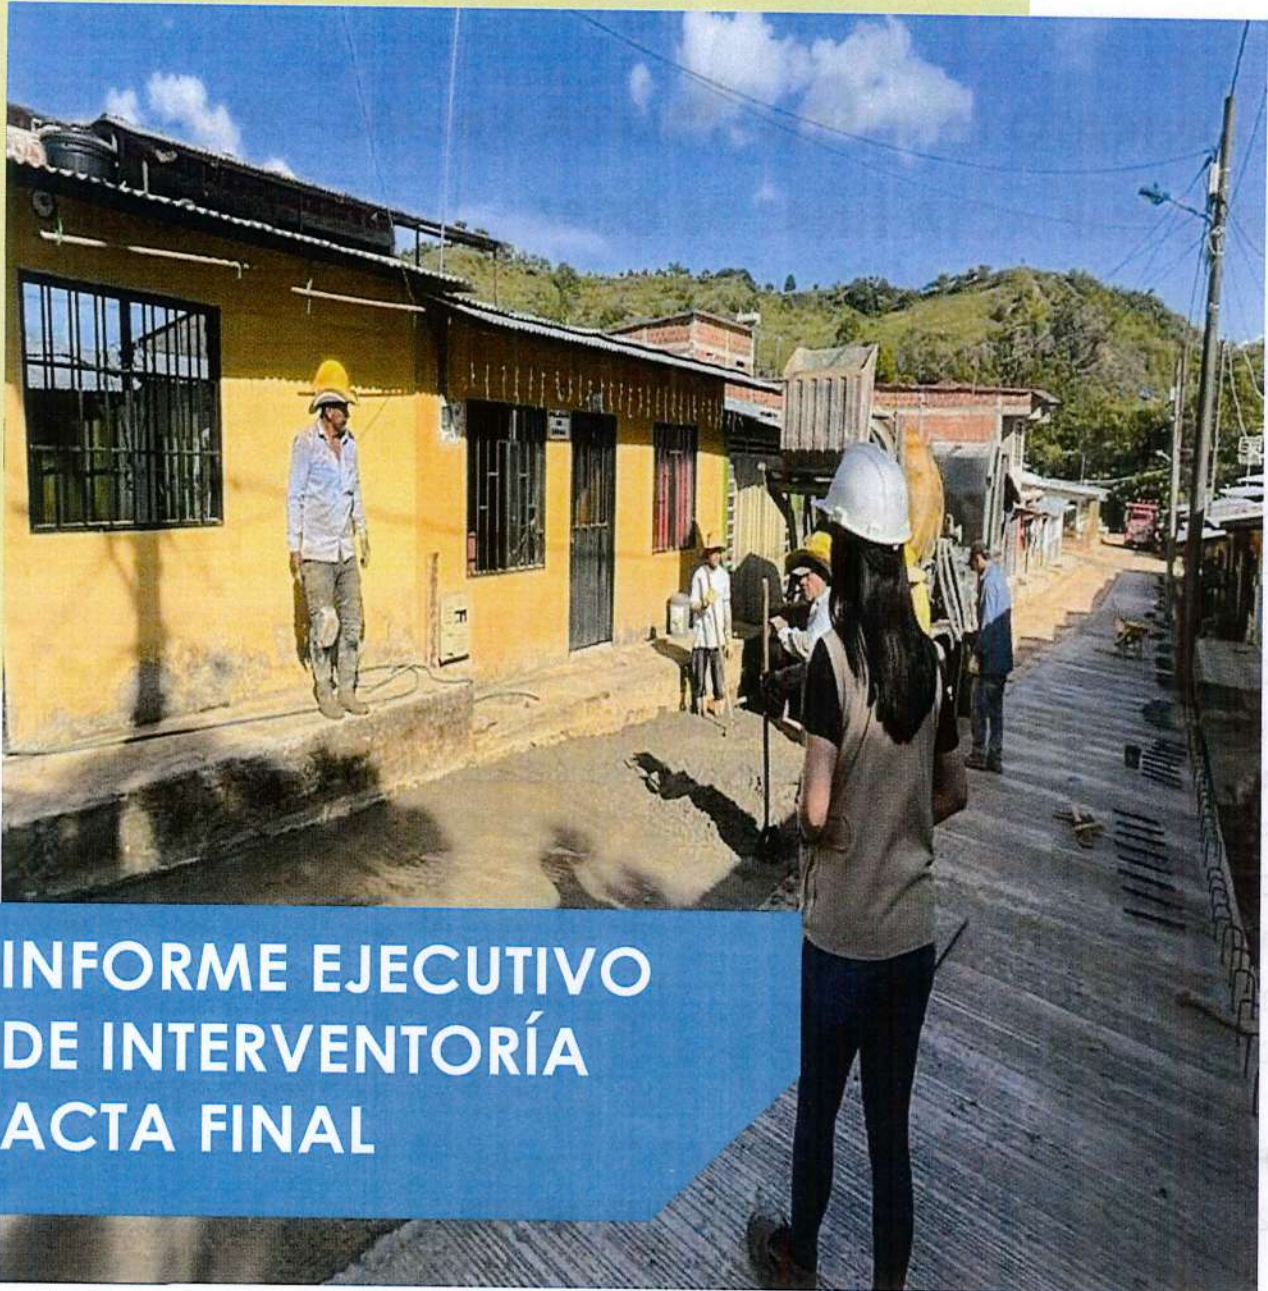

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA ACTA FINAL

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 155-2025

construmacingenierossas@gmail.com

Tel.: 320 354 6767

Calle 2 #4-65 Barrio San José

Teruel - Huila



Calle 2 #4-65 Barrio San José, Teruel (H)
construmacingenierossas@gmail.com
Cel. 320 354 6767

Informe Ejecutivo de Interventoría
Acta Final

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 155 – 2025

INFORME ACTA FINAL DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO

Contratista de interventoría:

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

Objeto del contrato:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Municipios de intervención:

TERUEL

DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo de cobro:

23 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 11 DE FEBRERO DE 2026.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
Teruel	6
RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 154 - 25	8
Información general	8
Información financiera	8
Plazos y fechas clave	8
Estado de ejecución	8
Avance en tiempo	8
Modificaciones en tiempo y/o suspensiones	9
Avance físico de actividades ejecutadas	9
Acta Final de Obra	12
Estado financiero	14
Estado cronograma	14
Estado de pólizas	14
Pólizas según suscripción del contrato de obra	14
Pólizas según suscripción del acta de inicio de obra	15
Pólizas según suscripción de Otrosí modificadorio No. 1 de obra	15
Pólizas según suscripción de Otrosí modificadorio No. 2 de obra	16
Pólizas según suscripción de Acta de Recibo Final	16
Gestión social e industrial	17
Personal técnico - administrativo	17
Personal operativo	18
Gestión ambiental	18
Estado del tiempo	18
Maquinaria y equipo	19
Gestión de calidad	19
Ensayo de resistencia a la flexión de vigas en concreto	20

Señalización y demarcación de obra	20
RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 155 - 25	21
Información general	21
Información financiera	21
Plazos y fechas clave	21
Estado de ejecución	21
Avance en tiempo	21
Modificaciones en tiempo y/o suspensiones	22
Ejecución contractual	22
Actividades de supervisión	23
Estado financiero	24
Estado de pólizas	24
Pólizas según suscripción del contrato de interventoría	24
Pólizas según suscripción del acta de inicio de interventoría	25
Póliza según suscripción del acta final de interventoría	26
Personal técnico - administrativo	26
Gestión de calidad	27
Ensayo de resistencia a la flexión de vigas en concreto	27
Ensayo de compresión en cilindros de concreto	27
REGISTRO FOTOGRÁFICO	28
CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES	31

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Acta Final del Contrato de Interventoría No. 155 de 2025, cuyo objeto es la *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA"*, proyecto orientado al mejoramiento de la infraestructura vial urbana y al fortalecimiento de las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida de la comunidad.

Este documento tiene como finalidad dejar constancia del estado final de ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en el contrato, los estudios previos, los diseños, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente aplicable. Durante el periodo objeto de seguimiento, comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 11 de febrero de 2026, se ejecutaron las actividades previstas tales como: fundición de bordillos, nivelación de pozos y señalización vial, tanto horizontal como vertical, bajo el seguimiento permanente de esta interventoría, garantizando la calidad de los procesos constructivos y el adecuado uso de los recursos públicos.

En este reporte se resumen los aspectos más relevantes de la ejecución contractual, el avance físico y financiero alcanzado, las verificaciones realizadas y las conclusiones que permiten recomendar el recibo final de la obra, dejando constancia de que los trabajos ejecutados cumplen con los requerimientos técnicos y contractuales establecidos para su puesta en servicio.

Al cierre del periodo aquí consignado, el Contrato de Obra No. 154 de 2025 presenta un avance físico del 100%.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Teruel

El municipio de Teruel se localiza en la zona occidental del departamento del Huila, sobre la margen izquierda del río Magdalena y en las estribaciones de la Cordillera Central. Presenta una topografía predominantemente montañosa, con una altura promedio de 853 m s. n. m., temperatura media de 23 °C y una extensión aproximada de 589 km². Su cabecera municipal se sitúa a 2°44' de latitud norte y 75°34' de longitud oeste, a 50 km de la ciudad de Neiva, comunicada mediante una vía principal.

Según proyecciones del DANE (2019), el municipio cuenta con una población cercana a 8.838 habitantes. Administrativamente, se clasifica como municipio de sexta categoría. La economía local tiene una marcada vocación agropecuaria, destacándose el café como su principal cultivo y renglón productivo. El casco urbano se encuentra ubicado en la zona nororiental del territorio municipal y funciona como centro administrativo y de servicios para las veredas aledañas.

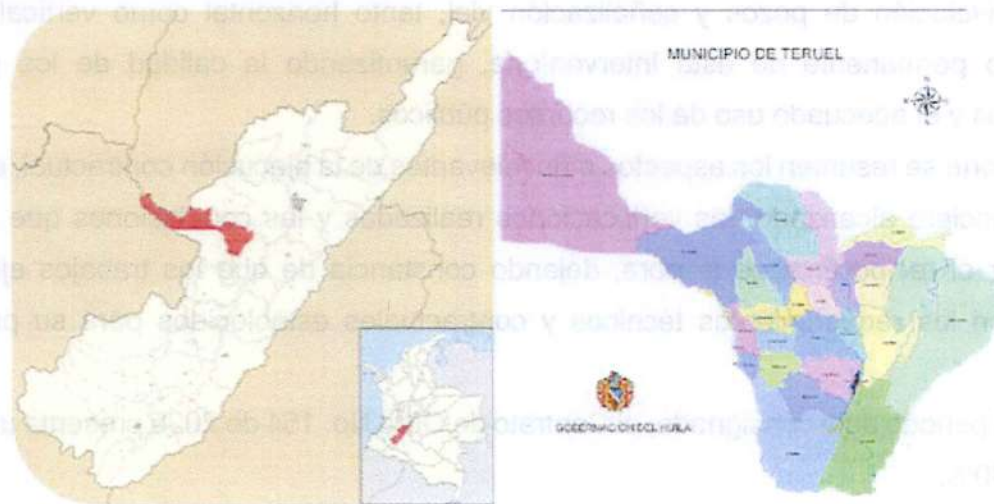


Ilustración 1. Mapa geopolítico del municipio de Teruel - Huila.

En el municipio de Teruel se ejecutarán intervenciones viales en diferentes calles del barrio La Esperanza, así:

Intervenciones viales por calles

Barrio La Esperanza, Teruel - Departamento del Huila

Nº	Tipo de vía	Identificación	Tramo (Inicio - Final)	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Estado inicial de la vía
1	Local	Calle 14 tramo 1	Cra 4 Cra 3	56,00	6,30	0,18	Afirmado
2	Local	Calle 14 tramo 2	Cra 3 Cra 2	21,40	5,05	0,18	Afirmado

Nº	Tipo de vía	Identificación	Tramo (Inicio - Final)		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Estado inicial de la vía
3	Local	Calle 15 tramo 1	Cra 4	Cra 3	66,00	5,30	0,18	Afirmado
4	Local	Calle 15 tramo 2	Cra 3	Cra 2	26,50	5,30	0,18	Afirmado
5	Local	Calle 16 tramo 1	Cra 4	Cra 3	67,00	5,30	0,18	Afirmado
6	Local	Calle 16 tramo 2	Cra 3	Cra 2	28,40	5,30	0,18	Afirmado
7	Local	Calle 17	Cra 4	Cra 3	67,70	6,30	0,18	Afirmado
Total					333			

Tabla 1. Listado de tramos viales contratados por calles.

El proyecto tiene por objeto ejecutar el mejoramiento de varios tramos de la red vial urbana del barrio La Esperanza, en el municipio de Teruel. Las actividades previstas contemplan la construcción integral de la estructura de pavimento, así como la implementación de los elementos de señalización vertical y horizontal necesarios, garantizando el cumplimiento de la normativa técnica y reglamentaria vigente aplicable al diseño y a la infraestructura vial.

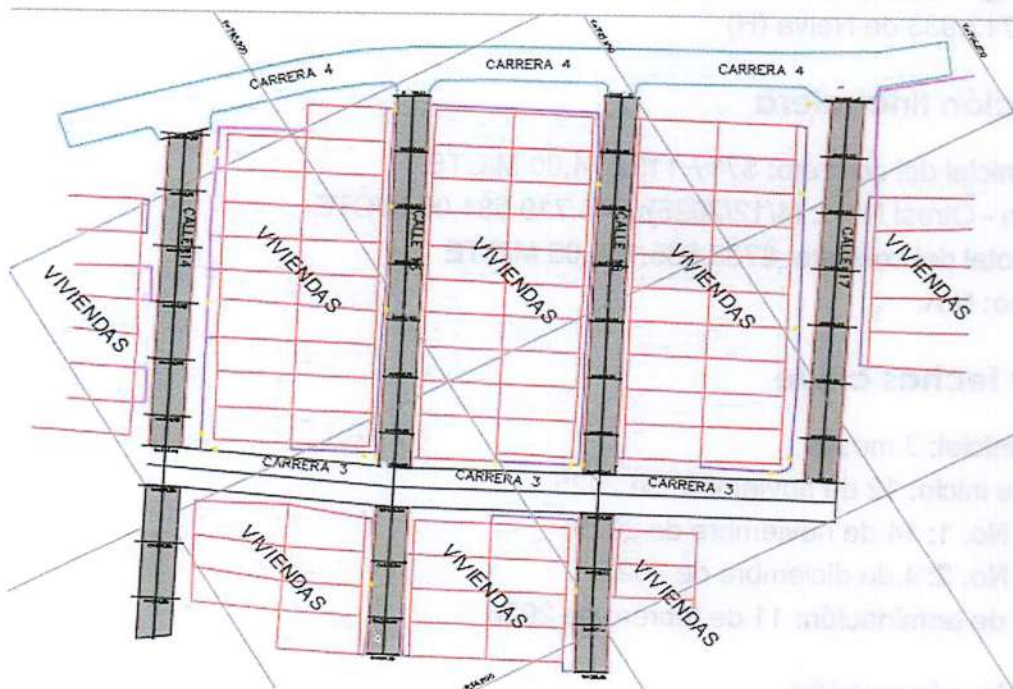


Ilustración 2. Ubicación general de los tramos viales a intervenir del barrio La Esperanza en el municipio de Teruel Huila.

RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 154 - 25

Información general

- **Objeto del contrato:** CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
- **Fecha de suscripción:** 23 de octubre de 2025.
- **Contratante:** Municipio de Teruel.
- **Contratista:** V&M INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 900.062.688-7
Rep. Legal: Yerson Fernando Camacho Ladino
CC: 7.713.933 de Neiva (H)

Información financiera

- **Valor inicial del contrato:** \$717.115.574,00 M/CTE
- **Adición - Otrosí No. 2 (4/12/2025):** \$46.719.584,05 M/CTE
- **Valor total del contrato:** \$763.835.158,05 M/CTE
- **Anticipo:** N/A.

Plazos y fechas clave

- **Plazo inicial:** 3 meses
- **Acta de inicio:** 12 de noviembre de 2025
- **Otrosí No. 1:** 14 de noviembre de 2025
- **Otrosí No. 2:** 4 de diciembre de 2025
- **Fecha de terminación:** 11 de febrero de 2026

Estado de ejecución

A corte del 11 de febrero de 2026

- **Porcentaje de avance ejecutado:** 100%
- **Tiempo transcurrido:** 92 días calendario.
- **Estado actual:** Terminado y liquidado.

Avance en tiempo

Periodo	Fecha	Días ejecutados	% del tiempo ejecutado
Inicio - Terminación	12/11/25 - 11/02/26	92	100%
Total acumulado		92	100%

Tabla 2. Avance en tiempo contrato de obra.

Modificaciones en tiempo y/o suspensiones

Durante el período de ejecución del Contrato de Obra, se han suscrito dos (2) modificaciones a la fecha.

La primera corresponde al Otrosí No. 1, suscrito el 14 de noviembre de 2025, cuyo objeto fue aclarar el valor contractual.

La segunda modificación, correspondiente al Otrosí No. 2, suscrito el 4 de diciembre de 2025, tuvo como objetivo principal la aprobación del balance de mayores y menores cantidades de obra, así como una adición presupuestal, con el fin de garantizar el cumplimiento del 100 % del alcance del proyecto, de acuerdo con la revisión técnica realizada en campo.

El ajuste financiero derivado de esta modificación obedeció a una adición presupuestal por valor de \$46.719.584,05 M/CTE, la cual se encuentra debidamente respaldada mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 325 del 7 de abril de 2025.

Dicha modificación se fundamentó en la actualización topográfica y los análisis de suelo, los cuales evidenciaron condiciones diferentes a las inicialmente proyectadas.

Avance físico de actividades ejecutadas

Durante el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 11 de febrero de 2026, se adelantaron actividades correspondientes a la construcción del pavimento rígido en el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, conforme a las metas establecidas en el contrato de obra. A continuación, se detallan las intervenciones realizadas:

- **Bordillo en concreto 12x48 clase E ($f'c$ 176 kg/cm²), no incluye preparación de la superficie de apoyo (585 m):** En el marco del proyecto, se ejecutó la construcción de bordillo en concreto de sección 12 × 48 cm, Clase E, con una longitud total de 666 m, conforme a los planos aprobados y las especificaciones técnicas establecidas.

El concreto empleado presenta una resistencia a la compresión $f'c = 176$ kg/cm², garantizando las condiciones de resistencia y durabilidad requeridas. La actividad incluyó el trazado, encofrado, vaciado, conformación y acabado del bordillo, asegurando alineación, nivelación y continuidad a lo largo del tramo intervenido.

La preparación de la superficie de apoyo no se encuentra incluida en este ítem, de acuerdo con lo establecido en el alcance contractual.

La interventoría realizó el seguimiento y control correspondiente, verificando que los bordillos construidos cumplen con las dimensiones, resistencia, acabado y tolerancias exigidas, dejando constancia de su correcta ejecución.

- **Nivelación de pozo/caja de inspección de la red de alcantarillado, incluye reparación y reconstrucción del cono, reforzamiento y tapa metálica fundida en concreto (5 und):** En el desarrollo del proyecto de construcción, se realizó la nivelación de pozos/cajas de inspección de la red de alcantarillado, en una cantidad total de 5 unidades, conforme a los planos aprobados y las especificaciones técnicas establecidas.
Las actividades incluyeron la reparación y reconstrucción del cono, el reforzamiento estructural de los elementos intervenidos y la instalación de tapa metálica, fundida en concreto, garantizando la correcta integración con el nivel final del pavimento y el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado.
La interventoría efectuó el seguimiento y control correspondiente, verificando alineación, nivelación, estabilidad y acabado de los pozos intervenidos, dejando constancia de que los trabajos ejecutados cumplen con los requisitos técnicos, funcionales y normativos exigidos para la obra.
- **Línea de demarcación (666 m):** En el marco del proyecto de construcción, se ejecutó la aplicación de línea de demarcación vial en una longitud total de 666 m, conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente en materia de señalización vial.
Las actividades incluyeron la preparación de la superficie, el trazado y la aplicación del material de demarcación, garantizando uniformidad, adherencia, dimensiones reglamentarias y adecuada visibilidad diurna y nocturna.
La interventoría realizó la verificación correspondiente, constatando que la demarcación ejecutada cumple con los parámetros técnicos, de calidad y seguridad vial exigidos para su correcta funcionalidad.
- **Marca vial (33,65 m²):** En el desarrollo del proyecto de construcción, se realizó la aplicación de marcas viales en un área total de 33,65 m², conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente en materia de señalización vial.
Las actividades incluyeron la preparación de la superficie, el trazado y la aplicación del material de señalización horizontal, garantizando adecuada adherencia, uniformidad, dimensiones reglamentarias y niveles de visibilidad diurna y nocturna.
La interventoría efectuó el seguimiento y control correspondientes, verificando que las marcas viales ejecutadas cumplen con los requisitos técnicos, de calidad y seguridad vial exigidos para la correcta puesta en servicio de la vía.

- **Señal vertical de tránsito (11 und):** En el marco del proyecto de construcción, se realizó la instalación de señales verticales de tránsito en una cantidad total de 11 unidades, conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente en materia de señalización vial.

Las actividades incluyeron el suministro, ubicación e instalación de las señales, verificando altura, orientación, visibilidad, anclaje y elementos reflectivos, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial para los usuarios de la vía.

La interventoría realizó el seguimiento y control correspondientes, constatando que las señales verticales instaladas cumplen con los requisitos técnicos, funcionales y normativos exigidos para su correcta operación.

Acta Final de Obra

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES VIGENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
			CANT	Vr.UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
I - PRELIMINARES													
1.0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-13 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	M2	1.925,00	\$ 1.867,00	\$ 3.593.975,00	1922,45	\$ 3.589.214,15	1922,45	\$ 3.589.214,15			1.922,45	\$ 3.589.214,15
2.0	INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	M3	810,68	\$ 48.299,00	\$ 39.155.033,00	1391,82	\$ 67.223.514,00	1391,82	\$ 67.223.514,00			1.391,82	\$ 67.223.514,00
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS					\$ 42.749.008,00	\$ 70.812.728,15	\$ 70.812.728,15	\$ 0,00	\$ 70.812.728,15				
3.0	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE BASE GRANULAR CLASE B ESTABILIZADA CON CEMENTO	M2	1.925,00	\$ 1.775,00	\$ 3.416.875,00	1922,45	\$ 3.412.348,75	1922,45	\$ 3.412.348,75			1.922,45	\$ 3.412.348,75
4.0	ESTABILIZADA CON CEMENTO	M3	385,00	\$ 336.105,00	\$ 129.400.425,00	539,88	\$ 181.456.367,40	539,88	\$ 181.456.367,40			539,88	\$ 181.456.367,40
III - PAVIMENTOS EN CONCRETO					\$ 132.817.300,00	\$ 184.868.716,15	\$ 184.868.716,15	\$ 0,00	\$ 184.868.716,15				
5.0	PAVIMENTO RÍGIDO MR-38. INCLUYE: JUNTA DE DILATACIÓN, TEXTURIZADO, MICRO TEXTURIZADO. APLICACIÓN DE MEMBRANA CURADORA. ESP. 500 INV. E = 18 CMS.	M3	347,00	\$ 1.197.129,00	\$ 415.403.763,00	331,05	\$ 396.309.555,45	331,05	\$ 396.309.555,45			331,05	\$ 396.309.555,45
6.0	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.	KG	3.227,00	\$ 8.900,00	\$ 28.720.300,00	3104,02	\$ 27.625.778,00	3104,02	\$ 27.625.778,00			3.104,02	\$ 27.625.778,00
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES					\$ 444.124.063,00	\$ 423.935.333,45	\$ 423.935.333,45	\$ 0,00	\$ 423.935.333,45				
7.0	BORDILLO EN CONCRETO 12X48 CLASE E (F'c= 176KG/CM2); No incluye la preparación de la superficie de apoyo	M	671,00	\$ 96.316,00	\$ 64.628.036,00	666,00	\$ 64.146.456,00	81,00	\$ 7.801.596,00	585,00	\$ 56.344.860,00	666,00	\$ 64.146.456,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADAS PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UND	CANT	Vr.UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
8.0	NIVELACIÓN DE POZO/CAJA DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, incluye reparación y reconstrucción del cono, reforzamiento y Tapa Metálica fundida en concreto	UND	12,00	\$ 788.410,00	\$ 9.460.920,00	5,00	\$ 3.942.050,00	0	\$ 0,00	5,00	\$ 3.942.050,00	5,00	\$ 3.942.050,00
	V- SEÑALIZACIÓN				\$ 74.088.956,00		\$ 68.088.506,00		\$ 7.801.596,00		\$ 60.286.910,00		\$ 68.088.506,00
9.0	LÍNEA DE DEMARCACIÓN	M	671,00	\$ 5.469,00	\$ 3.669.699,00	666,00	\$ 3.642.354,00	0	\$ 0,00	666,00	\$ 3.642.354,00	666,00	\$ 3.642.354,00
10.0	MARCA VIAL	M2	150,00	\$ 61.702,00	\$ 9.255.300,00	33,65	\$ 2.076.272,30	0	\$ 0,00	33,65	\$ 2.076.272,30	33,65	\$ 2.076.272,30
11.0	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UND	11,00	\$ 557.656,00	\$ 6.134.216,00	11,00	\$ 6.134.216,00	0	\$ 0,00	11,00	\$ 6.134.216,00	11,00	\$ 6.134.216,00
					\$ 19.059.215,00		\$ 11.852.842,30		\$ 0,00		\$ 11.852.842,30		\$ 11.852.842,30
	SUBTOTAL DE OBRA				\$ 712.838.542,00		\$ 759.558.126,05		\$ 687.418.373,75		\$ 72.139.752,30		\$ 759.558.126,05
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				\$ 3.564.193,00		\$ 3.564.193,00		\$ 0,00		\$ 3.564.193,00		\$ 3.564.193,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				\$ 712.839,00		\$ 712.839,00		\$ 0,00		\$ 712.839,00		\$ 712.839,00
	VALOR TOTAL				\$ 717.115.574,00		\$ 763.835.158,05		\$ 687.418.373,75		\$ 76.416.784,30		\$ 763.835.158,05
	COSTOS INDIRECTOS				\$ 213.851.562,60		\$ 227.867.437,81		\$ 206.225.512,13		\$ 21.641.925,69		\$ 206.225.512,13
	ADMINISTRACIÓN 26%				\$ 185.338.020,92		\$ 197.485.112,77		\$ 178.728.777,18		\$ 18.756.335,60		\$ 178.728.777,18
	IMPREVISTOS 1%				\$ 7.128.385,42		\$ 7.595.581,26		\$ 6.874.183,74		\$ 721.397,52		\$ 6.874.183,74
	UTILIDADES 3%				\$ 21.385.156,26		\$ 22.786.743,78		\$ 20.622.551,21		\$ 2.164.192,57		\$ 20.622.551,21
	VALOR TOTAL				\$ 717.115.574,00		\$ 763.835.158,05		\$ 687.418.373,75		\$ 76.416.784,30		\$ 763.835.158,05
	MENOS A AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO VR. TOTAL:									0,00%	\$ 0,00		
	VALOR A GIRAR:									10%	\$ 76.416.784,30		

Estado financiero

Concepto de pago	Fecha de corte	Valor acta	Amortización anticipo	Valor neto pagado/ por pagar
Anticipo				N/A
Acta parcial 1	12/12/25	\$516.103.418,30	N/A	\$516.103.418,30
Acta parcial 2	22/12/25	\$171.314.955,45	N/A	\$171.314.955,45
Acta final	11/02/26	\$76.416.784,30	N/A	\$76.416.784,30
Total		\$763.835.158,05		\$763.835.158,05
Valor inicial del contrato	Valor de adición	Valor total del contrato	Valor facturado	Saldo pendiente
\$717.115.574,00	\$46.719.584,05	\$763.835.158,05	\$76.416.784,30	\$0,00

Tabla 3. Estado financiero de obra.

Estado cronograma

El cronograma de obra entregado por el contratista cumple con los requerimientos de la entidad contratante, el cual permite realizar un buen seguimiento durante el desarrollo de la obra.

Avance acumulado programado	100%
	\$763.835.158,05
Avance acumulado ejecutado	100%
	\$763.835.158,05
Atraso (-) y/o avance (+) mensual	0%
	\$0,00

Tabla 4. Estado cronograma de obra (Programado vs. Ejecutado)

Estado de pólizas

Pólizas según suscripción del contrato de obra

- Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
- Fecha de expedición: 29/10/2025
- Fecha de aprobación: 11/11/2025

Póliza de cumplimiento No. 61-44-101061964 Anexo 0

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	23/10/2025	23/05/2026	\$76.877.812,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e	23/10/2025	23/01/2029	\$38.438.906,35

indemnizaciones laborales Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días	\$153.755.625,40
---	--------------------------	------------------

Póliza de RCE derivada de cumplimiento No. 61-40-101022504 Anexo 0

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Predios laborales y operacionales	23/10/2025	23/01/2025	\$284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	23/10/2025	23/01/2025	\$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	23/10/2025	23/01/2025	\$284.700.000,00

Pólizas según suscripción del acta de inicio de obra

- Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
- Fecha de expedición: 20/11/2025
- Fecha de aprobación:

Póliza de cumplimiento No. 61-44-101061964 Anexo 1-4

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	12/11/2025	12/06/2026	\$76.877.812,70
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2025	12/02/2029	\$38.438.906,35
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$153.755.625,40

Póliza de RCE derivada de cumplimiento No. 61-40-101022504 Anexo 1-5

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Predios laborales y operacionales	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00

Pólizas según suscripción de Otrosí modificadorio No. 1 de obra

- Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
- Fecha de expedición: 24/11/2025

Calle 2 #4-65 Barrio San José, Teruel (H)
 construmacingenierossas@gmail.com
 Cel. 320 354 6767

Informe Ejecutivo de Interventoría
 Acta Final

- Fecha de aprobación:

Póliza de cumplimiento No. 61-44-101061964 Anexo 5-6

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	12/11/2025	12/06/2026	\$71.711.557,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2025	12/02/2029	\$35.855.778,70
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$143.423.114,80

Pólizas según suscripción de Otrosí modificatorio No. 2 de obra

- Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
- Fecha de expedición: 22/12/2025
- Fecha de aprobación:

Póliza de cumplimiento No. 61-44-101061964 Anexo 7

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	12/11/2025	12/06/2026	\$76.383.515,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2025	12/02/2029	\$38.191.757,95
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$152.767.031,80

Póliza de RCE derivada de cumplimiento No. 61-40-101022504 Anexo 6

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Predios laborales y operacionales	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00

Pólizas según suscripción de Acta de Recibo Final

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 19/02/2026

Fecha de aprobación:

Calle 2 #4-65 Barrio San José, Teruel (H)
 construmacingenierossas@gmail.com
 Cef. 320 354 6767

Informe Ejecutivo de Interventoría
 Acta Final

Póliza de cumplimiento No. 61-44-101061964 Anexo 8

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	12/11/2025	12/06/2026	\$76.383.515,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2025	12/02/2029	\$38.191.757,95
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		\$152.767.031,80

Gestión social e industrial

En el marco del componente de seguridad industrial, se verifica que todos los trabajadores del contratista se encuentren debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL), y que sus pagos se encuentren al día, garantizando así el cumplimiento de la normatividad vigente en materia laboral y de riesgos profesionales.

El inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista realiza las inducciones obligatorias al personal que ingresa a laborar en las diferentes actividades de obra, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la interventoría. Estas inducciones tienen como finalidad informar al personal sobre los riesgos y peligros más comunes presentes en el entorno laboral, las posibles lesiones asociadas a su labor, los procedimientos a seguir en caso de accidente o enfermedad laboral, los canales de reporte, las rutas de atención ante emergencias y la forma adecuada de brindar primeros auxilios.

Adicionalmente, el contratista desarrolla jornadas de capacitación orientadas al fortalecimiento de la cultura de prevención, donde se socializan los reglamentos internos en materia de higiene y seguridad, los riesgos propios de la obra, y la planificación de las actividades diarias, promoviendo así una ejecución segura y eficiente de los trabajos.

Asimismo, se realiza la entrega de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para cada labor, con el fin de minimizar la exposición a riesgos y salvaguardar la integridad física de los trabajadores durante el desarrollo del proyecto.

Personal técnico – administrativo

Durante el periodo correspondiente a este informe, el contratista de obra vinculó a los siguientes profesionales en su nómina para el desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto.

ÍTEM	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	EPS	ARL	AFP
1	Director de obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	X	X	X
2	Residente de obra	Yerson Fernando Camacho Ladino	X	X	X
3	Profesional HSEQ	Mercy Jazmín Plazas Calderón	X	X	X

Tabla 5. Equipo de profesionales del contratista de obra.

Personal operativo

Así mismo, para la ejecución de las actividades en campo, el contratista vinculó personal operativo (mano de obra no calificada), conforme a las necesidades del proyecto, como se relaciona a continuación:

ÍTEM	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	EPS	ARL	AFP
1	Ayudante	Hermenegildo Hernández Cubillos	X	X	X
2	Ayudante	Leonardo Herrera Góngora	X	X	X
3	Ayudante	Nelson Javier Herrera Moreno	X	X	X
4	Ayudante	Yeison Fabián Leyva Ordoñez	X	X	X

Tabla 6. Mano de obra no calificada del contratista de obra.

Gestión ambiental

En el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA) correspondiente al Contrato de Obra No. 154 de 2025, el contratista implementó durante el periodo reportado diversas medidas de prevención, control y mitigación de impactos ambientales. Entre las acciones ejecutadas se destacan: la socialización de lineamientos ambientales al personal, el uso racional de recursos como agua y energía, la disposición clasificada de residuos sólidos en puntos ecológicos, la revisión preventiva de maquinaria y vehículos para evitar emisiones contaminantes y fugas, así como el almacenamiento seguro de combustibles y sustancias peligrosas.

Durante este periodo no se realizaron talas ni podas, ni se efectuaron vertimientos a cuerpos de agua. Las acciones ejecutadas se desarrollaron conforme a los programas establecidos en el PMA, y aportan a la protección del aire, agua, suelo, flora, fauna y a la seguridad de la comunidad.

Estado del tiempo

DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025																			
Clima	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Soleado		X	X			X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	
Nublado																			
Lluvioso	X	X	X	X		X			X	X							X		

DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

Clima	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Soleado	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x			x		x		x
Nublado																						
Lluvioso		x	x							x						x	x		x			

DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE ENERO DE 2026

Clima	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soleado																						
Nublado																						
Lluvioso																						

DEL 14 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2026

Clima	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Soleado										x	x		x	x	x	x						
Nublado																						
Lluvioso																						

DEL 5 AL 11 DE FEBRERO DE 2026

Clima	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Soleado		x																				
Nublado																						
Lluvioso																						

Maquinaria y equipo

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo completo de topografía	1
Retroexcavadora de orugas	1
Volqueta	2
Vibro compactador	1
Compactador tipo canguro	1
Hormigonera	1

Gestión de calidad

Durante el periodo reportado, y con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proyecto, específicamente para la placa de pavimento rígido, se realizaron ensayos de flexión en vigas de concreto. A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos:

Ensayo de resistencia a la flexión de vigas en concreto

Viga	Fecha de fundición	Fecha de rotura	Edad del ensayo (días)	Resistencia obtenida (kg/cm ²)	Resistencia de diseño (kg/cm ²)	% de Cumplimiento
Placa, calle 17 barrio La Esperanza						
1	28/11/25	12/12/25	14	37.3	38	98.2
2	28/11/25	26/12/25	28	41.8	38	110.1%
Placa, calle 15 barrio La Esperanza						
1	11/12/25	25/12/25	14	37.4	38	98.5%
2	11/12/25	08/01/26	28	40.7	38	107.1%
Placa, calle 16 barrio La Esperanza						
1	04/12/25	18/12/25	14	36.8	38	96.9%
4	04/12/25	01/01/26	28	39.8	38	104.8%

Tabla 7. Resultados de ensayos de resistencia a la flexión de vigas en concreto.

Señalización y demarcación de obra

Durante el tiempo transcurrido desde el inicio del contrato y en el avance actual del proyecto, el contratista de obra ha implementado de manera adecuada el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Para ello, se ha llevado a cabo la señalización preventiva, informativa y reglamentaria requerida en cada frente de trabajo, garantizando el ordenamiento de la movilidad y la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía. Asimismo, el contratista ha realizado la instalación, adecuación y retiro progresivo de los dispositivos de control de tránsito conforme al desarrollo de las actividades constructivas, siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y en el PMT aprobado por interventoría.

RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 155 - 25

Información general

- **Objeto del contrato:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA”
- **Fecha de suscripción:** 23 de octubre de 2025.
- **Contratante:** Municipio de Teruel.
- **Contratista:** CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
NIT: 900.116.571-8
Rep. Legal: Daniela Carrillo Tavera
CC: 1.007.750.886 de Armenia.

Información financiera

- **Valor inicial del contrato:** \$53.814.465,60 M/CTE
- **Anticipo:** N/A

Plazos y fechas clave

- **Plazo inicial:** 3 meses
- **Acta de inicio:** 12 de noviembre de 2025
- **Fecha de terminación:** 11 de febrero de 2026 y en todo caso hasta la liquidación del contrato de obra.

Estado de ejecución

A corte del 11 de febrero de 2026

- **Tiempo transcurrido:** 92 días calendario.
- **Estado actual:** En ejecución hasta la liquidación de obra.

Avance en tiempo

Periodo	Fecha	Días ejecutados	% del tiempo ejecutado
Inicio - Terminación	12/11/25 - 11/02/26	92	100%
Total acumulado		92	100%

Tabla 8. Avance en tiempo contrato de interventoría.

Modificaciones en tiempo y/o suspensiones

Durante el período transcurrido desde la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, no se han realizado modificaciones al plazo establecido ni se ha suscrito acta de suspensión asociada a su ejecución.

Ejecución contractual

A corte del 11 de febrero de 2026, el contrato de interventoría presenta un avance acumulado del **100%**, equivalente a **\$53.814.465,60 M/CTE**, en coherencia con el progreso físico del contrato de obra supervisado en ese mismo periodo. Este porcentaje constituye la base de referencia para la facturación del presente informe.

Avance acumulado programado	100%
	\$53.814.465,60
Avance acumulado ejecutado	100%
	\$53.814.465,60
Atraso (-) y/o avance (+) mensual	0%
	\$0,00

En este contexto, se tramitará el cobro del **Acta Final** por un valor de **\$5.381.446,56 M/CTE**, correspondiente al **10%** del valor total del contrato, definido con base en las actividades de interventoría integral realizadas durante el periodo del **23 de diciembre de 2025 al 11 de febrero de 2026**.

En concordancia con lo anterior, a continuación se presenta la distribución de costos correspondiente al periodo ejecutado, con base en la oferta económica del contrato de interventoría. Este desglose refleja los servicios efectivamente prestados por el equipo de profesionales durante el tiempo de ejecución de la obra.

ÍTEM	CONDICIONES ORIGINALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL								
1	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	UND	\$ 5.700.000,00	10,00%	\$ 570.000,00	100%	\$ 5.700.000,00
2	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	UND	\$ 7.800.000,00	10,00%	\$ 780.000,00	100%	\$ 7.800.000,00
3	PROFESIONAL SOCIAL	1,00	UND	\$ 1.350.000,00	10,00%	\$ 135.000,00	100%	\$ 1.350.000,00
4	PROFESIONAL HSEQ	1,00	UND	\$ 1.350.000,00	10,00%	\$ 135.000,00	100%	\$ 1.350.000,00
	SUBTOTAL			\$ 16.200.000,00		\$ 1.620.000,00		\$ 16.200.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR			\$ 29.646.000,00	1,83	\$ 2.964.600,00	1,83	\$ 29.646.000,00
	VALOR TOTAL PERSONAL			\$ 29.646.000,00		\$ 2.964.000,00		\$ 29.646.000,00
OTROS COSTOS VARIADOS								

ÍTEM	CONDICIONES ORIGINALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	TRANSPORTE	1,00	MES	\$ 5.100.000,00	10,00%	\$ 510.000,00	100%	\$ 5.100.000,00
2	ENSAYOS DE LABORATORIO (CILINDROS)	1,00	UND	\$ 4.000.000,00	10,00%	\$ 400.000,00	100%	\$ 4.000.000,00
3	PAPELERÍA	1,00	MES	\$ 1.800.000,00	10,00%	\$ 180.000,00	100%	\$ 1.800.000,00
4	PÓLIZAS	1,00	UND	\$ 2.000.000,00	10,00%	\$ 200.000,00	100%	\$ 2.000.000,00
5	GASTOS DE OFICINA, SERVICIOS Y OTROS	1,00	MES	\$ 1.500.000,00	10,00%	\$ 150.000,00	100%	\$ 1.500.000,00
6	DOTACIÓN	1,00	GL	\$ 1.176.240,00	10,00%	\$ 117.624,00	100%	\$ 1.176.240,00
	SUBTOTAL			\$ 15.576.240,00		\$ 1.557.624,00		\$ 15.576.240,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 45.222.240,00		\$ 4.522.224,00		\$ 45.222.240,00
	I.V.A			\$ 8.592.225,60	19%	\$ 859.222,56	19%	\$ 8.592.225,60
	VALOR DE LA INTERVENTORÍA			\$ 53.814.465,60		\$ 5.381.446,56		\$ 53.814.465,60

Tabla 9. Resumen de costos acta final de interventoría.

El cumplimiento de las obligaciones contractuales se refleja en la ejecución de las siguientes actividades:

Actividades de supervisión

- **Control y seguimiento:** Se verificó que los procesos técnicos del contratista de obra se ajusten a las normas, planos, estudios, diseños, cronograma y presupuesto.
- **Revisión de diseños:** Se realizó la revisión técnica de los diseños del proyecto antes de que inicien las actividades constructivas.
- **Inspección y Ensayos:** Se realizó el control de calidad de la obra mediante ensayos de laboratorio y pruebas necesarias, rechazando materiales u obras que no cumplan las especificaciones.
- **Instrucciones y Órdenes:** Se impartió instrucciones por escrito al contratista de obra y se solicitará cuando sea necesario la suspensión de trabajos que se ejecuten de forma indebida.
- **Planos Récord:** Se mantuvieron actualizados los planos del contrato de obra conforme las modificaciones introducidas y se entregaron los planos récord finales en la liquidación del contrato de obra.
- **Aprobación de Programas:** Se revisó y aprobó los programas de trabajo, de inversión y de entrega de recursos presentados por el constructor.
- **Informes Mensuales:** Se presentaron los informes mensuales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, detallando el estado de ejecución del proyecto, el cumplimiento de las metas físicas y las novedades presentadas.
- **Documentación:** Se llevó una bitácora de obra foliada donde se constaron todos los eventos, decisiones y visitas de funcionarios.
- **Veeduría Ciudadana:** Se gestionó previo al inicio de actividades la conformación de un comité de veeduría con la comunidad beneficiaria para el seguimiento del contrato. Posteriormente, en la etapa de liquidación del contrato de obra, se hizo cierre de veedurías, no existiendo ninguna novedad en la clausura de parte de la comunidad.

- **Control Presupuestal:** Se vigiló que no se sobrepasara el valor del contrato y sus modificaciones, y se ha mantenido un análisis mensual del avance financiero.
- **Trámite de Pagos:** Se revisó y gestionó oportunamente las solicitudes de pago del contratista de obra.
- **Vigilancia de Garantías:** Se aseguró que las pólizas de garantía del contrato de obra se mantuvieran vigentes y con los amparos suficientes.
- **Cumplimiento Laboral:** Se verificó que el contratista cumpliera con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de su personal de obra.
- **Gestión Ambiental:** Se veló por la implementación de las medidas de manejo ambiental y la adecuada disposición de residuos.
- **Seguridad Industrial:** Se inspeccionó que se cumplieran las normas de seguridad industrial, señalización y el uso de elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores.
- **Inspección y Recibo Final:** Se realizó la inspección técnica final para la entrega de las obras y se elaboró el informe técnico respectivo. Se suscribió acta de recibo final de las actividades ejecutadas junto con el contratista de obra.
- **Documentación Técnica:** Se entregaron los planos récord de lo construido, la bitácora de seguimiento, memorias de cálculo de cantidades ejecutadas, registro fotográfico y el cierre ambiental.
- **Preparación de la Liquidación:** Se gestionó y revisó los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra. Se proyectó y preparó el acta de liquidación de dicho contrato en conjunto con el contratista de obra, garantizando que las cifras correspondan a lo efectivamente ejecutado.

Estado financiero

Concepto de pago	Fecha de corte	Valor acta	Amortización anticipo	Valor neto pagado/ por pagar
Anticipo				N/A
Acta parcial 1	22/12/2025	\$48.433.019,04	N/A	\$48.433.019,04
Acta final	11/02/2026	\$5.381.446,56	N/A	\$5.381.446,56
Total		\$53.814.465,60		\$53.814.465,60
Valor inicial del contrato	Valor de adición	Valor total del contrato	Valor facturado	Saldo pendiente
\$53.814.465,60	\$0,00	\$53.814.465,60	\$5.381.446,56	\$0,00

Tabla 10. Estado financiero de interventoría.

Estado de pólizas

Pólizas según suscripción del contrato de interventoría

- Aseguradora: Seguros Mundial

- Fecha de expedición: 29/10/2025
- Fecha de aprobación: 07/11/2025

Póliza de cumplimiento No. CHU-100061044 Anexo 0

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	23/10/2025	23/07/2026	\$10.762.893,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23/10/2025	23/07/2026	\$16.144.339,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23/01/2029	23/01/2029	\$10.762.893,20
Calidad del servicio	23/01/2031	23/01/2031	\$10.762.893,20

Póliza de RCE derivada de cumplimiento No. CHU-100011500 Anexo 0

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	23/10/2025	23/01/2026	\$284.700.000,00
Patronal	23/10/2025	23/01/2026	\$284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	23/10/2025	23/01/2026	\$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	23/10/2025	23/01/2026	\$284.700.000,00

Pólizas según suscripción del acta de inicio de interventoría

- Aseguradora: Seguros Mundial
- Fecha de expedición: 25/11/2025
- Fecha de aprobación: 02/12/2025

Póliza de cumplimiento No. CHU-100061044 Anexo 1-2

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	12/11/2025	12/08/2026	\$10.762.893,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2025	12/08/2026	\$16.144.339,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2025	12/02/2029	\$10.762.893,20

Calidad del servicio	12/02/2026	12/02/2031	\$10.762.893,20
----------------------	------------	------------	-----------------

Póliza de RCE derivada de cumplimiento No. CHU-100011500 Anexo 1-2

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00
Patronal	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	12/11/2025	12/02/2026	\$284.700.000,00

Póliza según suscripción del acta final de interventoría

Aseguradora: Seguros Mundial

Fecha de expedición: 13/03/2026

Fecha de aprobación: 17/03/2026

Póliza de cumplimiento No. CHU-100061044 Anexo 3

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	12/11/2025	12/08/2026	\$10.762.893,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2025	12/08/2026	\$16.144.339,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2025	12/02/2029	\$10.762.893,20
Calidad del servicio	11/02/2026	11/02/2031	\$10.762.893,20

Personal técnico – administrativo

Durante el periodo correspondiente a este informe, el contratista de interventoría vinculó a los siguientes profesionales en su nómina para el desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto.

ÍTEM	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	EPS	ARL	AFP
1	Director de interventoría	Germán Escobar Melo	x	x	x
2	Residente de interventoría	Daniela Carrillo Tavera	x	x	x
3	Profesional HSEQ	Nelson Muñoz Losada	x	x	x
4	Profesional Social	Yina Marcelli Muñoz Burbano	x	x	x

Gestión de calidad

Durante el periodo reportado, y con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proyecto, se realizaron ensayos de flexión en vigas y de compresión en cilindros de concreto para elementos como la placa del pavimento rígido y los bordillos. A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos:

Ensayo de resistencia a la flexión de vigas en concreto

Viga	Fecha de fundición	Fecha de rotura	Edad del ensayo (días)	Resistencia obtenida (kg/cm ²)	Resistencia de diseño (kg/cm ²)	% de Cumplimiento
Placa, calle 17 barrio La Esperanza						
1	28/11/25	26/12/25	28	38.6	38	102%
Placa, calle 16 barrio La Esperanza						
2	04/12/25	01/01/26	28	39.2	38	103%
Placa, calle 15 barrio La Esperanza						
3	11/12/25	08/01/26	28	40.4	38	106%
Placa, calle 14 barrio La Esperanza						
4	13/12/25	10/01/26	28	37.9	38	100%

Tabla 11. Resultados de ensayos de resistencia a la flexión de vigas en concreto.

Ensayo de compresión en cilindros de concreto

Viga	Fecha de fundición	Fecha de rotura	Edad del ensayo (días)	Resistencia obtenida (PSI)	Resistencia de diseño (PSI)	% de Cumplimiento
Bordillos, Calle 15 barrio La Esperanza						
1	24/12/25	07/01/26	14	2811	2500	112%
2	24/12/25	21/01/26	28	3041	2500	122%

Tabla 12. Resultados de ensayos de compresión en cilindros de concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Barrio La Esperanza



Acero de refuerzo bordillos.



Fundición bordillos en concreto clase E.



Nivelación de pozos barrio La Esperanza.



Nivelación de pozos barrio La Esperanza.



Curado de bordillos en concreto.



Curado de pavimento rígido en concreto.

Barrio La Esperanza



Corte para dilataciones del pavimento.



Curado de pavimento rígido.



Limpieza de obra.



Fraguado de bordillos.




Toma de muestras de concreto para ensayo de compresión (bordillos)



Muestras de concreto desmoldadas para iniciar proceso de curado y fallar en los próximos días.


Barrio La Esperanza

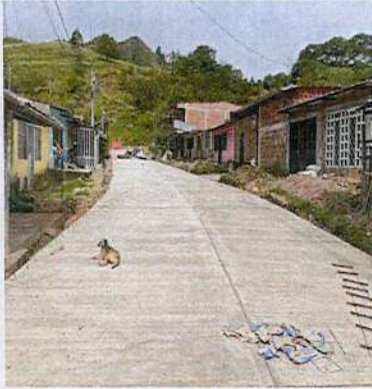

Pavimento rígido en concreto barrio La Esperanza.




Pavimento rígido en concreto barrio La Esperanza.



Inspección final de la obra en compañía de la supervisión.



Señalización vertical instalada.

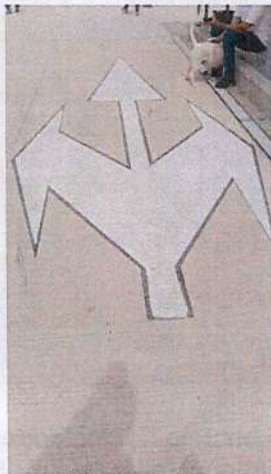

Demarcación vial.



Demarcación vial.

CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES

- A corte del 11 de febrero de 2026, el contrato de obra presenta un avance físico acumulado del **100%**, correspondiente a una ejecución valorada en **\$763.835.158,05 M/CTE**, lo que refleja un desarrollo positivo del proyecto en relación con el cronograma general.
- El contrato de interventoría, en concordancia con dicho avance, alcanzó un **progreso equivalente al 100%** del valor contratado, sobre el cual se estructura el **cobro del Acta Final, por valor de \$5.381.446,56 M/CTE**, correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el tiempo de supervisión técnica.
- El valor presentado para el cobro de la interventoría refleja con precisión la correcta ejecución de los servicios de supervisión prestados durante el periodo comprendido entre el **23 de diciembre de 2025 y el 11 de febrero de 2026**, sin exceder el porcentaje de avance permitido a la fecha. Este valor fue determinado con base en la propuesta económica aprobada, en proporción al tiempo ejecutado, y en concordancia con el avance físico alcanzado en el contrato de obra.
- Durante el periodo reportado, se adelantaron las actividades constructivas correspondientes a la fundición de bordillos, el ajuste de cotas en pozos de inspección y la señalización vial (horizontal y vertical).
- Los resultados de los **ensayos de resistencia a la flexión** en el pavimento rígido y de **compresión** en los bordillos de concreto demuestran el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando así la integridad de las obras ejecutadas.
- La interventoría ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales, realizando un seguimiento riguroso a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales del contrato de obra, contribuyendo al avance ordenado y conforme a las condiciones pactadas.
- Se recomienda la implementación de una **plan de mantenimiento preventivo**, especialmente para la demarcación vial, señales verticales y las juntas de pavimento rígido, con el fin de prolongar la vida útil de la estructura.


DANIELA CARRILLO TAVERA
Representante Legal
C.C. 1.007.750.886 de Armenia
Tel. 320 354 6767
construmacingenierossas@gmail.com

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
NIT 900.116.571-8

Calle 2 #4-65 Barrio San José, Teruel (H)
construmacingenierossas@gmail.com
Cel. 320 354 6767


Informe Ejecutivo de Interventoría
Acta Final

ANEXOS DEL INFORME

- INFORME DE LABORATORIO
- BITÁCORA

CONSTRUMAC INGENIEROS

**ENSAYOS DE LABORATORIO
RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE
CONCRETO - NORMA INV E-414-13**

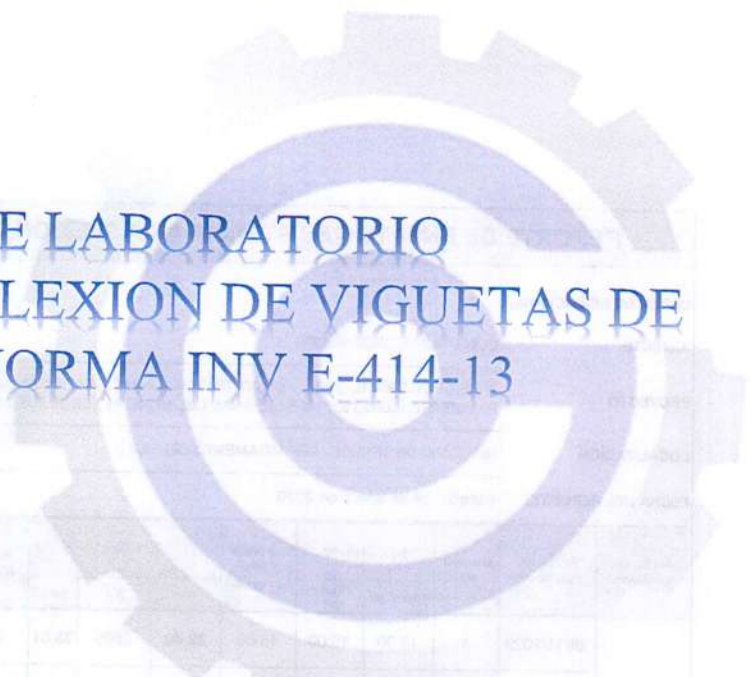

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL
AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES
'CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL,
DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

REPORTE: 24 DE ENERO 2026

ASESORIA – CONSULTORIA – INTERVENTORIA

Teléfonos: 316 300 4752 – 310 246 3804

E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

INGELAB – SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

GEOTECNIA

SUELOS

CONCRETOS

PAVIME

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA FLEXION DE VIGUETAS DE CONCRETO - NORMA INV E-414-13

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE CONSTRUMAC INGENIEROS

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 'CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

LOCALIZACION MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL REPORTE: sábado, 24 de enero de 2026

Fecha de recepcion	Fecha de Fundicion	Muestra No.	Medidas (cm)		Distancia Entre Apoyos (L)	Lectura			Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Modulo de Rotura obtenido (mpa)	%de Fraguado	Modulo de Rotura (mpa)	Observaciones y/o Ubicación
			Altura (d)	Altura (d)		KN	Kg	mpa						
26/12/2025	28/11/2025	1	15,00	15,00	45,00	<u>28,40</u>	2896	38,61	28	26-dic-25	38,6	102%	38,0	CALLE 17 - BARRIO LA ESPERANZA
	4/12/2025	2	15,00	15,00	45,00	<u>28,80</u>	2937	39,16	28	1-ene-26	39,2	103%	38,0	CALLE 16 - BARRIO LA ESPERANZA
	11/12/2025	3	15,00	15,00	45,00	<u>29,70</u>	3029	40,38	28	8-ene-26	40,4	106%	38,0	CALLE 15 - BARRIO LA ESPERANZA
	13/12/2025	4	15,00	15,00	45,00	<u>27,90</u>	2845	37,93	28	10-ene-26	37,9	100%	38,0	CALLE 14 - BARRIO LA ESPERANZA

OBSERVACIONES:

Calculo
Jose Luis vargas Quimbaya
Coordinador de Laboratorio

ASESORIA – CONSULTORIA – INTERVENTORIA

Teléfonos: 316 300 4752 – 310 246 3804

E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

INGELAB – SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

GEOTECNIA

SUELOS

CONCRETOS

PAVIMI

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO

CONTRATISTA

CONSTRUMAC INGENIEROS

PROYECTO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 'CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

UBICACIÓN

MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA


FECHA EMISION INFORME:

sábado, 24 de enero de 2026



FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN	Lbs							
	24/12/2025	1	10,00	20,00	152,2	34216	14	7/01/2026	2811	112%	5	2500	BORDILLOS CALL 15 BARRIO LA ESPERANZA - TERUEL TRAMO # 2
	24/12/2025	2	10,00	20,00	164,7	37026	28	21/01/2026	3041	122%	5	2500	



Tipo 1




Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4



Tipo 5



Tipo 6

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO CONVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

Fener Gonzales

REALIZO
FENER GONZALES
LABORATORISTA

Jose Luis Vargas Quimbaya

CALCULO
JOSE LUIS VARGAS QUIMBAYA
JEFE DE LABORATORIO

ASESORIA – CONSULTORIA – INTERVENTORIA

Teléfonos: 316 300 4752 – 310 246 3804

E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REGISTRO FOTOGRAFICO



22-12-2025 Día: Sábado

Personal en obra: 1 maestro 6 operarios

Maquinaria: Retroexcavadora

Actividades: Se inicia realizando el desmoldado de bordillos fundidos el día sábado y se procede a instalar formateo en la calle 15. Una vez instalado se procede a preparar la fundición de bordillos.

Pres. Obra: [Firma]
Res. Int: [Firma]

23-12-2025 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza la instalación de formateo para fundición de bordillo en calle 15 entre carreras 4 y 3. Se procede a realizar la fundición de bordillo de un costado de la calle garantizando sus debidas dimensiones.

Pres. Obra: [Firma]
Res. Int: [Firma]

24-12-2025 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el retiro de formateo de bordillo fundido en la calle 15 entre carrera 4 y 3. Se realiza la debida limpieza y retiro de elementos de formateo. Se realiza limpieza en obra. Se labora hasta medio día.

Pres. Obra: [Firma]
Res. Int: [Firma]

25-12-2025 Día festivo - Día no trabajado

26-12-2025 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

NICE

Actividades: Se realiza la instalación de formateo para fundición del siguiente costado de bordillo en Calle 15 entre carreras 4 y 3. Se procede a realizar la fundición de bordillo garantizando sus debidas dimensiones.

Pres. Obra: [Firma]
Res. Int: [Firma]

27-12-2025 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el retiro de formateo de bordillo fundido en la calle 15 entre carrera 4 y 3. Se realiza la debida limpieza y retiro de elementos de formateo. Se realiza limpieza en obra. Se labora hasta medio día.

Pres. Obra: [Firma]
Res. Int: [Firma]

28-12-2025 Día domingo - Día no trabajado

29-12-2025 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el encofrado de ambos costados de la calle 15 entre carrera 3 y 2. Se procede a realizar la debida fundición de bordillo garantizando las dimensiones del bordillo.

Pres. Obra: [Firma]
Res. Int: [Firma]

30-12-2025 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el desencofrado de bordillo fundido día anterior en la calle 15 entre carrera 3 y 2. Se realiza la

NICE

debidamente limpieza de obra. Se labora hasta medio día.

Juan Samuel Res. Obra
Daniel Res. Int.

31-12-2025 Día No laborado, se retoman actividades el día 5 de enero del 2026

01-01-2026 Día no laborado.

02-01-2026 Día no laborado.

03-01-2026 Día no laborado.

04-01-2026 Día no laborado.

05-01-2026 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

Actividades: Se inicia obra y se inicia realizando la instalación de formaleta para fundición de un costado de bordillo en la calle 16 entre carreras 4 y 3. Se realiza la debida verificación de dimensiones. Se procede a fundir el costado derecho.

Juan Samuel Res. Obra
Daniel Res. Int.

06-01-2026 Clima:

Personal en Obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el retiro de formaleta en costado derecho y la instalación de formaleta para fundición del siguiente costado de bordillo en la calle 16 entre carreras 4 y 3. Se realiza la debida verificación de dimensiones. Se procede a fundir el costado izquierdo.

Juan Samuel Res. Obra
Daniel Res. Int.

07-01-2026

Clima:

Personal en Obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el retiro de formaleta en costado izquierdo y la instalación de formaleta para fundición de bordillo en la calle 16 entre carreras 3 y 2. Se realiza la debida verificación de dimensiones. Se procede a fundir ambos costados.

Juan Samuel Res. Obra
Daniel Res. Int.

08-01-2026

Clima:

Personal en Obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el retiro de formaleta en calle 16 entre carreras 3 y 2, garantizando el aseo y limpieza de la cimbra. Se da inicio a el corte y demolición en placas para la reparación de fisuras.

Juan Samuel Res. Obra
Daniel Res. Int.

09-01-2026

Clima:

Personal en Obra:

Maquinaria:

Actividades: Se continúa con la demolición en placas para reparación de fisuras, garantizando el retiro de escombros y su debida limpieza. Se realiza igualmente la instalación de formaleta en costado derecho de la calle 17 para la debida fundición de bordillo.

Juan Samuel Res. Obra
Daniel Res. Int.

10-01-2026

Clima:

Personal en Obra:

Maquinaria:

Actividades: Se finaliza la demolición en placas para reparación de fisuras, procediendo a realizar las debidas fundiciones.

Se finaliza realizando la debida limpieza en sitio. Se trabaja hasta medio dia.

Juan Suarez
Res. Obra
Res. Int

11-01-2026 Dia domingo - Dia no trabajado

12-01-2026 Dia lunes festivo. - Dia no trabajado

13-01-2026 Clima:

Personal en obra:

Maquinaria:

Actividades: Se inicia semana, continuando con la fundicion de bordillo en la calle 17 del costado derecho. Se realizan el debido aseo y limpieza de obra.

Juan Suarez
Res. Obra
Res. Int

14-01-2026 Clima:

Personal en Obra:

Maquinaria:

Actividades: Se realiza el desencofrado y la instalacion de formaleta en el siguiente costado de la calle 17. Se prosigue a realizar la fundicion de bordillos, alcanzando la fundicion en su totalidad. Se realiza aseo y limpieza en obra.

Juan Suarez
Res. Obra
Res. Int

15-01-2026 Clima:

No se cuenta con personal y maquinaria en obra debido a que se termino con la actividad de fundicion de bordillos quedando pendiente la instalacion de la señalizacion vial y demarcacion de esta realizando la coordinacion con el contratista.

NKB

que va a recibir dicha actividad para el inicio de la misma.

Juan Suarez
Res. Obra
Res. Int

23-01-2026 Clima: Soleado.

Personal: Cuadrilla de pintura.

Maquinaria: Comoneta.

Se inicia con la actividad de demarcacion vial en la calle 17 en ambos costados, tambien se realiza la marca vial.

Juan Suarez
Res. Obra
Res. Int

24-01-2026 Clima: Soleado. Inicio en horas de la tarde.

Personal: Cuadrilla de pintura.

Maquinaria: Comoneta.

Se continua con la demarcacion vial en la calle 16 pero no se puede terminar porque se presentan lluvias en horas de la tarde.

Juan Suarez
Res. Obra
Res. Int

26-01-2026 Clima: Soleado.

Personal: Cuadrilla pintura.

Maquinaria: Comoneta.

Actividades: Se continua con la demarcacion vial en la calle 17 y reforza vial en la misma. Se inicia con la demarcacion vial de la calle 15.

Juan Suarez
Res. Obra
Res. Int

27-01-2026 Clima: Soleado.


Personal: Cuadrilla pintura.

NKB

Mayaguez Comarca
 Actividades Se Continúa con la demarcación
 vial de la calle 15 y moración vial
 se termina la actividad en la calle 15 y
 se pasa a la calle 14.

11.

Juan Suarez


 INGE. GESTOR
 INT.


12.

13- 23-01-2026

Clima Soleado.

Personal: Cuadrilla de pintura

Actividad Se termina con la demarcación y
 moración vial en todas las calles cuadrando
 pendiente la instalación de los señales
 verticales.


 INGE. GESTOR
 INT.

Juan Suarez


14.

24-01-2026: Clima Soleado.

Personal: Ayudantes

Mayaguez.

Actividad: Se realiza asco de obra y
 retiro de equipos.


 INGE. GESTOR
 INT.

Juan Suarez

15.

05-02-2026

Clima Soleado.

Personal: 2 Ayudantes



Actividad: Se realiza la instalación de los
 señales verticales de poste según diseño
 cuadrando terminado en su totalidad los

actividades propias del contrato.



RESIDENTE INTEGRA.



	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Municipio de Teruel
Fecha Aprobación: 27 de junio de 2025	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: SP-C31-P02-F03 Versión: 1 Página 1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°155 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TERUEL Y CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 'CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
NIT: 900116571-8
REP. LEGAL CEDULA: DANIELA CARRILLO TAVERA
 1.007.750.886 de Armenia

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA PESOS (\$53.814.465,60) MCTE

VALOR ADICIONAL: 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA PESOS (\$53.814.465,60) MCTE

PLAZO: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.


FECHA ACTA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA ACTA DE REINICIO: N/A

VALOR PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$5.381.446,56) M/CTE


FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: 11 DE FEBRERO DE 2026.

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Municipio de Teruel
		Código: SP-C31-P02-F03
Fecha Aprobación: 27 de junio de 2025	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión: 1 Página 2 de 2

En Teruel, a los once (11) días del mes de febrero de 2026, se reunieron el señor **CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS**, Secretario de Desarrollo Económico e Infraestructura en calidad de supervisor del contrato y **DANIELA CARRILLO TAVERA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.007.750.886 de Armenia, representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S, en calidad de interventora, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Teruel, por las partes intervinientes hoy once (11) de febrero del año 2026.

CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS
Supervisor.


DANIELA CARRILLO TAVERA
R/L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
Interventoría



Municipio de
Teruel

MUNICIPIO DE TERUEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTA FINAL



OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

CONTRATISTA: CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S NIT. 900.116.571-8	CONTRATO No.:	155 DE 2025	Vr. ADICIONAL:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL: ING. DANIELA CARRILLO TAVERA CC 1.007.750.886 de Armenia (Q)	Vr. CONTRATO:	\$ 53.814.465,60	Vr. PRESENTE ACTA:	
FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	Vr. ANTICIPO:	N/A		\$ 5.381.446,56
PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	SUSPENSIÓN 1:	N/A	FECHA PRESENTE ACTA:	
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 2026	REINICIO 1:	N/A		11 de febrero de 2026

En Teruel (H), a los once (11) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), se reunieron CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS en calidad de Secretario de Desarrollo Económico e Infraestructura, supervisor del Contrato de interventoría 155 de 2025 y DANIELA CARRILLO TAVERA Representante Legal de la empresa CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S., contratista interventor, con el fin de suscribir la presente Acta Final, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		
		CANT.	UND	VALOR / MES BASE	% DEDICACIÓN	VALOR MES	TIEMPO MESES	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL														
1	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	UND	\$ 3.800.000,00	50%	\$ 1.900.000,00	3,00	\$ 5.700.000,00	90,00%	\$ 5.130.000,00	10,00%	\$ 570.000,00	100%	\$ 5.700.000,00
2	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1,00	UND	\$ 2.600.000,00	100%	\$ 2.600.000,00	3,00	\$ 7.800.000,00	90,00%	\$ 7.020.000,00	10,00%	\$ 780.000,00	100%	\$ 7.800.000,00
3	PROFESIONAL SOCIAL	1,00	UND	\$ 1.800.000,00	25%	\$ 450.000,00	3,00	\$ 1.350.000,00	90,00%	\$ 1.215.000,00	10,00%	\$ 135.000,00	100%	\$ 1.350.000,00
4	PROFESIONAL HSEQ	1,00	UND	\$ 1.800.000,00	25%	\$ 450.000,00	3,00	\$ 1.350.000,00	90,00%	\$ 1.215.000,00	10,00%	\$ 135.000,00	100%	\$ 1.350.000,00
SUBTOTAL								\$ 16.200.000,00		\$ 14.580.000,00		\$ 1.620.000,00		\$ 16.200.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR							1,83	\$ 29.646.000,00	1,83	\$ 26.681.400,00	1,83	\$ 2.964.600,00	1,83	\$ 29.646.000,00
VALOR TOTAL PERSONAL								\$ 29.646.000,00		\$ 26.681.400,00		\$ 2.964.600,00		\$ 29.646.000,00
OTROS COSTOS VARIADOS														
1	TRANSPORTE	1,00	MES	\$ 1.700.000,00	3,00	\$ 5.100.000,00	1,00	\$ 5.100.000,00	90,00%	\$ 4.590.000,00	10,00%	\$ 510.000,00	100%	\$ 5.100.000,00
2	ENSAYOS DE LABORATORIO (CILINDROS)	1,00	UND	\$ 4.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	90,00%	\$ 3.600.000,00	10,00%	\$ 400.000,00	100%	\$ 4.000.000,00
3	PAPELERÍA	1,00	MES	\$ 600.000,00	3,00	\$ 1.800.000,00	1,00	\$ 1.800.000,00	90,00%	\$ 1.620.000,00	10,00%	\$ 180.000,00	100%	\$ 1.800.000,00
4	PÓLIZAS	1,00	UND	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	\$ 2.000.000,00	90,00%	\$ 1.800.000,00	10,00%	\$ 200.000,00	100%	\$ 2.000.000,00
5	GASTOS DE OFICINA, SERVICIOS Y OTROS	1,00	MES	\$ 500.000,00	3,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	90,00%	\$ 1.350.000,00	10,00%	\$ 150.000,00	100%	\$ 1.500.000,00
6	DOTACIÓN	1,00	GL	\$ 1.176.240,00	1,00	\$ 1.176.240,00	1,00	\$ 1.176.240,00	90,00%	\$ 1.058.616,00	10,00%	\$ 117.624,00	100%	\$ 1.176.240,00
SUBTOTAL								\$ 15.576.240,00		\$ 14.018.616,00		\$ 1.557.624,00		\$ 15.576.240,00
VALOR COSTOS DIRECTOS								\$ 45.222.240,00		\$ 40.700.016,00		\$ 4.522.224,00		\$ 45.222.240,00
I.V.A							19%	\$ 8.592.225,60	19%	\$ 7.733.003,04	19%	\$ 859.222,56	19%	\$ 8.592.225,60
VALOR DE LA INTERVENTORIA								\$ 53.814.465,60		\$ 48.433.019,04		\$ 5.381.446,56		\$ 53.814.465,60


VALOR TOTAL PRESUPUESTO OBRA

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:	\$ 5.381.446,56
(-) AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR:	\$ 5.381.446,56

CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 5.381.446,56) MCTE, IVA INCLUIDO

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron:

CAMILLO ANDRES CERQUERA VARGAS
Secretario de Desarrollo Económico e Infraestructura - Alcaldía de Teruel.
SUPERVISOR


DANIELA CARRILLO TAVERA
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Date: 2026.03.13 11:59:10 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

NIT 860 037 013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 7T4HJuSYS6z1mUxTFeLk1w==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-0001

Table with fields: No. PÓLIZA, No. ANEXO, No. CERTIFICADO, No. RIESGO, TIPO DE DOCUMENTO, FECHA DE EXPEDICIÓN, SUC. EXPEDIDORA, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, DÍAS, VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE, VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

Table with fields: TOMADOR, DIRECCIÓN, ASEGURADO, DIRECCIÓN, BENEFICIARIO, DIRECCIÓN, No. DOC. IDENTIDAD, TELÉFONO

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE RECIBO FINAL CON FECHA DEL 11 DE FEBRERO DE 2026, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.155 DE 2025 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCION.

Table with columns: NOMBRE DEL AMPARO, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEGURADA\$, VALOR PRIMAS\$

Table with columns: INTERMEDIARIOS, TIPO, % PARTICIPACIÓN, PRIMA BRUTA, \$, 0,00

Table with columns: COMPañIA, TIPO COASEGURO, PÓLIZA LÍDER, CERTIF. LÍDER, % PARTICIPACIÓN, PRIMA NETA, \$, 0,00

Table with columns: CONVENIO DE PAGO, DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/03/2026, GASTOS EXP. \$, 0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A. ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente: Nacional: 01 8000 111 935 Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFLUADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PMS - AIF



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100061044	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	533142966	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	12/11/2025	24:00 Horas Del	13/02/2031		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
 Página web: www.seguromundial.com.co
 Correo electrónico: mundial@seguromundial.com.co
 Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.


LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CHU-100061044 y endoso, 3 cuyo afianzado es: **CONSTRUMAC INGENIEROS SAS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE TERUEL / MUNICIPIO DE TERUEL**, expedida por la Compañía en **13/03/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **13** días del mes **MARZO** del año **2026**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
 reciclando responsablemente. Protege el Medio
 Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial


- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 533142966

Fecha de Facturación	13/03/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CHU-100061044	
Periodo Facturado	12/11/2025	13/02/2031

Fecha Límite de Pago	12/04/2026	
Prima (incluye gastos de expedición)	00.00	
IVA	00.00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	00.00	

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	
CALLE 2 N 4-65 BR SAN JOS - HUILA 900.116.571		
Intermediario	ARCILA PERDOMO ASESORES D	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recatada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 533142966

Fecha de Facturación	13/03/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CHU-100061044	
Periodo Facturado	12/11/2025	13/02/2031

Fecha Límite de Pago	12/04/2026	
Prima (incluye gastos de expedición)	00.00	
IVA	00.00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	00.00	

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	
CALLE 2 N 4-65 BR SAN JOS - HUILA 900.116.571		
Intermediario	ARCILA PERDOMO ASESORES D	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000533142966(3900)00000000000(96)20260412

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990533142966(3900)00000000000(96)20260412

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES

Carulla grupo éxito efecy edeq
Bancolombia Corresponsal Bancario Punto de pago Mercar 472

OPCIÓN 2


BANCOS

Scotiabank DAVIVIENDA
Banco de Bogotá Bancolombia
Banco de Occidente


CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

RELACIÓN DETALLADA DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Contrato de Interventoría No. 155 de 2025

Periodo: noviembre 2025 - febrero 2026

Presentado por: CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.



Ítem	Nombre del profesional	Documento	Cargo/Rol	Tipo de cotizante	Periodo cotizado	Estado del pago	No. Planilla PILA	Observaciones
1	Germán Escobar Melo	19.293.454	Director de interventoría	Dependiente	2025-11	Pagada	35753573	
2	Daniela Carrillo Tavera	1.007.750.886	Residente de interventoría	Dependiente	2025-11	Pagada	35468790	
3	Nelson Muñoz Losada	1.075.255.228	Profesional HSEQ	Dependiente	2025-11	Pagada	35753573	
4	Yina Marcelli Muñoz Burbano	1.075.304.639	Profesional social	Dependiente	2025-11	Pagada	35753573	
5	Germán Escobar Melo	19.293.454	Director de interventoría	Dependiente	2025-12	Pagada	35753709	
6	Daniela Carrillo Tavera	1.007.750.886	Residente de interventoría	Dependiente	2025-12	Pagada	35740641	
7	Nelson Muñoz Losada	1.075.255.228	Profesional HSEQ	Dependiente	2025-12	Pagada	35753709	
8	Yina Marcelli Muñoz Burbano	1.075.304.639	Profesional social	Dependiente	2025-12	Pagada	35753709	
9	Daniela Carrillo Tavera	1.007.750.886	Residente de interventoría	Dependiente	2026-01	Pagada	36034448	
10	Daniela Carrillo Tavera	1.007.750.886	Residente de interventoría	Dependiente	2026-02	Pagada	36324270	

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900116571	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 13 4 50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUMACINGENIEROSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	8741735
FAX	8735493	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO TERUEL 155 DEL 2025
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1007750886	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	TAVERA
PRIMER NOMBRE	DANIELA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		\$2.704.650		35753573

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-19293454	01	5	No	No	41	801	5711001	Fijo	ESCOBAR MELO GERMAN	\$1.423.500	
CC-1075304639	01	No	No	No	41	801	5711001	Fijo	MUÑOZ BURBANO YINA MARCELI	\$1.423.500	
CC-1075255228	01	No	No	No	41	801	5711001	Fijo	MUÑOZ LOSADA NELSON	\$1.423.500	

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D	T T	T T	T V	Fecha Nov	V S	Fecha T S L	Fecha Sln	I G	Fecha Ige	Fecha Ige	L M	Fecha Lma	V A	Fecha Vac	V C	Fecha Vct	A V	Fecha Vct	Fecha Vct	IRL	Fecha Irp	Fecha Irp	
CC - 19293454	X	2025-11-12																								0		
CC - 1075304639	X	2025-11-12																								0		
CC - 1075255228	X	2025-11-12																								0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 19293454	SINAPP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1075304639	COLPENSIONES	19	\$901.550	0.1600000	\$144.300	\$0	\$0	\$144.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1075255228	COLFONDOS	19	\$901.550	0.1600000	\$144.300	\$0	\$0	\$144.300	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 19293454	SANITAS	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$901.550	5	0.0696000	\$62.800
CC - 1075304639	NUEVA E.P.S. S.A.	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$901.550	5	0.0696000	\$62.800
CC - 1075255228	NUEVA E.P.S. S.A.	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$901.550	5	0.0696000	\$62.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-19293454	COMPAMILAR DEL HUILA	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075304639	COMPAMILAR DEL HUILA	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075255228	COMPAMILAR DEL HUILA	19	\$901.550	0.0400000	\$36.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLPENSIONES	1	\$144.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$144.300	
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	
COLFONDOS	1	\$144.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$144.300	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUOVA E.F.S. S.A.	2	\$72.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$72.200	0	\$0	\$0	\$72.200	\$0	0	\$0	\$0	\$72.200	\$0	\$0	\$72.200
SANTITAS	1	\$36.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$36.100	0	\$0	\$0	\$36.100	\$0	0	\$0	\$0	\$36.100	\$0	\$0	\$36.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCA PACIDA DES	VLR INCA PACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ UACIÓ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	\$188.400	0	\$0	\$0	\$188.400	0	\$0	\$188.400	0	\$0	\$0	\$188.400

Página 3 2025-12-17 09:38:37 ASOPAGOS SA -

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	
COMPAMILAR DEL HUILA	3	\$108.300	0	\$0	\$108.300	
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$108.300
PENSIONES	2	\$288.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$188.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$108.300
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$693.600

Página 4 2025-12-17 09:38:37 ASOPAGOS SA -



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 35740641
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-12-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900116571	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 13 4 50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	8741735
FAX	8735493	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	NOMINA PRINCIPAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1007750886	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	TAVERA
PRIMER NOMBRE	DANIELA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025 Mes: 12	Año: 2026 Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
2	\$2.847.000	35740641

Página 1 2025-12-16 10:04:12 ASOPAGOS SA -

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-51801084	01	4	No	No	41	1	1701001	Fijo	CARREÑO RUIZ ROSA ALCIRA		\$1.423.500
CC-1007750886	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CARRILLO TAVERA DANIELA		\$1.423.500

NOVEDADES																				
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 51801084																		0		
CC - 1007750886																		0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 51801084	SINAPP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1007750886	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 51801084	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	1	0.0052200	\$7.500
CC - 1007750886	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	5	0.0696000	\$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-51801084	COMPAMILAR DEL HUILLA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007750886	COMPAMILAR DEL HUILLA	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

Página 2 2025-12-16 10:04:12 ASOPAGOS SA -

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$227.800
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	\$114.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$114.000	0	\$0	\$0	\$114.000	\$0	0	\$0	\$0	\$114.000	\$0	\$0	\$114.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	\$106.600	0	\$0	\$0	\$106.600	0	\$0	\$106.600	0	\$0	\$0	\$106.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPAGNAR DEL HUILA	2	\$114.000	0	\$0	\$114.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$114.000
PENSIONES	1	\$227.800

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$106.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$114.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$562.400



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 36034448
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2026-01-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900116571	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 13 4 50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	8741735
FAX	8735493	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	NOMINA PRINCIPAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1007750886	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	TAVERA
PRIMER NOMBRE	DANIELA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$3.501.810	Nro. DE RADICACIÓN
				36034448

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-51801084	01	4	No	No	41	1	1701001	Fijo	CARREÑO RUIZ ROSA ALCIRA		\$1.750.905
CC-1007750886	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CARRILLO TAVERA DANIELA		\$1.750.905

NOVEDADES																				
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 51801084																		0		
CC - 1007750886																		0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 51801084	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1007750886	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 51801084	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1007750886	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	5	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-51801084	COMPAMILAR DEL HUILA	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007750886	COMPAMILAR DEL HUILA	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$280.200
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INIERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	\$140.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140.200	0	\$0	\$0	\$140.200	\$0	0	\$0	\$0	\$140.200	\$0	\$0	\$140.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍOD O ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	\$131.100	0	\$0	\$0	\$131.100	0	\$0	\$131.100	0	\$0	\$0	\$131.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPANILAR DEL HUILA	2	\$140.200	0	\$0	\$140.200
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$140.200
PENSIONES	1	\$280.200

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$131.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$140.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$691.700



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 36324270
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2026-02-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900116571	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 13 4 50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	8741735
FAX	8735493	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	NOMINA PRINCIPAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1007750886	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	TAVERA
PRIMER NOMBRE	DANIELA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$3.501.810	Nro. DE RADICACIÓN
				36324270

Página 1 2026-02-10 07:50:54 ASOPAGOS SA -

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-51801084	01	4	No	No	41	1	1701001	Fijo	CARREÑO RUIZ ROSA ALCIRA	\$1.750.905
CC-1007750886	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CARRILLO TAVERA DANIELA	\$1.750.905

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D A D E	T A D A S	T V P P	Fecha Nov Vsp	V E T N	V S L	S L Sln	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 51801084																												
CC - 1007750886																												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 51801084	SINAPP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1007750886	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 51801084	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1007750886	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	5	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-51801084	COMPANILAR DEL HUILA	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007750886	COMPANILAR DEL HUILA	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

Página 2 2026-02-10 07:50:54 ASOPAGOS SA -

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFPE	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	\$140.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140.200	0	\$0	\$0	\$140.200	\$0	0	\$0	\$0	\$140.200	\$0	\$0	\$140.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	\$131.100	0	\$0	\$0	\$131.100	0	\$0	\$131.100	0	\$0	\$0	\$131.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPANILAR DEL HUILA	2	\$140.200	0	\$0	\$140.200
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$140.200
PENSIONES	1	\$280.200

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$131.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$140.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$631.700

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA
ALEJANDRINA ROBAYO GUZMÁN
T.P. 267588-T**


CERTIFICA

Que la empresa **CONSTRUMAC INGENIEROS SAS** identificada con NIT: 900.116.571-8 representada legalmente por **DANIELA CARRILLO TAVERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.750.886 de Armenia, se encuentra al día con el pago de nóminas y liquidaciones de los trabajadores a su cargo, así como con el pago de las obligaciones legales destinadas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos sus empleados, durante el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 11 de febrero de 2026.

Aclaremos que no realiza aportes al Sena ni al ICBF debido a que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 en el artículo 65 el cual dispone que "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Para constancia de lo anterior firmo la presente a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Firmado,


**ALEJANDRINA ROBAYO GUZMÁN
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 267588-T**

Registro de Comercio
Administración de la Ley 43 de 1990

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

267588-T

ALEJANDRINA ROBAYO GUZMAN
C.C. 52033387
RES. INSCRIPCIÓN 316 DEL 19/02/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

289027 288885

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (571) 644-4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-45 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-AGO-1971**
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1900100-01292538-F-0052033387-20220428 0078930107A 1 8504492853

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **52.033.387**
ROBAYO GUZMAN
APELLIDOS
ALEJANDRINA
NOMBRES

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 2 0 9 B C 0 4 E C 9 3 0 E 6 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEJANDRINA ROBAYO GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52033387 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 267588-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Municipio de Teruel
		Código: SP-C31-P02-F10
Fecha Aprobación: 27 de junio de 2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 1
		Página 1 de 5

CONTRATO N° 155 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TERUEL Y CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA: NIT REP. LEGAL CEDULA	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. 900.116.571 – 8 DANIELA CARRILLO TAVERA 1.007.750.886 de Armenia - Quindío
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 53.814.465,60) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$ 53.814.465,60) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	11 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 17 DE MARZO DE 2026.

En el municipio de Teruel, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026, se reunieron: el señor **GERMÁN MORALES OLIVEROS**, en su calidad de Alcalde Municipal, y la señora **DANIELA CARRILLO TAVERA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.007.750.886 de Armenia (Quindío), quien actúa como Representante Legal de **CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.**, en calidad de contratista de interventoría; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Municipio de Teruel
		Código: SP-C31-P02-F10
Fecha Aprobación: 27 de junio de 2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 1 Página 2 de 5

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	\$53.814.465,60
2. Adición - Otro Sí No. 01	N/A
3. Valor Final Contratado	\$53.814.465,60
4. Valor Final Ejecutado	\$53.814.465,60
5. Saldo a Favor del Municipio de Teruel	\$ 0,00
6. Saldo a Favor del Contratista	\$5.381.446,56


2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de iniciación	12 DE NOVIEMBRE 2025
2. Acta de recibo final	11 DE FEBRERO 2026

3.0 PÓLIZAS:

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA No: CHU – 100061044 ANEXO 0
PÓLIZA No: CHU – 100011500 ANEXO 0
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/10/2025

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No	Riesgos asegurados	Valor Asegurado (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación
				Desde	Hasta	
Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales decreto 1082	CHU – 100061044 Anexo 0	Cumplimiento	\$10.762.893,20	23/10/2025	23/07/2026	07/11/2025
		Buen manejo del anticipo	\$16.144.339,80	23/10/2025	23/07/2026	
		Prestaciones sociales	\$10.762.893,20	23/10/2025	23/01/2029	
		Calidad del servicio	\$10.762.893,20	23/01/2026	23/01/2031	
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	CHU – 100011500 Anexo 0	- Predios, laborales y operaciones - Patronal - Contratistas y subcontratistas - Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	23/10/2025	23/01/2026	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Municipio de Teruel
		Código: SP-C31-P02-F10
Fecha Aprobación: 27 de junio de 2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 1
		Página 3 de 5

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA No: CHU – 100061044 ANEXO 1 y 2
PÓLIZA No: CHU – 100011500 ANEXO 1 y 2
FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/11/2025

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No	Riesgos asegurados	Valor Asegurado (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación
				Desde	Hasta	
Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales decreto 1082	CHU – 100061044 Anexo 1 y 2	Cumplimiento	\$10.762.893,20	12/11/2025	12/08/2026	02/12/2025
		Buen manejo del anticipo	\$16.144.339,80	12/11/2025	12/08/2026	
		Prestaciones sociales	\$10.762.893,20	12/11/2025	12/02/2029	
		Calidad del servicio	\$10.762.893,20	12/02/2026	12/02/2031	
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	CHU – 100011500 Anexo 1 y 2	- Predios, laborales y operaciones - Patronal - Contratistas y subcontratistas - Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	12/11/2025	12/02/2026	

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA No: CHU – 100061044 ANEXO 3
FECHA DE EXPEDICIÓN: 13/03/2026

SEGUROS MUNDIAL						
Documento	Garantía No	Riesgos asegurados	Valor Asegurado (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación
				Desde	Hasta	
Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales decreto 1082	CHU – 100061044 Anexo 3	Cumplimiento	\$10.762.893,20	12/11/2025	12/08/2026	17/03/2026
		Buen manejo del anticipo	\$16.144.339,80	12/11/2025	12/08/2026	
		Prestaciones sociales	\$10.762.893,20	12/11/2025	12/02/2029	
		Calidad del servicio	\$10.762.893,20	11/02/2026	11/02/2031	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Municipio de Teruel
		Código: SP-C31-P02-F10
Fecha Aprobación: 27 de junio de 2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 1
		Página 4 de 5

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de egreso No.		\$48.433.019,04	\$48.433.019,04	\$5.381.446,56
PENDIENTE	PENDIENTE	\$5.381.446,56	\$53.814.465,60	\$0.00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$53.814.465,60	\$0,00	\$53.814.465,60	\$53.814.465,60	\$0.00

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$5.381.446,56) M/Legal.


5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Interventor y/o supervisor del Contrato y/o convenio certifica que el objeto se recibió mediante acta de recibo final de fecha 11 de FEBRERO de 2026.

6.0 INFORME

Que, según el acta de recibo final e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *“ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de prestación de servicios”*.

De igual manera se dejó constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Municipio de Teruel
		Código: SP-C31-P02-F10
Fecha Aprobación: 27 de junio de 2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 1
		Página 5 de 5

7.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de TERUEL cancelará al Contratista la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$5.381.446,56)** M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

GERMAN MORALES OLIVEROS
Alcalde Municipal


DANIÉLA CARRILLO TAVERA
RL. CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
Contratista de Interventoría
