

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  
CONTRATO DE OBRA SVIV UM 001 DE 2026. (CO1.PCCNTR.9263176)**

**OBJETO: REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO  
PLUVIAL EN EL BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA 9 A 22-59 Y EN EL BARRIO  
EL DORADO CARRERA 14 MANZANA A DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE  
SANTANDER**



**CONTRATISTA: IINCOAS SAS  
NIT 901389045**

**PERIODO:  
02 DE FEBRERO 2026 HASTA 01 DE MARZO DE 2026**

**SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
Ocaña, 2026**

## INTRODUCCIÓN

El Municipio de Ocaña, adelantó proceso de contratación bajo la modalidad de menor cuantía No. SVIV UM 001 DE 2026, bajo el cual se celebró en la plataforma del Secop II, contrato de obra pública No. (CO1.PCCNTR.9263176) de fecha 29 de enero de 2026, cuyo objeto es REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA 9 A 22-59 Y EN EL BARRIO EL DORADO CARRERA 14 MANZANA A DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, por término de un (01) meses.

El Municipio de Ocaña, con el apoyo de la secretaría de Vías, Infraestructura Y Vivienda en cumplimiento de las obligaciones delegadas al supervisor del contrato de obra, se permite presentar el Informe FINAL comprendido entre el 02 de febrero al 01 de marzo de 2026 con el objeto de informar al MUNICIPIO; las actividades supervisadas y entregadas por el contratista al Supervisor administrativo, legal y financiero, durante la etapa de ejecución del contrato de la referencia. En el presente informe se detallarán las actividades descritas y desarrolladas por el contratista de obra y la Supervisión como parte integral de la ejecución del contrato y se elabora de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

**1. INFORMACION CONTRATO DE OBRA**

|                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO:                        | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATO No.                             | SVIV UM 001 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9263176)                                                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA:<br>Nit o C.C. No.           | IINCOAS SAS<br>R/L SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA<br>NIT 901389045<br>C.C 1091.668.650                                                                                                                       |
| OBJETO:                                  | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA 9 A 22-59 Y EN EL BARRIO EL DORADO CARRERA 14 MANZANA A DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER |
| VALOR INICIAL:                           | CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$193.501.993) MCTE                                                                                                   |
| VALOR DE LA DISMINUCIÓN                  | VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (24.037.536,00) M/CTE                                                                                                          |
| VALOR FINAL:                             | CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$169.464.457). M/CTE                                                                          |
| RUBRO RECURSOS DESCRIPCIÓN               | 2.3.2.01.01.001.03.19.40.006 OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO                                                                                                                     |
| RUBRO ADICION                            | N/A                                                                                                                                                                                                      |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL              | CD0332 (24/01/2026)                                                                                                                                                                                      |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                    | RP 0319 (30/01/2026)                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO INICIAL:                           | Un (01) meses                                                                                                                                                                                            |
| ADICIÓN DE TIEMPO                        | N/A                                                                                                                                                                                                      |
| SUPERVISOR                               | OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA<br>Profesional Universitario área de Vías                                                                                                                                 |
| FECHA DE INICIO:                         | 02 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                                                    |
| MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica) | Si                                                                                                                                                                                                       |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL          | N/A                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)                                     |                                                                                                                                 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello) | N/A                                                                                                                             |
| VALOR POR PAGAR                                                           | CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$169.464.457). M/CTE |
| FECHA DE TERMINACIÓN                                                      | 01 DE MARZO DE 2026                                                                                                             |
| VALOR ADICIÓN ( Si aplica)                                                | N/A                                                                                                                             |
| MUNICIPIO:                                                                | OCAÑA                                                                                                                           |
| OFICINA GESTORA:                                                          | SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA                                                                                  |

## 2. LOCALIZACIÓN

El proyecto está ubicado en la zona urbana del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander,

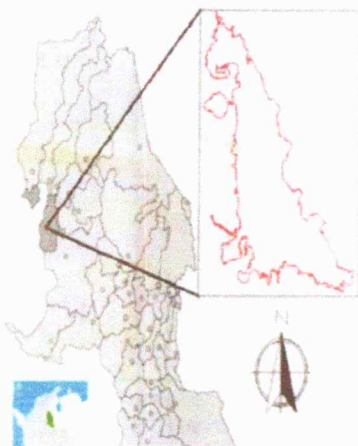


Ilustración 1. Localización del proyecto.



BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA  
9A 22-59



BARRIO EL DORADO, CARRERA 14, MANZANA A

### 3. RESUMEN EJECUTIVO

El municipio de Ocaña suscribió contrato SVIV UM 001 DE 2026, (CO1.PCCNTR.9263176) de fecha 29 de enero de 2026, cuyo objeto es REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA 9 A 22-59 Y EN EL BARRIO EL DORADO CARRERA 14 MANZANA A DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. Con inicio para el contrato el día 02 de febrero de 2026. El presente proyecto tiene como objetivo principal mejorar el sistema de drenaje y evacuación de aguas lluvias en dos sectores específicos de la ciudad, con el fin de reducir inundaciones, prevenir daños en la infraestructura vial y en las viviendas aledañas, y mejorar las condiciones de salubridad y calidad de vida de los habitantes de los barrios 26 de Julio y El Dorado.

En el presente informe de supervisión acompaña la cuenta de cobro del contratista, que ha presentado para facturar las actividades en el periodo comprendido entre el 02 de febrero al 01 de marzo de 2026

Durante la ejecución se suscribió contrato modificadorio No. 1 al contrato SVIV UM 001 DE 2026. (CO1.PCCNTR.9263176) del 29 de enero de 2026,

#### AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Con fecha 01 de marzo de 2026, el avance físico del contrato de obra No. SVIV UM 001 DE 2026. ( CO1.PCCNTR.9263176), es del 87.57%.

A continuación, se presentan las cantidades totales de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el Entre 02 de febrero al 01 de marzo de 2026 a el contratista ejecutó las actividades correspondientes al **REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA 9 A 22-59 Y EN EL BARRIO EL DORADO CARRERA 14 MANZANA A DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER** de acuerdo con la siguiente descripción de cantidades y actividades realizadas:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO     | V. PARCIAL       | CANT.(+) | CANT.(-) | CANT.  | VALOR            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|------------------|
| 1    | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                    |        |          |                 | \$ 30.217.719,00 |          |          |        | \$ 38.202.170,00 |
| 1,01 | Localización y Replanteo                                                                                                    | m2     | 72,00    | \$ 4.980,00     | \$ 358.560,00    | 11,42    |          | 83,42  | \$ 415.425,00    |
| 1,02 | Corte de pavimento                                                                                                          | ml     | 46,00    | \$ 11.915,00    | \$ 548.090,00    | 0,20     |          | 46,20  | \$ 550.473,00    |
| 1,03 | Demolición pavimento rígido e= entre 14 - 25 cm                                                                             | m2     | 72,00    | \$ 26.973,00    | \$ 1.942.056,00  | 10,07    |          | 82,07  | \$ 2.213.640,00  |
| 1,04 | Excavacion mecánica                                                                                                         | m3     | 216,00   | \$ 24.844,00    | \$ 5.366.304,00  | 8,74     |          | 224,74 | \$ 5.583.441,00  |
| 1,05 | Relleno Con Material Seleccionado                                                                                           | m3     | 120,46   | \$ 42.591,00    | \$ 5.130.312,00  |          |          | 0,00   | \$ 0,00          |
| 1,06 | Procedente De La Excavación                                                                                                 |        |          |                 |                  |          |          |        |                  |
| 1,06 | Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado                                                                       | m3     | 112,73   | \$ 110.828,00   | \$ 12.493.381,00 | 79,50    |          | 192,23 | \$ 21.304.577,00 |
| 1,07 | Retiro de sobrantes                                                                                                         | m3     | 119,60   | \$ 24.583,00    | \$ 2.940.127,00  | 161,33   |          | 280,93 | \$ 6.905.979,00  |
| 1,08 | Retiro de tubería existente                                                                                                 | ml     | 24,00    | \$ 11.066,00    | \$ 265.584,00    |          | -19,00   | 5,00   | \$ 55.330,00     |
| 1,09 | Manejo de Aguas para evitar inundación en Zona de Trabajo                                                                   | und    | 1,00     | \$ 1.173.305,00 | \$ 1.173.305,00  |          |          | 1,00   | \$ 1.173.305,00  |
| 2    | REPOSICIÓN RED PLUVIAL                                                                                                      |        |          |                 | \$ 27.718.906,00 |          |          |        | \$ 26.700.043,00 |
| 2,01 | Suministro e instalación de tubería Reforzada de 36"                                                                        | ml     | 20,00    | \$ 593.184,00   | \$ 11.863.680,00 |          | -1,00    | 19,00  | \$ 11.270.496,00 |
| 2,02 | Solado para Tubería                                                                                                         | m2     | 3,00     | \$ 48.980,00    | \$ 146.940,00    | 29,85    |          | 32,85  | \$ 1.608.993,00  |
| 2,03 | Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M | Und    | 2,00     | \$ 5.794.799,00 | \$ 11.589.598,00 |          |          |        |                  |
| 2,04 | Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos)                                                                                       | ml     | 72,00    | \$ 57.204,00    | \$ 4.118.688,00  |          | -33,00   | 39,00  | \$ 11.589.598,00 |
|      |                                                                                                                             |        |          |                 |                  |          |          |        | \$ 2.230.956,00  |

|      |                                                                     |    |        |                 |                  |       |        |       |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------|-------|--------|-------|------------------|
| 3    | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO                                         |    |        |                 | \$ 25.488.847,00 |       |        |       | \$ 14.990.356,00 |
| 3,01 | Suministro E Instalación De Base Granular                           | m3 | 17,02  | \$ 150.689,00   | \$ 2.565.473,00  |       | -3,80  | 13,22 | \$ 1.992.109,00  |
| 3,02 | Concreto MR= 38kg/cm2 para pavimento                                | m3 | 20,44  | \$ 1.037.029,00 | \$ 21.196.873,00 |       | -9,09  | 11,35 | \$ 11.766.831,00 |
| 3,03 | Junta de dilatacion sello de poliuretano                            | ml | 43,20  | \$ 18.709,00    | \$ 808.229,00    | 4,10  |        | 47,30 | \$ 884.936,00    |
| 3,04 | Acero para dovelas, barras de anclajes y canastillas                | kg | 106,01 | \$ 8.662,00     | \$ 918.272,00    |       | -66,01 | 40,00 | \$ 346.480,00    |
|      |                                                                     |    |        |                 |                  |       |        |       |                  |
|      | ITEMS NO PREVISTOS                                                  |    |        |                 | \$ 3.050.196,00  |       |        |       | \$ 3.050.196,00  |
| NP01 | Desvío de aguas de red principal                                    | ML | 21,00  | \$ 75.952,00    | \$ 1.594.992,00  | 21,00 | 0      | 21,00 | \$ 1.594.992,00  |
| NP02 | Bordillos perimetrales 0,15 x 0,60 m en concreto rígido de 3000 PSI | ML | 12,00  | \$ 121.267,00   | \$ 1.455.204,00  | 12,00 | 0      | 12,00 | \$ 1.455.204,00  |

| EL DORADO |                                                           |     |        |  |                 |       |                  |         |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--|-----------------|-------|------------------|---------|------------------|
| 4         | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                  |     |        |  |                 |       | \$ 10.119.643,00 |         | \$ 8.735.623,00  |
| 4.01      | Localización y Replanteo                                  | m2  | 327,88 |  | \$ 4.980,00     |       | \$ 1.632.842,00  | -299,82 | 28,07            |
| 4.02      | Corte de pavimento                                        | ml  | 71,32  |  | \$ 11.915,00    |       | \$ 849.778,00    | -31,72  | 39,60            |
| 4.03      | Demolición pavimento rígido e= entre 14 - 25 cm           | m2  | 79,95  |  | \$ 26.973,00    |       | \$ 2.156.491,00  | -51,89  | 28,07            |
| 4.04      | Excavacion mecánica                                       | m3  | 97,425 |  | \$ 24.844,00    | 6,42  | \$ 2.420.427,00  |         | 103,84           |
| 4.05      | Retiro de sobrantes                                       | m3  | 70     |  | \$ 24.583,00    | 72,06 | \$ 1.720.810,00  |         | 142,06           |
| 4.06      | Retiro de tubería existente                               | ml  | 15     |  | \$ 11.066,00    |       | \$ 165.990,00    | -4,00   | 11,00            |
| 4.07      | Manejo de Aguas para evitar inundación en Zona de Trabajo | und | 1      |  | \$ 1.173.305,00 |       | \$ 1.173.305,00  |         | 1,00             |
| 5         | REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL               |     |        |  |                 |       | \$ 28.724.011,00 |         | \$ 14.695.587,00 |
| 5.01      | Suministro e instalación de tubería Reforzada de 36"      | ml  | 15     |  | \$ 593.184,00   |       | \$ 8.897.760,00  | -6,00   | 9,00             |
| 5.02      | Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado     | m3  | 133,79 |  | \$ 110.828,00   |       | \$ 14.827.678,00 | -49,36  | 84,43            |
| 5.03      | Construcción de pozo de inspección                        | und | 1      |  | \$ 4.998.573,00 |       | \$ 4.998.573,00  |         | 0,00             |
|           |                                                           |     |        |  |                 |       |                  |         | \$ 0,00          |

| 6 REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO          |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 8.251.864,00   |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------|----|---------------|-------|--------|-------------------|-----------------|
| 6.01                                    | Suministro E Instalación De Base Granular                                                                                  | m3  | 15,99      | \$ | 150.689,00      | \$ | 2.409.517,00  |       | -10,38 | 5,61              | \$ 845.817,00   |
| 6.02                                    | Concreto MR 38 para pavimento                                                                                              | m3  | 15,6821239 | \$ | 1.037.029,00    | \$ | 16.262.817,00 |       | -10,60 | 5,08              | \$ 5.271.218,00 |
| 6.03                                    | Junta de dilatacion sello de poliuretano                                                                                   | ml  | 86,6       | \$ | 18.709,00       | \$ | 1.620.199,00  |       | -47,20 | 39,40             | \$ 737.135,00   |
| 6.04                                    | Acero para dovelas, anclajes y canastillas                                                                                 | kg  | 86,6       | \$ | 8.662,00        | \$ | 750.129,00    |       | -41,60 | 45,00             | \$ 389.790,00   |
| 6.05                                    | Dado en concreto reforzado para tapa de pozo de inspección                                                                 | und | 2          | \$ | 503.952,00      | \$ | 1.007.904,00  |       |        | 2,00              | \$ 1.007.904,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS                      |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 11.483.597,50  |                 |
| NP03                                    | Solado para Tubería                                                                                                        | m2  | 18,15      | \$ | 48.980,00       |    | 146.940,00    | 18,15 |        | 18,15             | \$ 888.987,00   |
| NP04                                    | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 8"                                                                       | ML  | 6,00       |    | \$ 115.379,00   |    | 692.274,00    | 6,00  | 0      | 6,00              | \$ 692.274,00   |
| NP05                                    | Suimnistro e instalación de filtro de ancho 0,60m H 090m, incluye geotextil                                                | ml  | 11,05      |    | \$ 178.130,00   |    | 1.968.336,50  | 11,05 | 0      | 11,05             | \$ 1.968.336,50 |
| NP06                                    | Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,40 x 2,5 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M | UND | 1,00       |    | \$ 7.934.000,00 |    | 7.934.000,00  | 1     | 0      | 1,00              | \$ 7.934.000,00 |
| SUBTOTAL                                |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 126.109.437,00 |                 |
| COSTOS DIRECTOS DE OBRA                 |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 126.109.437,00 |                 |
| ADMINISTRACIÓN                          |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 32.788.453,62  |                 |
| IMPREVISTOS                             |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 1.261.094,37   |                 |
| UTILIDAD                                |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 6.305.471,85   |                 |
| OTROS COSTOS                            |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 3.000.000,00   |                 |
| PLAN DE MANEJO DE TRAFICO               |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 3.000.000,00   |                 |
| COSTO INDIRECTOS OBRA                   |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 40.355.019,84  |                 |
| VALOR TOTAL OBRAS CIVILES               |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 126.109.437,00 |                 |
| VALOR TOTAL PROYECTO REDONDEADO AL PESO |                                                                                                                            |     |            |    |                 |    |               |       |        | \$ 169.464.457,00 |                 |

Se realiza la verificación de las actas con las debidas cantidades, están firmadas por el contratista.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

|                                                           |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| VALOR CONTRATO INICIAL                                    | \$ 193.501.993,00 |                  |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL                                  | \$0               |                  |
| ANTICIPO INICIAL                                          |                   | \$0              |
| ANTICIPO ADICIONAL                                        |                   | \$0              |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL |                   | \$169.464.457,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                             |                   | \$0              |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO                               | \$ 24.037.536,00  |                  |
| SUMAS IGUALES                                             | \$169.464.457,00  | \$169.464.457,00 |
| % de ejecución                                            | 100%              |                  |

El valor del ACTA FINAL , que incluye costos directos e indirectos, equivale a **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/TCE (\$169.464.457,00)M/CTE**  
Se realizó la verificación de la cláusula séptima del contrato correspondiente a la forma de pago, y se confirmó que este pago del ACTA FINAL representa el 87.57%.del contrato.

5. SOPORTES FINANCIEROS

| CONCEPTO | NUMERO | FECHA (DDMMAA) | RUBRO PRESUPUESTAL           | VALOR         |
|----------|--------|----------------|------------------------------|---------------|
| CDP      | 0332   | 24/01/2026     | 2.3.2.01.01.001.03.19.40.006 | \$193.501.993 |
| RP       | 0319   | 30/01/2026     | 2.3.2.01.01.001.03.19.40.006 | \$193.501.993 |

6. CONTROL DE PAGOS

| PAGOS REALIZADOS |                          |       |       |
|------------------|--------------------------|-------|-------|
| No.              | No COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA | VALOR |
|                  |                          |       |       |

Con fecha a la prsentación del presente informe no se han realizado pagos al contratista de obra.

7. CONTROL ADMINISTRATIVO.

ACTAS

Durante la ejecución del proyecto se han suscrito las siguientes actas:

| ACTA                                   | FECHA                 |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Orden de inicio SECOP II               | 02 de febrero de 2026 |
| Acta Modificatoria de cantidades No 01 | 25 de febrero de 2026 |

VISITAS TÉCNICA REALIZADAS

El personal de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda realizó visitas técnicas de seguimiento para supervisar la ejecución de las actividades del proyecto. Se anexa acta de visitas de obra, se anexan actas de visita al presente informe.

Que el contratista, constituyó las pólizas de garantía única de seguro el 02 de marzo de 2026 a favor de la entidad seguros mundial así: póliza de cumplimiento No. B-100074913 y de responsabilidad civil No. B-100020848, con los siguientes amparos.

PÓLIZAS INICIALES

| AMPAROS                                                                                                  | VALOR PRIMAS | DESDE<br>(DD-MM-AAAA) | HASTA<br>(DD-MM-AAAA) | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| CUMPLIMIENTO                                                                                             | 10%          | 30/01/2026            | 01/07/2026            | \$19.350.199,30 |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                                                    | 10%          | 30/01/2026            | 01/03/2029            | \$19.350.199,30 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                                                                   | 10%          | 01/03/2026            | 01/03/2031            | \$19.350.199,30 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL                                                                  |              |                       |                       |                 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS, VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |              | 30/01/2026            | 01/03/2026            | \$350.181.000   |

Estas pólizas fueron ampliadas con la orden de inicio, y a la terminación del contrato así: póliza de cumplimiento No. B-100074913 y de responsabilidad civil No. B-100020848, con los siguientes amparos.

| AMPAROS                | VALOR PRIMAS | DESDE        | HASTA        | VALOR ASEGURADO |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                        |              | (DD-MM-AAAA) | (DD-MM-AAAA) |                 |
| CUMPLIMIENTO           | 10%          | 27/02/2026   | 04/07/2026   | \$16.946.445,70 |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 10%          | 27/02/2026   | 04/03/2029   | \$16.946.445,70 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 10%          | 01/03/2026   | 01/03/2031   | \$16.946.445,70 |

| AMPAROS                                                                                                  | VALOR PRIMAS | DESDE        | HASTA        | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                          |              | (DD-MM-AAAA) | (DD-MM-AAAA) |                 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                   |              |              |              |                 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS, VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |              | 02/02/2026   | 04/03/2026   | \$350.181.000   |

8. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

| Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)                                                                               | Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado Para el periodod comprendido durante el 02 de febrero al 01 de marzo de 2026        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.                                                                       | El contratista cumplió con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.                                           |
| 2) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.        | El contratista desarrolló el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas.                            |
| 3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios y/u obras, de acuerdo a este documento, Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.                 | El contratista garantizó la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. |
| 4) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | El contratista no presentó ninguna reclamación que directa o indirectamente pudiera afectar el objeto del contrato o sus obligaciones.           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5)</b> Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).                                                                                                                                                                | El contratista se abstuvo de adelantar intervenciones a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente.                                              |
| <b>6)</b> Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.                                                                                                                                                                                             | El contratista acreditó el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.                                       |
| <b>7)</b> Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                            | El contratista identificó las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.                                                                      |
| <b>8)</b> Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.                                                                                                                                                                                                                               | El contratista implementó las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.                                                                         |
| <b>9)</b> Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.                                                                                                                                                                                                                | El contratista dio cabal cumplimiento al pacto de transparencia y a las declaraciones de la carta de presentación de la oferta.                                                   |
| <b>10)</b> Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.                                                                                                                            | El contratista no presentó ningún cambio en la composición del capital social, ni en los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ni en su pertenencia a un grupo empresarial. |
| <b>11)</b> Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como es el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. | El contratista no presentó ninguna situación que implicara modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.                       |
| <b>12)</b> Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.                                                                                                                                             | El contratista no presentó ninguna circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pudiera afectar la ejecución del contrato.     |
| <b>13)</b> Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones para evitar que se produzcan en las zonas de sus                                                                                                  | El contratista observó las leyes y reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, tomó todas las precauciones necesarias para evitar accidentes o              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).                                                                                                                                                                                                                                                                | condiciones insalubres, dotó al personal y aseguró el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).                                                                                                                                                         |
| <b>14)</b> Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial; si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. | El contratista no presentó modificaciones en la composición del capital social, ni en la existencia de pactos o acuerdos de accionistas, ni en la pertenencia a un grupo empresarial, ni en información relevante de índole jurídica, comercial o financiera.             |
| <b>15)</b> Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.                                                                                             | El contratista mantuvo las condiciones inicialmente declaradas ante la Entidad Estatal, sin que se presentara ninguna situación que implicara modificación del estado de los riesgos existentes al momento de la presentación de la propuesta o celebración del contrato. |
| <b>16)</b> Asumir el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El contratista cumplió con el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género establecidos por la normatividad legal vigente en Colombia.                                                                                                |
| <b>17)</b> Estar afiliado a los sistemas de Seguridad Social Integral, y de Riesgos Laborales, durante la totalidad de la duración del presente contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan                                                                                                                            | El contratista permaneció afiliado y realizó los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensión) y al Sistema General de Riesgos Laborales durante la totalidad de la ejecución del contrato.                                          |
| <b>18)</b> Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El contratista rindió y elaboró oportunamente los informes solicitados durante el desarrollo del contrato, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas para la adecuada ejecución y seguimiento contractual.                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>19)</b> Asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.</p> <p>En virtud de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, para lo cual deberá aportar al CONTRATANTE, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral (salud y pensión), y de Riesgos Laborales, y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser verificada por éste, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes señaladas durante la vigencia del contrato.</p> | <p>El contratista asumió el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal vinculado para la ejecución del objeto contractual, así como el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y demás obligaciones establecidas por la normatividad colombiana vigente.</p> <p>El contratista dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, aportando la certificación correspondiente expedida por el revisor fiscal o representante legal, según el caso, en la cual se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensión), Sistema General de Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, cuando hubo lugar, durante toda la vigencia del contrato, documentación que fue verificada por la supervisión contractual.</p> |
| <p><b>20)</b> Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor e interventor del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>El contratista acató y dio cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones impartidas por el supervisor y/o interventor del contrato durante el desarrollo y ejecución del mismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>21)</b> Responder por los daños a terceros que se les cause cuando provengan de causas imputables al CONTRATISTA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>El contratista no causó daños a terceros derivados de causas imputables a su gestión durante la ejecución del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>22)</b> Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>El contratista atendió oportunamente las instrucciones y lineamientos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor del contrato.                                       | impartidos por el supervisor del contrato, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.                                                                                               |
| <b>23)</b> Anexar a cada informe de avance de obra, incluyendo el final, los soportes fotográficos de ejecución.                                | El contratista anexó a cada informe de avance de obra, incluyendo el informe final, los respectivos soportes fotográficos que evidencian la ejecución de las actividades desarrolladas.          |
| <b>24)</b> El contratista debe colocar una valla en la cual se plasme las características esenciales del proyecto.                              | El contratista instaló la valla informativa correspondiente, plasmando en ella las características esenciales del proyecto, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.                 |
| <b>25)</b> El contratista debe llevar una bitácora de obra.                                                                                     | El contratista llevó y mantuvo debidamente diligenciada la bitácora de obra durante la ejecución del contrato, conforme a las obligaciones establecidas.                                         |
| <b>26)</b> Las demás que deriven de la naturaleza del contrato, aquellas afines a su objeto, y de la normatividad vigente que le sea aplicable. | El contratista dio cumplimiento a las demás obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato, a las afines a su objeto y a la normatividad vigente aplicable durante la ejecución del mismo. |

**PROGRAMACIÓN DE OBRA**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| FECHA DE INICIO          | 02 de febrero de 2026 |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | Un (01) mes           |
| FECHA DE TERMINACIÓN     | 01 de marzo de 2026   |

**9. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO**

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA** - Profesional Universitario área de Vías, identificado con la cedula de ciudadanía número 1091665414 expedida en Ocaña en mi condición de

supervisor del contrato de Obra No. **SVIV UM 001 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9263176)** CERTIFICO que:

IINCOAS SAS, hizo entrega de REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA 9 A 22-59 Y EN EL BARRIO EL DORADO CARRERA 14 MANZANA A DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER relacionado con la ejecución del objeto contractual durante el período del 02 de febrero al 01 de marzo de 2026

El valor a reconocer y pagar es la suma CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$169.464.457). M/CTE correspondiente al pago de recibo final.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acredita los siguientes pagos:

Del representante Legal

|                                         | R/L                                              | IINCOAS SAS              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Ítems                                   | MES DE FEBRERO DE 2026                           | MES DE FEBRERO DE 2026   |
| Entidad de aporte en línea              | COMPENSAR                                        | COMPENSAR                |
| Empresa de pensiones                    | PORVENIR                                         | PORVENIR COLPENSIONES    |
| Valor                                   | \$ 485.800                                       | \$ 840.600               |
| Empresa administradora de salud         | SANITAS EPS<br>NUEVA EPS<br>NUEVA EPS S.A<br>MOV | SANITAS EPS<br>NUEVA EPS |
| Valor                                   | \$ 121.600                                       | \$ 210.300               |
| Administradora de riesgos profesionales | ARL SURA                                         | ARL SURA                 |
| Valor                                   | \$ 211.400                                       | \$ 365.700               |
| CAJA DE COMPENSACIÓN                    | COMFAORIENTE                                     | COMFAORIENTE             |
| Valor                                   | \$121.600                                        | \$210.300                |
| Valor total de cotización               | \$ 940.400                                       | \$1.626.900              |
| Nº de Planilla                          | 62782654                                         | 58297014                 |
| Periodo Cotización                      | FEBRERO DE 2026                                  | FEBRERO DE 2026          |

Representante legal, trabajadores mano de obra calificada, trabajadores mano de obra no calificada

Pago del FIC por favor de por valor de \$423.661

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotografico.

Fecha de elaboración presente informe, 04 de marzo del 2026.

  
**GUSTAVO CASTILLA VERGEL**

Secretario Vías, Infraestructura Y Vivienda





**IINCOAS S.A.S**

Representante Legal  
Sergio Andrés Arias Anzola  
CONTRATISTA

  
**OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA**

Prof. Universitario área de Vías  
Supervisor

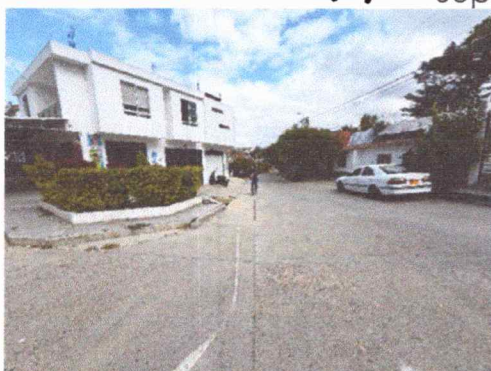

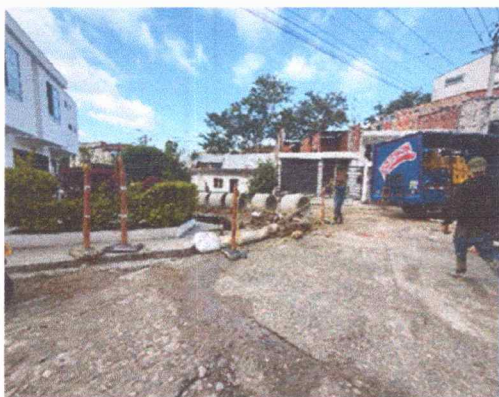

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda – Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander  
Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Código Postal: 546552  
Correo: [secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co](mailto:secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co) - Teléfono: (607) 5636300  
[www.ocana-nortedesantander.gov.co](http://www.ocana-nortedesantander.gov.co)

### ACTA DE VISITA

**FECHA:** 23/02/2026

**LUGAR:** Barro el dorado

**MUNICIPIO/DEPARTAMENTO:** Ocaña/Norte de Santander

**HORA:** 10:00 AM.

**OBJETO:** Visita obra Urgencia Dorado

Vista Seguimiento Supervisión Urgencia manifiesta barro el dorado

**ASISTENTES:** Profesionales de la secretaria de vía,

#### DESARROLLO DE LA VISITA

En el lugar se está realizando un cambio de tubería Pvc con un diámetro de 36", por influencia del nivel freático se socavó el terreno y afectó el pozo, se tuvo que construir un dado de soporte. En la obra se encontraba la ingeniera y dos ayudantes estaban compactando con material de relleno.


Máquinas utilizadas: un cargador y una rana según indicaciones de la ingeniera. Clima favorable, sin lluvia. Hora 10:00 am.

**COMPROMISOS (Si los hay):**

En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

|   | COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|------------|-------------|
| 1 |            |             |
| 2 |            |             |
| 3 |            |             |
| 4 |            |             |
| 5 |            |             |

Para constancia firman:

|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE: <i>Francisco Miguel Padilla</i> | FIRMA:  |
| CARGO: <i>Abogado Secretario de acw</i> |                                                                                            |
| ENTIDAD: <i>Alcaldia de Ocaña</i>       |                                                                                            |
| NOMBRE:                                 | FIRMA:                                                                                     |
| CARGO:                                  |                                                                                            |
| ENTIDAD:                                |                                                                                            |
| NOMBRE:                                 | FIRMA:                                                                                     |
| CARGO:                                  |                                                                                            |
| ENTIDAD:                                |                                                                                            |
| NOMBRE:                                 | FIRMA:                                                                                     |
| CARGO:                                  |                                                                                            |
| ENTIDAD:                                |                                                                                            |
| NOMBRE:                                 | FIRMA:                                                                                     |
| CARGO:                                  |                                                                                            |
| ENTIDAD:                                |                                                                                            |
| NOMBRE:                                 | FIRMA:                                                                                     |
| CARGO:                                  |                                                                                            |
| ENTIDAD:                                |                                                                                            |

### ACTA DE VISITA

**FECHA:** 26 10 2026

**LUGAR:** Barrio el dorado

**MUNICIPIO/DEPARTAMENTO:** Ocaña/Norte de Santander

**HORA:** 10:00 am

**OBJETO:** Visita de instalación tubería barrio el dorado

Visita de seguimiento obra agencia Manifiesta

**ASISTENTES:** Profesionales de la secretaria de vía,

#### DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó una visita a la obra con la intención de verificar el estado en el que se encuentra.

La visita se realizó a las 10:00 am con clima favorable. Sin lluvia, el pavimento ya fue instalado y el lugar está acondicionado para continuar la obra.


En el lugar existen algunos materiales de construcción y un residuo que parece ser de la excavación; al lado están realizando una construcción, no está claro si todo esos materiales son de la obra pública o de la obra privada.

**COMPROMISOS (Si los hay):**

En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

|   | COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|------------|-------------|
| 1 |            |             |
| 2 |            |             |
| 3 |            |             |
| 4 |            |             |
| 5 |            |             |

**Para constancia firman:**

|                                                                                                                              |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE:</b> Francisco Miguel Rueda Molina<br><b>CARGO:</b> Asesor Secretario de Vías<br><b>ENTIDAD:</b> Alcaldía de Ocaña | <b>FIRMA:</b>  |
| <b>NOMBRE:</b><br><b>CARGO:</b><br><b>ENTIDAD:</b>                                                                           | <b>FIRMA:</b>                                                                                     |
| <b>NOMBRE:</b><br><b>CARGO:</b><br><b>ENTIDAD:</b>                                                                           | <b>FIRMA:</b>                                                                                     |
| <b>NOMBRE:</b><br><b>CARGO:</b><br><b>ENTIDAD:</b>                                                                           | <b>FIRMA:</b>                                                                                     |
| <b>NOMBRE:</b><br><b>CARGO:</b><br><b>ENTIDAD:</b>                                                                           | <b>FIRMA:</b>                                                                                     |
| <b>NOMBRE:</b><br><b>CARGO:</b><br><b>ENTIDAD:</b>                                                                           | <b>FIRMA:</b>                                                                                     |
| <b>NOMBRE:</b><br><b>CARGO:</b><br><b>ENTIDAD:</b>                                                                           | <b>FIRMA:</b>                                                                                     |

### ACTA DE VISITA

**FECHA:** 24 / 02 / 2026

**LUGAR:** Barrio 26 de Julio.

**MUNICIPIO/DEPARTAMENTO:** Ocaña/Norte de Santander

**HORA:** 10:00 am

**OBJETO:** Visita obra 26 de Julio

Visita de seguimiento obra vigencia Manizota

**ASISTENTES:** Profesionales de la secretaria de vía,

#### DESARROLLO DE LA VISITA

Visita obra terminada barrio 26 de Julio  
se realizó visita con la intención de obtener un registro  
fotografica que permita observar como fue  
entregada la obra a la comunidad

**COMPROMISOS (Si los hay):**

En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

|   | COMPROMISO | RESPONSABLE |
|---|------------|-------------|
| 1 |            |             |
| 2 |            |             |
| 3 |            |             |
| 4 |            |             |
| 5 |            |             |

**Para constancia firman:**

|                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| NOMBRE: <i>Yenith Lorena Acosta</i><br>CARGO: <i>Apoyo Secretaria de vías</i><br>ENTIDAD: <i>Alcaldia</i> | FIRMA: |
| NOMBRE:<br>CARGO:<br>ENTIDAD:                                                                             | FIRMA: |
| NOMBRE:<br>CARGO:<br>ENTIDAD:                                                                             | FIRMA: |
| NOMBRE:<br>CARGO:<br>ENTIDAD:                                                                             | FIRMA: |
| NOMBRE:<br>CARGO:<br>ENTIDAD:                                                                             | FIRMA: |
| NOMBRE:<br>CARGO:<br>ENTIDAD:                                                                             | FIRMA: |
| NOMBRE:<br>CARGO:<br>ENTIDAD:                                                                             | FIRMA: |
