

Del informe de  MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 7
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 1808-2024, DEPARTAMENTO DE CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE - FASE I		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$20.000.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$20.000.000.000,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$40.000.000.000,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/07/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	01/06/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MARLENY RIVERA GALEANO	04/10/2025	A LA FECHA
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	15/09/2025	03/10/2025
	MARLENY RIVERA GALEANO	21/08/2024	14/09/2025
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	13/08/2024	20/08/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO	08/07/2024	12/08/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	SERGIO O. BERNAL J.	07/10/2025	31/12/2025
	HAVID NUMA MARCHENA	11/02/2025	31/12/2025
	HAVID NUMA MARCHENA	22/08/2024	25/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.98424	08/07/2024	31/12/2024
	No.825	08/01/2025	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	vigencias futuras de 2026 mediante radicado No. 2-2025-062662 del 09 de octubre de 2025 (\$3.000.000.000)		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3002507	20/09/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/09/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACIÓN: se modificó la cláusula sexta-FORMA DE PAGO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04/10/2024	
	PRIMERA PRÓRROGA: con nuevo plazo de ejecución hasta el 24 de diciembre de 2025.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09/05/2025	
	SEGUNDA PRÓRROGA: con nuevo plazo de ejecución hasta el 1 de junio de 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/10/2025	

Del informe de  MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 7
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA EXPEDICIÓN: 22/10/2024	
	FECHA DESDE: 20/09/2024	
	FECHA: 25/08/2026	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 575.575.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 264.983.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN	\$ 38.393.442.000	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 766.000.000	
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN	N/A	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A). Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio.	NO APLICA	28/03/2025	\$ 7.000.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	A). Acto administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados.	NO APLICA	25/08/2025	\$ 7.000.000.000
TERCER DESEMBOLSO	contra entrega de la certificación del supervisor del convenio designado por el departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.	40%	26/12/2025	\$ 3.000.000.000
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la documentación requerida para efectos de la liquidación del convenio.	100%	DD/MM/AAAA	\$ 3.000.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$17.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **PREVISORA SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
3002507	Cumplimiento	\$8.000.000.000	20/09/2024	25/08/2026

Del informe de  MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 7
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños e implementación

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CAS-OAJ-LP-009-2024	Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del Departamento de Casanare		\$ 37.390.300.786
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO LLANO SEGURO 2024		R.L. RUBEN DARIO GÓMES VALLEJO C.C.79.723.597
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/05/2025		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	04/04/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 37.390.300.786
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA		
PÓLIZA No.	No. 85194		
FECHA DE LA PÓLIZA	30/12/2024		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños e implementación

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CAS-OAJ-CMA-002-2025	Interventoria técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la "implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del casanare - fase i.		\$ 1.029.823.343,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. NIT. 900.115.339-0		DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ C.C.74.859.089
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/05/2025		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	05/05/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 1.029.823.343,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	57-44-101006998		
FECHA DE LA PÓLIZA	2025/04/11		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL DEPARTAMENTO: DICIEMBRE DE 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$8.056.698.075	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

De la reunión quedaron los siguientes compromisos:

3. Compromisos

Responsable	Actividad	Fecha límite
Contratista Implementador	Subsanación de los informes de septiembre y octubre de 2025 a interventoría	22 de enero de 2026
Contratista Implementador	Entrega de acta de entrega parcial solicitada por almacén de la Gobernación a interventoría	22 de enero de 2026
Interventoría	Entregar aval a la Gobernación para el pago parcial	27 de enero de 2026
Gobernación del Casanare	Entregar al Ministerio del Radicado de solicitud de pago	30 de enero de 2026
Contratista Implementador	Informe correspondiente a los inconvenientes con las cámaras	27 de enero de 2026
Contratista Implementador	Plan de choque	27 de enero de 2026

Del informe de interventoría se extrae la siguiente información:

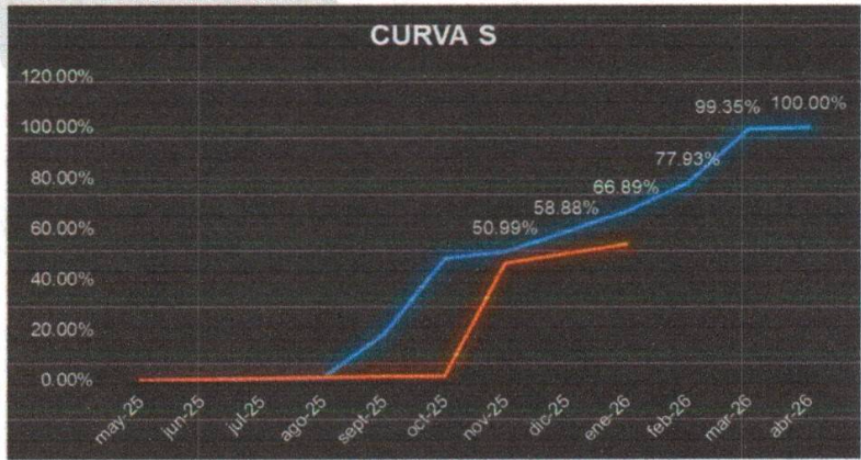


Ilustración 2 Curva S Contrato 3007 2024

En cuanto al avance del cronograma, se registra un progreso programado del 66,89 %, mientras que el avance ejecutado corresponde al 54 %, evidenciándose una desviación negativa del 12,89% frente a lo planificado.

Este retraso se asocia principalmente al bajo rendimiento presentado en actividades críticas tales como: hincado de postes, instalación de gabinetes, instalación de equipos de transmisión y recepción de microondas, ejecución de estructuras en concreto, construcción de muros y acabados, pisos y enchapes, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obras preliminares, construcciones especiales, carpintería y cubierta, las cuales han presentado avances inferiores a los previstos en el cronograma aprobado.

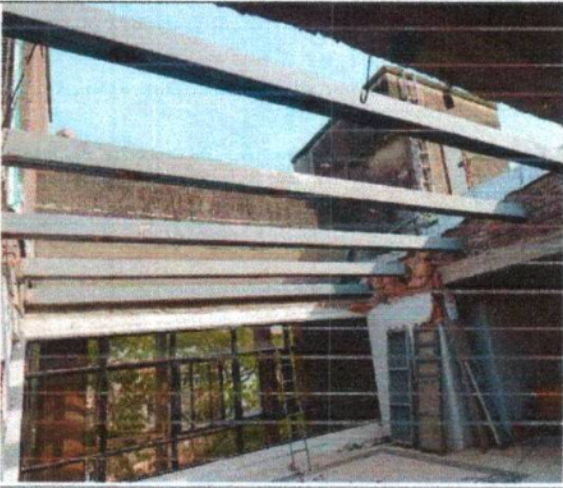
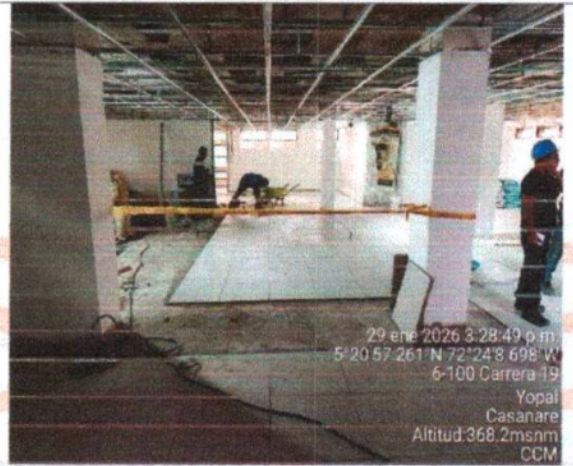
Adicionalmente, la desviación también obedece a la falta de disponibilidad en sitio de equipos fundamentales para el inicio de actividades programadas. Según el cronograma contractual, la instalación de cámaras iniciaba el 9 de enero de 2026; sin embargo, a la fecha no se evidencian en campo las cámaras, ni el switch tipo 1, cuya instalación también estaba prevista para esa misma fecha. De igual manera, no se encuentran en sitio las UPS para cámaras, brazos soporte para cámaras, sistemas de puesta a tierra (SPT), ni altavoces IP, elementos indispensables para el desarrollo de las actividades programadas.

En consecuencia, se evidencia que no se cuenta en campo con los equipos necesarios para dar inicio a estas actividades, situación que incide directamente en el incumplimiento del cronograma y resulta atribuible al consorcio, al no garantizar la logística, suministro y disponibilidad oportuna de los materiales y equipos requeridos para la ejecución conforme a la programación aprobada.

- Para el presente informe de supervisión queda pendiente que la Gobernación del Casanare, subsane el informe enviado, de acuerdo a las observaciones realizadas por el Ministerio del Interior:
 - Informe de supervisión mes de enero de 2026
 - Informe financiero mes de enero de 2026
 - Informe de interventoría de enero de 2026

Del informe de  MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	6 de 7
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Registro fotográfico

	
Actividades CCM	Actividades CCM
 29 ene 2026 3:38:47 p.m. 5°20'57.31" N 72°24'9.015" W 6-100 Carrera 19 Yopal Casanare Altitud: 368.2msnm CCM	 29 ene 2026 3:28:49 p.m. 5°20'57.261" N 72°24'8.698" W 6-100 Carrera 19 Yopal Casanare Altitud: 368.2msnm CCM
Actividades CCM	Actividades CCM
 29 ene 2026 4:44:42 p.m. 5°20'57.228" N 72°24'9.620" W 6-100 Carrera 19 Yopal Casanare Altitud: 368.2msnm CCM	 29 ene 2026 4:44:42 p.m. 5°20'57.228" N 72°24'9.620" W 6-100 Carrera 19 Yopal Casanare Altitud: 368.2msnm CCM
Actividades CCM	Actividades CCM

Del informe de  MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	7 de 7
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	
Postes tipo 1 e instalación	Postes tipo 1 e instalación
	
Postes tipo 1 e instalación	Postes tipo 1 e instalación

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

4 y 5 de junio de 2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisora Convenio No. 1808 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	Elaboro: SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ Apoyo a la supervisión SIES Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON
--	---

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7.	PÁGINA	1 de 4
		ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

ACTA	REUNION DE SEGUIMIENTO
FECHA	20-01-2026
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1808-2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	50%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento

ANTECEDENTES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO CONVENIO: 20/09/2024
FECHA TERMINACION DEL CONVENIO DE ACUERDO A LA SEGUNDA PRORROGA: 01/06/2026
VALOR DEL CONVENIO \$40.000.000.000

DESARROLLO DE LA REUNION

Asistentes:

- **Marleny Rivera** – Representante Ministerio del Interior – Supervisora convenio 1808 de 2024.
- **Julio Ramos** - Representante Gobernación del Casanare -Supervisor convenio 1808 de 2024
- **Mauricio Montoya** – Representante Gobernación del Casanare – Apoyo a la supervisión Gobernación.
- **Diego Rojas** – Representante Interventoría – Representante Legal
- **Diego Mora** - Representante Interventoría – Profesional de apoyo
- **Oswaldo Plata** - Representante Implementador – Project Manager
- **John Velasco** - Representante Implementador – Ingeniero de Apoyo
- **Camila Ramírez** - Representante Implementador – Abogada
- **Felipe Bolaños** - Representante Implementador – Operaciones
- **Juan Torres** - Representante Implementador – Gerente de Proyectos

1. Objetivo de la reunión

Dar seguimiento al estado de la ejecución al convenio 1808 de 2024 y legalización de recursos aportados por el Ministerio del Interior.

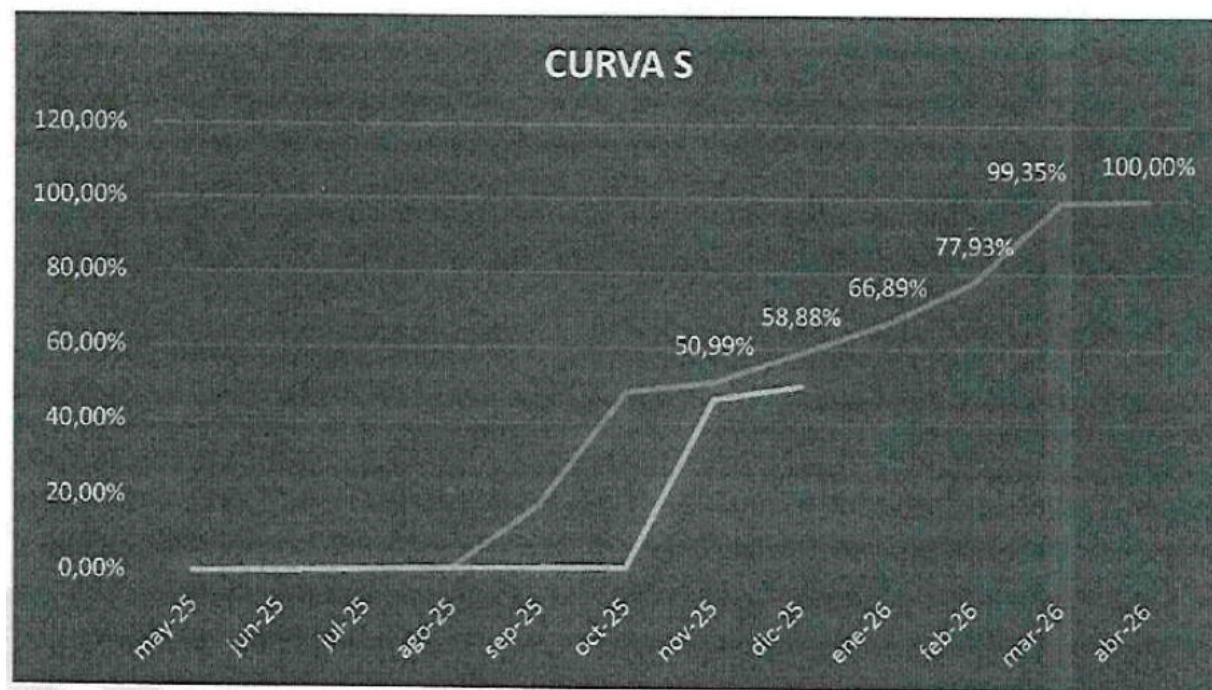
1. Avance del proyecto.
2. Entrada al almacén
3. Puesta de las cámaras en territorio
4. Legalización de recursos

2. Temas tratados

2.1. Estado del convenio

- Avance del 50,02%, retraso del 8,88%

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023



El Ministerio solicita a la Gobernación informar cuál es el plan de choque definido para ponerse al día con el cronograma del proyecto. Frente a ello, la Gobernación manifiesta que se encuentra a la espera de la subsanación del plan de choque presentado por el contratista de implementación, el cual fue remitido a la interventoría para su revisión, la interventoría manifiesta que el plan de choque no debe ser sólo la actualización de las fechas del cronograma, el contratista de implementación manifiesta que no es sólo se modificó las fechas de ejecución, sino que también se ampliaran las cuadrillas para poder ponerse al día con todas las actividades. Adicionalmente el contratista de implementación tuvo que devolver en dos ocasiones las cámaras por defectos de fábrica, la supervisión del Ministerio solicita que se le remita un informe de lo sucedido.

El retraso del proyecto se asocia principalmente a las actividades de hincado de postes, instalación de gabinetes, instalación de equipos de transmisión y recepción de microondas, construcción de estructuras de concreto, muros y acabados, pisos y enchapes, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, obras preliminares, construcciones especiales, carpintería y cubierta. Dichas actividades han presentado rendimientos inferiores a los previstos en el cronograma aprobado, presentado por el contratista de implementación y validado por la interventoría.

Respecto a la cubierta del edificio, esta no ha iniciado debido a que la estructura aún no se ha ejecutado. De acuerdo con el cronograma, a la fecha se debía contar en sitio con aproximadamente el 90 % de los materiales; no obstante, únicamente se dispone de cerca del 11 % de los equipos. La interventoría advierte que durante la primera semana de febrero el retraso se incrementará, dado que el tiempo restante no es suficiente para finalizar las actividades. Así mismo, señala que el denominado plan de choque presentado por el contratista de implementación corresponde únicamente a una actualización de fechas de inicio, sin contemplar acciones efectivas que permitan recuperar el atraso frente al cronograma aprobado.

Se está solicitando adelantar el ingreso al almacén de las cámaras y de los equipos activos, teniendo en cuenta los procedimientos internos de la Gobernación. No obstante, desde la Secretaría de Hacienda se informa que, para poder efectuar el pago solicitado por el contratista de implementación, se requiere el ingreso previo de los

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7.	PÁGINA	3 de 4
		ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

equipos al almacén; razón por la cual no ha sido posible realizar dicho pago. Cabe precisar que tanto el contratista de implementación y de interventoría, como la supervisión de la Gobernación de Casanare, tienen claridad sobre el procedimiento para realizar el respectivo ingreso. El certificado de almacén es un requisito indispensable para la autorización del pago.

El Ministerio manifiesta que ya se han girado diecisiete mil millones de pesos (\$17.000.000.000). Sin embargo, al 31 de diciembre únicamente se ha girado el recurso correspondiente al anticipo a la fiducia.

En relación con los pisos, al levantar el mortero se evidenció la afectación de algunas tuberías existentes.

En cuanto al suministro de equipos, no se han trasladado, teniendo en cuenta la problemática de orden público actual y un tema de pólizas, sin embargo, se informa que el 28 de enero llegará al sitio el primer lote de equipos ya importados, actualmente se encuentra pendiente la planta eléctrica, la cual será transportada por separado. Las estaciones de trabajo se encuentran en zona franca y no han sido liberadas por falta de pago. En Bogotá se encuentran algunos equipos almacenados listos para ser enviados, sobre los cuales se está realizando el inventario conforme a los requerimientos de la Gobernación. Los equipos estarán en bodega en Yopal el 28 de enero. Para aquellos equipos que aún no se encuentren disponibles, el contratista de implementación entregará los soportes de compra y el estado en el que se encuentra el proceso de importación.

El Ministerio del Interior realizará una comisión de verificación el 4 de febrero de 2026.

El Ministerio del Interior aclara que el ingreso al almacén solo debe efectuarse una vez el proyecto sea recibido a satisfacción, y sugiere a la Gobernación que dicho procedimiento se realice únicamente cuando se cuente con el acta de recibo a satisfacción. Así mismo, precisa que el sistema de CCTV no se recibe de manera parcial, sino como una solución integral.

Respecto al primer corte, se aprobó un avance del 46 %. No obstante, se encuentran pendientes de subsanar los informes correspondientes a los meses de septiembre y octubre, de acuerdo con las observaciones formuladas por la interventoría. En este sentido, la interventoría no ha otorgado el aval para el pago por parte de la Gobernación, debido a que aún no se cuenta con el recibo a satisfacción de la totalidad de los informes documentales.

El contratista de implementación manifiesta haber entregado todos los productos y entregables exigidos contractualmente; sin embargo, señala que también ha presentado documentación adicional solicitada por la interventoría para efectos del pago, la cual no corresponde a una obligación contractual. Frente a esto, la interventoría aclara que la solicitud de los desprendibles de pago del personal fue realizada por la Gobernación.

Finalmente, el Ministerio solicita a la Gobernación informar la fecha en la cual se realizará el pago correspondiente al avance de ejecución, teniendo en cuenta que, según certificación de la interventoría, el contratista derivado de implementación ha cumplido con sus obligaciones contractuales.

3. Compromisos

Responsable	Actividad	Fecha límite
Contratista Implementador	Subsanación de los informes de septiembre y octubre de 2025 a interventoría	22 de enero de 2026
Contratista Implementador	Entrega de acta de entrega parcial solicitada por almacén de la Gobernación a interventoría	22 de enero de 2026
Interventoría	Entregar aval a la Gobernación para el pago parcial	27 de enero de 2026

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	4 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023








Responsable	Actividad	Fecha límite
Gobernación Casanare	del Entregar al Ministerio del Radicado de solicitud de pago	30 de enero de 2026
Contratista Implementador	Informe correspondiente a los inconvenientes con las cámaras	27 de enero de 2026
Contratista Implementador	Plan de choque	27 de enero de 2026

FIRMA DE ASISTENTES: se adjunta la lista de asistentes

 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: <u>Reunión de Seguimiento Grupo 1808 de 2024</u>				
Responsable u organizador: <u>Ministerio del Interior</u>		Dependencia:		
Ciudad: <u>Bogotá</u>	Lugar y/o enlace: <u>Edificio Banco</u>	☒ Presencial ☐ Virtual	Fecha	
			Día	Mes
			20	01
			Año	26
Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál? _____			Hora inicial 10:00 Hora final 12:30	

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE):** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VÍCTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACCIONES AL DIH?			ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
							SI	NO	PN					
1	JULIO RAMOS	74795537	43				X			GOBIERNO	Secretaría de Gobierno	gobierno@csunap.gov.co	3157909270	
2	Miguel Montoya	794880225C					X			GOBIERNO	Asesor Técnico	gobiernor@espolte.gov.co	31588822	
3	Reina Patricia Díaz P	1118591597	27	H			X			SECOB SAS	Prof de Arte	Proyectos E Sede en co	3142750959	
4	Diego Rojas Gómez	74857089	49	H	-	-	X			SECOB SAS	RL	diego.rojas@SECOB.COM.CO	3108861356	
5	Osvaldo Plata M	12265162	46	H			X			Contrato Llan, Ej	PM	osvaldo.plata@tsg.net.co	3118772662	
6	John F Velasco Díaz	7187235	40				X			CLS 2024	Enf Apoyo	Jvelasco@tsg.net.co	3115156591	
7	Carmela Ramirez Espinosa	10834482	38	M			X			CLS 2024	Asesora	Carmela.ramirez@TSG.ROSCO	3192211594	
8	W. Felipe Bolaños A.	1084254271	35	H			X			CLS 2024	Operaciones	wbolanos@tsg.net.co	3115488348	
9	Juan Mario Torres Nova	1019004203	39	H			X			CLS 2024	Asesor	juan.torres@violac.com.co	3223391301	
10	Marleny Rivera G.	63430009	-	-			X			SECOB SAS	Prof de Arte	marleny.rivera@interior.gov.co	63430009	
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.
