

INFORME DE OBRA No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025

OBJETO:

“RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS



INTERVENTOR: CONINARQ SAS



CONSTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ARROYO CAROLINA



 <p>CONSORCIO ARROYO CAROLINA</p>	<p align="center">INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</p> <p>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</p>	 <p><small>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE</small> CVS</p>
---	---	---

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVOS	3
3. ALCANCE DEL INFORME	4
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	5
5. GARANTÍAS VIGENTES DEL CONTRATO	6
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	7
7. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	13
8. RECURSOS UTILIZADOS	14
9. CONDICIONES CLIMÁTICAS	14
10. ASPECTOS SOCIALES	15
11. CONCLUSIONES	17



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

	<p align="center">INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</p> <p>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</p>	
---	---	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad presentar el avance físico, técnico y financiero correspondiente al período comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2025, dentro de la ejecución del Contrato de Obra No. 047-2025.

Durante esta quincena se consolidaron los avances en la excavación del cauce, conformación de diques, retiro lateral de material, y se dio inicio formal a la fase de revegetalización, con el establecimiento de árboles nativos y la ampliación del aislamiento del bosque de galería.

Todas las actividades fueron ejecutadas en concordancia con las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y el cronograma de ejecución, bajo la supervisión de la interventoría CONINARQ S.A.S. y el acompañamiento técnico de la CVS.



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

	<p align="center">INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</p> <p>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</p>	
---	---	---

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Presentar el informe técnico correspondiente al avance físico, financiero y social del proyecto durante el período 16–31 de octubre de 2025.

Objetivos específicos

- Describir las actividades ejecutadas en campo durante la quincena.
- Cuantificar los volúmenes de obra ejecutados y el avance físico acumulado.
- Registrar las condiciones ambientales, climáticas y sociales que influyeron en el desarrollo de los trabajos.
- Servir como instrumento de seguimiento técnico y administrativo para la interventoría y la entidad contratante.



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

	<p align="center">INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</p> <p>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</p>	
---	---	---

3. ALCANCE DEL INFORME

El presente documento comprende las actividades realizadas entre el **16 y el 31 de octubre de 2025**, que corresponden a la **tercera etapa de ejecución contractual**, incluyendo:

- Excavación y optimización de la sección hidráulica del cauce.
- Conformación de diques y dentellones laterales.
- Retiro y disposición controlada de material producto de excavaciones.
- Aislamiento y siembra de árboles nativos en el componente de revegetalización.
- Control topográfico continuo y verificación de cotas y alineamientos.



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

	INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3	
	CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."	

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS
NIT:	891.000.627-0
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA
NIT:	901.979.765-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
NÚMERO DE CONTRATO:	047-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES
MODIFICACIÓN No. 1:	REDUCCIÓN DE PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla 1. Información del contrato

<div><div>CONSORCIO</div><div></div><div>ARROYO CAROLINA</div></div>	<div>INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</div>	<div></div>
	<div>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</div>	

5. GARANTÍAS VIGENTES DEL CONTRATO

De acuerdo con las obligaciones del contratista, estipuladas en el contrato de obra, el contratista debe mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras

COMPAÑÍA	NACIONAL DE SEGUROS		
Nº DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO	11-44-101263402 - ANEXO 2	
RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento general del contrato	\$ 1.622.219.002,80	15/09/2025	16/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	\$811.109.501,40	15/09/2025	15/01/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$3.244.438.005,60	15/09/2025	16/07/2026
Estabilidad de la obra	\$1.622.219.002,80	15/09/2025	16/01/2031

Tabla 2. Póliza de Cumplimiento

COMPAÑÍA	NACIONAL DE SEGUROS		
Nº DE PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11-40-101082273 - ANEXO 2	
RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios Laborales y Operaciones	\$520.000.000,00	15/09/2025	15/01/2026

Tabla 3. Póliza responsabilidad civil extracontractual



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

	INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3	
	CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."	

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la segunda quincena de octubre se alcanzó un avance físico del 16,09 %, consolidando los frentes de excavación, conformación de diques y revegetalización.

Las labores se desarrollaron de acuerdo con el cronograma aprobado, bajo condiciones climáticas favorables y con acompañamiento permanente de la interventoría.

6.1. Control topográfico y replanteo

Se realizó la actualización de puntos de control, verificación de cotas de fondo y coronas, levantamientos de secciones ejecutadas y ajuste de alineamientos.

Estos controles garantizaron la precisión geométrica del cauce y la continuidad de los flujos hidráulicos.

6.2. Optimización de la sección hidráulica del cauce

Volumen ejecutado en el período: 22 021 m³ Acumulado: 58 722 m³

Se ejecutaron trabajos de excavación en material común y rectificación de taludes con retroexcavadoras de oruga, alcanzando una sección hidráulica estable y homogénea.

Los taludes fueron perfilados con pendiente promedio 1V:2H, y se implementaron canales de desvío temporal para mantener la circulación del agua.

El material excavado fue clasificado para su posterior uso en rellenos o disposición final controlada.

6.3. Conformación de diques y dentellones con material de préstamo

Volumen ejecutado en el período: 16 569 m³ Acumulado: 35 208 m³

Los diques se construyeron con material arcilloso impermeable, extendido en capas de 30 cm y compactado con vibrocompactador.

Se verificaron cotas, densidades y alineamientos en cada tramo, asegurando estabilidad y continuidad estructural.

Las obras permiten el confinamiento del flujo del arroyo y la protección de las zonas agrícolas vecinas.

6.4. Retiro y disposición lateral de material

Volumen ejecutado en el período: 8 434 m³ Acumulado: 22 490 m³

El material excedente fue transportado con volquetas sencillas a los sitios de disposición definidos por la interventoría, a distancias mayores de 1 000 m del eje del cauce.

6.5. Aislamiento del arreglo forestal

Superficie ejecutada en el período: 5,85 ha Acumulado: 9,64 ha

Se amplió el aislamiento mediante instalación de estacones de madera tratada cada 2,5 m y tres hilos de alambre de púas calibre 12, protegiendo las áreas destinadas a revegetalización y evitando el ingreso de ganado.



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

CONSORCIO  ARROYO CAROLINA	INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3 CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."	 CVS
---	---	---

6.6. Establecimiento de árboles nativos

Cantidad ejecutada en el período: 3 261 unidades Acumulado: 3 261 unidades

Se inició la siembra de especies nativas (ceiba, caracolí, campano, matarratón, mangle bobo, entre otras).

La siembra se realizó con hoyos de 30×30×30 cm, aplicación de materia orgánica y riego inicial, instalando tutores y protecciones.

Esta actividad constituye el inicio del componente de restauración ecológica del proyecto.

A continuación se anexa registro fotográfico de actividades ejecutadas:

 <p>8°26'27.252"N 75°36'41.97"W Arroyo Carolina</p>		 <p>8°26'27.198"N 75°36'42.594"W Planeta Rica Arroyo Carolina</p>	
Fotografía No.	01	Fotografía No.	02
Fecha:	2/10/2025	Fecha:	3/10/2025
Actividad:	Control topográfico	Actividad:	Control topográfico
Observaciones:			



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

<div>CONSORCIO</div> <div></div> <div>ARROYO CAROLINA</div>	<div>INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</div>	<div></div>
	<div>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</div>	



Fotografía No.	03
Fecha:	9/10/2025
Actividad:	Excavación de material común

Fotografía No.	04
Fecha:	9/10/2025
Lugar:	Excavación de material común

Observaciones:



Fotografía No.	05
Fecha:	14/10/2025
Actividad:	Excavación de material común

Fotografía No.	06
Fecha:	14/10/2025
Actividad:	Excavación de material común

Observaciones:



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

<div><div>CONSORCIO</div><div></div><div>ARROYO CAROLINA</div></div>	<div>INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</div>	<div><div>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE</div><div></div></div>
	<div>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</div>	



Fotografía No.	07	Fotografía No.	08
Fecha:	7/10/2025	Fecha:	8/10/2025
Actividad:	Excavación de material común.	Lugar:	Conformación de diques y rectificación de taludes.

Observaciones:



Fotografía No.	09	Fotografía No.	10
Fecha:	14/10/2025	Fecha:	14/10/2025
Actividad:	Conformación de diques.	Actividad:	Conformación de diques.

Observaciones:



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

<div><div>CONSORCIO</div><div></div><div>ARROYO CAROLINA</div></div>	<div>INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</div>	<div><div>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE</div><div>CVS</div></div>
	<div>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”</div>	



Fotografía No.	11	Fotografía No.	12
Fecha:	6/10/2025	Fecha:	7/10/2025
Actividad:	Rectificación de taludes.	Lugar:	Rectificación de taludes.

Observaciones:



Fotografía No.	13	Fotografía No.	14
Fecha:	4/10/2025	Fecha:	4/10/2025
Actividad:	Excavación de material común.	Actividad:	Excavación de material común.

Observaciones:



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

<div><div>CONSORCIO</div><div></div><div>ARROYO CAROLINA</div></div>	<div>INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</div>	<div><div>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE</div><div></div></div>
	<div>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</div>	

			
Fotografía No.	15	Fotografía No.	16
Fecha:	8/10/2025	Fecha:	8/10/2025
Actividad:	Excavación de material común.	Lugar:	Excavación de material común.
Observaciones:			
			
Fotografía No.	17	Fotografía No.	18
Fecha:	4/10/2025	Fecha:	4/10/2025
Actividad:	Retiro de material.	Actividad:	Retiro de material
Observaciones:			



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

<div><div>CONSORCIO</div><div></div><div>ARROYO CAROLINA</div></div>	<div>INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</div>	<div></div>
	<div>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”</div>	

7. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

PRESUPUESTO							Período 3 - Octubre 31			
ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	% ejecutado	Cant. ejecutada	Costo directo	Costo total
1	REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES								\$ -	\$ -
1.1	Localización, trazado y replanteo	ml	8220	\$ 3,189.00	\$ 26,213,580.00	\$ 34,326,684.00	0%	0.00	\$ -	\$ -
2	REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA								\$ 911,048,561.00	\$ 1,193,018,090.63
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	146804.43	\$ 17,225.00	\$ 2,528,706,306.75	\$ 3,311,340,909.00	15%	22021.00	\$ 379,311,725.00	\$ 496,708,703.89
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación (específicamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	103553.56	\$ 30,582.00	\$ 3,166,874,971.92	\$ 4,147,022,775.74	16%	16569.00	\$ 506,713,158.00	\$ 663,540,880.40
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	56226.13	\$ 2,967.00	\$ 166,822,927.71	\$ 218,454,623.84	15%	8434.00	\$ 25,023,678.00	\$ 32,768,506.34
3	RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA								\$ 85,581,412.59	\$ 112,068,859.79
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	und	12544	\$ 5,800.00	\$ 72,755,200.00	\$ 95,272,934.40	26%	3265.00	\$ 18,937,000.00	\$ 24,798,001.50
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.8	\$ 11,470,639.00	\$ 181,236,096.20	\$ 237,328,667.97	37%	5.81	\$ 66,644,412.59	\$ 87,270,858.29
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	Ha	15.8	\$ 1,801,486.00	\$ 28,463,478.80	\$ 37,272,925.49	0%	0.00	\$ -	\$ -
4	REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION								\$ -	\$ -
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos sólidos	Taller	10	\$ 2,106,127.00	\$ 21,061,270.00	\$ 25,062,911.30	0%	0.00	\$ -	\$ -
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Taller	2	\$ 2,106,127.00	\$ 4,212,254.00	\$ 5,012,582.26	0%	0.00	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL						\$ 8,111,095,014.00			\$ 1,305,086,950.42	
VALOR ACUMULADO									\$ 3,025,255,094.36	
PORCENTAJE EJECUTADO									16.09%	
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO									37.30%	

- **Porcentaje de avance físico en el período:** 16,09%
- **Porcentaje de avance físico global:** 37,30%
- **Valor total del contrato:** \$8,111,095,014.00 COP
- **Valor ejecutado en el período:** \$1,305,086,950.42 COP
- **Valor ejecutado acumulado:** \$3,025,255,094.36 COP



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

	<p align="center">INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</p> <p>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</p>	
---	---	---

8. RECURSOS UTILIZADOS

Durante el periodo reportado se contó con el siguiente personal y maquinaria:

- **Personal técnico y operativo:**
 - Director de obra
 - Profesional SST
 - Especialista en hidráulica
 - Ingeniero residente de obra
 - Profesional social
 - Inspectores de obra
 - Inspectores en SST
 - Topógrafo
 - Operadores de maquinaria
 - Auxiliares de obra y ayudantes

- **Maquinaria empleada:**
 - Retroexcavadoras de orugas (12)
 - Motoniveladoras (6)
 - Bulldozer (4)
 - Volquetas sencillas (4)
 - Vibrocompactadores (6)
 - Retrocargador (1)
 - Estación total y GPS para trazado y control topográfico

9. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante el período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2025, las condiciones climáticas en la zona de Planeta Rica se mantuvieron variables, predominando días parcialmente nublados con lluvias ligeras e intermitentes, sin afectaciones significativas sobre el cronograma de obra.

Las temperaturas oscilaron entre 26 y 33 °C, con humedad relativa alta, características propias del régimen climático de transición hacia la temporada invernal.



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

	<p align="center">INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</p> <p>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."</p>	
---	---	---

10. ASPECTOS SOCIALES

Durante la segunda quincena del mes de octubre de 2025, se desarrollaron de manera efectiva las actividades del Componente Social en el marco del Contrato de Obra No. 047-2025, con el objetivo de fortalecer la relación entre el proyecto y las comunidades del área de influencia, garantizar la continuidad de los permisos de acceso a predios y consolidar los mecanismos de participación ciudadana.

10.1. Visitas a propietarios de predios aledaños

Entre el 16 y el 30 de octubre de 2025 se realizaron visitas de concertación y socialización a propietarios de predios colindantes con el cauce del Arroyo Carolina, con el propósito de formalizar los permisos de paso y garantizar la comprensión del alcance de las actividades constructivas.

Durante las reuniones se explicaron las acciones contempladas en el proyecto —dragado, conformación de terraplenes, construcción de desarenador y revegetalización—, escuchando las particularidades de cada predio, su uso actual y las condiciones de acceso para maquinaria y personal.

En esta jornada se visitaron los siguientes propietarios:

1. Wilmer Osorio Flórez – Estación Petromil
2. Luis Fernando Correa – Comercializadora La Blanquita
3. Juan David Lora – Agro Por Banda S.A.S.
4. María Helena Palacio – Predio Parlamento
5. Rodrigo Salgado Benítez – Predio La Mercedes

Durante las visitas se mantuvo un ambiente de diálogo y cooperación, y los propietarios manifestaron su disposición a facilitar las actividades, siempre que se respeten las condiciones de ingreso y restitución de los elementos existentes en sus predios (alambrados, cercas o accesos).

10.2. Acompañamiento y gestión de la veeduría ciudadana

Se brindó acompañamiento al proceso de reconocimiento e inscripción de la veeduría ciudadana del proyecto “Recuperación de la Conectividad Hidrológica con Énfasis Ecosistémico del Arroyo Carolina” ante la Personería Municipal de Planeta Rica, Córdoba.



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

CONSORCIO  ARROYO CAROLINA	INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3	 CVS
	CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."	

La profesional social gestionó la elaboración de la carta de solicitud, el documento de constitución y el reglamento interno de la veeduría, realizando seguimiento al trámite hasta su formal aprobación.

Como resultado, se obtuvo la Resolución N° 028 del 01 de octubre de 2025, mediante la cual la Personería reconoció oficialmente la Veeduría Ciudadana "Arroyo Carolina", integrada por representantes de las comunidades locales.

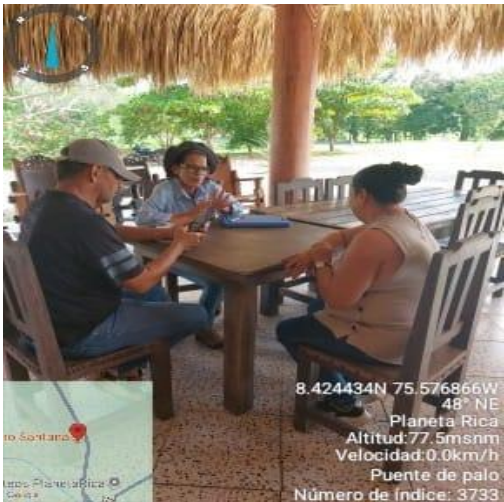
Este mecanismo fortalece la transparencia y la participación comunitaria, permitiendo que los ciudadanos realicen seguimiento a las etapas del proyecto y se mantengan informados sobre los avances de la obra.

10.3. Dificultades presentadas

No se presentaron dificultades relevantes durante la ejecución de las actividades del componente social en el período.

Las acciones programadas se desarrollaron de forma efectiva, con buena disposición por parte de los propietarios y apoyo de las autoridades locales.

A continuación se anexa registro fotográfico de las visitas:

 <p>8.424434N 75.576866W 48° NE Planeta Rica Altitud: 77.5msnm Velocidad: 0.0km/h Puente de palo Número de índice: 3733</p>		 <p>8.418295N 75.576232W 197° S Planeta Rica Altitud: 84.9msnm Velocidad: 0.0km/h Wilmer Osorio Número de índice: 3743</p>	
Fotografía No.	19	Fotografía No.	20
Fecha:	21/10/2025	Fecha:	21/10/2025
Lugar:	Planeta Rica	Lugar:	Planeta Rica
Observaciones: Solicitud de permisos para acceso a predios de privados.			



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com

<div><div>CONSORCIO</div><div></div><div>ARROYO CAROLINA</div></div>	<div>INFORME QUINCENAL DE OBRA No. 3</div>	<div><div>CVS</div></div>
	<div>CONTRATO DE OBRA No. 047 DE 2025: “RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”</div>	

	
Fotografía No. 21	Fotografía No. 22
Fecha: 21/10/2025	Fecha: 21/10/2025
Lugar: Planeta Rica	Lugar: Planeta Rica
Observaciones: Solicitud de permisos para acceso a predios de privados.	

11. CONCLUSIONES

Durante la segunda quincena de octubre de 2025, el proyecto alcanzó un avance físico del 16,09 %, logrando un acumulado total del 37,30 %.

Se consolidaron las actividades de excavación, conformación de diques, retiro lateral de material y aislamiento forestal, además de iniciarse con éxito la fase de revegetalización mediante la siembra de especies nativas, todo esto gracias al cumplimiento del compromiso establecido en el comité #2, donde se mencionaba el aumento del parque de maquinaria y frentes de obra para cumplir con los plazos propuestos

Las condiciones climáticas fueron favorables, lo que permitió mantener la continuidad operativa.

El componente social se desarrolló de manera armónica, con respaldo comunitario y sin incidencias.

El proyecto avanza conforme a los objetivos planteados, contribuyendo a la recuperación hidráulica y ecológica del arroyo Carolina y al fortalecimiento de la conectividad ambiental en su zona de influencia.



Cra 6 #65-24 Of. 506



314-571-3218



consorcioarroyocarolia@gmail.com
