



Ingeniería S. A. S
NIT 900-833-643-5

INFORME DEL CONTRATISTA

OP 001 DEL 2025

**CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA
HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA
EL LUCERO BAJO, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA.**

DDM INGENIERIA S.A.S

1000

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

1950

CONSTITUTION OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTICLE I
SECTION 1
The University of Michigan shall be a body corporate, to be known as the University of Michigan, and shall have perpetual succession in its corporate name. It shall have the right to acquire, hold, and dispose of real and personal property, and to sue and be sued in its corporate name.

OFFICE OF THE CHANCELLOR



Ingeniería S.A.S
NR 900-833-643-5

INFORME N°2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° OP-001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA
HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL
CAUCA.**

**LA UNIÓN VALLE, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE
2025**

1977-1978

Page 2

Complete the following table for the year 1977-1978.

OBJECT: To determine the effect of the treatment on the growth of the plants.

HYPOTHESIS: The treatment will increase the growth of the plants.

METHOD: The plants were treated with the substance and the growth was measured.

RESULTS: The plants treated with the substance showed a significant increase in growth compared to the control group.

CONCLUSION: The treatment has a positive effect on the growth of the plants.

1977-1978



Ingeniería S. A. S
NR 900-833-643-5

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
OBJETO	4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.....	5
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS	5
PRELIMINARES	5
EXCAVACIONES Y RELLENOS	6
BOX CULVERT Y CONCRETOS.....	6
ACTA DE EJECUCIÓN	7
CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	8
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA	8
INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO.....	9
CONTROL DE GARANTÍAS.....	9
CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.....	9
REGISTRO FOTOGRAFICO	12
ACTAS DE OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES.....	17

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011



Ingeniería S.A.S
Nº 900-833-643-5

INTRODUCCIÓN

El informe N°1 describe las actividades realizadas al 24 de noviembre del 2025 del contrato cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA"**. Obras desarrolladas dentro del contrato de OBRA PÚBLICA N° OP-001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025.

Para lo cual se realizó un recorrido final de la obra en compañía del Arq. Argemiro Eduardo Tamayo Salazar, quien actúa como supervisor del contrato por parte del municipio de La Unión Valle, el Ingeniero Juan Sebastián Varela Millán como director de obra y Diego María Delgado Millán como representante legal de la empresa DDM INGENIERÍA S.A.S. con el fin de verificar las actividades desarrolladas desde el 11 de noviembre hasta el 24 de noviembre del 2025.

PARTICIPANTES

ENTIDAD	NIT	CARGO	NOMBRE
DDM INGENIERÍA S.A.S	900.833.643-5	CONTRATISTA	Diego María Delgado Millán
DDM INGENIERÍA S.A.S	900.833.643-5	DIRECTOR DE OBRA	Juan Sebastián Varela Millán
MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA	891.901.109-3	SUPERVISOR	Argemiro Eduardo Tamayo Salazar

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la carrera 15 con calle 7, vía de acceso a la vereda El Lucero Bajo zona rural del municipio de La Unión Valle.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
TO THE
LEGISLATIVE COUNCIL
ON THE
LANDS OF THE
GOVERNMENT

IN
RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE
LEGISLATIVE COUNCIL
PASSED ON THE
11TH MARCH 1904

BY
THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE
HONG KONG
1904

PRINTED BY
THE
GOVERNMENT
PRINTING OFFICE
HONG KONG

1904



Ingeniería S. A. S
NIT 900-833-643-5

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
Nit:	891-901-109-3
Nº de Contrato:	OP-001-2025.
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA".
Contratista de Obra:	DDM INGENIERIA S.A.S.
NIT o C.C. Nº:	Nit No. 900.833.643-5
Representante Legal:	DIEGO MARIA DELGADO MILLAN
Identificación C.C.:	6.356.066 DE LA UNION, VALLE
Valor Contrato de Obra:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$154.904.145).
Plazo de Ejecución:	PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DESDE LA SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.
Fecha de Inicio:	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025.
Fecha de Terminación:	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025.
Supervisor:	ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

PRELIMINARES

Dentro de las actividades a desarrollar durante la ejecución de este contrato de obra se encontraban:

- Localización y replanteo
- Paso peatonal provisional
- Cerramiento en tela fibrotejida
- Barricada y desvío vehicular
- Instalación de señalización informativa de obra
- Demoliciones de estructuras existentes



Ingeniería S.A.S
NR 900-833-643-5

- Corte y retiro de material vegetal
- Desmonte de cerramiento perimetral de predio colindante a la obra
- Retiro de tubería existente

Estas actividades se ejecutaron con personal y equipos idóneos, garantizando el desarrollo normal de la obra sin generar contratiempos ni afectaciones. Durante el proceso se evidenció que algunas de las estructuras a demoler presentaban dimensiones superiores a las previstas, debido a la existencia de dos alcantarillas cubiertas por una losa de concreto de mayor espesor y resistencia a la indicada en los documentos iniciales. Lo anterior requirió mayor tiempo de ejecución y uso de recursos para completar las demoliciones, situación que quedó registrada en el acta de mayores y menores cantidades.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Este ítem comprende:

- Excavaciones
- Relleno y compactación de suelo
- Cargue, retiro y disposición de material de demolición y excavación

Este capítulo incluye las actividades necesarias para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura, al permitir conformar y compactar el terreno de manera adecuada para soportar la obra de arte hidráulica proyectada. Donde se realizó una excavación de mayor tamaño a la proyectada con el fin de mitigar el riesgo de movimiento de tierra de las bancas hacia los portales de la obra hidráulica en periodos de alta precipitación.

BOX CULVERT Y CONCRETOS

Las siguientes actividades hacen parte de este ítem:

- Concreto ciclópeo 3000 PSI
- Solado de limpieza
- Aceros de refuerzo para box culvert
- Concreto para box culvert
- Loza maciza

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Las siguientes actividades hacen parte de este ítem:

- MURO LAD.SOGA LIMPIO
- COLUMNA AMARRE MURO

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000

100-1000





Ingeniería S. A. S
NIT 900-833-043-5

- MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"
- POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"
- PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=38
- CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS
- PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES"
- PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO
- LIMPIEZA GENERAL

Durante la ejecución se realizaron las labores necesarias para la construcción del box culvert, incluyendo la colocación del solado de limpieza, el armado de los aceros de refuerzo y el vaciado de concreto ciclópeo y estructural, conforme a las especificaciones del proyecto.

En el desarrollo de la obra se presentó una modificación respecto a las cantidades iniciales, dado que fue necesario reducir la longitud del box culvert frente a la planteada en los documentos iniciales. Así mismo, se amplió el tamaño de las aletas con el propósito de brindar mayor estabilidad a las bancas del terreno y mejorar el comportamiento hidráulico y estructural de la obra. Estas novedades quedaron registradas en el acta de mayores y menores cantidades correspondiente. Y en los planos récord entregados

ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN

PARTIDAS DE PAGO - CONDICIONES REALES						MODIFICACIONES			ACTA PARCIAL N° 1		ACTA FINAL		ACUMULADA					
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT.	VI. UNITARIO	VI. PARCIAL	N° / 4	CANT.	VI. PARCIAL	CANT.	VI. PARCIAL	CANT.	VI. PARCIAL	CANT.	VI. PARCIAL				
I PRELIMINARES																		
1.1	BOQUEALJE	MES	2.60	\$	443.267	-	0.00	\$	-	2.60	\$	1.198.168	-	3.50	\$	1.108.168		
1.2	LOCALIZACION/REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	58.00	\$	9.729	-	0.00	\$	-	39.47	\$	276.995	29.53	59.00	\$	964.263		
1.3	PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A-BECON	LIND	2.00	\$	207.244	-	-2.00	\$	(514.488)	0.00	\$	-	-	0.00	\$	-		
1.4	CORRIMIENTO SUELO PBI, TIPO HPS 12M-30M	ML	50.00	\$	30.273	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	-	0.00	\$	-		
1.5	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	2.60	\$	86.560	-	-2.60	\$	(60.900)	1.513.600	\$	50.900	-	1.513.600	\$	-		
1.6	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	2.60	\$	101.200	-	-2.60	\$	(221.374)	0.00	\$	-	-	0.00	\$	-		
1.7	SEÑALIZACION Y DESVIO TIPO SRA-102	DIA	75.00	\$	16.050	-	0.00	\$	-	75.00	\$	1.203.750	75.00	-	0.00	\$	-	
1.8	SEÑAL TIPO SRA-101 (DIA EN CONSTRUCCION)	DIA	75.00	\$	7.431	-	0.00	\$	-	75.00	\$	572.325	75.00	-	0.00	\$	-	
1.9	SEÑAL TIPO SRA-30 (OBROS EN LA VIA)	DIA	75.00	\$	4.631	-	0.00	\$	-	75.00	\$	347.325	75.00	-	0.00	\$	-	
1.10	DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	9.28	\$	31.224	-	18.00	\$	879.610	27.28	\$	869.415	0.00	-	27.28	\$	900.615	
1.11	DEMOLICION MALLA C. S+HIDROM	M2	6.60	\$	72.778	-	0.00	\$	-	6.60	\$	498.680	0.00	-	6.60	\$	561.358	
1.12	DEMOLICION MURO LADO DERRAMA	M2	8.00	\$	9.037	-	0.00	\$	-	8.00	\$	72.312	0.00	-	8.00	\$	80.324	
1.13	DEMOLICION VIGA CONCRETO HPS-38CM	ML	6.00	\$	12.917	-	0.00	\$	-	6.00	\$	77.212	0.00	-	6.00	\$	80.124	
1.14	DEMOLICION MALLA ESLABONADA HPS-8 MT	ML	6.00	\$	8.364	-	0.00	\$	-	6.00	\$	50.912	0.00	-	6.00	\$	58.912	
1.15	DEMOLICION COLUMNA CONCRETO	M3	6.60	\$	212.179	-	-6.60	\$	(137.307)	0.00	\$	-	-	0.00	-	0.00	\$	-
1.16	CORTE ARBOL, MUJES REBORDOS, BANCOS H+H	LIND	1.80	\$	189.581	-	0.00	\$	-	1.80	\$	1.273.068	0.00	-	1.80	\$	1.462.649	
1.17	DEMOLICION ALAMBRE PUAS CORRIMIENTO 3.5 LINEAS	ML	7.00	\$	3.437	-	0.00	\$	-	7.00	\$	24.009	0.00	-	7.00	\$	27.446	
1.18	ESTRUCTURA ENTERRANDO MADERA-SACOS BUNKER	M2	20.00	\$	488.819	-	0.00	\$	-	20.00	\$	9.338.340	0.00	-	20.00	\$	20.676.680	
1.19	CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO HPS-2M	ML	16.00	\$	66.140	-	0.00	\$	-	16.00	\$	1.058.240	0.00	-	16.00	\$	1.124.380	
1.20	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"	ML	12.00	\$	34.704	-	0.00	\$	-	12.00	\$	416.448	0.00	-	12.00	\$	451.148	
SUBTOTAL CAPITULO I					\$	16.954.611	\$	(536.586)	\$	16.738.554	\$	287.367	\$	16.461.951				
II EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
2.1	EXCAVACION EN CONSOLIDADO MANUAL	M3	100.20	\$	42.494	-	30.94	\$	1.298.560	109.27	\$	6.761.649	31.47	1.336.927	159.94	\$	8.097.676	
2.2	CONFORME COMPACT SUBVALLANTE CBR=10	M2	42.27	\$	3.072	-	41.28	\$	128.059	83.55	\$	181.433	44.44	1.561.520	179.03	\$	2.171.985	
2.3	RELLENDO ROCAMADERA COMPACT TRAMA	M3	56.93	\$	81.527	-	-3.81	\$	(210.618)	29.33	\$	2.407.482	32.58	1.941.685	62.13	\$	4.269.161	
2.4	CARGUE MA TERIAL A MAGUANA	M3	56.93	\$	5.966	-	11.83	\$	67.029	36.39	\$	217.518	29.37	166.410	67.79	\$	383.928	
2.5	CARGUE DE SUELO EN SITIO MANUAL	M3	86.17	\$	12.003	-	206.08	\$	2.493.181	292.11	\$	3.026.076	40.94	481.403	293.05	\$	3.517.473	
2.6	RETIRO ACARREO MA TERIAL VOLQUE TA KILOM	M3K	86.17	\$	-2.360	-	206.08	\$	488.737	292.11	\$	394.880	40.94	293.05	293.05	\$	691.598	
2.7	RELLENDO MA TERIAL SITIO COMPACTADO 80% PM	M3	37.40	\$	29.090	-	45.42	\$	1.320.600	0.00	\$	-	-	2.408.607	293.05	\$	2.707.215	
SUBTOTAL CAPITULO II					\$	64.194.739	\$	6.475.714	\$	13.198.147	\$	8.427.328	\$	16.686.475				



Ingeniería S.A.S
Nr 900-833-643-5

III BOIS ENLACE Y CONCRETOS																					
3.1	CONCRETO CILINDRO 300 PSI RELAC 40CMPSI	M3	16.68	\$	601.634	\$	9.191.247	-	1.221	\$	672.262	14.24	\$	7.846.734	3.66	\$	2.016.794	17.90	\$	8.863.502	
3.2	ISOLADO ESPESOR 1/4" 67M 2000PSI 14MPA	M2	32.36	\$	37.833	\$	1.204.276	-	-3.881	\$	(116.526)	28.471	\$	1.077.104	0.611	\$	39.250	-	-	1.107.750	
3.3	VIGA CEMENTO ENLACE H20-40CM 3100PSI	M3	5.38	\$	1.922.349	\$	4.188.920	-	-5.351	\$	(6.109.909)	0.026	\$	-	0.001	\$	-	-	-	-	
3.4	CONCRETO CARBON ACCELERADO A 7 DIAS 3100PSI-22.0MPA	M3	16.24	\$	1.121.116	\$	30.651.558	+	5.241	\$	9.333.396	12.381	\$	14.681.886	13.521	\$	15.270.966	26.481	\$	23.961.952	
3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 6000PSI 420MPSI	KLS	2.476.63	\$	8.465	\$	20.864.410	+	30.881	\$	261.339	1.189.901	\$	10.072.594	1.317.581	\$	11.183.315	2.007.451	\$	21.235.919	
3.6	LOSA MACIZA CEMENTO H-11 CM	M2	5.06	\$	136.432	\$	1.234.618	-	-0.061	\$	(1.234.618)	0.001	\$	-	0.001	\$	-	-	-	-	
3.7	VIGA CEMENTO ENLACE H20-40CM 4000PSI	M3	0.75	\$	1.261.690	\$	945.238	+	0.441	\$	560.269	0.001	\$	-	0.001	\$	-	-	-	-	
3.8	CONCRETO CARBON ACCELERADO A 7 DIAS 3100PSI-22.0MPA	M3	1.98	\$	1.121.116	\$	2.238.410	-	-1.361	\$	(2.239.619)	0.001	\$	-	0.001	\$	-	-	-	-	
3.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 6000PSI 420MPSI	KLS	567.00	\$	8.465	\$	4.780.385	-	-480.631	\$	(3.889.144)	0.001	\$	-	40.381	\$	341.817	40.381	\$	341.817	
					SUBTOTAL CAPITULO		\$	68.934.849			\$	(2.817.496)			\$	33.479.239			\$	38.338.334	
IV OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
4.1	MURO LAD SODA LIMPIO	M2	8.00	\$	61.967	\$	495.726	-	-4.751	\$	(294.343)	0.001	\$	-	3.291	\$	201.283	3.291	\$	201.283	
4.2	COLUMNA AMARRE MURO	M2	2.00	\$	71.931	\$	143.862	-	-1.101	\$	(71.124)	0.001	\$	-	0.901	\$	64.738	0.901	\$	64.738	
4.3	MALLA EMBALAJADA GALV 1/2 ROMBO 2"	M2	16.00	\$	48.464	\$	775.436	-	-10.411	\$	(807.416)	0.001	\$	-	5.531	\$	268.006	5.531	\$	268.006	
4.4	POSTE TUBO GALV 2" 22.3MM 2"	M2	10.00	\$	46.712	\$	467.120	-	-0.001	\$	-	0.001	\$	-	10.001	\$	467.120	10.001	\$	467.120	
4.5	PAV CONCRETO FRIEGEOLADO MIN-58	M3	5.20	\$	841.731	\$	4.377.812	+	3.648	\$	3.097.877	0.001	\$	-	0.001	\$	-	-	-	-	
4.6	CHERRAMIENTO ALAMBRE PUNTA 5 H-10	M2	6.00	\$	25.902	\$	207.216	-	5.151	\$	133.205	0.001	\$	-	13.151	\$	248.611	13.151	\$	248.611	
4.7	ANDEN CONCRETO 10CM 2000 PSI	M2	3.97	\$	90.527	\$	357.439	-	-3.371	\$	(1.956.137)	0.001	\$	-	3.601	\$	1.624.817	3.601	\$	1.624.817	
4.8	PASAMANOS TUBO GALV 2" SUBARRO 18"	M2	5.34	\$	491.338	\$	2.620.940	-	-3.341	\$	(79.639)	0.001	\$	-	3.001	\$	81.409	3.001	\$	81.409	
4.9	PASAMANOS METALICO TUBULAR REDONDO	M2	5.94	\$	27.153	\$	161.269	-	-3.341	\$	(79.639)	0.001	\$	-	3.001	\$	81.409	3.001	\$	81.409	
4.10	CAJA DESARROLLADOR DE 6.000.00 M	UNO	1.00	\$	1.144.894	\$	1.144.894	-	-1.801	\$	(1.144.894)	0.001	\$	-	0.001	\$	-	-	-	-	
4.11	CANAL CONCRETO PISO 50x50x08 CM DOBLE	M2	12.60	\$	161.235	\$	2.031.475	-	-12.081	\$	(2.031.475)	0.001	\$	-	0.001	\$	-	-	-	-	
4.12	LIMPIEZA GENERAL	M2	58.00	\$	2.491	\$	144.358	+	48.441	\$	111.011	0.001	\$	-	102.441	\$	256.895	102.441	\$	256.895	
					SUBTOTAL CAPITULO		\$	12.814.988			\$	(2.117.480)			\$	19.788.638			\$	19.788.638	
					SUBTOTAL OBRAS		\$	112.990.187			\$	288			\$	47.992.474			\$	113.996.394	
					TOTAL COSTO DIRECTO		\$	113.988.187			\$	288			\$	48.997.811			\$	113.996.394	
					VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		\$	113.988.187			\$	288			\$	48.997.811			\$	113.996.394	
					ADMINISTRACION 30.00%		\$	34.179.531			\$	86			\$	14.379.742			\$	34.179.118	
					UTILIDADES 6.00%		\$	6.824.966			\$	17			\$	3.958.875			\$	6.824.024	
					VALOR TOTAL A.U.		\$	47.004.838			\$	101			\$	23.758.231			\$	47.004.142	
					VALOR TOTAL		\$	154.994.145			\$	391			\$	89.757.172			\$	154.994.538	
BALANCE DEL CONTRATO										BALANCE DEL ANTICIPO											
					VALOR CONTRATO		\$		154.994.145	(VALOR ANTICIPO 40%)		\$		-					\$	(61.861.658)	
					VALOR ADICION		\$		-	VALOR ADICION		\$		-					\$	-	
					VALOR ACTAS ANTERIORES		\$		89.757.172	VALOR AMORTIZACION ACTA ANTERIOR		\$		-					\$	24.784.663	
					VALOR PRESENTE ACTA		\$		68.147.364	VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA		\$		-					\$	37.176.960	
					SALDO		\$		154.994.145	SALDO		\$		-					\$	81.901.859	
					TOTAL PRESENTE ACTA		\$		68.147.364											\$	68.147.364
					(-) MENOS 40% AMORTIZACION ANTICIPO		\$		37.176.960											\$	37.176.960
					VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$		27.970.369											\$	27.970.369

CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Se presenta cuadro relacionando la planilla correspondiente al mes de noviembre del 2025:

EMPRESA	MES	No. Planilla
DDM INGENIERIA S.A.S	NOVIEMBRE 2025	35317239

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA:

Como contratista se ha venido realizando las siguientes actividades encaminadas a garantizar la calidad de las obras ejecutadas:

1. Adecuadas condiciones de almacenamiento y preservación de materiales.
2. Solicitud de los correspondientes certificados de calidad de los materiales adquiridos.
3. Control y verificación sobre los materiales y los procesos constructivos y ejecución de las actividades de obra realizadas durante este periodo.



Ingeniería S.A.S
Nº 900-833-643-5

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Se presenta Acta N°2 Final de ejecución de obra para "CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA HIDRAULICA TIPO BOX CULVERT Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL LUCERO BAJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA". Por valor de \$65.147.364, al cual se realiza amortización del anticipo (60%) que corresponde al valor de \$37.176.995, en ese orden de ideas el valor a pagar en la presente acta es de \$27.970.369 que corresponde a un avance financiero del 100% respecto al costo total del proyecto.

CONTROL DE GARANTÍAS

Pólizas iniciales del contrato de obra OP-001-2025

Registro Presupuestal:	N° 2710 del 10/10/2025.
Póliza Contrato de Obra:	N° 45-44-101170183 – 45-40-101103560 Aseguradora Seguros del Estado S.A
Aprobación de póliza Contrato de Obra por el Municipio:	Resolución N° 0747 14 de octubre del 2025.

CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

NO.	CARGO	NOMBRE
1	Representante Legal	Diego María Delgado Millán
2	Director de Obra	Juan Sebastián Varela Millán
3	Residente de Obra	Nelly Maritza Montoya Ramírez

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se hace entrega física del registro fotográfico de las actividades realizadas en este periodo de ejecución de la obra, para la construcción del Bol Culvert, en el Municipio de La Unión, Valle.

ACTA DE OBRA FINAL Y MEMORIA DE CANTIDADES

A la fecha de este informe se presenta Acta No. 2 FINAL, con sus respectivas memorias de cálculo de cada una de las actividades ejecutadas durante este periodo. Las memorias de cálculo también se entregan anexas.

15

WEDNESDAY, MAY 12, 1964

Left at 8:00 AM for the
Museum of Modern Art
to see the exhibition
of the work of the
American Abstract Artists
Group. The exhibition
was held in the
Museum's new
gallery.

Returned at 5:00 PM.

Spent the afternoon
in the Museum's
library, reading
the book "The
American Abstract
Artist" by
Clement Greenberg.

Wrote a few notes
on the book.

Left at 7:00 PM.

Spent the evening
at home, reading
the book "The
American Abstract
Artist" by
Clement Greenberg.

Wrote a few notes
on the book.

Left at 10:00 PM.
Returned at 11:00 PM.
Spent the night
at home, reading
the book "The
American Abstract
Artist" by
Clement Greenberg.

Wrote a few notes
on the book.



Ingeniería S.A.S
Nr 900-833-643-5

Diego Delgado Millán,

DIEGO MARIA DELGADO MILLAN
C.C 6.356.066 de La Unión, Valle
Representante Legal
DDM INGENIERIA S.A.S
Nit. 900.833.643-5



Ingenieria S.A.S
NIT 900-833-643-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

RECEIVED
OCT 14 1964

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO OP-001-2025



VACIADO DE CONCRETO ACELERADO EN ALETAS





VACIADO DE CONCRETO ACELERADO EN ALETAS



**CONFORMACIÓN PARA DESCOLE
(CICLIPEO)**

**VACIADO CONCRETO CICLOPEO
DESCOLE BOX CULVERT**

THE HISTORY OF THE COUNTY OF MIDDLESEX

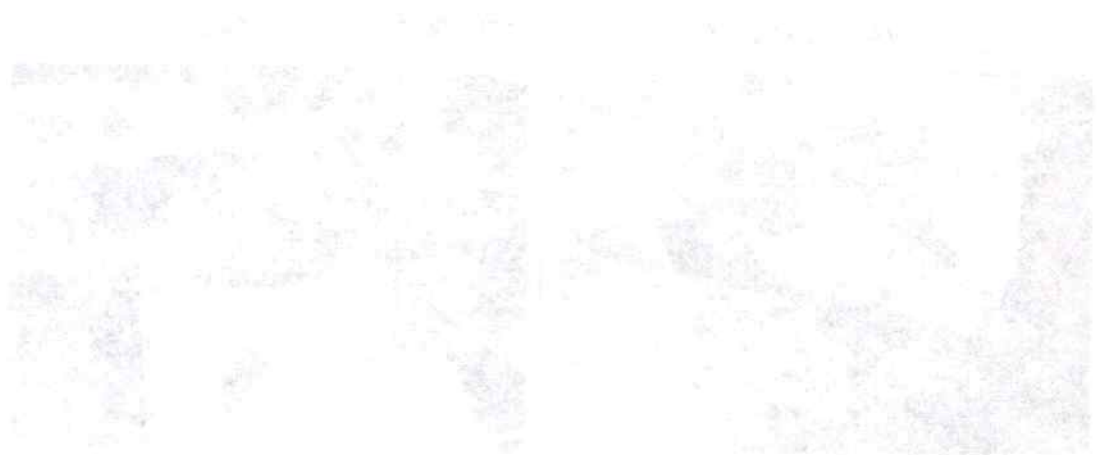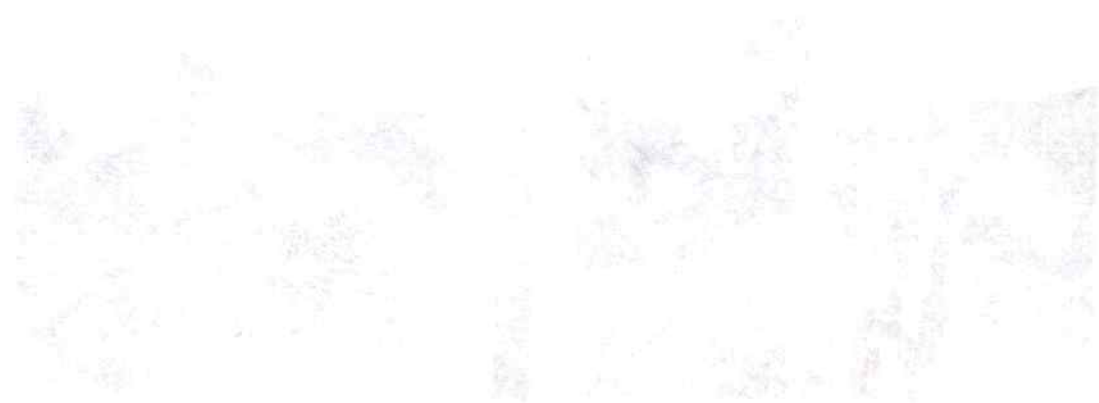



Ingeniería S.A.S
Nº 900-833-643-5



VACIADO CONCRETO CICLOPEO DESCOLE BOX CULVERT



**LLENO MATERIAL DE SITIO Y
AFIRMADO ROCA MUERTA**

**EXCAVACIONES PARA PAVIMENTO
VIA**



INSTALACIÓN ACERO LOSA SUPERIOR BOX CULVERT

Figure 1
Figure 2





VACIADO CONCRETO LOSA SUPERIOR BOX CULVERT



CONCRETO CICLOPEO DESCOLE BOX CULVERT




NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE



NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE



VACIADO CONCRETO HIDRAULICO

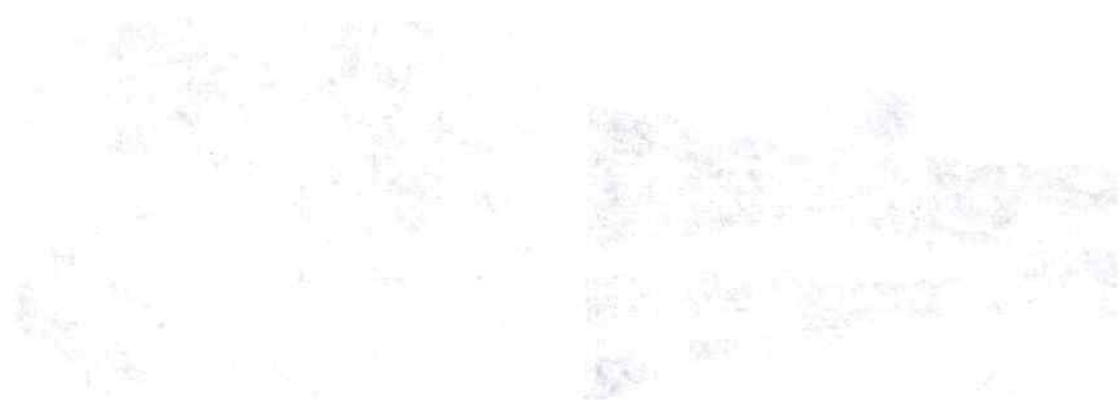



**VACIADO VIGA PARA MURO
CERRAMIENTO**



**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE
SUB RASANTE**



COLOCACIÓN DE ACEROS PARA FUNDICION DE BORDILLO EN CONCRETO



MURO EN LADRILLO E INSTALACIÓN DE MALLA PARA CERRAMIENTO



100

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.



Ingeniería S.A.S
NR 900-833-643-5



MATERIAL DE LLENO Y ROCA MUERTA PARA VIA PROVISIONAL

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes how different types of information are gathered and how they are processed to identify trends and patterns.

3. The third part of the document focuses on the results of the analysis. It presents the findings of the study and discusses their implications for the future. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for further research.

Page 1 of 1

Page 2 of 2



Ingeniería S.A.S
Nº 900-833-643-5

ACTA DE OBRA

No. 2 FINAL -

MEMORIA DE

CANTIDADES

ACCTA DE GATA

NO. 2 FINE

MEMORIA DE

CANT. C. T. NAO

CONTRATO DE OBRA			OP. 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025			Valor inicial			\$			154.904.145			ACTA FINAL		
Indicador No.			N/A			Valor total			\$			154.904.145					
Indicador No.						Fecha iniciación			15 DE OCTUBRE DE 2025								
Objeto:			CONSTRUCCION DE BOX CULVERT, DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA			HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025						VALOR \$ 154.904.536					
Contratista:			DOM INGENIERIA S.A.S.			Fecha de Terminación Final:											
Supervisor de obra:			ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO SALAZAR			Fecha Acta:			24 DE NOVIEMBRE 2025			Porcentaje:			100%		
PARTIDAS DE PAGO - CONDICIONES INICIALES			MODIFICACIONES			ACTA PARCIAL N° 1			ACTA FINAL			ACUMULADA			V. PARCIAL		
ITEMS	UN	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	(+/-)	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
DESCRIPCION																	
I PRELIMINARES																	
1.1	MES	2,50	\$ 443.267	\$ 1.108.168	-	0,00	\$ -	2,50	\$ 1.108.168	-	\$ -	2,50	\$ 1.108.168	-	\$ -	2,50	\$ 1.108.168
1.2	M2	58,00	\$ 9.729	\$ 564.282	-	0,00	\$ -	28,47	\$ 276.985	-	\$ -	28,47	\$ 276.985	-	\$ -	28,47	\$ 276.985
1.3	UNO	2,00	\$ 257.244	\$ 514.488	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.4	ML	50,00	\$ 30.272	\$ 1.513.600	-	0,00	\$ -	50,00	\$ 1.513.600	-	\$ -	50,00	\$ 1.513.600	-	\$ -	50,00	\$ 1.513.600
1.5	MES	2,50	\$ 30.272	\$ 75.680	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.6	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.7	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.8	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.9	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.10	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.11	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.12	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.13	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000	-	-2,50	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1.14	MES	189,200	\$ 253.000	\$ 47.568.000													

Diego Delgado Millán
R/ L. DIEGO MARIA DELGADO MILLÁN
DOM INGENIERIA S.A.S.

ARQ. MARIA DEL MAR ALVAREZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN
Supervisor

DDM INGENIERÍA S.A.S.		 	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES									
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 1: PRELIMINARES							
ITEM:		1.1 BODEGAJE							
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		ANCHO	ALTO						
ALMACENAMIENTO DE OBRA						2,50	1,00	MES	2,50
Aproxima Resultado a:						2	Decimales		
								TOTAL	2,50
Observaciones:									
Item 1.1 Página 1 de 1									
CONTRATISTA					 Vo.Bo. INTERVENTOR				

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 1: PRELIMINARES							
ITEM:		1.2 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.							
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			AREA	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		ANCHO	ALTO						
PISO BOX COULVERT					28,47	28,47	1,00	M2	28,47
EMPEDRADO DESCOLE (PROTECCION CIMIENTOS BOXCOULVERT)	4,58	2,00				9,15	1,00	M2	9,15
AREA DE MURO CERRAMIENTO VIVIENDA VECINA (MENOS ANCHO DE BOXCOULVERT)	1,00	5,30				5,30	1,00	M2	5,30
ADECUACION AREA DESCARGA DESENCOLE AL TERRENO NATURAL	4,50	3,35				15,08	1,00	M2	15,08
Aproxima Resultado a:						2	Decimales		
								TOTAL	58,00
Observaciones:									
Item 1.2 Página 1 de 1									
CONTRATISTA					 Vo.Bo. INTERVENTOR				

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 1: PRELIMINARES							
ITEM:		1.4 CERRAMIENTO TELA FIB TEJIDA H=2,30M-SINB							
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		ANCHO	ALTO						
CERRAMIENTO OBRA						50,00	1,00	ML	50,00
Aproxima Resultado a:						2	Decimales		
								TOTAL	50,00
Observaciones:									
Item 1.4 Página 1 de 1									
CONTRATISTA					 Vo.Bo. INTERVENTOR				

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 1: PRELIMINARES							
ITEM:		1.7 BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102							
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		ANCHO	ALTO						
SERIALIZACION PREVENTIVA PARA BLOQUEO DE VIA EN INTERVENCION						75,00	1,00	DIA	75,00
Aproxima Resultado a:						2	Decimales		
								TOTAL	75,00
Observaciones:									
Item 1.7 Página 1 de 1									
CONTRATISTA					 Vo.Bo. INTERVENTOR				

DDM INGENIERÍA S.A.S.		 	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE BOX CULVERT DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										UNIDAD:	DIA
CAPITULO	ITEM:	CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	75
		SEÑAL TIPO SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION)									
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL			
		ANCHO	ALTO	PESO							
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA					75,00	1,00	DIA	75,00			
Aproxima Resultado a:					2	Decimales	TOTAL		75,00		
Observaciones:											
Item 1.8 Página 1 de 1											
CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR											

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										UNIDAD:	DIA
CAPITULO	ITEM:	CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	75
		SEÑAL TIPO SP-38 (OBREROS EN LA VIA)									
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL			
		ANCHO	ALTO	PESO							
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA					75,00	1,00	DIA	75,00			
Aproxima Resultado a:					2	Decimales	TOTAL		75,00		
Observaciones:											
Item 1.9 Página 1 de 1											
CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR											

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										UNIDAD:	M2
CAPITULO	ITEM:	CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	27,84
		DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE									
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL			
		ANCHO	ALTO	PESO							
DEMOLICION CARCAMO PROTECCION TUBERIA EXISTENTE (ESPOSOR DE GRAN TAMAÑO SE LLEVA MAS TIEMPO DEL PRESUPUESTADO)	12,00	0,77			9,28	3,00	M2	27,84			
Aproxima Resultado a:					2	Decimales	TOTAL		27,84		
Observaciones:											
Item 1.11 Página 1 de 1											
CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR											

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										UNIDAD:	M2
CAPITULO	ITEM:	CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	9,60
		DEMOLICION MACIZA C. E=20CM									
AREA O LUGAR	LONGITUD	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL			
		ANCHO	ALTO	PESO							
DEMOLICION LOSA CARCAMO	12,00	0,80			9,60	1,00	M2	9,60			
Aproxima Resultado a:					2	Decimales	TOTAL		9,60		
Observaciones:											
Item 1.11 Página 1 de 1											
CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR											

DDM INGENIERÍA S.A.S.		 	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA	OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025	

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M2
CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	8
CAPITULO		ITEM: 1.12 DEMOL MURO LAD. SOGA							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL VIVIENDA	8,00		1,00		8,00	1,00	M2	8,00	
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	8,00
Observaciones:									
Item 1.12 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	8
CAPITULO		ITEM: 1.13 DEMOL VIGA CONCRETO <=35C-35CM							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL VIVIENDA	8,00				8,00	1,00	ML	8,00	
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	8,00
Observaciones:									
Item 1.13 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	8
CAPITULO		ITEM: 1.14 DESM VALLA EMBARONADA H=2,0 MT							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL VIVIENDA	8,00				8,00	1,00	ML	8,00	
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	8,00
Observaciones:									
Item 1.14 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M3
CAP. 1: PRELIMINARES								CANTIDAD:	8
CAPITULO		ITEM: 1.15 DEMOL COLUMNA CONCRETO							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN	PESO					
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO MURO PERIMETRAL VIVIENDA			1,00		1,00	6,00	M3	6,00	
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	6,00
Observaciones:									
Item 1.15 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

DDM INGENIERÍA S.A.S.			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, DEL BARRIO EL LUGERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	UNO
CAPITULO ITEM: 1.16 CORTE ARBOL MAS RETIRO (INCL. RAICES) H>1.0								CANTIDAD:	1
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
ARBOL EXISTENTE EN AREA DE INTERVENCIÓN					1,00	1,00	UND	1,00	
Aproxima Resultado a: 2 Decimales								TOTAL	1,00
Observaciones:									
Item 1.16 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAPITULO ITEM: 1.17 DESM. ALAMBRE PLUS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS								CANTIDAD:	7
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CERRAMIENTO	7,00				7,00	1,00	ML	7,00	
Aproxima Resultado a: 2 Decimales								TOTAL	7,00
Observaciones:									
Item 1.17 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M2
CAPITULO ITEM: 1.18 ESTRUCTURA ENTAMADO MADERA-SACOS BLUNKER								CANTIDAD:	20
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA					
DESIVIO DE CAUSE				20,00	20,00	1,00	M2	20,00	
Aproxima Resultado a: 2 Decimales								TOTAL	20,00
Observaciones:									
Item 1.18 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAPITULO ITEM: 1.19 CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M								CANTIDAD:	16
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CERCO VIVO LATERAL PUNTE	16,00				16,00	1,00	ML	16,00	
Aproxima Resultado a: 3 Decimales								TOTAL	16,00
Observaciones:									
Item 1.19 Página 1 de 1									
Vo.Bo. INTERVENTOR									
CONTRATISTA									

DDM INGENIERÍA S.A.S.			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML	
CAPITULO		CAP. 1: PRELIMINARES						CANTIDAD:	12	
ITEM:		1.2 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"								
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL		
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO						
TUBERIA EXISTENTE	12.00				12.00	1.00	ML	12.00		
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	12.00	
Observaciones:										
Item 1.2 Página 1 de 1										

CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M3	
CAPITULO		CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS						CANTIDAD:	190.74	
ITEM:		2.1 EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)								
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL		
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA						
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVO BOX COULVERT	9.80	6.03	2.70		159.27	1.00	M3	159.27		
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO	8.15	5.34	0.60		26.11	1.00	M3	26.11		
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO (OCHAVO)			0.60	0.92	0.55	1.00	M3	0.55		
ADECUACION AREA DESCARGA DESENCOLE AL TERRENO NATURAL	4.50	3.35	0.30		4.57	1.00	M3	4.57		
EXCAVACION VIGA CIMENTO MURO VIVIENDA VECINA	3.25	0.25	0.30		0.24	1.00	M3	0.24		
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	190.74	
Observaciones:										
Item 2.1 Página 1 de 1										

CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M2	
CAPITULO		CAP. 3: EXCAVACIONES Y RELLENOS						CANTIDAD:	103.5	
ITEM:		3.2 CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95								
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL		
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA						
PREPARACION TERRENO PARA CONSTRUCCION DE NUEVO BOX COULVERT	9.80	6.03			59.06	1.00	M2	59.06		
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO	8.15	5.34			43.52	1.00	M2	43.52		
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO (OCHAVO)				0.92	0.92	1.00	M2	0.92		
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	103.50	
Observaciones:										
Item 3.2 Página 1 de 1										


CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

DDM INGENIERÍA S.A.S.		 	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS							
ITEM:		2.3 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA					
REPOSICIÓN DE TERRENO CIMIENTO BOX COULVERT	9,80	6,03	0,50		29,53	1,00	M3	29,53	
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO	8,15	5,34	0,40		17,41	1,00	M3	17,41	
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO (OCHAVO)			0,40	0,92	0,37	1,00	M3	0,37	
ADECUACIÓN AREA DESCARGA DESENCOLE AL TERRENO NATURAL	4,50	3,35	0,30		4,57	1,00	M3	4,57	
EXCAVACIÓN VIGA CIMIENTO MURO VIVIENDA VECINA	3,25	0,25	0,30		0,24	1,00	M3	0,24	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
TOTAL								52,12	
Observaciones:									
 Vo.Bo. INTERVENTOR									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS							
ITEM:		2.4 CARGUE MATERIAL A MAQUINA							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO/ AREA	ALTO	FACTOR					
REPOSICIÓN DE TERRENO CIMIENTO BOX COULVERT	9,80	6,03	0,50	1,30	38,39	1,00	M3	38,39	
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO	8,15	5,34	0,40	1,30	22,63	1,00	M3	22,63	
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO (OCHAVO)			0,92	0,40	1,30	0,48	1,00	M3	0,48
ADECUACIÓN AREA DESCARGA DESENCOLE AL TERRENO NATURAL	4,50	3,35	0,30	1,30	5,94	1,00	M3	5,94	
EXCAVACIÓN VIGA CIMIENTO MURO VIVIENDA VECINA	3,25	0,25	0,30	1,30	0,32	1,00	M3	0,32	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
TOTAL								67,76	
Observaciones:									
 Vo.Bo. INTERVENTOR									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS							
ITEM:		2.5 CARGUE DE SALDO EN SITIO (MANUAL)							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	AREA	VOLUMEN	ALTO	EXPANSIÓN					
RETIRO DE SOBANTES DEMOLICION ESTRUCTURA	27,84		0,20	1,40	7,80	1,00	M3	7,80	
RETIRO DE SOBANTES DEMOLICION DE LOSA ESTRUCTURA	9,60		0,20	1,40	2,69	1,00	M3	2,69	
RETIRO DEMOLICION DE MURO LADRILLO SOGA	8,00		0,15	1,35	1,65	1,00	M3	1,65	
DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO			0,50	1,40	0,70	1,00	M3	0,70	
DESMONTE MALLA ESABONADA			0,80	1,00	0,80	1,00	M3	0,80	
DEMOLICION COLUMNA EN CONCRETO			6,00	1,40	8,40	1,00	M3	8,40	
RETIRO DE ARBOL			4,20	1,00	4,20	1,00	M3	4,20	
DESMONTE ALAMBRE DE PUAS			0,02	1,00	0,02	1,00	M3	0,02	
CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO VIVO			16,00	1,00	16,00	1,00	M3	16,00	
RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE			2,36	1,20	2,83	1,00	M3	2,83	
RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACIÓN			190,74	1,30	247,96	1,00	M3	247,96	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
TOTAL								293,05	
Observaciones:									
 Vo.Bo. INTERVENTOR									

DDM INGENIERÍA S.A.S.			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BOX COLVERT, DEL BARRIO EL LUGERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS							
ITEM:		2.6 RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM.							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	EXPANSIÓN					
RETIRO DE SOBRESANTES DEMOLICION ESTRUCTURA	27,84		0,20	1,40	7,80	1,00	M3K	7,80	
RETIRO DE SOBRESANTES DEMOLICION DE LOSA ESTRUCTURA	9,60		0,20	1,40	2,69	1,00	M3K	2,69	
RETIRO DEMOLICION DE MURO LADRILLO SOGA	8,00		0,15	1,35	1,65	1,00	M3K	1,65	
DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO		0,50		1,40	0,70	1,00	M3K	0,70	
DESMONTE MALLA EMBARNADA		0,80		1,00	0,80	1,00	M3K	0,80	
DEMOLICION COLUMNA EN CONCRETO		6,00		1,40	8,40	1,00	M3K	8,40	
RETIRO DE ARBOL:		4,20		1,00	4,20	1,00	M3K	4,20	
DESMONTE ALAMBRE DE PUAS		0,02		1,00	0,02	1,00	M3K	0,02	
CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO VIVO		16,00		1,00	16,00	1,00	M3K	16,00	
RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE		2,36		1,20	2,83	1,00	M3K	2,83	
RETIRO DE SOBRESANTES DE EXCAVACION		190,74		1,30	247,96	1,00	M3K	247,96	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
								TOTAL	293,05
Observaciones:									
CONTRATISTA  Vo.Bo. INTERVENTOR Item 2.6 Página 1 de 1									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS							
ITEM:		2.7 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	%					
LLENO LATERALES CUERPO BOX CULVERT (ANCHO TOTAL MENOS ANCHO DE CUERPO CONSTRUIDO DE BOX)	7,70	3,31	2,70		68,66	1,00	M3	68,66	
LLENO LATERALES ALETAS BOX CULVERT (ANCHO TOTAL ZONA DE ALETAS MENOS ZONA CONSTRUIDA AREA DE ALETAS)	2,10	2,50	2,70		14,14	1,00	M3	14,14	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
								TOTAL	82,80
Observaciones:									
CONTRATISTA  Vo.Bo. INTERVENTOR Item 2.7 Página 1 de 1									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
CAPITULO		CAP. 3: BOX CULVERT Y CONCRETOS							
ITEM:		3.1 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC. 60C/80P							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA					
PSO BOX CULVERT			0,50	28,47	14,24	1,00	M3	14,24	
EMPERADO DESCOLE (PROTECCION CIMENTOS BOXCULVERT)	4,58	2,00	0,40		3,66	1,00	M3	3,66	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
								TOTAL	17,90
Observaciones:									
CONTRATISTA  Vo.Bo. INTERVENTOR Item 3.1 Página 1 de 1									

DDM INGENIERIA S.A.S.			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE BOX CULVERT. DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M2
CAPITULO		CAP. 3: BOX CULVERT Y CONCRETOS						CANTIDAD:	29,28
ITEM:		3.2 SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA					
PISO BOX CULVERT					28,47	28,47	1,00	M2	28,47
EXCAVACION VIGA CIMIENTO MURO VIVIENDA VECINA	3,25	0,25				0,81	1,00	M2	0,81
Aproxima Resultado a: 2 Decimales								TOTAL	29,28
Observaciones:									
Item 3.2 Página 1 de 1									


Vo.Bo. INTERVENTOR

CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M3
CAPITULO		CAP. 3: BOX CULVERT Y CONCRETOS						CANTIDAD:	26,48
ITEM:		3.4 CONCRETO CARMIX ACERADO A 7 DIAS 3100PSI-22,0MPA							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA					
PISO BOX CULVERT			0,25	28,47	7,12	1,00	M3	7,12	
MURO LATERAL BOX CULVERT	7,80	0,25	1,45		2,83	2,00	M3	5,66	
ALETA 1 PARTE IZQUIERDA BOXCULVERT	1,35	0,25	1,40		0,47	1,00	M3	0,47	
ALETA 1 PARTE DERECHA BOXCULVERT	1,30	0,25	1,40		0,45	1,00	M3	0,45	
MURO LATERAL BOX CULVERT	7,70	0,25	1,45		2,79	2,00	M3	5,58	
ALETA 2 PARTE IZQUIERDA BOXCULVERT	1,33	0,25	1,30		0,43	1,00	M3	0,43	
ALETA 2 PARTE DERECHA BOXCULVERT	1,32	0,25	1,37		0,45	1,00	M3	0,45	
PARTE SUPERIOR BOXCULVERT	7,75	2,72	0,30		6,32	1,00	M3	6,32	
Aproxima Resultado a: 2 Decimales								TOTAL	26,48
Observaciones:									
Item 3.4 Página 1 de 1									


Vo.Bo. INTERVENTOR

CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	KLS
CAPITULO		CAP. 3: BOX CULVERT Y CONCRETOS						CANTIDAD:	2507,48
ITEM:		3.5 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPa							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	PESO					
VARILLA 2A INTERNA - PARTE INFERIOR BOX - ACEROS TRANSVERSALES	2,82	1,00	64,00		167,68	1,00	KLS	167,68	
VARILLA 2A EXTERNA - PARTE INFERIOR BOX - ACEROS TRANSVERSALES	2,62	1,00	64,00		167,68	1,00	KLS	167,68	
VARILLA 4 INTERNA - PARTE LATERAL BOX - ACEROS TRANSVERSALES	2,23	1,00	64,00		142,72	2,00	KLS	285,44	
VARILLA 1 ESQUINA EXTERNA - PARTE LATERAL BOX - ACEROS TRANSVERSALES	1,20	1,00	64,00		76,80	2,00	KLS	153,6	
VARILLA 5 CENTRO EXTERNA - PARTE LATERAL BOX - ACEROS TRANSVERSALES	1,50	1,00	64,00		96,00	2,00	KLS	192	
VARILLA 6 - LATERALES EXTERNOS BOX CULVERT - ACERO LONGITUDINAL	1,46	1,00	64,00		93,44	4,00	KLS	373,76	
VARILLA 3 - PARTE INFERIOR BOX CULVERT - ACERO LONGITUDINAL	8,00	0,56	11,00		49,28	2,00	KLS	98,56	
VARILLA 6 - LATERALES EXTERNOS BOX CULVERT - ACERO LONGITUDINAL	8,00	0,56	14,00		62,72	2,00	KLS	125,44	
VARILLA 6 - LATERALES EXTERNOS BOX CULVERT - ACERO LONGITUDINAL	8,00	0,56	14,00		62,72	2,00	KLS	125,44	
VARILLA 2 INTERNA - PARTE SUPERIOR BOX - ACEROS TRANSVERSALES	2,62	1,55	64,00		259,90	1,00	KLS	259,9	
VARILLA 2A EXTERNA - PARTE SUPERIOR BOX - ACEROS TRANSVERSALES	2,62	1,55	64,00		259,90	1,00	KLS	259,9	
VARILLA 3 - PARTE SUPERIOR BOX CULVERT - ACERO LONGITUDINAL	8,00	0,56	18,00		80,64	2,00	KLS	161,28	
ALETA 1 PARTE IZQUIERDA BOXCULVERT - TRANSVERSALES	1,48	1,00	16,00		23,68	4,00	KLS	94,72	
ALETA 1 PARTE IZQUIERDA BOXCULVERT - LONGITUDINALES	1,32	1,00	16,00		21,04	2,00	KLS	42,08	
Aproxima Resultado a: 2 Decimales								TOTAL	2.507,48
Observaciones:									
Item 3.5 Página 1 de 1									


Vo.Bo. INTERVENTOR

CONTRATISTA

DDM INGENIERÍA S.A.S.		 	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BOX COLVERT, DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA	OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025	

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M3
CAPITULO		CAP. 3: BOX COLVERT Y CONCRETOS						CANTIDAD:	1,21
ITEM:		VIGA CEMENTO ENLACE Hx20-40CM 4000PSI							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CIMIENTO MURO CERRAMIENTO VIVIENDA VECINA - LADO IZQUIERDO	3,25	0,22	0,63		0,45	1,00	M3	0,45	
CIMIENTO MURO CERRAMIENTO VIVIENDA VECINA - LADO DRECHO	1,95	0,25	0,70		0,34	1,00	M3	0,34	
SARDINEL VIA	8,15	0,15	0,20		0,24	1,00	M3	0,24	
GUARDARILLO BOX COLVERT	2,80	0,25	0,25		0,18	1,00	M3	0,18	
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	1,21
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	KLS
CAPITULO		CAP. 3: BOX COLVERT Y CONCRETOS						CANTIDAD:	40,38
ITEM:		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	PESO	ALTO	CANT					
PASADORES DE CARGA TRANSVERSALES - VARILLA LISA 7/8"	0,30	3,04			16,00	14,59	2,00	KLS	29,18
PASADORES DE CARGA LONGITUDINALES - VARILLA CORRUGADA 1/2"	0,80	1,00			14,00	11,20	1,00	KLS	11,20
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	40,38
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAPITULO		OBRAS COMPLEMENTARIAS						CANTIDAD:	3,25
ITEM:		MURO LAD SOTA LIMPIO							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CONSTRUCCIÓN NUEVO MURO PERIMETRAL VIVIENDA VECINA	3,25				3,25	1,00	ML	3,25	
Aproxima Resultado a : 3 Decimales								TOTAL	3,25
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAPITULO		OBRAS COMPLEMENTARIAS						CANTIDAD:	0,9
ITEM:		COLUMNA AMARRE MURO							
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CONSTRUCCIÓN NUEVO MURO PERIMETRAL VIVIENDA VECINA			0,45		0,45	2,00	ML	0,90	
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	0,90
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

DDM INGENIERÍA S.A.S.			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT. DEL BARRIO EL LUGERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA		OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M2
CAPITULO								CANTIDAD:	5,53
ITEM: 4.3 MALLA EMBLONADA GALV # 32 ROMBO 3"									
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CONSTRUCCIÓN NUEVO MURO PERIMETRAL VIVIENDA VECINA	3,25		1,70		5,53	1,00	M2	5,53	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
TOTAL								5,53	
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAPITULO								CANTIDAD:	10
ITEM: 4.4 POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"									
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CONSTRUCCIÓN NUEVO MURO PERIMETRAL VIVIENDA VECINA	2,50				2,50	4,00	ML	10,00	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
TOTAL								10,00	
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	M3
CAPITULO								CANTIDAD:	8,88
ITEM: 4.5 PAV. CONCRET. PREMEZCLADO MR-38									
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA					
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO	8,15	5,34	0,20		8,70	1,00	M3	8,70	
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO (OCHAVO)			0,20		0,92	0,18	M3	0,18	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
TOTAL								8,88	
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA								UNIDAD:	ML
CAPITULO								CANTIDAD:	13,15
ITEM: 4.6 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 MILDS									
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO BOX CULVERT	13,15				13,15	1,00	ML	13,15	
Aproxima Resultado a:								2	Decimales
TOTAL								13,15	
Observaciones:									
CONTRATISTA								 Vo.Bo. INTERVENTOR	

DDM INGENIERIA S.A.S.		 	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA	OP - 001 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE 2025	

MEMORIA DE CANTIDADES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										UNIDAD:	M2
CAPITULO ITEM: 4.8 PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES										CANTIDAD:	3,6
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL			
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO							
PASAMANOS PROTECCION LATERALES	3,00		1,20		3,60	1,00	M2	3,60			
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	3,60		
Observaciones:										Item 4.8 Página 1 de 1	
CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR											

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										UNIDAD:	ML
CAPITULO ITEM: 4.9 PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO										CANTIDAD:	3
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL			
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO							
PASAMANOS PROTECCION LATERALES	3,00				3,00	1,00	ML	3,00			
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	3,00		
Observaciones:										Item 4.9 Página 1 de 1	
CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR											

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										UNIDAD:	M2
CAPITULO ITEM: 4.12 LIMPIEZA GENERAL										CANTIDAD:	102,44
AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL			
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA							
PISO BOX COULVERT					28,47	28,47	1,00	M2	28,47		
EMPEDRADO DESCOLE (PROTECCION CIMIENTOS BOXCULVERT)	4,58	2,00				9,15	1,00	M2	9,15		
AREA DE MURO CERRAMIENTO VIVIENDA VECINA (MENOS ANCHO DE BOXCULVERT)	1,00	5,30				5,30	1,00	M2	5,30		
ADICUACION AREA DESCARGA DESNOCLE AL TERRENO NATURAL	4,50	3,35				15,08	1,00	M2	15,08		
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO	8,15	5,34				43,52	1,00	M2	43,52		
ESTRUCTURA PARA VIA EN CONCRETO RIGIDO (OCHAVO)					0,92	0,92	1,00	M2	0,92		
Aproxima Resultado a : 2 Decimales								TOTAL	102,44		
Observaciones:										Item 4.12 Página 1 de 1	
CONTRATISTA Vo.Bo. INTERVENTOR											



Ingeniería S. A. S
Nº 900-833-643-5

PLANILLA **SEGURIDAD** **SOCIAL.**

2 3 2 45000
1000 -

ALMAZ
GACINUESS
SOCIAL

... ..
... ..

[illegible][illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

[illegible][illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	HT	DI	APLACADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UFC	INTERESES MORA	SALDOS E INSCRIPCIONES DESCUENTADOS	VALOR A PAGAR
APFPA-Administración 21				5	1.211.600	0	0	0	1.211.600
APFPA-CCOCS	211001	8/0027940	0	1	520.000	0	0	0	1.211.600
APFPA-CCOCS	230001	8/0027460	8	4	1.111.800	0	0	0	433.000
EPFPA-Mantenimiento 21				6	433.000	0	0	0	233.000
EPFPA-Mantenimiento 21	EP2017	8/0114204	2	3	233.000	0	0	0	300.000
M.S.A. P.E. S.A.				2	350.000	0	0	0	201.400
EPFPA-EPFPA	EP2018	8/0001107	2	6	251.400	0	0	0	

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPIC	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ASO SUPA	14-11	990663700	5	5	251.400	0	0	0	251.400
CEFA (Antes de 2008)				5	433.000	0	0	0	433.000
COMAFAND	02-57	89000408	5	5	433.000	0	0	0	433.000
Grm Total					2.840.200				2.840.200

ASOPAGOS
S.A.

PAGADO



Ingenieria S.A.S
NIT 900-833-643-5

FACTURA

10/10/10

WUICAE

10/10/10

DDM INGENIERIA SAS

NIT: 900833643-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

Carrera 3 No. 6-78 Cgto San Luis, La Unión, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3226335043

Email. ddmingenieriasas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764098000851 válida desde 2025-09-01 hasta 2026-09-01 rango desde FEL203 hasta FEL1000.

Nombre o Razón MUNICIPIO DE LA UNION VALLE

Social:

NIT: 891901109

Dirección:

Teléfono:

Email: hacienda@launion-valle.gov.co

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago: 26/11/2025

Total de Líneas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEL207

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 19:35:25-05:00

FECHA FIRMADO: 25/11/2025 19:35:28

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	11	2025	26	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	020	VALOR COSTO DIRECTO	WSD	1,00	\$47.902.474,00				0,00	\$47.902.474,00
2	010	ADMINISTRACION 30,00%	WSD	1,00	\$14.370.742,20				0,00	\$14.370.742,20
3	004	UTILIDAD 6,00%	WSD	1,00	\$2.874.148,44				0,00	\$2.874.148,44

Notas:
ACTA FINAL POR 100% DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. OP-001 DEL 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, DEL BARRIO EL LUCERO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA. AMORTIZAR \$37.176.995 DEL ANTICIPO. VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA DE OBRA \$27.970.369.

SON: (sesenta y cinco millones ciento cuarenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos sesenta y cuatro centavos)
CUFE: f68a6dbacbfabf356174a20c2c45737f3e0e53a9080588e65e1e9262d68538ec8f266751afcedab2edec7c2e87c30af5

Subtotal:	\$65.147.364,64
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$65.147.364,64

Firma Digital: HWVbocNoqPgf0ZgU+PvWwDMK+XUOVnCBWM3JqF25ArlMLQYrKLYHRn80+QEn6
[b]VAILh7bz0EGQVITNPcP160CaAVTx5lloqL MjOExJatrH5
kr3zuWJ3Y9h1T IFYwB34JunTayAeB96R7DQZ2cbR8p3jSuQUdnIdnrUcyXOYqvA6xMcMzS5HHH0 7KxVUSr/KcOnbtrKBpK7PZnZjN4QCxLcS
ARZW75nX7j2lmJ0mQh04wctv3rBK PPoljE3fnX+hNdLDwLn2gZoE5cC5580BouKID5zdD6kz/Hs0K1YR1OwKIBZyOX+J QxTqgbFNNJIBrVAr4B/Y
pw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Ingeniería S. A. S
Nº 900-833-643-5

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

COMMON ORDER
OF THE
COURT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141136220666



(415)7707212489984(8020) 000014113622066 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 3 3 6 4 3

6. DV

5

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tuluá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DDM INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento
Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio
La Unión

4 0 0

41. Dirección principal

CR 3 6 78

42. Correo electrónico ddmingenieriasas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 3 4 0 8 5 0 0

45. Teléfono 2

6 0 2 2 6 7 1 5 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

1

2

50. Código

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO MILLAN DIEGO MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141136220666



(415)7707212489984(8020) 000014113622066 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 3 3 6 4 3

6. DV

5

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tulua

14. Buzón electrónico

2 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 3 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 3 2 5	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 9 2 3 0 3 2	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 3 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141136220666



(415)7707212489984(8020) 000014113622066 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tulua

14. Buzón electrónico

9 0 0 8 3 3 6 4 3 5

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 5 0 3 2 5

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

Cédula de Ciudadanía 1 3

6 3 5 6 0 6 6

106. Primer nombre

107. Otros nombres

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

DELGADO

MILLAN

DIEGO

MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal



Ingeniería S. A. S
NR 900-833-643-5

CERTIFICADO BANCARIO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

CONFIDENTIAL
HANG

Certificación Bancaria



La Unión, 27 de Septiembre de 2025

Señor(a)

A quien pueda interesarle

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **DDM INGENIERIA S.A.S** identificado (a) con **NIT 900833643** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Corriente	864-403241-77	2015/04/01	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

Sucursal Telefónica Transaccional

VIGILADO



Ingeniería S.A.S
Nº 900-833-643-5

PLANOS RECORD

Carrera 3 No. 6-78 Cgto San Luis, La Unión - Valle del Cauca - Colombia. Cel 311
340 8500

1

10/1/15

10/1/15

10/1/15



Ingeniería S.A.S
Nº 900-833-643-5

BITACORA DE OBRA.

Carrera 3 No. 6-78 Cgto San Luis, La Unión - Valle del Cauca - Colombia. Cel 311
340 8500

THE ASSOCIATION

1990

THE ASSOCIATION

