

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	19

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO
	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA 4009 - 2023
	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA, MUNICIPIO DE MAGANGUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA 4670 - 2023
	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA, MUNICIPIO DE MAGANGUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS 4754 - 2023
	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS, MUNICIPIO DE MAGANGUE DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO 4779 - 2023
	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL CAMPO SERENO, MUNICIPIO DE CICUCO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	19

	DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
Periodo:	Febrero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	057 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

CORREGIMIENTO DE BARRANCA DE YUCA

Se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°13'N y Longitud: 74°53'W; con punto de referencia final en el PR6+200 con coordenadas geográficas Latitud: 9°11'N y Longitud: 74°51'W

CORREGIMIENTO DE SANTA COITA

se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°59'N y Longitud: 74°35'W; con punto de referencia final en el PR3+600 con coordenadas geográficas Latitud: 8°60'N y Longitud: 74°33'W

CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LAS MARTAS

Se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°59'N y Longitud: 74°35'W; con punto de referencia final en el PR3+600 con coordenadas geográficas Latitud: 8°60'N y Longitud: 74°33'W

CORREGIMIENTO DE CAMPO SERENO

se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°13'N y Longitud: 74°45' W; con punto de referencia final en el PR9+300 con coordenadas geográficas Latitud: 9°11' N y Longitud: 74°43' W

- **LONGITUD TOTAL A INTERVENIR: 505 ML**

- **UBICACIÓN:**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3	DE 19



Ilustración 1. Ubicación de Municipio Magangué con respecto al departamento de Bolívar.



Ilustración 2. Ubicación de Municipio Cicuco con respecto al departamento de Bolívar.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 19



Ilustración 3. Localización de vía a intervenir – Corregimiento de Barranca de Yuca.

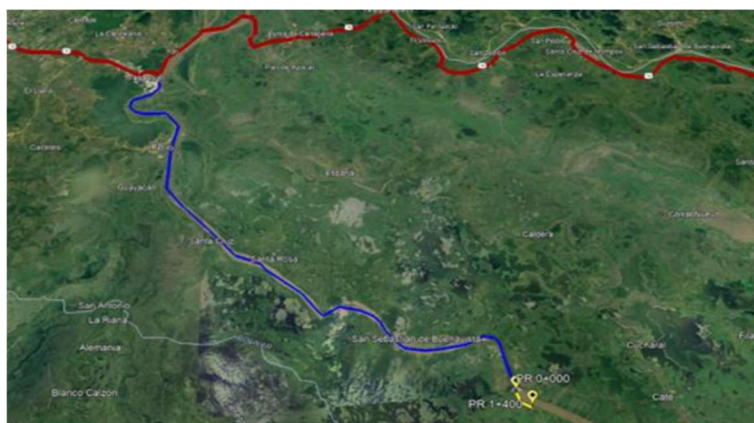


Ilustración 4. Localización de vía a intervenir – Corregimiento de Santa Coita.



Ilustración 5. Localización de vía a intervenir – Corregimiento de San José de las Martas.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 19



Ilustración 6. Localización de vía a intervenir – Corregimiento de Campo Sereno.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO - 4009 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA

CONTRATO DE OBRA	4009 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA	NIT:	9012500627
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCA DE YUCA, MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		
VALOR INICIAL	\$ 198.423.386,00		
FECHA DE INICIO	18/01/2023		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
REANUDACIÓN	N/A		
PRÓRROGA No. 1	18/01/2023 hasta 30/04/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	19

FECHA DE FINALIZACIÓN	30/04/2023
-----------------------	------------

CONVENIO - 4670 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA

CONTRATO DE OBRA	4670 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA	NIT:	9012500627
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		
VALOR INICIAL	\$ 199.471.756,00		
FECHA DE INICIO	18/01/2023		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
REANUDACIÓN	N/A		
PRÓRROGA No. 1	18/01/2023 hasta 30/04/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/04/2023		

CONVENIO - 4754 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS

CONTRATO DE OBRA	4754 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS	NIT:	9012500627
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		
VALOR INICIAL	\$ 197.503.185,00		
FECHA DE INICIO	18/01/2023		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	19

REANUDACIÓN	N/A
PRÓRROGA No. 1	18/01/2023 hasta 30/04/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/04/2023

CONVENIO - 4779 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO

CONTRATO DE OBRA	4779 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO	NIT:	9012500627
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO, MUNICIPIO DE MAGANGUÉ DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”		
VALOR INICIAL	\$ 199.011.748,00		
FECHA DE INICIO	18/01/2023		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
REANUDACIÓN	N/A		
PRÓRROGA No. 1	18/01/2023 hasta 30/04/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/04/2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO - 4009 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1232123	10	NACIÓN	\$ 198.423.386,00	\$ 0,00	\$ 198.423.386,00
TOTALES				\$ 0,00	\$ 198.423.386,00

CONVENIO - 4670 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1387223	10	NACIÓN	\$ 199.471.756	\$ 0,00	\$ 199.471.756

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	19

TOTALES				\$ 0,00	\$ 199.471.756

CONVENIO - 4754 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1387123	10	NACIÓN	\$ 197.503.185,00	\$ 0,00	\$ 197.503.185,00
TOTALES				\$ 0,00	\$ 197.503.185,00

CONVENIO - 4779 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO

REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1385023	10	NACIÓN	\$ 199.011.748,00	\$ 0,00	\$ 199.011.748,00
TOTALES				\$ 0,00	\$ 199.011.748,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

CONVENIO - 4009 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 143.852.366,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	19

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

CONVENIO - 4670 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 144.866.263,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

CONVENIO - 4754 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 142.991.770,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

CONVENIO - 4779 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 144.421.381,00	0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (EYD, Gestión Predial, Social, Ambiental y otras.)	\$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA (Incluye Ajustes e IVA)	\$ 0	0%

A la fecha del presente informe el contratista, se encuentra desarrollando preliminares para el inicio de la actualización de estudios y diseños.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	19

1.4.2. ANTICIPO.

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

A la fecha del presente informe el contratista, no ha presentado solicitud para tramitar el anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

CONVENIO - 4009 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

CONVENIO - 4670 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

CONVENIO - 4754 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

CONVENIO - 4779 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO

Meta física programada:	0 %
Meta física ejecutada:	0 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	19

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de modificación de cantidades y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado adiciones, prórrogas y/o modificaciones.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONVENIO - 4009 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DEL BARRANCA YUCA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 19

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18-01-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS DE GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☒

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento		\$ 39.684.677,20	NB-100291342	30/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		\$ 9.921.169,30	NB-100291342	30/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra		\$ 59.527.015,00	NB-100291342	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	100071564	30/10/2023	31/12/2023

CONVENIO - 4670 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SANTA COITA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18-01-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS DE GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
--	--	--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		13	DE 19

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento		\$ 39.894.351,20	NB-100297807	27/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		\$ 9.973.587,80	NB-100297807	27/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra		\$ 59.841.526,80	NB-100297807	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	100073624	27/11/2023	31/12/2023

CONVENIO - 4754 - 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MARTAS

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18-01-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS DE GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento		\$ 39.500.637,00	NB-100298711	30/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones		\$ 9.875.159,25	NB-100298711	30/10/2023	31/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		14	DE 19

Sociales e indemnizaciones.					
Estabilidad de la Obra		\$ 59.250.955,50	NB-100298711	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	100073930	30/11/2023	31/12/2023

CONVENIO - 4779 – 2023 - JUNTA DE ACCIÓN DEL CORREGIMIENTO CAMPO SERENO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18-01-2024

MEMORANDO DE APROBRACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS DE GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ___ O NO ___

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento		\$ 39.802.350	NB-100298277	01/12/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		\$ 9.950.588,00	NB-100298277	01/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra		\$ 59.703.525,00	NB-100298277	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	19

Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	100073757	01/12/2023	31/12/2023
--	-------------------	-----------	------------	------------

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha ó periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4931-2023		
CONTRATISTA:	VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S	NIT:	9006288039
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	19

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE Y CICUCO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
REPRESENTANTE LEGAL	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 73.338.214,00
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 36.650.757,00
VALOR ACUMULADO	\$ 109.988.971,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN	18/01/2024
PRÓRROGA No.1	TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
		NACION		\$ 73.338.214,00		\$ 73.338.214,00
		NACION		\$ 36.650.757,00		\$ 36.650.757,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	\$	\$	\$	\$

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada	\$ 0	0 %
Total inversión ejecutada	\$ 0	0 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	19

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS					
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL					
Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
Cumplimiento		\$ 10.998.898,00	21-44101432818	12/12/2023	30/06/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	19

Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		\$ 21.997.795,00	21-44101432818	12/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra		\$ 32.996.692,00	21-44101432818	31/12/2023	31/12/2024

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADAS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 19

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.


3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes técnicos.

3.2 ASPECTOS LEGALES.

A la fecha ó periodo del presente informe no se han presentado inconvenientes legales.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ

Resolución 057 del 26 de diciembre de 2023

Supervisor del contrato 4931 de 2023
