



ALCALDÍA DE
FUNZA

ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL

11-FR-19

ACTA DE TERMINACIÓN (ACTA No. 5)

CONTRATO	No. LP202401362
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y REGIONAL VIA LA FUNZHE DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE
NIT	901903294-2
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXION FUNZA
SUPERVISOR	GLADYS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
FECHA DE INICIO:	20-02-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.231.872.495,00
ADICION No. 1	\$ 5.295.027.455,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.526.899.950,00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	6 MESES
PRORROGA No. 1	03-07-2025 <u>(2 MESES desde 20/08/2025 al 19/10/2025)</u>
PRORROGA No. 2	16-10-2025 <u>(2 MESES Y 10 DÍAS desde 20/10/2025 al 29/12/2025)</u>
PRORROGA No. 3	16-01-2026 <u>(2 MESES desde 20/01/2026 al 19/03/2026)</u>
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	12 MESES Y 10 DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	22-12-2025 <u>(14 DÍAS desde 22/12/2025 al 04/01/2026)</u>
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	06-01-2026 <u>(10 DÍAS desde 05/01/2025 al 14/01/2026)</u>
FECHA DE REINICIO	13-01-2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	19-03-2026

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: EMILIANO VARGAS MESA en su calidad de Representante Legal de CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE, DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ Representante Legal del CONSORCIO CONEXION FUNZA en su calidad de interventor y GLADYS GONZÁLEZ GONZÁLEZ en su calidad de Supervisor.

Con la presente acta de terminación del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del interventor recibe las actividades derivadas del contrato. No obstante, se aclara que el contratista ajustará algunas actividades a conformidad de la interventoría y en los tiempos que a continuación se relacionan para poder llevar a cabo el acta de recibo final de obra con las cantidades ejecutadas del contrato.

1. En los siguientes tramos se debe realizar las correcciones referentes a empozamientos, atraque de cargues y nivelación de sumideros, de acuerdo al recorrido realizado:

- Carrera 2 entre calles 15 y 19ª
- Carrera 2B entre calles 15 y 19
- Calle 7A entre Carreras 7 y 8

Fecha máxima de cumplimiento: 31 de marzo de 2026.

2. Ejecución de la señalización horizontal definitiva en dos (2) tramos viales urbanos CARRERA 11 Y CALLE 19, las cuales se encuentran pendientes debido a los tiempos de curado de la carpeta asfáltica, garantizando las condiciones óptimas de adherencia y durabilidad.
Fecha máxima de cumplimiento: 31 de marzo de 2026.

3. Finalización del proceso de curado del concreto correspondiente a la fundida de las rampas de acceso en el K 0+638 y en el K 0+683 para el andén en el sector de la vía La Funzhe, incluyendo la verificación de condiciones de fraguado y resistencia conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
Fecha máxima de cumplimiento: 31 de marzo de 2026.



ALCALDÍA DE
FUNZA

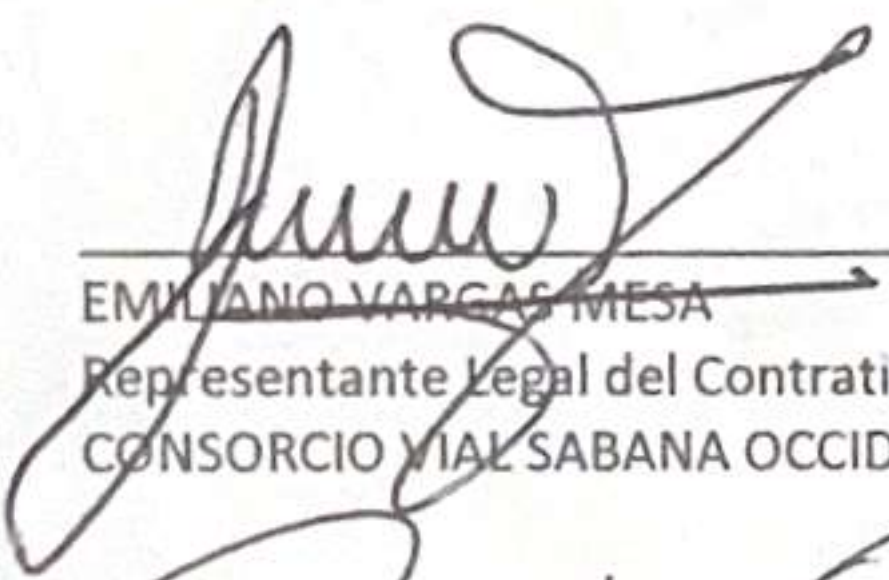
ACTA DE TERMINACIÓN O RECIBO FINAL


11-FR-19

4. Ejecución de las actividades de aseo, retiro de sobrantes y limpieza general en las áreas intervenidas y zonas aferentes directas al proyecto, garantizando la adecuada disposición de residuos y la restitución de las condiciones iniciales del entorno.

Fecha máxima de cumplimiento: 31 de marzo de 2026.

Se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).


EMILIANO VARGAS MESA
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE


DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO CONEXION FUNZA


GLADYS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Daniel Lombana Cifuentes Contratista – Secretaría de Infraestructura	Gladys González González / EDWIN OAZA Secretaria de Infraestructura	Gladys González González Secretaria de Infraestructura
