

Febrero 05 de 2026, Valledupar, Cesar

INFORME DE OBRA PARA ACTA PARCIAL 06
PERIODO: 15 DE NOVIEMBRE 2025 – 05 DE FEBRERO 2026

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO: 2025 04 0003
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

VALLEDUPAR – CESAR
2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades realizadas en obra durante el periodo del 15 de Noviembre de 2025 al 05 de Febrero de 2026. Dichas actividades corresponden a demoliciones, explanaciones, extensión de base granular, extensión de subbase granular, instalación de tubería sanitaria, pluvial e hidráulica, fabricación de cámaras de inspección y boxes, mezcla asfáltica y fundida de losas de concreto hidráulico para la capa de rodadura del pavimento rígido, fabricación de andenes para espacio público.

Este documento es una recopilación integral de las actividades y logros obtenidos durante el presente periodo. Su objetivo es proporcionar una visión detallada del avance del proyecto, respaldada por evidencias fotográficas y documentación generada en cada etapa.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2025 04 0003
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
NIT	901.927.252-7
DIRECCION	Vía al aeropuerto km 1 200 OGB, Valledupar, Cesar
PERIODO	Del 16 de Julio de 2025 al 25 de Agosto de 2025

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el presente periodo, comprendido entre el 15 de Noviembre de 2025 al 05 de Febrero de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades:

1.0 REHABILITACIÓN DE VÍAS

1.1 EXPLANACIÓN

Se realizó excavación mecánica en material común de la explanación. Incluyendo el retiro y la disposición final del mismo.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	15.083,63	67.683,79	2.201,81
PORCENTAJE	21,58%	96,85%	3,15%



1.2 DEMOLICIONES Y REMOCIONES.

1.2.1 DEMOLICION DE MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4.924,95	4.924,95	4,00
PORCENTAJE	99,92%	99,92%	0,08%



1.2.2 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO

Se realizó una demolición de bordillos existentes donde se incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, incluye transporte.

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3.670,38	10.565,03	4,00
PORCENTAJE	34,73%	99,96%	0,04%




1.2.3 DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

Se realizó demolición de pavimento en concreto hidráulico. Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, incluye transporte

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	77,28	390,35	593,23
PORCENTAJE	7,86%	39,69%	60,31%

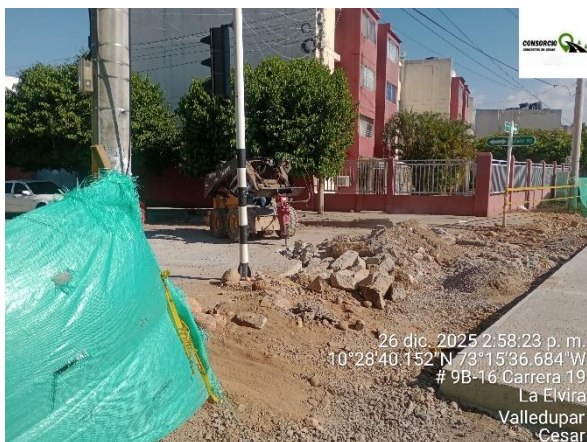

1.2.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO

Se realizó una demolición de pavimento en asfalto con un espesor variable. Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. Incluye transporte.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3.566,80	34.946,45	11.404,61
PORCENTAJE	7,70%	75,40%	24,60%



1.3 CONFORMACIÓN, TERRAPLEN Y MATERIALES GRANULARES.

1.3.1 RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE.

Se realizó actividades de corrección de niveles y compactación del terreno natural.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	11.840,00	34.071,60	5.746,20
PORCENTAJE	29,74%	85,57%	14,43%



1.3.2 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUBBASE GRANULAR.

Se realizó instalación, extensión, humectación y compactación de material de subbase granular a lo largo del tramo según especificaciones y guía de diseños.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	13.530,95	49.769,05	4,00
PORCENTAJE	27,18%	99.99%	0,01%




1.3.3 BASE GRANULAR VÍA Y BOCACALLES.

Se realizó instalación, extensión, humectación y compactación de material de base granular a lo largo del tramo según especificaciones y guía de diseños.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1.702,00	6.770,58	1.192,98
PORCENTAJE	21,37%	85,02%	14,98%

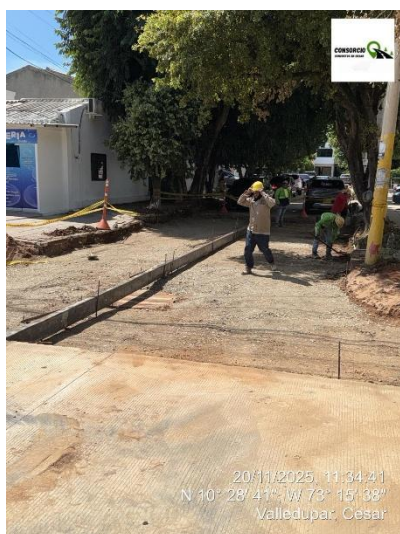

1.4 PAVIMENTOS.

1.4.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	13.789,95	34.920,60	22,20
PORCENTAJE	39,46%	99,94%	0.06%




1.4.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 ASFALTO INV 450/22.

Se suministró, extendió, niveló y compactó la mezcla asfáltica con un espesor de 0.05m.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	689,50	1.746,03	1,11
PORCENTAJE	39,46%	99,94%	0,06%



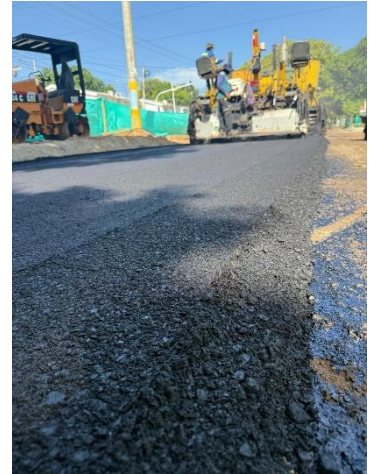

1.4.3 LOSA DE CONCRETO MR45.

Se suministró, formaleteó, colocó y se realizaron los respectivos acabados del concreto acelerado a 7 días para las placas de la capa de rodadura del pavimento.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2.507,12	7.392,60	501,01
PORCENTAJE	31,76%	93,65%	6,35%



1.4.4 JUNTA DE DILATACIÓN

Se realizó sello de silicona e instaló cordón de espuma para fondo de junta. Esta actividad incluye corte

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	8.182,00	13.152,66	12.497,10
PORCENTAJE	31,90%	51,28%	48,72%



1.4.5 ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI.

Se suministró, cortó, figuró e instaló acero de refuerzo en losas y bordillos.

La unidad de esta actividad es en kilogramos (kg).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	203.235,83	269.224,56	47.061,07
PORCENTAJE	64,26%	85,12%	14,88%



2.0 ESPACIO PÚBLICO

2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL

Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, incluye transporte

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	11.798,38	26.977,84	2.948,71
PORCENTAJE	39,42%	90,15%	9,85%



2.1.2 DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO E MAX=0.20 M

Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, incluye transporte.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7.565,46	13.087,32	25.869,18
PORCENTAJE	19,42%	33,59%	66,41%



2.2.3 SUB BASE GRANULAR

Se suministró e instaló material denominado como sub base granular para el espacio público.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	4.637,87	13.520,43	8.924,48
PORCENTAJE	20,66%	60,24%	39,76%



IAE 1 CONSTRUCCIÓN DE PANTILLA EN CONCRETO PIGMENTADO PREMEZCLADO

Se fabricó plantilla en concreto pigmentado de 3000 PSI E=0.10m para el espacio público. Incluye malla electrosoldada, sello acrílico y corte de juntas.

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7.565,46	7.565,46	7.565,46
PORCENTAJE	50,00%	50,00%	50,00%



4.0 REDES HÚMEDAS.

4.1. ALCANTARILLADO SANITARIO

4.1.1.5 ENTIBADO CONTINUO EN MADERA

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	16.000,00	16.000,00	179,00
PORCENTAJE	98.89%	98.89%	1,11%

4.1.1.6 ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7.400,00	7.400,00	102,00
PORCENTAJE	98,64%	98,64%	1,36%

4.1.1.9 ARENA DE RIO O PEÑA

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	149,05,00	276,00	2,00
PORCENTAJE	53,62%	99,28%	0,72%



4.1.3 INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO

Este capítulo contempla la instalación de tubería PVC corrugada de 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20" y accesorios como sillas yee de 8" x 6", 10" x 6" y 12" x 6", como a su vez codos PVC de 6" 45°.

El avance se describe de la siguiente manera, en unidades de COP\$ el capítulo en general

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
VALOR (\$)	147.263.482,08	280.269.926,48	9.706.893,73
PORCENTAJE	50,78%	96,65%	3,35%



4.2 ALCANTARILLADO PLUVIAL

4.2.1.2 EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA REDES EN MATERIAL CON PRESENCIA DE ROCAS

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	1.511,78	6.046,38	3.710,62
PORCENTAJE	15,49%	61,97%	38,03%



4.2.1.4 ENTIBADO CONTINUO EN MADERA

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	3.700,00	3.700,00	70,00
PORCENTAJE	98.14%	98.14%	1,86%

4.2.1.5 ENTIBADO EN LÁMINA METÁLICA ACODALADO

La unidad de esta actividad es en metros cuadrados (m²).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7.854,18	7.854,18	6,82
PORCENTAJE	99,91%	99,91%	0,09%

4.2.1.8 RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
--	-------------------------	---------------------	--------------

CANTIDAD	1.050,88	4.318,73	7.482,27
PORCENTAJE	8,90%	36,60%	63,40%

4.2.3.3 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CÁMARAS Y BOXES

Se fabricó concreto de 4000psi para la muros de cámaras y boxes.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	87,00	117,40	3,40
PORCENTAJE	48,12%	98,12%	1,88%



4.2.3.4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA SUPERIOR DE CÁMARAS Y BOXES

Se fabricó concreto de 4000psi para placa superior de cámaras y boxes.

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	60,00	123,60	3,60
PORCENTAJE	47,17%	97,17%	2,83%



4.2.3.6 ACERO DE REFUERZO

Se realizó armado de refuerzo con acero de 60.000psi para cámaras y boxes.

La unidad de esta actividad es en kilogramos (kg).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	2.200,00	46.217,06	86,94
PORCENTAJE	4,75%	99,81%	0,19%



4.2.3.7 CINTA PVC V-15

Se suministró e instaló cinta PVC flexible para la junta constructiva de cámaras y boxes.

La unidad de esta actividad es en metros lineales (m).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	98,00	203,50	7,50
PORCENTAJE	46,45%	96,45%	3,55%



4.2.4 INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Este capítulo contempla la instalación de tubería PVC corrugada para alcantarillado pluvial con diámetros de 16", 18", 20", 54", 57", 68", 72".

El avance se describe de la siguiente manera, en unidades de COP\$ el capítulo en general

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
VALOR (\$)	139.301.276,73	297.075.533,97	41.237.390,33
PORCENTAJE	41,18%	87,81%	12,19%



4.3 ACUEDUCTO

4.3.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL

Incluye cargue y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, incluye transporte

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	557,04	4.411,36	1,64
PORCENTAJE	12,62%	99,96%	0,04%



4.3.1.3 ARENA DE RIO O PEÑA

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	366,82	848,61	30,39
PORCENTAJE	41,73%	96,54%	3,46%

4.3.1.4 RELLENO SELECCIONADO TM 3" TIPO RECEBO

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos (m³).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	331,25	3.703,56	1,44
PORCENTAJE	8,94%	99,96%	0,04%

4.3.1.6 TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES

La unidad de esta actividad es en metros cúbicos por kilómetro de trayecto (m³-km).

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
CANTIDAD	7.241,52	48.489,95	2.100,05
PORCENTAJE	14,31%	95,85%	4,15%



4.3.3 INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO

Este capítulo contempla la instalación de tubería PVC unión mecánica RDE21 de 3", 4", 6", 10", 18", sus respectivas uniones pvc y tipo dresser, codos HD, tees HD, cruces HD, reducciones HD, válvulas HD, ventosas y pasamuros.

El avance se describe de la siguiente manera, en unidades de COP\$ el capítulo en general

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
VALOR (\$)	15.063.932.556,69	41.126.469.249,67	17.733.674.304,89
PORCENTAJE	25,59%	68,87%	30,13%



4.4.1 SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO SANITARIO

Este capítulo contempla el suministro de tubería PVC corrugada para alcantarillado sanitario con diámetros de 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20" con sus respectivos accesorios: kits de sillas yee de 8" x 6", 10" x 6", 12" x 6" y codos pvs 6" de 45°.

El avance se describe de la siguiente manera, en unidades de COP\$ el capítulo en general

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
VALOR (\$)	20.402.221,67	1.621.772.601,36	0,00
PORCENTAJE	1,26%	100,00%	0,00%



4.4.2 SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Este capítulo contempla el suministro de tubería PVC corrugada para alcantarillado pluvial con diámetros de 16", 18", 20", 24", 30", 33", 36", 39", 51", 54", 57", 68", 72" y sus respectivas uniones.

El avance se describe de la siguiente manera, en unidades de COP\$ el capítulo en general

	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
VALOR (\$)	369.566.027,66	6.613.189.579,01	0,00
PORCENTAJE	5,59%	100,00%	0,00%



4.4.3 SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO

Este capítulo contempla el suministro de tubería PVC unión mecánica RDE21 de 3", 4", 6", 10", 18", sus respectivas uniones pvc y tipo dresser, codos HD, tees HD, cruces HD, reducciones HD, válvulas HD, ventosas y pasamuros.

El avance se describe de la siguiente manera, en unidades de COP\$ el capítulo en general


	EJECUTADA EN EL PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA	POR EJECUTAR
VALOR (\$)	122.671.367,69	3.991.124.285,61	0,00
PORCENTAJE	3,07%	100,00%	0,00%



2. REGISTRO DE LLUVIAS

A continuación, se detalla los días de lluvias presentados:

NOVIEMBRE 2025						
						 1 Cubierto / Lluvioso
 2 SOLEADO	 3 SOLEADO	 4 SOLEADO	 5 SOLEADO	 6 SOLEADO	 7 SOLEADO	 8 SOLEADO

 9 SOLEADO	 10 SOLEADO	 11 SOLEADO	 12 SOLEADO	 13 Cubierto / Lluvioso	 14 SOLEADO	 15 SOLEADO
 16 SOLEADO	 17 SOLEADO	 18 SOLEADO	 19 SOLEADO	 20 SOLEADO	 21 SOLEADO	 22 SOLEADO
 23 SOLEADO	 24 SOLEADO	 25 SOLEADO	 26 SOLEADO	 27 SOLEADO	 28 SOLEADO	 29 Cubierto / Lluvioso
 30 SOLEADO						
DICIEMBRE 2025						
	 1 Cubierto / Lluvioso	 2 SOLEADO	 3 SOLEADO	 4 SOLEADO	 5 Cubierto / Lluvioso	 6 SOLEADO
 7 SOLEADO	 8 SOLEADO	 9 SOLEADO	 10 SOLEADO	 11 SOLEADO	 12 SOLEADO	 13 SOLEADO
 14 SOLEADO	 15 SOLEADO	 16 SOLEADO	 17 SOLEADO	 18 SOLEADO	 19 SOLEADO	 20 SOLEADO
 21 SOLEADO	 22 SOLEADO	 23 SOLEADO	 24 SOLEADO	 25 SOLEADO	 26 SOLEADO	 27 SOLEADO
 28 SOLEADO	 29 SOLEADO	 30 SOLEADO	 31 SOLEADO			
ENERO 2026						
				 1 Cubierto / Lluvioso	 2 Cubierto / Lluvioso	 3 SOLEADO
 4 SOLEADO	 5 SOLEADO	 6 SOLEADO	 7 SOLEADO	 8 SOLEADO	 9 SOLEADO	 10 SOLEADO

 11 SOLEADO	 12 SOLEADO	 13 SOLEADO	 14 SOLEADO	 15 SOLEADO	 16 SOLEADO	 17 SOLEADO
 18 SOLEADO	 19 SOLEADO	 20 SOLEADO	 21 SOLEADO	 22 SOLEADO	 23 SOLEADO	 24 SOLEADO
 25 SOLEADO	 26 SOLEADO	 27 SOLEADO	 28 SOLEADO	 29 SOLEADO	 30 SOLEADO	 31 Cubierto / Lluvioso
FEBRERO 2026						
 1 SOLEADO	 2 Cubierto / Lluvioso	 3 SOLEADO	 4 SOLEADO	 5 Cubierto / Lluvioso	 6 SOLEADO	 7 Cubierto / Lluvioso


En acumulado, se presentaron 8 días en los cuales hubo precipitaciones medianas y fuertes. Durante todo el periodo descrito en el presente informe hubo amenazas y pronósticos de lluvia y las tardes y noches nubladas fueron una constante.

3. PRESUPUESTO EJECUTADO


A continuación, se presentan las cantidades y presupuesto ejecutado acumulado:

SALDOS Y PORCENTAJES				
ACTA No.	VALOR ACTA TOTAL	SALDO CONTRATO	PORCENTAJE FACTURADO	PORCENTAJE POR FACTURAR
0		\$ 92.936.735.930,00		100,00%
1	\$ 5.754.378.933,00	\$ 87.182.356.997,00	6,19%	93,81%
2	\$ 16.705.955.651,15	\$ 70.476.401.346,00	17,98%	75,83%
3	\$ 8.283.046.454,37	\$ 62.583.329.132,00	8,91%	66,92%
4	\$ 7.793.305.867,36	\$ 54.400.049.024,00	8,39%	58,53%
5	\$ 10.132.952.613,17	\$ 44.267.096.411,00	10,90%	47,63%
6	20.243.080.399,89	\$ 23.621.648.267,00	21.78 %	25,85%

COMPARATIVO FACTURADO VS. SALDO POR FACTURAR

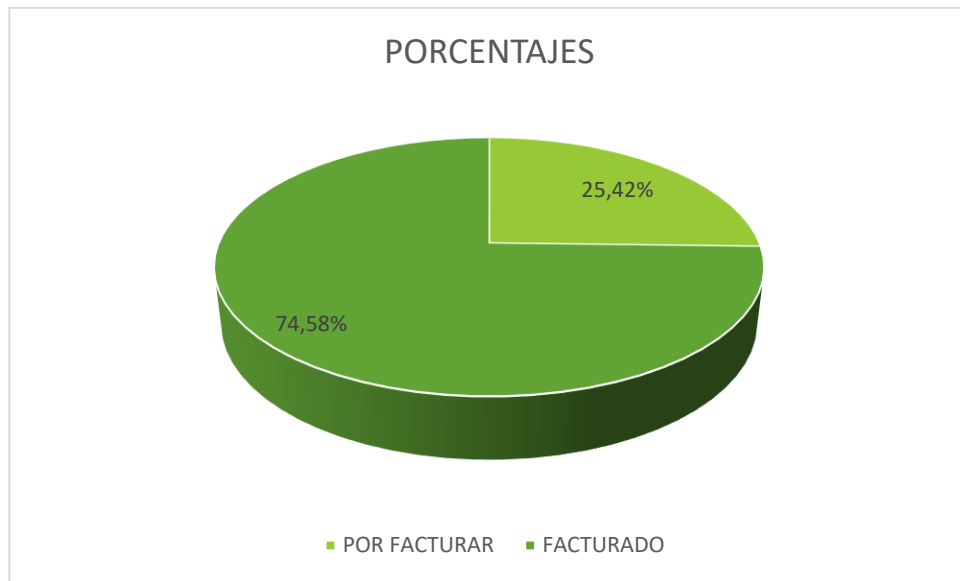

De manera general el proyecto lleva ejecutado un 74,15% del valor total del contrato, lo que en dinero traduce \$68.912.719.919,07



DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
