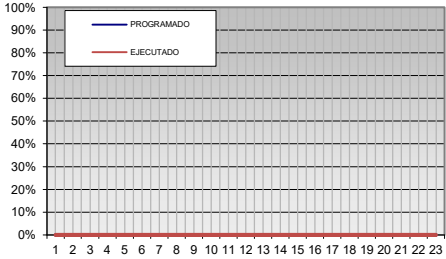
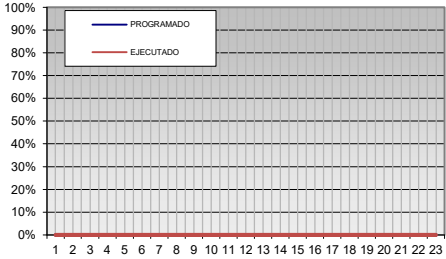
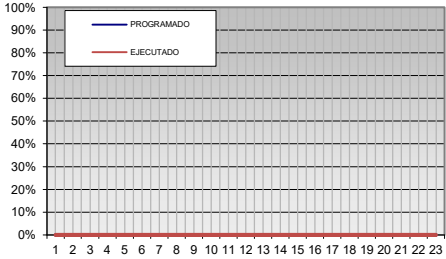


<div>Informe Ejecutivo Semanal</div>	<div>Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminisitrativa</div>	<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>																																																																						
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																								
<div>CONTRATO DE OBRA No167 DE 2025 INFORME SEMANAL No.10PERIODO: 15/12/2025 - 21/12/2025</div> <div>OBJETO</div> <div>REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL (FRENTE DE OBRA SEDE ANEXA)</div>																																																																								
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																								
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3,8076884%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="2">TOTTALL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="2">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>LP-04-2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="2">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="2"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="2">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="2">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>- 0,00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ - 0,00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00 100,00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 8.000.000.000,00 100,00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOTTALL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	LP-04-2025	VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE REINICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	\$	- 0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00 100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA																																																																					
INTERVENTOR:	TOTTALL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																				
CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	LP-04-2025																																																																				
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00																																																																				
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																				
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																				
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00																																																																				
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																				
PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:																																																																					
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																					
FECHA DE REINICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE REINICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																				
VALOR EJECUTADO:	\$	- 0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%																																																																				
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00 100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%																																																																				
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																								
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																								
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																			
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																						
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																								
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th><th colspan="2">GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><td></td><td>% PROGRAMADO SEMANA</td><td>% EJECUTADO EN LA SEMANA</td><td>DIFERENCIA</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><th colspan="5">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><td>Tiempo total</td><td>Contractual</td><td>Tiempo transcurrido</td><td>Faltante</td><td colspan="2">Atraso o adelanto en tiempo</td></tr><tr><td></td><td>78</td><td>68</td><td>10,00</td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA			Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%	Acumulado semana anterior	0,00%	0,00%	0,00%	Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%	AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO					Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo			78	68	10,00	0,00																														
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																				
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																					
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%																																																																					
Acumulado semana anterior	0,00%	0,00%	0,00%																																																																					
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%																																																																					
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																								
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																				
	78	68	10,00	0,00																																																																				

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
No se programa ni se presenta avance alguno de actividades pertenecientes a ejecución de obra		No se programa ni se presenta avance alguno de actividades pertenecientes a ejecución de obra	
Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (memorias de calculo, balances, cronogramas)		Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (Ajuste a los diseños, memorias de calculo, balances, cronogramas)	
Se realizó visita de frente de obra para toma de medidas		Se realizó visita de frente de obra para toma de medidas	
A la fecha no se cuenta con un valor de inversion avalado por las partes para el frente de obra			
Aun no se realiza visita para diligenciamiento de actas de vecindad			

OBRA

Daniel Andres Pinzon Vasquez
 Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
 CONTRATISTA

INTERVENTORIA


Ricardo Mesa
 Director de Interventoria
Total Corporation SAS Bic
 INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Anexa - P7 Oficina 6

Evidencia fotografica recorridos de obra



Sede Anexa - BAÑO MUJERES P7

Evidencia fotografica recorridos de obra
