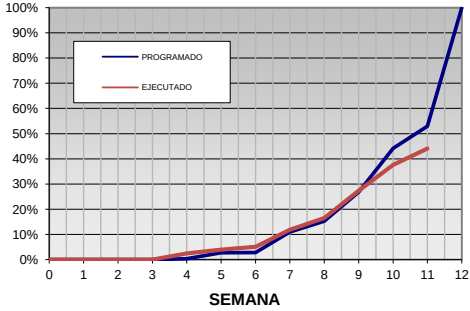



Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>																																																																											
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																													
<div>CONTRATO DE OBRA No 167 DE 2025 INFORME SEMANAL No. 11PERIODO: 22/12/2025 - 28/12/2025</div> <div>OBJETO "REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." (FRENTE PALACIO DE JUSTICIA)</div>																																																																													
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																													
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3,8076884%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="2">TOTALL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="2">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="2">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="2"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="2"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="2">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="2">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>- 0,00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ - 0,00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00 100,00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 8.000.000.000,00 100,00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	167 DE 2025	VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	\$	- 0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00 100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA																																																																										
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																									
CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																									
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00																																																																									
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																									
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																									
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00																																																																									
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																									
PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:	N/A																																																																									
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A																																																																									
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A																																																																									
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																									
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																									
VALOR EJECUTADO:	\$	- 0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%																																																																									
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00 100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%																																																																									
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																													
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																													
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN	N/A	N/A	N/A																																																																					
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																											
N/A	N/A	N/A																																																																											
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																													
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th></tr><tr><th></th><th>% PROGRAMADO SEMANA</th><th>% EJECUTADO EN LA SEMANA</th><th></th></tr><tr><td>Acumulado anterior</td><td>44,17%</td><td>37,60%</td><td>-6,57%</td></tr><tr><td>Acumulado semana anterior</td><td>8,81%</td><td>6,49%</td><td>2,32%</td></tr><tr><td>Acumulado Actual</td><td>52,98%</td><td>44,09%</td><td>-8,89%</td></tr></table>				AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO					% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA		Acumulado anterior	44,17%	37,60%	-6,57%	Acumulado semana anterior	8,81%	6,49%	2,32%	Acumulado Actual	52,98%	44,09%	-8,89%																																																						
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO																																																																													
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA																																																																											
Acumulado anterior	44,17%	37,60%	-6,57%																																																																										
Acumulado semana anterior	8,81%	6,49%	2,32%																																																																										
Acumulado Actual	52,98%	44,09%	-8,89%																																																																										
<table><tr><th colspan="4">AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO</th></tr><tr><th>Tiempo total Contractual</th><th>Tiempo transcurrido</th><th>Faltante</th><th>Atraso o adelanto en tiempo</th></tr><tr><td>78</td><td>75</td><td>3,00</td><td>-6,94</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO				Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	78	75	3,00	-6,94																																																														
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO																																																																													
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo																																																																										
78	75	3,00	-6,94																																																																										
<div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div> 																																																																													
<table><tr><th colspan="4">ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA</th></tr><tr><th>PROGRAMADO SEMANA</th><th>%</th><th>EJECUTADO SEMANA</th><th>%</th></tr><tr><td>Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>100,00%</td><td>Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>100,00%</td><td>Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>67,00%</td></tr><tr><td>Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>100,00%</td><td>Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)</td><td>67,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)</td><td>85,00%</td></tr><tr><td>Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)</td><td>100,00%</td><td>Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)</td><td>0,00%</td></tr></table>				ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA				PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	67,00%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	67,00%			Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	85,00%	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	100,00%	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	0,00%																																														
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA																																																																													
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%																																																																										
Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%																																																																										
Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	67,00%																																																																										
Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	100,00%	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	67,00%																																																																										
		Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	85,00%																																																																										
Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	100,00%	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	0,00%																																																																										

Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	100,00%	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	0,00%
Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	80,00%	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	0,00%
Troqueles eléctricos dobles, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	100,00%	Troqueles eléctricos dobles, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	0,00%
Troqueles eléctricos dobles, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	100,00%	Troqueles eléctricos dobles, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	0,00%
Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	100,00%	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	0,00%
Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul.(Suministro e instalación)	100,00%	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul.(Suministro e instalación)	0,00%
Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	50,00%	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	0,00%
Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	50,00%	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	0,00%
DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	0,00%	DIVISION PISO TECHO. Suministro e instalacion de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	0,00%
PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	0,00%	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	0,00%


OBRA


CC:1014216864
Daniel Andres Pinzon Vasquez
Director de Obra
Consorcio CAPABRI Rama Judicial
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA


Ricardo Muzila
Director de Interventoría
Total Corporation SAS Bic
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

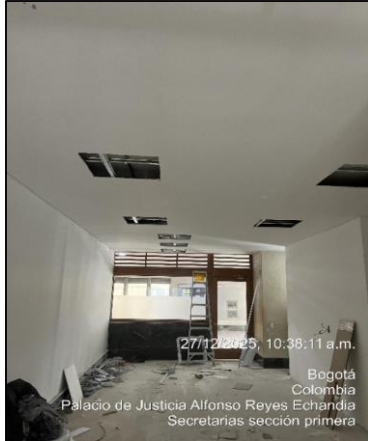

10.4- Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filis y dilataciones)



10.4- Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filis y dilataciones)

NOTA: Se informa a las partes que una vez sea legalizado el modificadorio numero 1, el CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL realizara el respectivo ajuste a la programacion y cronograma de obra teniendo presente las fechas reales requeridas para el cumplimiento del alcance del presente frente de obra .
