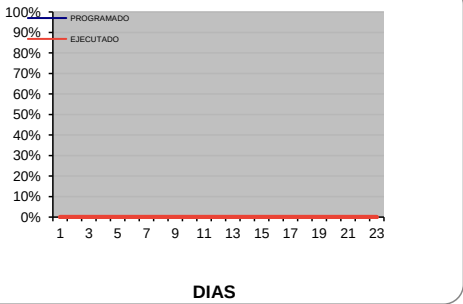
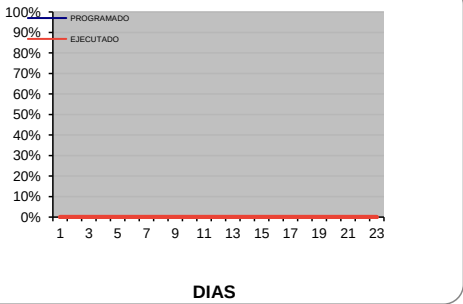
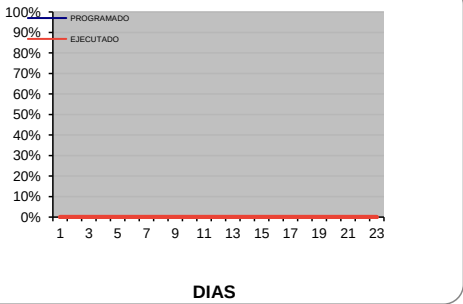


Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa																																																																																										
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																											
<div>CONTRATO DE OBRA No 167 DE 2025</div> <div>INFORME SEMANAL No. 8</div> <div>PERIODO: 1/12/2025 AL 7/12/2025</div> <div>OBJETO</div> <div>REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL (FRENTE DE OBRA CALLE 18)</div>																																																																																											
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA</th><th>3,8076884%</th><th colspan="2">CONTRATO DE OBRA</th></tr><tr><td>INTERVENTOR:</td><td colspan="3">TOTALL CORPORATION SAS BIC</td><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL</td></tr><tr><td>CONTRATO No.:</td><td colspan="3">175 DE 2025</td><td>CONTRATO No.:</td><td>167 DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td></td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 1:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td>VALOR ADICIÓN 2:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO:</td><td>\$ 8.000.000.000,00</td></tr><tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td colspan="3">2 MESES Y 18 DIAS</td><td>PLAZO INICIAL:</td><td>2 MESES Y 18 DIAS</td></tr><tr><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td colspan="3"></td><td>PLAZO ACTUALIZADO:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE SUSPENSIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>FECHA DE REINICIACIÓN:</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td colspan="3">14 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>14 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>VALOR EJECUTADO:</td><td>\$ - 0,00%</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$</td><td>304.615.069,00</td><td>100,00%</td><td>VALOR POR EJECUTAR:</td><td>\$ 8.000.000.000,00 100,00%</td></tr></table>			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA		INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025	VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00	VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -	VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -	VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA																																																																																								
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL																																																																																						
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025																																																																																						
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00		VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00																																																																																						
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-		VALOR ADICIÓN 1:	\$ -																																																																																						
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-		VALOR ADICIÓN 2:	\$ -																																																																																						
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00		VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00																																																																																						
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS																																																																																						
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:																																																																																							
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																							
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:																																																																																							
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																						
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																						
VALOR EJECUTADO:	\$	-	0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%																																																																																						
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00	100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%																																																																																						
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO																																																																																											
3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																											
<table><tr><th>LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS</th><th>DESCRIPCIÓN DEL ESTADO</th><th>FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																						
LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN																																																																																									
3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																																																																											
<table><tr><th colspan="4">AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</th><th rowspan="5"><div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div></th></tr></table>			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				<div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div> 																																																																																				
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				<div>GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO</div> 																																																																																							
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA																																																																																								
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																								
Acumulado semana anterior	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																								
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																								

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
78	54	24,00	0,00

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA | | | |
| PROGRAMADO SEMANA | % | EJECUTADO SEMANA | % |

Se continua con gestion administrativa para documentacion de ajuste de balances, memorias, planos y diseños pertinentes, resultado del diagnostico preliminar remitido (memorias de calculo, balances, cronogramas)	100%	Se continua con gestion administrativa para documentacion de ajuste de balances, memorias, planos y diseños resultado del diagnostico preliminar (memorias de calculo, balances, cronogramas)	100%
se continua con el ajuste de diagnosticos previos, actualizando memorias de cantidades, balance y programacion, conforme a visitas de campo y recorridos previos realizadoscon acompañamiento de interventoría y/o supervisión	100%	se continua con el ajuste de diagnosticos previos, actualizando memorias de cantidades, balance y programacion, conforme a visitas de campo y recorridos previos realizadoscon acompañamiento de interventoría y/o supervisión	100%

OBRA	INTERVENTORÍA
<div><p>CC:1014216864 Daniel Andres Pinzon Vasquez Director de Obra Consorcio CAPABRI Rama Judicial CONTRATISTA</p></div>	<div><p>Ricardo Mansilla Director de Interventoría Totall Corporation SAS Bic INTERVENTORÍA</p></div>
REGISTRO FOTOGRAFICO	
