


Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	<u>167 DE 2025</u>	PERIODO: 01/12/2025 - 07/12/2025
INFORME SEMANAL No.	<u>8</u>	
OBJETO		
REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL (FRENTE DE OBRA SEDE ANEXA)		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		3,8076884%	CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	TOTAL CORPORATION SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATO No.:	175 DE 2025		CONTRATO No.:	LP-04-2025
VALOR INICIAL:	\$	304.615.069,00	VALOR INICIAL:	\$ 8.000.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1:	\$	-	VALOR ADICIÓN 1:	\$ -
VALOR ADICIÓN 2:	\$	-	VALOR ADICIÓN 2:	\$ -
VALOR ACTUALIZADO:	\$	304.615.069,00	VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8.000.000.000,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:			PLAZO ACTUALIZADO:	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO:	\$	- 0,00%	VALOR EJECUTADO:	\$ - 0,00%
VALOR POR EJECUTAR:	\$	304.615.069,00 100,00%	VALOR POR EJECUTAR:	\$ 8.000.000.000,00 100,00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO


3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN


3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO				GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA		
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%		
Acumulado semana anterior	0,00%	0,00%	0,00%		
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO					
Tiempo total	Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo	
78		54	24,00	0,00	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
No se programa ni se presenta avance alguno de actividades pertenecientes a ejecucion de obra		No se programa ni se presenta avance alguno de actividades pertenecientes a ejecucion de obra	
Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (memorias de calculo, balances, cronogramas)		Se continua con gestion administrativa para documentacion de diagnostico (Ajuste a los diseños, memorias de calculo, balances, cronogramas)	
Se realiza visita de frente de obra para toma de medidas el día 2 y 3 de Diciembre de 2025		Se realiza visita de frente de obra para toma de medidas el día 2 y 3 de Diciembre de 2025	
A la fecha no se cuenta con un valor de inversion avalado por las partes para el frente de obra			
Aun no se realiza visita para diligenciamiento de actas de vecindad			


OBRA	INTERVENTORÍA
 CC:1014216864 Daniel Andres Pinzon Vasquez Director de Obra Consortio CAPABRI Rama Judicial CONTRATISTA	 Ricardo Masilla Director de Interventoría Total Corporation SAS Bic INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

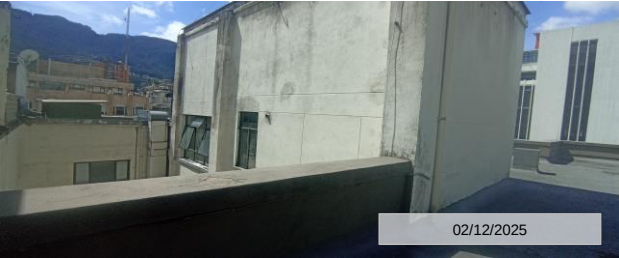

Sede Anexa - CUBIERTA

Evidencia fotografica recorridos de obra

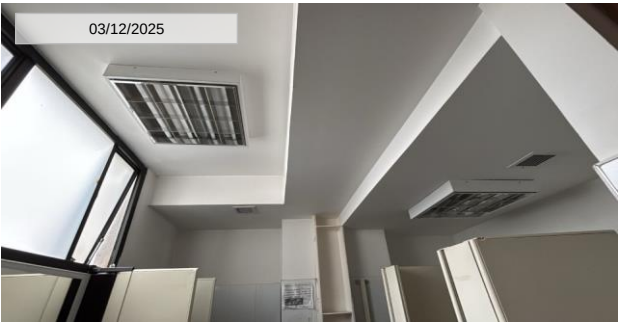

Sede Anexa - BAÑO HOMBRES P7

Evidencia fotografica recorridos de obra
