



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

ASUNTO: MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL
MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ

INTERESADO (S):

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL DONCELLO

CONTRATISTA: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

SUPERVISOR: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

CONTRATO No.: COP-2025-008

CONTENIDO:

INFORME FINAL DE OBRA



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	
2. OBJETIVO	
3. DESCRIPCIÓN FISICA DEL MUNICIPIO EL DONCELLO - CAQUETÁ.....	
4. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO	
5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA	
6. INFORME ADMINISTRATIVO	
6.1 Discriminación de AIU	
6.2 Discriminación de Factor Prestacional	
6.3 Relación pagos de seguridad social.....	
6.4 Planillas de Seguridad Social.....	
6.5 Certificación de paz y salvo por pago de seguridad social y parafiscales....	
6.6 Justificación de gastos de Administración.....	
6.7 Justificación de gastos de Factor Prestacional	
7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE	
7.1 Relación de pagos	
7.2 Factura.....	
7.3 Certificado de cuenta bancaria.....	
8. INFORME JURIDICO	
8.1 Amparos del contrato	
8.2 Registro Único Tributario (RUT).....	
9. INFORME TECNICO	
9.1 Acta Final	
9.2 Memorias de Cantidades – Pre Actas Finales	
9.3 Informe SISO	



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.4 Certificación pago FIC.....	
9.5 Certificación de Material.....	
9.6 Registro Fotográfico.....	
9.7 Bitácora.....	



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, realizo contrato de obra No. COP-2025-008 con el fin de realizar el **MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ**.

Quien mediante proceso de selección abreviada de menor cuantía No SAMC-2025-014, contrató el día 19 de noviembre de 2025, mediante contrato de obra No COP-2025-008, con un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la firma del acta de inicio, por un valor de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$61.778.755.00) M/CTE M/cte. que serán pagados según la cláusula 8, a la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S con Nit. 901.209.615-7** representada legalmente por **WILLIAM CALDERON PEREZ**.

Este contrato tuvo como finalidad optimizar las condiciones físicas, estructurales y funcionales del aula existente, garantizando un espacio seguro, confortable y adecuado para el desarrollo de las actividades académicas de la comunidad educativa rural.

La intervención contempló obras civiles orientadas al reforzamiento estructural, mejoramiento de acabados, adecuación eléctrica y reposición de elementos arquitectónicos, cumpliendo con criterios técnicos, normativos y de seguridad vigentes, especialmente en lo relacionado con edificaciones educativas.

El presente informe técnico corresponde al informe final de obra que muestra el avance y proceso de las actividades ejecutadas durante el periodo entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre del año 2025.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

2. OBJETIVO

El objetivo al generar este informe es socializar el seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas en terreno en los aspectos técnico, administrativos y financieros de acuerdo al contrato de obra No COP-2025-008 y, suscrito entre EL **MUNICIPIO DE EL DONCELLO** y la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ**". En la zona rural del municipio de El Doncello.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

3. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MUNICIPIO EL DONCELLO - CAQUETÁ

El Doncello es un municipio de Colombia en el departamento del Caquetá. Plantado sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental, está ubicado al nororiente de Florencia, capital del departamento. Es el primer Municipio productor de caucho a nivel Nacional, existen más de 200 hectáreas cultivadas en la Inspección de Maguaré y Puerto Manrique. Es la capital comercial del Caquetá por su frecuente tráfico económico ya que sus fértiles tierras son manipuladas por campesinos y el personal agro, quien lo saben aprovechar al máximo.

La Colonización del Norte Caqueteño exigió la fundación de un pueblo intermedio entre Florencia y Puerto Rico que brindara descanso y aprovisionamiento. Las tierras más indicadas eran las de Jorge Abel Molina y Rufino Quichoya.

Analizadas las múltiples posibilidades, el 20 de marzo de 1951, durante la pernoctación en casa de Jorge Abel Molina, de Jesús González y Juan Vicente Aguirre Ortiz y frente a la propuesta de este último, se decidió levantar el caserío; para esto Jorge Abel Molina donó un lote destinado a la plaza y otro para la escuela.

Región: PIEDEMONTE Y LA LLANURA AMAZÓNICA

Altura: 280 m.s.n.m

Temperatura Media: 24°C

Precipitación anual: 2145 mm

Veredas: 63.

Límites: Tomando como punto de partida el nacimiento del río Anayá; de este lugar en línea recta en dirección norte hasta encontrar el filo más alto que divide el departamento del Huila con el Caquetá y siguiendo este mismo límite hasta situarse frente del nacimiento del Río Nema; de este punto en línea recta, aguas abajo hasta su desembocadura en el río Guayas; río Guayas abajo hasta la desembocadura del río Anayá; río Anayá arriba hasta su nacimiento, (primer punto de partida).

Principales Ríos: El principal curso de agua del municipio es el río El Doncello y la quebrada Anaya, adicional a esto cuenta con quebradas importantes como El Quebradon, La Granada, El Nema y San Jose.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

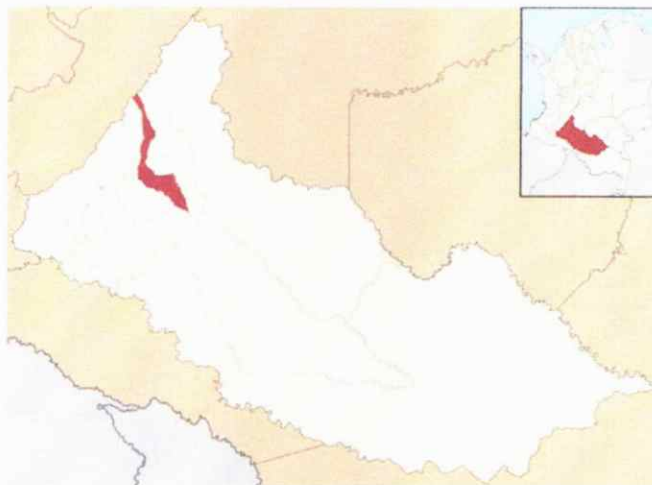


Ilustración 1. **Ubicación de El Doncello** – Fuente: **Google**.

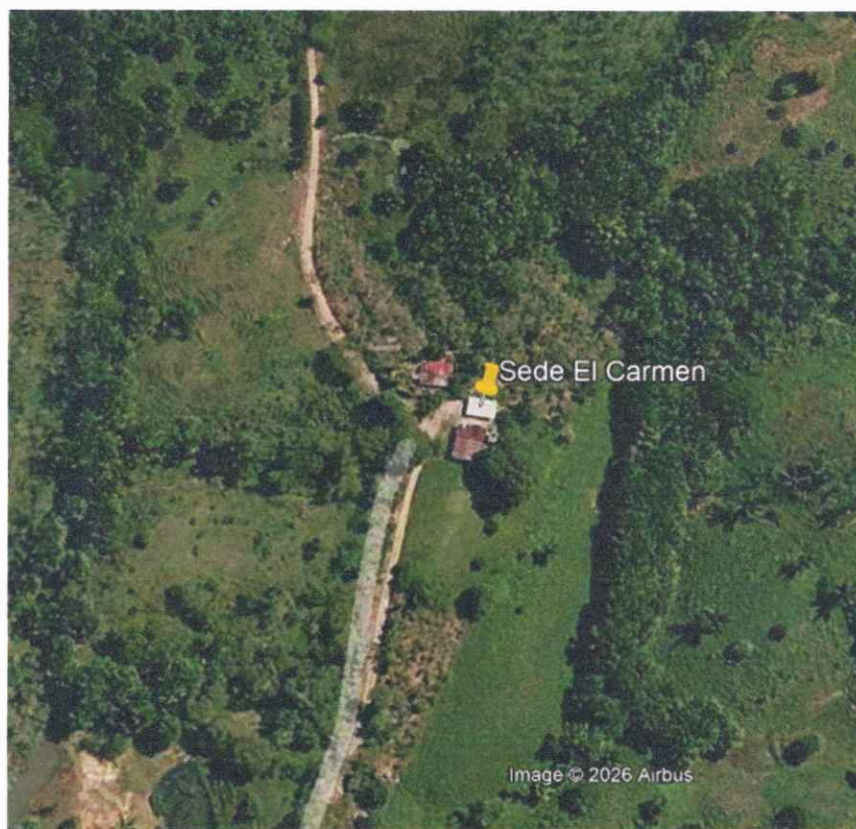


Ilustración 5. Ubicación del proyecto – Fuente: Google Earth

Latitud: 1°40'14.46"N– Longitud: 75°10'30.08"O



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

4. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

JAIR DIAZ DIAZ

Alcalde de El Doncello

REPRESENTANTE DEL CONSTRATISTA:

WILLIAM CALDERON PEREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

El municipio de El Doncello llevo a cabo un proceso de contratación estatal, con el fin de seleccionar un contratista de obra, que para este caso fue la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S, quien fue la encargada de ejecutar el contrato de obra No COP-2025-008, que tenía como alcance el mejoramiento de la infraestructura física del aula de clase de la sede El Carmen. El contrato de obra cuenta con unas características específicas las cuales se detallan a continuación, y fueron cumplidas por el contratista; dentro de los involucrados en la ejecución del contrato de la referencia, se encuentra la máxima autoridad del municipio de El Doncello como ordenador del gasto y la Secretaria de Planeación y de las TIC'S como supervisor del contrato de obra No COP-2025-008.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE EL DONCELLO	JAIR DIAZ DIAZ Alcalde Municipal
SUPERVISOR DEL CONTRATO	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATISTA

NÚMERO DEL CONTRATO	COP – 2025 - 008
OBJETO	MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

	BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ
NOMBRE CONTRATISTA	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	19 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	25 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION EFECTIVA	24 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuarenta y cinco (45) días
VALOR INICIAL	\$61.778.755
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR ADICION	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 61.778.755
Valor Acta Final	\$ 61.778.755
Valor a amortizar en el acta final	\$ 0.00
Valor a pagar Acta Final	\$ 61.778.755
Avance Ejecutado acumulado Porcentual en valor total	100%
Saldo a favor del municipio	\$0.00

El contrato de obra No COP-2025-008 fue firmado el día 19 de noviembre de 2025, y se dio acta de inicio el día 25 de noviembre del mismo año, y se finalizó el 24 de diciembre del 2025, dando cumplimiento al plazo establecido contractualmente.

El contrato fue ejecutado en su totalidad, es decir, que se dio cumplimiento al 100% de las actividades contratadas.

En una primera etapa se desarrollaron las actividades preliminares, que incluyeron la localización, replanteo y cerramiento del área de intervención, así como las demoliciones generales necesarias con retiro y disposición final adecuada de los escombros, *garantizando el manejo responsable de residuos*. Posteriormente se ejecutaron excavaciones manuales y rellenos con material seleccionado proveniente de las mismas excavaciones, debidamente compactado para asegurar la estabilidad del terreno.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

En el componente estructural, se construyó concreto pobre o solado de limpieza de 2000 PSI como base de cimentación, se realizó el suministro y amarre de acero de refuerzo Fy 420 MPa, y se fundió concreto de 3000 PSI para vigas, zapatas y columnas, garantizando la estabilidad y resistencia de la estructura del aula.

En el componente de mampostería, se ejecutaron muros en bloque farol No. 6 liso a la vista por ambas caras, asentados con mortero 1:4, acompañados de pañete impermeabilizado 1:4 que incluyó filos y dilataciones. Asimismo, se realizó el suministro e instalación de pintura plástica en interiores y pintura tipo Koraza en superficies que requerían mayor resistencia y protección.

El proyecto incluyó la adecuación de la acometida eléctrica y el suministro e instalación de la red eléctrica interna, asegurando condiciones óptimas de iluminación y seguridad eléctrica conforme a la normatividad RETIE vigente.

En el componente de pisos y acabados interiores, se ejecutó el alistado de pisos en mortero 1:3 con espesor promedio de 5 cm, el suministro e instalación de piso en cerámica tráfico 5 (incluyó pegante con látex y fragüe), así como la instalación de guarda escoba en cerámica para protección y acabado perimetral.

Finalmente, en el capítulo de carpintería y herrería, se instalaron ventanas en aluminio de 1,20 x 1,20 m con rejilla de protección y puerta metálica de 1,20 x 2,00 m, garantizando ventilación, iluminación natural y seguridad del aula. El proyecto culminó con el aseo general de la obra, dejando el espacio en condiciones óptimas para su uso.

Con la ejecución de estas actividades se fortaleció la infraestructura educativa rural del municipio de El Doncello, mejorando las condiciones de aprendizaje y contribuyendo al bienestar y permanencia escolar de los estudiantes de la sede rural El Carmen.

Finalmente, el contrato de obra fue ejecutado en un mes.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el desarrollo de la obra se realizaron algunos aspectos administrativos que se resumen a continuación:

- ✓ Revisión y estudio de documentos generados en la etapa precontractual
- ✓ Se firmó acta de inicio del contrato
- ✓ Renuncia al anticipo del que se habla en la clausula No 6 del contrato No COP-2025-008.
- ✓ Revisión del contrato de obra
- ✓ Chequeo equipo de trabajo
- ✓ Se participó en la socialización del proyecto con comunidad beneficiada

6.1 Discriminación de AIU

El AIU es clave para garantizar la viabilidad económica del proyecto, pues permite cubrir los costos indirectos, gestionar riesgos y asegurar que el contratista obtenga una utilidad razonable. De esta manera en la propuesta económica se presentó un porcentaje del 25.00% correspondiente a la Administración, el cual se discrimina así:

ADMINISTRACION INICIAL

COSTO DIRECTO TOTAL								\$ 47.522.119,23
	DESCRIPCION	UN D	CAN T	% DE PAR T	F.P	VALOR UNITARIO	MESE S	VALOR TOTAL
1	PERSONAL DE OBRA							
1,1	Maestro de obra	mes	1,0	100%	138,36 %	100.000	1,50	207.541
	TOTAL PERSONAL DE OBRA							207.541
2	OTROS - GASTOS GENERALES							
2,1	Estampillas y descuentos							
2.1.1	Pro-universidad	%	0,5%			61.778.755	1	308.894
2.1.2	Pro-Cultura	%	2,0%			61.778.755	1	1.235.575
2.1.3	Pro-Ancianato	%	4,0%			61.778.755	1	2.471.150
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e Imder	%	1,5%			61.778.755	1	926.681
2.1.5	Pro Electrificación	%	1,0%			61.778.755	1	617.788
2.1.6	Pro Deporte	%	2,5%			61.778.755	1	1.544.469
2.1.7	Pro Justicia	%	2,0%			61.778.755	1	1.235.575
2.1.8	Fondo de Seguridad	%	5,0%			61.778.755	1	3.088.938
2.1.9	Polizas	%	0,4%			61.778.755	1	243.919



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:							11.672.989
TOTAL ADMINISTRACION					25,00%		11.880.529,81
IMPREVISTOS					0%		0
UTILIDAD					5%		2.376.105,96
TOTAL AIU					30%		14.256.635,77

6.2 Discriminación de Factor Prestacional

El factor prestacional es el porcentaje del salario integral que corresponde a las prestaciones sociales que reciben los trabajadores, donde las prestaciones sociales corresponde a los beneficios adicionales que la empresa debe pagar a sus empleados, para el caso de las obras civiles, es común ver este factor afectado el salario base del personal ofrecido como equipo mínimo requerido, esto con el fin de que estos costos hagan parte de los gastos de administración, que para este caso aplica para el maestro de obra, tal como se describe en la discriminación de la administración.

Ítem	Descripción	%
A	SALARIO BÁSICO	100%
B	PRESTACIONES SOCIALES	35,87%
	Primas de Servicios	8,33%
	Cesantías	8,33%
	Vacaciones	4,16%
	Auxilio de Transporte	14,05%
	Intereses sobre cesantías	1,00%
C	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	26,96%
	Salud	4,00%
	Riesgos Profesionales	6,96%
	CCF	4,00%
	SENA	0,00%
	ICBF	0,00%
	Pensiones	12,00%
	SUBTOTAL FACTOR PRESTACIONAL (B+C)	62,83%
	TOTAL FACTOR PRESTACIONAL (A + B + C + D)	162,83%

6.3 Relación pagos de seguridad social

La seguridad social es la protección que proporciona la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S a las personas involucradas en la ejecución del contrato de obra en referencia, de esta manera se garantiza el acceso a la asistencia médica, en particular en caso de enfermedad o accidente laboral.

Para el caso de esta obra se relacionan las planillas pagadas del director y maestro de obra, quienes hacen parte del equipo mínimo requerido, así mismo dos ayudantes entre ellos una mujer, personal que está bajo la nómina de la empresa, y fueron los encargados del desarrollo de las actividades contractuales que dieron como resultado el mejoramiento de la Planta física de la sede Educativa El Carmen.

Es importante mencionar que LUZ MIREYA LÓPEZ BUBÚ de sexo femenino, se encuentra vinculada a la empresa y desarrolló actividades de mano de obra no calificada dentro de la obra, de esta manera se da cumplimiento a la cláusula 9, del contrato de obra en mención, donde el 5% de la mano de obra no calificada son mujeres.

De igual manera, LUZ MIREYA LÓPEZ BUBÚ, se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO AMENAZA, de esta manera se da cumplimiento a la cláusula 9, del contrato de obra en mención. (Seguido a la seguridad se anexa el certificado de registro).

Adicional a esto se relación la planilla de seguridad social del profesional SISO, quien hace su aporte de manera independiente, toda vez que la vinculación con la empresa corresponde a pagos por honorarios o servicios prestados, de igual manera se anexa la seguridad social como independiente del ingeniero director de obra que hace parte del equipo mínimo requerido.

Personal mínimo Requerido

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Noviembre	Yesid Fernando Bartolo Lozano	Director	9494795401 9496420078	2025/11/26 2025/12/15	I N	\$ 3.627.008	\$ 1.033.800 \$ 89.200
Noviembre	Yesid Vega Lozano	Maestro	9496849350	2026/01/06	E	\$ 284.700	\$ 111.500



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Diciembre	Yesid Fernando Bartolo Lozano	Director	9496420092 9496420110	2025/12/15	I N	\$ 3.627.008	\$ 1.033.800 \$ 88.400
Diciembre	Yesid Vega Lozano	Maestro	9496849363	2026/01/07	E	\$ 1.560.000	\$ 483.000

Personal Mano de Obra No calificada

MESES	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	DÍAS	VALOR PAGADO
Noviembre		9496849350	2026/01/06	Tipo E	
Afiliados		ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S			\$ 204.200
40.077.673	Ayudante	Luz Mireya Lopez Bubú		IBC 284.700	\$ 88.300
		9495850975	2025/12/04	TIPOE	\$ 1.190.500
1.117.499.072	Ayudante	Edwin Palomino		IBC 996.450	\$ 308.700

MESES	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	DÍAS	VALOR PAGADO
Diciembre		9496849363	2026/01/07	Tipo E	
Afiliados		ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S			\$ 865.100
40.077.673	Ayudante	Luz Mireya Lopez Bubú		IBC 1.233.700	\$ 382.100
		9496708221	2026/01/07	TIPOE	\$ 1.190.500
1.117.499.072	Ayudante	Edwin Palomino		IBC 1.233.700	\$ 382.100

Personal adicional

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Noviembre	María Camila Escobar	SISO	1749308159	2025/12/06	I	\$1.423.500	\$469.000
Diciembre	María Camila Escobar	SISO	4635888195	2025/12/19	I	\$1.423.500	\$533.400

- Ajuste planilla riesgo V

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Noviembre	María Camila Escobar	SISO	4635887822	2025/12/19	N	\$1.423.500	\$64.400



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 2025-0983290-1

Fecha: 25/06/2025 16:18:23 PM

Firmado por: Diana Marcela Bustamante Arango
Bogotá, miércoles 25 de junio de 2025

Señor(a)
LUZ MIREYA LOPEZ BUBÚ
Dirección: transversal 1a # 4-86
Teléfono: 3142061 - 3142061412
El Doncello, Caquetá, 48

La UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS hace constar que, una vez consultado el Registro Único de Víctimas (RUV) el día **miércoles 25 de junio de 2025**, el(la) señor(a) **LUZ MIREYA LOPEZ BUBÚ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía 40077673, evidencia el siguiente reporte de estado y hecho(s) victimizante(s):

DECLARACION/ RADICADO	ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES	FECHA HECHO VICTIMIZANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
BJ000885334	4336538(RUV)	Incluido	Desplazamiento forzado	07/11/2024	Caquetá (18)	San Vicente del Caguán (18753)
BJ000885334	4336538(RUV)	Incluido	Amenaza	07/11/2024	Caquetá (18)	San Vicente del Caguán (18753)

ADVERTENCIA: Esta constancia se expide a petición del(a) interesado(a), previa verificación de su identidad, y da cuenta del estado de inscripción en el Registro Unico de Víctimas, los hechos victimizantes por los que fue valorado y el lugar de ocurrencia de cada hecho, a la fecha de su expedición. El presente documento es de carácter personal e intransferible.

Al respecto, es preciso indicar que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter RESERVADO, según lo citado en el párrafo 1º del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. En todo caso se deberá garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información.

De acuerdo con lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS SON GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE INTERMEDIARIOS

DIANA MARCELA BUSTAMANTE ARANGO
Directora de Registro y Gestión de la Información(E)
Unidad para las Víctimas

Dirección: Complejo logístico San Cayetano. Carrera 85D No. 46A-65, Bogotá - Colombia
Conmutador: Tel: +57 (601) 796 5150
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 911119



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639**, domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATANTE**, y por el otro, **YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.110.562.700** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DIRECTOR DE OBRA**; **EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **UN (01) MES**, contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE**.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **DOS MILLONES DE PESOS**

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

(\$2.000.000) M/CTE mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: **EL CONTRATISTA** se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Coordinar el inicio y desarrollo de la obra.
2. Elaborar y revisar cronogramas de ejecución.
3. Gestionar los recursos humanos, materiales y equipos.
4. Asegurar el cumplimiento de planos, especificaciones y normas de seguridad.
5. Verificar la calidad de los materiales y su correcta instalación.
6. Controlar los avances físicos y financieros de la obra.
7. Dirigir y coordinar al equipo de trabajo (obreros, técnicos, subcontratistas).
8. Asignar tareas y verificar su ejecución.
9. Resolver conflictos laborales en la obra.
10. Supervisar el uso eficiente de los recursos para evitar sobrecostos.
11. Aprobar valuaciones y certificaciones de obra.
12. Gestionar pedidos de materiales y equipos según el presupuesto.
13. Coordinar inspecciones con entidades reguladoras.
14. Informar avances, problemas y soluciones al representante legal.
15. Realizar informes de avance técnico y financiero.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección DIAGONAL 6 No 7-98 BARRIO EL CEDRAL.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, en tres (03) folios.

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ

C.C. 96.352.693

Representante Legal

Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO

C.C. No 1.110.562.700

Contratista



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639**, domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATANTE**, y por el otro, **MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.109.005.852** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO SISQ; EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **UN (01) MES**, contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE**.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **UN MILLON DE PESOS**



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

(\$1.000.000) M/CTE mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: **EL CONTRATISTA** se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Realizar inspecciones para identificar peligros y evaluar riesgos.
2. Desarrollar e implementar planes de prevención de accidentes.
3. Recomendar y supervisar el uso adecuado de EPP (Elementos de Protección Personal).
4. Dictar charlas de seguridad (inducción, pausas activas, manejo de emergencias).
5. Capacitar al personal sobre normas de seguridad y buenas prácticas.
6. Garantizar que la obra cumpla con las normas de seguridad laboral (ej. Resolución 0312 de 2019 en Colombia).
7. Verificar el cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 –



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

No 6 = 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección DIAGONAL 10B No 1 - 70 - 78.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, en tres (03) folios.

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ

C.C. 96.352.693

Representante Legal

Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO

C.C. No 1.109.005.852

Contratista



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6.4 Planillas de Seguridad Social



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

NOVIEMBRE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1957623081	9494795401	I	2025/12/02	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,033,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	\$3,627,008	\$580,400	EP5037	30	\$3,627,008	\$453,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	195/623081	9494/95401	I	2025/12/02	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,033,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$580,400	\$0	\$0	\$580,400		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$580,400	\$0	\$0	\$580,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$453,400	\$0	\$0	\$453,400		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$453,400	\$0	\$0	\$453,400		
TOTAL				1	\$1,033,800	\$0	\$0	\$1,033,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco
2025-11	2025-11	2007807814	9496420078	N	2025/12/02	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA
						Días Mora	Valor
						13	\$89,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0	
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0	
1	CC 1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	(\$3,627,008)	(\$88,400)	EPS037	30	(\$3,627,008)	(\$453,400)		0	\$0	\$0	14-4	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
2	CC 1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	\$3,627,008	\$88,400	EPS037	30	\$3,627,008	\$453,400		0	\$0	\$0	14-4	30	\$3,627,008	\$88,400	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	200/80/814	9496420078	N	2025/12/02	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	13	\$89,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$88,400	\$800	\$0	\$89,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$88,400	\$800	\$0	\$89,200	
TOTAL				1	\$88,400	\$800	\$0	\$89,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL CARMEN	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	2064098522	9496849350	E	2025/12/04	2026/01/06	NEQUI	\$204,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL CARMEN (2 Afiliados)					\$644,700	\$103,200			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$45,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: EL CARMEN (2 Afiliados)					\$644,700	\$103,200			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$45,000		\$0	\$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					\$644,700	\$103,200			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$45,000		\$0	\$0
1	CC 40077673	LOPEZ LUZ	25-14	6	\$284,700	\$45,600	ESSC62	6	\$284,700	\$11,400	CCF13	6	\$284,700	\$11,400	14-23	6	\$284,700	\$19,900	6	\$0	\$0
2	CC 96357515	VEGA YESID	230301	6	\$360,000	\$57,600	EPS037	6	\$360,000	\$14,400	CCF13	6	\$360,000	\$14,400	14-23	6	\$360,000	\$25,100	6	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$644,700	\$103,200			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$25,800			\$644,700	\$45,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL CARMEN	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2064098522	9496849350	E	2025/12/04	2026/01/06	NEQUI	33	\$204,200

RÉSUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$103,200	\$2,200	\$0	\$105,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$45,600	\$1,000	\$0	\$46,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$57,600	\$1,200	\$0	\$58,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$45,000	\$1,000	\$0	\$46,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$45,000	\$1,000	\$0	\$46,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$25,800	\$600	\$0	\$26,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$25,800	\$600	\$0	\$26,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$25,800	\$600	\$0	\$26,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$11,400	\$300	\$0	\$11,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$14,400	\$300	\$0	\$14,700
TOTAL				2	\$199,800	\$4,400	\$0	\$204,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	1975038574	9495850975	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	\$1,190,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077877363	CALDERON LAURA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
2	CC	1006458912	MORALES YEFERSON																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
3	CC	1117499072	PALOMINO EDWIN	X	X																230301	21	\$996,450	\$159,500	ESSC62	21	\$996,450	\$39,900	CCF13	21	\$996,450	\$39,900	14-23	21	\$996,450	\$69,400	21	\$0	\$0	SI	\$308,700
Total Afiliados(3)																																								\$1,190,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975038574	9495850975	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	\$1,190,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$615,100	\$0	\$0	\$615,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$615,100	\$0	\$0	\$615,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$267,600	\$0	\$0	\$267,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$267,600	\$0	\$0	\$267,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$153,900	\$0	\$0	\$153,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$153,900	\$0	\$0	\$153,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$153,900	\$0	\$0	\$153,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$96,900	\$0	\$0	\$96,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				3	\$1,190,500	\$0	\$0	\$1,190,500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		1109005852					NÚMERO PLANILLA:		1749308159		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		INDEPENDIENTES:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO			MARIANA ESCOBAR LOZANO					MES:		noviembre AÑO:		2025		MES:		noviembre AÑO:	
CIUDAD/PRINCIPIO:		BOGOTÁ			BOGOTÁ					DÍAS DE MORIA:		0		DÍAS DE MORIA:		0		2025	
DIRECCIÓN:		CL 8 N 1-23 CENTENARIO			2000000					FECHA PAGO (año/mes/día):		2025/11/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994842974			
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE			INDEPENDIENTE					FECHA PAGO (año/mes/día):		2025/11/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994842974			
TIPO EMPRESA:		PRIVADA			PRIVADA					FECHA PAGO (año/mes/día):		2025/11/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994842974			
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO			UNICO					FECHA PAGO (año/mes/día):		2025/11/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994842974			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD - SENAT ICBP (REFORMA TRIBUTARIA):		NO			NO					FECHA PAGO (año/mes/día):		2025/11/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994842974			

TOTAL APORTES A PENSION														
CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
						EMP. EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COUPENESIONES			1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:														

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:														

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700
SUBTOTALES:														

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500
SUBTOTALES:														

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRAORDINARIO	EXTRAORDINARIO	EXTRAORDINARIO										
1	CC	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	02	\$ 1.423.500														

TOTAL PAGADO: \$ 469.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	1975017561	9495852088	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	\$557,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0
1	CC 96352639	CALDERON WILLIAM	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	ESSC62	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF13	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975017561	9495852088	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	\$557,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000	
TOTAL				1	\$557,300	\$0	\$0	\$557,300	



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

DICIEMBRE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2007809806	9496420092	I	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	\$1,033,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	\$3,627,008			\$580,400	EPS037	30			\$3,627,008	\$453,400	0		\$0		\$0		\$0
Total Afiliados(1)					\$3,627,008	\$580,400			\$3,627,008	\$453,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	200/809806	9496420092	1	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	\$1,033,800
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$580,400	\$0	\$0	\$580,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$580,400	\$0	\$0	\$580,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$453,400	\$0	\$0	\$453,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$453,400	\$0	\$0	\$453,400
TOTAL				1	\$1,033,800	\$0	\$0	\$1,033,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2007812452	9496420110	N	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	\$88,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0
1	CC 1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	(\$3,627,008)	(\$88,400)	EPS037	30	(\$3,627,008)	(\$453,400)		0	\$0	\$0	14-4	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
2	CC 1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	\$3,627,008	\$88,400	EPS037	30	\$3,627,008	\$453,400		0	\$0	\$0	14-4	30	\$3,627,008	\$88,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$3,627,008	\$88,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	200/812452	9496420110	N	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	\$88,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	
TOTAL				1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL CARMEN	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2026-01	2065837936	9496849363	E	2026/01/07	2026/01/07	NEQUI	\$865,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL CARMEN (2 Afiliados)					\$2,793,700	\$447,000			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$194,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: EL CARMEN (2 Afiliados)					\$2,793,700	\$447,000			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$194,500		\$0	\$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					\$2,793,700	\$447,000			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$194,500		\$0	\$0
1	CC 40077673	LOPEZ LUZ	25-14	26	\$1,233,700	\$197,400	ESSC62	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF13	26	\$1,233,700	\$49,400	14-23	26	\$1,233,700	\$85,900	26	\$0	\$0
2	CC 96352515	VEGA YESID	230301	26	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	26	\$1,560,000	\$62,400	CCF13	26	\$1,560,000	\$62,400	14-23	26	\$1,560,000	\$108,600	26	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$2,793,700	\$447,000			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$111,800			\$2,793,700	\$194,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL CARMEN	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2026-01	2065837936	9496849363	E	2026/01/07	2026/01/07	NEQUI	\$865,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$447,000	\$0	\$0	\$447,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$197,400	\$0	\$0	\$197,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$249,600	\$0	\$0	\$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$194,500	\$0	\$0	\$194,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$194,500	\$0	\$0	\$194,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$111,800	\$0	\$0	\$111,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$111,800	\$0	\$0	\$111,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$111,800	\$0	\$0	\$111,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$49,400	\$0	\$0	\$49,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$62,400	\$0	\$0	\$62,400
TOTAL				2	\$865,100	\$0	\$0	\$865,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV, 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2026-01	2028512888	9496708221	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	\$940,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077877363	CALDERON LAURA	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	EP5037	19	\$901,550	\$36,100	CCF13	19	\$901,550	\$36,100	14-23	19	\$901,550	\$62,800	19	\$0	\$0	SI	\$279,300
2	CC	1006458912	MORALES YEFERSON	X																	230301	19	\$901,550	\$144,300	ESSC62	19	\$901,550	\$36,100	CCF13	19	\$901,550	\$36,100	14-23	19	\$901,550	\$62,800	19	\$0	\$0	SI	\$279,300
3	CC	1117499072	PALOMINO EDWIN	X																	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	ESSC62	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF13	26	\$1,233,700	\$49,400	14-23	26	\$1,233,700	\$85,900	26	\$0	\$0	SI	\$382,100
Total Afiliados(3)																							\$3,036,800	\$486,000			\$3,036,800	\$121,600			\$3,036,800	\$121,600			\$3,036,800	\$211,500		\$0	\$0		\$940,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2028512888	9496708221	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	0	\$940,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$486,000	\$0	\$0	\$486,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$486,000	\$0	\$0	\$486,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$211,500	\$0	\$0	\$211,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$211,500	\$0	\$0	\$211,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$121,600	\$0	\$0	\$121,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$121,600	\$0	\$0	\$121,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$121,600	\$0	\$0	\$121,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$85,500	\$0	\$0	\$85,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,100	\$0	\$0	\$36,100
TOTAL				3	\$940,700	\$0	\$0	\$940,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIUDAD/PAÍS/REGIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO	1199005852	NÚMERO PLANILLA:	4635888195	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES	2025
DIRECCIÓN:	CALLE	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ	2500000	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2025	
TIPO APORTANTE:	09-INDEPENDIENTE	TELÉFONO:			DÍAS DE MORA:	0			
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999207865	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD - SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO						

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA			No.	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNA/D		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO		NOMBRE	COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANCHILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041		NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTAL:					\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA		VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0			\$ 99,100	\$ 99,100	\$ 0	\$ 0	\$ 99,100
SUBTOTAL:				\$ 0		\$ 0		\$ 99,100	\$ 99,100	\$ 0	\$ 0	\$ 99,100

CODIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COZIZANTES	APORTES	TOTALES		VALOR PAGADO
00448	00448-COMPATOLIMA			1	\$ 28.500	\$ 0		\$ 28.500
SUBTOTAL:					\$ 28.500	\$ 0		\$ 28.500

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 533.400
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2026-01	2028503114	9496709901	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	\$557,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0	
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0	
1	CC	96352639	CALDERON WILLIAM	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	ESSC62	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF13	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$72,000			\$1,800,000	\$125,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2026-01	2028503114	9496709901	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	\$557,300

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
TOTAL				1	\$557,300	\$0	\$0	\$557,300



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6.5 Certificación de paz y salvo por pago de seguridad social y parafiscales

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
NIT: 901.209.615-7



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADOR PÚBLICO DE
ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
NIT: 901.209.615-7

CERTIFICA QUE:

Que, la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIO S.A.S**, identificado bajo el NIT No. 901.209.615-7, se encuentra obligada a cumplir con los pagos al SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; y que a la fecha la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIO S.A.S**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

En constancia, se firma en El Doncello - Caquetá, a los Seis días del mes de febrero de 2026.


WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. No. 96.352.639 de El Doncello - Caquetá
R.L ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S


JHOLIAN A. VILLARREAL CRUZ
C.C. No. 17.784.323 de El Doncello - Caquetá
CONTADOR PÚBLICO
T.P No. 189865-T

Anexo: T.P. Certificado de la Junta de Contadores y Cedula de Ciudadanía.

Tv. 1ª No. 4-86 Barrio Abas Turbay
El Doncello - Caquetá

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189865-T

JHOLIAN ALBERTO
VILLARREAL CRUZ
C.C. 17784323
RESOLUCION INSCRIPCION 287
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA



FECHA 14/05/2014

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

200793



190696

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0651F1905B9EFC63

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHOLIAN ALBERTO VILLARREAL CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17784323 de EL DONCELLO (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 189865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

30

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
FOLIO DE CIUDADANIA

17.784.323

VILLARREAL CRUZ

JHOLIAN ALBERTO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1985

EL DONCELLO
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

01-SEP-2003 EL DONCELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-4400500-01083373-M-0017784323-20190711

0066289603A 2

51630347



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6.6 Justificación de gastos de Administración

Los gastos de administración para el contrato en referencia, se encuentran soportados dentro del mismo informe final, toda vez que el 98.25% de los gastos de administración cuantificados en el discriminado a continuación, corresponden a los impuestos municipales (estampillas) para los contratos de obra y son de estricto cumplimiento, por ende son retenidos por el municipio antes de cualquier tipo de pago al contratista, mientras que el 1.75% restante corresponde a salarios del equipo mínimo requerido, donde dicho salario se justifica con el pago de seguridad social, por los días que se estuvo desarrollando la obra, y otros gastos que se soportan con los respectivos pagos, anexos seguidamente.

COSTO DIRECTO TOTAL							\$ 47.522.119,23		
	DESCRIPCION	UND	CANT	% DE PART.	F.P	VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
1	PERSONAL DE OBRA								
1,1	Maestro de obra	mes	1,0	100%	138,36%	100.000	1,50	207.541	Se soporta con la seguridad social del personal. Ver cap. 6.4
TOTAL PERSONAL DE OBRA								207.541	
2	OTROS - GASTOS GENERALES								
2,1	Estampillas y descuentos								
2.1.1	Pro-universidad	%	0,5%			61.778.755	1	308.894	Gastos que son descontados por la entidad contratante y son debitados al momento de los pagos
2.1.2	Pro-Cultura	%	2,0%			61.778.755	1	1.235.575	
2.1.3	Pro-Ancianato	%	4,0%			61.778.755	1	2.471.150	
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e Imder	%	1,5%			61.778.755	1	926.681	
2.1.5	Pro Electrificación	%	1,0%			61.778.755	1	617.788	
2.1.6	Pro Deporte	%	2,5%			61.778.755	1	1.544.469	
2.1.7	Pro Justicia	%	2,0%			61.778.755	1	1.235.575	
2.1.8	Fondo de Seguridad	%	5,0%			61.778.755	1	3.089.938	
2.1.9	Polizas	%	0,4%			61.778.755	1	243.919	Las pólizas se encuentran en el expediente contractual, donde se puede evidenciar los gastos acarreados
TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:								11.672.989	



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

	TOTAL ADMINISTRACION					25,00%		11.880.529,81
	IMPREVISTOS					0%		0
	UTILIDAD					5%		2.376.105,96
	TOTAL AIU					30%		14.256.635,77

6.7 Justificación de gastos de Factor Prestacional

Este gasto corresponde a los costos laborales con respecto a las leyes laborales, que establecen beneficios adicionales para los trabajadores más allá del salario básico. Este factor representa un coeficiente que incluye los costos asociados a las prestaciones sociales, beneficios legales y otros conceptos laborales obligatorios que el empleador debe pagar por cada trabajador, en este orden de ideas solo un empleado está afectado por el factor prestacional, lo cual es el caso del **MAESTRO DE OBRA**, quien se encuentra bajo la nómina de la empresa y acarrea un costo de prestaciones sociales que deben ser asumidas por Alwil Global Servicios S.A.S, esto se puede verificar con el pago de la seguridad social en capítulo 6.4.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

7.1 Relación de pagos

El contrato de obra en su cláusula quinta, menciona que el valor del contrato corresponde a SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$61.778.755.00) M/CTE M/cte, y en la cláusula octava, se evidencia la forma de pago, donde se indica que hará un anticipo del 50% del valor total del contrato, al cual como contratista renuncie mediante oficio radicado a la supervisión el día 28 de noviembre de 2025, esta misma cláusula menciona que posteriormente se harán pagos parciales y un pago final; de esta manera se presenta un solo cobro final, por el valor total del contrato, toda vez que se dio cumplimiento al contrato de obra en un 100%.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuarenta y cinco (45) días
VALOR INICIAL	\$61.778.755
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR ADICION	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 61.778.755
Valor Acta Final	\$ 61.778.755
Valor a amortizar en el acta final	\$ 0.00
Valor a pagar Acta Final	\$ 61.778.755
Avance Ejecutado acumulado Porcentual en valor total	100%
Saldo a favor del municipio	\$0.00



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

7.2 Factura

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e82ac3bf9c1cc40da2c8cd07c2dda91a0577e31410575ad387b76dc51dc6c1887f77895b8b84c48d187fe0e8cecf0907

Número de Factura: FE-37
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.
Nombre Comercial: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901209615
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: El Doncello
Dirección: CR 4 6 08
Teléfono / Móvil: 3124219611
Correo: alwil197101@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO EL DONCELLO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095760
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: El Doncello
Dirección: CRA. 4 CLL. 3 ESQ.
Teléfono / Móvil: 4310609
Correo: hacienda@eldoncello-caqueta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	027	COSTOS DIRECTOS	WSD	1,00	\$ 47.522.119,23	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 47.522.119,23
2	028	ADMINISTRACION 25%	WSD	1,00	\$ 11.880.529,81	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.880.529,81
3	029	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$ 2.376.105,96	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.376.105,96

Notas Finales

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-2025-008, PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-2025-014, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ."

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2025 17:38:43
Documento validado por la
DIAN:
30/12/2025 17:38:43
**XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN**
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	61778755
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	61778755
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	61778755
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 61778755

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	61.778.755,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	61.778.755,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	61.778.755,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 61.778.755,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103384110 Rango desde: 35 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-19



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

7.3 Certificado de cuenta bancaria

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ALWIL GLOBAL SERVICIOS SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9012096157 de EL DONCELLO, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-752-00-08354-5, fecha de apertura: 10/07/2025.

Se expide en EL DONCELLO, a los siete (07) días del mes de octubre de 2025, con destino a: AL INTERESADO





ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

8. INFORME JURIDICO

El contrato de obra No COP-2025-008, fue producto del proceso de selección abreviada de menor cuantía No SAMC-2025-014, el cual se abrió mediante resolución No 0622 del 31 de octubre de 2025, y se adjudicó el 18 de noviembre de 2025 mediante resolución No 0672, y de esa manera se firma el contrato de obra en mención el día 19 de noviembre de 2025.

Dicho contrato tuvo fecha de inicio el día 25 de noviembre de 2025, cuando el contratista dio cumplimiento con las garantías exigidas en la minuta y los requisitos pre obra.

FECHA DEL CONTRATO	19 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	25 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	24 de diciembre de 2025

8.1 Amparos del contrato

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA – CONTRATO (ANEXO 0 y 1)

Estas garantías corresponden al anexo cero, son las primeras pólizas que emite la aseguradora a un tomador, que para este caso es la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S, y da como beneficiario al Municipio de El Doncello, allí se ven reflejados todos los amparos requeridos por la parte contratante para así poder dar inicio a la ejecución del contrato, es importante mencionar que para este contrato se tienen dos pólizas, la de cumplimiento y la de responsabilidad civil extracontractual.

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADOR	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	18/11/2025	30/06/2026	\$ 12.355.751,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	18/11/2025	30/06/2026	\$ 30.889.377,50
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	18/11/2025	30/12/2028	\$ 6.177.875,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	31/12/2025	31/12/2030	\$ 12.355.751,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011952	18/11/2025	31/12/2025	\$ 427.050.000,00



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICO (ANEXO 2 y 3)

El anexo actual de las pólizas, corresponde a la modificación que se realiza a las fechas de los amparos, toda vez que estas fueron expedidas con la fecha del contrato de obra, pero la ejecución del mismo se inició días después cuando se dan cumplimiento a trámites administrativos y legales, por esta razón, los plazos deben ser ajustados a la fecha real de iniciación. Por esta razón se actualizan las pólizas, adicional es importante mencionar que los anexos anteriores a este, corresponde a las devoluciones o retracciones de los amparos de manera negativa, para posteriormente en el anexo actual, poder ajustar a las fechas del acta de inicio.

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADOR	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	25/11/2025	7/07/2026	\$ 12.355.751,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	25/11/2025	7/07/2026	\$ 30.889.377,50
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	25/11/2025	06/01/2029	\$ 6.177.875,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	07/01/2026	07/01/2031	\$ 12.355.751,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011952	18/11/2025	07/01/2026	\$ 427.050.000,00

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA – ACTA DE TERMINACION (ANEXO 3)

Toda obra civil estatal, debe presentar una garantía, por lo tanto, al finalizar la obra se debe generar la actualización para que el tiempo de estabilidad y calidad de la obra inicie, para este caso, el tiempo de estabilidad es de cinco años a partir de recibo final de la obra, mientras que la póliza de responsabilidad civil extracontractual no se debe actualizar.

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADOR	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	25/11/2025	7/07/2026	\$ 12.355.751,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	25/11/2025	7/07/2026	\$ 30.889.377,50
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	25/11/2025	06/01/2029	\$ 6.177.875,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100062959	24/12/2025	24/12/2030	\$ 12.355.751,00



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

8.2 Registro Único Tributario (RUT)

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 14931323248			
		 (415)7707212489984(8020) 000001493132324 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 0 9 6 1 5 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Florencia	
				14. Buzón electrónico 2 8	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio					
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres					
35. Razón social ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Caquetá		40. Ciudad/Municipio El Doncello	
41. Dirección principal CR 4 6 08		42. Correo electrónico alwill197101@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1		3 1 2 4 2 1 9 6 1 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
52. Número establecimientos					
4 1 1 2		2 0 2 0 0 2 0 7		4 2 2 0	
2 0 2 0 0 2 0 7		0 8 9 9 0 8 1 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI ☐ NO ☒					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 09 : 19: 44					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre CALDERON PEREZ WILLIAM					
985. Cargo Representante legal Certificado					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14931323248



(415)7707212489984(8020) 000001493132324 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 0 9 6 1 5 7

Impuestos y Aduanas de Florencia

2 8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 0 1	2	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 8 0 5 1 5	2 0 1 9 1 1 2 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 8 3 1	2 0 1 9 1 2 0 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 1 0 6 2 8 4	1 0 6 2 8 4	
78. Departamento	1 8	1 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 1	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 8 0 8 3 1		
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 0 7		-
2	4 9	2 0 2 0 0 2 0 7		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
HINCAPIE ALVAREZ JAIME ALBERTO			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14931323248



(415)7707212489984(8020) 000001493132324 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Florencia

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 0 9 6 1 5 7

2 8

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 9 1 2 0 3

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadani

1 3

9 6 3 5 2 6 3 9

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

CALDERON

PEREZ

WILLIAM

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9. INFORME TECNICO

- Durante el desarrollo de la obra se ha velado por el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas de construcción que rigen el proyecto, en cuanto a procedimientos y a calidad de los materiales utilizados.
- El personal conto con los elementos de protección personal durante toda la obra.
- Realizando una comparación entre lo ejecutado vs lo programado, el contrato presenta un equilibrio en cuanto al tiempo de ejecución, toda vez que fue ejecutado en el plazo establecido, adicional a esto se anexa el acta final con las respectivas memorias de cantidades como constancia de la ejecución total del contrato de obra.

ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante la ejecución del contrato se dio la importancia necesaria al tema ambiental, con respecto principalmente a la correcta utilización del agua y la debida solicitud de permiso ante la autoridad competente respecto a tala de árboles en obra en caso de ser necesario, no obstante, para la obra en mención no fue necesario. De acuerdo a lo establecido con el personal en obra, se mantiene el lugar limpio.

En cuanto a la seguridad industrial, se hace un control periódico a los elementos de protección y seguridad de todos los trabajadores que se encuentran en la obra, tal como se puede evidenciar en el informe SST presentado por el profesional.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se exige al ingreso del trabajador a la obra afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales.

CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA

En el presente capítulo se presenta el resumen de todos los aspectos inherentes a la labor de obra ejecutada por la ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

GENERALIDADES DEL SERVICIO DE OBRA

La firma de obra dentro de sus funciones desarrolla el contrato de obra No. COP-2025-008. En este capítulo se presenta el resumen de todas las actividades realizadas:

ACTIVIDADES BÁSICAS

El contratista de obra ha proporcionado desde el inicio del Contrato los recursos necesarios para desarrollar las obligaciones según el Contrato. Estos recursos son:

- ✓ Personal mínimo requerido
- ✓ Personal no calificado
- ✓ Equipos
- ✓ Herramienta menor
- ✓ Elaboración de Informe
- ✓ Acta Final de obra
- ✓ Informe SST

CONTROL TÉCNICO REALIZADO EN LA OBRA

Se revisa continuamente la ejecución de las obras, localización, chequeo de calidad de materiales, recomendación y toma de decisiones en obra.

Además, velamos por el cumplimiento del contrato de acuerdo con especificaciones técnicas, estudios, cálculos y diseños, de igual forma para que cumpliéndose los requisitos técnicos y normas pertinentes, se empleen los materiales y sistemas constructivos previamente especificados o aquellos que cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía adecuada y necesaria, dentro del plazo establecido para el contrato.

Informe de obra correspondiente a las actividades ejecutadas en el periodo entre el 25 de noviembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025, realizado por:

R.L. WILLIAM CALDERON PEREZ
ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.1 Acta Final



Libertad y Orden

ACTA FINAL DE OBRA



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	DD	25	MM	3	AA	2026
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7	ACTA	FINAL					
No. CONTRATO	COP-2025-008		ELABORO	WILLIAM CALDERON PEREZ					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ								
VALOR DEL CONTRATO	\$	61,778,755	VALOR PRESENTE ACTA FINAL No 1	\$	61,778,755.00		PORCENTAJE	100.00%	

CONDICIONES INICIALES						ACTA ANTERIOR		ACTA FINAL No 1		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO	ML	35.04	\$ 15,550.00	\$ 544,872.00	0.00	\$ -	35.04	\$ 544,872.00	0.00	\$ -
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	3.6	\$ 37,800.00	\$ 136,080.00	0.00	\$ -	3.60	\$ 136,080.00	0.00	\$ -
1.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0.61	\$ 38,000.00	\$ 23,180.00	0.00	\$ -	0.61	\$ 23,180.00	0.00	\$ -
2	ESTRUCTURAL										
2.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0.38	\$ 524,450.00	\$ 199,291.00	0.00	\$ -	0.38	\$ 199,291.00	0.00	\$ -
2.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	458.83	\$ 9,800.00	\$ 4,496,534.00	0.00	\$ -	458.83	\$ 4,496,534.00	0.00	\$ -
2.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS,ZAPATAS, COLUMNAS	M3	4.33	\$ 884,300.00	\$ 3,829,019.00	0.00	\$ -	4.33	\$ 3,829,019.00	0.00	\$ -
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA	ML	24	\$ 278,750.00	\$ 6,690,000.00	0.00	\$ -	24.00	\$ 6,690,000.00	0.00	\$ -
3	MAMPOSTERIA										
3.1	MURO EN BLOQUE FAROL NO 6 LISO A LA VISTA LAS 1 CARAS 0,30 X 0,20 X 0,10	M2	50.78	\$ 160,050.00	\$ 8,127,339.00	0.00	\$ -	50.78	\$ 8,127,339.00	0.00	\$ -
3.2	MORTERO 1:4	M3	0.63	\$ 515,200.00	\$ 324,576.00	0.00	\$ -	0.63	\$ 324,576.00	0.00	\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	61.57	\$ 18,800.00	\$ 1,157,516.00	0.00	\$ -	61.57	\$ 1,157,516.00	0.00	\$ -
3,3,1	PAÑETE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	67.79	\$ 68,500.00	\$ 4,643,615.00	0.00	\$ -	67.79	\$ 4,643,615.00	0.00	\$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCALAR (INC BLANQUEO Y LIJADO)	M2	67.79	\$ 182,400.00	\$ 12,364,896.00	0.00	\$ -	67.79	\$ 12,364,896.00	0.00	\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA	M2	67.79	\$ 45,000.00	\$ 3,050,550.00	0.00	\$ -	67.79	\$ 3,050,550.00	0.00	\$ -
4	ACOMETIDA ELETRICA										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELETRICA INTERNA	UND	1	\$ 1,677,650.00	\$ 1,677,650.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,677,650.00	0.00	\$ -
5	PISOS Y ACABADOS INTERIORES										
5.1	ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 ALTURA PROMEDIO 0,05 M	M2	56.29	\$ 49,600.00	\$ 2,791,984.00	0.00	\$ -	56.29	\$ 2,791,984.00	0.00	\$ -
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA TRAFICO 5, INCLUYE PEGANTE CON LATEX, FRAGUE Y CERAMICA	M2	56.29	\$ 110,200.00	\$ 6,203,158.00	0.00	\$ -	56.29	\$ 6,203,158.00	0.00	\$ -
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA INCLUYE PEGANTE CON LATEX Y FRAGUE	ML	31.1	\$ 57,950.00	\$ 1,802,245.00	0.00	\$ -	31.10	\$ 1,802,245.00	0.00	\$ -



Libertad y Orden

ACTA FINAL DE OBRA



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA		DD	25	MM	3	AA	2026						
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7	ACTA		FINAL											
No. CONTRATO		COP-2025-008		ELABORO		WILLIAM CALDERON PEREZ											
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ															
VALOR DEL CONTRATO		\$	61,778,755	VALOR PRESENTE ACTA FINAL No 1		\$	61,778,755.00		PORCENTAJE	100.00%							
6	CARPINTERÍA Y HERRERÍA																
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS METALICAS 1,20X1,20 M CON REJILLA	UND	4	\$	601,250.00	\$	2,405,000.00	0.00	\$	-	4.00	\$	2,405,000.00	0.00	\$		
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 120X200	UND	1.00	\$	1,082,750.00	\$	1,082,750.00	0.00	\$	-	1.00	\$	1,082,750.00	0.00	\$		
7	ASEO GENERAL	GBL	1	\$	228,500.00	\$	228,500.00	0.00	\$	-	1.00	\$	228,500.00	0.00	\$		
				VALOR TOTAL		\$	61,778,755.00		\$	-		\$	61,778,755.00		\$	-	
				ADMINISTRACION		25%	\$	11,880,530.00		\$	-		\$	11,880,530.00		\$	-
				IMPREVISTOS		0%	\$	-		\$	-		\$	-		\$	-
				UTILIDAD		5%	\$	2,376,106.00		\$	-		\$	2,376,106.00		\$	-
				VALOR AIU		\$	14,256,636.00		\$	-		\$	14,256,636.00		\$	-	
				COSTO DIRECTO		\$	47,522,119.00		\$	-		\$	47,522,119.00		\$	-	
				COSTO TOTAL DE OBRA		\$	61,778,755.00		\$	-		\$	61,778,755.00		\$	-	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 61,778,755
VALOR PRESENTA ACTA FINAL	\$ 61,778,755
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	\$ 61,778,755
PORCENTAJE AVANCE	100.00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (AJUSTE AL PESO)	\$ -

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ

R-L ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

ORDENADOR DEL GASTO
JAI R DIAZ DIAZ

ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TICs

APOYO PROFESIONAL
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ

APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.2 Memorias de Cantidades – Pre Actas Finales



ACTA FINAL DE OBRA



CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	DD	24	MM	12	AA	2025
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7	ACTA	FINAL					
No. CONTRATO	COP-2025-008		ELABORO	WILLIAM CALDERON PEREZ					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ								
VALOR DEL CONTRATO	\$ 61.778.755	VALOR PRESENTE ACTA FINAL No 1	\$	61.778.755,00			PORCENTAJE	100,00%	

CONDICIONES INICIALES						ACTA ANTERIOR		ACTA FINAL No 1		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO	ML	35,04	\$ 15.550,00	\$ 544.872,00	0,00	\$ -	35,04	\$ 544.872,00	0,00	\$ -
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	3,6	\$ 37.800,00	\$ 136.080,00	0,00	\$ -	3,60	\$ 136.080,00	0,00	\$ -
1,3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0,61	\$ 38.000,00	\$ 23.180,00	0,00	\$ -	0,61	\$ 23.180,00	0,00	\$ -
2	ESTRUCTURAL										
2,1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,38	\$ 524.450,00	\$ 199.291,00	0,00	\$ -	0,38	\$ 199.291,00	0,00	\$ -
2,2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	458,83	\$ 9.800,00	\$ 4.496.534,00	0,00	\$ -	458,83	\$ 4.496.534,00	0,00	\$ -
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS,ZAPATAS, COLUMNAS	M3	4,33	\$ 884.300,00	\$ 3.829.019,00	0,00	\$ -	4,33	\$ 3.829.019,00	0,00	\$ -
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA	ML	24	\$ 278.750,00	\$ 6.690.000,00	0,00	\$ -	24,00	\$ 6.690.000,00	0,00	\$ -
3	MAMPOSTERIA										
3,1	MURO EN BLOQUE FAROL NO 6 LISO A LA VISTA LAS 1 CARAS 0,30 X 0,20 X 0,10	M2	50,78	\$ 160.050,00	\$ 8.127.339,00	0,00	\$ -	50,78	\$ 8.127.339,00	0,00	\$ -
3,2	MORTERO 1:4	M3	0,63	\$ 515.200,00	\$ 324.576,00	0,00	\$ -	0,63	\$ 324.576,00	0,00	\$ -
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	61,57	\$ 18.800,00	\$ 1.157.516,00	0,00	\$ -	61,57	\$ 1.157.516,00	0,00	\$ -
3,3,1	PAÑETE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	67,79	\$ 68.500,00	\$ 4.643.615,00	0,00	\$ -	67,79	\$ 4.643.615,00	0,00	\$ -
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCALAR (INC BLANQUEO Y LUJADO)	M2	67,79	\$ 182.400,00	\$ 12.364.896,00	0,00	\$ -	67,79	\$ 12.364.896,00	0,00	\$ -
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA	M2	67,79	\$ 45.000,00	\$ 3.050.550,00	0,00	\$ -	67,79	\$ 3.050.550,00	0,00	\$ -
4	ACOMETIDA ELETRICA										
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELETRICA INTERNA	UND	1	\$ 1.677.650,00	\$ 1.677.650,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.677.650,00	0,00	\$ -
5	PISOS Y ACABADOS INTERIORES										
5,1	ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 ALTURA PROMEDIO 0,05 M	M2	56,29	\$ 49.600,00	\$ 2.791.984,00	0,00	\$ -	56,29	\$ 2.791.984,00	0,00	\$ -
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA TRAFICO 5, INCLUYE PEGANTE CON LATEX, FRAGUE Y CERAMICA	M2	56,29	\$ 110.200,00	\$ 6.203.158,00	0,00	\$ -	56,29	\$ 6.203.158,00	0,00	\$ -
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA INCLUYE PEGANTE CON LATEX Y FRAGUE	M2	31,1	\$ 57.950,00	\$ 1.802.245,00	0,00	\$ -	31,10	\$ 1.802.245,00	0,00	\$ -



ACTA FINAL DE OBRA



CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA		DD	24	MM	12	AA	2025
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7	ACTA		FINAL					
No. CONTRATO		COP-2025-008		ELABORO		WILLIAM CALDERON PEREZ					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ									
VALOR DEL CONTRATO		\$	61.778.755	VALOR PRESENTE ACTA FINAL No 1		\$	61.778.755,00			PORCENTAJE	100,00%
6	CARPINTERÍA Y HERRERÍA										
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS METALICAS 1,20X1,20 M CON REJILLA	UND	4	\$ 601.250,00	\$ 2.405.000,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.405.000,00	0,00	\$ -
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 120X200	UND	1,00	\$ 1.082.750,00	\$ 1.082.750,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.082.750,00	0,00	\$ -
7	ASEO GENERAL	GBL	1	\$ 228.500,00	\$ 228.500,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 228.500,00	0,00	\$ -
VALOR TOTAL				\$	61.778.755,00	\$	-	\$	61.778.755,00	\$	-
ADMINISTRACION				25%	\$ 11.880.530,00	\$	-	\$	11.880.530,00	\$	-
IMPREVISTOS				0%	\$ -	\$	-	\$	-	\$	-
UTILIDAD				5%	\$ 2.376.106,00	\$	-	\$	2.376.106,00	\$	-
VALOR AIU				\$	14.256.636,00	\$	-	\$	14.256.636,00	\$	-
COSTO DIRECTO				\$	47.522.119,00	\$	-	\$	47.522.119,00	\$	-
COSTO TOTAL DE OBRA				\$	61.778.755,00	\$	-	\$	61.778.755,00	\$	-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	61.778.755
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$	61.778.755
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	\$	61.778.755
PORCENTAJE AVANCE		100,00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (AJUSTE AL PESO)	\$	-

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ

R-L ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

ORDENADOR DEL GASTO
FRANKLIN DIAZ ALBA

ALCALDE MUNICIPAL (E)

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

SECRETARIO DE PLANTACIÓN



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

ITEM	1.2	CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL	UNID.	M3
------	-----	----------	--------------	------	-------------------	-------	----

[illegible]

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL

  LIBERTAD Y ORDEN MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES  ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S													
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO			FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO						
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S			NIT		901.209.615-7						
No. CONTRATO		COP-2025-008			VERSION		HOJA 1 DE 1						
FECHA		DD	25	MM	3	AA	2026	CORTE N° FINAL					
						ELABORÓ		WILLIAM CALDERON PEREZ					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO											
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO			NIT O C.C.		800.095.760-9		CONTRATO N°				
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S			NIT O C.C.		901.209.615-7		CONTRATO N°				
SUPERVISOR		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO			Secretaría de Planeación Municipal y de las TIC								
ITEM	2.2	CAPÍTULO	ESTRUCTURAL		ITEM	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa		UNID.	KG				
 		Localización PESO No Elementos Longitud No Elem. Medida Total		ACERO ZAPATA V	0.56	9.00	0.55	2.00	5.5440				
				ACERO ZAPATA H	0.56	9.00	0.55	2.00	5.5440				
				COLUMNA TIPO A V	0.56	4.00	3.85	2.00	17.2480				
				COLUMNA TIPO A H	0.56	37.00	0.64	2.00	26.5216				
				VIGA V CIMENTACION	0.56	310.00	1.2	1.00	208.3200				
				VIGA H CIMENTACION	0.56	4.00	31.13	1.00	69.7312				
				TRASLAPE VIGAS H CIMENTACION	0.56	4.00	0.8	4.00	7.1680				
				VIGA V AEREA	0.25	310.00	0.54	1.00	41.8500				
				VIGA H AEREA	0.56	4.00	31.13	1.00	69.7312				
				TRASLAPE VIGAS H	0.56	4.00	0.8	4.00	7.1680				
									0.0				
									0.0				
									0.0				
									0.0				
									0.0				
									0.0				
									0.0				
									0.0				
				OBSERVACIONES:						Subtotal		458.826	
										Vienen		0.00	
						TOTAL		458.83					
 WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		 KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR		 ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL									

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES							
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT		901.209.615-7			
No. CONTRATO		COP-2025-008		VERSIÓN					
				HOJA		1 DE 1			
FECHA		DD	25	MM	3	AA	2026		
		CORTE N°		FINAL		ELABORÓ WILLIAM CALDERON PEREZ			
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO							
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		NIT O C.C.		800.095.760-9			
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT O C.C.		901.209.615-7			
SUPERVISOR		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO		CONTRATO N°		COP-2025-008			
				CONTRATO N°		COP-2025-008			
				Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC					
ITEM	2.3	CAPÍTULO	ESTRUCTURAL	ITEM	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS,ZAPATAS, COLUMNAS				
				UNID.	M3				
		Localización			Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					LARGO	ANCHO	ALTO		
		ZAPATA			0.70	0.70	0.35	2	0.34
		COLUMNA TIPO A			0.20	0.20	3.10	2	0.25
		VIGA			31.13	0.30	0.30	1	2.80
		VIGA AEREA			31.13	0.15	0.20	1	0.9
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
					Subtotal				4.33
					Vienen				0.00
			TOTAL				4.33		
OBSERVACIONES:									
 WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S			 KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR			 ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL			



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

 WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALLWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	 KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR	 ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL
--	---	---



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S				NIT		901.209.615-7															
No. CONTRATO		COP-2025-008				VERSIÓN		HOJA		1	DE	1											
FECHA		DD	25	MM	3	AA	2026	CORTE N°		FINAL		ELABORÓ		WILLIAM CALDERON PEREZ									
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO																					
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO				NIT O C.C.		800.095.760-9		CONTRATO N°		COP-2025-008											
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S				NIT O C.C.		901.209.615-7		CONTRATO N°		COP-2025-008											
SUPERVISOR		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO				Secretaría de Planeación Municipal y de las TIC																	
ITEM	3.1	CAPÍTULO	MAMPOSTERIA			ITEM	MURO EN BLOQUE FAROL NO 6 LISO A LA VISTA LAS 1 CARAS 0,30 X 0,20 X 0,10				UNID.	M2											
										Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total							
										LARGO		ANCHO		ALTO									
										L DE 2m		31.13		1		2.2				1		68.486	
										DESCUENTO VENTANAS		1.2		1		1.2				-4		-5.760	
										DESCUENTO COLUMNAS		0.3		1		2.65				-6		-4.770	
										DESCUENTO PEGA ENTRE LADRILLOS (9%)												-5.023	
										DESCUENTO PUERTAS		1		1		2.15				-1		-2.150	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
																						0.0	
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											
												0.0											

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES					
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT		901.209.615-7	
No. CONTRATO		COP-2025-008		VERSIÓN		HOJA 1 DE 1	
FECHA		DD	25	MM	3	AA	2026
		CORTE N°		FINAL		ELABORÓ WILLIAM CALDERON PEREZ	
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO					
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		NIT O C.C.		800.095.760-9	CONTRATO N° COP-2025-008
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT O C.C.		901.209.615-7	CONTRATO N° COP-2025-008
SUPERVISOR		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO		Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			
ITEM	3.2	CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	MORTERO 1:4	UNID.	M3
		Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		PEGA ENTRE LADRILLOS V	0.2	0.1	0.025	846.39	0.4
		PEGA ENTRE LADRILLOSH	0.3	0.1	0.025	846.39	0.63
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
		Subtotal					1.06
		Vienen					0.00
TOTAL					1.06		
OBSERVACIONES:							
WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL							



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES



CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
CONTRATISTA		ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT		901.209.615-7				
No. CONTRATO		COP-2025-008	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	
FECHA	DD	25	MM	3	AA	2026	CORTE N° FINAL ELABORÓ WILLIAM CALDERON PEREZ		
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO							
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.		800.095.760-9	CONTRATO N°		COP-2025-008	
CONTRATISTA		ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.		901.209.615-7	CONTRATO N°		COP-2025-008	
SUPERVISOR		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Secretaría de Planeación Municipal y de las TIC						
ITEM	3.3	CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZADO 1:4	UNID.	M2		
		Localización		Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
		Ancho	Alto	Longitud					
		PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	2.20		31.13				68.49
		DESCUENTO COLUMNAS Y VENTANAS	2.00		3.46		-1.00		-6.9
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
OBSERVACIONES:							Subtotal	61.57	
							Vienen	0.00	
							TOTAL	61.57	
		WILLIAM CALDERON PEREZ				KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO			
R-L ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		SUPERVISOR		APOYO PROFESIONAL					



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

 WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALLWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	 KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR	 ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL
--	---	---



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

 WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALLWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	 KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR	 ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL
--	---	---

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES							
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT		901.209.615-7			
No. CONTRATO		COP-2025-008		VERSIÓN		HOJA 1 DE 1			
FECHA DD 25 MM 3 AA 2026		CORTE N° FINAL		ELABORÓ WILLIAM CALDERON PEREZ					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO							
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		NIT O C.C.		800.095.760-9			
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT O C.C.		901.209.615-7			
SUPERVISOR		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO		CONTRATO N°		COP-2025-008			
				CONTRATO N°		COP-2025-008			
				Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC					
ITEM	3.5	CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA	UNID.	M2		
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				MURO INTERIOR	2.20		30.814		67.79
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
				OBSERVACIONES:				Subtotal	
Vienen			0.00						
TOTAL			67.79						
WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR		ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL					



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

 WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALLWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	 KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR	 ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL
--	---	---



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES							
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT		901.209.615-7			
No. CONTRATO		COP-2025-008		VERSIÓN		HOJA 1 DE 1			
FECHA DD 25 MM 3 AA 2026		CORTE N° FINAL		ELABORÓ WILLIAM CALDERON PEREZ					
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO							
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO		NIT O C.C.		800.095.760-9			
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S		NIT O C.C.		901.209.615-7			
SUPERVISOR		KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO		CONTRATO N°		COP-2025-008			
				CONTRATO N°		COP-2025-008			
				Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC					
ITEM	5.2	CAPÍTULO	PISOS Y ACABADOS INTERIORES	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA TRAFICO 5, INCLUYE PEGANTE CON LATEX, FRAGUE Y CERAMICA				
				UNID.	M2				
				Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
					Ancho	Alto	Longitud		
				PISO AULA DE CLASE	9.79		5.75		56.29
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
				Subtotal					56.29
				Vienen					0.00
TOTAL					56.29				
OBSERVACIONES:									
WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL									



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

 WILLIAM CALDERON PEREZ R-L ALLWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	 KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO SUPERVISOR	 ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ APOYO PROFESIONAL
--	---	---



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES



CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7			
No. CONTRATO	COP-2025-008	VERSIÓN		HOJA	1	DE 1

FECHA	DD	25	MM	3	AA	2026	CORTE N°	FINAL	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ
--------------	-----------	----	-----------	---	-----------	------	-----------------	-------	----------------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-008
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-008
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO		Secretaría de Planeación Municipal y de las TIC		

ITEM	6.2	CAPÍTULO	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 120X200	UNID.	UND				
 						Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
							Ancho	Alto	Longitud		
						PUERTAS				1.00	1.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0
						Subtotal					1.00
Vienen					0.00						
TOTAL					1.00						

OBSERVACIONES:


WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S


KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR


ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S.

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO PROFESIONAL



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.3 Informe SISO



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

INFORME
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

25 DE NOVIEMBRE – 24 DICIEMBRE 2025

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE OBRA: COP-2025-008

**OBJETO: “MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL
CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ”**

DONCELLO - CAQUETÁ
DICIEMBRE 2025



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	4
2.1.	Objetivo General	4
2.2.	Objetivos Específicos	4
3.	ALCANCE	5
4.	DATOS GENERALES DE LA OBRA	5
4.1.	Relación Personal Vinculado en la Obra	5
4.2.	Herramientas y Equipos	6
5.	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SST	7
5.1.	Conformación del Grupo de Gestión SST	7
5.2.	Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	8
5.3.	Elementos de Protección Personal	8
5.4.	Acciones de Prevención y Control para Intervenir Peligro	12
5.5.	Novedades de Reporte de Accidentes Laborales	12
5.6.	Punto de Hidratación	13
6.	ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	13
6.1.	Contactos de emergencia	14
6.2.	Verificación e inspección de herramienta y equipo	15
7.	SEGURIDAD SOCIAL	15
8.	ANEXOS PRESENTADOS EN EL INFORME SST CONTRATISTA	16



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la gestión desarrollada durante el período correspondiente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Las actividades ejecutadas y registradas permiten fortalecer la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, contribuyendo a la optimización de las acciones preventivas y a la mejora continua de las condiciones de trabajo durante la jornada laboral.

De acuerdo con lo anterior, la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.** tiene dentro de sus propósitos fundamentales el desarrollo de acciones de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a mejorar la calidad de vida laboral de sus colaboradores y a reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante la ejecución de las actividades propias de la obra.

En este sentido, la empresa se compromete a suministrar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para atender las necesidades de la población trabajadora en relación con su salud y el adecuado ambiente laboral, así como a dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en el marco de sus funciones como contratista de obra.

La gestión preventiva en Seguridad y Salud en el Trabajo está orientada a una adecuada administración de los riesgos, que permita mantener su control permanente durante el desarrollo de las actividades laborales, contribuyendo al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, así como al óptimo funcionamiento de los recursos e instalaciones de la empresa.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Describir las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. COP-2025-008, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ", evidenciando el cumplimiento del alcance contractual, las especificaciones técnicas, el cronograma establecido y las disposiciones normativas aplicables.

2.2. Objetivos Específicos

- Presentar y sustentar de manera clara y organizada las actividades desarrolladas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.
- Facilitar la identificación, consulta y comprensión de la información relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a la normatividad legal vigente.
- Sensibilizar y concientizar al personal en obra sobre los peligros y riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades diarias, promoviendo la implementación y el cumplimiento de los controles preventivos y correctivos necesarios.
- Dar cumplimiento a los criterios, lineamientos y obligaciones establecidos en el contrato de obra.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

3. ALCANCE

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un documento técnico que consolida la información y los lineamientos exigidos por la legislación colombiana vigente, en especial lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. Su aplicación es obligatoria para todos los procesos desarrollados por la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S, así como para cada uno de los proyectos y contratos de obra civil que ejecute, independientemente de su ubicación o duración, garantizando la implementación, control y mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.

4. DATOS GENERALES DE LA OBRA

DATOS GERENERALES DE LA OBRA			
CONTRATISTA / EJECUTOR:	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	N.º CONTRATO	COP-2025-008
OBJETO:	MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre del 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de Diciembre del 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN EFECTIVO:	Cuarenta y cinco (45) días		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 61.778.755		

4.1. Relación Personal Vinculado en la Obra

No.	NOMBRE	NO. DOCUMENTO	CARGO
1	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Director de obra
2	William Calderón Pérez	96352639	Repre. legal
3	Luz Mireya Lopez Bubú	40077673	Ayudante
4	Edwin Palomino	1117499072	Ayudante
5	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO
6	Yesid Vega Lozano	96352515	Maestro



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

4.2. Herramientas y Equipos

Equipos utilizados para las actividades:

- Pulidora
- Taladro
- Mezcladora
- Vibrador de concreto
- Andamios

Herramienta Menor:

- Rodillo
- Brocha
- Baldes
- Escalera

En el frente de obra se realizaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO	ML	35,04
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	3,6
1,3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0,61
2	ESTRUCTURAL		
2,1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,38
2,2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	458,83
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS, ZAPATAS, COLUMNAS	M3	4,33
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA	ML	24
3	MAMPOSTERIA		
3,1	MURO EN BLOQUE FAROL NO 6 LISO A LA VISTA LAS 1 CARAS 0,30 X 0,20 X 0,10	M2	50,78
3,2	MORTERO 1:4	M3	0,63
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	61,57
3,3,1	PAÑETE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	67,79
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCALAR (INC BLANQUEO Y LIJADO)	M2	67,79
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAÇA	M2	67,79
4	ACOMETIDA ELETRICA		



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELETRICA INTERNA	UND	1
5	PISOS Y ACABADOS INTERIORES		
5,1	ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 ALTURA PROMEDIO 0,05 M	M2	56,29
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA TRAFICO 5, INCLUYE PEGANTE CON LATEX, FRAGUE Y CERAMICA	M2	56,29
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA INCLUYE PEGANTE CON LATEX Y FRAGUE	M2	31,1
6	CARPINTERÍA Y HERRERÍA		
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS METALICAS 1,20X1,20 M CON REJILLA	UND	4
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA 120X200	UND	1,00
7	ASEO GENERAL	GBL	1

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SST

5.1. Conformación del Grupo de Gestión SST

Para la ejecución del proyecto, la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. cuenta con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo contratado bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales (honorarios), quien es el responsable de dirigir, coordinar y supervisar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el desarrollo del proyecto de construcción.

Dentro de sus funciones se encuentran la planificación, ejecución, seguimiento y control de las medidas preventivas y correctivas establecidas, el acompañamiento al personal en obra, la identificación y control de peligros y riesgos propios de las actividades, así como la verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los lineamientos contractuales en materia de SST.

Inspector SST

María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

5.2. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

Durante el tiempo de ejecución de la obra se realizaron las respectivas inducciones y reinducciones al personal que ingresó al proyecto, socializando las condiciones de trabajo, los peligros y riesgos asociados a las actividades propias de la obra, así como las medidas de prevención y control establecidas. Estas inducciones incluyeron la notificación de riesgos y las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben ser cumplidas durante la ejecución de las labores.

El objetivo principal de estas actividades es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los colaboradores, mediante el desarrollo de un proceso lógico y sistemático, basado en el ciclo de mejora continua, que permita prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante el período evaluado se desarrollaron charlas y actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocadas en los riesgos presentes, entre las cuales se destacan.

- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Señalización de seguridad y demarcación de áreas de trabajo.
- Prevención de caídas al mismo y distinto nivel
- Identificación de peligros y control de riesgos en actividades de construcción.

5.3. Elementos de Protección Personal

Los EPP mínimos exigidos incluyen:

- Casco de seguridad



- Botas de seguridad
- Guantes de seguridad
- Gafas de seguridad
- Protección auditiva
- Protección respiratoria
- Arnés de cuerpo completo y línea de vida.

El uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal fue socializado al personal mediante inducciones y charlas de seguridad, y su cumplimiento fue objeto de seguimiento y control durante toda la ejecución de la obra.

Fotos: 1 y 2 Evidencia fotografica entrega de Elementos de Proteccion Personal (EPP)	



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Los Elementos de Protección Personal (EPP) deben ser utilizados como parte integral del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial de ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S., el cual contempla la identificación y evaluación de los peligros presentes en las actividades de mantenimiento y construcción, así como la definición de los controles necesarios para la mitigación de los riesgos laborales.

El programa incluye el uso adecuado de los EPP, la capacitación y formación de los colaboradores responsables de su utilización, y el compromiso de ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S para garantizar condiciones de trabajo seguras. En este sentido, los elementos de protección personal constituyen una medida fundamental para el control de los riesgos laborales, siempre y cuando sean correctamente seleccionados, utilizados y mantenidos.

Los EPP son equipos de seguridad de uso individual, cuya finalidad es proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que ejecuta en obra. Su función no es eliminar el riesgo, sino minimizar la exposición al mismo, en complemento con la aplicación de controles de ingeniería, administrativos y operativos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Los Elementos de Protección Personal (EPP) no eliminan los peligros ni evitan por sí mismos la ocurrencia de accidentes o el contacto con agentes agresivos; sin embargo, contribuyen significativamente a reducir la severidad de las lesiones y las consecuencias derivadas de la exposición a los riesgos laborales.

Las ventajas del uso de los elementos de protección personal:



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

- El uso adecuado de los Elementos de Protección Personal proporciona una barrera efectiva entre el trabajador y los diferentes riesgos presentes en el desarrollo de las actividades propias de la obra civil. Estos elementos contribuyen a mejorar la protección de la integridad física del trabajador y a disminuir la gravedad de las consecuencias derivadas de un posible accidente laboral. Si bien los EPP no eliminan el riesgo, su correcta utilización reduce significativamente la probabilidad de lesiones graves y fortalece las condiciones de seguridad en el entorno laboral.

Principales factores para el uso de los EPP:

- La implementación y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal requiere del compromiso permanente de todos los niveles de la organización, tanto del personal directivo como de aquellos con responsabilidades operativas. Este compromiso debe estar acompañado de procesos de sensibilización y concientización dirigidos a los colaboradores, que permitan reconocer la importancia del uso correcto y permanente de los EPP como medida preventiva.
- Asimismo, el uso de los EPP está orientado al control y prevención de los riesgos laborales, constituyéndose en una medida complementaria a los controles administrativos, de ingeniería y a las prácticas seguras de trabajo. Su finalidad es proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta, contribuyendo a preservar su salud, seguridad y bienestar durante el desarrollo de las actividades de la obra.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Fotos: 3 y 4
Uso de Elementos de Protección Personal

5.4 Acciones de Prevención y Control para Intervenir Peligro

Las acciones que se utilizaron para este periodo fueron:

Durante la ejecución se implementaron acciones de prevención y control orientadas a la identificación, evaluación y mitigación de los peligros presentes en el desarrollo de las actividades propias de la obra, con el fin de proteger la integridad física y la salud de los colaboradores.

Las principales acciones ejecutadas fueron las siguientes:

- **Inspecciones periódicas al personal en obra**, con el propósito de verificar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), evaluar su estado actual y garantizar su reposición o cambio oportuno cuando se evidencié desgaste, deterioro o incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

- **Verificación de las condiciones de las herramientas y equipos de trabajo**, asegurando que se encontraran en buen estado de funcionamiento antes y durante su uso, así como el seguimiento permanente a los equipos existentes, con el fin de prevenir incidentes, accidentes laborales y fallas operativas durante la jornada laboral.

Estas acciones contribuyeron al control efectivo de los riesgos laborales, fortaleciendo la cultura de prevención y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En el periodo del 25 noviembre – 24 Diciembre del 2025; no se presentaron accidentes de trabajo, dentro del Contrato de Obra No. COP-2025-008.

INDICADORES DE ACCIDENTES			
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0		
SIN ACCIDENTES QUE REPORTAR			

5.6 Punto de Hidratación

Durante la ejecución de la obra se dispuso de un (1) punto de hidratación debidamente ubicado y accesible para los colaboradores, con el fin de promover



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

hábitos saludables y prevenir riesgos asociados a la deshidratación y el estrés térmico.

Así mismo, se mantuvo un stock permanente de dos (2) pacas de bolsas de agua potable, garantizando su reposición oportuna en el momento que fuese necesario, asegurando de esta manera la disponibilidad continua del recurso para el personal en obra.

5. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

6.1. Contactos de emergencia

De conformidad con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se informó y socializó a todos los colaboradores que, en caso de presentarse una situación de emergencia durante la ejecución de la obra, deberán comunicarse de manera inmediata con las entidades competentes a través de los siguientes números de atención de emergencias, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y adecuada ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se reiteró al personal la importancia de conocer y tener a disposición estos contactos, como parte de las acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias implementadas en el proyecto de obra civil.

ENTIDAD	NUMERO DE CONTACTO
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	321 4347391
POLICÍA LÍNEA ÚNICA DE EMERGENCIAS NACIONAL CUADRANTE 1	3157922192
DEFENSA CIVIL	3112554476
HOSPITAL ESE SOR TERESA ADELE	317 442 2702

6.2 Verificación e inspección de herramienta y equipo

INSPECCION	FRECUENCIA	RESPONSABLE
HERRAMIENTAS MANUALES	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST
INSPECCION INTERNA DE OBRA	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST
INSPECCION A EQUIPOS	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST

Otras Acciones:

Se desarrollaron acciones complementarias orientadas a la promoción de la salud, la prevención de riesgos laborales y la preparación ante situaciones de emergencia, entre las cuales se destacan:

- **Realización de pausas activas** dirigidas a los colaboradores, con el fin de prevenir la fatiga física, disminuir el riesgo de desórdenes musculoesqueléticos y promover hábitos saludables durante la jornada laboral. Estas actividades se encuentran debidamente soportadas mediante las respectivas planillas de asistencia del personal.
- **Socialización del punto de encuentro** establecido dentro del área de influencia de la obra, definido como lugar seguro en caso de presentarse una emergencia que requiera la evacuación parcial o total del personal. Esta información fue impartida durante la capacitación de inducción al personal, quedando respaldada con la planilla de asistencia correspondiente a la capacitación realizada el **26/11/2025**.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura de prevención, al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la adecuada respuesta ante posibles situaciones de emergencia durante el desarrollo de las actividades de obra civil.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6. SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período evaluado se realizó la verificación de la afiliación de los colaboradores a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a través de la plataforma de **POSITIVA Compañía de Seguros**, conforme a los lineamientos establecidos por la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.**

En dichas consultas se constató que el personal operativo vinculado a la obra, correspondiente a ayudantes, oficiales, maestro de obra y profesional SISO, se encuentra afiliado en **nivel de riesgo V**, acorde con las actividades propias de la ejecución de obra civil. Así mismo, los ingenieros director y residente de obra se encuentran afiliados en nivel de riesgo V, de acuerdo con las funciones administrativas y de supervisión que desempeñan.

Esta verificación garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y permite asegurar la cobertura adecuada frente a los riesgos laborales asociados al desarrollo del proyecto.

A continuación, se relaciona el personal.

No.	NOMBRE	NO. DOCUMENTO	CARGO
1	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Director de obra
2	William Calderón Pérez	96352639	Repre. legal
3	Luz Mireya Lopez Bubú	40077673	Ayudante
4	Edwin Palomino	1117499072	Ayudante
5	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO
6	Yesid Vega Lozano	96352515	Maestro

7. ANEXOS PRESENTADOS EN EL INFORME SSTCONTRATISTA

- ANEXO 1. Planilla Asistencia Charla Inducción.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

- Uso y Mantenimiento Elementos de Protección Personal.
 - Señalización de seguridad y demarcación de áreas de trabajo
 - Prevención de caídas al mismo y distinto nivel
 - Identificación de peligros y control de riesgos en actividades de construcción.
- ANEXO 2. Entrega de EPP.
 - ANEXO 3. Planilla de Seguridad Social.

ELABORÓ

Maria Camila Escobar L.

María Camila Escobar Lozano

Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo

Profesional en Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgada mediante Resolución No. 3673 del 05 de junio de 2023.



MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA
DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN
BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO
DE EL DONCELLO CAQUETÁ

26 11 25
(Día) (Mes) (Año)

PLANILLAS INFORME SST - ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL DONCELLO

CONTRATO DE OBRA No. COP-2025-008

CONTRATISTA: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONCEPTO: Entrega EPP.

No	NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS							FECHA DE ENTREGA	FIRMA
			CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	TAPA BOCAS	GUANTE CARNAZA	BOTAS	GAFAS		
1	Mireya Lopez B.	Ayudante	X	X	X	X	X	X	X	26/11/25	MIREYA LÓPEZ
2	Yesid Vega.	Maestro	X	X	X	X	X	X	X	26/11/25	yesid vega
3	Yesid Bartolo	Director	X						X	26/11/25	
4	Edwin Palomino	Ayudante	X	X	X	X	X	X	X	26/11/25	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

NOTA:

Firma
Nombre: María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023



MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DE AULA
DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN
BOLÍVAR -SEDE RURAL EL CARMEN DEL MUNICIPIO
DE EL DONCELLO CAQUETÁ

10 12 25
(Día) (Mes) (Año)

PLANILLAS INFORME SST - ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL DONCELLO

CONTRATO DE OBRA No. COP-2025-008

CONTRATISTA: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONCEPTO: Reposición de EPP.

No	NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS							FECHA DE ENTREGA	FIRMA
			CASCO	GUANTES	TAPA OÍDOS	TAPA BOCAS	GUANTE CARNAZA	BOTAS	GAFAS		
1	Yesid Vega	Maestro		X		X				10/12/2025	Yesid Vega
2	Yesid Bartolo	Director								10/12/2025	
3	Mirsyá Lopez	Ayudante		X		X	X			10/12/2025	MIRSYA LÓPEZ
4	Edwin Polomino	Ayudante		X		X	X			10/12/2025	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

NOTA:

Firma
Nombre: María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

María Camila Escobar L.



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

SG-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Nombre o Temática o temática de la Charla o Capacitación:	Uso y mantenimiento de EPP.	Departamento:	Caquetá
		Ciudad o Municipio:	Doncello
Responsable(s):	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S – Profesional SST		

Fecha de Realización	26/11/2025	Hora	9:00 am
----------------------	------------	------	---------

N°	Nombres y Apellidos	N° Documento	Cargo	Firma
1	Mireya Lopez	40077673	Ayudante	MIREYA LOPEZ
2	Yesid Vega	96352515	Maestro	yesid vega
3	Yesid Bartolo	1110562700	Director	[Firma]
4	Edwin Palomino	1.117.499.072	Ayudante	[Firma]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

Se entregan los EPP a los colaboradores.

Inspector SST

María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

SG-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Nombre o Temática o temática de la Charla o Capacitación:	Señalización y seguridad Prevención de caídas.	Departamento:	Caquetá
		Ciudad o Municipio:	Doncello
Responsable(s):	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S – Profesional SST		

Fecha de Realización	09/12/2025	Hora	11:00 am
----------------------	------------	------	----------

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Documento	Cargo	Firma
1	Yesid Vega L.	96352515	Maestro	yesid vega
2	Mireya Lopez	40077673	Ayudante	MIREYA LOPEZ
3	Yesid Bartolo	1.110.562.700	Director.	[Firma]
4	Edwin Palomino	1.117.499.072	Ayudante	[Firma]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

Inspector SST

María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

SG-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Nombre o Temática o temática de la Charla o Capacitación:	Identificación de peligros y control de riesgos.	Departamento:	Caquetá
		Ciudad o Municipio:	Doncello
Responsable(s):	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S – Profesional SST		

Fecha de Realización	17/12/2025	Hora	2:00 Pm
----------------------	------------	------	---------

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Documento	Cargo	Firma
1	Mirya Lopez	40077673	Ayudante	MIRYA LOPEZ
2	Yessid Vega	96352515	Maestro	YESSID VEGA
3	Yessid Bartolo	1.110.562.700	Director	YESSID BARTOLO
4	Edwin Palomino	1.117.499.070	Ayudante	EDWIN PALOMINO
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

Inspector SST

María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.4 Certificación pago FIC



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. identificado con el NIT 901209615, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
COP-2025-008	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	EL DONCELLO	154,447	2025-12	06-FEB-2026	155784987
		Total	154,447			

Expedido por el SENA, a los seis (06) días del mes de Febrero de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-02-06

Generado por : Certificados En Línea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2626601182 y el Número de Certificado: 458749



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	155784987	41750608	06/02/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901209615**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.148.182.44**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 154,447.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 154,447.00	COP\$ 154,447.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	155784987	41750608	06/02/2026

Número de Identificación

901209615

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

7

Departamento

CAQUETA

Dirección de Domicilio

CRA. 4 No. 6-08

Localización

Nacional

Correo electrónico

alwill197101@gmail.com

Regional

Caqueta

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Fecha Terminación Obra

24/12/2025

Tipo FIC

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

15444689.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

FLORENCIA (CAQUETA)

Ciudad de Domicilio

EL DONCELLO

Teléfono de Contacto

+57,312 4219611

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-018-000000

Número Contrato de Obra

COP-2025-008

Fecha Inicio Obra

25/11/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

EL DONCELLO

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

61778755.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

154447.00

Valor del Pago

154447.00



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.5 Certificación de Material



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.**, en la Calle 93B No. 18 - 12 Piso 8 Bogotá D.C. Colombia, identificada con número de NIT 891.800.111-5.

Trader by **DIACO S.A.**, in the Calle 93B No. 18 - 12 Piso 8 Bogotá D.C. Colombia, identified with NIT number 891.800.111-5.

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:

Manufactured in described plants on the annex:

"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 2289 (2020)

Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

Low-alloy steel deformed and plain bars for concrete reinforcement

SECTOR ICS 77.140.15

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación: 2012-03-08

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-15

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2023-09-25

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-08-16

Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628
Versión 00



DIACO S.A.

NTC 2289 (2015)

Anexo Certificado

CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación:

2012-03-08

Fecha Última Modificación:

2023-09-25

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2022-08-15

Fecha de Vencimiento:

2028-08-16

Renewal Date:

Expiration Date:

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta	Dirección	País
DIACO S.A. Planta Tuta	Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Colombia
DIACO S.A. Planta Muña	Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia	Colombia



DIACO S.A.

NTC 2289 (2020)

Anexo Certificado

CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación:

2012-03-08

Fecha Última Modificación:

2023-05-19

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2022-08-15

Fecha de Vencimiento:

2028-08-16

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	8,5 mm (Número de designación 8,5M)	8,5 mm (Número de designación 8,5M)	Presentación en barra recta y rollo	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	1/4" (Número de designación 2)	1/4" (Número de designación 2)	Presentación en barra recta y rollo	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	3/8" (Número de designación 3)	3/8" (Número de designación 3)	Presentación en rollo	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	1/2" (Número de designación 4)	1/2" (Número de designación 4)	Presentación en rollo	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	9 mm (Número de designación 9M)	9 mm (Número de designación 9M)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	11 mm (Número de designación 11M)	11 mm (Número de designación 11M)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia



DIACO S.A.

NTC 2289 (2020)

Anexo Certificado

CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación:

2012-03-08

Fecha Última Modificación:

2023-05-19

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2022-08-15

Fecha de Vencimiento:

2028-08-16

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	12 mm (Número de designación 12M)	12 mm (Número de designación 12M)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	3/8" (Número de designación 3)	3/8" (Número de designación 3)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	1/2" (Número de designación 4)	1/2" (Número de designación 4)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	5/8" (Número de designación 5)	5/8" (Número de designación 5)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	3/4" (Número de designación 6)	3/4" (Número de designación 6)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	7/8" (Número de designación 7)	7/8" (Número de designación 7)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia



DIACO S.A.

NTC 2289 (2020)

Anexo Certificado

CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación:

2012-03-08

Fecha Última Modificación:

2023-05-19

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2022-08-15

Fecha de Vencimiento:

2028-08-16

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	1" (Número de designación 8)	1" (Número de designación 8)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	1 1/8" (Número de designación 9)	1 1/8" (Número de designación 9)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
Diaco	Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto.	1 1/4" (Número de designación 10)	1 1/4" (Número de designación 10)	Presentación en barra recta	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE APOLO & AGREGADOS S.A.S
NIT: 901.379.145-5

CERTIFICA


Que la empresa **APOLO & AGREGADOS S.A.S** identificada con Nit: 901.379.145-5, suministro el siguiente material a la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S** identificada con Nit: 901.209.615-7 para el contrato de obra No **COP-2024-004**:

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN M ³
Gravilla	3
Arena	9
Arena Fina	3

Dicho material es extraído mediante aprobación de resolución de la Licencia Ambientales expedida por la Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Sur de la Amazonía CORPO AMAZONÍA No **DG-2438 del 22 de diciembre de 2022**, con contrato de concesión minera No **OE8-15441** firmado el 8 de septiembre del 2023 ante la Agencia Nacional de Minería ANM y registro único de comercialización de materiales RUCOM-2024081428479 expedido por ANM.

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S** a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente;


FANOR TROCHES SANCHEZ
Representante Legal




ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.6 Registro Fotográfico



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

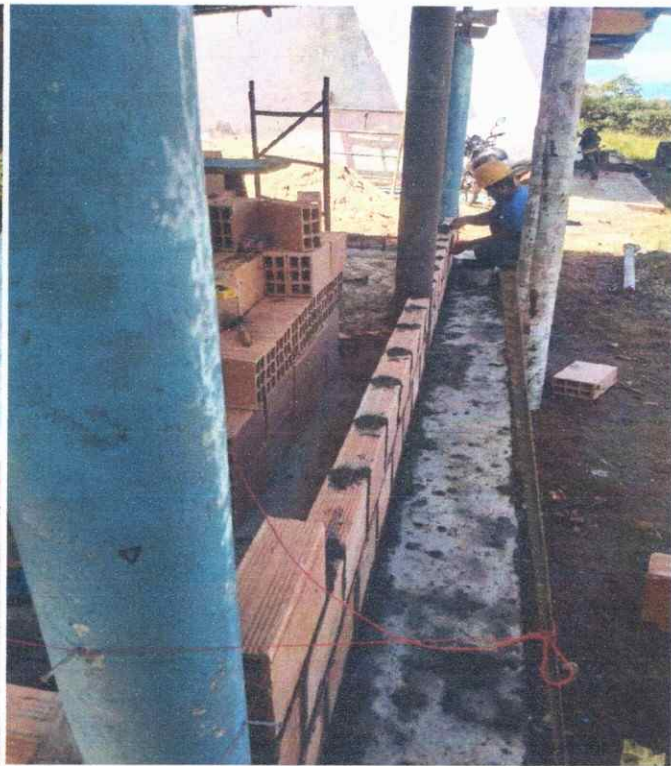

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com




ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S





ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S


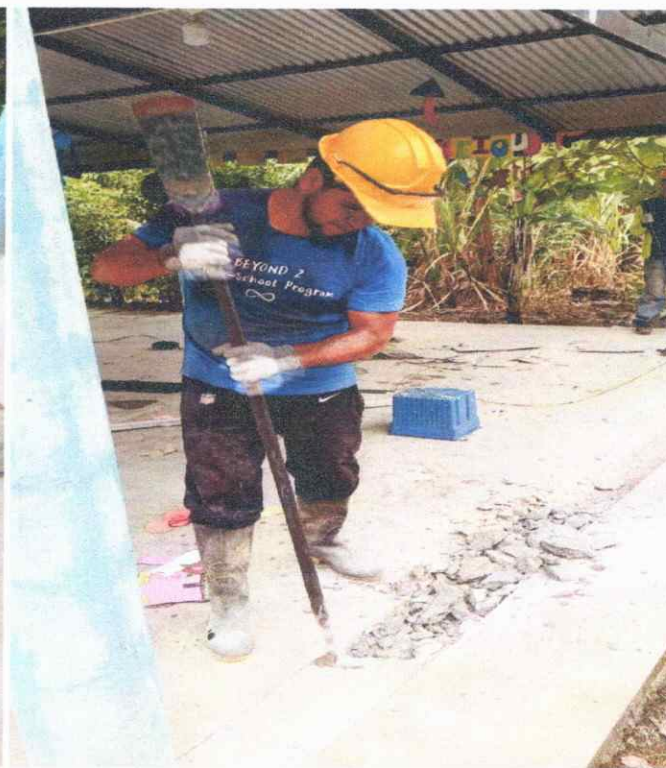




ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



©© TECNO POP 7

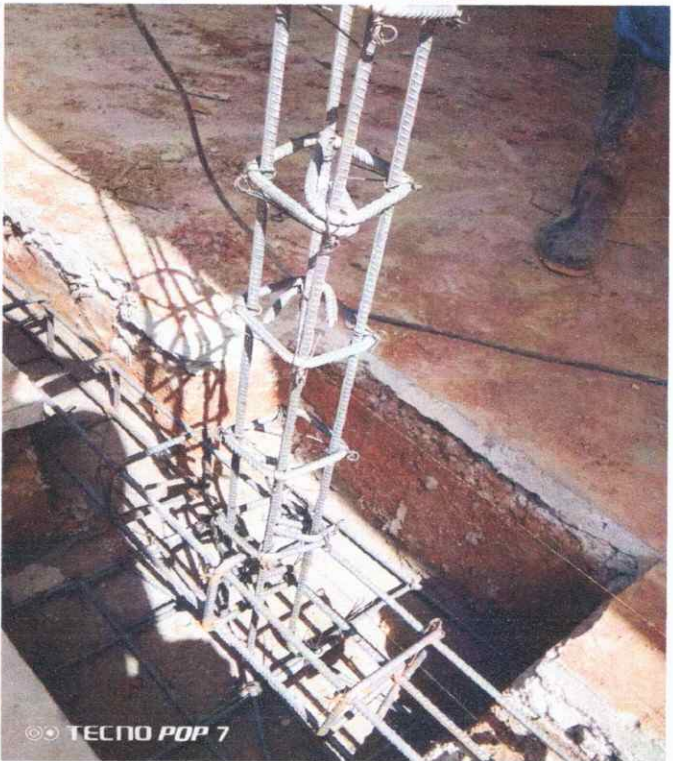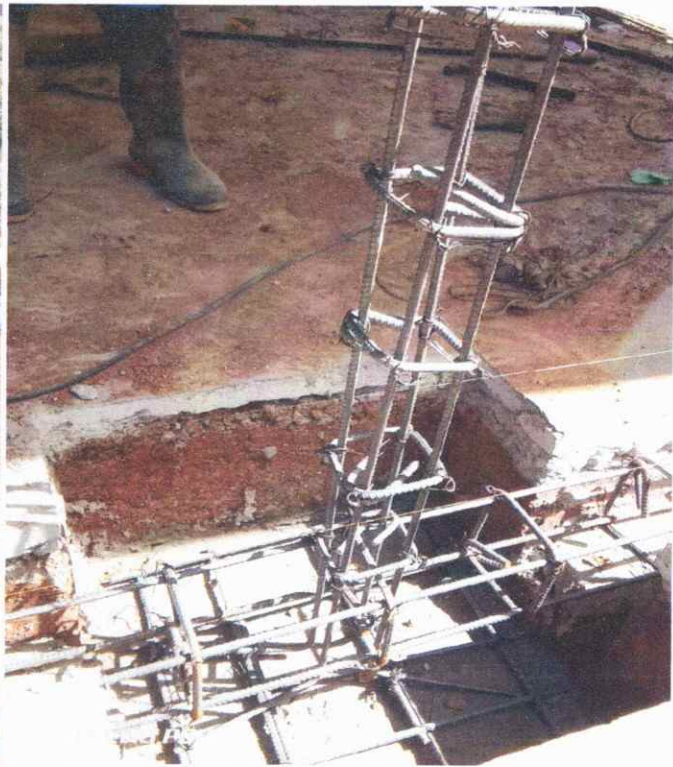

©© TECNO POP 7

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S





ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com





ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S




Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

Carrera 4 - No 6 - 08 Barrio Belalcázar - El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com

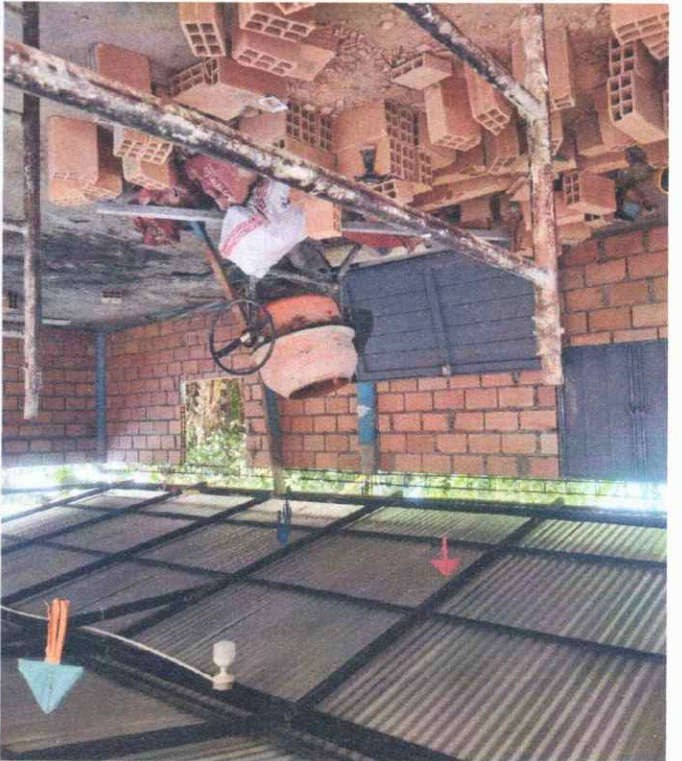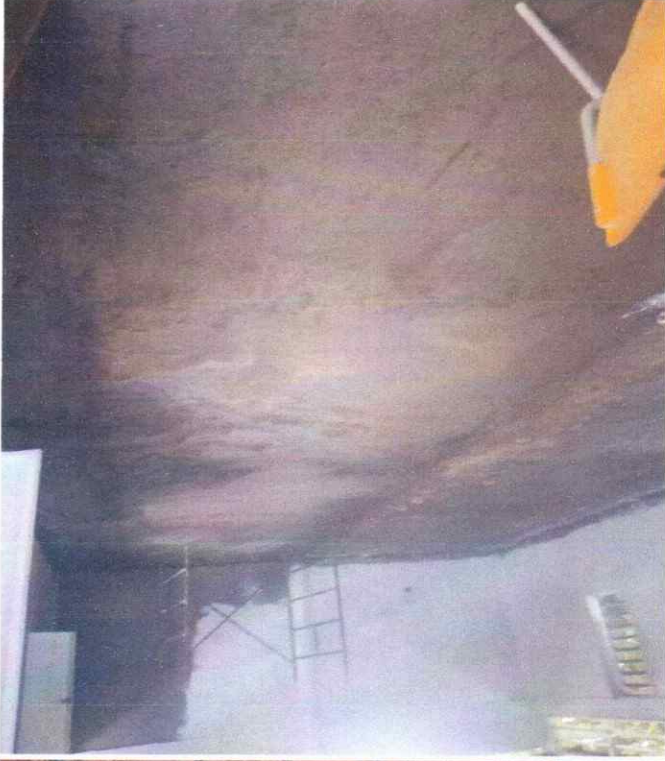




ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

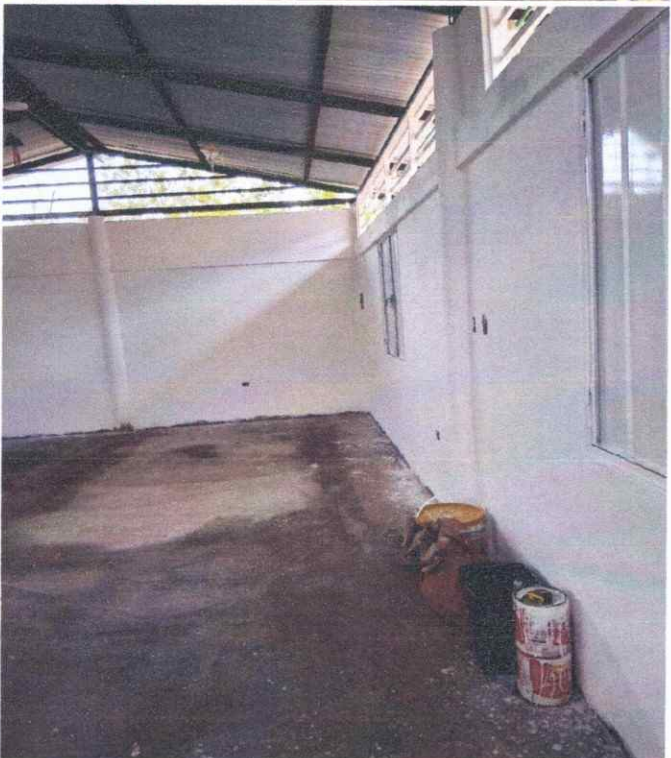

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com




ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

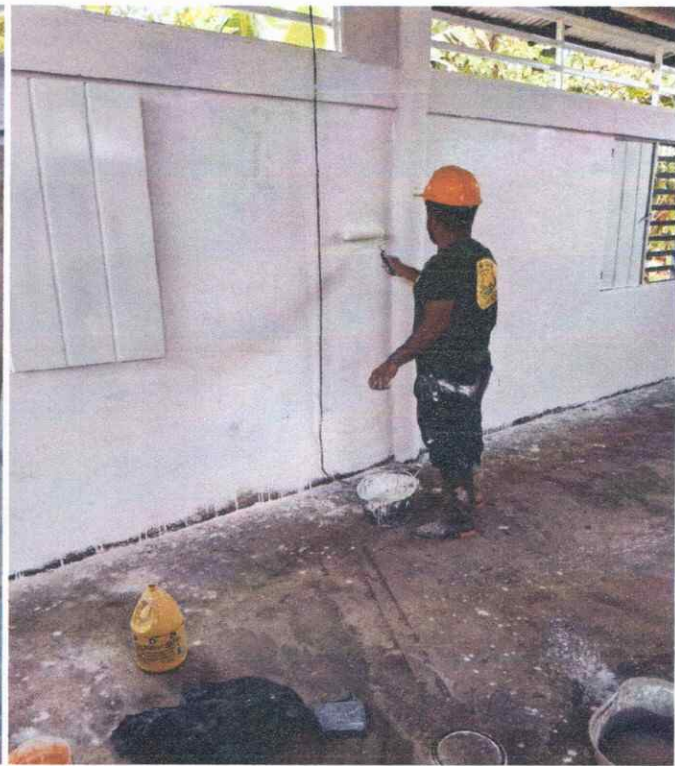




ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

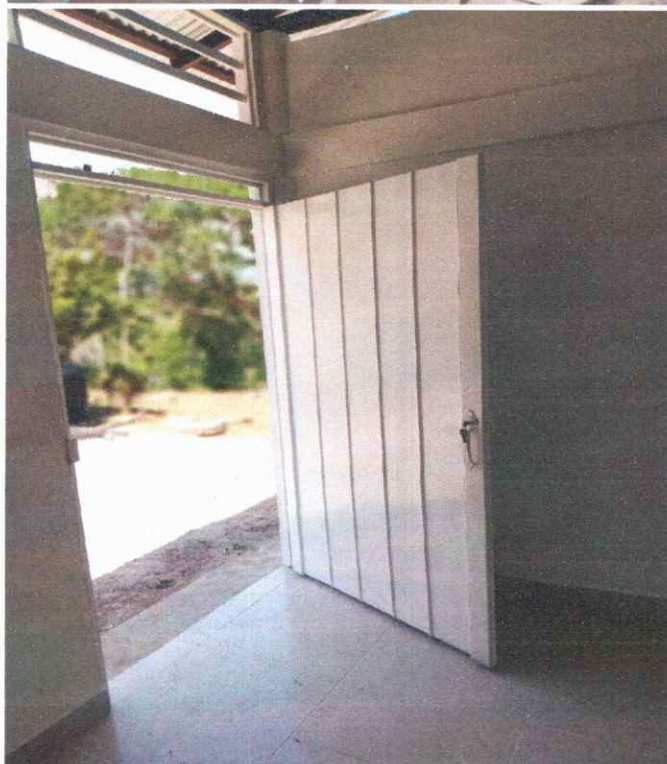







ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

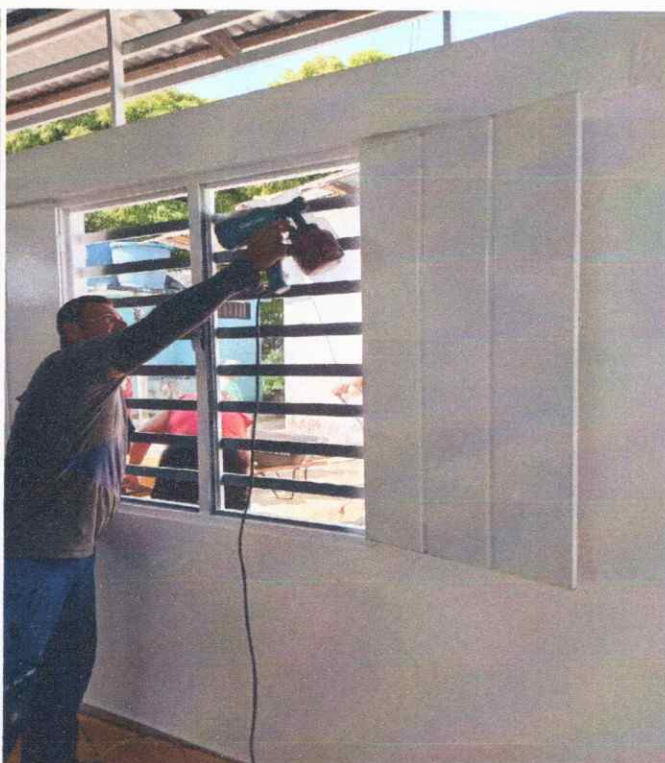

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com




ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

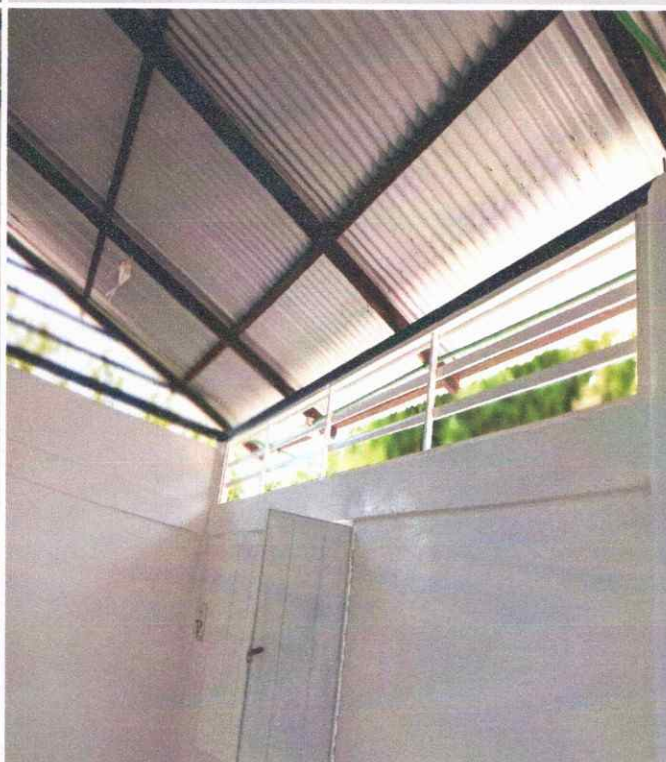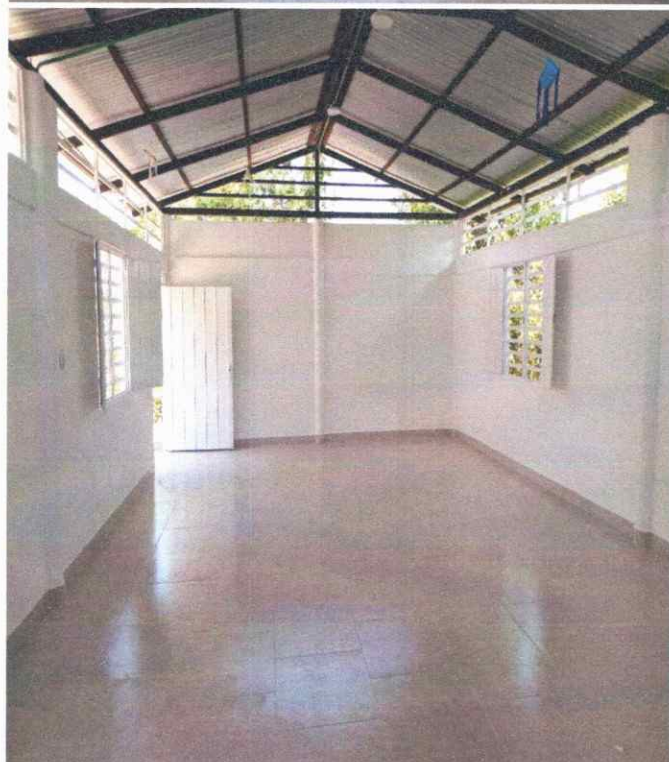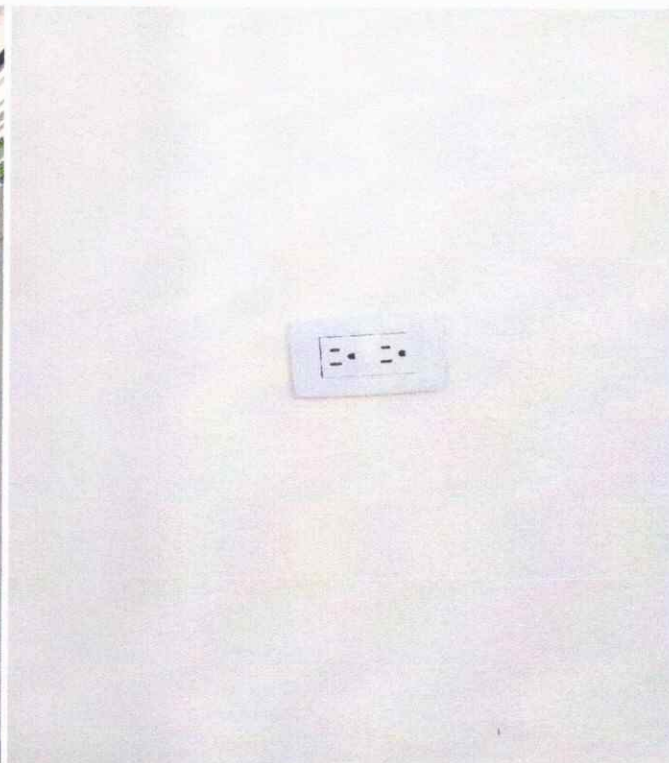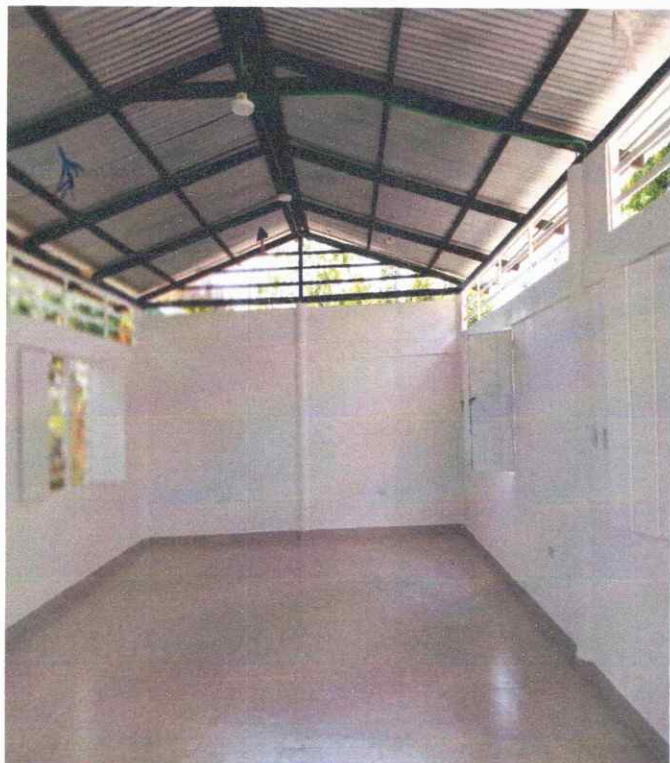



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

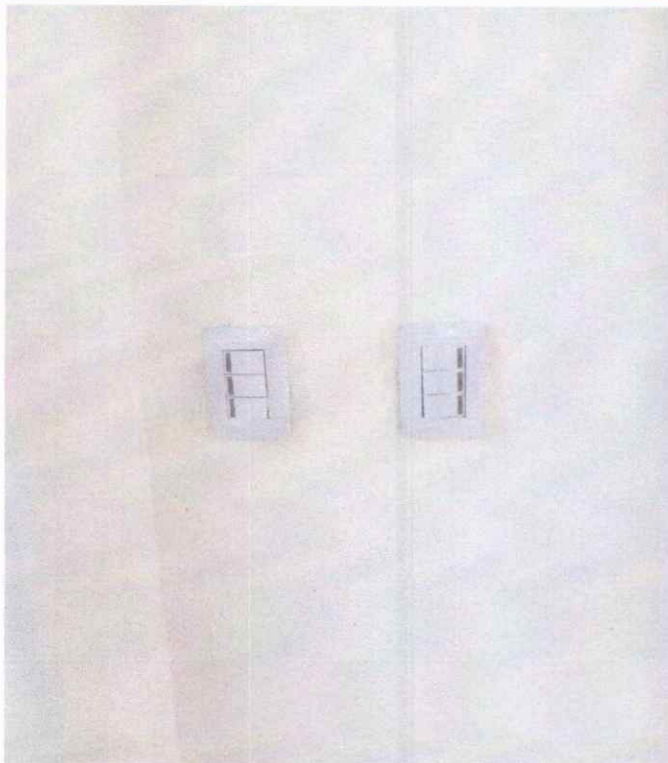



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.7 Bitácora



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Se adjunta la certificación de materiales correspondiente, debidamente suscrita.

5. Planos récord y memorias:

Se anexan los planos récord actualizados, conforme a lo requerido para el proceso de liquidación.

Con lo anterior, consideramos atendidas en su totalidad las observaciones formuladas, quedando atentos a cualquier requerimiento adicional que se considere necesario para continuar con el trámite de liquidación del contrato.

Cordialmente,

Firma: 
Nombre del Representante Legal: WILLIAM CALDERON PEREZ
Nombre del proponente (Persona Jurídica): ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
N.I.T. 901.209.615-7
Dirección del Proponente: CR 4 6 08 BRR BELALCAZAR
Teléfonos: 3124219611 Fax: _____
Ciudad: El Doncello Caquetá
E-mail: alwill197101@gmail.com



ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

(El Doncello Caquetá), 12 de diciembre de 2025

OFCOP-008-003

Ingeniera

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

Secretaria de Planeación Municipal y de las TIC'S

Municipio de El Doncello

Departamento del Caquetá

Supervisor

ASUNTO: Renuncia al pago del anticipo contractual estipulado en el contrato de obra No COP-2025-008, en la clausula No 8 "FORMA DE PAGO".

Por medio de la presente, me permito manifestar de manera expresa y voluntaria mi decisión de renunciar al pago correspondiente al anticipo del cincuenta por ciento (50%), establecido en el marco del contrato No COP-2025-008 suscrito entre El Municipio de El Doncello y la empresa Alwil Global Servicios S.A.S.

La presente renuncia se realiza de manera libre, consciente y sin que medie presión alguna, con el fin de dar continuidad al desarrollo contractual bajo las condiciones financieras acordadas en la minuta, dejando constancia de que no exigiré el desembolso del anticipo previamente pactado.

En consecuencia, el valor total del contrato será cancelado conforme a las condiciones de pago definidas, sin tener en cuenta el anticipo.

La presente comunicación se expide para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Firma: 

Nombre del Representante Legal: **WILLIAM CALDERON PEREZ**

Nombre del proponente (Persona Jurídica): **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**

N.I.T. **901.209.615-7**

Dirección del Proponente: **CR 4 6 08 BRR BELALCAZAR**

Teléfonos: **3124219611**

Fax: _____

Ciudad: **El Doncello Caquetá**

E-mail: alwil197101@gmail.com

(El Doncello Caquetá), 28 de Noviembre de 2025

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel.

3124219611 email: alwil197101@gmail.com


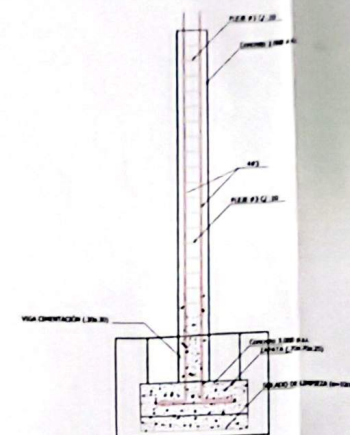


Diagram illustrating the reinforcement layout for a square column. The column is labeled "COLUMN" and has a width of "0.55". The reinforcement bars are labeled "9#4 C/ ØH" and "9#4 C/ ØV". The top bar is labeled "9#4 C/ ØH ZAPATA (70x70x25)".

VIGA CIMENTACIÓN (.30x.30)
ESCALA 1:20

COLUMNAS (.30x.30)
ESCALA 1:20

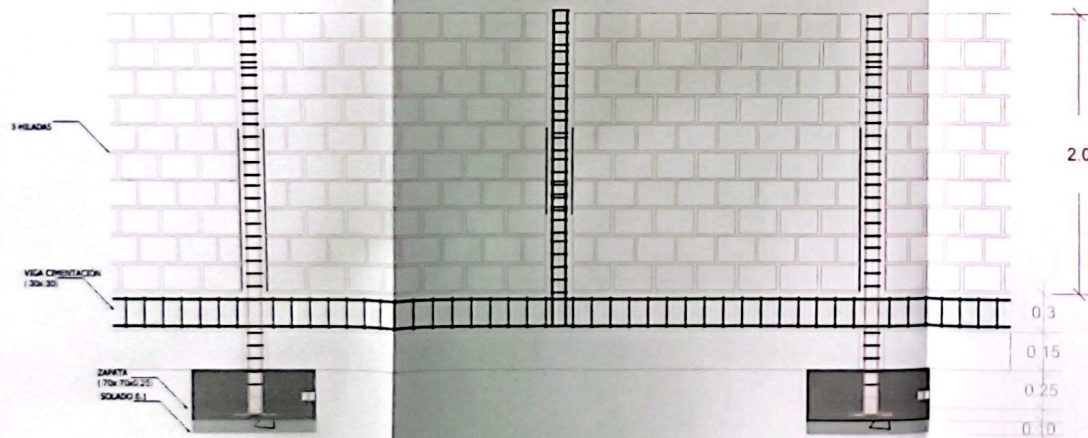

CONTRATO DE OBRA No: COP-2025-008
MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA
FISICA DE AULA DE CLASE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR -SEDE RURAL EL CARMEN
DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO
CAQUETA

Αριθμός | :

WILLIAM CALDERON PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

Dibujó:

YESID F. BARTOLO LOZANO
Ing. Agrónomo - RP 30202-299003 TLM
EL DOMICILLO - CAQUETA

CONFIDENTIAL

PLANO RECORD
PLANTA DE AULA
DETALLE CONSTRUCTIVO

MODIFICACIONES

FEBRUARY 2014

01/01
AA

A

B

C

S3
S3

JDG


PLANTA ELECTRICA

ARQUITECTONICO


CONVENCIONES

- ▬ Tablero de Distribución General 3 circuitos
- ⊗ Luminaria en Aplique
- ⊙ Luminaria techo
- Tomacorriente doble
- Tomacorriente GFCI
- ▬ Ducto iluminación Techo-Pared
- Indicador Interruptor
- Número de Circuito
- ⊗ Interruptor Triple
- ⊗ Interruptor sencillo
- ✓ Conductor de Neutro
- ✓ Conductor de puesta a Tierra
- ✓ Conductor de Fase

DETALLE DE ALTURA DE APARATOS

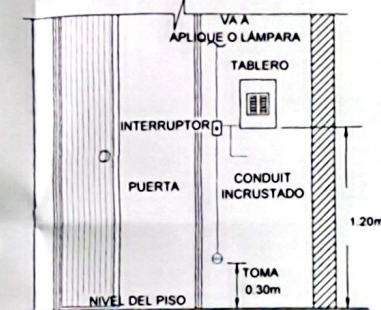

DIAGRAMAS UNIFILAR TABLERO T.A.2.

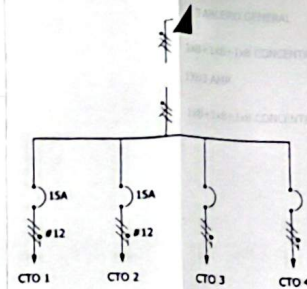

NOTAS:

- LOS DUCTOS Y CONDUCTORES NO ESPECIFICADOS SERAN EN $\phi 1/2"$ Y No. 12AWG-
- TODO DUCTO P.V.C. A SI COMO LAS CAJAS Y PARTES METALICAS SERAN ATERRIZADAS EN ALAMBRE DE COBRE No. 12 DESNUDO.
- LA LINEA A TIERRA PPAL SERA EN ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 8AWG LA VARILLA COPERWELD DE 2.40 Y $\phi 12.7$ mm.
- LOS TOMAS ESTARAN A 40cm. DEL PISO Y DEBEN IR APANTALLADO A TIERRA CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 14 AWG.
- LOS INTERRUPTORES ESTARAN A 1.30 m. DEL PISO.
- TODOS LOS TOMAS ESTAN CONECTADOS A LA LINEA A TIERRA PPAL



CONTRATO DE OBRA No: COP-2025-008
MEJORAMIENTO A LA ESTRUCTURA
FISICA DE AULA DE CLASE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN
BOLÍVAR -SEDE RURAL EL CARMEN
DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO
CAQUETÁ

Aprobó:

WILLIAM CALDERÓN PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
ALWIL GLOBAL SERVICES S.A.S

Dibujó:

YESID F. BARTOLO LOZANO
Ing. Registrado No. 73012-399503 TLM
EL DONCELLO - CAQUETÁ

CONTIENE:

PLANO RECORD
RED ELECTRICA
DETALLES
CONVENCIONES

MODIFICACIONES

FEBRERO/2026

01/01
EE

INDICADA
