

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - UAESP

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INF. SEMANAL No	11	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1/12/2025	Y EL	6/12/2025
OBJETO:	"REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA"				
LOCALIZACIÓN:	VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORIA		
CONTRATO No:	4182.0.10.26.1.1016-2025		CONTRATO No:	4182.010.26.1.784-2025	
CONTRATISTA:	CEHID CONSULTORIA S.A.S		CONTRATISTA:	TERRACONTROL CIP S.A.S. BIC	
PLAZO INICIAL:	Tres Meses		PLAZO INICIAL:	Tres Meses	
FECHA DE INICIACIÓN:	23/09/2025		FECHA DE INICIACIÓN:	23/09/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-		FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	
FECHA DE REINICIACIÓN:	-		FECHA DE REINICIACIÓN:	-	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2025	
PLAZO ACTUALIZADO:	-		PLAZO ACTUALIZADO:	-	
VALOR INICIAL:	\$ 90.000.000,00		VALOR INICIAL:	\$ 390.679.380,00	
VALOR ADICIÓN(ES):	-		VALOR ADICIÓN(ES):	-	
VALOR ACTUALIZADO:	-		VALOR ACTUALIZADO:	-	
VALOR PAGADO:	-		VALOR PAGADO:	-	

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


CONTRATO INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
ENTIDAD ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			ENTIDAD ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	435 47 994000061295			PÓLIZA No.	430 47 994000072497		
CONCEPTO	VIGENTE		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CUMPLIMIENTO	09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11/09/2025	31/12/2028	\$ 7.200.000,00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	09/09/2025	31/12/2028	\$ 31.230.350,40
CALIDAD DEL SERVICIO	11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CALIDAD DEL SERVICIO	09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORIA		
CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR
Acta de avance No. 1			Acta de avance No. 1		

4. CURVA "S"

15, 99% de avance programado y 0% de avance ejecutado.

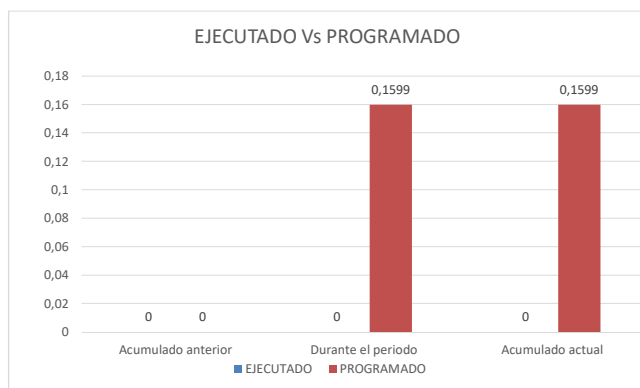

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica.

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

7, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
8. ACTIVIDADES REALIZADAS	
Para la fecha, el Contratista de Consultoría se encuentra en proceso de elaboración de los informes técnicos correspondientes al levantamiento topográfico de los Lotes 1 y 2. Actualmente se adelanta la fase de procesamiento, depuración y ajuste de la información obtenida en campo, así como la validación de coordenadas, generación del modelo digital del terreno y demás productos cartográficos requeridos. Paralelamente, se encuentra en proceso de elaboración el informe técnico correspondiente a los resultados obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras recolectadas durante la fase de campo del estudio de suelos.	
	
ALEJANDRO CESPEDES REPRESENTANTE LEGAL / ENTIDAD DE INTERVENTORÍA	
