

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - UAESP

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

|                           |                                                                                                                                                        |                              |                         |                             |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| INF. SEMANAL No           | 16                                                                                                                                                     | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 5/01/2026               | Y EL                        | 10/01/2026 |
| OBJETO:                   | "REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA" |                              |                         |                             |            |
| LOCALIZACIÓN:             | VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA                                                                                                               |                              |                         |                             |            |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                                                                                                                                                        |                              | CONTRATO DE CONSULTORIA |                             |            |
| CONTRATO No:              | 4182.0.10.26.1.1016-2025                                                                                                                               |                              | CONTRATO No:            | 4182.010.26.1.784-2025      |            |
| CONTRATISTA:              | CEHID CONSULTORIA S.A.S                                                                                                                                |                              | CONTRATISTA:            | TERRACONTROL CIP S.A.S. BIC |            |
| PLAZO INICIAL:            | Tres Meses                                                                                                                                             |                              | PLAZO INICIAL:          | Tres Meses                  |            |
| FECHA DE INICIACIÓN:      | 23/09/2025                                                                                                                                             |                              | FECHA DE INICIACIÓN:    | 23/09/2025                  |            |
| FECHA DE SUSPENSIÓN:      | -                                                                                                                                                      |                              | FECHA DE SUSPENSIÓN:    | -                           |            |
| FECHA DE REINICIACIÓN:    | -                                                                                                                                                      |                              | FECHA DE REINICIACIÓN:  | -                           |            |
| FECHA DE TERMINACIÓN:     | 14/02/2026                                                                                                                                             |                              | FECHA DE TERMINACIÓN:   | 14/02/2026                  |            |
| PLAZO ACTUALIZADO:        | Cuarenta y Cinco Días                                                                                                                                  |                              | PLAZO ACTUALIZADO:      | Cuarenta y Cinco Días       |            |
| VALOR INICIAL:            | \$ 90.000.000,00                                                                                                                                       |                              | VALOR INICIAL:          | \$ 390.679.380,00           |            |
| VALOR ADICIÓN(ES):        | -                                                                                                                                                      |                              | VALOR ADICIÓN(ES):      | -                           |            |
| VALOR ACTUALIZADO:        | -                                                                                                                                                      |                              | VALOR ACTUALIZADO:      | -                           |            |
| VALOR PAGADO:             | -                                                                                                                                                      |                              | VALOR PAGADO:           | -                           |            |

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


|                                               |                                   |            |                  |                                         |                                   |            |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| CONTRATO INTERVENTORÍA                        |                                   |            |                  | CONTRATO DE CONSULTORIA                 |                                   |            |                  |
| ENTIDAD ASEGURADORA                           | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |            |                  | ENTIDAD ASEGURADORA                     | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |            |                  |
| PÓLIZA No.                                    | 435 47 994000061295               |            |                  | PÓLIZA No.                              | 430 47 994000072497               |            |                  |
| CONCEPTO                                      | VIGENTE                           |            | VALOR            | CONCEPTO                                | VIGENTE                           |            | VALOR            |
|                                               | DESDE                             | HASTA      |                  |                                         | DESDE                             | HASTA      |                  |
| CUMPLIMIENTO                                  | 11/09/2025                        | 30/06/2026 | \$ 18.000.000,00 | CUMPLIMIENTO                            | 09/09/2025                        | 30/06/2026 | \$ 78.075.876,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 11/09/2025                        | 31/12/2028 | \$ 7.200.000,00  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 09/09/2025                        | 31/12/2028 | \$ 31.230.350,40 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                          | 11/09/2025                        | 30/06/2026 | \$ 18.000.000,00 | CALIDAD DEL SERVICIO                    | 09/09/2025                        | 30/06/2026 | \$ 78.075.876,00 |

3. RESUMEN DE PAGOS

|                        |                       |       |                         |                       |       |
|------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------|
| CONTRATO INTERVENTORÍA |                       |       | CONTRATO DE CONSULTORIA |                       |       |
| CONCEPTO               | FECHA DE PRESENTACIÓN | VALOR | CONCEPTO                | FECHA DE PRESENTACIÓN | VALOR |
| Acta de avance No. 1   |                       |       | Acta de avance No. 1    |                       |       |
|                        |                       |       |                         |                       |       |
|                        |                       |       |                         |                       |       |
|                        |                       |       |                         |                       |       |

4. CURVA "S"

15, 99% de avance programado y 0% de avance ejecutado.

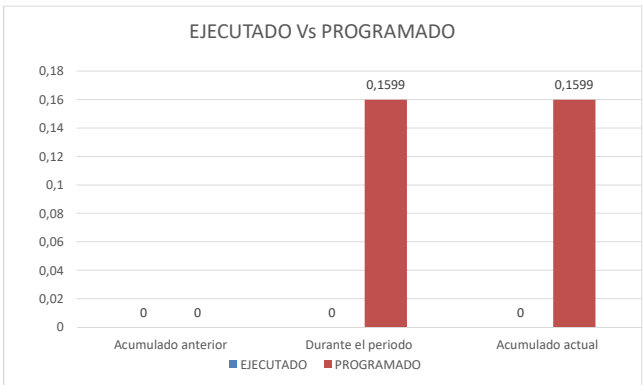

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica.

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## 7, REGISTRO FOTOGRÁFICO



### 1. INTRODUCCIÓN

Las plantas de tratamiento de agua del tipo convencional son sistemas compuestos por diversas partes, las cuales permiten la remoción de una variedad de sólidos que componen las aguas residuales, entre las que se encuentran las aguas negras y las aguas de lluvia, la remoción de sólidos y colores pueden ser a través de procesos de 100 unidades, dependiendo de la capacidad de tratamiento de la planta, operativamente con una alta eficiencia en la gestión de los recursos hídricos en la calidad de gestión, debe estar que se requiere los componentes laborales para el personal que trabaja en la gestión de la planta.

### 2. COMPONENTES DEL SISTEMA

Las partes que a continuación se describen son las siguientes:

- Módulo de agua y compuestos
- Módulo de agua y compuestos
- Módulo de agua y compuestos
- Módulo de agua y compuestos
- Módulo de agua y compuestos
- Módulo de agua y compuestos

Cada uno de estos procesos se encuentra con el sistema de tratamiento de agua, dependiendo de la capacidad de la planta de tratamiento.



### 1. UBICACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO

A continuación, se presentan los detalles de las plantas para la localización de la planta de tratamiento.

#### 1.1. LOTE 1

Artículo 100, modificado por el artículo 23 de la resolución 0779 de 2011. ARTÍCULO 100. Ubicación de la planta de tratamiento. Las aguas que deben considerarse en la ubicación de la PTA son las siguientes:

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. | El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. |
| El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. | El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. |
| El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. | El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. |
| El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. | El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. |
| El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. | El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. |
| El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. | El agua de lluvia que cae sobre la zona de construcción de la planta, verificada de acuerdo con los datos según el plano de la Planta de Tratamiento, o del Plan de Ordenamiento Territorial, o del Sistema de Ordenamiento Territorial. |

## 8. ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo a las observaciones de mejora realizadas por la interventoría, el mes anterior, en cuanto a los Diseños Hidráulicos, el Contratista Consultor, para el periodo de la presente semana, entrega los documentos ajustados, los cuales serán revisados nuevamente para su aprobación.

**ALEJANDRO CESPEDES**  
REPRESENTANTE LEGAL / ENTIDAD DE INTERVENTORÍA
