

 Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 CONTRATO No. C-391-2025 - MC-105-2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	10 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	C-391-2025 - MC-105-2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERÍA CUMBRE S A S / RL Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo				
NIT	900868183 1				
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES SECTORES CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA ORIENTACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.				
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$35.805.200)				
VALOR PARCIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$35.804.726)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	3 días	FECHA INICIACIÓN	29/12/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
SUSPENSIÓN N° 001	POR DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 18 DE ENERO DE 2026.				
SUSPENSIÓN N° 002	POR CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2026.				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026.				

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)	NIVEL DE AVANCE %
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN HORIZONTAL DE VÍAS PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO.	Se verificó la ejecución de esta actividad, la cual consistió en el suministro, transporte y aplicación de pintura plástica en frío para la demarcación horizontal de vías en los	105.86%

 Municipio de Pensilvania Nº 890801137-7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO		VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA: 20-03-2025
	sectores priorizados. Durante la ejecución realizamos seguimiento a la correcta preparación de la superficie, la aplicación del material y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, como resultado de un balance de cantidades realizado durante la ejecución del contrato, priorizamos ampliar la cobertura de este ítem, redistribuyendo recursos provenientes de actividades que finalmente no fueron ejecutadas, con el fin de fortalecer la señalización horizontal y mejorar las condiciones de seguridad vial, ejecutándose en total 104.8 m2		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN PASOS PEATONALES, LÍNEAS DE PARE, SÍMBOLOS, TEXTOS Y OTROS CON PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO MÉTODO LLANA.	Se comprobó la ejecución de este ítem mediante la demarcación de pasos peatonales, líneas de pare, símbolos y demás elementos de señalización horizontal en los puntos definidos para la intervención. La aplicación del material se realizó mediante el método de llana, garantizando la adecuada adherencia del material y la visibilidad de las marcas viales, contribuyendo a mejorar las condiciones de tránsito y seguridad para peatones y conductores. Así mismo, como resultado de un balance de cantidades realizado durante la ejecución del contrato, priorizamos ampliar la cobertura de este ítem, redistribuyendo recursos provenientes de actividades que finalmente no fueron ejecutadas, con el fin de fortalecer la señalización horizontal y mejorar las condiciones de seguridad vial, ejecutándose en total 92.4 m2		102.67%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN LÍNEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO APLICADA CON	En desarrollo de nuestras labores de supervisión y tras realizar un balance de cantidades durante la ejecución del contrato, determinamos no ejecutar este ítem, toda vez que se priorizó ampliar la		0%

 Municipio de Pensilvania Nit 9908011277	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

VEHÍCULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS) ANCHO 12 CMS.	cobertura de la demarcación horizontal contemplada en el ítem 1.1 y 1.2, al evidenciarse que esta intervención generaba un mayor impacto en materia de organización del tránsito y seguridad vial en los sectores intervenidos.	
FRESADO DE MARCAS VIALES.	Durante la supervisión técnica realizada en campo, evidenciamos que en los sectores intervenidos no se presentaban condiciones que hicieran necesario el fresado de marcas viales existentes. En consecuencia, esta actividad no fue ejecutada y, en el marco del balance de cantidades efectuado durante la ejecución contractual, se priorizó la inversión en actividades de demarcación vial con mayor necesidad en campo, particularmente el ítem 1.1 y 1.2.	0%
INSTALACIÓN DE REDUCTORES EXISTENTES (INCLUYE MANO DE OBRA, PEGANTE, PERNOS DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN).	En el marco de la supervisión verificamos la correcta instalación de reductores de velocidad existentes en los puntos definidos para la intervención. Esta actividad incluyó las labores de mano de obra, aplicación de pegante, instalación de pernos de anclaje y demás elementos necesarios para garantizar su adecuada fijación a la superficie de la vía, contribuyendo a la reducción de la velocidad vehicular y al mejoramiento de la seguridad vial.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDUCTORES PLÁSTICOS (INCLUYE MANO DE OBRA, PEGANTE, PERNOS DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN).	Verificamos el suministro, transporte e instalación de reductores plásticos en los sectores priorizados, incluyendo la mano de obra y los elementos necesarios para su adecuada fijación. Durante la supervisión constatamos que los reductores fueron correctamente anclados a la superficie de la vía, cumpliendo su función de control de velocidad y aportando al ordenamiento del tránsito en las zonas intervenidas.	100%

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio de
Pensilvania
Nal. 550801337-7

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


GESTIÓN PARA EL GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN

FO-GG-22

VERSIÓN 2.0

FECHA: 20-03-2025

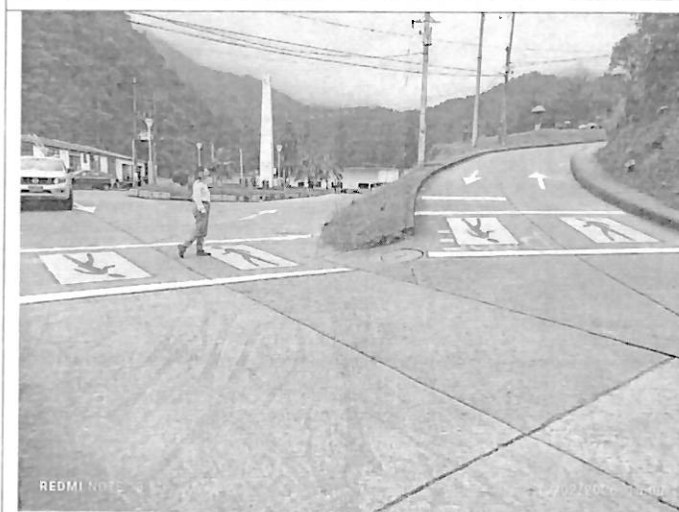

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	09/02/2026	47662731	401.500
PENSIÓN	09/02/2026	47662731	513.800
RIESGOS LABORALES	09/02/2026	47662731	223.800
CCF	09/02/2026	47662731	128.700
ICBF	09/02/2026	47662731	96.600
SENA	09/02/2026	47662731	1.429.000


 Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta de ahorros N° 101-455005-62 del Bancolombia.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro. 001.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma: 
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISOR	MARIA PAULA JARAMILLO LOAIZA Contratista	Firma: 
