



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Cubará, 3 de febrero de 2026

AQUITECTO  
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA  
SUPERVISOR  
ALCALDIA DE CUBARA

REFERENCIA **CONTRATO DE OBRA NO. SAMC-013-2025**  
**"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA"**

#### OFICIO DE ENTREGA DE INFORME

Yo, Gladys Xiomara Manrique, en calidad de Representante Legal de CONSTRUINDUCIVIL SAS, hago entrega del informe final del contrato en referencia, el cual se remite con todos los anexos y soportes correspondientes, de conformidad con lo solicitado por la entidad para su respectiva revisión y aprobación

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional que considere pertinente

Atentamente,

*Xiomara Manrique B.*  
CONSTRUINDUCIVIL SAS

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.  
Nit.901.375.684-5



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# INFORME FINAL

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

## INFORME DE OBRA FINAL



**CONTRATO DE OBRA No. SAMC -013-2025**

**PERIODO DEL INFORME: 29 de SEPTIEMBRE al 16 DE NOVIEMBRE del 2025**

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**OBJETO:**

**"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE  
ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA".**

**CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.  
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**

**ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA – SUPERVISOR**

**CUBARÁ, 2025**

**CONSTRUINDUCIVIL**

**NIT. 901375684-5**



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN .....	5
<b>1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES</b> .....	<b>6</b>
PROCESO DE SELECCIÓN .....	6
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO .....	6
<b>2 ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO</b> .....	<b>7</b>
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL .....	7
2.2 LOCALIZACIÓN .....	7
2.3 ALCANCE .....	8
<b>3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</b> .....	<b>9</b>
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA .....	9
3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA .....	9
3.1.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO .....	9
3.1.3 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN .....	10
3.2 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES .....	11
3.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS .....	11
3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA .....	12
3.5 BITACORA DIARIA DE OBRA .....	13
3.6 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES .....	13
3.6.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO .....	13
3.6.2 PERSONAL VINCULADO .....	14
3.6.3 PERSONAL OPERATIVO VINCULADO .....	15
3.6.4 CERTIFICACIONES PARAFISCALES .....	17
3.7 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL .....	17
DOTACIÓN DEL PERSONAL .....	17
ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA .....	20
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA .....	21
<b>4 ASPECTOS TÉCNICOS</b> .....	<b>22</b>
4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES .....	22
4.2 MODIFICACIONES O ADICIONALES AL CONTRATO .....	23
4.3 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA .....	23
4.3.1 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL .....	24
REGISTRO FOTOGRAFICO .....	25
4.4 MANEJO DE ANTICIPO .....	33
4.5 ENSAYOS DE LABORATORIOS .....	33
<b>5 ASPECTOS FINANCIEROS</b> .....	<b>34</b>
5.1 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL .....	34
5.2 PROGRAMACION DE OBRA .....	35
<b>6 IMPREVISTOS</b> .....	<b>37</b>
<b>7 CONCLUSIONES</b> .....	<b>39</b>

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

**LISTA DE TABLAS**

Tabla Ficha técnica del contrato .....	
Tabla Pólizas según contrato de obra No. SAMC -013-2025.....	
Tabla Pólizas según acta de inicio.....	
Tabla Pólizas según acta de prorroga N° 1 .....	
Tabla Actos Administrativos Contrato de Obra No. SAMC -013-2025.....	
Tabla Personal mínimo requerido .....	
Tabla Profesionales PAGA.....	
Tabla Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S SEPTIEMBRE .....	
Tabla Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S OCTUBRE.....	
Tabla Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S NOVIEMBRE .....	
Tabla Personal administrativo vinculado mes de SEPTIEMBRE de 2025 .....	
Tabla Personal administrativo vinculado mes de OCTUBRE de 2025.....	
Tabla Personal administrativo vinculado mes de NOVIEMBRE de 2025.....	
Tabla Personal técnico vinculado mes de SEPTIEMBRE de 2025 .....	
Tabla Personal técnico vinculado mes de OCTUBRE de 2025 .....	
Tabla Personal técnico vinculado mes de NOVIEMBRE de 2025 .....	
Tabla Seguimiento entrega de elementos de protección .....	
Tabla Control maquinaria y equipo en obra.....	
Tabla Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. SAMC -013-2025.....	
Tabla Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. SAMC -013-2025.....	
Tabla Avance físico de la Obra .....	
Tabla Avance en tiempo.....	
Tabla Ensayos de laboratorio .....	
Tabla Avance financiero .....	
Tabla Avance programado vs ejecutado.....	

**LISTA DE ILUSTRACIONES**

Ilustración Ubicación general del Municipio de Cubará.....	
Ilustración Ubicación específica del sector a intervenir.....	
Ilustración Socialización del proyecto.....	
Ilustración Señalizaciones zonas de trabajo .....	
Ilustración entrega de dotación a personal.....	
Ilustración registro fotográfico, cilindros.....	
Ilustración Imprevistos por lluvias.....	
Ilustración Imprevistos por lluvias en obra.....	

**LISTA DE ANEXOS**

ANEXO 1. Pólizas .....	
ANEXO 2. Pólizas de obra .....	
ANEXO 3. Planillas de Seguridad Social .....	
ANEXO 4. Nomina .....	
ANEXO 5. Actas .....	
ANEXO 6. Registro Fotográfico .....	
ANEXO 7. Memorias de cantidades .....	
ANEXO 8. Ensayos de Laboratorios .....	

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

## INTRODUCCIÓN

La alcaldía Municipal de Cubará mediante Obra Pública No. SAMC -013-2025 contrató a **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** representada legalmente por **GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA** para el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA"**.

El seguimiento de las actividades contractuales está siendo realizada por la oficina de Planeación Y Obras Publicas Del Municipio De Cubara en cabeza de su secretario, el Arquitecto Jesús Iván Quiñones Rueda

El presente informe es realizado por **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S**, del contrato de Obra Pública No. SAMC -013-2025. El cual contiene la acumulación de las actividades ejecutadas para el informe FINAL al contrato de obra, que comprende el periodo del 29 de Septiembre al 16 de Noviembre de 2025, estas actividades principalmente son:

### 1,00 PRELIMINARES

- 1,01 localización y replanteo de obra arquitectónica (no incluye comisión topográfica)
- 1,02 descapote manual (hasta 20 cm ) distancia de 5 km m2
- 1,03 demolición de andén o placa de contrapiso en concreto e >a 12 cm. (incluye retiro y m2 acarreo libre hasta 5 km.)
- 1,04 relleno con material de afirmado m3 compactado rana
- 1,05 excavación manual en material común

### 2,00 CONSTRUCCION DE ANDENES

- 2,01 concreto estriado rampas (3000 psi) e=10cm, incluye instalación de malla electrosoldada 6 mm (15cm·15cm)
- 2,02 placa de piso en concreto de 3000 psi e= 10 cm, incluye estampado color vainilla brillo medio y malla m2 electrosoldada 6 mm (15cm·15cm)
- 2,03 placa de piso en concreto de 3000 psi e= 10 cm, incluye estampado color marron brillo medio y malla m2 electrosoldada 6 mm (15cm·15cm)
- 2,04 loseta prefabricada color amarilla a-50 (40x40x6), incluye mortero 1:4 de nivelación 4 cm y emboquillado.
- 2,05 loseta prefabricada gris a-50 (40x40x6), incluye mortero 1 :4 de nivelación 4 cm y emboquillado.
- 2,08 contenedor de raíces
- 2,07 bordillo para zona verde
- 2,08 construcción de bordillo de 10 x 30 cm. Fundido en concreto de 17.5 mpa. (incluye refuerzo.
- 2,09 siembra de árboles nativos altura h=1,2 -1,5
- 2,10 suministro e instalación de cestas de basura en acero

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

El informe contiene la ejecución técnica, administrativa, financiera del contrato de obra arriba mencionado, en el marco del sistema de calidad y las exigencias de la Entidad Contratante contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:

**Trabajos ejecutados:** descripción general de las obras ejecutadas evaluadas técnicamente de acuerdo a las especificaciones y diseños para el cumplimiento de los objetivos.

**Aspectos Administrativos:** Manejo administrativo de todos los documentos y trámites legales correspondientes, legalización, pólizas, actas, personal y equipo empleado para la ejecución de las obras.

**Aspectos Técnicos:** Control sobre la ejecución diaria de las actividades de obra dentro de los parámetros técnicos establecidos, utilizando el equipo y personal idóneo en la realización de los trabajos.

**Aspecto Financiero:** Control sobre la ejecución financiera del Contrato de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo.

**Control de Calidad:** control diario ejecución de obras, utilizando materiales de calidad y el personal idóneo en la ejecución de los trabajos.

## 1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES

### PROCESO DE SELECCIÓN

La Administración Municipal de Cubará mediante la Resolución N° 0298 del 04 de Agosto de 2025 realizó la apertura del Proceso DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-013-2025, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2025000427 del 28 de Julio de 2025.

Mediante la resolución de adjudicación No. 0318 del 15 de Agosto del 2025, se adjudica el proceso DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-013-2025, para verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales de la propuesta presentada por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. representada por GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

### CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Se procedió a la suscripción del contrato de obra No SAMC-013-2025 el día 15 de Agosto del 2025 entre el señor alcalde del Municipio de Cubará y la firma contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. representada por GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA, el cual tiene por objeto **MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA**, con un plazo de ejecución de treinta (30) DIAS y un valor de \$ 199.994.798,00

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

2

**ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO**

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

## 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL


En el municipio de Cubará, la Carrera 9 constituye una vía principal del casco urbano, con funciones estratégicas de conectividad, acceso a viviendas, establecimientos comerciales, instituciones educativas y dependencias administrativas. No obstante, el tramo comprendido entre la calle 3ª y la diagonal 2ª presenta una alarmante carencia de andenes peatonales adecuados. Las superficies irregulares, la inexistencia de rampas, la falta de confinamiento en las zonas verdes y la ausencia de señalización táctil o elementos de accesibilidad, configuran un entorno hostil e inseguro para los peatones, en especial para niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida y madres con coche. Esta situación no solo expone a los transeúntes al riesgo permanente de accidentes de tránsito, debido al flujo mixto sin separación física entre vehículos y peatones, sino que también vulnera las disposiciones técnicas contenidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y en la Cartilla de Andenes del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las cuales establecen parámetros mínimos para garantizar un tránsito peatonal seguro, accesible y continuo. La falta de intervención en este tramo ha generado un deterioro progresivo en la calidad del espacio público, aumentando la percepción de inseguridad y dificultando el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

Una de las apuestas del plan de desarrollo municipal está orientada a mejorar la infraestructura vial y peatonal del municipio con el objetivo de cerrar las brechas y mejorar la calidad de vida de los habitantes, en tal sentido se ha priorizado sectores estratégicos que permitirán articular la malla vial urbana para generar una movilidad óptima y segura para la población del municipio de Cubará.

## 2.2 LOCALIZACIÓN

- Este proyecto se llevará a cabo en la zona urbana del Municipio de Cubará, Departamento de Boyacá específicamente en la carrera 9 entre calles 3 y diagonal 2 del barrio el jardín.

### Ilustración Ubicación general del Municipio de Cubará

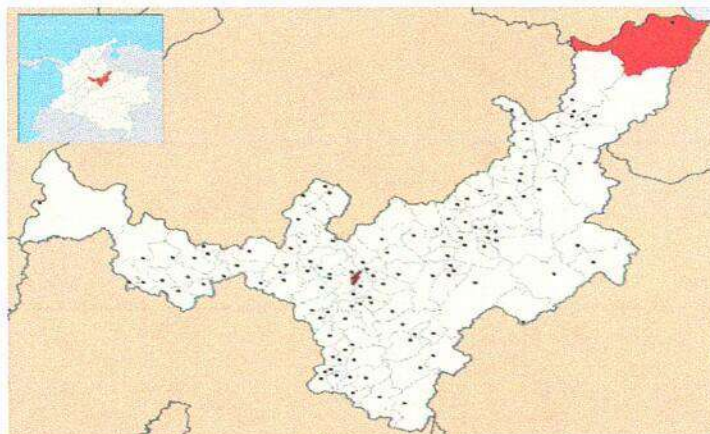

Fuente: [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia\\_-\\_Boyaca\\_-\\_Cubara.svg](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Boyaca_-_Cubara.svg)

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

### Ilustración Ubicación específica del sector a intervenir



Fuente: Propia



### 2.3 ALCANCE

El contrato de obra No. **SAMC-013-2025** dio inicio el 29 de septiembre de 2025 y se encuentra ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad el objetivo "**MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA**", teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y principalmente cumplir con las expectativas de la entidad contratante en pro de entregar una obra de buena calidad a la comunidad del sector.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

### 3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

#### 3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

##### 3.1.1 Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de obra

Tabla Ficha técnica del contrato

<b>FICHA TECNICA DEL CONTRATO</b>	
<b>CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO</b>	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARA
SUPERVISOR:	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
CONTRATO No:	SAMC-013-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA
CONTRATISTA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
NIT. No:	901.375.684-5
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$199.994.798) M/CTE..
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	TREINTA (30) DIAS
FECHA INICIO:	29/ 09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28/10/2025
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUTADO
<b>MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL</b>	
MODIFICACIÓN No.01 PRORROGA No. 01	24 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO PRORROGAL:	VEINTE (20) DIAS
PLAZO CONTRACTUAL FINAL:	CINCUENTA (50) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	19/12/2025

##### 3.1.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Cubara en el Contrato de Obra No. SAMC-013-2025, se suscribe con la compañía de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

### 3.1.3 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas según contrato de obra fueron expedidas el 19/08/2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, tomadas por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y como beneficiario el Municipio de Cubará.

**Tabla** Pólizas según contrato de obra No. SAMC-013-2025

POLIZAS SUSCRITAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-013-2025				
ANEXO	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA
0	625-47-994000003206 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	15/08/2025	20/03/2026
		Anticipo	15/08/2025	20/01/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	15/08/2025	20/09/2028
		Estabilidad y Calidad de la obra	Si Ampara 5 Años	
		Calidad del bien	15/08/2025	20/03/2026

Las pólizas según acta de inicio fueron expedidas el 30/09/2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, tomadas por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y como beneficiario el Municipio de Cubará.

**Tabla** Pólizas según acta de inicio

POLIZAS SUSCRITAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-013-2025				
ANEXO	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA
1	625-47-994000003206 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	29/09/2025	05/05/2026
		Anticipo	29/09/2025	07/03/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	29/09/2025	05/11/2028
		Estabilidad y Calidad de la obra	Si Ampara 5 Años	
		Calidad del bien	29/09/2025	05/05/2026

Las pólizas según acta de prórroga fueron expedidas el 27/10/2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, tomadas por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y como beneficiario el Municipio de Cubará.

**Tabla** Pólizas según acta de prórroga N° 1

POLIZAS SUSCRITAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-013-2025				
ANEXO	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA
2	625-47-994000003206 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	29/09/2025	26/05/2026
		Anticipo	29/09/2025	28/03/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	29/09/2025	26/11/2028
		Estabilidad y Calidad de la obra	Si Ampara 5 Años	
		Calidad del bien	29/09/2025	26/05/2026

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



Las pólizas según acta de recibo final fueron expedidas el 26/10/2025 por la Aseguradora Solidaria de Colombia, formadas por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y como beneficiario el Municipio de Cubará. ES  
NIT. 901375684-5

**Tabla.** Pólizas según acta de recibo final

POLIZAS SUSCRITAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-013-2025				
ANEXO	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA
3	625-47-994000003206 Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	29/09/2025	27/05/2026
		Anticipo	29/09/2025	30/03/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	29/09/2025	26/11/2028
		Estabilidad y Calidad de la obra	Si Ampara 5 Años	
		Calidad del bien	29/09/2025	27/05/2026

### ANEXO. Pólizas

#### 3.2 IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe el contrato de obra No. SAMC-013-2025, suscrito con CONSTRUINDUCIVIL S.A.S no presenta ningún requerimiento o imposición de multas o sanciones sobre las obligaciones contractuales.

#### 3.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

**Tabla** Actos Administrativos Contrato de Obra No SAMC-013-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
29/09/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de obra No. SAMC-013-2025	<b>SUPERVISIÓN:</b> JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-013-2025 <b>CONTRATISTA:</b> CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5 <b>ALCALDE MUNICIPAL:</b> GILDARDO MURCIA
19/09/2025	Acta de socialización	Socialización del proyecto del contrato No SAMC-013-2025	Asistentes: representantes de la administración municipal, presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas, contratista de obra, supervisión y comunidad beneficiada
14/07/2025	Modificación N. 1 prorroga N.1	Acta de prorroga N.1 al contrato de obra No. SAMC-013-2025	<b>SUPERVISIÓN:</b> JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-013-2025. <b>CONTRATISTA:</b> CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5 <b>ALCALDE MUNICIPAL:</b> GILDARDO MURCIA

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
NIT. 901.375.684-5			<b>CONTRATISTA:</b> CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5
19/12/2025	ACTA DE RECIBO FINAL	SUSCRIBIR ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-013-2025.	<b>SUPERVISIÓN:</b> JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC-013-2025 <b>CONTRATISTA:</b> CONSTRUINDUCIVIL SAS R/L GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA NIT. 901.375.684-5 <b>ALCALDE MUNICIPAL:</b> GILDARDO MURCIA

**Acta de Inicio:** Se realiza con el propósito de dar inicio a la ejecución del Contrato de Obra Pública No SAMC-013-2025, suscrito previamente entre el contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S y la entidad contratante la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CUBARA. En el acta de inicio se establece la fecha de finalización para el día 28 de Octubre de 2025 y es firmada el día 29 de Septiembre de 2025 por el contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S representado legalmente por GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA, Supervisor JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA

**Acta de Socialización:** Para este proceso CONSTRUINDUCIVIL S.A.S convocó a una reunión en las instalaciones de la ALCALDIA ESPECIAL DE CUBARÁ, el día 19 de Septiembre de 2025 a las 9:00 a.m, a la que asistieron representantes de la administración, los presidentes de las comunidades beneficiadas e involucradas con el proyecto, contratista de obra, supervisión y comunidad beneficiada, donde se dio a conocer el alcance del contrato, el presupuesto destinado para la ejecución de las actividades contempladas, se realizó la presentación del personal profesional del contratista, contratación del personal de la zona, maquinaria a emplear, los inconvenientes posibles para el desarrollo de las actividades .

**Ilustración 1** Socialización del proyecto



### 3.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra NO se radicaron, ni se recibió ninguna notificación:

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

### 3.5 BITACORA DIARIA DE OBRA

Se realiza bitácora diaria de obra desde el día 29 de septiembre de 2025 hasta el 16 de Noviembre de 2025 día final de actividades de la presente obra. Esta es diligenciada diariamente por el Arquitecto residente de obra y El Secretario De Planeación Y Obras Públicas Municipal como Supervisor de la obra y si hay lugar a alguna observación por parte de algún profesional este la realiza de manera escrita plasmando su firma junto a esta. La bitácora es abierta y suscrita por los firmantes.

#### ANEXO. Bitácoras de obra

### 3.6 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

#### 3.6.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El contratista CONSTRUINDUCIVIL S.A.S entregó la documentación del personal profesional exigido en el Proceso de Licitación de Obra Pública No SAMC-013-2025, para inicio de actividades.

En el presente cuadro se especifica los nombres de los profesionales propuestos por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

**Tabla** Personal mínimo requerido

No.	DOCUMENTACION PRESENTADA	OBSERVACION
1	Hojas de vida del personal profesional	<b>Residente de Obra:</b> CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA ARQUITECTO M.P. A68232001-91496344



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

El Personal profesional propuesto por el contratista fue evaluado por la SUPERVISION para verificar que dicho personal cumpliera con los requerimientos del contrato de Obra Pública No SAMC-013-2025

En la verificación de las hojas de vida del personal profesional se pudo evidenciar que efectivamente cumplen con los requerimientos de Obra Pública No SAMC-013-2025

Una vez realizada la verificación, se procedió a informar a la entidad contratante la evaluación realizada por la supervisión y finalmente emitir un concepto favorable que permitiera garantizar la idoneidad del personal profesional a cargo de la ejecución del Contrato de Obra No. SAMC-013-2025

### 3.6.2 PERSONAL VINCULADO

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra No. SAMC-013-2025, se realizaron las afiliaciones de personal administrativo, la supervisión verificó que el personal ingresado a laborar contara con las afiliaciones pertinentes para el inicio de sus trabajos. Teniendo en cuenta que inicialmente se realizó una suspensión del contrato de obra, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona, esto sumado a los tiempos en los que el contratista tarde en solicitar el personal, y realizar las afiliaciones correspondientes y los exámenes médicos del personal, las actividades de obra dieron inicio el día 29 de SEPTIEMBRE del 2025, por lo que el personal inicio labores en esta fecha.

A continuación, se relaciona el personal del contratista vinculado a CONSTRUINDUCIVIL S.A.S, identificando las empresas prestadoras de servicios para cada uno de ellos.

**Tabla Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S SEPTIEMBRE**

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA	1049397338	R/L	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	34071564

**Tabla 1 Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S OCTUBRE**

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA	1049397338	R/L	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	34386823

**Tabla. Representante legal CONSTRUINDUCIVIL S.A.S NOVIEMBRE**

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA	1049397338	R/L	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	35621248

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)


**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**
**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

 NIT. 9013 **Tabla** Personal administrativo vinculado mes de septiembre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA	91496344	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	34920970

**Tabla** Personal administrativo vinculado mes de octubre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA	91496344	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35256845

**Tabla** Personal administrativo vinculado mes de noviembre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA
				EPS	AFP	ARL		
1	CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA	91496344	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35621366

### 3.6.3 PERSONAL OPERATIVO VINCULADO

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra No. SAMC-013-2025, El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

**Tabla** Personal técnico vinculado mes de septiembre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA	FECHA INGRESO PERSONAL
				EPS	AFP	ARL			
1	CHAPETA SILVA CESAR	5.492.210	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	34920970	29-09-2025
2	VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN	9.466.184	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	34920970	29-09-2025
3	GARCIA DURAN JUAN DE JESUS	9.466.571	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	34920970	29-09-2025
4	OCHOA OLMEDO	96.123.880	OFICIAL DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COMFABOY	34920970	29-09-2025
5	GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL	1.049.393.372	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	34920970	29-09-2025
6	AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE	1.094.243.208	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	34920970	29-09-2025
7	MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA	1.118.565.441	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	34920970	29-07-2025

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)


**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**
**Tabla 2** Personal técnico vinculado mes de octubre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACION	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA	FECHA RETIRO PERSONAL
				EPS	AFP	ARL			
1	CHAPETA SILVA CESAR	5.492.210	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35256845	
2	VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN	9.466.184	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35256845	
3	GARCIA DURAN JUAN DE JESUS	9.466.571	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35256845	
4	GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL	1.049.393.372	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35256845	
5	AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE	1.094.243.208	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35256845	
6	MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA	1.118.565.441	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35256845	

**Tabla 3.** Personal técnico vinculado mes de noviembre de 2025

N	NOMBRE	N° DE IDENTIFICACION	CARGO	AFILIADO A			CAJA DE COMPENSACION	No. PLANILLA	FECHA DE RETIRO PERSONAL
				EPS	AFP	ARL			
1	CHAPETA SILVA CESAR	5.492.210	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35621366	05/10/2025
2	VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN	9.466.184	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35621366	16/10/2025
3	GARCIA DURAN JUAN DE JESUS	9.466.571	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35621366	05/10/2025
4	GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL	1.049.393.372	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35621366	16/10/2025
5	AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE	1.094.243.208	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35621366	05/10/2025
6	MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA	1.118.565.441	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY	35621366	05/10/2025

**ANEXO. Planillas de Seguridad Social**
**ANEXO. Nomina**

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



3.6.4. CERTIFICACIONES PARAFISCALES  
**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Como parte del cierre administrativo del contrato, se anexan las certificaciones de cumplimiento de aportes parafiscales, con el fin de acreditar que se encuentran al día los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y a las contribuciones parafiscales a favor del SENA, Cajas de Compensación Familiar. Dichas certificaciones garantizan el cumplimiento de las obligaciones laborales y legales derivadas de la ejecución del contrato, requisito indispensable para la aprobación del presente informe final y la liquidación del contrato.

#### **ANEXO. Certificado Parafiscales FIC, CONFABOY, SENA**

#### **DOTACIÓN DEL PERSONAL**

El contratista suministro los equipos y elementos de protección personal (EPP) e igualmente, desarrolló las acciones necesarias para que fueran utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de

los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. Los elementos de protección personal fueron entregados por CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. Se anexan al final del presente documento las respectivas actas de entrega de dotación debidamente diligenciadas por los integrantes del personal de obra.



☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



CONS  
NIT



REGRALES

**Ilustración.** entrega de dotación a personal

Los suministros de dotación y elementos de protección personal "EPP" entregados por el contratista al personal de obra fueron: Pantalón, Camisa, Casco protector, Guantes reforzados, Tapa oídos y Gafas de seguridad.

**Tabla 4.** Seguimiento entrega de elementos de protección

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGA DOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Sí	N	Bueno	Regul	Malo	
<b>PROTECCION DE MANOS</b>						
Guantes reforzados	X		X			CHAPETA SILVA CESAR OCHOA OLMEDO VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN GARCIA DURAN JUAN DE JESUS GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA
<b>PROTECCION DE OJOS</b>						
Gafas de seguridad	X		X			CHAPETA SILVA CESAR VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN GARCIA DURAN JUAN DE JESUS GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGA DOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	SI	N	Bueno	Regul	Malo	
<b>PROTECCION AUDITIVA</b>						
Tapa oídos	X		X			CHAPETA SILVA CESAR VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN GARCIA DURAN JUAN DE JESUS GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA
<b>PROTECCION DE CUERPO</b>						
Camisa manga larga	X		X			CHAPETA SILVA CESAR VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN GARCIA DURAN JUAN DE JESUS GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA
Pantalón	X		X			CHAPETA SILVA CESAR VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN GARCIA DURAN JUAN DE JESUS GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA



ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGA DOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	N	Bueno	Regul	Malo	
Botas	X		X			CHAPETA SILVA CESAR VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN GARCIA DURAN JUAN DE JESUS GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA
<b>PROTECCION DE CABEZA</b>						
Casco	X		X			CHAPETA SILVA CESAR VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN GARCIA DURAN JUAN DE JESUS GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE MANRIQUE AGUDEL GEIDY ESPERANZA

### ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA

Durante la ejecución del proyecto se estuvo pendiente del registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el presente periodo de ejecución de la obra **NO** se presentaron accidentes laborales en la ejecución del contrato No. SAMC-013-2025.

Por otro lado, también se estuvo pendiente de cualquier accidente que se hubiese podido ocasionar a terceros en razón de la ejecución de la obra. Para el periodo de ejecución de la obra **NO** se presentaron accidentes a terceros en la ejecución del contrato No. SAMC-013-2025

### SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

#### VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

El contratista de obra desarrolló acciones de vigilancia de la Salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica; con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la Salud derivados de los ambientes de Trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
 Examen médico  
 NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

Previo a la incorporación al Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025, el contratista les informo a sus trabajadores de la importancia de verificar su estado de salud, para ello se les realizó los respectivos exámenes de ingreso con el fin de conocer si estos se encontraban en condiciones óptimas de salud para desempeñarse en las diferentes actividades a ejecutar.

La interventoría realizó el respectivo control y revisión de los exámenes de cada uno de los trabajadores para verificar su estado de salud y si está en óptimas condiciones para desarrollar las actividades del presente contrato.

### CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA


La supervisión verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así

mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

La maquinaria y equipo que el contratista utilizó durante el periodo del presente informe fue el siguiente:

**Tabla. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA**

<b>Tipo:</b>	MEZCLADORA DE CONCRETO	
<b>Estado:</b>	Bueno	
<b>Regularidad del mantenimiento:</b>	Mensual	
<b>Vibraciones/ Ruidos:</b>	(No presenta/ presenta)	
<b>Idoneidad de operarios:</b>	idóneo	

<b>Tipo:</b>	Compactador manual	
<b>Estado:</b>	Bueno	
<b>Regularidad del mantenimiento:</b>	Mensual	
<b>Vibraciones/ Ruidos:</b>	(No presenta/ presenta)	
<b>Idoneidad de operarios:</b>	idóneo	

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Por otro lado, se realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO			
	MES 1		MES 2	
	SI	NO	SI	NO
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.	X		x	
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X		x	

#### 4 ASPECTOS TECNICOS

##### 4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Municipio de Cubara y la firma contratista CONSTRUINDUCIVIL contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de cincuenta (50) días.

**Tabla 5 Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No SAMC-013-2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INICIAL
1,00	PRELIMINARES				\$ 27.921.031,00
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE URBANISMO	M2	512,04	\$ 4.104,00	\$ 2.101.412,00
1,02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 KM	M2	494,04	\$ 13.020,00	\$ 6.432.401,00
1,03	DEMOLICION ANDENES EN CONCRETO	M2	18,00	\$ 44.852,00	\$ 807.336,00

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INICIAL
1,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO	M3	92,30	\$ 121.901,11	\$ 11.250.888,00
1,05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	79,92	\$ 91.703,00	\$ 7.326.994,00
<b>2,00</b>	<b>URBANISMO Y CERRAMIENTO</b>				<b>\$ 122.450.996,93</b>
2,01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	M2	49,69	\$ 159.382,00	\$ 7.919.692,00
2,02	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	M2	129,63	\$ 200.117,00	\$ 25.941.167,00
2,03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	M2	126,63	\$ 187.736,65	\$ 23.773.092,00
2,04	LOSETA PREFABRICADA COLOR A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM. Y SELLO DE ARENA	M2	75,20	\$ 173.282,66	\$ 13.030.855,93
2,05	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM. Y SELLO DE ARENA	M2	53,76	\$ 134.140,06	\$ 7.211.369,63
2,06	CONTENEDOR DE RAÍCES	UND	26,00	\$ 293.284,00	\$ 7.625.384,00
2,07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	ML	184,80	\$ 44.127,00	\$ 8.154.669,60
2,08	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO)	ML	252,82	\$ 97.918,00	\$ 24.755.628,76
2,09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2 -1,5	UND	26,00	\$ 104.573,00	\$ 2.718.898,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	UND	1,00	\$ 1.320.240,00	\$ 1.320.240,00
<b>COSTO DIRECTO DE LA OBRA</b>					<b>\$ 150.372.027,93</b>
<b>ADMINISTRACION 24%</b>					<b>\$ 36.089.287,00</b>
<b>IMPREVISTO 2%</b>					<b>\$ 3.007.441,00</b>
<b>UTILIDAD 7%</b>					<b>\$ 10.526.042,00</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>\$ 199.994.798,00</b>

#### 4.2 MODIFICACIONES O ADICIONALES AL CONTRATO

No se presentaron ninguna modificación de actividades ni adicionales en valor al contrato

#### 4.3 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del contrato que abarca desde del 29 de septiembre al 16 de noviembre de 2025, se ejecutaron las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

**Tabla 6 Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. SAMC-013-2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR INICIAL
1,00	PRELIMINARES					\$ 27.921.031,00
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE URBANISMO	M2	512,04	512,04	\$ 4.104,00	\$ 2.101.412,00
1,02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 KM	M2	494,04	494,04	\$ 13.020,00	\$ 6.432.401,00
1,03	DEMOLICION ANDENES EN CONCRETO	M2	18,00	18,00	\$ 44.852,00	\$ 807.336,00

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO		M3	92,30	92,30	\$ 121.901,11	\$ 11.250.888,00
1,05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 375684-5	M3	79,92	79,92	\$ 91.703,00	\$ 7.328.994,00
2,00	<b>URBANISMO Y CERRAMIENTO</b>					\$ 122.450.996,93
2,01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	M2	49,69	49,69	\$ 159.382,00	\$ 7.919.692,00
2,02	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	M2	129,63	129,63	\$ 200.117,00	\$ 25.941.167,00
2,03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	M2	126,63	126,63	\$ 187.736,65	\$ 23.773.092,00
2,04	LOSETA PREFABRICADA COLOR A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION 4 CM. Y SELLO DE ARENA	M2	75,20	75,20	\$ 173.282,66	\$ 13.030.855,93
2,05	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION 4 CM. Y SELLO DE ARENA	M2	53,76	53,76	\$ 134.140,06	\$ 7.211.369,63
2,06	CONTENEDOR DE RAICES	UND	26,00	26,00	\$ 293.284,00	\$ 7.625.384,00
2,07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	ML	184,80	184,80	\$ 44.127,00	\$ 8.154.669,60
2,08	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO)	ML	252,82	252,82	\$ 97.918,00	\$ 24.755.628,76
2,09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2-1,5	UND	26,00	26,00	\$ 104.573,00	\$ 2.718.898,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	UND	1,00	1,00	\$ 1.320.240,00	\$ 1.320.240,00

La anterior tabla ilustra las cantidades ejecutadas respecto a las contratadas durante el total de días de ejecución, teniendo un avance físico total de 100,00%.



#### 4.3.1 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual, y a la modificación en tiempo que se adiciono de los tiempos establecidos en la minuta del contrato, transcurrieron 49 días desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación de los trabajos, lo cual equivale a un 100,00% del total del plazo contractual.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

**Tabla 7. Avance en tiempo**

AVANCE EN TIEMPO	
PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)	50
TIEMPO LABORADO	49
TIEMPO RESTANTE	1
GRAFICA DE AVANCE	
PORCENTAJE LABORADO	100,00%
PORCENTAJE RESTANTE	0,00%



<b>ACTIVIDAD:</b>	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE URBANISMO		
<b>ITEM:</b>	1.01	<b>UNIDAD:</b>	M <sup>2</sup>
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	512,04	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	512,04
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	512,04	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

<b>ACTIVIDAD:</b>	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 KM		
<b>ITEM:</b>	1.02	<b>UNIDAD:</b>	M <sup>2</sup>
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	494,04	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	494,04
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	494,04	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

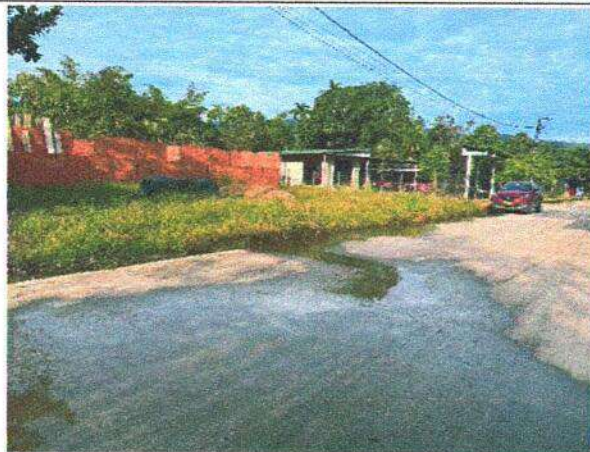

<b>ACTIVIDAD:</b>	DEMOLICION ANDENES EN CONCRETO		
<b>ITEM:</b>	1.03	<b>UNIDAD:</b>	M <sup>3</sup>
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	18,00	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	18,00
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	18,00	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)


**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**
**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

<b>ACTIVIDAD:</b>	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMACO COMPACTADO RANA		
<b>ITEM:</b>	1.04	<b>UNIDAD:</b>	M3
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	92,30	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	92,30
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	92,30	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**


<b>ACTIVIDAD:</b>	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		
<b>ITEM:</b>	1.5	<b>UNIDAD:</b>	M3
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	79,92	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	79,92
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	79,92	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**


☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

♀ Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

<b>ACTIVIDAD:</b>	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM•15CM)		
<b>ITEM:</b>	2.01	<b>UNIDAD:</b>	M <sup>2</sup>
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	49,69	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	49,69
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	49,69	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



<b>ACTIVIDAD:</b>	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM•15CM)		
<b>ITEM:</b>	2.02	<b>UNIDAD:</b>	M <sup>2</sup>
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	129,63	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	129,63
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	129,63	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100,00%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO



3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

<b>ACTIVIDAD:</b>	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM•15CM)		
<b>ITEM:</b>	2.03	<b>UNIDAD:</b>	M <sup>2</sup>
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	126,63	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	126,63
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	126,63	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



<b>ACTIVIDAD:</b>	LOSETA PREFABRICADA COLOR A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM. Y SELLO DE ARENA		
<b>ITEM:</b>	2.04	<b>UNIDAD:</b>	M <sup>2</sup>
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	75,20	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	75,20
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	75,20	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

<b>ACTIVIDAD:</b>	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM. Y SELLO DE ARENA		
<b>ITEM:</b>	2.05	<b>UNIDAD:</b>	M2
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	53,76	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	53,76
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	53,76	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



<b>ACTIVIDAD:</b>	CONTENEDOR DE RAÍCES		
<b>ITEM:</b>	2.06	<b>UNIDAD:</b>	UND
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	26,00	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	26,00
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	26,00	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>PORCENTAJE POR EJECUTAR:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



## CONSTRUCCION CIVIL


<b>ACTIVIDAD:</b>	BORDILLO PARA ZONA VERDE		
<b>ITEM:</b>	2.07	<b>UNIDAD:</b>	ML
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	184,80	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	184,80
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	184,80	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100,00%	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	0,00%

## REGISTRO FOTOGRAFICO



<b>ACTIVIDAD:</b>	"CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO)." "		
<b>ITEM:</b>	2.08	<b>UNIDAD:</b>	ML
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	252,82	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	233,46
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	252,82	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	0,00%

## REGISTRO FOTOGRAFICO

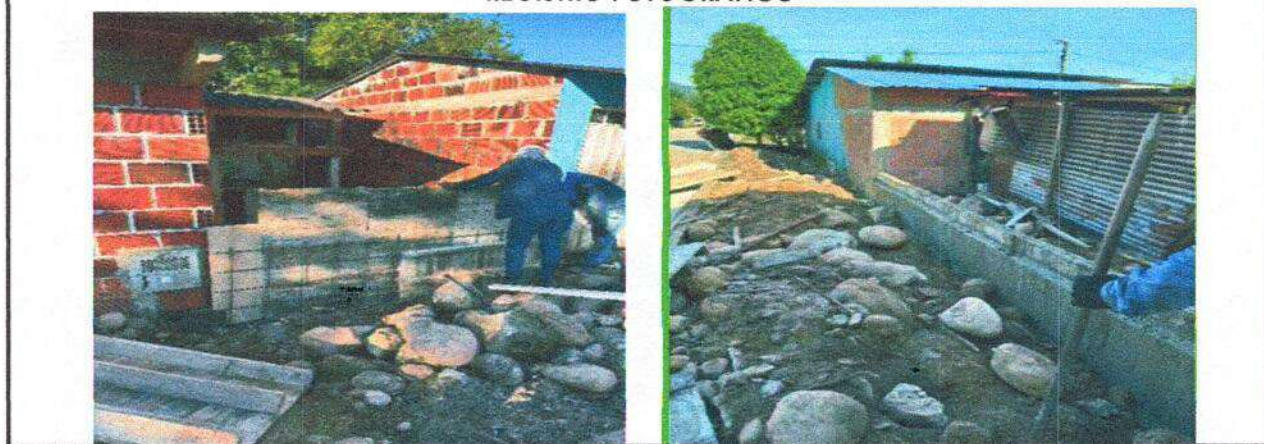

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

<b>ACTIVIDAD:</b>	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2 -1,5		
<b>ITEM:</b>	2,09	<b>UNIDAD:</b>	UND
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	26	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	26
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	26	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	0,0%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



<b>ACTIVIDAD:</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO		
<b>ITEM:</b>	2.10	<b>UNIDAD:</b>	UND
<b>CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:</b>	1	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	1
<b>CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME:</b>	1	<b>CANTIDAD POR EJECUTAR:</b>	0
<b>PORCENTAJE EJECUTADO:</b>	100%	<b>CANTIDAD ACUMULADA:</b>	0,00%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**ANEXO 1. Memorias de cantidades**

**4.4 MANEJO DE ANTICIPO DE OBRA**

CONSTRUINDUCIVIL SAS realizo la apertura de la cuenta bancaria para manejo de pagos de anticipo del contrato de obra N° SAMC-013-2025 con la entidad bancaria, Banco agrario de Colombia

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	41510300819-6
FECHA APERTURA	13/10/2025
NOMBRE DE LA CUENTA	CONSTRUINDUCIVIL SAS
NIT	601,357,684-5
ESTADO DE LA CUENTA	ACTIVA

PARA EL CONTRATO DE OBRA N° SAMC-013-2025 LA ENTIDAD ENTREGO RECURSOS DE ANTICIPO DE 40% EQUIVQLENTES A \$ 79.997.919,20 LOS CUALES FUERON USADOS DE LA SIGUIENTE MANERA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	PORCENTAJE %
1	MATERIALES	\$ 67.998.231,32	85,00%
2	MANO DE OBRA INICIAL	\$ 11.999.687,88	15,00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 79.997.919,20</b>	<b>100,00%</b>

**4.5 ENSAYOS DE LABORATORIOS**

En el periodo de ejecución del presente informe se realizaron los siguientes ensayos, en los resultados dados por cada una de las muestras se puede observar que el contratista de obra cumplió a cabalidad con lo especificado técnicamente para la resistencia del concreto.

- Para el control de calidad de los concretos empleados en la obra, se cuenta con el apoyo del laboratorio SEINCO S.A.S., ubicado en la ciudad de SARAVENA ARAUCA, encargado de la ejecución de los ensayos correspondientes.

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

**Tabla** Ensayos de laboratorio

No.	ENSAYO	FECHA	RESULTADO		OBSERVACIONES
			PSI	%	
1	ENSAYO CONCRETO ESTRIADO E=10CM	17 DE OCTUBRE DEL 2025	3278	109%	CUMPLE:
2	ENSAYO PLACA DE PISO E=10CM	23 DE OCTUBRE DEL 2025	3371	112%	CUMPLE:

**Ilustración.** Registro fotográfico toma de muestras



**Ilustración.** registro fotográfico, cilindros

## 5 ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe el contratista cuenta con un avance financiero de doscientos veinte millones seiscientos veinticinco mil doscientos doce pesos ( \$ 199.994.798,00) indicándome un porcentaje financiero del 100,00%

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)


**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**Tabla 8. Avance financiero**
**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

AVANCE FINANCIERO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	AVANCE TOTAL	PORCENTAJE AVANCE
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	\$ 2.101.412,00	\$ 2.101.412,00	100,00%
1,02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 5 KM	\$ 6.432.401,00	\$ 6.432.401,00	100,00%
1,03	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	\$ 807.336,00	\$ 807.336,00	100,00%
1,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	\$ 11.250.888,00	\$ 11.250.888,00	100,00%
1,05	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	\$ 7.328.994,00	\$ 7.328.994,00	100,00%
2,01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	\$ 7.919.692,00	\$ 7.919.692,00	100,00%
2,02	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	\$ 25.941.167,00	\$ 25.941.167,00	100,00%
2,03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	\$ 23.773.092,00	\$ 23.773.092,00	100,00%
2,04	LOSETA PREFABRICADA COLOR AMARILLA A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM Y EMBOQUILLADO.	\$ 13.030.855,93	\$ 13.030.855,93	100,00%
2,05	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM Y EMBOQUILLADO.	\$ 7.211.369,64	\$ 7.211.369,64	100,00%
2,06	CONTENEDOR DE RAÍCES	\$ 7.625.384,00	\$ 7.625.384,00	100,00%
2,07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	\$ 8.154.669,60	\$ 8.154.669,60	100,00%
2,08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO).	\$ 24.755.628,76	\$ 24.755.628,76	100,00%
2,09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2 -1,5	\$ 2.718.898,00	\$ 2.718.898,00	100,00%
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	\$ 1.320.240,00	\$ 1.320.240,00	100,00%
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>\$ 199.994.798,00</b>	<b>\$ 199.994.798,00</b>	<b>100,00%</b>

## 5.2 PROGRAMACION DE OBRA

Se realizó la programación de obra, en la cual se establece la planificación de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto, se realizó una comparación en cuanto a la programación inicial de obra, y la programación real en cuanto a el avance de obra a la fecha.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los porcentajes (%) de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado.

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)


**CONSTRUINDUCIVIL**

NIT. 901375684-5

Tabla. Avance programado vs ejecutado

FUENTES DE SOLUCIONES INTEGRALES

AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	100,00%	100,00%
1,02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 5 KM	100,00%	100,00%
1,03	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	100,00%	100,00%
1,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	100,00%	100,00%
1,05	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	100,00%	100,00%
2,01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	100,00%	100,00%
2,02	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	100,00%	100,00%
2,03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	100,00%	100,00%
2,04	LOSETA PREFABRICADA COLOR AMARILLA A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM Y EMBOQUILLADO.	100,00%	100,00%
2,05	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM Y EMBOQUILLADO.	100,00%	100,00%
2,06	CONTENEDOR DE RAÍCES	100,00%	100,00%
2,07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	100,00%	100,00%
2,08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO).	100,00%	100,00%
2,09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2 -1,5	100,00%	100,00%
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	100,00%	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
 Actividades de campo  
 NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Durante el periodo ejecutado se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades:

- Verificación de la instalación de manera adecuada de la señalización en cada frente de obra.
- Verificación de la entrega y porte de los elementos de protección personal de los trabajadores de acuerdo a la actividad que desempeñaron.
- Actividades de orden y limpieza de la obra.

## 6 IMPREVISTOS

Durante la ejecución del contrato de obra N° SAMC-013-2025 **"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA,** se han venido presentando actividades que se hicieron necesarias realizar para la correcta ejecución de la obra y que el contratista asumió económicamente.

También se han venido presentando lluvias, lo que ha generado un gasto económico en horas máquina, horas hombre, debido a estas lluvias se han presentado actividades o trabajos extras para no generar retraso en el cronograma de actividades.



Imprevistos por lluvias en obra



Imprevistos por lluvias en obra

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



Imprevistos por lluvias en obra



Imprevistos por lluvias en obra



Imprevistos por lluvias en obra



Imprevistos por lluvias en obra

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



## 7 CONCLUSIONES

De acuerdo con la ejecución del Contrato de Obra SAMC-013-2025, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA"**. Se puede resaltar lo siguiente:

- Se hizo la respectiva revisión de los diseños del contrato de obra No. SAMC-013-2025, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de la obra ejecutada.
- Se garantizó la ejecución de las actividades del contrato de obra No. SAMC-013-2025, las cuales se ejecutaron de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del contrato.
- En la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA"**. CONSTRUINDUCIVIL S.A.S tuvo como prioridad la sostenibilidad de proteger al medio ambiente y promover beneficios sociales, calidad de vida y responsabilidad social y ambiental.
- CONSTRUINDUCIVIL S.A.S ha cumplido con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo a sus empleados cumpliendo así con la normativa exigida y aprobación por parte de la interventoría técnica.
- Se presenta un avance de obra, ejecutando las actividades contratadas según las especificaciones técnicas y aprobaciones por parte de la supervisión, de acuerdo con la ejecución de obra del Contrato No. SAMC-013-2025, se presentan los siguientes rendimientos finales:
  - Avance Financiero **100,00%** que equivale a **\$ 199.994.798,00**
  - Avance físico **100,00%**
  - Avance en tiempo **100,00%**

Atentamente;

**CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**  
 RESIDENTE DE OBRA



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

 <b>ALCALDÍA DE CUBARÁ</b> <small>NIT 800.099.194-2</small>	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Código: JUR-02-P02-F09</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Fecha: 02/07/2024</b> <b>Página 1 de 2</b>

### ACTA DE INICIO

CONTRATO No. SAMC-013-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5

<b>OBJETO:</b>	<b>ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSTRUIDUCIVIL SAS</b> NIT. No. 901375684-5 <b>R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA</b> C.C. No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá.
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ
<b>VALOR:</b>	<b>CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 199.994.798,00)</b>
<b>PLAZO:</b>	<b>UN (01) MES</b>
<b>No. DE DISPONIBILIDAD:</b>	2025000427 del 28/07/2025.

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá, **CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5** representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá, y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, y **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **SAMC-013-2025**.

### CONSIDERANDO:

1. Que se trata de un **CONTRATO DE OBRA**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.


Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2025000427 del 28/07/2025. por el valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 199.994.798,00)**, documento que hace parte integral del presente contrato.

2. Que el municipio ha designado al Secretario de Planeación y Obras Públicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del Contrato de Obra No. **SAMC-013-2025** el veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

En razón a lo anterior, las partes:

📍 Código Postal 1514020  
☎ 310 257 4494



🌐 [www.cubara-boyaca.gov.co](http://www.cubara-boyaca.gov.co)  
✉ [alcaldia@cubara-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@cubara-boyaca.gov.co)  
📍 Calle 4 # 4-43 Barrio el Comercio

 <b>ALCALDÍA DE CUBARÁ</b> <small>NIT 830.099.794-2</small>	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Código: JUR-02-P02-F09</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Fecha: 02/07/2024</b> <b>Página 2 de 2</b>


**ACUERDAN:**

1. Firmar la presente acta de inicio del Contrato de Obra No. **SAMC-013-2025** el veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
2. Fijar como fecha de inicio el día: 29 de septiembre de 2025.
3. Fijar como fecha de terminación el día: 28 de octubre de 2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

<b>SUPERVISOR</b>	<b>CONTRATISTA</b>
  <b>JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA</b> Secretario De Planeación y Obras Públicas	 <b>CONSTRUIDUCIVIL SAS</b> NIT. No. 901375684-5 <b>R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA</b> C.C. No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá.


*Helmer Becerra*  
 Proyecto: Helmer Eduardo Becerra Santander;  
 Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

 <b>ALCALDÍA DE CUBARÁ</b> <small>NIT 800.099.196-2</small>	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Código: JUR-02-P06-F23</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>Fecha: 02/07/2024</b> <b>Página 1 de 4</b>

**MODIFICACIÓN No. 01 PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. SAMC-013-2025**

<b>ASUNTO:</b>	Modificación No. 01 Prorroga No. 01 al Contrato No. SAMC-013-2025			
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ</b> NIT No. 800.099.196-2 R/L: <b>GILDARDO MURCIA BUITRAGO</b> C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.			
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSTRUIDUCIVIL SAS</b> NIT. No. 901375684-5 R/L: <b>GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA</b> C.C. No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá.			
<b>OBJETO:</b>	<b>ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ.</b>			
<b>VALOR INICIAL:</b>	<b>CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 199.994.798,00).</b>			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>UN (01) MES.</b>			
<b>ASPECTOS DE LA MODIFICACIÓN</b>				
<b>PRORROGA:</b>	<b>VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO</b>			
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO:</b>				
<b>Tipo de modificación</b>	<b>No.</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Fecha inicial</b>	<b>Fecha final</b>
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	01	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO	29/10/2025	17/11/2025
<b>Tipo de Modificación</b>	<b>No.</b>	<b>Fecha de la adición</b>	<b>Valor adicionado</b>	<b>Valor total del contrato</b>
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Otras modificaciones</b>	<b>No.</b>	<b>Fecha de la modificación</b>	<b>Observaciones</b>	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

El municipio de Cubará, Boyacá, representado legalmente por **GILDARDO MURCIA BUITRAGO**, identificado con la C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander, en adelante "La Entidad" **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de **supervisor** del Contrato No. SAMC-013-2025, y por la otra el **CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5** representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá, en adelante "El contratista", y quien manifiesta bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos de los que trata el artículo 8° de la Ley 80 de 1993; hemos

 <b>ALCALDÍA DE CUBARÁ</b> <small>NIT 800.095.996-2</small>	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Código: JUR-02-P06-F23</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>Fecha: 02/07/2024</b> <b>Página 2 de 4</b>

convenido celebrar la presente Modificación No. 01 Prorroga No. 01 al Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025, previas las siguientes:


#### CONSIDERACIONES:

1. Que el marco constitucional y legal previsto en el título XII, capítulo II de la constitución política de Colombia sobre la planeación en los organismos del estado, en armonía con la ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en concordancia con sus Decretos reglamentarios, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de planificación, que permitan el adecuado manejo del gasto público, y de otro lado, la satisfacción de las necesidades y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios inmersos dentro de la administración estatal.
2. De conformidad a lo expuesto y surtidas las etapas precontractuales, el día veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), el Municipio de Cubará, Boyacá, suscribió Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025, con el **CONSTRUIDUCIVIL SAS** NIT. No. 901375684-5 representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ"**, para tal efecto se pactó la suma suma **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 199.994.798,00)**, cuyo término de ejecución fueron **UN (01) MES**. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previos los requisitos de suscripción y legalización.
3. Que el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se suscribió acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. **SAMC-013-2025**, en donde, se estableció de común acuerdo como fecha de terminación el día veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
4. Que el día dieciséis (16) de septiembre de 2025 el contratista **CONSTRUIDUCIVIL SAS** NIT. No. 901375684-5 representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá, elevó ante esta supervisión solicitud de prórroga No. 01 del Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025 fundada en lo siguiente:

*El contratista sustenta prórroga con base a los siguientes:*

Las lluvias que se han venido presentando en la región, que han generado un bajo rendimiento de las actividades, la definición de unos puntos no encontrados de los servicios de acueducto y servicio de gas y sumado a esto la falta de materiales como bordillos y tabletas, que por lo expresado en la carta del proveedor no ha sido posible su entrega a la obra, debido a estos factores se han generado atrasos en la ejecución de las actividades.

5. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas presentadas en la región, las cuales han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas, así como las dificultades técnicas derivadas de la localización de los puntos de los servicios de acueducto y gas, y la falta de suministro oportuno de materiales como bordillos y tabletas por parte del proveedor, la supervisión considera justificada la solicitud de prórroga presentada por el contratista.

	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Código: JUR-02-P06-F23</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>Fecha: 02/07/2024</b> <b>Página 3 de 4</b>

Por lo anterior, se autoriza una **ampliación del plazo contractual por veinte (20) días calendario**, con el fin de permitir la adecuada culminación de las actividades pendientes y garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.

6. Que la presente Modificación No. 01 Prorroga No.01 al Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025 encuentra fundamento jurídico en:
  - I. Que, el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales, así como sus modificaciones deben constar por escrito.
  - II. Que, por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Por lo que, en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.
7. Que con base a las consideraciones expuestas las partes acuerdan celebrar la presente Modificación No. 01 Prorroga No. 01 al Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025, que se registrará por las siguientes:


#### CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:** El presente contrato tiene por objeto Modificación No. 01 Prorroga No.01 al Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025 cuyo objeto es **“ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ”**

**CLÁUSULA SEGUNDA. -MODIFIQUESE** la **“CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO”** del Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025 de la siguiente manera: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato genitor en **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO**.

**CLÁUSULA TERCERA. -GARANTÍAS:** Teniendo en cuenta que en el contrato genitor existen garantías, se deberán adicionar sus amparos.

**CLAUSULA CUARTA. -INALTERABILIDAD:** Las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra Pública No. SAMC-013-2025, permanecen tal y como fueron consignadas en el documento original y por lo tanto no sufren modificación alguna.

 <p>ALCALDÍA DE <b>CUBARÁ</b> NIT 800.099.190-2</p>	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Código: JUR-02-P06-F23</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL</b>	<b>Fecha: 02/07/2024</b> <b>Página 4 de 4</b>

**CLAUSULA QUINTA. - NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas en el contrato genitor.

En constancia se firma el presente contrato en el municipio de Cubará, Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

<p>Por el Municipio de Cubará, Boyacá</p>   <p><b>GILDARDO MURCIA BUITRAGO</b> Alcalde Municipal</p> <p>Supervisor,.</p>   <p><b>JESUS IVAN QUINONES RUEDA</b> Secretario de Planeación y Obras Públicas</p>	<p>Contratista,</p>   <p><b>GLADYS XIOMARA MANRIQUE B.</b> CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5 <b>R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA</b> C.C. No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá.</p>
--	--

Revisó: Yofre Andrés Rincón Medrano,   
Asesor Jurídico en Contratación.

Proyectó:   
Helmer Eduardo Becerra Santander,  
Apoyo secretario de Planeación y Obras Públicas.



## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: JUR-02-P06-F08  
Versión 02

## ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha: 02/07/2024

Contrato	SAMC-013-2025	Valor inicial del contrato	Fecha de inicio del contrato
Objeto	ADECUACION DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ	\$ 199.994.798,00	29/09/2025
Contratista	CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5 R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA C.C. No. 1.049.397.338 de Cúbará, Boyacá	Valor adicional al contrato	Plazo de ejecución
Interventoría	N/A	\$ 0,00	Un (01) Mes y veinte (20) días calendario
Supervisor	JESÚS IVÁN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas	Saldo a favor del municipio	Valor anticipo (40%)
Contratante	MUNICIPIO DE CUBARÁ	\$ 0,00	\$ 79.997.919,20
		valor del contrato actualizado	Valor ejecutado acumulado
		\$ 199.994.798,00	\$ 199.994.798,00
			Porcentaje acumulado
			100%
			Fecha de terminación del contrato
			17/11/2025
			Fecha de la presente acta
			19/12/2025
			Estado
			TERMINADO

En el Municipio de Cúbará, Boyacá, se reunieron el Doctor GILDARDO MURCIA BUITRAGO, mayor de edad, vecino del Municipio de Cúbará, Boyacá, identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591, expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cúbará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Circuito de Cúbará, el Arquitecto, JESÚS IVÁN QUINONES RUEDA, Secretario Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato No. SAMC-013-2025, suscrito por el Municipio de Cúbará, Boyacá y el señor GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.397.338 de Cúbará, Boyacá, representante legal de CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5 en calidad de contratista, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo final comprendida entre el 29/09/2025 al 17/11/2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades del Contrato de Obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por el municipio de Cúbará (Boyacá):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES				\$ 27.921.031,00		\$ 27.921.031,00		\$ 27.921.031,00
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	512,04	\$ 4.104,00	\$ 2.101.412,00	512,04	\$ 2.101.412,00	512,04	\$ 2.101.412,00
1.02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 5 KM	M2	494,04	\$ 13.020,00	\$ 6.432.401,00	494,04	\$ 6.432.401,00	494,04	\$ 6.432.401,00
1.03	DEMOLICIÓN DE ANDEN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	18,00	\$ 44.852,00	\$ 807.336,00	18,00	\$ 807.336,00	18,00	\$ 807.336,00
1.04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	M3	92,30	\$ 121.901,11	\$ 11.250.888,00	92,30	\$ 11.250.888,00	92,30	\$ 11.250.888,00
1.05	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	79,92	\$ 91.703,00	\$ 7.328.994,00	79,92	\$ 7.328.994,00	79,92	\$ 7.328.994,00
2.00	CONSTRUCCION DE ANDENES				\$ 122.450.996,93		\$ 122.450.996,93	0,00	\$ 122.450.996,93
2.01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	M2	49,69	\$ 159.382,00	\$ 7.919.692,00	49,69	\$ 7.919.692,00	49,69	\$ 7.919.692,00
2.02	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	M2	129,63	\$ 200.117,00	\$ 25.941.167,00	129,63	\$ 25.941.167,00	129,63	\$ 25.941.167,00
2.03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	M2	126,63	\$ 187.736,65	\$ 23.773.092,00	126,63	\$ 23.773.092,00	126,63	\$ 23.773.092,00
2.04	LOSETA PREFABRICADA COLOR AMARILLA A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM Y EMBOQUILLADO	M2	75,20	\$ 173.282,66	\$ 13.030.855,93	75,20	\$ 13.030.855,93	75,20	\$ 13.030.855,93



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: JUR-02-P06-F08  
Versión: 02

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha: 02/07/2024

Contrato	SAMC-013-2025	Valor inicial del contrato	\$ 199.994.798,00	Fecha de inicio del contrato	29/09/2025
Objeto	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ	Valor adicional al contrato	\$ 0,00	Plazo de ejecución	Un (01) Mes y veinte (20) días calendario
Contratista	CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5 R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA C.C No. 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá.	Saldo a favor del municipio	\$ 0,00	Valor anticipo (40%)	\$ 79.997.919,20
Interventoría	N/A	valor del contrato actualizado	\$ 199.994.798,00	Valor ejecutado acumulado	\$ 199.994.798,00
Supervisor	JESUS IVAN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas			Porcentaje acumulado	100%
Contratante	MUNICIPIO DE CUBARÁ			Fecha de terminación del contrato	17/11/2025
				Fecha de la presente acta	19/12/2025
				Estado	TERMINADO

En el Municipio de Cubará, Boyacá, se reunieron el Doctor GILDARDO MURCIA BUITRAGO, mayor de edad, vecino del Municipio de Cubará, Boyacá, identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Circuito de Cubará, el Arquitecto, JESUS IVAN QUINONES RUEDA, Secretario Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato No. SAMC-013-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y el señor GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.397.338 de Cubara, Boyacá, representante legal de CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5, en calidad de contratista, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo final comprendida entre el 29/09/2025 al 17/11/2025, en la cual se consignaron las siguientes cantidades del Contrato de Obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por el municipio de Cubará (Boyacá):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,05	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM Y EMBOQUILLADO	M2	53,76	\$ 134.140,06	\$ 7.211.369,64	53,76	\$ 7.211.369,64	53,76	\$ 7.211.369,64
2,06	CONTENEDOR DE RAICES	UND	26,00	\$ 293.284,00	\$ 7.625.384,00	26,00	\$ 7.625.384,00	26,00	\$ 7.625.384,00
2,07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	M	184,80	\$ 44.127,00	\$ 8.154.669,60	184,80	\$ 8.154.669,60	184,80	\$ 8.154.669,60
2,08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17,5 Mpa (INCLUYE REFUERZO)	M	252,82	\$ 97.918,00	\$ 24.755.628,76	252,82	\$ 24.755.628,76	252,82	\$ 24.755.628,76
2,09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2 -1,5	UND	26,00	\$ 104.573,00	\$ 2.718.898,00	26,00	\$ 2.718.898,00	26,00	\$ 2.718.898,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	UND	1,00	\$ 1.320.240,00	\$ 1.320.240,00	1,00	\$ 1.320.240,00	1,00	\$ 1.320.240,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 150.372.028,00		\$ 150.372.028,00		\$ 150.372.028,00
ADMINISTRACIÓN 24%					\$ 36.089.287,00		\$ 36.089.287,00		\$ 36.089.287,00
IMPREVISTO 2%					\$ 3.007.441,00		\$ 3.007.441,00		\$ 3.007.441,00
UTILIDAD 7%					\$ 10.526.042,00		\$ 10.526.042,00		\$ 10.526.042,00
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 49.622.770,00		\$ 49.622.770,00		\$ 49.622.770,00
COSTO TOTAL					\$ 199.994.798,00		\$ 199.994.798,00		\$ 199.994.798,00



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: JUR-02-P06-F08  
Versión 02

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha: 02/07/2024

Contrato	SAMC-013-2025	Valor inicial del contrato	\$ 199.994.798,00	Fecha de inicio del contrato	29/09/2025
Objeto	ADECUACION DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ	Valor adicional al contrato	\$ 0,00	Plazo de ejecución	Un (01) Mes y veinte (20) días calendario
Contratista	CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT. No. 901375684-5 R/L: GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA C.C. No. 1.049.397.338 de Cúbará, Boyacá	Saldo a favor del municipio	\$ 0,00	Valor anticipo (40%)	\$ 79.997.919,20
Interventoría	N/A	valor del contrato actualizado	\$ 199.994.798,00	Valor ejecutado acumulado	\$ 199.994.798,00
Supervisor	JESÚS IVÁN QUINONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas	Porcentaje acumulado	100%	Fecha de terminación del contrato	17/11/2025
Contratante	MUNICIPIO DE CUBARÁ	Fecha de la presente acta	19/12/2025	Estado	TERMINADO

En el Municipio de Cúbará, Boyacá, se reunieron el Doctor GILDARDO MURCIA BUITRAGO, mayor de edad, vecino del Municipio de Cúbará, Boyacá, identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cúbará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Circuito de Cúbará, el Arquitecto, JESÚS IVÁN QUINONES RUEDA, Secretario Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato No. SAMC-013-2025, suscrito por el Municipio de Cúbará, Boyacá y el señor GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.397.338 de Cúbará, Boyacá representante legal de CONSTRUIDUCIVIL SAS NIT No. 901375684-5 en calidad de contratista, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo final comprendida entre el 29/09/2025 al 17/11/2025, en la cual se consignan las siguientes cantidades del Contrato de Obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por el municipio de Cúbará (Boyacá):

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 199.994.798,00
VALOR ANTICIPO (40%)	\$ 79.997.919,20
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 199.994.798,00
ARMONIZACION DEL ANTICIPO	\$ 79.997.919,20
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 199.994.798,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 119.996.878,80
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL, por los que en ella intervinieron, en Cúbará a los Diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2025

GILDARDO MURCIA BUITRAGO  
Alcalde  
Municipio de Cúbará

JESUS IVÁN QUINONES RUEDA  
Secretario de planeación y obras públicas  
Supervisor

GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA  
CONSTRUIDUCIVIL SAS  
NIT 901375684-5  
Contratista

📍 Código Postal 1514020  
☎ 310 257 4494

🌐 www.cubara-boyaca.gov.co  
✉ alcaldia@cubara-boyaca.gov.co  
📍 Calle 4 # 4-43 Barrio el Comercio



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# POLIZAS

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6250089643**

**PÓLIZA No: 625-47-994000003206 ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL**

COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	08	2025	19	08	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**  
DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**  
BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	15/08/2025	20/03/2026	19,999,479.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	15/08/2025	20/01/2026	79,997,919.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/08/2025	20/09/2028	9,999,739.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	39,998,959.80
CALIDAD DEL BIEN	15/08/2025	20/03/2026	19,999,479.90

BENEFICIARIOS  
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\*

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. SAMC-013-2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA.

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ <b>***169,995,579.15</b>	VALOR PRIMA: \$ <b>*****508,261</b>	GASTOS EXPEDICION: \$ <b>***15,000.00</b>	IVA: \$ <b>*****99,420</b>	TOTAL A PAGAR: \$ <b>*****622,680</b>
---	--	--	-------------------------------	--

NOMBRE INTERMEDIARIO SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	CLAVE 7274	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	---------------	-----------------	----------------------------------	-------	-----------------

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO; TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECOBRANZA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: [https://www.solidaria.com.co/va\\_digitalClient/#login](https://www.solidaria.com.co/va_digitalClient/#login)

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA. LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>. EN EL MENÚ 'SERVICIOS', OPCIÓN 'CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS'.

**FIRMA ASEGURADOR**



**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
C8DA25780F07F5785B

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6250089684**

**PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001223 ANEXO:0**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL			COD. AGE: 625			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
19	08	2025	15	08	2025	23:59	16	09	2025	23:59	32	19	08	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS DIAS			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION		DIA			MES			AÑO			HORAS		
VIGENCIA DEL ANEXO		15	08	2025	23:59	16	09	2025	23:59	32	19	08	2025
		VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS			DIAS			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

DIRECCIÓN: **CALLE 4 NO 4-43** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3102574494**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** NIT : **800099196**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **BOYACÁ** CIUDAD: **CUBARÁ**

DIRECCION: **CALLE 1 No. 1-1**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **SERVICIOS** MANZANA: **1-2**

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 284,700,000.00	284,700,000.00	

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS  
NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # SAMC-013-2025 REFERENTE A ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA.

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL  
MUNICIPIO DE CUBARA NIT 800099196-2

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ <b>***284,700,000.00</b>	VALOR PRIMA: \$ <b>*****74,880</b>	GASTOS EXPEDICION: \$ <b>*****9,000.00</b>	IVA: \$ <b>*****15,937</b>	TOTAL A PAGAR: \$ <b>*****99,817</b>
---	---------------------------------------	---	-------------------------------	---

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	CLAVE 7274	%PART 100.00	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR** (415)7701861000019(8020)00000000007000625008968

**FIRMA TOMADOR** *Xiorra Manrique B.*

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

LUSOLERT 0

C8DA25780F07F57857

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros  
 GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000001223

ANEXO: 0

TIPO DE MOVIMIENTO: 0

PAGINA: 2

TOMADOR: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

IDENTIFICACION: 901.375.684-5

## ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. & NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE CUBARA	800099196-2	CALLE 1 No. 1-1	CUBARÁ	284,700,000.00	74,880	90,817
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						74,880	90,817

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**



**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6250089643**

**PÓLIZA No: 625-47-994000003206 ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2025	30	09	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	29/09/2025	05/05/2026	19,999,479.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	29/09/2025	07/03/2026	79,997,919.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/09/2025	05/11/2028	9,999,739.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	39,998,959.80
CALIDAD DEL BIEN	29/09/2025	05/05/2026	19,999,479.90

BENEFICIARIOS  
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 29/09/2025 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

**\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. SAMC-013-2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA.

**\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ <b>***169,995,579.15</b>	VALOR PRIMA: \$ <b>*****0.00</b>	GASTOS EXPEDICION: \$ <b>*****0.00</b>	IVA: \$ <b>*****0</b>	TOTAL A PAGAR: \$ <b>*****0</b>
---	-------------------------------------	---	--------------------------	------------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO, POR FAVOR INGRESAR A: <https://www.solidaria.com.co/whatsapp/clientes/#login>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACE-DE-INTERES-POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACE-DE-INTERES-POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX)

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**



**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
C8DA25780E0FF87F56

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6250089684**

**PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001223 ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: <b>SEAS YOPAL</b>			COD. AGE: 625			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
30	09	2025	16	09	2025	23:59	01	11	2025	23:59	46	30	09	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: <b>ANUAL</b>			A LAS			A LAS			DÍAS			TIPO DE IMPRESIÓN: <b>IMPRESION</b>		

TIPO DE MOVIMIENTO: <b>PRORROGA</b>														
VIGENCIA DEL ANEXO						DIA			MES			AÑO		
16						09			2025			23:59		
VIGENCIA DESDE						A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS		

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

DIRECCIÓN: **CALLE 4 NO 4-43** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3102574494**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** NIT : **800099196**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **BOYACÁ** CIUDAD: **CUBARÁ**

DIRECCION: **CALLE 1 No. 1-1**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **SERVICIOS** MANZANA: **1-2**

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 284,700,000.00		284,700,000.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				
BENEFICIARIOS				
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS				

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 29/09/2025 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

**NOTA ACLARATORIA DE VIGENCIAS**  
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES VIGENCIA DESDE 29/09/2025 VIGENCIA HASTA 01/11/2025

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # SAMC-013-2025 REFERENTE A ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA.

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL  
MUNICIPIO DE CUBARA NIT 800099196-2

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***284,700,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	---------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

<b>INTERMEDIARIO</b>		<b>COASEGURO CEDIDO</b>	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR** (415)7701861000019(8020)00000000007000625008968

**FIRMA TOMADOR** *Xiomara Montique B.*

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE LUSOLERPT 0

C8DA25780E0FF87C5F

Hora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros  
GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000001223

ANEXO: 1

TIPO DE MOVIMIENTO: 0

PAGINA: 2

TOMADOR: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

IDENTIFICACION: 901.375.684-5

## ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. & NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE CUBARA	800099196-2	CALLE 1 No. 1-1	CUBARÁ	284,700,000.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0



**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6250089643**

**PÓLIZA No: 625-47-99400003206 ANEXO: 2**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: **625** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	10	2025	27	10	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	29/09/2025	26/05/2026	19,999,479.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	29/09/2025	28/03/2026	79,997,919.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/09/2025	26/11/2028	9,999,739.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA	ACLARATORIA	39,998,959.80
CALIDAD DEL BIEN	29/09/2025	26/05/2026	19,999,479.90

BENEFICIARIOS  
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON MODIFICACION NO 01 PRORROGA NO 01 DE FECHA 24/10/2025

PRORROGA: VEINTE (20) DIAS CALENDARIO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

**ACLARACION DE VIGENCIAS**

CUMPLIMIENTO VIGENCIA DESDE 29/09/2025 VIGENCIA HASTA 26/05/2026

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO VIGENCIA DESDE 29/09/2025 VIGENCIA HASTA 28/03/2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES VIGENCIA DESDE 29/09/2025 VIGENCIA HASTA 26/11/2028

CALIDAD DEL BIEN VIGENCIA DESDE 29/09/2025 VIGENCIA HASTA 26/05/2026

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ <b>***169,995,579.15</b>	VALOR PRIMA: \$ <b>*****29,917</b>	GASTOS EXPEDICION: \$ <b>*****7,000.00</b>	IVA: \$ <b>*****7,014</b>	TOTAL A PAGAR: \$ <b>*****43,931</b>
---	---------------------------------------	---	------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN:** DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERAG@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: [https://www.solidaria.com.co/wa\\_digitalclient/#login](https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login)

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES-POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES-POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX)

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS" OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

*[Firma]*  
**FIRMA ASEGURADOR**



*[Firma]*  
**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
C8DA25780E0EF87B5D CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/83 - REGIMEN COMULIN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

## PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL

COD. AGENCIA: 625

RAMO: 47

No PÓLIZA: 994000003206 ANEXO: 2

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.375.684-5

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUBARA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

## TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. SAMC-013-2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA.

## NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6250089684**

**PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001223 ANEXO:2**

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL			COD. AGE: 625			RAMO: 74			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
27	10	2025	01	11	2025	23:59	22	11	2025	23:59	21	27	10	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
						A LAS			A LAS			DIAS		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO	PRORROGA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
		01	11	2025	23:59	22	11	2025	23:59	21
VIGENCIA DEL ANEXO					VIGENCIA HASTA					
A LAS					A LAS					

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

DIRECCIÓN: **CALLE 4 NO 4-43** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3102574494**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

**DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** NIT : **800099196**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **BOYACÁ** CIUDAD: **CUBARÁ**

DIRECCION: **CALLE 1 No. 1-1**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **SERVICIOS** MANZANA: **1-2**

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

**BENEFICIARIOS**  
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON MODIFICACION NO 01 PRORROGA NO 01 DE FECHA 24/10/2025  
PRORROGA: VEINTE (20) DIAS CALENDARIO  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

**ACLARACION DE VIGENCIAS**  
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES VIGENCIA DESDE 29/09/2025 VIGENCIA HASTA 22/11/2025

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO SAMC-013-2025 REFERENTE A ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA.

ASEGURADO BENEFICIARIO ADICIONAL  
MUNICIPIO DE CUBARA NIT 800099196-2

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***284,700,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****49,140	GASTOS EXPEDICION: \$*****7,000.00	IVA: \$ *****10,667	TOTAL A PAGAR: \$ *****66,807
--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274		
	%PART 100.00		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/entances-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR** (415)7701861000019(8020)00000000007000625008968

**FIRMA TOMADOR** *Xiorara Manrique B.*

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

LUSOLERTP 0

C8DA25780E0EP87B5C

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tener en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros  
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/83 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

## LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL  
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000001223

ANEXO: 2

TIPO DE MOVIMIENTO: 0

PAGINA: 2

TOMADOR: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

IDENTIFICACION: 901.375.684-5

## ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE CUBARA	800099196-2	CALLE 1 No. 1-1	CUBARÁ	284,700,000.00	49,140	59,807
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						49,140	59,807



**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**6250089643**

**PÓLIZA No: 625-47-994000003206 ANEXO: 3**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2025	26	12	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.375.684-5**

DIRECCIÓN: **CARRERA 3 7 A 67 BARRIO JARDIN** CIUDAD: **CUBARÁ, BOYACÁ** TELÉFONO: **3183616384**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	29/09/2025	27/05/2026	19,999,479.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	29/09/2025	30/03/2026	79,997,919.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/09/2025	26/11/2028	9,999,739.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	39,998,959.80
CALIDAD DEL BIEN	29/09/2025	27/05/2026	19,999,479.90

BENEFICIARIOS  
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:  
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA DE CONFORMIDAD CON ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 19/12/2025  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA  
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. SAMC-013-2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA.

NOTA ACLARATORIA  
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ 199,997,919.60	\$ *****	\$ *****.00	\$ *****	\$ *****

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ORIENTE LTDA	7274	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR REFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: [https://www.solidaria.com.co/vra\\_digitalclient/#login](https://www.solidaria.com.co/vra_digitalclient/#login)

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

*[Firma]*  
**FIRMA ASEGURADOR**

(415)770186100019(8020)00000000007000625008964

*[Firma]*  
**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE  
C8DA25780E0BFC7B58

Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

COMPAÑÍA DE SEGUROS ENTIDAD ECONOMICA 861 ENTIDAD COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC.2015

## PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL

COD. AGENCIA: 625

RAMO: 47

No PÓLIZA: 994000003206 ANEXO: 3

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.375.684-5

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUBARA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

## TEXTO ITEM 1



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# NOMINAS

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**Comprobante Número: **105**Nombre: **CESAR CHAPETA SILVA**Identificación: **5492210**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 130,061.00	Fondo de salud	0.0	\$ 5,202.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 13,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 5,202.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 143,394.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 10,404.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 132,990.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**  
 Comprobante Número: **106**

Nombre: **EFRAIN VILLOAMIZAR MARTINEZ**  
 Identificación: **9466184**  
 Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**  
 Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	1.00	\$ 85,767.00	Fondo de salud	0.0	\$ 3,431.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	1.00	\$ 6,667.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 3,431.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 92,434.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 6,862.00</b>

**NETO A PAGAR** \$ 85,572.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**  
Comprobante Número: **107**

Nombre: **JUAN DE JESUS GARCIA DURAN**  
Identificación: **9466571**  
Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**  
Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 171,534.00	Fondo de salud	0.0	\$ 6,861.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 13,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 6,861.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 184,867.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 13,722.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 171,145.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**Comprobante Número: **108**Nombre: **CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**Identificación: **91496344**Cargo: **RESIDENTE DE OBRA**Salario básico: **\$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 200,000.00	Fondo de salud	0.0	\$ 8,000.00
			Fondo de pensión	0.0	\$ 8,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 200,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 16,000.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 184,000.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**Comprobante Número: **109**Nombre: **OLMEDO OCHOA**Identificación: **96123880**Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 171,534.00	Fondo de salud	0.0	\$ 6,861.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 13,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 6,861.00
Cesantías liquidación contrato	2.00	\$ 14,332.00			
Intereses cesantías liquidación contrato	2.00	\$ 10.00			
Prima liquidación contrato	2.00	\$ 14,332.00			
Vacaciones liquidación contrato	1.00	\$ 7,147.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 220,688.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 13,722.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 206,966.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**Comprobante Número: **110**Nombre: **JULIO RAFAEL GUERRERO RANGEL**Identificación: **1049393372**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 130,061.00	Fondo de salud	0.0	\$ 5,202.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 13,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 5,202.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 143,394.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 10,404.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 132,990.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**Comprobante Número: **111**Nombre: **AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE**Identificación: **1094243208**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,950,915.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 130,061.00	Fondo de salud	0.0	\$ 5,202.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 13,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 5,202.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 143,394.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 10,404.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 132,990.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**Comprobante Número: **112**Nombre: **MANRIQUE AGUDELO GEIDY ESPERANZA**Identificación: **1118565441**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	2.00	\$ 130,061.00	Fondo de salud	0.0	\$ 5,202.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	\$ 13,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 5,202.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 143,394.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 10,404.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 132,990.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**Comprobante Número: **77**Nombre: **CESAR CHAPETA SILVA**Identificación: **5492210**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,950,915.00	Fondo de salud	0.0	\$ 78,037.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 78,037.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,150,915.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 156,074.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,994,841.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**  
Comprobante Número: **78**

Nombre: **EFRAIN VILLOAMIZAR MARTINEZ**  
Identificación: **9466184**  
Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**  
Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 2,573,010.00	Fondo de salud	0.0	\$ 102,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 102,920.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,773,010.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 205,840.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>\$ 2,567,170.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**  
Comprobante Número: **79**

Nombre: **JUAN DE JESUS GARCIA DURAN**  
Identificación: **9466571**  
Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**  
Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 2,573,010.00	Fondo de salud	0.0	\$ 102,920.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 102,920.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,773,010.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 205,840.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 2,567,170.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**Comprobante Número: **80**Nombre: **CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**Identificación: **91496344**Cargo: **RESIDENTE DE OBRA**Salario básico: **\$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 3,000,000.00	Fondo de salud	0.0	\$ 120,000.00
			Fondo de pensión	0.0	\$ 120,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 3,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 240,000.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 2,760,000.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**Comprobante Número: **81**Nombre: **JULIO RAFAEL GUERRERO RANGEL**Identificación: **1049393372**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,950,915.00	Fondo de salud	0.0	\$ 78,037.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	23.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 78,037.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,150,915.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 156,074.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,994,841.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**Comprobante Número: **82**Nombre: **AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE**Identificación: **1094243208**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,950,915.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,950,915.00	Fondo de salud	0.0	\$ 78,037.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 78,037.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,150,915.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 156,074.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,994,841.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/30**Comprobante Número: **83**Nombre: **MANRIQUE AGUDELO GEIDY ESPERANZA**Identificación: **1118565441**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,950,915.00	Fondo de salud	0.0	\$ 78,037.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 78,037.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,150,915.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 156,074.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,994,841.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**  
Comprobante Número: **84**

Nombre: **CESAR CHAPETA SILVA**  
Identificación: **5492210**  
Cargo: **OBROERO DE CONSTRUCCION**  
Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	5.00	\$ 325,153.00	Fondo de salud	0.0	\$ 13,006.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	\$ 33,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 13,006.00
Cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 221,066.00			
Intereses cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 2,726.00			
Prima liquidación contrato	37.00	\$ 221,066.00			
Vacaciones liquidación contrato	2.00	\$ 100,255.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 903,599.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 26,012.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 877,587.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**  
Comprobante Número: **85**

Nombre: **EFRAIN VILLOAMIZAR MARTINEZ**  
Identificación: **9466184**  
Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**  
Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	16.00	\$ 1,372,272.00	Fondo de salud	0.0	\$ 54,891.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	16.00	\$ 106,667.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 54,891.00
Cesantías liquidación contrato	47.00	\$ 362,032.00			
Intereses cesantías liquidación contrato	47.00	\$ 5,672.00			
Prima liquidación contrato	47.00	\$ 362,032.00			
Vacaciones liquidación contrato	2.00	\$ 167,960.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,376,635.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 109,782.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 2,266,853.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**  
Comprobante Número:**86**

Nombre: **JUAN DE JESUS GARCIA DURAN**  
Identificación: **9466571**  
Cargo: **OFICIAL DE CONSTRUCCION**  
Salario básico: **\$2,573,010.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	5.00	\$ 428,835.00	Fondo de salud	0.0	\$ 17,153.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	\$ 33,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 17,153.00
Cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 285,004.00			
Intereses cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 3,515.00			
Prima liquidación contrato	37.00	\$ 285,004.00			
Vacaciones liquidación contrato	2.00	\$ 132,224.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,167,915.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 34,306.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,133,609.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**Comprobante Número: **87**Nombre: **CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**Identificación: **91496344**Cargo: **RESIDENTE DE OBRA**Salario básico: **\$3,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	16.00	\$ 1,600,000.00	Fondo de salud	0.0	\$ 64,000.00
Cesantías liquidación contrato	48.00	\$ 400,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 64,000.00
Intereses cesantías liquidación contrato	48.00	\$ 6,400.00			
Prima liquidación contrato	48.00	\$ 400,000.00			
Vacaciones liquidación contrato	2.00	\$ 200,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,606,400.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 128,000.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 2,478,400.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2025/11/01 - 2025/11/30

Comprobante Número: 88

Nombre: JULIO RAFAEL GUERRERO RANGEL

Identificación: 1049393372

Cargo: OBRERO DE CONSTRUCCION

Salario básico: \$1,915,950.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	16.00	\$ 1,040,488.00	Fondo de salud	0.0	\$ 41,620.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	16.00	\$ 106,667.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 41,620.00
Cesantías liquidación contrato	48.00	\$ 286,789.00			
Intereses cesantías liquidación contrato	48.00	\$ 4,589.00			
Prima liquidación contrato	48.00	\$ 286,789.00			
Vacaciones liquidación contrato	2.00	\$ 130,061.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,855,383.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 83,240.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,772,143.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**Comprobante Número: **89**Nombre: **AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE**Identificación: **1094243208**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,950,915.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	5.00	\$ 325,153.00	Fondo de salud	0.0	\$ 13,006.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	\$ 33,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 13,006.00
Cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 221,066.00			
Intereses cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 2,726.00			
Prima liquidación contrato	37.00	\$ 221,066.00			
Vacaciones liquidación contrato	2.00	\$ 100,255.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 903,599.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 26,012.00</b>

**NETO A PAGAR****\$ 877,587.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**Comprobante Número: **90**Nombre: **MANRIQUE AGUDELO GEIDY ESPERANZA**Identificación: **1118565441**Cargo: **OBRERO DE CONSTRUCCION**Salario básico: **\$1,915,950.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	5.00	\$ 325,153.00	Fondo de salud	0.0	\$ 13,006.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	\$ 33,333.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 13,006.00
Cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 221,066.00			
Intereses cesantías liquidación contrato	37.00	\$ 2,726.00			
Prima liquidación contrato	37.00	\$ 221,066.00			
Vacaciones liquidación contrato	2.00	\$ 100,255.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 903,599.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 26,012.00</b>

**NETO A PAGAR****\$ 877,587.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# VINCULACION LABORAL

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO DE OBRA LABOR

**Nombre del empleador:** CONSTRUINDUCIVIL SAS

**Representante legal:** GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

**Nombre del empleado(a):** CESAR CHAPETA SILVA

**Identificado con cédula N°:** 5.492.210 Exp. Toledo N/S

**Cargo por desempeñar:** AYUDANTE COSTRUCION

**valor salario:** Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE OBRA LABOR**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación de la vía carrera 9, entre calles 2 y 3.

**SEGUNDA: Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en el área de trabajo
- Mezclar y regar materiales
- Nivelar terreno
- Retiro de escombros y otros desechos del sitio de la construcción
- Ejecutar trabajos necesarios para la construcción (excavaciones, amarre y figurado de acero, y demás actividades que se presenten en la ejecución de la obra)
- Acatar órdenes del maestro general, residente de obra, auxiliar en obra
- Servir de apoyo logístico para las actividades requeridas

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**TERCERA: Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA: Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

**QUINTA: Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de **termino indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA: Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA: Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00), pagados en el lugar de trabajo. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA: Horario.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA: Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA PRIMERA: Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA SEGUNDA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veintisiete (29) del mes de septiembre de 2025.

*Glady Xiomara Manrique B.*  
CONSTRUINDUCIVIL SAS

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Nit.901.375.684-5

*Cesar Chapeta*  
CESAR CHAPETA SILVA

AYUDANTE

CC. 5.492.210

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO DE OBRA LABOR

**Nombre del empleador:** CONSTRUINDUCIVIL SAS  
**Representante legal:** GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA  
**Nombre del empleado(a):** EFRAIN VILLAMIZAR MARTINEZ  
**Identificado con cédula N°:** 9.466.184 Exp. Cubara Boyaca  
**Cargo por desempeñar:** OFICIAL CONSTRUCCION  
**valor salario:** Dos millones quinientos setenta y tres mil  
dies pesos (\$2.573.010,00)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE OBRA LABOR**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación de la vía carrera 9, ENTRE CALLES 2 Y 3.

**SEGUNDA: Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en el área de trabajo
- Mezclar y regar materiales
- Nivelar terreno
- Retiro de escombros y otros desechos del sitio de la construcción
- Ejecutar trabajos necesarios para la construcción (excavaciones, amarre y figurado de acero, y demás actividades que se presenten en la ejecución de la obra)
- Acatar órdenes del maestro general, residente de obra, auxiliar en obra
- Servir de apoyo logístico para las actividades requeridas

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**TERCERA: Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA: Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

**QUINTA: Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de **termino indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA: Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA: Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de dos millones quinientos setenta y tres mil dies pesos (\$2.573.010,00), pagados en el lugar de trabajo. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA: Horario.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA: Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA PRIMERA: Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA SEGUNDA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veintisiete (29) del mes de septiembre de 2025.

*Glady Xiomara Manrique B.*

CONSTRUINDUCIVIL SAS

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Nit.901.375.684-5

*Efrain Villamizar Martinez*

EFRAIN VILLAMIZAR MARTINEZ

OFICIAL CONSTRUCCION

CC. 9.466.184

CONSTRUINDUCIVIL  
NIT. 901375684-5

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO DE OBRA LABOR

**Nombre del empleador:** CONSTRUINDUCIVIL SAS

**Representante legal:** GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

**Nombre del empleado(a):** CARLOS RENE AGUABLANCA DUARTE

**Identificado con cédula N°:** 1.094.243.208 Exp. Pamplona N/S

**Cargo por desempeñar:** AYUDANTE COSTRUCCION

**valor salario:** Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE OBRA LABOR**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación de la vía carrera 9, ENTRE CALLES 2 Y 3.

**SEGUNDA: Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en el área de trabajo
- Mezclar y regar materiales
- Nivelar terreno
- Retiro de escombros y otros desechos del sitio de la construcción
- Ejecutar trabajos necesarios para la construcción (excavaciones, amarre y figurado de acero, y demás actividades que se presenten en la ejecución de la obra)
- Acatar órdenes del maestro general, residente de obra, auxiliar en obra
- Servir de apoyo logístico para las actividades requeridas

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**TERCERA: Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA: Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

**QUINTA: Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de **termino indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA: Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA: Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00), pagados en el lugar de trabajo. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA: Horario.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA: Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA PRIMERA: Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA SEGUNDA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veintisiete (29) del mes de septiembre de 2025.

*Glady Xiomara Manrique B.*  
CONSTRUINDUCIVIL SAS

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Nit.901.375.684-5

*Carlos René Agublanca*  
CARLOS RENE AGUBLANCA DUARTE

AYUDANTE DE CONSTRUCCION

CC. 1.094.243.208

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

### CONTRATO DE OBRA LABOR

<b>Nombre del empleador:</b>	CONSTRUINDUCIVIL SAS
<b>Representante legal:</b>	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
<b>Nombre del empleado(a):</b>	GEIDY ESPERANZA MANRIQUE AGUDELO
<b>Identificado con cédula N°:</b>	1.118.565.441 Exp. Yopal Casanare
<b>Cargo por desempeñar:</b>	AYUDANTE COSTRUCION
<b>valor salario:</b>	Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE OBRA LABOR**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación de la vía carrera 9, entre calles 2 y 3.

**SEGUNDA: Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en el área de trabajo
- Mezclar y regar materiales
- Nivelar terreno
- Retiro de escombros y otros desechos del sitio de la construcción
- Ejecutar trabajos necesarios para la construcción (excavaciones, amarre y figurado de acero, y demás actividades que se presenten en la ejecución de la obra)
- Acatar órdenes del maestro general, residente de obra, auxiliar en obra
- Servir de apoyo logístico para las actividades requeridas

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**TERCERA: Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA: Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

**QUINTA: Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de **termino indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA: Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA: Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00), pagados en el lugar de trabajo. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA: Horario.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA: Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA PRIMERA: Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA SEGUNDA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veintisiete (29) del mes de septiembre de 2025.

*Glady Xiomara Manrique B.*  
CONSTRUINDUCIVIL SAS

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Nit.901.375.684-5

*Geidy Manrique A.*  
GEIDY ESPERANZA MANRIQUE AGUDELO

AYUDANTE

CC. 1.118.565.441

3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO DE OBRA LABOR

**Nombre del empleador:** CONSTRUINDUCIVIL SAS  
**Representante legal:** GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA  
**Nombre del empleado(a):** JUAN DE JESUS GARCIA DURAN  
**Identificado con cédula N°:** 9.466.571 Exp. Cubara Boyaca  
**Cargo por desempeñar:** OFICIAL CONSTRUCCION  
**valor salario:** Dos millones quinientos setenta y tres mil  
dies pesos (\$2.573.010,00)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE OBRA LABOR**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación de la vía carrera 9, entre calles 2 y 3.

**SEGUNDA: Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en el área de trabajo
- Mezclar y regar materiales
- Nivelar terreno
- Retiro de escombros y otros desechos del sitio de la construcción
- Ejecutar trabajos necesarios para la construcción (excavaciones, amarre y figurado de acero, y demás actividades que se presenten en la ejecución de la obra)
- Acatar órdenes del maestro general, residente de obra, auxiliar en obra
- Servir de apoyo logístico para las actividades requeridas

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**TERCERA: Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA: Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

**QUINTA: Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de **termino indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA: Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA: Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de dos millones quinientos setenta y tres mil dies pesos (\$2.573.010,00), pagados en el lugar de trabajo. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA: Horario.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA: Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA PRIMERA: Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA SEGUNDA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veintisiete (29) del mes de septiembre de 2025.

*Glady Xiomara Manrique B.*  
CONSTRUINDUCIVIL SAS

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Nit.901.375.684-5

*Juan de Jesús García Durán*  
JUAN DE JESUS GARCIA DURAN

OFICIAL CONSTRUCCION

CC. 9.466.571

CONSTRUINDUCIVIL  
NIT. 901375684-5

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO DE OBRA LABOR

**Nombre del empleador:** CONSTRUINDUCIVIL SAS

**Representante legal:** GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

**Nombre del empleado(a):** JULIO RAFAEL GUERRERO RANGEL

**Identificado con cédula N°:** 1.049.393.372 Exp. Cubara Boyaca

**Cargo por desempeñar:** AYUDANTE COSTRUCION

**valor salario:** Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE OBRA LABOR**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación de la vía carrera 9, entre calles 2 y 3

**SEGUNDA: Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en el área de trabajo
- Mezclar y regar materiales
- Nivelar terreno
- Retiro de escombros y otros desechos del sitio de la construcción
- Ejecutar trabajos necesarios para la construcción (excavaciones, amarre y figurado de acero, y demás actividades que se presenten en la ejecución de la obra)
- Acatar órdenes del maestro general, residente de obra, auxiliar en obra
- Servir de apoyo logístico para las actividades requeridas

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**TERCERA: Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA: Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS.**

**QUINTA: Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de **termino indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA: Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA: Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00), pagados en el lugar de trabajo. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA: Horario.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA: Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA PRIMERA: Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA SEGUNDA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veintisiete (29) del mes de septiembre de 2025.

*Glady Xiomara Manrique B.*  
**CONSTRUINDUCIVIL SAS**

R/L.GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Nit.901.375.684-5

*Julio Rafael Guerrero Rangel*  
**JULIO RAFAEL GUERRERO RANGEL**

AYUDANTE

CC. 1.049.393.372

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO DE OBRA LABOR

**Nombre del empleador:** CONSTRUINDUCIVIL SAS

**Representante legal:** GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

**Nombre del empleado(a):** OLMEDO OCHOA

**Identificado con cédula N°:** 96.123.880

**Cargo por desempeñar:** OFICIAL CONSTRUCCION

**valor salario:** Dos millones quinientos setenta y tres mil  
dies pesos (\$2.573.010,00)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE OBRA LABOR**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación de la vía carrera 9, entre calles 2 y 3

**SEGUNDA: Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como:

- Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en el área de trabajo
- Mezclar y regar materiales
- Nivelar terreno
- Retiro de escombros y otros desechos del sitio de la construcción
- Ejecutar trabajos necesarios para la construcción (excavaciones, amarre y figurado de acero, y demás actividades que se presenten en la ejecución de la obra)
- Acatar órdenes del maestro general, residente de obra, auxiliar en obra
- Servir de apoyo logístico para las actividades requeridas

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**TERCERA: Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA: Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS**.

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS**.

**QUINTA: Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de **termino indefinido**, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA: Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA: Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Un millón novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos (\$1.915.950,00), pagados en el lugar de trabajo. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA: Horario.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA: Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA PRIMERA: Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA SEGUNDA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veintisiete (29) del mes de septiembre de 2025.

*Gladys Xiomara Manrique B.*  
**CONSTRUINDUCIVIL SAS**

R/L. GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Nit.901.375.684-5

*Almedo Ochoa*  
**OLMEDO OCHOA**

OFICIAL DE CONSTRUCCION

CC. 96.123.880

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901.375.684-5



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375884	5	CONSTRUINDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34920970	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	384.800	0	BANCO DAVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	34920970	2025-10-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.149.079	1.149.079	1.149.079	1.149.079	200.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	184.400	0	0	0	184.400
PORVENIR	230301	800224808	8	7	156.900	0	0	0	156.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	27.500	0	0	0	27.500
EPS(Administradoras: 3)				8	63.500	0	0	0	63.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	30.300	0	0	0	30.300
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	21.000	0	0	0	21.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	12.200	0	0	0	12.200
ARP(Administradoras: 1)				8	80.400	0	0	0	80.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	80.400	0	0	0	80.400
CCF(Administradoras: 1)				8	46.500	0	0	0	46.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	8	46.500	0	0	0	46.500
SENA(Administradoras: 1)				1	4.000	0	0	0	4.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	4.000	0	0	0	4.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	6.000	0	0	0	6.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	6.000	0	0	0	6.000
Gran Total					384.800	0	0	0	384.800



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NR 901375684	5	CONSTRUINDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35256845	E	2025-11-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.939.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35256845	2025-11-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.949.680	15.949.680	15.949.680	15.949.680	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				7	2.552.200	0	0	0	2.552.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.552.200	0	0	0	2.552.200
EPS(Administradoras: 3)				7	638.400	0	0	0	638.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	198.100	0	0	0	198.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	78.100	0	0	0	78.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	362.200	0	0	0	362.200
ARP(Administradoras: 1)				7	1.110.200	0	0	0	1.110.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	1.110.200	0	0	0	1.110.200
CCF(Administradoras: 1)				7	638.400	0	0	0	638.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	7	638.400	0	0	0	638.400
Gran Total					4.939.200	0	0	0	4.939.200



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375684	5	CONSTRUINDUCIVIL SAS	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-223	CARRERA 3 NRO 7A 67 BARRIO JARDIN		3118260217		CONSTRUINDUCIVIL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35621366	E	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.678.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35621366	2025-12-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.417.054	5.417.054	5.417.054	5.417.054	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				7	867.100	0	0	0	867.100
PORVENIR	230301	800224808	8	7	867.100	0	0	0	867.100
EPS(Administradoras: 3)				7	217.100	0	0	0	217.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	77.100	0	0	0	77.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	126.900	0	0	0	126.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	13.100	0	0	0	13.100
ARP(Administradoras: 1)				7	377.500	0	0	0	377.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	377.500	0	0	0	377.500
CCF(Administradoras: 1)				7	217.100	0	0	0	217.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	7	217.100	0	0	0	217.100
Gran Total					1.678.800	0	0	0	1.678.800

### CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONSTRUINDUCIVIL SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901375684
SUCURSAL	01
FECHA PAGO	2025-11-10
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1049397338
NOMBRE EMPLEADO	GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	34734708
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

#### SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1800000	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0

#### SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	\$ 57.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

#### SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	\$ 7.500	10

#### APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	\$ 57.000	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

#### TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 7.500	\$ 57.000	\$ 349.300







**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# PAZ Y SALVO PERSONAL

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**PAZ Y SALVO**

CHAPETA SILVA CESAR, identificado con Cedula De Ciudadania 5.492.210 declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO relacionado con mi cargo como AYUDANTE DE CONSTRUCCION, en el desarrollo del Contrato SAMC-013-2025, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 16 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

*cesar chapeta*

CHAPETA SILVA CESAR  
5.492.210

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ construinducivil@gmail.com
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

**PAZ Y SALVO**

**VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN**, identificado con Cedula De Ciudadanía 9.466.184, declaro que **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **OFICIAL DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-013-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 16 días del mes de noviembre de 2025.


Atentamente,

**VILLAMIZAR MARTINEZ EFRAIN**

9.466.184

CONSTRUINDUCIVIL

- 3183616384 / 3106716171
- [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**PAZ Y SALVO**

OCHOA OLMEDO, identificado con Cedula De Ciudadanía 96.123.880, declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **OFICIAL DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-013-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 16 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

*Ochoa Olmedo*

**OCHOA OLMEDO**

96.123.880

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

### PAZ Y SALVO

**GARCIA DURAN JUAN DE JESUS**, identificado con Cedula De Ciudadanía 9.466.571, declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **OFICIAL DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-013-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 16 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

**GARCIA DURAN JUAN DE JESUS**  
9.466.571

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT 901.375.684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES****PAZ Y SALVO**

**GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL**, identificado con Cedula De Ciudadanía 1.049.393.372, declaro que **CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.** identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **OFICIAL DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-013-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 16 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

  
**GUERRERO RANGEL JULIO RAFAEL**  
1.049.393.372

-  3183616384 / 3106716171
-  [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
-  Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

### **PAZ Y SALVO**

**AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE**, identificado con Cedula De Ciudadanía 1.094.243.208, declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-013-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 16 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

*CARLOS DUARTE AGUABLANCA*  
**AGUABLANCA DUARTE CARLOS RENE**  
1.094.243.208

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT 901.375.684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

### PAZ Y SALVO

**MANRIQUE AGUDELO GEIDY ESPERANZA**, identificado con Cedula De Ciudadanía 1.118.565.441, declaro que CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. identificada con NIT 901.375.684-5 se encuentra a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO** relacionado con mi cargo como **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**, en el desarrollo del Contrato **SAMC-013-2025**, entre el Municipio de Cubara y la empresa en referencia representada legalmente por **GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**.

Declaro a su vez haber recibido lo correspondiente a pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro incentivo para la ejecución de la obra.

Se firma en Cubará Boyacá a los 16 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

*Geidy Manrique A.*  
**MANRIQUE AGUDELO GEIDY ESPERANZA**  
1.118.565.441

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# PARAFISCALES FIC

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



## Servicio Nacional de Aprendizaje

**SENA**

MINISTERIO DE TRABAJO

### CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSTRUINDUCIVIL S.A.S identificado con el NIT 901375684, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
SAMC-013-2025	SAMC-013-2025	CUBARA	500,000	2025-11	30-ENE-2026	155071935
		Total	500,000			

Expedido por el SENA, a los treinta (30) días del mes de Enero de 2026

**"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-01-30

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3458116085 y el Número de Certificado: 457199





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5




EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES




# BITACORA DE OBRA




CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5




- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




	<b>BITACORA DE OBRA</b>	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC -013-2025	1	29	9	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>					
<p>Se realizó visita técnica de replanteo de obra en el área de intervención del proyecto correspondiente al Contrato No. SAMC-013-2025, en compañía de la supervisión y algunos miembros de la comunidad del sector. Durante la visita se verificó la localización de los tramos a intervenir y se socializaron aspectos relacionados con el acabado en concreto estampado de los andenes.</p> <p>En conjunto se sugirió ajustes en los colores del estampado, los cuales fueron evaluados y aceptados por la supervisión al tratarse de un cambio únicamente estético, que no afecta las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales ni los precios del contrato. Se continuará con la ejecución de las actividades conforme a lo acordado.</p>					
SE INICIA CON EL TRABAJO DE DESCAPOTE MANUAL					
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO	
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
MAESTRO	2	Residente de Obra	1		
AYUDANTE	4				
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
PALA					
PICA					
CARRETILLA					
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
SEGURIDAD SOCIAL					
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
OBSERVACIONES					
Proyectó:			Aprobó:		
					
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA		

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		2	30	9	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		ADECUACION DEL ESPCIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA							
SE REALIZA EL TRABAJO DE DESCAPOTE MANUAL							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
MAESTRO	3	Residente de Obra	1				
AYUDANTE	4						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PALA							
PICA							
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE		
				X			
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA			
RESIDENTE DE OBRA				SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
MATRICULA N° A68232001-91496344				MUNICIPIO DE CUBARA			




	<b>BITACORA DE OBRA</b>	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC -013-2025	3	1	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>					
SE REALIZA EL TRABAJO DE DESCAPOTE MANUAL					
<b>PERSONAL EN OBRA</b>					
<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CAUSA</b>	<b>HORAS</b>
MAESTRO	2	Residente de Obra	1		
AYUDANTE	4				
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>					
PICO			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>		
PALA					
CARRETILLA					
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>	<b>SECO-SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIA</b>	<b>SEÑALIZACION TEMPORAL</b>	
N° HORAS	7		2	CUMPLE	NO CUMPLE
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
OBSERVACIONES					
Proyectó:			Aprobó:		
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA		









		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		5	3	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA							
SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
MAESTRO	2	Residente de Obra	1				
AYUDANTE	4						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA							
CARRETIILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		6	4	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA							
SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
MAESTRO	2	Residente de Obra	1				
AYUDANTE	4						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA							
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	9			CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUINDONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			









		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		8	6	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA							
SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
ayudante	4	Profesional FEO	0				
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA							
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	<b>SEÑALIZACION TEMPORAL</b>			
N° HORAS	8		1	CUMPLE		NO CUMPLE	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
Proyectó:				Aprobó:			
 CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			

		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		9	7	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA							
SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA							
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE		
				X			
SEGURIDAD SOCIAL							
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS YAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




	<b>BITACORA DE OBRA</b>	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC -013-2025	10	8	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>					
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA					
SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION					
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.					
PERSONAL EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro		2 Residente de Obra	1		
Ayudante		4 Profesional HSQ	0		
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA					
PICA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO		
PALA			MEZCLADORA		
CARRETILLA					
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
OBSERVACIONES					
Proyectó:			Aprobó:		
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZO ENO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA		




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		11	9	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA							
SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA							
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	4		5	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUIJONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025	12	10	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>						
SE REALIZA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA						
SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION						
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.						
SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO						
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1			
Ayudante	4	Profesional HSQ	0			
Topografo	0					
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA						
PALA			VIBROCOMPACTADOR RANA			
CARRETILLA						
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE	
				X		
SEGURIDAD SOCIAL						
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
<b>OBSERVACIONES</b>						
Proyectó:			Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE VIZCAINO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			 ARQ. JESUS IVAN QUIONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		13	11	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 20 CM.							
SE REALIZAN LOS CONTENEDORES DE RAIZ							
SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				VIBROCOMPACTADOR RANA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO		SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	8			1	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-81496344				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			






		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		15	13	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 20 CM.							
SE REALIZAN LOS CONTENEDORES DE RAIZ							
SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				VIBROCOMPACTADOR RANA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyecto:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		16	14	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.							
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 20 CM.							
SE REALIZAN LOS CONTENEDORES DE RAIZ							
SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				VIBROCOMPACTADOR RANA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	9			CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyecto:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




	<b>BITACORA DE OBRA</b>	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC -013-2025	17	15	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>					
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM.					
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 20 CM.					
SE REALIZAN LOS CONTENEDORES DE RAIZ					
SE REALIZA EL CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS					
SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO					
<b>PERSONAL EN OBRA</b>					
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	2	Residente de Obra	1		
Ayudante	4	Profesional HSQ	0		
Topografo	0				
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>					
PICA					
PALA					
CARRETILLA					
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>					
MEZCLADORA DE CONCRETO					
VIBROCOMPACTADOR RANA					
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>					
N° HORAS	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
	9			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>					
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
<b>OBSERVACIONES</b>					
Proyectó:			Aprobó:		
					
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA		




	<b>BITACORA DE OBRA</b>	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC -013-2025	18	16	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>					
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 20 CM.					
SE REALIZAN LOS CONTENEDORES DE RAIZ					
SE REALIZA EL CONCRETO ESTRIADO RAMPAS					
SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO					
PERSONAL EN OBRA					
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS
Maestro general	2	Residente de Obra	1		
Ayudante	4	Profesional HSQ	0		
Topografo	0				
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA					
PICA					
PALA					
CARRETILLA					
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO					
MEZCLADORA DE CONCRETO					
VIBROCOMPACTADOR RANA					
ESTADO DEL TIEMPO					
SECO-SOLEADO	NUBLADO		LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE
				X	
SEGURIDAD SOCIAL					
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
OBSERVACIONES					
Proyecto:			Aprobó:		
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA		




		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025	19	17	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>						
SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 20 CM.						
SE REALIZAN LOS CONTENEDORES DE RAIZ						
SE REALIZA EL CONCRETO ESTRIADO RAMPAS						
SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO						
<b>PERSONAL EN OBRA</b>						
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1			
Ayudante	4	Profesional HSQ	0			
Topografo	0					
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>						
PICA						
PALA						
CARRETILLA						
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>						
MEZCLADORA DE CONCRETO						
VIBROCOMPACTADOR RANA						
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	7		2	CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>						
CUMPLE	X	NO CUMPLE		X		
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
						
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91495344			ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			














		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		22	20	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
SE REALIZA LA INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA							
SE REALIZA EL CONCRETO ESTRIADO RAMPAS							
SE REALIZAN TRABAJO DE RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA				VIBROCOMPACTADOR RANA			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUIRONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>CONSECUTIVO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>CONTRATO DE OBRA</b>		SAMC -013-2025		23	21	10	2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA</b>		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
<b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>		CONSTRUIDUCIVIL S.A.S.					
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
SE REALIZA LA INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							
<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TIEMPO PERDIDO</b>		<b>CAUSA</b>	<b>HORAS</b>
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETELLA							
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>	<b>SECO-SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIA</b>	<b>SEÑALIZACION TEMPORAL</b>			
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
<b>OBSERVACIONES</b>							
<b>Proyecto:</b>				<b>Aprobó:</b>			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		24	22	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
SE REALIZA LA INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA			
RESIDENTE DE OBRA				SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
MATRICULA N° A68232001-91496344				MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025	25	23	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>						
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR						
SE REALIZA LA INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA						
<b>PERSONAL EN OBRA</b>						
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO		
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1			
Ayudante	4	Profesional HSQ	0			
Topografo	0					
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>						
PICA						
PALA						
CARRETILLA						
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>						
MEZCLADORA DE CONCRETO						
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>						
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE	
				X		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>						
CUMPLE						
X						
NO CUMPLE						
OBSERVACIONES						
Proyectó:				Aprobó:		
						
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H				ARQ. JESUS IVAN QUIROVES RUEDA		
RESIDENTE DE OBRA				SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		
MATRICULA N° A68232001-91498344				MUNICIPIO DE CUBARA		




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		26	24	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
SE REALIZA LA INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO		CAUSA	HORAS
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	9			CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>CONSECUTIVO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>CONTRATO DE OBRA</b>		SAMC -013-2025		27	25	10	2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA</b>		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
<b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
SE REALIZA LA INSTALACION DE LOSETA PREFABRICADA							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							
<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
				<b>CAUSA</b>	<b>HORAS</b>		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>							
PICA							
PALA							
CARRETILLA							
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>							
MEZCLADORA DE CONCRETO							
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>	<b>SECO-SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIA</b>	<b>SEÑALIZACION TEMPORAL</b>			
N° HORAS	7		2	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>CUMPLE</b>	X	<b>NO CUMPLE</b>		X			
<b>OBSERVACIONES</b>							
<b>Proyectó:</b>				<b>Aprobó:</b>			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91498344				 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025	28	26	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
NO SE LABORA						
PERSONAL EN OBRA			TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general		Residente de Obra				
Ayudante		Profesional HSQ				
Topografo						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE	
				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025	29	27	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>						
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR						
<b>PERSONAL EN OBRA</b>						
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO		
Maestro general	2	Residente de Obra	1	CAUSA	HORAS	
Ayudante	4	Profesional HSQ	0			
Topografo	0					
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>						
PICA			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PALA			MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA						
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	5		4	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL						
CUMPLE	X	NO CUMPLE		X		
OBSERVACIONES						
Proyectó:				Aprobó:		
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO R RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUINDONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA		




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		30	28	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	4		5	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA			
RESIDENTE DE OBRA				SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
MATRICULA N° A68232001-91496344				MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO				
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		31	29	10	2025				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA									
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.									
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA									
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>											
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR											
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>							
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS						
Maestro general	2	Residente de Obra	1								
Ayudante	4	Profesional HSQ	0								
Topografo	0										
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>							
PICA											
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO							
CARRETILLA											
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>		<b>SECO-SOLEADO</b>		<b>NUBLADO</b>		<b>LLUVIA</b>		<b>SEÑALIZACION TEMPORAL</b>			
N° HORAS		3				6		CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL								X			
CUMPLE		X		NO CUMPLE							
OBSERVACIONES											
Proyectó:						Aprobó:					
											
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344						ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA					




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		32	30	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO			
Maestro general	2	Residente de Obra	1	CAUSA		HORAS	
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	4		5	CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
<b>OBSERVACIONES</b>							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		33	31	10	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE ZICANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		34	1	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO		SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	6			3	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		35	2	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
NO SE LABORA							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS			
Maestro general	Residente de Obra						
Ayudante	Profesional HSQ						
Topografo							
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>X</b>			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
<b>OBSERVACIONES</b>							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE DIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		36	3	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CARGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>CAUSA</b>	<b>HORAS</b>		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>	<b>SECO-SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIA</b>	<b>SEÑALIZACION TEMPORAL</b>			
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>X</b>			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
<b>OBSERVACIONES</b>							
Proyecto:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		37	4	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	7		2	CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H				ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA			
RESIDENTE DE OBRA				SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
MATRICULA N° A68232001-91496344				MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		38	5	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN COLOR							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	2	Residente de Obra	1				
Ayudante	4	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				MEZCLADORA DE CONCRETO			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	6		3	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H				ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA			
RESIDENTE DE OBRA				SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
MATRICULA N° A68232001-91496344				MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		39	6	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LAVADA DEL PISO							
SE REALIZA LA BRECHADA DE PISO							
SE REALIZA LA INSTALACION DE LA CESTA DE BASURA							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Ayudante	1	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				HIDROLAVADORA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		41	8	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LAVADA DEL PISO							
SE REALIZA LA BRECHADA DE PISO							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO		CAUSA	
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Ayudante	1	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				HIDROLAVADORA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	7		2	CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025	42	9	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>						
NO SE LBORA						
PERSONAL EN OBRA						
PERSONAL EN OBRA			TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS	
Maestro general		Residente de Obra				
Ayudante		Profesional HSQ				
Topogtrato						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS				CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyectó:			Aprobó:			
						
ARQ. CARLOS ENRIQUE LAFANO H			ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA			
RESIDENTE DE OBRA			SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
MATRICULA N° A68232001-91496344			MUNICIPIO DE CUBARA			




		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		43	10	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LAVADA DEL PISO							
SE REALIZA LA INSTALACION DEL ARBOLES CON SU RESPECTIVO ABONO							
SE REALIZA LA BRECHADA DE PISO							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							
PERSONAL EN OBRA		CANTIDAD		TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Ayudante	1	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA				HIDROLAVADORA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	5		4	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			




		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		44	11	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUIDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LAVADA DEL PISO							
SE REALIZA LA INSTALACION DEL ARBOLES CON SU RESPECTIVO ABONO							
SE REALIZA LA BRECHADA DE PISO							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA	HORAS		
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Ayudante	1	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				HIDROLAVADORA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE		
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyectó:				Aprobó:			
 <b>ARQ. CARLOS ENRIQUE RIZCANO H.</b> RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				 <b>ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA</b> SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			

		BITACORA DE OBRA	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025	45	12	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>						
SE REALIZA LAVADA DEL PISO						
SE REALIZA LA INSTALACION DEL ARBOLES CON SU RESPECTIVO ABONO						
SE REALIZA PINTADA CON LACA PARA EL PISO						
PERSONAL EN OBRA			TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS
Maestro general	1	Residente de Obra	1			
Ayudante	1	Profesional HSQ	0			
Topografo	0					
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA			MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA						
PALA			HIDROLAVADORA			
CARRETILLA						
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL		
N° HORAS	0		1	CUMPLE	NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X		
CUMPLE	X	NO CUMPLE				
OBSERVACIONES						
Proyecto:			Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LUCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			 ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			

 CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC-013-2025		46	13	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LAVADA DEL PISO							
SE REALIZA LA BRECHADA DE PISO							
SE REALIZA PINTADA CON LACA PARA EL PISO							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Ayudante	1	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA				HIDROLAVADORA			
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO		NUBLADO		LLUVIA		SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	SECO-SOLEADO					CUMPLE	NO CUMPLE
	9					X	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>							
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
<b>OBSERVACIONES</b>							
Proyecto:				Aprobó:			
 ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A88232001-91496344				 ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			

	<b>BITACORA DE OBRA</b>	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	SAMC -013-2025	47	14	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRINDUCIVIL S.A.S.				
REPRESENTANTE LEGAL	GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA				
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>					
SE REALIZA LA BRECHADA DE PISO					
SE REALIZA PINTADA CON LACA PARA EL PISO					
<b>PERSONAL EN OBRA</b>					
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO PERDIDO	
Maestro general	1	Residente de Obra	1	CAUSA	HORAS
Ayudante	1	Profesional HSQ	0		
Topogtrato	0				
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>		
PICA					
PALA					
CARRETILLA					
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL	
N° HORAS	8		1	CUMPLE	NO CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL				X	
CUMPLE	X	NO CUMPLE			
OBSERVACIONES					
Proyectó:			Aprobó:		
					
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344			ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA		

 CONSTRUIDUCIVIL S.A.S.		<b>BITACORA DE OBRA</b>		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
<b>CONTRATO DE OBRA</b>		SAMC-013-2025		48	15	11	2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA</b>		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
<b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA LA BRECHADA DE PISO							
SE REALIZA PINTADA CON LACA PARA EL PISO							
<b>PERSONAL EN OBRA</b>				<b>TIEMPO PERDIDO</b>			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Ayudante	1	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
<b>HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA</b>				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO</b>			
PICA							
PALA							
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	7		2	CUMPLE	NO CUMPLE		
				X			
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>							
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
<b>OBSERVACIONES</b>							
<b>Proyectó:</b>				<b>Aprobó:</b>			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			

		BITACORA DE OBRA		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA		SAMC -013-2025		49	16	11	2025
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA					
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL		GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA					
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>							
SE REALIZA PINTADA CON LACA PARA EL PISO							
PERSONAL EN OBRA				TIEMPO PERDIDO			
CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CAUSA		HORAS	
Maestro general	1	Residente de Obra	1				
Ayudante	1	Profesional HSQ	0				
Topografo	0						
HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA				MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO			
PICA							
PALA							
CARRETILLA							
ESTADO DEL TIEMPO	SECO-SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SEÑALIZACION TEMPORAL			
N° HORAS	9			CUMPLE		NO CUMPLE	
SEGURIDAD SOCIAL				X			
CUMPLE	X	NO CUMPLE					
OBSERVACIONES							
Proyecto:				Aprobó:			
							
ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO H. RESIDENTE DE OBRA MATRICULA N° A68232001-91496344				ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CUBARA			



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# MEMORIA DE CANTIDADES

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUIDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 9013766046

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

---

**MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA**

**Memoria de Cantidades de Obra**

Fecha:	DICIEMBRE	Año del Proyecto:	2025	Departamento:	BOYACA
Etapa:	Año Calendario:	2025	Municipio:	CUBARA	


**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**

Item	Actividad	Unid.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones				Cantidades						
					A (m2) Area	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto-Espesor	V (m3) Volumen	C (Unid) Cant. De elementos	Cant. Parcial			
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE URBANISMO	M2	ANDEN COSTADO 1		189.32							189.32			
			ANDEN COSTADO 2		322.72							322.72			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Cantidad Parcial Hoja de 1</td> <td style="width: 20%;">512.04</td> </tr> <tr> <td>Cantidad Total</td> <td>512.04</td> </tr> </table>												Cantidad Parcial Hoja de 1	512.04	Cantidad Total	512.04
Cantidad Parcial Hoja de 1	512.04														
Cantidad Total	512.04														




Proyecto:

CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Vs. Bto. Secretario

  
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

---

 3183616384 / 3106716171  
 construiducivil@gmail.com  
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardin (Cubara-Boyaca)

**MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA**

**Memoria de Cantidades de Obra**

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

CUBARA

---

Etapa: **DICIEMBRE** Año Calendario: 2025 Año del Proyecto: 2025 Municipio: CUBARA

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**

Item	Actividad	Unid.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones			Cantidades				
					A (m) Área	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cent. Parcial
1.02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 KM	M2	ANDEN COSTADO 1 ANDEN COSTADO 2 CONCRETO EXISTENTE	COBST. 1	189.32 322.72		2.00	9.00			189.32 322.72	189.32 322.72
												-18.00
Cantidad Parcial Hoja 1 de 1: <b>484.04</b> Cantidad Total: <b>484.04</b>												

Proyecto:   
**CARLOS LIZCANO HERRERA**  
 RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bb. Secretario:   
**JESUS IVAN QUIJONES RUEDA**  
 SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


3183616384 / 3106716171  
 construinducivil@gmail.com  
 Carretera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA



Memoria de Cantidades de Obra

Fecha:	DICIEMBRE			Departamento:	BOYACA		
Etapas:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades			
					A (m2) Area	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial		
1.03	DEMOLICION ANDENES EN CONCRETO	M2		CONCRETO EXISTENTE	COST, 1			2.00	9.00				-18.00	

Cantidad Parcial Hoja1de1	-	18.00
Cantidad Total	-	18.00

Proyecto	 CARLOS LIZCANO HERRERA RESIDENTE DE OBRA	Vo. Bo. Secretario  JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
----------	--	---

 3183616384 / 3106716171  
 construinducivil@gmail.com  
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

Memoria de Cantidades de Obra


Fecha:	DICIEMBRE	Año del Proyecto:		2025	Departamento:	BOYACA
Etaqa:	Año Calendario:	2025	Municipio:	CUBARA		


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					A (m <sup>2</sup> ) Area	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m <sup>3</sup> ) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
1.04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	M3	ANDEN COSTADO 1		189,32					0,18			24,12
			ANDEN COSTADO 2		322,72					0,18			56,17



Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	92,30
Cantidad Total	92,30

Proyecto:  CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo. Secretario:  JESUS IVAN QUINONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

☎ 3183616384 / 3106716171  
 ✉ construinducivil@gmail.com  
 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardin (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375084-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**


MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

**Memoria de Cantidades de Obra**

Fecha:	DICIEMBRE	Departamento:	BOYACA
Etapas:	Año Calendario: 2025	Año del Proyecto: 2025	Municipio: CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones						Cantidades		
					A (m2) Area	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cent. De elementos	Cant. Parcial	
1,05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3											
			ANDEN COSTADO 1				0,25	124,24	0,20	6,21			38,59
			ANDEN COSTADO 2				0,25	128,58	0,20	6,43			41,33
			CONTENEDOR										



Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	79,92
Cantidad Total	79,92

Proyecto	 CARLOS LIZCANO HERRERA RESIDENTE DE OBRA	Vo. Bo. Secretario	 JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
----------	---	--------------------	--

3183616384 / 3106716171  
 construinducivil@gmail.com  
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 701375584-5



EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA


**Memoria de Cantidades de Obra**

Fecha:	DICIEMBRE			Departamento:	BOYACA	
Etapas:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades		
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m <sup>2</sup> ) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial
2.01	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS - (3000 P8) E=10CM. INCLUYE INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM*15CM)	M2										
			RAMPAS	#/V		0.96					4,00	3,84
			RAMPAS	#/V		3,84					1,00	3,84
			RAMPAS	#/V		3,37					1,00	3,37
			RAMPAS	#/V		2,88					3,00	8,84
			RAMPAS	#/V		3,60					1,00	3,60
			RAMPAS	#/V	M2	0,96					3,00	2,88
			RAMPAS	#/V	M2	2,88					7,00	20,16
			RAMPAS	#/V	M2	3,36					1,00	3,36

Cantidad Parcial Hoja1de1	49,69
Cantidad Total	49,69

Proyecto:  CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Va. Bo. Secretario:  JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

☎ 3183616384 / 3106716171  
 ✉ construinducivil@gmail.com  
 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375084-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

**Memoria de Cantidades de Obra**


Fecha:	DICIEMBRE			Departamento:	BOYACA		
Etapas:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA	


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades			
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m2) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
2.02	FINICION DE PISO EN CONCRETO DE 2000 P/CM ± 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 M/CM DE ESPESOR	M2											
			ANDEN 1	Largo x Ancho x Cantidad	M2	44,18						1,00	44,18
			ANDEN 2	Largo x Ancho x Cantidad	M2	85,45						1,00	85,45



Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	129,63
Cantidad Total	129,63

Proyecto:  CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo. Secretario:  JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ construinducivil@gmail.com  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA


**Memoria de Cantidades de Obra**


Fecha:	DICIEMBRE			Departamento:	BOYACA		
Etapas:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades			
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m2) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
2.03	FONDO DE FIBRA CONCRETO DE 600 X 315 X 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MML (3/8" X 3/8")	M2											
			ANDEN 1	Largo x Ancho x	M2	-					48,23	1,00	48,23
			ANDEN 2	Cantidad	M2	-					78,40	1,00	78,40

Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	126,63
Cantidad Total	126,63

Proyecto:  CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Va. Bo. Secretario:  JESÚS IVÁN QUINONEZ RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ construinducivil@gmail.com  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375084-0

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES


MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

**Memoria de Cantidades de Obra**


Fecha:	DICIEMBRE	Departamento:	BOYACA
Etapas:	Año Calendario: 2025	Año del Proyecto: 2025	Municipio: CUBARA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades			
					B (m) Lado Mayor	F(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m2) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cont. Parcial	
2,04	LOSETA PREFABRICADA COLOR AMARILLA A-50 (40X40X6). INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION 4 CM Y EMBOQUILLADO.	M2											
			LOSETA AMARILLA	#N/D	M2	37,12						1,00	37,12
			LOSETA AMARILLA	#N/D	M2	38,08						1,00	38,08



Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	75,20
Cantidad Total	75,20

Proyecto:  CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bc. Secretario:  JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

**Memoria de Cantidades de Obra**

Fecha:	DICIEMBRE			Departamento:	BOYACA		
Etapas:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item #REF1	Actividad #REF1	Und. #REF1	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones			L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m2) Area	Cantidades	
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perímetro	a (m) Ancho				C (Und) Cant. De elementos	Cont. Parcial
			LOSETA PEPAS GRIS	Largo x Ancho x Cantidad	M2	20,00					1,00	20,00
			LOSETA PEPAS GRIS			33,76					1,00	33,76




Cantidad Parcial Hoja 1 de 1 **53,76**

Cantidad Total **53,76**

Proyecto

  
CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo. Secretario

  
JESUS IVAN QUIRONES SUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ construinducivil@gmail.com  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

Memoria de Cantidades de Obra



Fecha:	DICIEMBRE			Departamento:	BOYACA		
Etapas:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades		
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m <sup>2</sup> ) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial
2.06	CONTENEDOR DE RAICES	Und.										
			ANDEN COSTADO 1	Cantidad de elementos	Und.						9,00	9,00
			ANDEN COSTADO 2									17,00

Cantidad Parcial Hoja 1 de 1 26,00

Cantidad Total 26,00

Proyecto	 <b>CARLOS LIZCANO HERRERA</b> RESIDENTE DE OBRA	Vo. Bo. Secretario	 <b>JESUS IVAN QUINONES HUEDA</b> SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
----------	---	--------------------	--

 3183616384 / 3106716171  
 [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardin (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375084-9



EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

**Memoria de Cantidades de Obra**

Fecha:	DICIEMBRE	Departamento:		BOYACA		
Etapas:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades			
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m2) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
2.07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	ML											
			ANDEN COSTADO 1	Largo y Cantidad	ML				59.20			1.00	59.20
			ANDEN COSTADO 2						125.60			1.00	125.60

Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	184.80
Cantidad Total	184.80

Proyecto

  
CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo. Secretario

  
JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ construinducivil@gmail.com  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901376084-9


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA


**Memoria de Cantidades de Obra**


Fecha:	DICIEMBRE	Departamento:			BOYACA	
Etapa:	Año Calendario:	2025	Año del Proyecto:	2025	Municipio:	CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades			
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m <sup>2</sup> ) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial	
2.08	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE RELEJERZO)	ML											
			ANDEN COSTADO 1	Largo	ML				124.24			1,00	124.24
			ANDEN COSTADO 2	Cantidad						128.58			1,00

Cantidad Parcial Hoja1de1	252.82
Cantidad Total	252.82

Proyecto:   
CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo. Secretario:   
JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

Memoria de Cantidades de Obra

Fecha:	DICIEMBRE	Departamento:	BOYACA
Etapas:	Año Calendario: 2025	Año del Proyecto: 2025	Municipio: CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades		
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m <sup>2</sup> ) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial
2.09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1.2 -1.5	Und.										
			ANDEN COSTADO 1	Largo x	Und.						13,00	13,00
			ANDEN COSTADO 2	Cantidad								13,00


Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	26,00
Cantidad Total	26,00

Proyecto



CARLOS LIZCANO HERRERA  
RESIDENTE DE OBRA

Va. Bo. Secretario



JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS





MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA



Memoria de Cantidades de Obra

Fecha:	DICIEMBRE	Departamento:	BOYACA
Etapas:	Año Calendario: 2025	Año del Proyecto: 2025	Municipio: CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Fórmula de Cálculo	Dimensiones					Cantidades		
					B (m) Lado Mayor	P(m) Perímetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	A (m <sup>2</sup> ) Area	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	Und.										
			ANDEN COSTADO 1	Und.							1,00	1,00
												

Cantidad Parcial Hoja 1 de 1	1,00
Cantidad Total	1,00

Proyecto	 CARLOS LIZCANO HERRERA RESIDENTE DE OBRA	Vo. Bo. Secretario  JESÚS IVÁN QUINTERO RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
----------	--	---

 3183616384 / 3106716171  
 construinducivil@gmail.com  
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

-  3183616384 / 3106716171
-  [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
-  Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

## REGISTRO FOTOGRAFICO

**CONTRATO DE OBRA No. SAMC -013-2025**

**OBJETO:**

**"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA".**

**CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.  
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**

**ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA – SUPERVISOR**

**CUBARÁ, 2025**

 3183616384 / 3106716171

 [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

**27 DE SEPTIEMBRE DE 2025**



**17 DE NOVIEMBRE DE 2025**





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

**LOCALIZACION Y REPLANTEO**






**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**DESCAPOTE MANUAL**

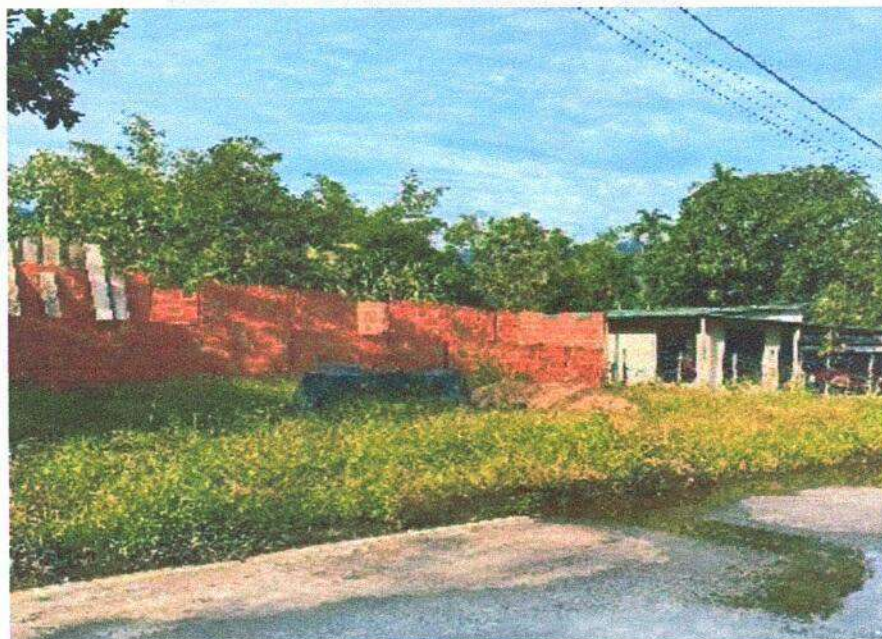

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



**DEMOLICION ANDENES EN CONCRETO**





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



**RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA**





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**



**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN**





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

**CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM ·15CM)**



☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA  
BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM•15CM)**



3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM•15CM)**





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



**LOSETA PREFABRICADA COLOR A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM. Y SELLO DE ARENA**




☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

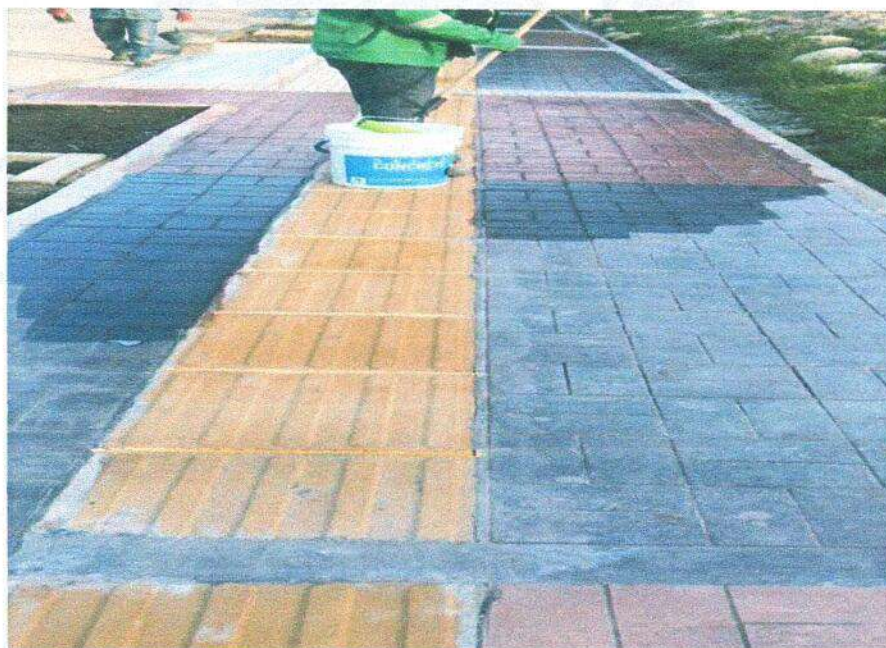

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



**LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN 4 CM. Y SELLO DE ARENA**




3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

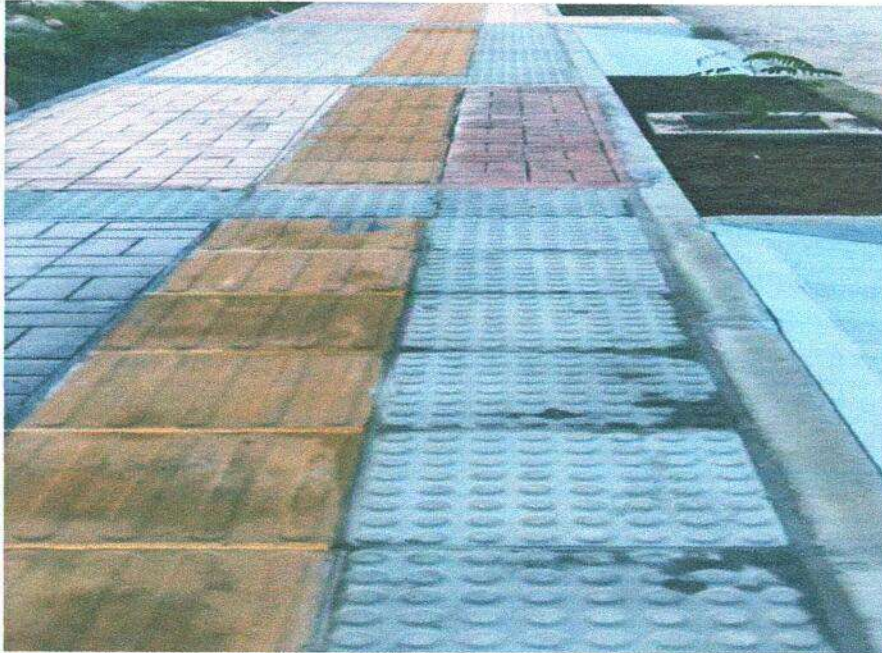

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONTENEDOR DE RAÍCES**





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**



**BORDILLO PARA ZONA VERDE**




☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

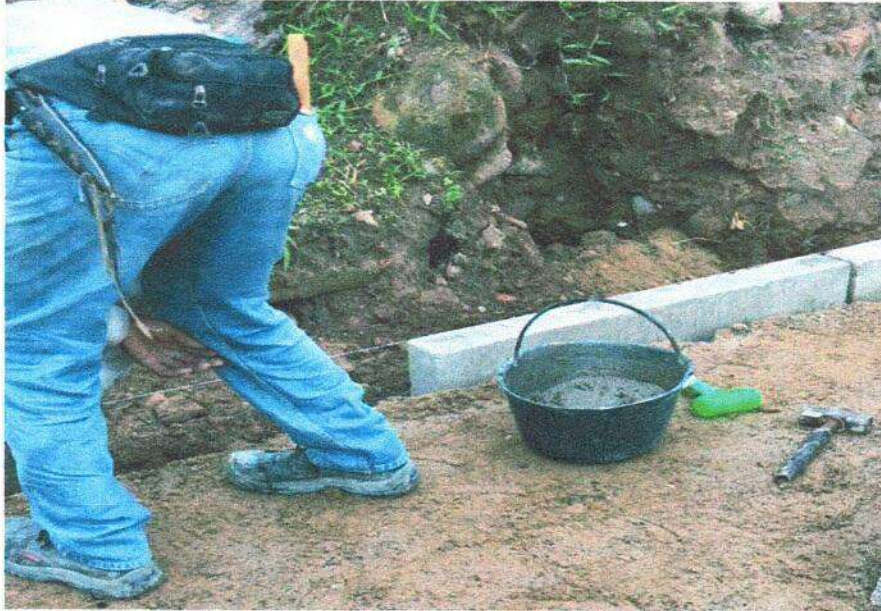

3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



**"CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO)."**



3183616384 / 3106716171  
construinducivil@gmail.com  
Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS**





**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

**SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO**



☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



3183616384 / 3106716171

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



CONSTRUINDUCIVIL  
NIT. 901375684-5

Atentamente;

**CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**  
RESIDENTE DE OBRA

☎ 3183616384 / 3106716171  
✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)  
📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# ENSAYOS LABORATORIO

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT**  
Ingeniero Civil U.F.P.S. - Esp. Geotecnia Ambiental UDES

Fecha:  
Noviembre de 2025

**ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO**

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA

Contrato No. SAMC-013-2025

Página 1

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO**  
**INV E-410-13 NTC 673**

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA		
CONTRATISTA	CONSTRUINDUCIVL S.A.S - R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA	CONTRATO DE OBRA No.:	SAMC-013-2025
SUPERVISOR	ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA - S. DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		

FECHA DE TOMA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	LOCALIZACION	REF. CILINDRO	SLUMP (CM)	EDAD CILINDRO (DÍAS)	FECHA DE ROTURA	CARGA		DIMENSION CILINDRO (cm)		RESISTENCIA PSI				FALLA	OBSERVACIONES	
							KN	Lb	D	H	Nominal		Resultado				%
											PSI	MPa	PSI	MPa			
17/10/2025	CONCRETO ESTRIADO E=10CM	RAMPAS	1		7	24/10/2025	122.3	27.498	10.0	20.0	3000	21	2259	16	75%	Corte	
			1		14	31/10/2025	154.6	34.761	10.0	20.0	3000	21	2855	20	95%	Corte	
			1		28	14/11/2025	177.5	39.910	10.0	20.0	3000	21	3278	23	109%	Corte	
			1		28	14/11/2025	174.7	39.280	10.0	20.0	3000	21	3227	23	108%	Corte	
23/10/2025	PLACA DE PISO E=10CM	ANDENES	2		7	30/10/2025	125.9	28.308	10.0	20.0	3000	21	2325	16	78%	Corte	
			2		14	6/11/2025	160.2	36.020	10.0	20.0	3000	21	2959	21	99%	Corte	
			2		28	20/11/2025	182.5	41.034	10.0	20.0	3000	21	3371	24	112%	Corte	
			2		28	20/11/2025	179.6	40.382	10.0	20.0	3000	21	3317	23	111%	Corte	

**OBSERVACIONES** CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA Y ENSAYADOS EN EL LABORATORIO

REF: NTC 673

Columnar	Cono	Cono y corte	Cono y rotura vertical	Corte

<p><i>Enderson Cagua</i></p> <p>ENDERSON JADIR CACUA RICO LABORATORISTA</p>	<p><i>Joaquín Delgado Montagut</i></p> <p>ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT M.P. 5420272031 NTS</p>
---	---

Carrera 18 # 27-21 Barrio Modelo  
seincojedm@gmail.com Cel. 3132635714  
Saravena-Arauca



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# INFORME DE IMPREVISTOS

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

## INFORME DE IMPREVISTOS

CONTRATO DE OBRA SAMC -013-2025

PERIODO DEL INFORME: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

### OBJETO:

"MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA"

CONTRATISTA: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.  
R/L GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA

ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA  
SUPERVISOR

CUBARÁ, 2025

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito documentar, analizar y justificar los imprevistos ocurridos durante la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA", cuyo alcance comprendió intervenciones de mejoramiento DE ESPACIOS URBANOS , ANDENES SOBRE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 3 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARA

Durante el desarrollo de las actividades programadas se presentaron condiciones no previstas que afectaron directamente los rendimientos, la continuidad de los frentes de trabajo y los costos asociados al proceso constructivo. En particular, se registraron eventos climatológicos adversos (lluvias de diferentes intensidades y duraciones) entre el 29 de SEPTIEMBRE y el 16 de NOVIEMBRE de 2025,

situación que impactó actividades sensibles a la humedad como los concretos estriado rampas y la construcción de placas de pisos en concreto de 3000 psi

Estas afectaciones obligaron a reducir ritmos de trabajo, interrumpir actividades por seguridad, reprogramar procesos y minimizar el uso operativo de ciertos equipos debido a la falta de condiciones adecuadas de superficie, visibilidad. Así mismo, la obra presentó un segundo tipo de imprevisto el cual era un lavado general de las losas en concreto para poder retirar el polvo y todo el mugre generado por estar a la intemperie para poder realizar el acabado final en laca.

El presente informe consolida y justifica exclusivamente los imprevistos ocurridos durante la ejecución del proyecto, detallando las afectaciones generadas por las lluvias. Estos sucesos impactaron directamente la continuidad operacional, los rendimientos esperados y los costos asociados a procesos constructivos sensibles a condiciones climáticas o variaciones de volumen. En consecuencia, se expone de manera técnica y verificable cómo dichos eventos obligaron a emplear los recursos del rubro de imprevistos, conforme a su naturaleza contractual, para cubrir los mayores costos derivados de tiempos improductivos, reprogramaciones operativas, interrupciones por seguridad Este análisis permite sustentar la correcta aplicación de los recursos destinados a imprevistos, asegurando transparencia y coherencia técnica en el desarrollo del proyecto.

### JUSTIFICACION

La presente justificación se formula con el propósito de sustentar técnicamente las causas que originaron el uso del rubro de imprevistos durante la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA. Dichos imprevistos se derivaron de dos factores principales: las afectaciones climáticas por lluvias y la realización obligada de un lavado general para la aplicación de la pintura de las losas, ambos no previstos en la programación inicial ni en el presupuesto contractual.

En primer lugar, las precipitaciones registradas entre el 29 de SEPTIEMBRE y el 16 de NOVIEMBRE de 2025, generaron interrupciones y disminución en los rendimientos de actividades que requieren condiciones ambientales secas, tales como los concretos estriados para rampas y la construcción de placas de pisos en concreto de 3000 psi. Estas labores, al verse afectadas por humedad superficial, obligaron a detener total o parcialmente los frentes de trabajo, generando tiempos improductivos, reprogramaciones operativas y disminución en los índices de productividad del personal y los equipos.

Además de el lavado general de las losas en concreto para la realización del acabado final.

Ambos factores —las lluvias y la actividad adicional— configuran imprevistos conforme a la normatividad de contratación estatal, al tratarse de eventos ajenos a la voluntad del contratista y no previstos en la planeación ni en los estudios previos. El uso de los recursos de imprevistos se encuentra plenamente justificado en tanto permitió cubrir los mayores costos derivados de la afectación climática, la ralentización de actividades, la necesidad de adecuar tiempos y equipos, y la ejecución de metrajes adicionales requeridos para cumplir adecuadamente con el objeto del contrato.

En consecuencia, el uso del rubro de imprevistos responde a la necesidad de garantizar la continuidad del proyecto, la estabilidad técnica de las intervenciones de la obra

### TIPOS DE IMPREVISTOS

#### IMPREVISTO CLIMATICO- (EVENTOS DE LLUVIAS)

Las lluvias registradas entre el 29 de SEPTIEMBRE y el 16 de NOVIEMBRE de 2025, constituyen imprevistos climatológicos que generan afectaciones directas sobre actividades que requieren condiciones ambientales secas para garantizar su correcta adherencia, calidad y seguridad operacional. Entre las actividades sensibles a estas condiciones se encuentran:

- Lavado De Los Pisos En Concreto Con Hidro lavadora.
- Concretos Estriados Para Rampas.
- Placas De Pisos En Concreto De 3000 Psi

La presencia de las lluvias reduce la capacidad de ejecución continua, exige pausas operativas por seguridad, impide la correcta aplicación de acabados y disminuye los rendimientos esperados, lo que conduce a tiempos improductivos y reprogramación de frentes de trabajo.

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

Estos eventos climatológicos configuran imprevistos porque no pueden ser anticipados en su intensidad ni duración y alteran las condiciones normales previstas para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades del proyecto.

### COSTOS DE IMPREVISTOS

PRESUPUESTO DE IMPREVISTOS- MOTIVOS DE LLUVIAS						
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD DE PERSONAL	HORA EJECUTADAS	VALOR HORA EXTRA	TOTAL
1	4 AYUDANTES	HORA	4	42	\$ 10.600,00	\$ 1.780.800,00
2	2 OFICIAL	HORA	2	42	\$ 14.000,00	\$ 1.176.000,00
6	HIDROLAVADORA	HORA	1	13	\$ 4.000,00	\$ 52.000,00
						<b>\$ 3.008.800,00</b>

Valor total de imprevistos en el presente contrato es de tres millones ocho mil ochocientos pesos.

COSTOS TOTALES DE LA OBRA	
<b>COSTO INDIRECTO</b>	<b>\$ 150.372.027,93</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 36.089.287,00</b>
<b>IMPREVISTOS</b>	<b>\$ 3.007.441,00</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>\$ 10.526.042,00</b>
<b>TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>\$ 199.994.798,00</b>

El contrato contempla un rubro de imprevistos equivalente al 2 % de la base de cálculo de los costos indirectos, por un valor de \$ 3.007.441,00 incluido dentro del valor total de la obra de \$199.994.798,00

Durante el periodo evaluado, los imprevistos asociados a:

tiempos improductivos por lluvias (personal y equipos),

generaron un valor ejecutado de **\$3.008.800,00** que corresponde al 100 % del rubro de imprevistos contratado.

De esta forma, el saldo disponible del rubro de imprevistos es de \$0,00, correspondiente al 0 % del valor contratado para imprevistos, manteniéndose dentro del límite del 2 % definido contractualmente.

### RECONOCIMIENTO FINANCIERON

El conde financiero reconoce por imprevistos un valor de:

3183614384 / 3106716171  
 construinducivil@gmail.com  
 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

Imprevistos reconocidos: \$ 3.008.800,00

Esto equivale a: 100 % del rubro total de imprevistos (2 %).

#### **SALDO DISPONIBLE DE RUBRO DE IMPREVISTOS**

El saldo pendiente por ejecutar en el rubro, con base en los valores contratados y ejecutados, es:

Saldo del rubro: \$0.00

#### **RESUMEN DEL BALANCE**

Concepto	Valor	% del rubro de imprevistos (2 %)
Imprevistos contratados	<b>\$ 3.007.441,00</b>	100 %
Imprevistos ejecutados	<b>\$ 3.008.800,00</b>	100 %
Imprevistos reconocidos	<b>\$ 3.007.441,00</b>	100 %
<b>Saldo disponible</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00 %</b>

#### **DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y JUSTIFICADA DE LOS IMPREVISTOS**

##### **Imprevistos por Lluvias – Mano de Obra y Equipos**

Durante el periodo comprendido entre el 29 de SEPTIEMBRE y el 16 de NOVIEMBRE de 2025, se presentaron lluvias de distintas intensidades que afectaron directamente la continuidad de actividades como lavado de fachada, intervención de cubiertas, mantenimiento de viga canal, soldadura, aplicación de estuco y esmalte, instalación de teja termoacústica y labores en alturas. Estas actividades requieren estrictamente superficies secas, estabilidad climática y condiciones operativas seguras, especialmente al emplear equipos eléctricos y neumáticos.

Como consecuencia, se generaron tiempos improductivos, disminución en rendimientos y obligación de mantener al personal y equipos disponibles en obra a pesar de la restricción para trabajar bajo lluvia. Esto constituye un imprevisto climatológico plenamente justificable, documentado en el registro de lluvias y uso de equipos en días húmedos.

A continuación, se desglosa el gasto justificado por cada componente:

#### **MANO DE OBRA**

##### **Ayudantes**

Los ayudantes y oficiales asignados a realizar los concretos de pisos y rampas y actividades de lavado y preparación de área, permanecieron en obra durante los días de lluvia sin posibilidad de avanzar en las tareas asignadas.

El tiempo improductivo y la disponibilidad obligatoria justifican el valor registrado.

#### **EQUIPOS**

##### **Hidro lavadora**

318361 Programada para lavado de pisos en concreto para la instalación del acabado final.

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)




**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Este imprevisto corresponde a mayor cantidad de obra no prevista en la planeación original pero necesaria para garantizar funcionalidad y calidad en los acabados del project

**Registro fotográfico imprevistos por lluvias**

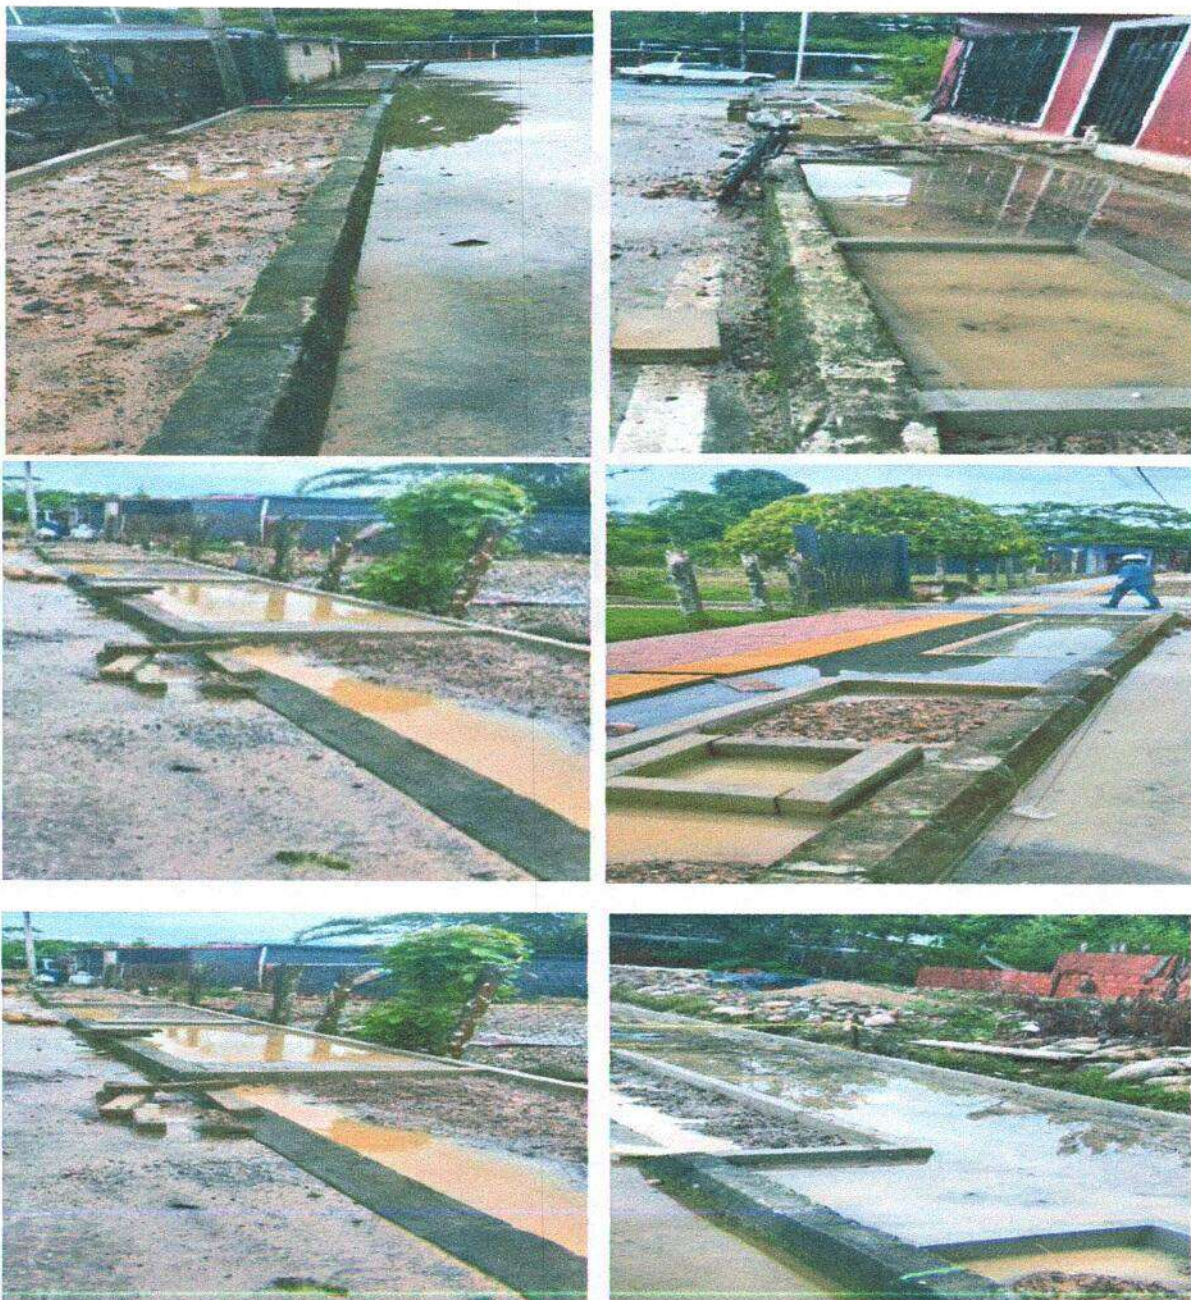

3183616

construinducivil@gmail.com

Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)

## CONCLUSIONES

- Los eventos de lluvia ocurridos entre el 29 de SEPTIEMBRE y el 16 de NOVIEMBRE de 2025 constituyeron imprevistos climatológicos que modificaron las condiciones normales de ejecución, afectando actividades que requieren ambiente seco ya que los concretos aparte tenían un tratamiento especial de acabado
- Las condiciones de humedad obligaron a realizar pausas operativas por seguridad, reduciendo los rendimientos programados y generando tiempos improductivos tanto del personal como de los equipos asignados a los frentes de trabajo.
- Equipos como hidrolavadora, y mezcladora presentaron restricciones técnicas por humedad y riesgo eléctrico, lo que impidió su operación continua, aunque debieron permanecer disponibles en obra conforme a la programación.
- La mayor cantidad ejecutada fue indispensable para cumplir con los criterios técnicos, los requerimientos de acabado y la funcionalidad del espacio intervenido, razón por la cual su reconocimiento se considera procedente.
- El valor total ejecutado en imprevistos durante la obra asciende a \$3.007.441,00, resultado de los tiempos improductivos por lluvias, para cumplir con los estándares técnicos del proyecto.
- El contrato dispone de un rubro de imprevistos equivalente al 2 %, por un total de \$3.007.441,00, de los cuales los imprevistos ejecutados representan el 100 %,
- La documentación técnica recopilada evidencia que los imprevistos fueron ajenos a la planeación inicial, afectaron las condiciones operativas reales del proyecto y se enmarcan dentro de los eventos susceptibles de cobertura mediante el rubro de imprevistos.
- La aplicación del rubro de imprevistos permitió mantener la continuidad de las actividades, asegurar la calidad de los procesos constructivos y cumplir con los estándares técnicos requeridos, mitigando los efectos de la variabilidad climática y compensando la mayor cantidad ejecutada.



**ARQ. CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**  
**RESIDENTE DE OBRA**

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

CONSTRUINDUCIVIL  
NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO****INFORME DETALLADO DEL USO DEL ANTICIPO****MONTO TOTAL DEL ANTICIPO RECIBIDO:**

PARA EL CONTRATO DE OBRA N° SAMC-013-2025 LA ENTIDAD ENTREGO RECURSOS DE ANTICIPO DE 40% EQUIVLENTES A \$ 79.997.919,20 LOS CUALES FUERON USADOS DE LA SIGUIENTE MANERA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	PORCENTAJE %
1	MATERIALES	\$ 67.998.231,32	85,00%
2	MANO DE OBRA INICIAL	\$ 11.999.687,88	15,00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 79.997.919,20</b>	<b>100,00%</b>

**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO: 40%**

**FECHA DE DESEMBOLSO: 14 OCTUBRE DE 2025**

**DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL ANTICIPO POR ACTIVIDAD O ÍTEM DEL CONTRATO.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%		VALOR	
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MATERIALES	MANO DE OBRA
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE URBANISMO	0%	4%		\$ 500.000,00
1,02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 KM	0%	33%		\$ 4.000.000,00
1,03	DEMOLICION ANDENES EN CONCRETO	0%	5%		\$ 600.000,00
1,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	4%	42%	\$ 2.623.950,00	\$ 5.000.000,00
1,05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	0%	16%		\$ 1.899.687,88
2,01	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS - (3000 PSI) E=10CM, INCLUYE INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	7%	0%	\$ 4.632.455,00	
2,02	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	23%	0%	\$ 15.700.000,00	
2,03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM, INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRÓN BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	23%	0%	\$ 15.592.870,00	
2,04	LOSETA PREFABRICADA COLOR A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION 4 CM. Y SELLO DE ARENA	10%	0%	\$ 6.711.600,00	


**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

**EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES**

CODIGO	DESCRIPCION	1%	0%	VALOR	TOTAL
2,00	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X5), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION 4 CM. Y SELLO DE ARENA	1%	0%	\$ 4.474.400,00	
2,06	CONTENEDOR DE RAICES	4%	0%	\$ 3.000.000,00	
2,07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	6%	0%	\$ 4.000.000,00	
2,08	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO).	17%	0%	\$ 11.262.956,32	
2,09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2 -1,5	0%	0%		
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	0%	0%		
<b>TOTALES</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 67.998.231,32</b>	<b>\$ 11.999.687,88</b>

**RELACION DE GASTOS EFECTUADOS**

COMPRA DE MATERIALES		
FACTURA N°	FECHA GASTO	VALOR
FEV2154	29 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 10.950.251,37
FEV2158	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 31.594.527,29
FEC 39	07 OCTUBRE DE 2025	\$ 9.789.499,30
FEV2321	11 OCTUBRE DE 2025	\$ 5.032.455,95
26416	20 OCTUBRE DE 2025	\$ 8.892.870,00
FEC 83	26 NOVIEMBRE DE 2025	\$ 2.623.950,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 68.883.553,91</b>

MANO DE OBRA		
NOMINA	FECHA PAGO	VALOR
OFICIAL DE CONSTRUCCION	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 171.145,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 206.966,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 85.572,00
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 132.990,00
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 132.990,00
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 132.990,00
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 132.990,00
RESIDENTE DE OBRA	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 184.000,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	30 OCTUBRE DE 2025	\$ 2.567.170,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	30 OCTUBRE DE 2025	\$ 2.567.170,00
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	30 OCTUBRE DE 2025	\$ 1.994.841,00
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	30 OCTUBRE DE 2025	\$ 1.994.841,00
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	30 OCTUBRE DE 2025	\$ 1.994.841,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 12.298.506,00</b>

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ construinducivil@gmail.com

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**

NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

CONSTRUINDUCIVIL SAS realizo la apertura de la cuenta bancaria para manejo de pagos de anticipo del contrato de obra N° SAMC-013-2025 con la entidad bancaria, Banco agrario de Colombia

**CARLOS ENRIQUE LIZCANO HERRERA**  
**RESIDENTE DE OBRA**  
**CONSTRUINDUCIVIL SAS**

**CONSTRUINDUCIVIL**

NIT. 901375684-5

☎ 3183616384 / 3106716171

✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)

📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



# CONSTRU CUBARA

Sulay Deny González  
 NIT: 33.645.027-7  
 Resp. de IVA

Comercio al por menor de artículos de  
 Ferretería, pinturas y productos de vidrio en  
 Establecimientos especializados



**SULAY DENY GONZALEZ JAIMES**

NIT: 33645027-7 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA PDF

No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores

Cubara -Boyaca MZ B CA 11 BRR VILLAS DEL COLEGIO Telefono 3115118136 sulayd.4758@gmail.com

Nº .Resolucion: 18764093793637 Prefijo: FEV Consecutivo: 2015 al 50000600 Fecha: 2025-05-30 Hasta: 2025-11-30

CUFE:52cf16df5cfb72b6047747f9cc91fa52d17fc6a9fc7d18c2ecb8328408f2207e9366f9b3c40e1080ba144c680c865df

**Razón social / Nombre:** CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

**Ced. ó NIT:** 901375684-5  
**Dirección:** CR 3 7 A 67 BRR JARDIN Cubará - Boyacá  
**Teléfono:** 3183616384  
**Email:** construinducivil@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA NO.FEV2154**

**Fecha de Emisión:** 29/09/2025 **Hora:** 16:59:46  
**Fecha Vencimiento:** 29/09/2025  
**Cond.Pago:** Contado

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	2205	600		LOSETA GUIA	0 %	19	9.400	5,640,000
2	2206	400		LOSETA TOPEROL	0 %	19	9.400	3,760,000

**Observaciones:**

**Valor en letras:** Diez millones novecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y un Pesos M/Cte

SUBTOTAL:	\$	9,400,000
BASE 19% \$	9,400,000	IVA 19% \$ 1,786,000
BASE 5% \$		IVA 5% \$
Descuento 0, 00%	\$	0
TOTAL:	\$	11,186,000
Rete.Fuente 0, 00%	\$	235,749
Rete.Iva 0, 00%	\$	0
Rete.Ica 0, 00%	\$	0
<b>Total A Pagar:</b>	<b>\$</b>	<b>10,950,251</b>

Recibi,

Nombre: \_\_\_\_\_

C.C: \_\_\_\_\_


Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO  
 Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el  
 contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008



# CONSTRU CUBARA

Sulay Deny González  
NIT: 33.643.027-7  
Resp. de IVA



**SULAY DENY GONZALEZ JAIMES**

NIT: 33645027-7 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA PDF

No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores

Cubara -Boyaca MZ B CA 11 BRR VILLAS DEL COLEGIO Telefono 3115118136 sulayd.4758@gmail.com

Nº .Resolución: 18764093793637 Prefijo: FEV Consecutivo: 2015 al 50000600 Fecha: 2025-05-30 Hasta: 2025-11-30

CUFE:90bc4893dd7df2cba1fce045569b0d4f2501de54de03e2ec92ee3096f2f92c3966dcb36261285af4a8a6afa02ffb14d5

**Razón social / Nombre:** CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

**Ced. ó NIT:** 901375684-5

**Dirección:** CR 3 7 A 67 BRR JARDIN Cubará - Boyacá

**Teléfono:** 3183616384

**Email:** construinducivil@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.FEV2158**

**Fecha de Emisión:** 30/09/2025 **Hora:** 17:28:37

**Fecha Vencimiento:** 30/09/2025

**Cond.Pago:** Contado

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	921	80		VARILLA CORRUGADA 12 MM X 6 MT	0 %	19	21.849	1,747,920
2	029	990	BULTO	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 42.5 KG	0 %	19	25.630	25,373,700

**Observaciones:** CARLOS LIZCANO

**Valor en letras:** Treinta y un millón quinientos noventa y cuatro mil quinientos veintisiete Pesos M/Cte

<b>SUBTOTAL:</b>	\$	27,121,620	
<b>BASE 19% \$</b>	27,121.620	<b>IVA 19% \$</b>	5,153,108
<b>BASE 5% \$</b>	0	<b>IVA 5% \$</b>	0
<b>Descuento 0, 00%</b>	\$	0	
<b>TOTAL:</b>	\$	32,274,728	
<b>Rete.Fuente 0, 00%</b>	\$	680,201	
<b>Rete.Iva 0, 00%</b>	\$	0	
<b>Rete.Ica 0, 00%</b>	\$	0	
<b>Total A Pagar:</b>	\$	31,594,527	

Recibi,

Nombre: \_\_\_\_\_

C.C: \_\_\_\_\_

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008



**CANTERA FAMILVAL SAS**  
 NIT 901.927.901-9  
 VDA LA ESPERANZA VIA PRINCIPAL  
 Tel: (608) 3115932160  
 Cubará - Colombia  
 canterafamival2025@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FEC 39

<b>Señores</b>	CONSTRUINDUCIVIL SAS		
<b>NIT</b>	901.375.684-5	<b>Teléfono</b>	(608) 0000000 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	No aplica	<b>Ciudad</b>	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	07/10/2025, 11:30
<b>Expedición</b>	07/10/2025, 11:30
<b>Vencimiento</b>	07/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TRITURADO X METRO CÚBICO	70.00	unidad	82,521.00	5.776,470.00	19 %	1.097,529.30	6.873,999.30
2	ARENA X METRO CÚBICO	70.00	unidad	35,000.00	2.450,000.00	19 %	465,500.00	2.915,500.00

**Total items: 2**

**Valor en Letras:**

Nueve millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte contreinta cent.

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 9.789,499.30

**Observaciones:**

Realizar los depósitos a la cuenta de Davivienda No. 506100274014 a nombre de CANTERA FAMILVAL SAS.

<b>Total Bruto</b>	8.226,470.00
<b>IVA 19%</b>	1.563,029.30
<b>Total a Pagar</b>	9.789,499.30

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145 - B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093152801 aprobado en 20250515 prefijo FEC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhídrido Tarifa  
 CUFE: 90bb8e0b4079b52b1afbe72b57021a96307ba0423b9862d54d94b0eb33cb143c97d616b4357e28aef905404716f3f9f2



# CONSTRU CUBARA

Sulay Deny González  
NIT: 33.643.027-7  
Resp. de IVA



SULAY DENY GONZALEZ JAIMES

NIT: 33645027-7 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA PDF

No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores

Cubara -Boyaca MZ B CA 11 BRR VILLAS DEL COLEGIO Telefono 3115118136 sulayd.4758@gmail.com

Nº .Resolución: 18764102423631 Prefijo: FEV Consecutivo:

Fecha: 2025-12-02 Hasta: 2026-06-02

CUFE: 0d875525c0bddce9eaaadb2b02e7d2dd3185623cfac1862519e555368f34f3494553c477e69419a0f443da0e9db972f

Razón social / Nombre: CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.

**FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA NO.FEV2321**

Ced. ó NIT: 901375684-5

Dirección: CR 3 7 A 67 BRR JARDIN Cubará - Boyacá

Teléfono: 3183616384

Email: construinducivil@gmail.com

Fecha de Emisión: 11/10/2025 Hora: 10:15:38

Fecha Vencimiento: 11/10/2025

Cond.Pago: Crédito a 0 días

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	86	12		MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM X 2,35 MT X 18 MT DE LARGODE 15 X 15	0 %	19	360.000	4,320,000

Observaciones: CARLOS LIZCANO

Valor en letras: Cinco millones treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos M/Cte

SUBTOTAL:		\$	4,320,000
BASE 19%	\$ 590.084	IVA 19%	\$ 820,800
BASE 5%	\$ 0	IVA 5%	\$ 0
Descuento 0, 00%		\$	0
TOTAL:		\$	5,140,800
Rete.Fuente 0, 00%		\$	108,345
Rete.Iva 0, 00%		\$	0
Rete.Ica 0, 00%		\$	0
<b>Total A Pagar:</b>		<b>\$</b>	<b>5,032,455</b>

Recibi,

Nombre: \_\_\_\_\_

C.C: \_\_\_\_\_

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO  
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

**CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S**  
 NIT 900.440.077-9  
 PARQUE IND TERRAPUERTO BOD34-KM1.7 AUT.MEDELLIN  
 COSTADO SUR POR ENTRADA PARQUE FLORIDA 1.2KM  
 A DENTRO  
 Tel: (091) 8766114 - Ext. 0  
 Cota - Colombia  
 administracion@concretoestampadocolombia.com  
 www.concretoestampadocolombia.com



Factura Electrónica de Venta  
 No. 26416

<b>Señores</b>	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S		
<b>NIT</b>	901.375.684-5	<b>Teléfono</b>	(601) 3183616384 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CR 3 7 A 67 BRR JARDIN	<b>Ciudad</b>	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	20/10/2025, 13:28
<b>Expedición</b>	20/10/2025, 17:58
<b>Vencimiento</b>	20/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONCRETE COLOR (Color endurecedor de cuarzo) LIGHT BROWN CT-14 - PRESENTACIÓN BULTO DE 25KG - DOSIFICACION: 4KG POR M2 - PARA INCORPORAR MANUALMENTE CON LLANA O FLOTA SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. PARA 150 M2	24.00	BULTO	73,304.00	2.093,562.24
2	DESMOL CONCRETE - LIGHT BROWN CT-14 (Desmoldante en polvo) - PREST. BULTO DE 10KG - DOSIFICACIÓN: 0.25KG POR M2 - PARA EL SISTEMA DE CONCRETO ESTAMPADO. PARA 150 M2	3.00	BOLSA	99,068.00	353,672.76
3	CONCRETE COLOR (Color endurecedor de cuarzo) GRAY HUMO CT-22 - PRESENTACIÓN BULTO DE 25KG - DOSIFICACION: 4KG POR M2 - PARA INCORPORAR MANUALMENTE CON LLANA O FLOTA SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. PARA 150 M2	24.00	BULTO	73,304.00	2.093,562.24
4	DESMOL CONCRETE - GRAY HUMO CT-22 (Desmoldante en polvo) - PREST. BULTO DE 10KG - DOSIFICACIÓN: 0.25KG POR M2 - PARA EL SISTEMA DE CONCRETO ESTAMPADO. PARA 150 M2	3.00	BOLSA	99,068.00	353,672.76
5	SELLA CONCRETE - BRILLO MEDIO - PREST. CUÑETE DE 20LT - DOSIFICACIÓN: 0.25LT POR M2 - PARA PROTEGER Y EMBELLECER PISOS O PIEZAS EN CONCRETO Y PIEDRA NATURALES. PARA 300 M2	4.00	CUÑETE	640,000.00	3,046,400.00
6	TRANSPORTE PLANTA DE PRODUCCION SIBERIA A CUBARA-BOYACA 672 KG CON TRANSPORTADORA	1.00		800,000.00	952,000.00

**Total ítems: 6**

**Valor en Letras:**

Ocho millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos setenta pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-18590-1 vence el 2025-10-20 por	\$	7,159,903.00
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-18591-1 vence el 2025-10-20 por	\$	1,732,967.00

**Observaciones:**

Autorizo a CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATA CREDITO, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a DATA CREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

NOTA: RETENCIÓN ICA MUNICIPIO DE COTA ACT 4663 TARIFA 6 X 1.000

CT 50594 Y.L

<b>Total Bruto</b>	7.473,000.00
<b>IVA 19%</b>	1.419,870.00
<b>Total a Pagar</b>	8.892,870.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089051136 aprobado en 20250218 prefijo desde el número 24224 al

40000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 7dc09b44427e1bf7ee7464e9f31876826527f13bf9438bc18176c0dbbd7a6bf9ac16859cbd8f807c3654a5a3d5fc7d6b



**CANTERA FAMIIVAL SAS**  
 NIT 901.927.901-9  
 VDA LA ESPERANZA VIA PRINCIPAL  
 Tel: (608) 3115932160  
 Cubará - Colombia  
 canterafamival2025@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FEC 83

<b>Señores</b>	CONSTRUINDUCIVIL SAS		
<b>NIT</b>	901.375.684-5	<b>Teléfono</b>	(608) 0000000
<b>Dirección</b>	No aplica	<b>Ciudad</b>	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	26/11/2025, 11:36
<b>Expedición</b>	26/11/2025, 11:36
<b>Vencimiento</b>	26/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	SUB BASE X METRO CÚBICO	63.00	unidad	35,000.00	2.205,000.00	19 %	418,950.00	2.623,950.00

**Total ítems: 1**

**Valor en Letras:**

Dos millones seiscientos veintitres mil novecientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Consignación bancaria - Consignación

\$ 2.623,950.00

**Observaciones:**

Realizar los depósitos a la cuenta de Davivienda No. 506100274014 a nombre de CANTERA FAMIIVAL SAS.

<b>Total Bruto</b>	2.205,000.00
<b>IVA 19%</b>	418,950.00
<b>Total a Pagar</b>	2.623,950.00

jico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nubs. Firma electrónica: ver en el XML

Fabricante Software y Proveedor:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093152801 aprobado en 20250515 prefijo FEC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhídrido Tarifa CUIFE: fc6f6121e056e1df609569ff2a9d51bdf7c71c94f251c44bd1a20989c4f7726a998121ea5370d7fd24a393f3f72e6ae7



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# **CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES**

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





# CERTIFICADO DE CALIDAD

Remisión: R-1- 25672

Certificamos que el producto **CONCRETE COLOR®** endurecedor, listo para usar, con base en agregados de cuarzo fino, especialmente gradados, de gran dureza, cemento, pigmentos que le otorgan diferentes colores y gran resistencia a la luz solar y aditivos que mejoran el acabado del piso, facilitan su colocación y penetración, fue fabricado cumpliendo los procesos de elaboración establecidos, controlado bajo estándares definidos, y cumple con los requerimientos del Sistema de Calidad establecidos por CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA. Adjuntamos los valores obtenidos para los lotes relacionados, están dentro de los límites de especificaciones indicadas.

<b>CONCRETE COLOR®:</b>	<b>LIGHT BROWN CT-14</b>														
<b>Lote</b>	13511 – CONSTRUINDUCIVIL S.A.S														
<b>Fecha de Fabricación:</b>	Octubre 17 de 2025														
<b>Tonalidad:</b>	Café														
<b>Aspecto:</b>	Granulado fino con un porcentaje de gruesos.														
<b>Resistencia a la compresión:</b>	R.24h = Min 180 Km/Cm2														
<b>Granulometría:</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>M16 =</b></td> <td>10% ± 6%</td> </tr> <tr> <td><b>M20 =</b></td> <td>40% ± 8%</td> </tr> <tr> <td><b>M30 =</b></td> <td>8% ± 4%</td> </tr> <tr> <td><b>M40 =</b></td> <td>12% ± 6%</td> </tr> <tr> <td><b>M50 =</b></td> <td>Max 10%</td> </tr> <tr> <td><b>M100 =</b></td> <td>Max 10%</td> </tr> <tr> <td><b>Fondo =</b></td> <td>Max 10%</td> </tr> </table>	<b>M16 =</b>	10% ± 6%	<b>M20 =</b>	40% ± 8%	<b>M30 =</b>	8% ± 4%	<b>M40 =</b>	12% ± 6%	<b>M50 =</b>	Max 10%	<b>M100 =</b>	Max 10%	<b>Fondo =</b>	Max 10%
<b>M16 =</b>	10% ± 6%														
<b>M20 =</b>	40% ± 8%														
<b>M30 =</b>	8% ± 4%														
<b>M40 =</b>	12% ± 6%														
<b>M50 =</b>	Max 10%														
<b>M100 =</b>	Max 10%														
<b>Fondo =</b>	Max 10%														

<b>CONCRETE COLOR®:</b>	<b>GRAY HUMO CT-22</b>														
<b>Lote</b>	13510 – CONSTRUINDUCIVIL S.A.S														
<b>Fecha de Fabricación:</b>	Octubre 17 de 2025														
<b>Tonalidad:</b>	Gris														
<b>Aspecto:</b>	Granulado fino con un porcentaje de gruesos.														
<b>Resistencia a la compresión:</b>	R.24h = Min 180 Km/Cm2														
<b>Granulometría:</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>M16 =</b></td> <td>10% ± 6%</td> </tr> <tr> <td><b>M20 =</b></td> <td>40% ± 8%</td> </tr> <tr> <td><b>M30 =</b></td> <td>8% ± 4%</td> </tr> <tr> <td><b>M40 =</b></td> <td>12% ± 6%</td> </tr> <tr> <td><b>M50 =</b></td> <td>Max 10%</td> </tr> <tr> <td><b>M100 =</b></td> <td>Max 10%</td> </tr> <tr> <td><b>Fondo =</b></td> <td>Max 10%</td> </tr> </table>	<b>M16 =</b>	10% ± 6%	<b>M20 =</b>	40% ± 8%	<b>M30 =</b>	8% ± 4%	<b>M40 =</b>	12% ± 6%	<b>M50 =</b>	Max 10%	<b>M100 =</b>	Max 10%	<b>Fondo =</b>	Max 10%
<b>M16 =</b>	10% ± 6%														
<b>M20 =</b>	40% ± 8%														
<b>M30 =</b>	8% ± 4%														
<b>M40 =</b>	12% ± 6%														
<b>M50 =</b>	Max 10%														
<b>M100 =</b>	Max 10%														
<b>Fondo =</b>	Max 10%														

Fraguado inicial Min 65min - Fraguado Final Max 320Min.

Notas Técnicas: Material fabricado con pigmentos inorgánicos, que se rige a la norma ASTM C 979; resistencia a los álcalis y a los rayos UV, con el fin de garantizar la permanencia del color en el tiempo. Material fabricado y regido a la norma ASTM D-2047, que mide el coeficiente estático de fricción (acabado antideslizante) y ASTM C502 que mide la resistencia a la abrasión.

Estos datos corresponden a la producción de 24 bultos cada uno de 25kg, fabricados en la fecha de referencia y enviados a obra el día 17-10-2025 mediante la remisión R-1- 25672.

Fabricado por: Concreto Estampado de Colombia S.A.S.  
Teléfono: (57) 6018985448 Ciudad: Bogotá - Colombia Dirección: Km 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La Florida 1.1km adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.

Fondo = Max 10%

Notas Técnicas: Material fabricado con pigmentos inorgánicos, que se rige a la norma ASTM C 979; resistencia a los álcalis y a los rayos UV, con el fin de garantizar la permanencia del color en el tiempo. Estos datos corresponden a la producción 2 cuñetes de 10kg y 2 garrafas de 5kg fabricados en la fecha de referencia y enviados a obra el día 17-10-2025 mediante la remisión R-1 25672.

Nota: El presente documento certifica la correcta fabricación del producto, CONCRETOL S.A.S. no es responsable de los métodos de aplicación, técnicas de acabado, condiciones del sitio de trabajo, métodos de curado o diseños de mezclas de concreto en obra.

Fabricado por: Concreto Estampado de Colombia S.A.S.  
Teléfono: (57) 6018985448 Ciudad: Bogotá - Colombia Dirección: Km 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La Florida 1.1km adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.



# CERTIFICADO DE CALIDAD

Certificamos que el producto **DESMOL CONCRETE®** desmoldante y color secundario del sistema de pisos en concreto estampados es un polvo higroscópico, que impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secundario al sistema, compuesto de sustancias de relleno y pigmentos, fue fabricado cumpliendo los procesos de elaboración establecidos, controlado bajo estándares definidos, y cumple con los requerimientos del Sistema de Calidad establecidos por CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA.

Adjuntamos los valores obtenidos para los lotes relacionados, están dentro de los límites de especificaciones indicadas.

DESMOL CONCRETE®:	LIGHT BROWN
Lote:	7420 – CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Fecha de Fabricación:	Octubre 17 de 2025
Tonalidad:	Café
Aspecto:	Polvo higroscópico de color establecido.
Familia química:	Mezcla de Compuesto químico ternario, sustancias de relleno y pigmentos inorgánicos.
Densidad aparente:	2.7 +/- 0.03 cm <sup>3</sup> (20 °C)
Toxicidad:	Atóxico (Inherente)
Solubilidad(es):	El producto no es soluble en agua.
Olor:	Inoloro
Granulometría:	M200 = Max 70% M400 = Max 20% Fondo = Max 10%

DESMOL CONCRETE®:	GRAY HUMO
Lote:	7419 – CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Fecha de Fabricación:	Octubre 17 de 2025
Tonalidad:	Gris
Aspecto:	Polvo higroscópico de color establecido.
Familia química:	Mezcla de Compuesto químico ternario, sustancias de relleno y pigmentos inorgánicos.
Densidad aparente:	2.7 +/- 0.03 cm <sup>3</sup> (20 °C)
Toxicidad:	Atóxico (Inherente)
Solubilidad(es):	El producto no es soluble en agua.
Olor:	Inoloro
Granulometría:	M200 = Max 70% M400 = Max 20% Fondo = Max 10%

Notas Técnicas: Material fabricado con pigmentos inorgánicos, que se rige a la norma ASTM C 979; resistencia a los álcalis y a los rayos UV, con el fin de garantizar la permanencia del color en el tiempo.

Estos datos corresponden a la producción 2 cuñetes de 10kg y 2 garrafas de 5kg fabricados en la fecha de referencia y enviados a obra el día 17-10-2025 mediante la remisión R-1 25672.

*Nota: El presente documento certifica la correcta fabricación del producto, CONCRET COL S.A.S. no es responsable de los métodos de aplicación, técnicas de acabado, condiciones del sitio de trabajo, métodos de curado o diseños de mezclas de concreto en obra.*



# CERTIFICADO DE CALIDAD

Certificamos que el producto **SELLA CONCRETE®** sello para concreto a base de resinas acrílicas y solventes que está diseñado para penetrar profundamente en los poros del concreto, y dar una protección al concreto, fue fabricado cumpliendo los procesos de elaboración establecidos, controlado bajo estándares definidos, y cumple con los requerimientos del Sistema de Calidad establecidos por CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA. Adjuntamos los valores obtenidos para los lotes relacionados, están dentro de los límites de especificaciones indicadas.

Lote:	4511 – CONSTRUINDUCIVIL S.A.S
Fecha de Fabricación:	Octubre 15 de 2025
Tonalidad:	Transparente
Brillo:	Brillo medio
Aspecto:	Líquido a temperatura ambiente.
Olor:	Característico a solvente.
Densidad:	0,86000 – 0,8800 gr/m
VDC calculado:	804,5 g/l
Punto de inflamación:	25°C

## Controles de Exposición

Base	Valor	Límites	Valor límite máximo observaciones
ECLV	Límite máximo	50ppm	
	Permisible de exposición promedio ponderado tiempo:	221mg/m <sup>3</sup> 100ppm	
	Límite permisible:	442mg/m <sup>3</sup>	
VLA	Temporal:		Absorción a través de la piel.
	Clasificación a riesgo de la piel:		Absorción a través de la piel.
	Clasificación a riesgo de la piel:		
	Valor límite ambiental:	100ppm 442mg/m <sup>3</sup>	
	Exposición corta:		
	Duración (VLA-EC):		
	Valor límite ambiental:	50ppm 221mg/m <sup>3</sup>	
	Exposición diaria (VLA-EC):		

Notas Técnicas: Material Fabricado y diseñado especialmente para concretos decorativos, 100% acrílico, con contenido de sólidos no inferior al 25%, resistente a rayos UV (no amarillea) y se rige a la norma ASTM C 1315, Tipo 1, Clase A y ASTM C 309 Clase 1 Tipo A y B.

Estos datos corresponden a la producción de 2 cuñetes de 20kg, fabricados en la fecha de referencia y enviado el día 17-10-2025 mediante la remisión R-1- 25672.

*Nota: El presente documento certifica la correcta fabricación del producto, CONCRETOL S.A.S. no es responsable de los métodos de aplicación, técnicas de acabado, condiciones del sitio de trabajo, métodos de curado o diseños de mezclas de concreto en obra.*

Departamento de Calidad  
Ing. Mauricio Bermúdez.  
Concreto Estampado de Colombia – CONCRETOL  
CONCRETOL  
CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA

# REPORTE DE CALIDAD

## CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 07-nov-25  
Número de Reporte: IBG-UG-43-2025

Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia  
Planta Caracolito

### Cemento Hidráulico Tipo UG

Fecha inicial\* 19-oct-25 ..... Fecha final\* 25-oct-25

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma	Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
1 día	NTC 220	10.1 MPa	No especificado	Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	6.01 %
3 días	NTC 220	17.5 MPa	Mínimo 8.0	Superficie Específica Blaine	NTC 33	439 m <sup>2</sup> /kg
7 días	NTC 220	21.0 MPa	Mínimo 15.0	Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	323 min
8 días (+)	NTC 220	25.3 MPa	Mínimo 24.0			

### Otros parámetros físicos



Nuestros productos cumplen con la Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO". Adicionalmente contamos con la certificación ISO 9001 versión 2015 para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el ICONTEC, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

\* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.

\*\* El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.

\*\*\* Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.

(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez  
Coordinador de Aseguramiento de Calidad



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5

EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# CERTIFICACION UNIDAD DE SERVICIOS

CONSTRUINDUCIVIL  
NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)



RECIBOS DE CAJA

Número 202600098

Tercero CONSTRUINDUCIVIL SAS

DIRECCION Cubará - Boyacá

C.c / Nit 901375684-5

Codigo Postal 151420 Fecha 20/02/2026

Contribuyente CONSTRUINDUCIVIL SAS  
 Concepto PAGO DE CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS  
 Detalle PAGO DE CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS

MOVIMIENTO CONTABLE


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050301	Caja General	\$22,000.00	
4105080201	Certificados y paz y salvo	\$0.00	\$22,000.00
Numero Documento	Vencimiento	Débito	Crédito
901375684-5	05/03/2026	\$22,000.00	\$22,000.00



Recibió: Albert Pineda Camacho

Aprobó:

SON: \$22,000.00


 <b>ALCALDÍA DE CUBARÁ</b> <small>NIT 800.099.196-2</small>	<b>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN</b>	<b>Código: GIC-02-M01-F02</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>CERTIFICACIÓN</b>	<b>Fecha: 02/07/2024</b>

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CUBARÁ- BOYACÁ, DENTRO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN, A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA.**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **CONSTRUINDUCIVIL SAS** con NIT: **901375684-5** Representada Legalmente por **GLADIS XIOMARA MANRIQUE BECERRA**, con C.C **1.094.397.338 de Cubará - Boyacá**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la Unidad de Servicios Públicos de Cubará- Boyacá, por concepto de pago de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; del contrato **SAMC 013-2025, DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ"**

Para constancia de lo anterior se firma en la oficina de la Unidad de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Cubará- Boyacá a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2025.

  
**WILMER ALEXANDER MANTILLA VELASCO**  
 GERENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS AAA



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

# ACTA DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUINDUCIVIL

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES

Contrato	SAMC-013-2025	Valor Inicial del contrato	Fecha de Inicio del contrato
Objeto	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARA	\$ 199.994.798,00	28/09/2025
		Valor adicional al contrato	Plazo de ejecución Un mes (01) y veinte (20) días calendario.
Contratista	CONSTRUINDUCIVIL S.A.S. C.C. No. 1.049.397.338 de Cubará, Boyacá.	\$ 0,00	Valor anticipo (40%) \$ 79.997.919,20
		Saldo a favor del municipio	Valor ejecutado acumulado \$ 199.994.798,00 Porcentaje ejecutado 100,00%
Interworfia	N/A	\$ 0,00	Fecha de terminación del contrato 16/11/2025
Supervisor	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas	Valor del contrato actualizado	Fecha de la presente acta 16/11/2025
Contratante	MUNICIPIO DE CUBARÁ	\$ 199.994.798,00	Estado TERMINADO

ACTA DE AVANCE

CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES INICIALES	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00	PRELIMINARES				\$ 27.921.031,00		\$ 27.921.031,00		\$ 27.921.031,00
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRAS DE URBANISMO	M2	512,04	\$ 4.104,00	\$ 2.101.412,00	512,04	\$ 2.101.412,00	512,04	\$ 2.101.412,00
1,02	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 KM	M2	494,04	\$ 13.020,00	\$ 6.432.401,00	494,04	\$ 6.432.401,00	494,04	\$ 6.432.401,00
1,03	DEMOLICION ANDENES EN CONCRETO	M2	18,00	\$ 44.852,00	\$ 807.336,00	18,00	\$ 807.336,00	18,00	\$ 807.336,00
1,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA	M3	82,30	\$ 121.901,11	\$ 11.250.000,00	82,30	\$ 11.250.000,00	82,30	\$ 11.250.000,00
1,05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	79,92	\$ 91.703,00	\$ 7.328.994,00	79,92	\$ 7.328.994,00	79,92	\$ 7.328.994,00
2,00	URBANISMO Y CERRAMIENTO				\$ 122.450.996,93		\$ 122.450.996,93		\$ 122.450.996,93
2,01	INCLUYE INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	M2	49,69	\$ 159.382,00	\$ 7.919.692,00	49,69	\$ 7.919.692,00	49,69	\$ 7.919.692,00
2,02	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM. INCLUYE ESTAMPADO COLOR VAINILLA BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	M2	129,63	\$ 200.117,00	\$ 25.941.167,00	129,63	\$ 25.941.167,00	129,63	\$ 25.941.167,00
2,03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CM. INCLUYE ESTAMPADO COLOR MARRON BRILLO MEDIO Y MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15CM-15CM)	M2	126,63	\$ 187.738,85	\$ 23.773.092,00	126,63	\$ 23.773.092,00	126,63	\$ 23.773.092,00
2,04	LOSETA PREFABRICADA COLOR A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION 4 CM. Y SELLO	M2	75,20	\$ 173.282,06	\$ 13.030.855,93	75,20	\$ 13.030.855,93	75,20	\$ 13.030.855,93
2,05	LOSETA PREFABRICADA GRIS A-50 (40X40X6), INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION 4 CM. Y SELLO DE ARENA	M2	53,78	\$ 134.140,06	\$ 7.211.369,63	53,78	\$ 7.211.369,63	53,78	\$ 7.211.369,63
2,06	CONTENEDOR DE RAICES	UND	28,00	\$ 293.284,00	\$ 7.625.384,00	28,00	\$ 7.625.384,00	28,00	\$ 7.625.384,00
2,07	BORDILLO PARA ZONA VERDE	ML	184,80	\$ 44.127,00	\$ 8.154.699,80	184,80	\$ 8.154.699,80	184,80	\$ 8.154.699,80
2,08	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 10 X 30 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17,5 Mpa. (INCLUYE REFUERZO)	ML	252,82	\$ 97.918,00	\$ 24.755.628,76	252,82	\$ 24.755.628,76	252,82	\$ 24.755.628,76
2,09	SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS ALTURA H=1,2-1,5	UND	26,00	\$ 104.573,00	\$ 2.718.898,00	26,00	\$ 2.718.898,00	26,00	\$ 2.718.898,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESTAS DE BASURA EN ACERO	UND	1,00	\$ 1.320.240,00	\$ 1.320.240,00	1,00	\$ 1.320.240,00	1,00	\$ 1.320.240,00
<b>COSTO DIRECTO DE LA OBRA</b>					\$ 150.372.027,93		\$ 150.372.027,93		\$ 150.372.027,93
<b>ADMINISTRACION 24%</b>					\$ 36.089.287,00		\$ 36.089.287,00		\$ 36.089.287,00
<b>IMPREVISTO 2%</b>					\$ 3.007.441,00		\$ 3.007.441,00		\$ 3.007.441,00
<b>UTILIDAD 7%</b>					\$ 10.526.042,09		\$ 10.526.042,09		\$ 10.526.042,09
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					\$ 199.994.798,00		\$ 199.994.798,00		\$ 199.994.798,00

BALANCE ECONOMICO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 199.994.798,00
VALOR ANTICIPO (40%):	\$ 79.997.919,20
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 199.994.798,00
ARMONIZACION DEL ANTICIPO	\$ 79.997.919,20
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 199.994.798,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 119.996.878,80

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE AVANCE, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los Dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 2025.


ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA  
ASECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS  
SUPERVISOR

*Xiomara Manrique B*  
RL GLADYS XIOMARA MANRIQUE BECERRA  
CONSTRUINDUCIVIL SAS  
Contratista



**CONSTRUINDUCIVIL S.A.S.**  
NIT. 901375684-5


EMPRESA DE SOLUCIONES INTEGRALES



# FACTURA ELECTRONICA

NIT. 901375684-5

- ☎ 3183616384 / 3106716171
- ✉ [construinducivil@gmail.com](mailto:construinducivil@gmail.com)
- 📍 Carrera 3 N° 7A-67 Barrio El Jardín (Cubará-Boyacá)





**CONSTRUINDUCIVIL SAS**  
 NIT 901.375.684-5  
 CR 3 7A 67 BRR JARDIN  
 Tel: 3183616384  
 Cubará - Colombia  
 construinducivil@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FECO 38

Señores	MUNICIPIO DE CUBARA		
NIT	800.099.196-2	Teléfono	(038) 3102574494
Dirección	CALLE 4 4 43	Ciudad	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2026, 16:09
Expedición	10/03/2026, 16:09
Vencimiento	10/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA SAMC-013-2025	1.00	0 %	0.00	150,372,028.00
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	0 %	0.00	36,089,287.00
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	0 %	0.00	3,007,441.00
4	UTILIDAD (7%)	1.00	19 %	1,680,628.55	10,526,042.00

Total items: 4

**Valor en Letras:**

Ciento noventa y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos m/cto

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 199,994,798.00

**Observaciones:**

"ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ" SAMC-013-2025

<b>Total Bruto</b>	198,314,169.45
IVA 19%	1,680,628.55
<b>Total a Pagar</b>	199,994,798.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091283806 aprobado en 20250330 prefijo FECO desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa  
 CUIFE: db701287d0d6e7ea86629221cdd728963aa4a3fdd4e84847bef2a00e189585040ee0ac422b1e5120aa87e277ed785002

# Certificado Bancario

12 de Diciembre de 2025

Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUINDUCIVIL SAS identificado (a) con 901375684, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorros	31773531628	2024-10-17	Activa

**\*Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

