

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	1 de 4	


MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 20254196 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)

INFORME DE INTERVENTORIA No.2



SGD INGENIERIA SAS
R.L. DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA

Noviembre 2025

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 2 de 4

- 1. INTRODUCCION** por una parte la Entidad MUNICIPIO DE PASTO y, por la otra, la empresa A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S convienen ejecutar el contrato No. 20254196 cuyo objeto es: "El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)". Dicho contrato se ejecutará a partir del 19 de septiembre de 2025 con diseños suministrado por la alcaldía.

Luego de iniciado el contrato la empresa A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S da en cesión los derechos del contrato No. 20254196 a la empresa PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA firmado así el día 21 de octubre de 2025.

El Municipio de Pasto a través del procedimiento de contratación CM-2025-7 delega a SGD INGENIERIA S.A.S. cuyo objeto es: "Interventoría Técnica, Financiera, Ambiental y Jurídica para la ejecución del contrato cuyo objeto es realizar la obra de mantenimiento y rehabilitación malla vial urbana comunas 10 a 12 del municipio de Pasto (SU-0045-069)", contrato anteriormente suscrito.

En el presente informe de interventoría, se muestra el desarrollo de las actividades, y labores ejecutadas durante el periodo 19 de septiembre de 2025 al 19 de octubre de 2025 del seguimiento al contrato.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato: 20254196
Fecha Contrato: 12 de septiembre de 2025
Valor Contrato: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS (\$1.986.282.000.00)
Objeto: El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)
Plazo: Cuatro (04) meses
Contratista: PANAVIAS INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.
Interventor: SGD INGENIERIA SAS
Supervisor: Ingeniero Wilber Morillo Arteaga

Pólizas y vigencia:
Vigencia Cumplimiento: 30/06/2026
Vigencia Anticipo: 30/06/2026
Vigencia Prestaciones Sociales: 31/12/2028
Vigencia Póliza Estabilidad: 3 años a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	3 de 4	

3. ACTAS DE OBRA

Acta de inicio de obra:	19 de septiembre de 2025
Acta socialización proyecto	01 de octubre de 2025
Cesión de derechos del contrato No. 20254196:	21 de octubre de 2025

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- **Estado inicial de la obra.**

En el municipio de Pasto, la mayor parte de las vías que conforman la red urbana y en especial las vías de la comuna 10 a 12 en la ciudad, han cumplido su periodo de vida útil de servicio por lo que presentan daños y fallas localizadas en su estructura. Esto, aunando el aumento del parque automotor del municipio, en conjunto con los factores climáticos adversos, han incrementado los problemas de transitabilidad vehicular y peatonal, aumento en el tiempo de viajes, costos de operación vehicular, incremento en accidentes de tránsito, deterioro de la imagen del sector y disminución en el nivel de vida de sus habitantes.

La mayor parte de la malla vial de los sectores a intervenir presentan deterioro en capa de rodadura y en algunos casos deterioro en la estructura, las cuales serán intervenidas para alcanzar un nivel óptimo de transitabilidad.

- **Avance físico**

Para el periodo comprendido entre el 19 de octubre y 19 de noviembre de 2025, el proyecto alcanza un 1.5 % de avance físico contractual. A continuación, se detalla el avance de las actividades hasta la fecha.

- Demolición concreto hidráulico

Durante este nuevo mes, comienza las actividades de demolición para despejar el área del proyecto. Se ha priorizado la remoción de las estructuras existentes en la calzada, en particular reposiciones defectuosas por acometidas domiciliarias y rotura en algunas tapas de cámaras existentes en la vía. El propósito de estas demoliciones es dejar una capa de rodadura uniforme.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	4 de 4	

ITEM	1.04	Demolicion concreto hidraulico	UN:	M3		CANT:	2.97	
DESCRIPCION GRAFICA		DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
				Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
 <p>15/10/2025 7:51:01 a. m. 1°13'11.45784° N 77°16'3.67356° W # 28A-31 Carrera 19 Pasto Nariño Altitud:2640.8msnm</p>	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+13.90	M3	1.00	1.60	1.90	0.09	0.27	
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.09	-0.07	
	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+41.50	M3	1.00	2.00	1.30	0.09	0.23	
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.09	-0.07	
 <p>20/10/2025 11:29:46 a. m. 1°13'15.4866° N 77°16'1.34668° W # 29A-3 Carrera 19 Pasto Nariño Altitud:2646.4msnm</p>	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+80.20	M3	1.00	1.80	2.40	0.09	0.39	
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.09	-0.07	
	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+121.80	M3	1.00	1.70	1.00	0.08	0.14	
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.08	-0.06	
 <p>20/10/2025 1:33:15 p. m. 1°13'14.0034° N 77°16'2.37108° W # 24-13 Carrera 19 Pasto Nariño Altitud:2641.1msnm</p>	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+126.80	M3	1.00	1.80	1.80	0.08	0.26	
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.08	-0.06	
	Demolicion estructuras existentes en concreto hidraulico K0+139.80	M3	1.00	3.30	1.00	0.15	0.50	
			1.00	0.95	2.35	0.15	0.33	
1.00			2.50	1.00	0.15	0.38		
1.00			1.70	1.05	0.15	0.27		
1.00			1.00	1.70	0.15	0.26		
Demolicion acometida domiciliaria existente K0+159.80	M3	1.00	1.30	0.97	0.06	0.08		
Demolicion acometida domiciliaria existente K0+175.30		1.00	1.80	0.77	0.15	0.21		

- Excavación Mecánica en Materiales Varios sin Clasificar

Durante este mes, las actividades de excavación han concluido exitosamente en dos frentes clave del proyecto. Se finalizaron todas las excavaciones necesarias para adecuar el terreno y asegurar una base sólida en las áreas donde se instalará adoquín en los sectores de la floresta y la calle 33 aledaño a la avenida Aranda.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	5 de 4	

ITEM	1.06	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIALES VARIOS SIN CLASIFICAR.	UN:	M3				CANT:	348.06
DESCRIPCION GRAFICA		DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor	
				Canfid	Longitud	Ancho	Espesor		
 <p>6/11/2025 2:54:32 p. m. 1°13'46.60068"N 77°16'18.38424"W CASA 7 MANZANA 7 NUEVO SOL Pasto Nariño Altitud:2636.6msnm</p>		Excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+000 y K0+020	M3	1.00	20.00	7.40	0.33	48.84	
		Excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+020 y K0+060		1.00	40.00	7.50	0.35	105.00	
		Excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+060 y K0+077.70		1.00	17.70	7.60	0.38	51.12	
		Excavacion mecanica calle 33 fallo en interseccion con avenida Aranda K0+077.10	M3	1.00	1.80	7.30	0.20	2.63	
		Excavacion mecanica calle 33 fallo K0+000	M3	1.00	2.00	3.50	0.20	1.40	
		Excavacion mecanica calle costado izquierdo Parroquia San Francisco Javier carrera 28A con calle 31C	M3	1.00	58.00	6.31	0.38	139.07	

- Retiro y Disposición de Material Sobrante con pago de escombrera.

Durante este mes, iniciaron labores de retiro y disposición de material, se llevó a cabo la evacuación del material saliente por medio de volquetas, también se realizaron actividades de cargue a mano para asegurar la limpieza del área, la optimización de la eficiencia en zonas específicas del proyecto y el cumplimiento de todas las normativas ambientales.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	6 de 4	

ITEM	1.07	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	UN:	M3				CANT:	348.03
DESCRIPCION GRAFICA		DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor	
				Canfid	Longitud	Ancho	Espesor		
		Desalojo excavacion mecanica carrera 19 fase 2 desde la K0+286,6 hasta la K0+306.80	M3	1.00	20.00	7.60	0.33	50.16	
		Desalojo excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+020 y K0+060		1.00	40.00	7.50	0.35	105.00	
		Desalojo excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+060 y K0+077.70		1.00	17.70	7.40	0.38	49.77	
		Desalojo excavacion mecanica calle 33 fallo en interseccion con avenida Aranda K0+077.10	M3	1.00	1.80	7.30	0.20	2.63	
		Desalojo excavacion mecanica calle 33 fallo K0+000	M3	1.00	2.00	3.50	0.20	1.40	
		Desalojo excavacion mecanica calle costado izquierdo Parroquia San Francisco Javier carrera 28A con calle 31C	M3	1.00	58.00	6.31	0.38	139.07	

- Compactación de la Subrasante:

Con el objetivo de asegurar una base sólida para la nueva estructura vial, se llevó a cabo la compactación de la subrasante en las áreas donde se ha trabajado. Este paso es esencial para mejorar la estabilidad del terreno y garantizar que tenga la capacidad de carga necesaria para soportar las siguientes capas de la carretera. Con este proceso, la vía está lista para continuar con las próximas fases de construcción.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	7 de 4	

ITEM	2.01	COMPACTACIÓN SUBRASANTE	UN:	M2		CANT:		1900.96	
DESCRIPCION GRAFICA			DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
					Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
 <p>15/10/2025 10:29:57 a. m. 1°13'11.87184" N 77°16'4.40316" W # 23A-34 Carrera 19 Pasto Narino Altitud:2634.7msnm Velocidad:1.3km/h</p>			Compactacion subrasante carrera 19 frente a Bloques de Monterey carril izquierdo subiendo desde la abscisa K0+000 hasta la K0+101.10	M2	1.00	101.80	3.55		361.39
			Negativo tapas de camaras existentes desde la la abscisa K0+000 hasta la K0+101.10		-1.00	1.70	1.90		-3.23
					-1.00	1.30	1.90		-2.47
					-1.00	1.80	2.40		-4.32
			Compactacion subrasante carrera 19 con calle 33 en ambos carriles desde la abscisa K0+101.10 hasta la K0+131.10	M2	1.00	10.00	7.60		76.00
					1.00	10.00	7.50		75.00
					1.00	10.00	7.20		72.00
			Negativo tapas de camaras existentes desde la la abscisa K0+101.10 hasta la K0+131.10		-1.00	1.80	1.80		-3.24
					-1.00	2.40	3.10		-7.44
 <p>17/10/2025 10:19:59 a. m. 1°13'13.32744" N 77°16'2.13888" W # 80-4 Carrera 19 Pasto Narino Altitud:2660.7msnm Velocidad:5.8km/h</p>			Compactacion subrasante carrera 19 con calle 33 en ambos carriles desde la abscisa K0+131.10 hasta la K0+178.50	M2	1.00	10.00	7.30		73.00
					1.00	10.00	7.50		75.00
					1.00	10.00	7.10		71.00
					1.00	10.00	7.10		71.00
					1.00	10.00	7.12		71.20
					1.00	6.50	7.12		46.28
			Negativo tapas de camaras existentes desde la la abscisa K0+131.10 hasta la K0+178.50		-1.00	2.00	1.70		-3.40
			Compactacion subrasante calle 33 entre avenida aranda y carrera 29	M2	1.00	77.70	7.30		567.21
			Compactacion subrasante calle costado izquierdo Parroquia San Francisco Javier carrera 28A con calle 31C		1.00	58.00	6.31		365.98

- Avance de tiempo.
Con corte al 19 de noviembre de 2025, el proyecto ha completado 2 de los 4 meses del plazo contractual. Esto representa un avance de tiempo del 50%, demostrando un retraso en la ejecución dentro del cronograma establecido.
- Avance financiero.
Hasta la fecha el proyecto no ha tenido un avance financiero significativo siendo así que el 1.5% del valor del contrato se haya ejecutado, lo que se traduce en \$7,386,425.00

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	8 de 4	

- **Control Ambiental y Señalización**
De acuerdo con el instructivo IN-I-002, se confirma la ejecución efectiva y completa del plan de acción socioambiental. Esto asegura que las medidas para mitigar impactos sociales y ambientales se han implementado cabalmente. Asimismo, se ha verificado el cumplimiento riguroso del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) de señalización en todas las actividades del proyecto. Esto garantiza la seguridad y fluidez vehicular en las zonas de obra.
- **Comparación con lo programado.**
De acuerdo con el cronograma contractual, el proyecto debería haber alcanzado un 50% de avance para el 19 de noviembre de 2025. El avance real de la obra es del 1.5% demostrando un retraso significativo en el cronograma.
- **Análisis de problemas surgidos y emisión concepto técnico de alternativas de solución.**
Hasta el momento no ha surgido ningún problema significativo ni con la población ni en obra.

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Hasta la fecha de corte de 19 de octubre de 2025 no se ha llevado a cabo ningún ensayo de laboratorio por parte de contratista.

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortización	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	\$1.986.282.000.00			
Pago anticipo	-	-	-	-
Pago Actas parciales	-	-	-	-
Pago Acta Final	-	-	-	-
Totales	\$1.986.282.000			

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

Conforme al seguimiento realizado para el periodo de reporte correspondiente al mes de octubre, se constató que el contratista no radicó ante la administración municipal ninguna documentación de soporte para cobro, incluyendo actas y preactas, lo que resultó en la ausencia de facturación para el periodo.

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 9 de 4

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1.	Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
2.	Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
3.	Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.	Avance similar al programado.	En proceso
4.	Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.	Avance similar al programado.	En proceso
5.	Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
6.	Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo.	Avance similar al programado.	En proceso
7.	Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras extras o adicionales.	Avance similar al programado.	En proceso

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 10 de 4

8.	Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos.	Avance similar al programado.	En proceso
9.	El proponente deberá mantener mínimo un (01) frente de trabajo, para la ejecución del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo será: un (1) director de obra, además el personal técnico administrativo consistirá en: un (01) residente de obra, cuya permanencia en obra será del 100%, un (01) residente SISO, cuya permanencia en obra será del 30%, un (1) técnico auxiliar SISO, cuya permanencia en obra será del 100%; cuyos currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos.	No cumple	Pendiente
10.	Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
11.	Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.	Avance similar al programado.	En proceso

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	11 de 4	

12.	Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre otras.	Avance similar al programado.	En proceso
13.	Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos	No cumple	Pendiente
14.	Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.	Avance similar al programado.	En proceso
15.	Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente resueltos.	Avance similar al programado.	En proceso
16.	Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.	Avance similar al programado.	En proceso
17.	Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.	Avance similar al programado.	En proceso

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	12 de 4	

18.	Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista), su verificación será mediante los soportes generados por la nómina electrónica ante la DIAN.	Avance similar al programado.	En proceso
19.	Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.	Avance similar al programado.	En proceso
20.	Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado	Avance similar al programado.	En proceso
21.	Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.	Avance similar al programado.	En proceso
22.	El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación.	Avance similar al programado.	En proceso
23.	Instalar una valla informativa sobre el proyecto.	Avance similar al programado.	En proceso

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	13 de 4	

24.	Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor	Avance similar al programado.	En proceso
------------	--	-------------------------------	------------

8. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION.

ANEXO 1 – Avance cronograma de obra.

ANEXO 2 – Estado general del tiempo.

ANEXO 3 – Control diario del personal del contratista de obra.

ANEXO 4 – Control diario del equipo del contratista de obra.

ANEXO 5 – Control Ambiental y señalización de Obras.

ANEXO 6 – Bitácora de obra.

ANEXO 7 – Oficio por parte de interventoría solicitando planillas de seguridad social a contratista

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 14 de 4

ANEXO 1

DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION																		PERIODO 19 DE OCT A 19 DE NOV 2025												
CONTRATO No:		20254196					CONTRATISTA					PANAVIAS SA					OBRA: EI CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)															
ITEM	DESCRIPCION	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
001	Corte pavimento asfáltico con cortadora																															
002	Corte pavimento rígido con cortadora																															
003	Demolición pavimento asfáltico compresor																															
004	Demolición concreto hidráulico									x	x	x	x	x																		
005	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco																															
006	Excavación mecánica en materiales varios sin clasificar.		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x
007	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x
008	Compactación subrasante		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x
009	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %																															
010	Base granular																															
011	Base granular para bacheo																															
012	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible.																															
013	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para parcheo, Incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible.																															
014	Adoquín en concreto tipo cruz, 10 cm de espesor incluye suministro, instalación y base arena de 5cm.																															
015	Concreto premezclado 4000 psi acelerante a 3 días parcheo																															
016	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17,5 Mpa (2500 PSI), altura 15 cm y espesor de 12.5 cm																															
017	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa																															
018	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.																															
019	Reconstrucción sumidero tipo empopasto																															

Interventor

Contratista



NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA
25-May-18

VERSIÓN
03

CODIGO
IN-F-023

PÁGINA
15 de 4

ANEXO 2

[illegible]

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
	VIGENCIA 25-May-18	VERSIÓN 03	CODIGO IN-F-023	PÁGINA 16 de 4

ANEXO 3

DEPENDENCIA:

SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

MES19 DE OCT A 19 DE NOV 2025

CONTRATO No:

20254196

CONTRATISTA

Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.

OBRA:

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069).

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PERSONAL EN OBRA																														
INGENIERO RESIDENTE OBRA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
INGENIERO DIRECTOR OBRA					X					X								X				X	X						X	
SISO	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
MAESTRO OBRA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
ALBAÑIL	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
AYUDANTE OBRA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
OPERADOR MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
OPERADOR RETROEXCAVADORA CAT	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X
OPERADOR RETROCARGADOR																														
OPERADOR COMPRESOR MARTILLO NEUMATICO																														
CONDUCTOR CAMIONETA																														
TOPOGRAFO									X	X							X													
CADENERO									X	X							X													

Interventor

Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.
Contratista



17 de 4

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION																								MES	nov-22												
CONTRATO No:	LP-2025-6				CONTRATISTA				Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.										OBRA:				MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10															
<div><div></div><div>EQUIPO</div></div>	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
MOTONIVELADORA																																						
VIBROCOMPACTADOR RODILLO 7 TON	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A							
VOLQUETA DOBLETROQUE	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A							
VOLQUETA SENCILLA	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A							
RETROEXCAVADORA ORUGA																																						
RETROCARGADOR "PAJARITA"	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A							
COMPRESOR AIRE + MARTILLO NEUMATICO PARA DEMOLICIONES																																						
CAMIONETA ESTACAS																																						
ESTACION TOTAL									A	A								A	A																			
CONVENCIONES																																						
ACTIVO = A																																						
REPARACION = R																																						
INACTIVO = I																																						
		0															Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.																					
		Interventor															Contratista																					

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	PÁGINA	
25-May-18	03	IN-F-023	18 de 4	

ANEXO 5

PROYECTO			
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, PROMOVRIENDO UNA CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA, VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PASTO"			
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAVIAS SA	NIT: 901282606-0	
NOMBRE INTERVENTORÍA:	SGD INGENIERIA SAS	NIT: 891201840-6	
CONTRATO No:	20254196	FECHA INICIO OBRA: 19 DE SEPTIEMBRE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)		
I. LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO			
ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CALIFICACIÓN	
	NO SE ENCUENTRAN IMPACTOS		
II. PROGRAMAS AMBIENTALES A IMPLEMENTAR			
1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA		☒	
2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO		☒	
3. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES		☐	
4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		☐	
5. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA		☒	
6. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS		☒	
7. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		☒	
8. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FLORA Y FAUNA		☒	
9. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN		☒	
III. LUGARES DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE			
NOMBRE ESCOMBRERA	LOCALIZACIÓN	No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE AUTORIZA



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

20 de 4





ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

21 de 4

ANEXO 6


COMIENZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA (CAJEO) CON PADRITOS EN EL SECTOR DE NUEVOSOL ENTRE LA K0+0.00 Y LA K0+20.0 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 7m. Y UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 33 cm, DESARROLLANDO UN TOTAL DE 28 CUBOS EN 2 VIAJES DE VOLQUETA DE 7M³ Y 1 VIAJE VOLQUETA DE 14 M³, EN HORAS DE LA TARDE SE COMPACTA LO SUBYACENTE CON VIBROCOMPACTADOR MARCA BIFELI COD: (BORA CBO).

PERSONAL DE OBRAS: 1 AYUDANTE, 1 RESIDENTE, 1 OPERARIO

CLIMA: SE PRESENTAN LLUVIAS DESDE 3:PM A 4:00 PM

EQUIPO: RETROEXCAVADOR (PASADITA), VIBROCOMPACTADOR.


RESIDENTE


INTERVENTOR

CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA Y DESOLTO EN EL MISMO SECTOR (CALLE 33 BARRIO NUEVO SOL) DESDE LA K0+0.20 HASTA LA K0+0.60 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 7.20m Y UNA PROFUNDIDAD CADA 10m DE 35cm, EN LA MAÑANA SE HAN 2 VIAJES DE VOLQUETA 7M³ Y UN VIAJE DE VOLQUETA DE 14 CUBOS, LUEGO

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023


PÁGINA


22 de 4

EL FRENTE DE TRABAJO SE TRASLADA DESDE LA ANTIGUA SALIDA AL NORTE, COMENZANDO ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EN EL SECTOR DEL BARRIO NUEVO SOL EN LA CALLE 33 ENTRE AVENIDAS BRANCO Y CARRERA 29, PARA INSTALACIÓN DE ADQUIN, SE INSTALAN 20 GUDUAS, 10 A CADAS UNO, CADA 10 METROS PARA PODER NIVELES.

PERSONAL DE OBRA: LING. RESIDENTE, 1 MESTRO, 2 AYUDANTES

CLIMA: FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA.


RESIDENTE


INTERVENTOR

CON PERSONAL DE LA ALCALDIA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PARCHEO Y SUMINISTRO EN EL SECTOR DEL MERCADO DE LOS 2 PUENTES EN LA CARRERA 24 CON AVENIDA SANTANDER, SE RETIRA CADA ASFALTICO CON EL USO DE PARCHES, Y SE COMPACTA BASE Y ASFALTO CON EL USO DE BENITIN, SE REDUCEN 5 PARCHES MOSTRADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

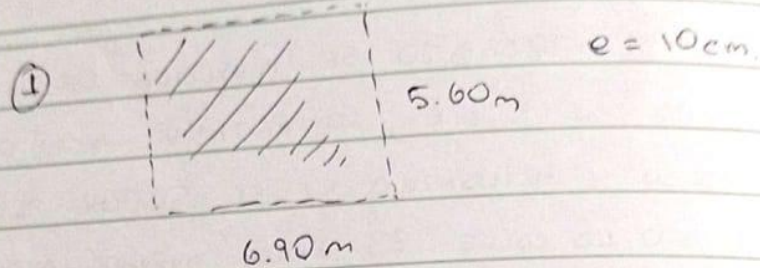
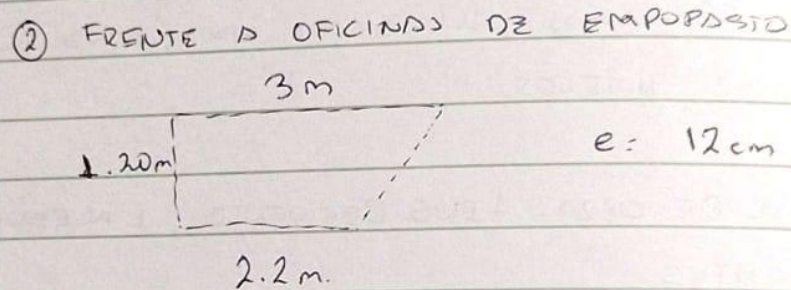

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

23 de 4



CLIMA : SE PRESENTA LLUVIAS DESDE LOS 3PM
HASTA 4:30 PM

RESIDENTE

INTERVENTOR.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023


PÁGINA

24 de 4

PERSONAL DE OBRAS: 1 RESIDENTE DE OBRAS, 1 MAESTRO DE OBRAS
1 AYUDANTE, 1 OPERADOR.

CLIMA: SE PRESENTAN LLOVIAS EN HORAS DE LA TARDE

EQUIPO: RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR.


RESIDENTE


INTERVENTOR.

COMIENZAN ACTIVIDADES DE NIVELACION PARA
INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ADQUIN, SEGUN
DISEÑOS ENTREGADOS POR ALCALDIA, LOS ESPESORES
SON LOS SIGUIENTES:

METOPAMIENTO CON BASE	15cm
CAPA DE AREN	4cm
ADQUIN.	10cm

EL EQUIPO UTILIZADO PARA LA NIVELACION ES LA
MOTONIVELADORA. LLEGANDO AL NIVEL REQUERIDO A
MEDIO DIA PARA LUEGO COMPACTAR LA SUPERFICIE
CON VIBROCOMPACTADOR, SALE 1 VIAJE DE VOLQUETES SEXILLOS
DE ESCOMBROS, EN HORAS DE LA TARDE LLEGA LA BASE
PARA UN TOTAL DE 5 VIAJES DE VOLQUETES DOBLE, LA
MOTONIVELADORA ES LA ENCARGADA DE REGAR EL
MATERIAL, SE IRRIGA, SE COMPACTA. CON VIBROCOMPACTADOR
Libro Medio Oficio 80 H.

Marden



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

25 de 4


PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OPERARIO
1 AYUDANTE

CLIMA: LUEVE FRECUENTEMENTE DURANTE TODO EL DIA

EQUIPO: MOTONIVELADOR, PASADITA Y VIBROCOMPACTADOR



RESIDENTE




INTERVENTOR

CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BASE
DESDE LA K0+0.00 HASTA K0+77.10 EN LA
CALLE 33, EN HORAS DE LA MAÑANA RESIDENTE
E INTERVENTOR ASISTEN A UNA REUNION EN INSTALACION
DE INFRAESTRUCTURA, TEMA A TRATAR "CARGA DE CARGA"
EN HORAS DE LA TARDE LLEGAN 3 VEHICULOS DE BASE DE VIGILANCIA
DOBLE, CONTINUAN MOTONIVELADORAS TRABAJANDO EN VIGILANCIA.


PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE, 1 OPERARIO, 1 MAESTRO
2 AYUDANTES

CLIMA: FUERTES LUVIAS EN HORAS DE LA TARDE

EQUIPO: MOTONIVELADOR, VIBROCOMPACTADOR.



RESIDENTE



INTERVENTOR

Libro Medio Oficio BO H.

Maldonado



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA


26 de 4


CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE BASE PARA EL MISMO SECTOR CALLE 33, LLEGAN 2 VISTAS DE MATERIAL EN LA MAÑANA, ESTE SE RIEGA, SE IRRIGA Y SE COMPACTA EN HORAS DE LA TARDE COMIENZAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL SECTOR DE LA IGLESIA DE DORADA EN EL LADO IZQUIERDO (CARRERA 28A CON CALLE 31C) DONDE SE VA INICIAR DORADA, EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA REALIZA TRABAJOS Y ENTREGA PLANO DE LEVANTAMIENTO A INTERVENTORES PARA APROBACION DE ANCHO DE CALZADA DE 6.31m

PERSONAL DE OBRA : 1 RESIDENTE, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO
1 AYUDANTE

CLIMA : SE PRESENTAN LLUVIAS LEVES EN HORAS DELA MAÑANA

EQUIPO : 1 MOTONIVELADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR,


RESIDENTE


INTERVENTOR.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE BASE PARA LA CALLE 33 SECTOR NUEVO SOL PARA LLEGAR A NIVEL DE DORADA.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023


PÁGINA


27 de 4

CLIMA: SE PRESENTAN LUVIAS INTERMITENTES EN
TODA LA TARDE

PERSONAL OBRAS: 1 RESIDENTE, 1 OPERADOR, 1
MAESTRO, 1 AYUDANTE

EQUIPO: MOTONIVELADOR Y VIBROCOMPACTADOR


RESIDENTE


INTERVENTOR

EL FRENTE DE TRABAJO SE TRASLADA AL SECTOR
DE LA CARRERA 19 FRENTE A TORRES DE MONTEPEY
FASE 2, DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FRENO
ANTERIORMENTE, EL PERSONAL DE OBRAS SE DEDICA
A REPARAR DAÑOS EN LA BASE YA QUE LAS LUVIAS
Y LA FALTA DE TRABAJOS EN EL SECTOR AFECTO
LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA, SE ENTREGA OCHO
A CONTRATISTA POR PARTE DE INTERVENTORES PARA
QUE PROCEDA CON LAS REPARACIONES.

SE RASPA EL MATERIAL DAÑADO CON MOTONIVELADOR
SE RETIRA EN VOLUMENES Y SE INSTALA BASE
NUEVA PARA COMPACTAR CON VIBROCOMPACTADOR.
LAS REPARACIONES SE HACEN DESDE LAS 06:00
HASTA LAS 10:00 PM.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

28 de 4


DE LA EXCAVACION SE COMIENZA LA SUBROZANTE CON VIBROCOMPACTADOR, EN LA TARDE SOLEN 2 VIAJES DE VOLQUETOS PEQUEÑOS Y 2 VIAJES DE VOLQUETOS DOBLE. CONTINUO LA COMPACTACION HASTA EL FINAL DE LA JORNADA

PERSONAS DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO, 1 AYUDANTE Y 1 OPERADOR.

CLIMA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA DESDE 7:00 AM A 9:00 AM

EQUIPO: RETROEXCAVADOR (POZOS), VIBROCOMPACTADOR


RESIDENTE


INTERVENTOR

CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION (COTEO) EN EL MISMO SECTOR CARRE 33 DESDE LA K0+060 A K0+ K0+077.10, SE TERMINA LA EXCAVACION. CON UN TOTAL DE 3 VIAJES DE VOLQUETOS DOBLE Y 4 VIAJES DE VOLQUETOS SENCILLO, TERMINADA LA EXCAVACION SE COMIENZA TODA LA LONGITUD DEL TRAMO CON VIBROCOMPACTADOR, SE REVISAN NIVELES PARA LA INSTALACION DE BASE, EL ESPESOR EXCAVADO FUE DE 38 cm

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

29 de 4

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO.

2 MAESTROS, 2 OPERARIOS, 2 PALETAS, 2 AYUDANTES

CLIMA: NO SE PRESENTARON LLUVIAS EN TODO EL DIA

EQUIPO: MOTOCICLETA, VIBROCOMPACTADOR.

RESIDENTE

INTERVENTOR.



NOMBRE DEL FORMATO

VIGENCIA

25-May-18

VERSIÓN

03

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

30 de 4

aportes
en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE APORTANTE									
Identificación	Gr	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Código Postal	Teléfono	Excmo. Sr. Srta. e	
167-970370480	6	FINANZAS INGENIERIA Y CONSTRUCTORES SA.	8- MONTE DE 200 COLTANTES	OBRA	CASA VALDE DE ALTOZ C/	POCITO MARINO 301	7311118	SI	ICFEP

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipos	Fecha	Pago	Banco	Dos Mera	Valor		
2025-10	9666007049	Planilla	2025-11-12	2025-11-14	BANCO AVILA US	7	5110,228,000		

[illegible]
