



130.20.10. 1033 - - - -

Yopal, Octubre 21 de 2024

Ingeniero:

JUAN JOSE CEPEDA PEREZ

R.L MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA - Tel. 3132920247

E-MAIL: mopensas@gmail.com

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csinterfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023** "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ASUNTO: - INVITACIÓN REUNIÓN CON PRESENCIA PRESIDENTES DE JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE ACUATODOS SA ESP PARA EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 4:00 DE LA TARDE


Cordial saludo;

Por medio de la presente ACUATODOS S.A E.S.P requiere al contratista de obra e interventoría para que asistan a reunión programada con la comunidad en las instalaciones de ACUATODOS SA ESP el día jueves 24 de octubre de 2024 a las 4:00 de la tarde con el fin de rendir información del estado actual de ejecución del proyecto y su programación para ejecución de actividades faltantes.

Como entidad requerimos la presencia de los representantes legales de obra e interventoría sin cabida de delegación alguna, así mismo que se acompañe del grupo de trabajo correspondiente a los Directores y Residentes.

Sin otro particular,


ING. JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente


ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CAGHAY
Subgerente Técnico y Operativo


Proyectó: **JORGE VAN MINAYA PULGARÍN**
Profesional S.T.Y.O

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario
Copia: Archivo



Subgerencia Tecnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

INVITACIÓN REUNIÓN CON PRESENCIA PRESIDENTES DE JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE ACUATODOS

1 mensaje

Subgerencia Tecnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

21 de octubre de 2024, 17:48

Para: Juan Jose Cepeda <mopensas@gmail.com>, csointerfase2@gmail.com, sical5sas@gmail.com

130.20.10.1033

Yopal, Octubre 21 de 2024

Ingeniero:

JUAN JOSE CEPEDA PEREZR.L MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA - Tel. 3132920247E-MAIL: mopensas@gmail.com

-

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csointerfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

-

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023** "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: - INVITACIÓN REUNIÓN CON PRESENCIA PRESIDENTES DE JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE ACUATODOS SA ESP PARA EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 4:00 DE LA TARDE

Cordial saludo;

Por medio de la presente ACUATODOS S.A.E.S.P requiere al contratista de obra e interventoría para que asistan a **reunión programada con la comunidad en las instalaciones de ACUATODOS SA ESP el día jueves 24 de octubre de 2024 a las 4:00 de la tarde** con el fin de rendir información del estado actual de ejecución del proyecto y su programación para ejecución de actividades faltantes.

Como entidad requerimos la presencia de los representantes legales de obra e interventoría sin cabida de delegación alguna, así mismo que se acompañe del grupo de trabajo correspondiente al los Directores y Residentes.

Sin otro particular,

ING. JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ

Gerente

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARÍN**

Profesional S.T.Y.O

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario

Copia: Archivo



(8) 6341324

subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co

Carrera 19 No. 6 - 100, Edificio Emiro Sossa Pacheco - 3er piso



1033-INVITACION CONTRATISTA E INTERV. REUNION 24-10-2024.pdf

662K

130.20.10 1035 - - - -

Yopal, octubre 21 de 2024

Señores
PRESIDENTES DE JUNTA
SECTORES BENEFICIADOS CONTRATOS DE LA REFERENCIA

REFERENCIA:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 044-2022 "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048-2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: INVITACIÓN REUNIÓN PRESIDENTES DE JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE ACUATODOS SA ESP PARA EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 4:00 DE LA TARDE.

Cordial saludo;

Por medio de la presente se hace extensiva invitación a los presidentes de Junta para participar en reunión en las instalaciones de la empresa ACUATODOS SA ESP el día jueves 24 de octubre de 2024 a las 4:00 de la tarde con el fin de informar el estado de ejecución de los proyectos indicados en la referencia.

ÁREA DE INFLUENCIA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 044 DE 2022
Comuna VII "Juan Nepomuceno Moreno"
Getsemani, Salome II, Xiruma II, Bosques de Achagua
ÁREA DE INFLUENCIA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2024
Comuna VII "Juan Nepomuceno Moreno"
Barrios: Bosques de Achagua, Bosques de Guaratara, Xiruma II, Piedemonte, Salome II, Getsemani

Sin otro particular,

ING. JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente

ROBERT ASIS NIERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: JORGE IVAN MINAYA PULGARIN
Profesional S.T.Y.O

Proyectó: NELSON ROTANDO VARGAS ANGARITA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

GESTION DOCUMENTAL:
Original Destinatario
Copia Archivo

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

estado de ejecución contratos de obra pública
No. 044-2022 y 048-2023

Fecha de la Reunión:

24 | 10 | 2024

Hora de inicio

4:00 pm

Hora de finalización

6:00 p.m.

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Acuatodos SA ESP.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1			
2	se adjunta lista asistencia		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión representantes de la comunidad beneficiada con la ejecución de las obras contratos 044-2022 y 048-2023

ORDEN DEL DÍA

- Presentación asistentes gerente, subgerente técnico y profesional
Apoyo Acuatodos, interventoría de los dos proyectos y
asistentes de la comunidad.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Interviene gerente Acuatodos SA E.S.P. haciendo una contextualización de los proyectos. La comunidad expresa inconformidad en los avances de las obras y solicitan mayor celeridad en la ejecución.

Se explica los componentes principales proyecto:

1. Enmallado redes sanitario y Alveolito en seis barrios.
2. colector principal
3. Estación de bombeo.
- 4 obras complementarias.

Así mismo se expone las acciones hechas por la empresa de servicios públicos tendientes de brindar soluciones y se lleve a la culminación de las obras y se beneficie la comunidad y evitar procesos jurídicos con grandes costos administrativos.

Se informa que actualmente el proyecto tiene un PAC (Proceso Administrativo de Control) iniciado por el DPN, se dio ya respuesta y se trabaja en subsanar este proceso, así se evita inconvenientes en el desarrollo de las actividades constructivas, así mismo la exigencia de cumplimiento de avance de obra.

los representantes de la comunidad solicitan que los avances se les informen y se citen todos los presidentes de junta y ediles

Se propone reuniones mensuales en el sitio de la obra con la comunidad


II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Comunidad solicita priorizar los servicios básicos de aseo y alcantarillado ante de la ejecución de las obras complementarias.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Realizar reunión en el sitio de la obra con la comunidad a las 7:00am el próximo martes 29 de octubre 2024.
- Comunidad adquiere el compromiso de apoyar la gestión de Acuatos S.A. E.S.P. para lograr la terminación de la obra.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma : 
 Nombre : Jorge Luis Minga
 Cargo : Profesional Área Sub-Técnica
Acuatos S.A. E.S.P.

Firma : 
 Nombre : ROBERT HERNANDEZ
 Cargo : Sub-Técnico

Firma : 
 Nombre : JORGE CASTELLÓN
 Cargo : R.L. INTERCENTRO

Firma : _____
 Nombre : _____
 Cargo : _____
 Comunidad ver lista asistencia.

actualizados s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.										
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (propiedad legal ente descentralizado)										
REGISTRO DE ASISTENCIA										
FECHA		DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	GERENCIA			
OBJETO		24		10		2024		TEMAS A TRATAR		
Contrato obra No 044-2022 y 048-2023								5		
								6		
								7		
								8		
No	NOMBRES Y APELLIDOS				ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO/e-mail	HORA	FIRMA
1	Claudia Patricia Pineda				Villa David		313 580 2579	cpatricia77@hotmail.es		Chunquim
2	SERGIO ANDRES GOMEZ				Villadavid	Presidente	314 857 888	ssss.gomez@gmail.com		Sergio Gomez
3	Dyana B. Sotelo				Vedonal Ebar		313 215 1871	luna.amiel@gmail.com		Dyana B. Sotelo
4	Gianella Ipin Godoy				Salome II	Gerente S.A.C.	313 363 1439	lpin.godoy@gmail.com		Gianella Ipin Godoy
5	BOLISARIO FERRERO F.				Cespedes	Gerente	320 667 419	lpin.godoy@gmail.com		Bolisario Ferrero
6	Claudia Patricia Vargas				Villa David	Veedora C-7	318 454 169	claudia.vargas@gmail.com		Claudia Patricia Vargas
7	Alejandro Monsalve				Vedunia	Vicepresidente	313 401 7390	cpalejandra.monsalve@gmail.com		Alejandro Monsalve
8	Anjelica Maria Vargas A.				AgDENOMVE	Lider Presidente	313 860 946	vargasagdenomve@gmail.com		Anjelica Vargas
9	Nancy Garcia Sanabria				Bosques Adragua	Lider Comunidad	314 839 030	nagaz505@gmail.com	4:25	Nancy Garcia
10	Fany Parra Martinez				Getoemani	Trasera	320 530 233	fany.parra@gmail.com		Fany Parra
11	Wilson Gomez Salamanca				Presdet Xuma	Presidente	310 836 671	wilson.gomez@gmail.com		Wilson Gomez
12	Audiver Baricra Ch.				P. Xiruma I	Presidente	314 424 136	audiverbaricra@gmail.com		Audiver Baricra
OBSERVACIONES										

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.										
Nombre de institución responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)										
REGISTRO DE ASISTENCIA										
FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	GERENCIA				
OBJETO					TEMAS A TRATAR					
						1	2	3	4	
						5	6	7	8	
contrato obra No. 044-2022 y 048-2023										
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS				ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO e-mail	HORA	FIRMA
1	NATALIA JORJES ROMANO				JAC SANTAMARTA	VICEPRES	3026166190	marca-gra fco e-hotmail.com	4:30 PM	(Firma)
2	NELY QUINTANA				JAC SANTAMARTA	CONVENCION	30865872	biaguenes@guayaquil.com	4:30 PM	(Firma)
3	Eulides Parasta Garin				XNUMA 2	Vicepresidente	312541583	evldbs, stb, g	4:20	(Firma)
4	Enica Hartner				CSO Inter Fase 2	Ing Residente	305223047	csointerfase2@guayaquil.com	4:20	(Firma)
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
OBSERVACIONES										

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN COMUNIDAD COMUNA 7 YOPAL EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024

A. OBJETO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 044-2022 "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048-2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN COMUNIDAD COMUNA 7 - YOPAL EL DÍA 24 DE OCUBRE DE 2024



FECHA: 24/10/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD



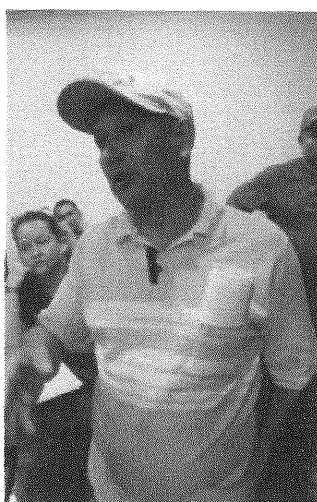
FECHA: 24/10/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD



FECHA: 24/10/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD



FECHA: 24/10/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD



120.26. 1039- - - -

Yopal, 22 de octubre de 2024

Señores:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

E-mail: resultadosgr@dn.gov.co

ASUNTO: SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE EJECUCIÓN PARA REPROGRAMACIÓN PROYECTO BPIN 2023005850054 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Cordial saludo,

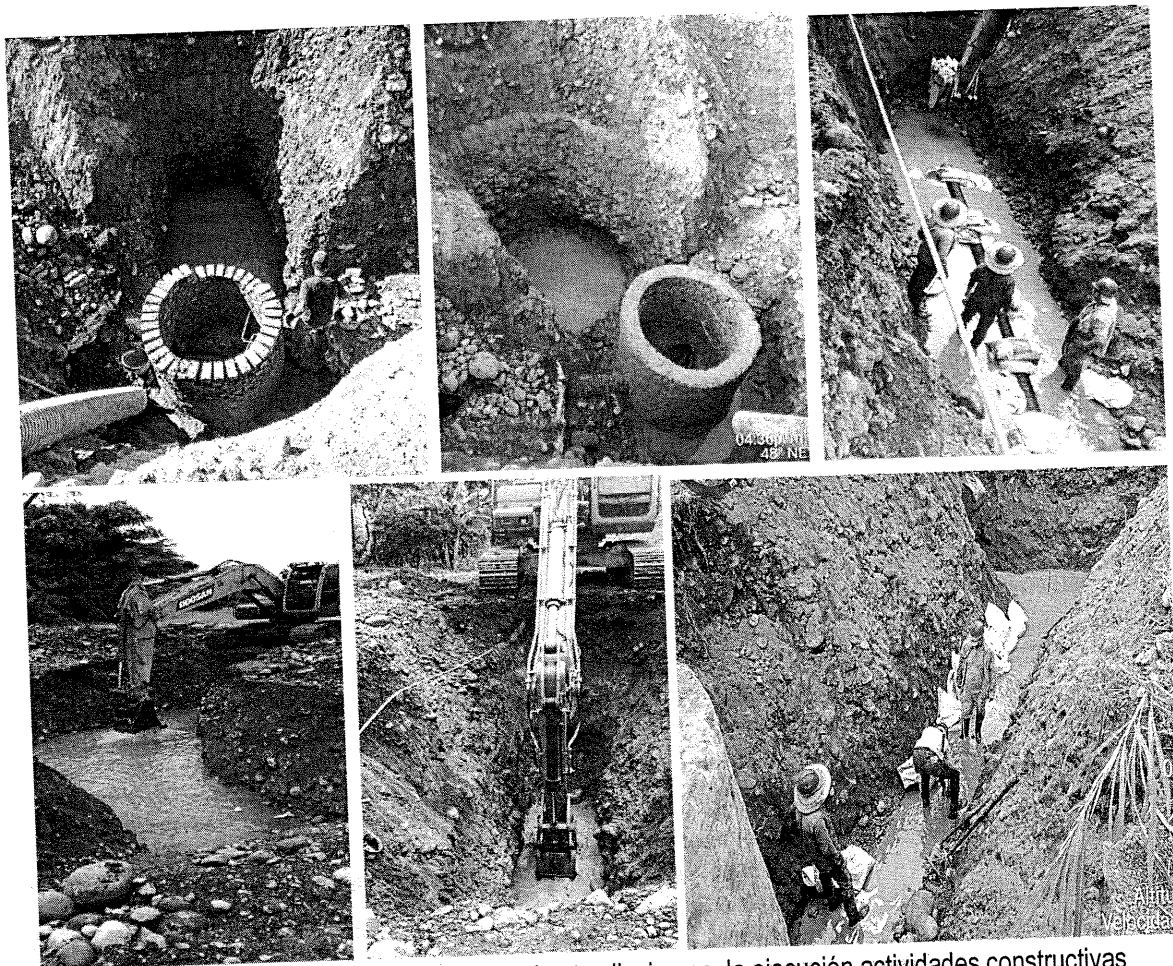
Por medio de la presente, me permito de manera atenta solicitar la ELIMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN del proyecto "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", para la modificación y actualización de la reprogramación del contrato de Obra No. 048 de 2023, toda vez que durante el proceso de ejecución de las actividades se han presentado situaciones que dieron origen a la suscripción de una prórroga por cuatro (4) meses, motivados en las siguientes causas:

1. En el inicio del desarrollo de la ejecución de las actividades propias de obra del contrato No. 048 de 2023, se presentaron dificultades relacionadas con la falta de tubería, debido a la demora por parte del proveedor, debido al traslado de la planta de producción del municipio de Itagüí al municipio de Guarne en Antioquia, por lo que la entrega de la tubería se efectuó fuera del tiempo acordado y de manera parcial, adicionalmente se suman los problemas en las vías nacionales que conectan el departamento de Casanare con el resto del país presentados en los meses de junio, julio y agosto 2024, lo cual ha retrasado aún más la entrega de los suministros necesarios.
2. Durante los meses de mayo, junio y julio 2024 se registraron bajos rendimientos de ejecución por condiciones climáticas adversas, ya que las fuertes precipitaciones durante dichos meses generaron dificultades en los trabajos de excavación necesarios para la construcción de los colectores de alcantarillado sanitario y los pozos de inspección, presentándose inestabilidad en taludes y pérdida de actividades ejecutadas como se visualiza en el registro fotográfico

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO
POSTAL
850001



Registro fotográfico impacto de las fuertes lluvias en la ejecución actividades constructivas

3. Para mitigar los constantes retrasos, la interventoría solicitó al contratista un plan de contingencia. Dicho plan fue entregado el 6 de julio 2024, aprobado por el equipo interventor el 9 de julio 2024 y ejecutado por el contratista el mismo día. El plan contemplaba aumentar el rendimiento de las actividades retrasadas mediante la asignación de más cuadrillas de trabajo; sin embargo, no fue posible completar las actividades dentro del plazo contractual previsto debido a las condiciones climáticas previamente mencionadas
4. Con base en las causales mencionadas anteriormente, el contratista de obra realizó una solicitud de prórroga al contrato de obra 048 por un plazo de cuatro (04) meses calendario, contados a partir de la fecha de terminación prevista (28 de agosto de 2024), solicitud que fue revisada y verificada por la interventoría quien, recomendó y avaló la suscripción de dicha prórroga, soportado en la revisión de los componentes técnicos, administrativos, financiero, legal y ambientales, resultando la suscripción de la prórroga No.1 al contrato de obra en mención.



5. Con el fin de realizar el seguimiento y control de las actividades faltantes, la interventoría realizó la solicitud de prorroga al contrato de consultoría No.1 de 2024 por un plazo de cuatro (04) meses calendario, el cual fue aprobado por la supervisión y suscrito el día 04 de septiembre de 2024.

Sin otro particular,


ING. JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente


ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo


Proyectó: AILYN OSPINA RINCON
Profesional de Apoyo STYO


Proyectó: JORGE IVÁN MINAYA PULGARÍN
Profesional de Apoyo STYP

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo
Copia: Archivo



130.20.10.

1131- - - -

Yopal, Noviembre 13 de 2024

Señores

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN GOBERNACIÓN DE CASANARE

casanareocad@gmail.com

REFERENCIA: SUIFP No. 2022005850029 AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUIFP No. 2023005850054 CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ASUNTO: SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTES FORMULACIÓN Y/O AJUSTES PROYECTOS DE LA REFERENCIA QUE REPOSAN EN EL SUIFP

Cordial saludo;

Por medio de la presente ACUATODOS S.A E.S.P solicita documentos soportes formulación y/o ajustes proyecto de la referencia que reposan en el suifp.

SUIFP No. 2022005850029	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUIFP No. 2023005850054	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Sin otro particular,


ING. JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente

Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARÍN**
Profesional S.T.Y.O

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario
Copia: Archivo



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTES FORMULACIÓN Y/O AJUSTES PROYECTOS DE LA REFERENCIA QUE REPOSAN EN EL SUIFP

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>
Para: Secretaria Tecnica Ocad casanare <casanareocad@gmail.com>

13 de noviembre de 2024, 16:53

130.20.10-1131

Yopal, Noviembre 13 de 2024

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN GOBERNACIÓN DE CASANARE
casanareocad@gmail.com

REFERENCIA: SUIFP No. 2022005850029 AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUIFP No. 2023005850054 CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTES FORMULACIÓN Y/O AJUSTES PROYECTOS DE LA REFERENCIA QUE REPOSAN EN EL SUIFP

Cordial saludo;

Por medio de la presente ACUATODOS S.A E.S.P solicita documentos soportes formulación y/o ajustes proyecto de la referencia que reposan en el suifp.

SUIFP No. 2022005850029	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUIFP No. 2023005850054	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Sin otro particular,

ING. JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ

Gerente

Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARÍN**

Profesional S.T.Y.O

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario

Copia: Archivo

Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL

gerencia@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co



1131-SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTES FORMULACION.pdf

281K

Yopal, 13 de noviembre 2024

Señores
ACUATODOS SAS
Ingeniero
JULIO CESAR CUEVAS
Ciudad

Referencia: Solicitud de informe del avance del contrato en Piedemonte

Cordial saludo.

Por medio de la presente, la comunidad del Asentamiento Humano Piedemonte solicitamos una certificación, en la cual le informen a la secretaria de Planeación de Yopal el porcentaje del avance de las obras que se están realizando en el Asentamiento Humano Piedemonte el cuál se encuentra incluido dentro del contrato 048 de 2023 que tiene como objetivo la construcción de las obras de alcantarillado , redes acueducto y obras complementarias; así mismo se informe la fecha estimada de la culminación de las obras.

Agradezco su valiosa colaboración

Atentamente,

ANGÉLICA VARGAS A.
ANGÉLICA MARÍA VARGAS AGUDELO
C.C. 1032421557 de Bogotá.
3138607146
vargasagudeloangelica@gmail.com


acuatos s.a.
E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 13-11-24.
HORA: 8:33 am
FIRMA: Julieth D.
(1 folio)

1463 - - - -

130.20.10.

1162----

Yopal, Noviembre 21 de 2024

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L. CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csinterfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023** "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: - ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No. 048 de 2023 DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 1 SUSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 2024 POR UN PLAZO DE CUATRO (04) MESES.

Cordial saludo;

Dado a las obligaciones de seguimiento y control que se tiene a la ejecución del contrato de obra No. 048 de 2023 se requiere a la interventoría dar cumplimiento a la CLÁUSULA No. 8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA numeral 45 del contrato de consultoría No. 001 de 2024 que establece:

45 Garantizar que el ejecutor del contrato de obra mantenga vigentes las pólizas y demás obligaciones contractuales durante el desarrollo del proyecto.

Lo anterior en que a la fecha no se ha hecho entrega para aprobación de las pólizas actualizadas del contrato de obra No. 048 de 2023 de acuerdo a la prórroga No. 1 suscrita el día 28 de agosto de 2024 por un tiempo de cuatro (04) meses.

Sin otro particular,

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARIN**
Profesional S.T.Y.O

CC. MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA
E-MAIL: mopensas@gmail.com

GESTION DOCUMENTAL: Original: Destinatario Copia Archivo



130.20.10.

1163-1163

Yopal, Noviembre 21 de 2024

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L. CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csinterfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023** "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA MES DE OCTUBRE DE 2024

Cordial saludo;

Dado a las obligaciones de seguimiento y control que se tiene a la ejecución del contrato de obra No. 048 de 2023 se requiere a la interventoría dar cumplimiento a la CLÁUSULA No. 8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA numeral 29 y 41 del contrato de consultoría No. 001 de 2024 que establece:

29. Solicitar al contratista de obra, informes mensuales sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e inversión del anticipo.


41. Presentar informes mensuales de interventoría sobre la ejecución del contrato de obra objeto de la vigilancia, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual, anexos, ensayos de laboratorio y los que solicite la Supervisión. En este informe deben relacionar las funciones administrativas, técnicas, ambientales, financieras, contables y jurídicas ejecutadas con relación a la obra objeto de control; la ejecución de estas funciones debe estar certificadas por cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo de la interventoría según su competencia. Este informe debe contener como mínimo:

- a). Avance de cada una de las actividades programadas del contrato de obra vigilado y de la interventoría.
- b.) Registros fotográficos.
- c). Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.

- d). Fotocopia de la bitácora.
- e). Resumen de las actividades realizadas en el mes.
- f). Relación del personal empleado en la ejecución del contrato.
- g). Informe de seguridad industrial y salud ocupacional.
- h). Informe de manejo socio ambiental.
- i). Informe de manejo del plan de manejo de aseguramiento de la calidad de la obra.
- j). Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes (cuando aplique).
- k). Actualización del programa de ejecución de obra.
- l). Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios ni Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, así como riesgos laborales cuando corresponda.

Lo anterior se motiva en que a la fecha no se tiene registro de entrega del informe mensual de obra e interventoría correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024.

Sin otro particular,



ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo



Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARÍN**
Profesional S.T.Y.O

CC. MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA
E-MAIL: mopensas@gmail.com

GESTION DOCUMENTAL: Original: Destinatario Copia Archivo

130.20.10.

1164----

Yopal, Noviembre 21 de 2024

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csointerfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: - REQUERIMIENTO PRESENTACIÓN SOPORTES PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORIA.

Cordial saludo;

Por medio de la presente se requiere que de manera inmediata se alleguen los soportes de pago de seguridad social y parafiscales del personal vinculado en el contrato de consultoría No. 001 de 2024 en el tiempo que se lleva de ejecución, lo anterior se enmarca en el cumplimiento que se debe dar de la **CLÁUSULA No. 7 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 16 del contrato de consultoría No. 001 de 2024 que establece:**

16 Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.

Sin otro particular,

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARÍN**
Profesional S.T.Y.O.

GESTION DOCUMENTAL: Original: Destinatario Copia Archivo



130.20.10. 1166 - - - -

Yopal, Noviembre 21 de 2024

Ingeniero:

JUAN JOSE CEPEDA PEREZ

R.L MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA - Tel. 3132920247

E-MAIL: mopensas@gmail.com

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csinterfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023** "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ASUNTO: - CITACIÓN COMITÉ EL DÍA MARTES 26 DE NOVIEMBRE 2024 A LAS 9:00 AM EN INSTALACIONES DE ACUATODOS SA ESP.


Cordial saludo;

Por medio de la presente ACUATODOS S.A E.S.P requiere al contratista de obra e interventoría para que asistan a reunión programada el día martes 26 de noviembre a las 09:00 am en las instalaciones de ACUATODOS SA ESP con el fin de rendir información del estado actual del proyecto.

Como entidad requerimos la presencia de los representantes legales de obra e interventoría sin cabida de delegación alguna, así mismo que se acompañe del grupo de trabajo correspondiente a los Directores, Residentes y Profesionales Especialistas relacionados en sus propuestas.

Sin otro particular,


ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo


Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARIN**
Profesional S.T.Y.O.

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

SIG MECA
GIC-F-07
CARTA
18/08/2015
V-02

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  @acuatodos  e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Telefax:** (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO
POSTAL
850001

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Fecha de la Reunión:

Hora de inicio

Hora de finalización

26 11 2024

9:00 a.m.

10:30 a.m.

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Acuatodos SA E.S.P.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	ROBERT ASIS REMANDO	Subgerente Técnico	Acuatodos
2	JORGE COSTEYRAS	ELABORADOR INTER FASE 2	CSO INTER FASE 2
3	Josely Jairo Miroja P.	Profesional STYO Acuatodos	STYO Acuatodos
4	Enzo Maitrey Campora	Residente Interventoria	CSO INTER FASE 2
5	Diego Fernando Bolono	Inspesor Interventoria	CSO INTER FASE 2
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Establecer estado actual de ejecución del proyecto.

ORDEN DEL DÍA

- Presentación asistentes.
- Intervención participantes.

Por parte del subgerente técnico de Acuatodos S.A. E.S.P. se pregunta.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

sobre la actividad de Revisión de la legalidad para intervención de los seis barrios, a lo cual la interventoria expresa:

1. Que se realizó la revisión de las licencias urbanísticas de los barrios Getsemani, Salome II, Bosque de Achagua, y Xiruma II, información que fue entregada por la entidad y que reposa en el SUIP.

La supervisión pregunta a la interventoria, que si encontraron incompleta la información sin cumplimiento total de los requisitos por qué no informaron y expresaron a la entidad y se acordó a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra.

La interventoria por medio del representante legal indica que se evalúe los documentos pre contractuales que la entidad entregue y que se informe en el documento preconstructivo y que hasta ahora se pronunció la supervisión.

De los seis barrios referidos se pide a la interventoria el estado de ejecución de los mismos.

La interventoria entrega un cuadro con avance en cada barrio.

Barrios	colectores Sanitarios	Pozos Inspección	Acum. Sanitaria
Salome II	0%	0%	0%
Getsemani	70%	70%	70%
Piedemonte	85%	85%	85%
Bosques de Achagua	100%	100%	99%
Xiruma II	40%	40%	10%
Bosques de Guasatama	100%	80%	35%

Se indica que el % de ejecución es del 44% contra programado 47,98%.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se requiere los supuestos de pago de seguridad social del personal de interventoría, a lo cual la interventoría expresa que este pago hasta el mes de abril de 2024.

Se adquiere el compromiso de entregar todos los pagos de su adscrito a la interventoría el día lunes 02 de diciembre del 2024 junto con el informe mensual de octubre de 2024 que está pendiente.

En relación a la vigencia de las pólizas de control de obra se indica que falta actualización en relación a la póliza No. 1 suscrita el día 28 de agosto de 2024 por un término de cuatro meses, la interventoría en reiteradas ocasiones genera oficio de requerimiento al contratista sin obtener respuestas, estos oficios se han enviado con copia a la entidad.

Una vez analizado por parte de la supervisión teniendo en cuenta que el contratista de obra omitió su deber de responder ante los requerimientos de la interventoría, y consultada sobre las implicaciones jurídicas nos encontramos ante una flagrante incumplimiento del numeral 7 de la cláusula 7 obligaciones generales del contratista del contrato de obra pública No 048 de 2023, teniendo en cuenta que la ejecución vio la vigencia del amparo de responsabilidad civil extrac contractual, además de representar una omisión en los deberes del contratista, en caso de la ocurrencia de un siniestro catastrófico consecuencias patrimoniales, disciplinarias y fiscales respecto a los intereses del contrato, en consecuencia una vez analizado lo anterior la subgerencia técnica en calidad de supervisor del contrato recomienda la suspensión inmediata de la ejecución de las actividades contractuales y solicita a la interventoría se pronuncie sobre la situación y presente en un término no mayor de cinco días dando su ampliación mediante un informe sobre el cumplimiento general del contrato en el marco del debido proceso y las garantías que le asisten al contratista.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

para que la entidad pueda analizar en el marco del manual de contratación las acciones que tenga lugar.

Teniendo en cuenta que el señor contratista de obra se ausenta de la reunión se proceda su notificación escrita para que se haga que a la entidad para la firma por la suspensión de manera inmediata.

La interventoría manifiesta que esta de acuerdo en suspender el contrato de obra toda vez que no están vigentes las garantías.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES


- Entrega soportes de pago de seguridad social del personal de interventoría por el tiempo de ejecución del contrato para el día lunes 02 de diciembre 2024 junto con el informe mensual mes octubre 2024.
- Entrega informe de presunto incumplimiento por parte de interventoría para el día lunes 02 de diciembre 2024.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma

Nombre

Cargo


ROBERT ARIAS HERNANDEZ
Subgerente Técnico.

Firma

Nombre


Cargo


JORGE CASTEDANOS
EL CSO REFER 2018 2.

Firma

Nombre

Cargo


Jorge I. Minaya I.
Profesional ST40 Acuatodos

Firma

Nombre

Cargo


Enira Hartinet
Residente Interventoría

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____	Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____
Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____	Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____
Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____	Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____
Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____	Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

acuatodos s.a.
E.S.P.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.									
REGISTRO DE ASISTENCIA									
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal ante desamortizado)									
FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	Subgerencia Técnica y Operativa	GERENCIA	TEMAS A TRATAR	
OBJETO	26	11	2024	HORA	9:00 am	1. Estado actual de	5		
	contrato obra 048-2023				2. ejecución del proyecto	6			
	Proyecto fase 2 Yopal				3. ejecución del proyecto	7			
					4	8			
No	NOMBRES Y APELLIDOS				ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO/e-mail	HORA
1	Robert Ortiz Henríquez				Acuatodos	Subgerente			9 AM
2	Jorge Casarecaro				CSO Interproyección	CSO Interproyección	3133930340	scasarecaro@gmail.com	10:30 am
3	Jocelyn Maza				Acuatodos	Proyección	3102108597	j.maza@acuatodos.gov.co	10:30 am
4	Enrique Matamoros				CSO Interproyección	CSO Interproyección	320829447	enrmatamoros@gmail.com	10:30 am
5	Diego Bolívar Buitrago				CSO Interproyección	CSO Interproyección	320829788	dbolivar@acuatodos.gov.co	10:30 am
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
OBSERVACIONES									

EL SUSCRITO SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO
DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE
"ACUATODOS S.A. E.S.P."

CERTIFICA:

ACUATODOS EJECUTA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE IDENTIFICADO CON CODIGO BIPIN 2023005850054 MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 Y CONTRATO DE CONSULTORÍA 001 DE 2024 (INTERVENTORÍA).

Dentro del alcance que se tiene en el proyecto está la construcción de las redes y acometidas de alcantarillado sanitario y acueducto de los barrios: 1. Piedemonte, 2. Bosques de Achagua, 3. Xiruma II, 4. Bosques de Guaratato, 5. Salome II y 6. Getsemaní.

De acuerdo al % de avance reportado por la interventoría de fecha 26 de noviembre de 2024 se posee un avance en los siguientes componentes por cada barrio así:

AVANCE EN CADA BARRIO POR CADA COMPONENTE CON CORTE AL 26/11/2024

Barrio	Colectores Sanitarios	Pozos de Inspección	Acometidas sanitarias	Sistema Acueducto
1. Piedemonte	85%	85%	85%	0%
2. Bosques de Achagua.	100%	100%	99%	0%
3. Xiruma II	40%	40%	10%	0%
4. Bosques de Guaratato	100%	80%	35%	0%
5. Salome II	0%	0%	0%	0%
6. Getsemaní	70%	70%	70%	0%

Fuente: Interventoría contratada

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la Ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024.

Sin otro particular,

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente técnico y Operativo
Supervisor

Proyecto: Jorge Ivan Minaya Pulgarin
Profesional STYO ACUATODOS SA ESP

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

Recibido:
ANGELICA JARGAS
1032427557

Recibido
20/11/2024 6:07 pm
@ 9283969 mly
Prendida JAC
XIRUMA 2

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Fecha de la Reunión:

Hora de inicio

Hora de finalización

03 12 2024

8:00 am

9:00 am

LUGAR DE LA REUNIÓN:

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Ver registro de asistencia.		
2			
3	Gerente Acuatodos S.A. E.S.P.	interventoria, control de obra y	
4	comunidad.		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informar a la comunidad sobre el estado de Avance de la obra.

ORDEN DEL DÍA

- Presentación asistentes
- Intervención Gerente Acuatodos S.A. E.S.P.
- Intervención comunidad

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Interviene gerente de Acuatodos SA E.S.P. indicando el avance informado por interventoria con corte al 26 Noviembre 2024 del 44%. Actualmente se tiene fecha prevista de terminación 27 de diciembre 2024.

Interventoria manifiesta que existe la necesidad de solicitar una ampliación al plazo contractual y que se está planificando priorizar la instalación redes de acueducto de las barrios Salome II y Getsemani atendiendo las peticiones de esta comunidad donde expresan la carencia de este líquido vital.

La comunidad solicita a la interventoria y contratista hacer oportunamente la reparación de mangueras artesanales que sirven para distribuir agua de manera provisional a las casas y que han sido averiadas con las actividades constructivas.

Preguntan adicionalmente los asistentes por los obras del otro proyecto que se ejecuta en la zona y que se denomina proyecto Macro, allí por parte de gerencia de acuatodos S.A. E.S.P.

2/6

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se indica que este proyecto tiene un proceso administrativo de control hecho por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) y que el día de mañana existe reunión virtual con esta entidad para solicitar el levantamiento de la Medida.

Por parte de Acuatodos S.A. E.S.P. se informa que desde la administración departamental el objetivo es seguir adelante estas obras y abordar las dificultades que se tienen con el contratista de obra tendientes a la culminación del proyecto.

Es de resaltar que ediles, presidentes acción comunal y habitantes asistentes a la reunión se unen en un solo llamado para que la obra continúe y se lleve a feliz término, expresando total apoyo a la gestión Acuatodos S.A. E.S.P.

3/6

acuatodos s.a.
E.S.P.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.										
REGISTRO DE ASISTENCIA										
Nombre dependiente, responsable del proyecto o control (representante legal ante descentralizado)										
FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACUATODOS SA ESP	GERENCIA	TEMAS A TRATAR		
OBJETO	03	12	2024	HORA	1. Avance obra. Mayo - Fase 2					
					2	5				
					3	6				
					4	7				
					5	8				
No	NOMBRES Y APELLIDOS				ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO/e-mail	HORA	FIRMA
1	Leonardo Gamboa R				5938041	Independiente	300371846	lvgamboa@casanare.gov.co		
2	Wilfredo Hernandez				1118535687	Independiente	31023777			
3	Sebastián Timonés				2336379		310292388			
4	Hastha Roldán				4743485	Independiente	3509239047			
5	Jenny Roldán				74260000		3104694210			
6	Fanny Pardo				1116997114		3205302332			
7	Luis Miguel Gamboa				1591586	EPUL 7	3128681230			
8	Alfonso Moncalve				103113207	Industria	3134077570			
9	Hernando Guerrero				41572000		31027768			
10	Julio Cesar Caceres				Platónides	Gerente	3165826448			
11	Jorge Castellanos				Intercomunicación	RIC	3133710310			
12	Gustavo Hernández				6549688	Independiente	320235876			
OBSERVACIONES										

acuátodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUÁTODOS" S.A. E.S.P.										
REGISTRO DE ASISTENCIA										
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal ante el contratante)										
FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO	TELEFONO	CORREO e-mail	HORA	FIRMA
OBJETO	03	12	2024	8:00 am	Acuátodos SA ESP	TEMAS A TRATAR				
					1 Avance obra Mayor Foz de					
					2					
					3					
					4					
					5					
					6					
					7					
					8					
No	NOMBRES Y APELLIDOS				ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO e-mail	HORA	FIRMA
1	Margin Surtos Veland				23791567	Presidente	3123712	margin.surtos@acuatos.gov.co	7:30	Margen
2	Carilyn Sandoval				40380192	Edil Comunal	312573506	carilyn.sandoval@acuatos.gov.co	7:30	Carilyn
3	Maria Salgado				23588988	ama de casa	31254782		7:30	Maria
4	Martha Echeverry				29756596	ama de casa	310607399			Martha
5	Carlos Escobar Camacho				46195225	Guarida	322322654	carlos.camacho@acuatos.gov.co	07:30	Carlos
6	Maria Lilia Pacheco				23554479	ama de casa	312355056		07:59	Maria
7	Arlando Murillo				10664111	o.lund	310424936		8:00	Arlando
8	Vilfredo Medina				29355334		326771251			Vilfredo
9	Alfonso Palencio				10974449	profesor	311322268			Alfonso
10	Marta Dora Echeverry				29067321	ama de casa	322956930		7:30	Marta
11	Erika Patricia Sonzon				49556054	Independiente	3124451194	erika.sonzon@acuatos.gov.co	7:30	Erika
12	Karen Juliette Garcia R.				100247002	Independiente	312586462		7:30	Karen
OBSERVACIONES										

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN COMUNIDAD COMUNA 7 YOPAL EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024

A. OBJETO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048-2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN COMUNIDAD COMUNA 7 - YOPAL EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024



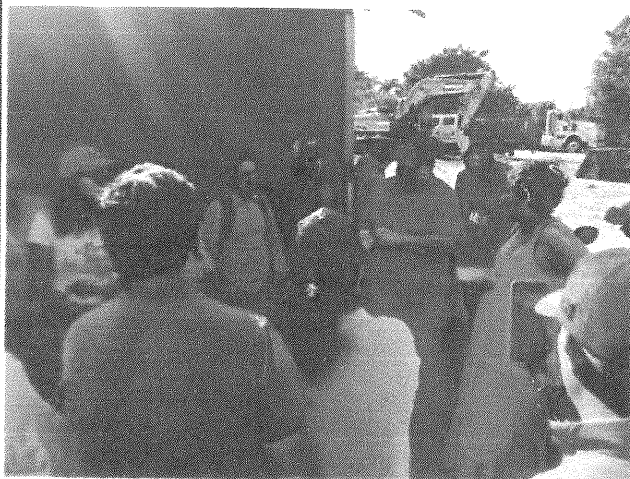
FECHA: 03/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD



FECHA: 03/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD



FECHA: 03/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD



FECHA: 03/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN COMUNIDAD

CONSORCIO INTER FASE 2

NIT: 901.791. 815-7

Yopal, 11 de diciembre de 2024

Ingeniero

ROBERT ASIS HERNANDEZ

Subgerente Técnico y operativo

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A E.S.P."

Yopal-Casanare

REFERENCIA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024, OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: Entrega de informe ejecutivo a corte 30 de noviembre de 2024

Cordial saludo,

Como interventoría contratada para el seguimiento y control del contrato de obra No. 048-2023, suscrito entre la empresa ACUATODOS SAESP y la empresa MOPEN SAS, presentamos el informe ejecutivo con corte al 30 de noviembre de 2024. Es importante destacar que, a la fecha, nos encontramos en proceso de revisión de la documentación entregada por el contratista para la elaboración del informe mensual correspondiente al mes de noviembre. Así mismo, continuamos recopilando la información perteneciente al contrato de consultoría No. 001 de 2024, necesaria para la elaboración del informe mensual de interventoría de dicho mes.

Sin otro particular,



JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

RL. CONSORCIO INTER FASE 2

CONSORCIO INTER FASE 2

NIT: 901.791. 815-7

Yopal, 11 de diciembre de 2024

Ingeniero

ROBERT ASIS HERNANDEZ

Subgerente Técnico y operativo

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A E.S.P."

Yopal-Casanare

REFERENCIA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024, OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: Entrega de informe ejecutivo a corte 30 de noviembre de 2024

Cordial saludo,

Como interventoría contratada para el seguimiento y control del contrato de obra No. 048-2023, suscrito entre la empresa ACUATODOS SAESP y la empresa MOPEN SAS, presentamos el informe ejecutivo con corte al 30 de noviembre de 2024. Es importante destacar que, a la fecha, nos encontramos en proceso de revisión de la documentación entregada por el contratista para la elaboración del informe mensual correspondiente al mes de noviembre. Así mismo, continuamos recopilando la información perteneciente al contrato de consultoría No. 001 de 2024, necesaria para la elaboración del informe mensual de interventoría de dicho mes.

Sin otro particular,



JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

RL. CONSORCIO INTER FASE 2

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.						
"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
CONTROL DE EJECUCIÓN						
PROGRAMADO				EJECUTADO		
	ACUMULADO				ACUMULADO	
Obra programada (%)	50.09%			Obra física ejecutada (%)	52.57%	
Valor de la obra programada con aju	\$ 11,736,667,389.36			Valor de la obra ejecutada con aju	\$ 12,318,025,295.05	
Diferencia en valor:				Diferencia en %:		
2.48%				2.48%		
Observación: Programación vigente de acuerdo a la prorroga No.1 suscrita el 28 de Agosto, por un plazo de cuatro (04) meses, proyectándose fecha de terminación de la obra el día 27 de diciembre de 2024.						
PROGRAMADO EJECUTADO 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 0.02% 0.38% 0.81% 1.31% 2.46% 11.47% 14.50% 26.74% 37.43% 50.09% 100.00% 0.02% 0.38% 0.81% 1.31% 2.46% 11.47% 14.50% 26.74% 40.51% 52.57%						
OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN						
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista:	MOPEN S.A.S			Contratista:	CONSORCIO INTER FASE 2	
Contrato No.	048 DE 2023			Contrato No.	001 DE 2024	
Valor inicial:	\$ 23,431,231,107.00			Valor inicial:	\$ 931,687,379.00	
Valor adicional:	\$ -			Valor adicional:	\$ -	
Valor actualizado:	\$ 23,431,231,107.00			Valor actualizado:	\$ 931,687,379.00	
Plazo inicial:	Seis (06) Meses			Plazo inicial:	Siete (07) Meses	
Fecha acta de iniciación:	29 de febrero de 2024			Fecha acta de iniciación:	5 de febrero de 2024	
Fecha terminación inicial:	28 de agosto de 2024			Fecha terminación inicial:	4 de septiembre de 2024	
Indicar con fecha prórrogas, suspensiones y reinicio en orden cronológicos				Indicar con fecha prórrogas, suspensiones y reinicio en orden cronológicos		
Prorroga No. 1	Veintiocho (28) de Agosto de 2024 cuatro (04) Meses			Prorroga No. 1	Cuatro (04) de Septiembre de 2024 cuatro (04) Meses	
Suspensión No.1	N/A			Suspensión No.1	N/A	
Tiempo de suspensión	N/A			Tiempo de suspensión	N/A	
Fecha prevista de Reinicio	N/A			Fecha prevista de Reinicio	N/A	
Plazo actual:	Diez (10) Meses			Plazo actual:	Once (11) Meses	
Fecha de terminación:	27 de diciembre de 2002			Fecha de terminación:	4 de enero de 2025	
Estado del contrato:	En ejecución			Estado del contrato:	En ejecución	
Avance financiero:	\$ 7,813,595,026.41			Avance financiero:	\$ -	
% Avance financiero	33.35%			% Avance financiero	0.00%	
Nota: Avance financiero se registra en relación al valor facturado acumulado pago actas parciales.						

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE
OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD 1	MM 12	AA 2024	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
					CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024
INFORMACIÓN VALOR CONTRATO DE OBRA No. 048 DE 2023						
Valor inicial contrato		\$23,431,231,107.00		Anticipo 50%	Valor	\$11,715,615,553.50
Adicional		\$0.00		Anticipo %	Valor	\$0.00
Total		\$23,431,231,107.00		Total		\$11,715,615,553.50
Pagos	No. Orden de pago / fecha	Valor facturado	Amortización anticipo		Valor facturado - amortización anticipo	
Parcial 1 (20/08/ 2024) - PERIODO del 29/02/2024 AL 15/08/2024		\$3,227,784,940.41	\$1,793,357,312.89		\$1,434,427,627.52	
Parcial 2 (17/10/2024) - PERIODO del 16/08/2024 AL 12/10/2024	OGR2024 00076	\$4,585,810,086.00	\$2,547,876,083.78		\$2,037,934,002.22	
Total		\$7,813,595,026.41	\$4,341,233,396.67		\$3,472,361,629.74	
Saldo por facturar		\$15,617,636,080.59	Saldo amortización anticipo		\$7,374,382,156.83	
INFORMEMANEJO DE ANTICIPO						
Indicar estado: El contratista de obra entregó la totalidad del informe de anticipo dentro del informe del acta Parcial de Obra No.1						
INFORMACIÓN VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2023						
Valor inicial contrato		\$931,687,379.00		Anticipo 50%	Valor	\$465,843,689.50
Adicional		\$0.00		Anticipo %	Valor	\$0.00
Total		\$931,687,379.00		Total		\$465,843,689.50
Pagos	No. Orden de pago / fecha	Valor facturado	Amortización anticipo		Valor facturado - amortización anticipo	
Parcial 1 (Fecha)- PERIODO del AL						
Total		\$0.00	\$0.00		\$0.00	
Saldo por facturar		\$931,687,379.00	Saldo amortización anticipo		\$465,843,689.50	
INFORME MANEJO DE ANTICIPO						
No se ha realizado entrega de informe de manejo de anticipo, se realizará entrega en el cobro del acta Parcial de Interventoría No.1						

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024
ACTAS TRAMITADAS CONTRATO DE OBRA No. 048 DE 2023						
No.	OBJETO	FECHA	VALOR SI APLICA	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIONES		
1	ACTA DE INICIO	29/02/2024				
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	29/02/2024	\$11,715,615,553.50			
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	20/08/2024	\$3,227,784,940.41			
4	SOLICITUD DE PRORROGA No. 1	28/08/2024		El contratista de obra realizó la solicitud de prorrogar del contrato ya que, durante el inicio de la obra se presentaron dificultades relacionadas con la falta de tubería, debido a la demora por parte del proveedor. Esta demora se ha visto afectada por problemas en las vías nacionales que conectan el departamento de Casanare con el resto del país, lo cual ha retrasado aún más la entrega de los suministros necesarios. Adicional a esto, se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades debido a condiciones climáticas adversas, específicamente intensas lluvias y precipitaciones en el área de influencia del proyecto en los últimos meses. Estas condiciones han afectado significativamente el progreso de las actividades planificadas, impidiendo el avance regular del proyecto y ocasionando retrasos respecto a la programación vigente. Motivo por el cual se aprobó dicha solicitud por parte de la interventoría y se suscribió la prorroga No.1 de fecha 08 de agosto de 2024 por cuatro meses.		
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2	17/10/2024	\$4,585,810,086.00			
ACTAS TRAMITADAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.						
No.	OBJETO	FECHA	VALOR SI APLICA	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIONES		
1	ACTA DE INICIO	5/02/2024				
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	5/02/2024	\$465,843,689.50			
3	SOLICITUD DE PRORROGA No. 1	4/08/2024		El contratista de obra realizó la solicitud de prorrogar del contrato ya que, durante el inicio de la obra se presentaron dificultades relacionadas con la falta de tubería, debido a la demora por parte del proveedor. Esta demora se ha visto afectada por problemas en las vías nacionales que conectan el departamento de Casanare con el resto del país, lo cual ha retrasado aún más la entrega de los suministros necesarios. Adicional a esto, se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades debido a condiciones climáticas adversas, específicamente intensas lluvias y precipitaciones en el área de influencia del proyecto en los últimos meses. Estas condiciones han afectado significativamente el progreso de las actividades planificadas, impidiendo el avance regular del proyecto y ocasionando retrasos respecto a la programación vigente. Motivo por el cual se aprobó dicha solicitud por parte de la interventoría y se suscribió la prorroga No.1 de fecha 08 de agosto de 2024 por cuatro meses.		

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024

CONTROL PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No. 048 DE 2023

Detalle	Aseguradora /No.	Vigencia		Fecha aprobación
		Desde	Hasta	
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	29-dic.-23	1-may.-25	20-ago.-24
Buen manejo y correcta inversión anticipo	SEGUROS DEL ESTADO	29-dic.-23	1-may.-25	20-ago.-24
Pago salarios, prestaciones sociales	SEGUROS DEL ESTADO	29-dic.-23	30-ago.-27	20-ago.-24
Estabilidad de la obra	SEGUROS DEL ESTADO	5 años, contados a partir de la entrega a satisfacción		20-ago.-24
Responsabilidad extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	29-dic.-23	30-ago.-24	20-ago.-24

Observaciones

Se actualizaron las pólizas con la suscripción del acta de Inicio de fecha 29 de febrero de 2024, la oficina asesora jurídica aprobó esas pólizas el día 20-ago.-24.

Actualmente se encuentra pendiente actualizar las garantías con la prorrogas No.1 por un plazo de cuatro meses, suscrita el 28-ago.-24, la interventoría ha solicitado en reiteradamente la actualización de las mismas, sin embargo el contratista no ha acatado los requerimientos.

CONTROL PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024

Detalle	Aseguradora /No.	Vigencia		Fecha aprobación
		Desde	Hasta	
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO	5-feb.-24	6-sep.-25	8-nov.-24
Buen manejo y correcta inversión anticipo	SEGUROS DEL ESTADO	5-feb.-24	6-sep.-25	8-nov.-24
Pago salarios, prestaciones sociales	SEGUROS DEL ESTADO	5-feb.-24	5-ene.-28	8-nov.-24
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	5-feb.-24	5-feb.-29	8-nov.-24

Observaciones

Se realizó la actualización de la póliza de cumplimiento con la suscripción de la prorrogas No.1 por un plazo de cuatro meses, suscrita el 04-sep.-24, la oficina asesora jurídica aprobó estas pólizas el día 8-nov.-24.

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024
SEGUIMIENTO AL PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 048 DE 2023						
0. REPRESENTANTE LEGAL						
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
JUAN JOSE CEPEDA PEREZ		74,860,917		Ing. Industrial		
1. DIRECTOR				DEDICACIÓN	50%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO		7,182,173		Ing. Civil - Esp. en Aguas y Saneamiento Ambiental	N/A	
2. RESIDENTE DE OBRA				DEDICACIÓN	100%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
ANDREA DEL PILAR RAMIREZ PEÑA		46,452,337		In. Civil	N/A	
3. PROFESIONAL AMBIENTAL				DEDICACIÓN	30%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
MILTON JOHANY ORTIZ SIERRA		1,098,717,607		Ing. Ambiental	Comité de fecha 29-feb.-24	
4. PROFESIONAL SG - SST				DEDICACIÓN	20%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
CARLOS ANDRES LADINO GIRALDO		17,357,726		Ing. Industrial	N/A	
5. PROFESIONAL ÁREA SOCIAL				DEDICACIÓN	20%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
ARMIDA REYES ACEVEDO		62,332,049		Ing. Industrial	N/A	
6. INSPECTOR DE OBRA				DEDICACIÓN	100%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
YORMAN HERNANDO ROJAS PUCHIGAY		1,116,545,333		Tecnólogo en obras civiles	N/A	
7. ESP. HIDRAULICA				DEDICACIÓN	20%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
CARLOS ANDRES CRISTANCHO		9,432,237		Ing. Civil - Esp. en Aguas y Saneamiento Ambiental	N/A	
8. ESP. GEOLOGIA				DEDICACIÓN	20%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ		74,187,852		Ing. Civil - Esp. en Geotecnia Vial y Pavimentos	N/A	

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024
SEGUIMIENTO AL PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024						
0. REPRESENTANTE LEGAL						
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA		9.399.267		Ing. Civil - Esp. en Aguas y Saneamiento Ambiental	N/A	
1. DIRECTOR				DEDICACIÓN	50%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA		9.399.267		Ing. Civil - Esp. en Aguas y Saneamiento Ambiental	N/A	
2. RESIDENTE DE OBRA				DEDICACIÓN	86%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
ERIKA YERALDIN MARTINEZ GAMBOA		1,115,857,255		Ing. Civil	N/A	
3. RESIDENTE AMBIENTAL				DEDICACIÓN	86%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
VILMAR ENRIQUE GAMEZ ROJAS		80,765,529		Ing. Sanitario y Ambiental	N/A	
4. SEGURIDAD EN SALUD Y GESTION SOCIAL				DEDICACIÓN	86%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
DEISY GALLEGO CASTELLANOS		39,584,015		Ing. Ambiental - Esp. Seguridad y salud en el trabajo	N/A	
5. ESPECIALISTA GEOTECNIA				DEDICACIÓN	15%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
JESUS NARANJO MESA		80,019,489		Ing. Civil - Esp. en Geotecnia Vial y Pavimentos	N/A	
6. ESPECIALISTA HIDRAULICO				DEDICACIÓN	15%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
YONATHAN DAVID REYES LOPEZ		1,118,540,590		Ing. Civil - Esp. en Hidráulica y Ambiental	N/A	
7. INSPECTOR DE OBRA				DEDICACIÓN	86%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
NESTOR ALI GONZALEZ		91,111,276		Ing. Civil	Solicitud de fecha 5-Mar.-24	
8. INSPECTOR DE OBRA				DEDICACIÓN	86%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
DIEGO FERNANDO BOLAÑOS		1,118,563,607		Ing. Civil	Solicitud de fecha 5-Mar.-24	
9. INSPECTOR AMBIENTAL				DEDICACIÓN	86%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
LUIS ALBERTO MEJIA MOLINA		8,058,277		Tecnólogo Ambiental	N/A	
10. INSPECTOR AMBIENTAL				DEDICACIÓN	86%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
HECTOR LIZANDRO OROZCO CADAVID		1,035,224,383		Tecnólogo Ambiental	N/A	

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD 1	MM 12	AA 2024	CONTRATO OBRA No. CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	048 de 2023 001 de 2024
SEGUIMIENTO AL PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024						
11. PROFESIONAL EN CONTADURIA				DEDICACIÓN	16%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
JHONNY DELGADO AMAYA		1,007,197,029		Contador Publico	N/A	
12. PROFESIONAL EN DERECHO				DEDICACIÓN	10%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
TOMAS HERNANDO ROA HOYOS		1,118,532,754		Abogado	N/A	
13. SECRETARIA				DEDICACIÓN	100%	
Nombre		CC		Profesión	Documento/Fecha de aprobación cambio profesional	
ANGELICA GONZALEZ LAVERDE		1,118,538,842		Administrador de Empresas	N/A	
CONTROL PRESENTACIÓN INFORMES MENSUALES CONTRATO DE OBRA No. 048 DE 2023						
No.	PERIODO		ESTADO (NO PRESENTADO- PRESENTANDO -PUBLICADO)	OBSERVACIONES (INDICAR SI ENTREGAN SOPORTES DE PAGO SS DEL PERSONAL VINCULADO Y NÓMINAS) - SI FALTA INFORMACIÓN		
	INICIO	CORTE				
1	29-feb.-24	31-mar.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
2	1-abr.-24	30-abr.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
3	1-may.-24	31-may.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
4	1-jun.-24	30-jun.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
5	1-jul.-24	31-jul.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
6	1-ago.-24	31-ago.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	CON SEGURIDAD SOCIAL		
7	1-sep.-24	30-sep.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	CON SEGURIDAD SOCIAL		
8	1-oct.-24	31-oct.-24		CON SEGURIDAD SOCIAL		
CONTROL PRESENTACIÓN INFORMES MENSUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001 DE 2024						
No.	PERIODO		ESTADO (NO PRESENTADO- PRESENTANDO Y/O -PUBLICADO)	OBSERVACIONES (INDICAR SI ENTREGAN SOPORTES DE PAGO SS DEL PERSONAL VINCULADO Y NÓMINAS) - SI FALTA INFORMACIÓN		
	INICIO	CORTE				
0	PRECONSTRUCTIVO		PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
1	29-feb.-24	31-mar.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
2	1-abr.-24	30-abr.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
3	1-may.-24	31-may.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
4	1-jun.-24	30-jun.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
5	1-jul.-24	31-jul.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
6	1-ago.-24	31-ago.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
7	1-sep.-24	30-sep.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		
8	1-oct.-24	30-oct.-24	PRESENTADO SIN PUBLICAR	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EXTEMPORANEO		

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024
RELACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO						
No.	FECHA	TEMAS TRATADOS				
1	9-feb.-24	*Presentación de las partes (Apoyo a la supervisión e Interventoría. *La supervisión solicita a la interventoría la copia de las afiliaciones del personal. *Se informa a la Interventoría que se deben presentar informes semanales, quincenales y mensuales.				
2	21-feb.-24	* El apoyo a la supervisión Solicita aportar memorial de responsabilidad de la revisión de los estudios y diseños y demás componentes que hacen parte de la etapa Preconstructiva, que deberá ser suscrito por el Representante legal y el director del contrato de consultoría NO. 001 de 2024. *Se solicita la corrección de los porcentajes de dedicación del personal de interventoría, el cual debe ser de acuerdo a los porcentajes indicados en la propuesta.				
3	29-mar.-24	CONTRATO DE OBRA No. 048 DE 2023 - Personal de la obra contratada - Relevo de personal: Ingeniero ambiental: *Análisis de la solicitud *Proposiciones y varios				
4	1-mar.-24	Socializar el proyecto en mención con la comunidad de los barrios a intervenir.				
5	4-mar.-24	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 - Personal de la interventoría contratada - Relevo de personal: Inspector 1 y 2 de la interventoría: *Análisis de la solicitud *Proposiciones y varios				
6	19-mar.-24	* La supervisión solicita el inicio inmediato a la elaboración de las actas de vecindad. * Se informa por parte del contratista que se encuentran realizando la afiliación del personal encargado para el levantamiento de las actas de vecindad. * La interventoría informa que el contratista se encuentra realizando actividades de localización y replanteo de los colectores de alcantarillado. * El contratista manifiesta que se presentan demoras con el despacho de la tubería PEAD de alcantarillado por parte del proveedor. * La supervisión solicita a la interventoría realizar seguimiento Juicioso del avance de las actividades. * De común acuerdo se establece como primer periodo de avance para informes mensuales del 29 de febrero al 32 e marzo de 2024.				
7	8-abr.-24	*Se realiza revisión de las acciones adelantadas por la interventoría. *Se verificar el estado actual del proyecto (Avance y otros). *Se solicita el pago de seguridad social por parte del contratista de obra. *Se solicita la entrega oportuna del de formato de avance Gesproy.				
8	16-abr.-24	*Se realiza la socialización del proyecto. *Se hace entrega de documentación solicita según lo requerido en el comunicado 202420991				
9	7-may.-24	*Se realiza la verificación de avance de ejecución de obra a la fecha. *Se solicita la seguridad social del personal del contratista de obra y la actualización de las garantías del contrato de obra 048 de 2023, según acta de inicio de 29 de febrero de 2024. * La supervisión requiere los informes mensuales pendientes de marzo y abril de 2024.				
10	21-may.-24	*Se realiza verificación del avance de ejecución de obra a la fecha. *La interventoría reitera al contratista la solicitud de actualización de las pólizas y el pagos de seguridad social del personal vinculado al cto 048 de 2023. *La supervisión requiere los informes mensuales tanto al contratista de obra como al interventor.				
11	30-may.-24	*La supervisión Realiza la verificación del stock de inventario de tuberías y materiales disponibles en campo para la ejecución de las actividades de instalación de tubera. *Se realizar la verificación de avance de ejecución de obra a la fecha en campo. *La interventoría Solicita nuevamente entrega de la seguridad social del personal del contratista de obra y la actualización de las garantías del contrato de obra No. 048 - 2023, según acta de inicio de fecha 29 de febrero de 2024.				
12	12-jun.-24	*Se realiza verificación del avance de ejecución de obra a la fecha. *Intervención del representante de la comunidad, quien solicita celeridad en la ejecución de las actividades debido a que se han generado atrasos constantes . * Intervención del Secretario general en la que le solicita a la interventoría y a la supervisión ser garantes de la correcta ejecución de las obras y la oportuna respuesta a la comunidad con respecto a las solicitudes, quejas y reclamos.				

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024
RELACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO						
No.	FECHA	TEMAS TRATADOS				
13	26-jun.-24	*Se realiza la verificación de avance de ejecución de obra a la fecha en campo. *La supervisión solicita nuevamente entrega de la actualización de las garantías del contrato de obra No. 048 - 2023, según acta de inicio de fecha 29 de febrero de 2024. *La interventoría manifiesta que el contratista se encuentra atrasado con la entrega de los informes mensuales de los meses de Abril y Mayo y el plan de contingencia anteriormente solicitado en el anterior comité. * La supervisión solicita un aumento de cuadrillas a fin de nivelar los atrasos.				
14	25-jul.-24	Realizar la verificación de Avance de ejecución de obra a la fecha en campo. Solicitud de cumplimiento de compromisos pendientes.				
15	29-jul.-24	*La supervisión solicita la entrega de los informes mensuales pendientes, de obra e interventoría, así como la actualización de la póliza del cto de obra con el acta de inicio. *El contratista de obra solicita que se evalúe la posibilidad de prorrogar el contrato de obra, toda vez que los atrasos presentados han sido causado por demoras con los proveedores y las adversidades del clima.				
16	15-ago.-24	*Se da a conocer el proyecto y el estado de avance al secretario de gobierno del Municipio de Yopal y se establece un seguimiento de la ejecución de actividades en pro de mejorar la calidad de vida de la comunidad.				
17	12-sep.-24	*Se evalúa el estado actual del contrato donde se presenta un avance del 14.5%. * La supervisión Solicita al contratista la reprogramación de obra con la prórroga No.1. *La supervisión Solicita la actualización de las pólizas al contratista de obra e interventoría con la prórroga No.1				
18	18-sep.-24	*A la fecha la obra se está ejecutando con un muy bajo rendimiento, debido a la presencia de pocos frentes de trabajo, con apenas 2 cuadrillas laborando (una en Bosques de Achagua y otra en Getsemani). *Se reitera por parte de la supervisión, las planillas pagadas de la seguridad social del personal de obra interventoría, el cual deberá allegarse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la presente fecha. *Con relación a la Prorroga No 01 del contrato de obra No 048 de 2023 y Prorroga No 01 del contrato de consultoría No 001 de 2024, la supervisión reitera una vez más, que sean actualizadas las pólizas de conformidad con los administrativos suscritos. *Se solicita la reprogramación de obra actualizada con la prórroga No.1				
19	26-sep.-24	*Se verifica el avance de obra, a la fecha se encuentra en un 21.% de ejecución. *Se reitera por parte de la supervisión, las planillas pagadas de la seguridad social del personal de obra interventoría, el cual deberá allegarse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la presente fecha. *Con relación a la Prorroga No 01 del contrato de obra No 048 de 2023 y Prorroga No 01 del contrato de consultoría No 001 de 2024, la supervisión reitera una vez más, que sean actualizadas las pólizas de conformidad con los administrativos suscritos. *Se solicita la reprogramación de obra actualizada con la prórroga No.1 *Se solicita al radicación de informes mensuales pendientes.				
20	24-oct.-24	* Presentación de los asistentes por parte de interventoría y supervisión, presentación de los asistentes por parte de la comunidad. * El gerente de acuatodos da conocer los componentes principales y el estado actual del contrato de obra 048 de 2023; del mismo modo expone las acciones realizadas por parte de la supervisión para lograr la total ejecución de las obras. *Los integrantes de la comunidad solicitan priorizar los servicios básicos de acueducto y alcantarillado, antes de la ejecución de obras complementarias. * Los representantes de la comunidad solicita realizar reunión en el sitio de la obra donde puedan asistir la totalidad de habitantes del sector, la reunión queda pactada para el 29 de octubre a las 9:00 am.				
21	30-oct.-24	* Presentación de los asistentes por parte de interventoría y supervisión, presentación de los asistentes por parte de la comunidad. * Exposición de problemáticas por parte de la comunidad. *Solicitud de priorización de las obras de la red de acueducto por parte Ediles de la comuna VII, de tal forma que se garantice el suministro e agua potable en los barrios Getsemani y Salomé II. * La supervisión da a conocer a la comunidad el seguimiento que se viene haciendo a la ejecución del contrato 048 de 2023 y que se realizará una mesa técnica para garantizar el inicio de la construcción de la red de acueducto.				

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024

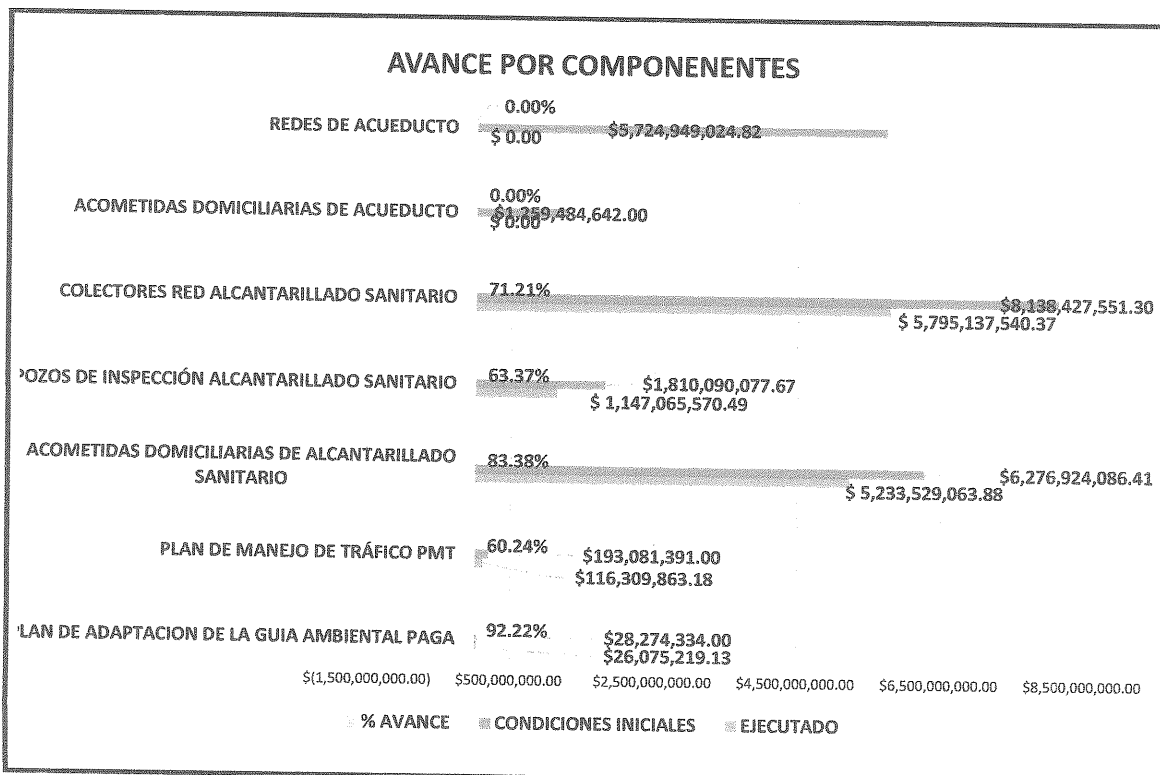
LOS COMITÉS DEBEN TENER TEMÁTICA QUE REFLEJE SEGUIMIENTO EN LOS COMPONENTES:

TÉCNICO
JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
AMBIENTAL

CONTROL COMPONENTE AMBIENTAL

	SI O NO	OBSERVACIONES
1 CUMPLIMIENTO PAGA	SI	Se lleva control del cumplimiento del Plan de adaptación para la guía Ambiental, Mediante presentación de informes mensuales de cumplimiento ambiental
2 PERMISOS AMBIENTALES	NO	El proyecto no requiere permisos ambientales
2.1 OCUPACIÓN DE CAUCE	NO	El proyecto no requiere permisos de ocupación de cauce
2.2 EXPLORACIÓN	NO	El proyecto no requiere permisos de exploración
2.3 APROVECHAMIENTO FORESTAL	NO	El proyecto no requiere permiso de aprovechamiento forestal

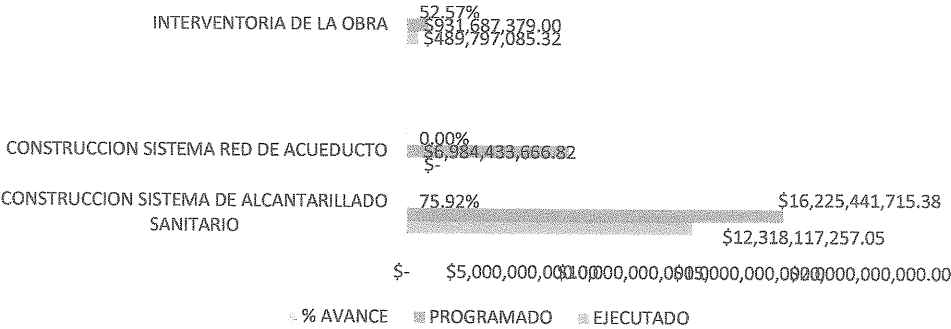
GRAFICO DE AVANCE X COMPONENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO MODIFICATORIA VIGENTE
(VALOR COSTO DIRECTO +AIU DE CADA COMPONENTE VS VALOR EJECUTADO ACUMULADO DEL COMPONENTE)



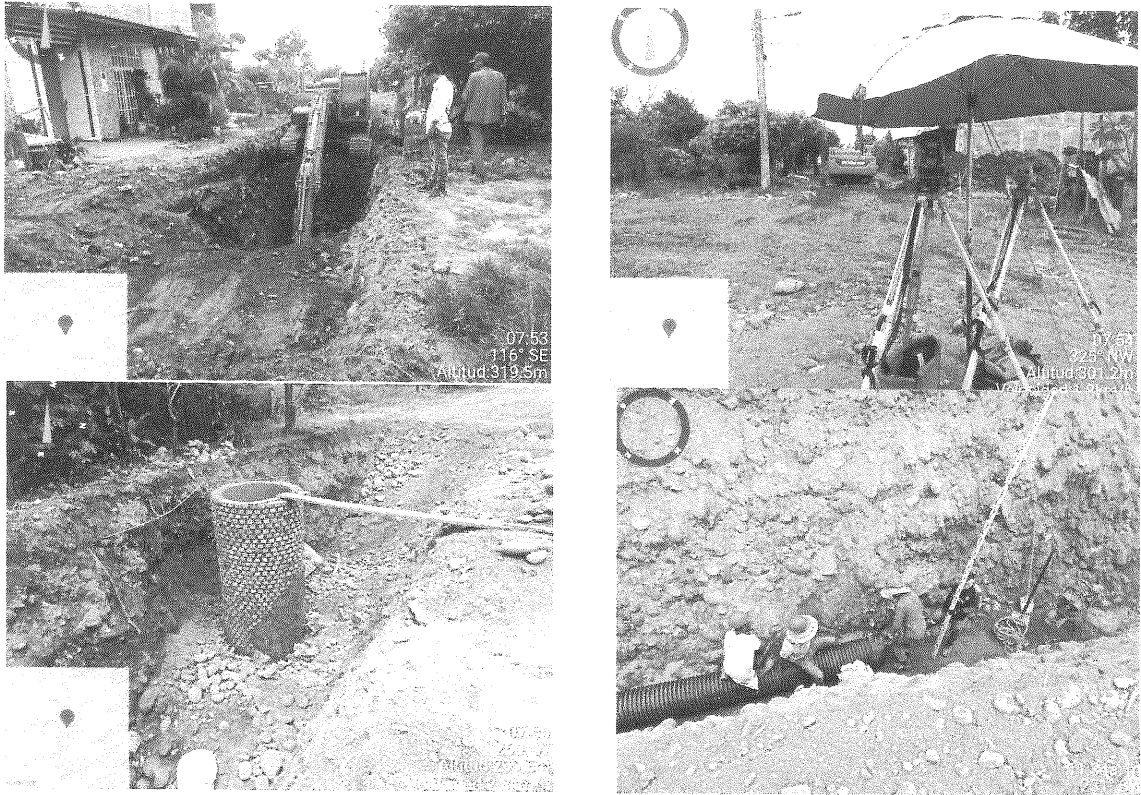
INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE
OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024

AVANCE DEL PROYECTO



REFISTRO FOTOGRAFICO



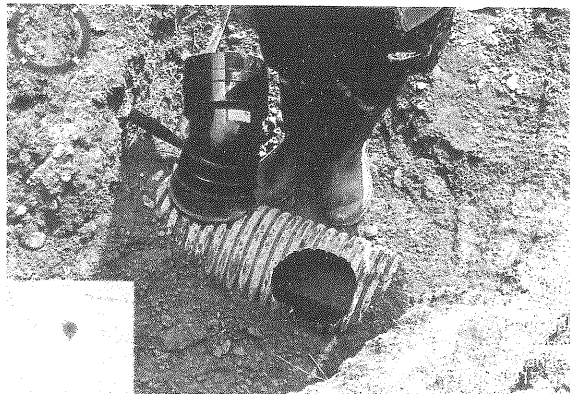
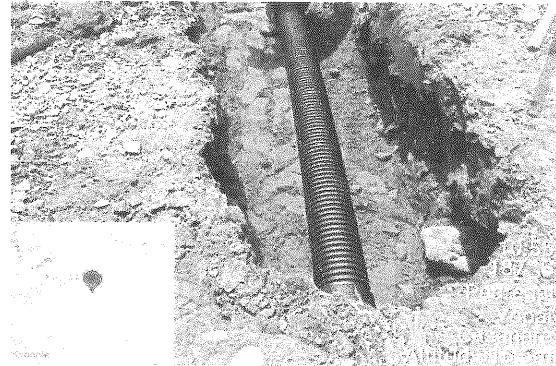
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y POZOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024

REFISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE

OBRA - INTERVENTORIA

HOJA de	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO OBRA No.	048 de 2023
		1	12	2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	001 de 2024

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

A corte del 30 de noviembre de 2024, el contrato de obra 048 de 2023 se encuentra en ejecución, con un plazo restante de 27 días para su finalización. El avance físico del proyecto se encuentra en un 52,57%, quedando por ejecutar un 47,43%. En cuanto a los capítulos del contrato, se ha logrado un avance del 75.92% en el capítulo 2.0, correspondiente a la "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario", mientras que en el capítulo 1.0, "Construcción del sistema de acueducto", no se

Ante esta situación, el contratista ha solicitado una segunda prórroga del contrato, argumentando que la construcción de las acometidas sanitarias pendientes y la red de acueducto con sus acometidas en sectores altamente habitados, con andenes construidos y zonas duras, presenta desafíos operativos. En dichas áreas, el espacio reducido para el tránsito de maquinaria ha generado una disminución en los rendimientos de excavación e instalación de tuberías. Por ello, se considera necesario evaluar la viabilidad.



130.20.10. **1274**

Yopal, 11 diciembre 2024

Arquitecto
Oscar Alberto González Hernández
Consultor Técnico
Departamento Nacional de Planeación
Oficina Regional Llano
E-mail: oscgonzalez@dnp.gov.co

ASUNTO: ESTADO ACTUAL PROYECTO BPIN 2023005850054

REFERENCIA: RESPUESTA RADICADO 1602 DEL 06/12/2024 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROYECTO BPIN 2023005850054 CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la información solicitada vía correo electrónico de fecha 06 de diciembre de 2024 (Radicado 1602) en donde requieren la siguiente información del proyecto BPIN 2023005850054:

1. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DERIVADOS
2. COPIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
3. REGISTROS PRESUPUESTALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS
4. CRONOGRAMA INICIAL DE OBRA. VALIDADO POR INTERVENTORÍA
5. CRONOGRAMA ACTUALIZADO. VALIDADO POR INTERVENTORÍA
6. ACTOS ADMINISTRATIVOS COMPLETOS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS (ACTAS DE INICIO, SUSPENSIONES, REINICIOS, PRÓRROGAS, ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACTAS PARCIALES, ETC)
7. PLANES DE INVERSIÓN DE ANTICIPO
8. LIQUIDACIÓN DE LA FIDUCIA Y PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (EN CASO DE HABERSE REALIZADO)
9. INFORMES MENSUALES COMPLETOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN
10. INFORME DE ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN, VALIDADO POR LA INTERVENTORIA



11. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD Y COMITES DE SEGUIMIENTO Y/O SOCIALIZACION DE AVANCE EN CASO DE EXISTIR.
12. PLANES DE CONTINGENCIA Y/O MEJORA EN CASO DE EXISTIR
13. POLIZAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

La información se suministra mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1KS0kHtlU3Q0_vRSD1ulhyUh9jWEmywpW?usp=sharing

Cordialmente,


JULIO CÉSAR QUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General


ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo


Proyectó: **JORGE IVAN MINAYA PULGARÍN**
Profesional - Subgerencia Técnica y Operativa

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Destinatario

Copia: Archivo



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

ESTADO ACTUAL PROYECTO BPIN 2023005850054

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>
Para: oscgonzalez@dnf.gov.co

12 de diciembre de 2024, 14:41

130.20.10. **1274**

Yopal, 11 diciembre 2024

Arquitecto
Oscar Alberto González Hernández
Consultor Técnico
Departamento Nacional de Planeación
Oficina Regional Llano
E-mail: oscgonzalez@dnf.gov.co

ASUNTO: ESTADO ACTUAL PROYECTO BPIN 2023005850054

REFERENCIA: RESPUESTA RADICADO 1602 DEL 06/12/2024 -
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROYECTO BPIN 2023005850054
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE
CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la información solicitada vía correo electrónico de fecha 06 de diciembre de 2024 (Radicado 1602) en donde requieren la siguiente información del proyecto BPIN 2023005850054:

1. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DERIVADOS
2. COPIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
3. REGISTROS PRESUPUESTALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS
4. CRONOGRAMA INICIAL DE OBRA. VALIDADO POR INTERVENTORÍA
5. CRONOGRAMA ACTUALIZADO. VALIDADO POR INTERVENTORÍA
6. ACTOS ADMINISTRATIVOS COMPLETOS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS (ACTAS DE INICIO, SUSPENSIONES, REINICIOS, PRÓRROGAS, ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACTAS PARCIALES, ETC)
7. PLANES DE INVERSIÓN DE ANTICIPO
8. LIQUIDACIÓN DE LA FIDUCIA Y PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (EN CASO DE HABERSE REALIZADO)
9. INFORMES MENSUALES COMPLETOS DE OBRA, INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fecha	DD 13	MM 12	AA 2024	MUNICIPIO Yopal	CONTRATO DE OBRA No. 048-2023
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.					
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)					
DE VISITA DE CAMPO					
SUMINISTRO ☐ DISEÑO Y CONSULTORIA ☒ CONSTRUCCION ☐ OTRA ☐ CUAL ☐					
A. OBJETO					
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".					
B. LUGAR DE LA REUNIÓN					
Sitio de la obra.					
C. PARTICIPANTES Y/O REPRESENTANTES					
CARGO					
Alejandro Galvis Canfo Jorge Luis Minayo P. Jairo Castrejon Miguel A. Hernandez Kevin A. Verduga			Prof. de la Oficina de Planeación Prof. Apoyo Acuatodos S.A. E.S.P. PL- INTER FASE 2 Rest Contratista Prof. Apoyo		
D. COMENTARIOS GENERALES DE LA VISITA					
Se hace presentación de los asistentes representantes Banco proyectos gobernación, Acuatodos, contratista de obra e interventoria. Se informa por parte de interventoria que se tiene un avance con corte al 30 Nov 2024 del 52,57% y avance financiero dos parciales con acumulado facturado del 33,35%. Se evidencio en terreno cuatro frentes de trabajo distribuidos de la siguiente manera: 1. Instalación tubería polietileno 10" barrio gotsermani. 2. Tres frentes de acometidas barrio Xumo tubería polietileno 6"					

A. OBJETO

D. COMENTARIOS GENERALES DE LA VISITA

Por parte de intervinientes y contratista obra manifiestan la necesidad de solicitar una prórroga.

Se hace la recomendación de mejorar señalización y hacer énfasis sobre el uso de elementos de protección personal en obras.

A. OBJETO

E. CONCLUSIONES FINALES Y/O COMPROMISOS

obra en ejecución con necesidad de solicitar prórroga

F. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

DÍA

MES

AÑO

HORA

(AM-PM)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en

Trece Pápa a los
(Escriba el lugar)

Trece
(Escriba en letras el día)

(13)
(número)

días del mes de

Diciembre
(Escriba el mes)

de

2024
(Escriba el año)

Alexandra Galus Campos




JOSEE CASTAÑEDA



Miguel A. Hernández



Kevin A. Verdugo



Jorge I. Mayas

acuatosos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.									
REGISTRO DE ASISTENCIA									
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)									
FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	GERENCIA	TEMA A TRATAR	HORA	FIRMA
OBJETO	13	12	2024	B.00 AM	1. Estado Avance obra	5			
Contrato de obra	048	2023	Fase 2	(comuna)	2	6			
					3	7			
					4	8			
No	NOMBRES Y APELLIDOS			ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO/e-mail	HORA	FIRMA
1	Alexandra Galus (amb.)			Gobernación	Asesoría	3219777777	alexandra.galus@gmail.com		
2	Jorge Carlos (amb.)			RLC	RLC	3133750310	siestas@esca		
3	Jorge Luis Mina			Asesoría	Prof. Apoyo	3103108007	minajorge@gmail.com		
4	Miguel A. Hernandez			Mopendos	Residente	3102595733	miguel.hernandez@gmail.com		
5	Kevin A. Verdugo			Mopendos	Prof. Apoyo	321932521	kevin123verdugo@gmail.com		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
OBSERVACIONES									

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN COMUNIDAD COMUNA 7 YOPAL EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024

A. OBJETO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048-2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN BANCO PROYECTOS GOBERNACIÓN COMUNA 7 - YOPAL EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2024



FECHA: 13/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN BANCO PROYECTOS GOBERNACIÓN

FECHA: 13/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN BANCO PROYECTOS GOBERNACIÓN



FECHA: 13/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN BANCO PROYECTOS GOBERNACIÓN

FECHA: 13/12/2024

DESCRIPCION: REUNIÓN BANCO PROYECTOS GOBERNACIÓN

130.26- 1280

Yopal, Casanare 16 de diciembre de 2024

Doctor.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARZAL

Contraloría General de la República

luisa.hernandez@contraloria.gov.co

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 Y CONTRATO No. 001 DE 2024 PROYECTO BPIN: 2023005850054 - RADICADO INTERNO 1616

En atención al asunto en referencia me permito dar alcance a la solicitud allegado mediante correo electrónico con radicado interno 1616 de fecha 10 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la Republica de "INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 Y CONTRATO No. 001 DE 2024 de acuerdo a formato anexo en medio magnético conforme a lo siguiente:


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 001 de 2024: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5305187&isFromPublicArea=True&isModal=False>

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367785&isFromPublicArea=True&isModal=False>


No siendo otro el particular.



JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General



Aprobó: **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
Subgerente Técnico y Operativo



Elaboró: **JORGE IVAN MINAYA PULGARIN**
Profesional de Apoyo.

Gestión Documental:
Original: Destinatario
Copia: Archivo



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 Y CONTRATO No. 001 DE 2024 PROYECTO BPIN: 2023005850054 - RADICADO INTERNO 1616

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

16 de diciembre de 2024, 16:46

Para: luisa.hernandez@contraloria.gov.co

Cc: controlinterno controlinterno <controlinterno@espacuatodos.gov.co>

130.26-1280

Yopal, Casanare 16 de diciembre de 2024

Doctor.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARZAL

Contraloría General de la República

luisa.hernandez@contraloria.gov.co

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 Y CONTRATO No. 001 DE 2024 PROYECTO BPIN: 2023005850054 - RADICADO INTERNO 1616

En atención al asunto en referencia me permito dar alcance a la solicitud allegado mediante correo electrónico con radicado interno 1616 de fecha 10 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República de "INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 Y CONTRATO No. 001 DE 2024 de acuerdo a formato anexo en medio magnético conforme a lo siguiente:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 001 de 2024: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5305187&isFromPublicArea=True&isModal=False>

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5367785&isFromPublicArea=True&isModal=False>

No siendo otro el particular.

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

Aprobó: ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

Subgerente Técnico y Operativo

Elaboró: JORGE IVÁN MINAYA PULGARÍN
Profesional de Apoyo.

Gestión Documental:

Original: Destinatario

Copia: Archivo

Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL

gerencia@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

2 adjuntos



BPIN 2023005850054 FASE 2 Ficha Postulaciones CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO.xlsx
638K



1280-RESPUESTA SOLICITUD INFORMACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.pdf
302K

Fwd: Solicitud Información CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 044 DE 2022 Y Contrato No. 046 de 2022 URGENTE

De: Subgerencia Tecnica (subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co)

Para: jiminaya@yahoo.es

CC: controlinterno@espacuatodos.gov.co

Fecha: lunes, 16 de diciembre de 2024, 09:37 GMT-5

Proceder con respuesta

----- Forwarded message -----

De: **Contactenos Espacuatodos** <contactenos@espacuatodos.gov.co>

Date: mié, 11 dic 2024 a las 8:06

Subject: Fwd: Solicitud Información CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 044 DE 2022 Y Contrato No. 046 de 2022 URGENTE

To: Subgerencia Tecnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>, controlinterno controlinterno <controlinterno@espacuatodos.gov.co>

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

GERENTE GENERAL

contactenos@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

----- Forwarded message -----

De: **Luis Alberto Hernandez Marzal (CGR)** <luisa.hernandez@contraloria.gov.co>

Date: mié, 11 dic 2024 a las 7:44

Subject: Solicitud Información CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 044 DE 2022 Y Contrato No. 046 de 2022 URGENTE

To: contactenos@espacuatodos.gov.co <contactenos@espacuatodos.gov.co>, csinternororiental@gmail.com <csinternororiental@gmail.com>, csomacronororiental@gmail.com <csomacronororiental@gmail.com>

Buenos días, la presente tiene por objeto nos remita la información de acuerdo a formato anexo; relacionada con el CONTRATO No 048 DE 2023 CON EL OBJETO DE construcción de la fase II de la Ampliación de acueducto y alcantarillado sanitario y obras complementarias entre los sectores de la calle 40 y calle 55 y entre carreras 30 y diagonal 50.

Y el Contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA del contrato mencionado, así como el enlace SECOP de los mismos.

Ruego a usted que esta información sea enviada con extrema urgencia (El día de Hoy) por este medio.

El incumplimiento a la presente solicitud podrá dar lugar a sanciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 a 104 de la Ley 42 de 1993, "Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen" y el parágrafo segundo del artículo 114 de la Ley 1474 de 2011, declarados exequibles por la Sentencia C-209 de 2023.

La información solicitada deberá enviarse por este medio al correo luisa.hernandez@contraloria.gov.co.



CONTRALORÍA

General de la República

LUIS ALBERTO HERNANDEZ MARZAL

Coordinador de Gestión G – 01 (E)

Gerencia departamental colegiada de Casanare

Tel: (601) 5187000 ext. 23800 - 3125114525

luisa.hernandez@contraloria.gov.co

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

--

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

Subgerente Técnico y Operativo

ACUATODOS S.A. E.S.P.

(8) 6341324

subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co

Carrera 19 No. 6 - 100, Edificio Emiro Sossa Pacheco - 3er piso



Ficha Postulaciones CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO rv (1).xlsx
635.6kB



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

PROYECTO BPIN: 2023005850054 – FOTOS INICIALES Y EN EJECUCIÓN FASE 2 YOPAL

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

23 de diciembre de 2024, 10:00

Para: luisa.hernandez@contraloria.gov.co

Cc: controlinterno controlinterno <controlinterno@espacuatodos.gov.co>, Subgerencia Tecnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

Cordial saludo,

Me permito enviar fotos iniciales y en ejecución del proyecto en referencia.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 001 de 2024: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE



28/05/2024 8:01:22 a. m.
350° N
Altitud:315.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 137

Google



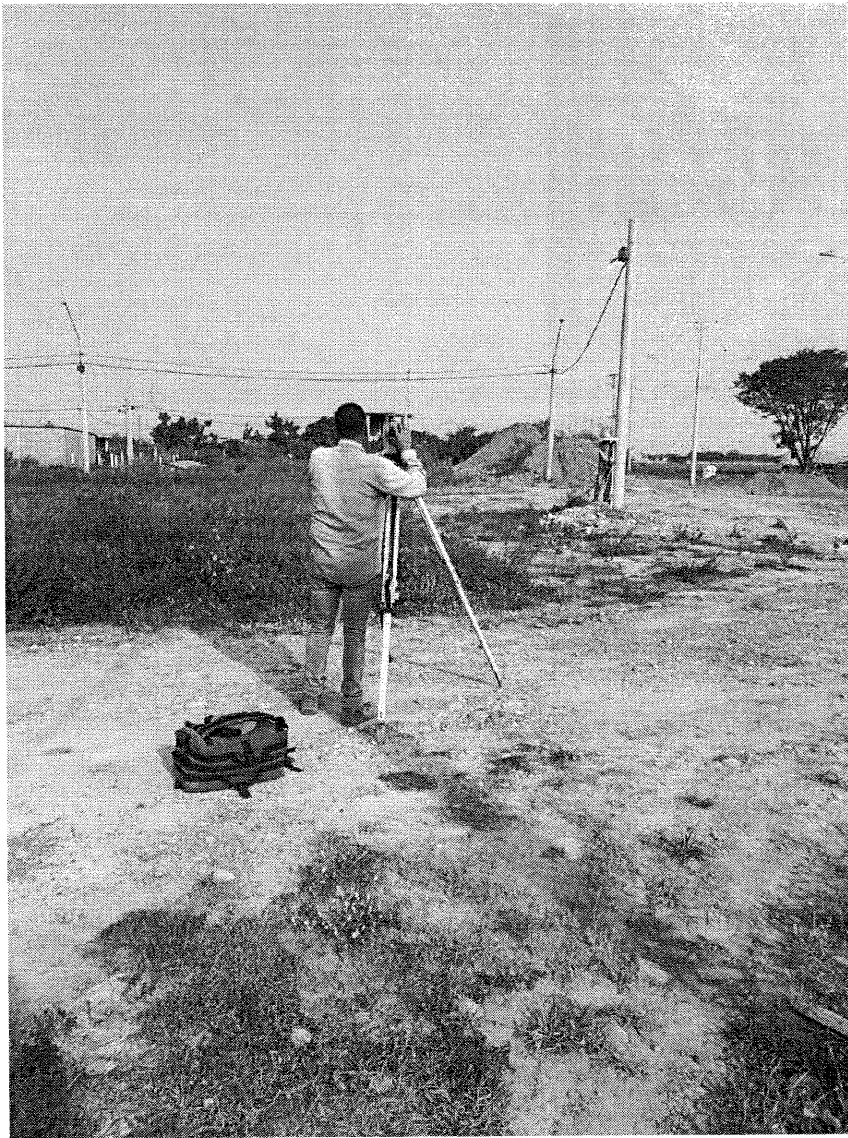
FASE 2 EJECUCIÓN FOTO 4.jpg





23/03/2024 8:43:28 a. m.
275° W
Calle 42
Pedregal
Yopal
Casanare
Altitud: 323.7m
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 27







Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

GERENTE GENERAL

gerencia@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

110.10- 1328 - - - -

Yopal, Casanare 24 de diciembre de 2024

Señor

WILSON GOMEZ SALAMANCA

Presidente Veeduría Comuna 7

wilsongomezinmmobiliaria@gmail.com

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023
PROYECTO BPIN: 2023005850054 - RADICADO INTERNO 1638 **FECHA 16/12/2024**


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

En atención a la solicitud de información del contrato en referencia nos permitimos indicar que bajo certificación expedida por interventoría se posee un avance con corte al 30 de Noviembre de 2024 del 52,57% (Ver anexo No. 1), así mismo se adjunta programación de obra vigente (**Ver anexo No. 2**).


El estado actual de la obra es en ejecución; el día 13 de diciembre se efectuó visita conjunta con profesionales adscritos a banco de proyectos gobernación de Casanare, Acuatodos SA ESP, contratista de obra e interventoría identificando cuatro frentes de trabajo, así mismo se requirió al contratista mejorar la señalización. (**Ver anexo No. 3**).

Contratista de obra e interventoría han manifestado la necesidad de solicitar un plazo adicional para la culminación de los trabajos, se está a la espera de la formalización de dicha solicitud.

No siendo otro el particular.



JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General



Aprobó: **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
Subgerente Técnico y Operativo

Elaboró: **JORGE IVÁN MINAYA PULGARÍN**
Profesional de Apoyo.

Se adjunta

Anexo No. 1 Informe estado actual de ejecución por parte de interventoría.....(09) Folios
Anexo No. 2 Programación de obra vigente.....(01) Folio
Anexo No. 3 Acta de visita de obra 13/12/2024.....(07) Folios

Gestión Documental:

Original: Destinatario

Copia: Archivo



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 PROYECTO BPIN: 2023005850054 - RADICADO INTERNO 1638 FECHA 16/12/2024

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>
Para: wilsongomezinmobiliaria@gmail.com

24 de diciembre de 2024, 11:35

110.10-1328

Yopal, Casanare 24 de diciembre de 2024

Señor

WILSON GOMEZ SALAMANCA

Presidente Veeduría Comuna 7

wilsongomezinmobiliaria@gmail.com

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023 PROYECTO **BPIN: 2023005850054 - RADICADO INTERNO 1638** FECHA 16/12/2024

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

En atención a la solicitud de información del contrato en referencia nos permitimos indicar que bajo certificación expedida por interventoría se posee un avance con corte al 30 de Noviembre de 2024 del 52,57% (**Ver anexo No. 1**), así mismo se adjunta programación de obra vigente (**Ver anexo No. 2**).

El estado actual de la obra es en ejecución; el día 13 de diciembre se efectuó visita conjunta con profesionales adscritos a banco de proyectos gobernación de Casanare, Acuatodos SA ESP, contratista de obra e interventoría identificando cuatro frentes de trabajo, así mismo se requirió al contratista mejorar la señalización. (**Ver anexo No. 3**).

Contratista de obra e interventoría han manifestado la necesidad de solicitar un plazo adicional para la culminación de los trabajos, se está a la espera de la formalización de dicha solicitud.

No siendo otro el particular.

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

Aprobó: ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo

Elaboró: JORGE IVÁN MINAYA PULGARÍN
Profesional de Apoyo.

Se adjunta

Anexo No. 1 Informe estado actual de ejecución por parte de interventoría.....(09) Folios

Anexo No. 2 Programación de obra vigente.....(01) Folio
Anexo No. 3 Acta de visita de obra 13/12/2024.....(07) Folios

Gestión Documental:

Original: Destinatario

Copia: Archivo

Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

GERENTE GENERAL

gerencia@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

4 adjuntos



ANEXO No. 3 COMITÉ 13-12-2024 FASE 2 CON BANCO PROYECTOS.pdf
1790K



ANEXO No. 2 CRONOGRAMA ACTUALIZADO PRÓRROGA 1 C-048-2023.pdf
910K



ANEXO No. 1 INFORME ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN CORTE 30 DE NOV 2024.pdf
9603K



1328-RTA SOLICITUD INFORMACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 048 .pdf
392K



RESOLUCION No. 029 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024
EXPEDIDA POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL

Yopal, diciembre 15 de 2024

Ingeniero
JULIO CESAR CUEVAS
Gerente de Acuatodos
E.S.D.

REF1: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023, OBJETO CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

REF 2: CONTRATO MACRO CARRERA 40 CON CALLE 40.

ASUNTO. 1. INFORME DETALLADO DEL PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA.

2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

En nuestra condición de VEEDURIA CIUDADANA COMUNA 7, por medio del presente escrito nos permitimos solicitar a ustedes el correspondiente porcentaje de ejecución de obra de manera individual de los barrios Xiruma 2, Piedemonte, Bosques de Achagua, Bosques de Guarataros 2, Getsemaní y Salome2. También necesitamos el correspondiente cronograma de trabajo como lo oportuno a la mano de obra para la comunidad, por tanto, requerimos a usted, se nos dé respuesta a la misiva.

Para la comunidad a la cual representamos, vemos con preocupación la falta de la señalización y a la pronta construcción de dichos pozos, por tal motivo requerimos celeridad y prontitud en su cumplimiento.

2. Se nos informe cual a sido el motivo por el cual se ha suspendido el contrato de la referencia en razón a que en la actualidad no se está adelantando ningún tipo de actividad que demuestre que se quiera dar por terminado el contrato

Cordialmente,

VEEDURIA CIUDADANA COMUNA 7

WILSON GOMEZ SALAMANCA
C.C. 91.283.969 EXP. BUCARAMANGA
CEL: 310 687 6671
PRESIDENTE VEEDURIA COMUNA 7

Fwd: Veeduría comuna 7

De: Contactenos Espacuatodos (contactenos@espacuatodos.gov.co)

Para: jiminaya@yahoo.es

Fecha: lunes, 23 de diciembre de 2024, 10:03 GMT-5

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

GERENTE GENERAL

contactenos@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

----- Forwarded message -----

De: **Contactenos Espacuatodos** <contactenos@espacuatodos.gov.co>

Date: lun, 16 dic 2024 a las 8:34

Subject: Fwd: Veeduría comuna 7

To: Subgerencia Técnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

Se remite comunicación con el radicado **1638**, para los fines pertinentes.

JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ

GERENTE GENERAL

contactenos@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

----- Forwarded message -----

De: **wilson gomez inmobiliaria** <wilsongomezinmobiliaria@gmail.com>

Date: dom, 15 dic 2024 a las 19:11

Subject: Veeduría comuna 7

To: <contactenos@espacuatodos.gov.co>

ACUATODOS.pdf



ACUATODOS.pdf

85.2kB

110.10- 0017 - - - -

Yopal, Casanare 15 de enero de 2025

Señor

WILSON GOMEZ SALAMANCA

Presidente Veeduría Comuna 7

wilsongomezinmobiliaria@gmail.com

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023
PROYECTO BPIN: 2023005850054 - RADICADO INTERNO 1693 FECHA 26/12/2024

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048 DE 2023: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

En atención a la solicitud de información del contrato en referencia nos permitimos indicar que bajo reporte expedido por interventoría se posee un avance con corte al 30 de Diciembre de 2024 del 53,10%.

AVANCE EN CADA BARRIO POR CADA COMPONENTE

Barrio	Coletores Sanitarios	Pozos de Inspección	Acometidas sanitarias	Sistema Acueducto
1. Piedemonte	85%	85%	90%	0%
2. Bosques de Achagua.	100%	100%	99%	0%
3. Xiruma II	40%	40%	30%	0%
4. Bosques de Guarataro	100%	80%	40%	0%
5. Salome II	0%	0%	0%	0%
6. Getsemani	70%	70%	75%	0%


Fuente: Interventoría contratada

El estado actual del contrato de obra es en ejecución; el día 27 de diciembre se suscribe prórroga No. 2 por seis (06) meses estableciendo fecha de terminación al plazo contractual el día 28 de junio de 2025.

Se adjunta a la presente reprogramación de obra ajustada a la ampliación de plazo No. 2.

No siendo otro el particular.

Aprobó: ROBERT ASIS HERNANDEZ CASHAY
Subgerente Técnico y Operativo


JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

Se adjunta

Anexo No. 1 Programación de obra vigente.....(01) Folio

Gestión Documental:

Original: Destinatario - Copia: Archivo



130.20.10.

0379

Yopal, Mayo 19 de 2025

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csinterfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

Ingeniero:

JUAN JOSE CEPEDA PEREZ

R.L MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA - Tel. 3132920247

E-MAIL: mopenzas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024** “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 “CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

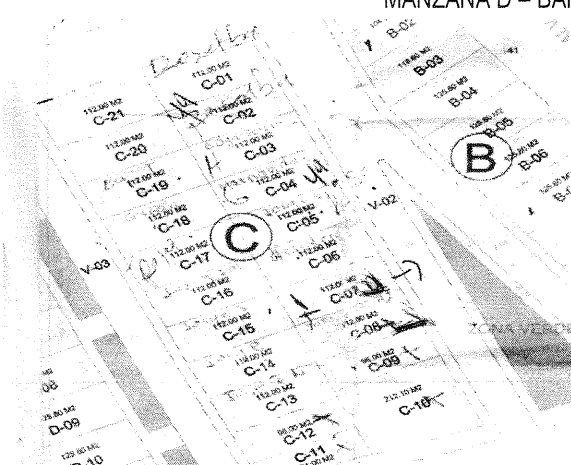
ASUNTO: - REMISIÓN DE PQR COMUNIDAD BARRIO XIRUMA 2 Y PIEDEMONTE

Por medio de la presente se formaliza por escrito las siguientes PQR elevadas ante ACUATODDOS SA ESP:

No. Radicado	Fecha	Descripción de la PQR	Barrio	Contacto
0457	09/04/2025	Daño medidor energía eléctrica	Mz C – predio 16 (Xiruma II)	Nelly Soledad Arévalo Araque. Celular: 3223546378 postobon02801@gmail.com
0458	09/04/2025	Daño pozo séptico	Mz C – predio 28 (Xiruma II)	Zulma Patricia Arévalo Araque. Celular: 3144156280 patricia-25081996@hotmail.com
0459	09/04/2025	Daño caja medidor de agua (Solicitan pago de la caja) – Arreglo vía de acceso.	Mz I – predio 22 (Xiruma II)	Bertilde Yadira López Pérez Celular: 3208536188 yadilop10@gmail.com
0504	22/04/2025	Daño pozo séptico	Mz C – predio 28 (Xiruma II)	Zulma Patricia Arévalo Araque Celular: 3144156280 patricia-25081996@hotmail.com
0537	29/04/2025	Solicitud de pago de \$80.000 por arreglo daño eléctrico.	Mz D – predio 8 (Piedemonte)	Victor Hugo Latorre Latorre Celular: 3123341761 – 3125078904 clahu_18@hotmail.com

0647	16/05/2025	Daños en cercas y material sobrante sin retirar.	(Piedemonte) Mz C Daños en cerca (Lotes 1-2-(19-3)-(4-18)-(17-5)-(16-6)-(15-14-13)-7-8 Material sobrante sin retirar (Lotes 1-2-3-4-7-8-13-14)	Rosalba Rojas ruges Celular: 3112442641 rosalbaruge6@gmail.com Carmenza Sanchez Niño Celular: 3134668391
------	------------	--	---	--

MANZANA D – BARRIO PIEDEMONTE



En la manzana C lotes C 1 y C2 retiro o regar el material en los lotes y sobrante a los lotes C3 y C4 443 p.m.

Retiro de materia o esparcir materia en lotes C_13 y C14 404 p.m.

Postes de cemento y alambre de lotes C1-C2- 445 p.m.

El lote C19 y C3 son de un mismo dueño y tenían su cerca en postes de cemento y alambre de pua 446 p.m.

El lote C4 y C18 son de un solo dueño y también estaban cercados sin división en el centro 447 p.m.

Igual el lote C17 y C5 son de otro dueño y también estaba cercado 448 p.m.

Los lotes C16 y C6 de otro dueño y también estaban cercados sin división en el centro solo los frentes y laterales 450 p.m.


C15-C14 y C13 son de un mismo dueño solo estaban cercados por el frente y los laterales con poste de cemento y alambre de púa 451 p.m.


Los lotes C7- C8 tienen material para esparcir y también quitaron la cerca pero en totalidad faltan algunos postes y el alambre. 454 p.m.


PQR BARRIO PIDE MONTE READICADO 0647 DEL 16/05/2025

Se solicita a la interventoría en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra de la referencia requerir al contratista la atención de dichas PQR y presentar informe donde se evidencie su subsanación.

Sin otro particular,


 Revisó: Robert Asis Hernández Cachay
 Subgerente Técnico y Operativo


 Proyectó: Jorge Iván Minaya Pulgarín
 Profesional S.T.Y.O


JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
 Gerente General

Anexo: Radicados 0457-0458-0459-0504-0537-0647.....07 Folios

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario
Copia: Archivo



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

REMISIÓN DE PQR COMUNIDAD BARRIO XIRUMA 2 Y PIEDEMONTE

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>
Para: csointerfase2@gmail.com, mopensas@gmail.com
Cc: sical5sas@gmail.com

19 de mayo de 2025, 16:15

130.20.10-0378

Yopal, Mayo 19 de 2025

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csointerfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

Ingeniero:

JUAN JOSE CEPEDA PEREZ

R.L MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA - Tel. 3132920247

E-MAIL: mopensas@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 “CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

ASUNTO: - REMISIÓN DE PQR COMUNIDAD BARRIO XIRUMA 2 Y PIEDEMONTE

Por medio de la presente se formaliza por escrito las siguientes PQR elevadas ante ACUATODOS SA ESP:

No. Radicado	Fecha	Descripción de la PQR	Barrio	Contacto
0457	09/04/2025	Daño medidor energía eléctrica	Mz C – predio 16 (Xiruma II)	Nelly Soledad Arévalo Araque. Celular: 3223546378 postobon02801@gmail.com
0458	09/04/2025	Daño pozo séptico	Mz C – predio 28 (Xiruma II)	Zulma Patricia Arévalo Araque. Celular: 3144156280 patricia-25081996@hotmail.com
0459	09/04/2025	Daño caja medidor de agua (Solicitan pago de la caja) – Arreglo vía de acceso.	Mz I – predio 22 (Xiruma II)	Bertilde Yadira López Pérez Celular: 3208536188 yadilop10@gmail.com

0504	22/04/2025	Daño pozo séptico	Mz C – predio 28 (Xiruma II)	Zulma Patricia Arévalo Araque Celular: 3144156280 patricia-25081996@hotmail.com
0537	29/04/2025	Solicitud de pago de \$80.000 por arreglo daño eléctrico.	Mz D – predio 8 (Piedemonte)	Victor Hugo Latorre Latorre Celular: 3123341761 – 3125078904 clahu_18@hotmail.com
0647	16/05/2025	Daños en cercas y material sobrante sin retirar.	(Piedemonte) Mz C Daños en cerca (Lotes 1-2-(19-3)-(4-18)-(17-5)-(16-6)-(15-14-13)-7-8 Material sobrante sin retirar (Lotes 1-2-3-4-7-8-13-14)	Rosalba Rojas ruges Celular: 3112442641 rosalbaruge6@gmail.com Carmenza Sanchez Niño Celular: 3134668391
MANZANA D – BARRIO PIEDEMONTE PQR BARRIO PIEDEMONTE READICADO 0647 DEL 16/05/2025				

Se solicita a la interventoría en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra de la referencia requerir al contratista la atención de dichas PQR y presentar informe donde se evidencie su subsanación.

Sin otro particular,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

Revisó: Robert Asis Hernández Cachay
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: Jorge Iván Minaya Pulgarín
Profesional S.T.Y.O

Anexo: Radicados 0457-0458-0459-0504-0537-0647.....07 Folios

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario

Copia: Archivo

Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL
gerencia@espacuatodos.gov.co
+57 (8) 6341324
Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.
www.espacuatodos.gov.co

2 adjuntos

19/5/25, 16:15

Correo de Gobierno en línea Colombia - REMISIÓN DE PQR COMUNIDAD BARRIO XIRUMA 2 Y PIEDEMONTE



0378-REMISON DE PQR CMUNIDAD BARRIO XIRUMA.pdf
983K



PQR XIRUMA II Y PIEDEMONTE.pdf
1807K



controlinterno controlinterno <controlinterno@espacuatodos.gov.co>

Fwd: VISITA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL SGR

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>20 de mayo de 2025, 9:25

Para: Subgerencia Tecnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>, controlinterno controlinterno <controlinterno@espacuatodos.gov.co>

Se remite comunicación con el radicado **0664**, para los fines pertinentes.

Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL
gerencia@espacuatodos.gov.co
+57 (8) 6341324
Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.
www.espacuatodos.gov.co

----- Forwarded message -----
De: **Jairo Elias Jabib Ortega** <jjabib@dnf.gov.co>
Date: mar, 20 may 2025 a las 8:00
Subject: VISITA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL SGR
To: gerencia@espacuatodos.gov.co <gerencia@espacuatodos.gov.co>

Asunto: Anuncio visita de seguimiento a proyectos SGR

Respetados señores:

Con el objetivo de realizar la verificación del estado de ejecución y cumplimiento de los proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), de manera atenta se informa que, a través de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, se ha dispuesto realizar visita a un (1) proyecto que ejecuta la entidad como se detalla a continuación:

BPIN	Nombre del proyecto	Valor SGR	No PAC
2023005850054	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	\$24.403.149.726,00	NA

AVANCE POR COMPONENTENTES

2.3 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO

98,16%

\$ 6161672173,82500

\$ 6161672173,82500

2.2 POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO

63,37%

\$ 1147065570,49000

\$ 7270000077,67000

2.1 COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO

94,64%

\$ 7702293563,98000

\$ 8139827551,30000

1.2 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO

25,20%

\$ 317383287,000

\$ 1259484642,000

1,1 REDES DE ACUEDUCTO

92,14%

\$ 5274780614,90000

\$ 5704989014,80000

\$,000

\$ 4000000000,000


\$ 8000000000,000

■ % EJCUTADO ■ EJCUTADO ■ CONDICIONES INICIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES	VALOR ACUMULADO EJCUTADO	% CON RESPECTO AL PROYECTO	% EJCUTADO RESPECTO AL PROYECTO	% EJCUTADO CON RESPECTO AL CAPITULO
1	1 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$ 6.984.493.666,82	\$ 5.592.163.901,90	29,81%	22,51%	80,07%
1.1	1.1 REDES DE ACUEDUCTO	\$ 5.724.949.024,82	\$ 5.274.780.614,90	24,43%	22,51%	92,14%
1.2	1.2 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	\$ 1.259.484.642,00	\$ 317.383.287,00	5,38%	1,35%	25,20%
2	2 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 16.225.441.715,38	\$ 15.011.031.308,30	69,25%	64,06%	92,52%
2.1	2.1 COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 8.138.427.551,30	\$ 7.702.293.563,98	34,73%	32,87%	94,64%
2.2	2.2 POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 1.810.090.077,67	\$ 1.147.065.570,49	7,73%	4,90%	63,37%
2.3	2.3 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 6.276.924.086,41	\$ 6.161.672.173,83	26,79%	26,30%	98,16%
TOTAL OBRA CIVIL		\$ 23.209.875.382,00	\$ 20.603.195.210,00	99,06%	86,58%	88,77%
PMT PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)		\$ 193.081.391,00	\$ 193.081.391,00	0,82%	0,82%	100,00%
PAGA PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)		\$ 28.274.334,00	\$ 28.274.334,00	0,12%	0,12%	100,00%
TOTAL OBRA CIVIL		\$ 23.431.231.107,00	\$ 20.824.550.935,00	100,00%	87,52%	88,88%
TOTAL AJUSTADO AL PESO		\$ 23.431.231.107,00	\$ 20.824.550.935,00	100,00%	100,00%	11,12%

Yopal, Casanare

Ingeniero
JULIO CESAR CUEVAS
Gerente de Acuatodos

Minaya / Nivias


Asunto: Solicitud

Cordial saludo,

REF1: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 048 DE 2023, OBJETO CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONLA 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

De la manera más atenta solicito restaurar el siguiente daño causado en el predio No 16 de la manzana C del barrio Xiruma II, durante la ejecución del contrato anteriormente mencionado.

Novedad: Se causaron daños en el medidor de energía eléctrica, los días 17 de marzo y 21 de marzo en las mesas de trabajo se dejó estipulado el daño y no se ha hecho la reparación correspondiente, por lo tanto tendré que pasar a la siguiente instancia colocando una demanda por daños y perjuicios.

Quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta de su parte.

Atentamente.

Nombres y apellidos: Nelly Soledad Arévalo Araque
Cedula de ciudadanía: 1118555666
Celular: 3223546378
Dirección: Manzana C casa 16 Barrio Xiruma II
Correo electrónico: postobon02801@gmail.com

Nelly arevalo
1118555666


Acuatodos S.A.
E.S.P.
GERENCIA
FECHA: *07-04-25*
HORA: *2:55 PM*
FIRMA: *Julio C. Cuevas*
(a foto)
0457- - - -

Yopal, Casanare

Ingeniero
JULIO CESAR CUEVAS
Gerente de Acuatodos

Yinayz / Vivian


Asunto: Solicitud

Cordial saludo,

REF1: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 048 DE 2023, OBJETO CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONLA 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. ✓

De la manera más atenta solicito restaurar el siguiente daño causado en el predio No 28 de la manzana C del barrio Xiruma II, durante la ejecución del contrato anteriormente mencionado. ✓

Novedad: Se dañó totalmente el pozo séptico, los días 17 de marzo y 21 de marzo en las mesas de trabajo se dejó estipulado el daño y no se ha hecho la reparación correspondiente, por lo cual me estoy viendo perjudicada económicamente, por lo tanto tengo que tomar medidas y pasar a la siguiente instancia interponiendo la respectiva demanda por daños y perjuicios.

Quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta de su parte.

Atentamente.

Nombres y apellidos: Zulma Patricia Arévalo Araque
Cedula de ciudadanía: 1118567257
Celular: 3144156280
Dirección: Manzana C casa 28 Barrio Xiruma II
Correo electrónico: patricia-25081996@hotmail.com

ZULMA AREVALO
1118567257


acuatodos s.a.
E.S.P.
GERENCIA
FECHA: *09-04-25*
HORA: *2:55 AM*
FIRMA: *Julian O.*
(1 folio)

0458- - -


Yopal Casanare, abril 09 del 2025

Señores

COMPañÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA EN YOPAL

Acuatodos S.A. E.S.P

Yopal

Financiera / Vivica


Asunto. **SOLUCIÓN A DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL BARRIO XIRUMA II**

Cordial saludo.

El presente es con el fin de solicitar muy respetuosamente el pago de la caja del medidor de agua correspondiente al lote No. 22 en la manzana i, la cual fue dañada al momento en que ustedes realizaron labores en la dirección ya mencionada. Además, como propietaria y habitante de la vivienda en este barrio exijo una intervención inmediata dirigida a arreglar el acceso a esta área ya que al realizar su proyecto dejaron las vías en un estado pésimo, perjudicando mi ingreso a la vivienda, las calles se encuentran en mal estado y debido a ello también se está generando una problemática de estancamiento de aguas.

Por lo anteriormente expuesto quedará atenta a una pronta respuesta.

Anexo.

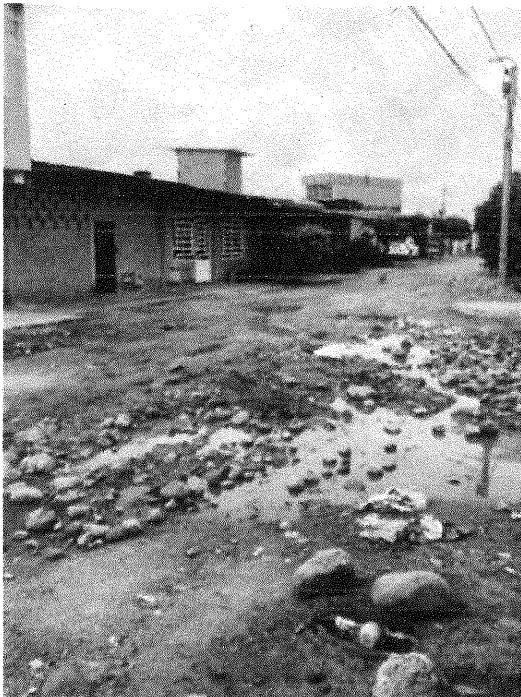
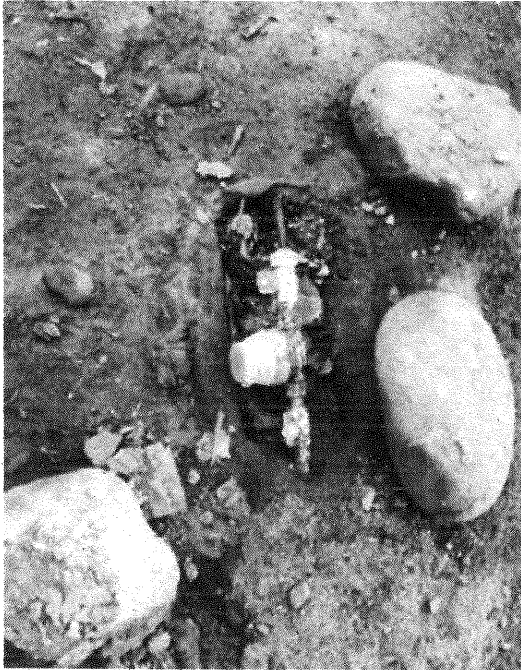
Fotografías

Atentamente


BERTILDE YADIRA LÓPEZ PÉREZ
CC 23725769 de Maní
CEL. 3208536188
E-MAIL: Yadilop10@gmail.com


acuatodos s.a.
E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 09-04-25
HORA: 11:11 AM
FIRMA: Julietta D.
(2 folios)

0459- - - -



Yopal, Casanare

Ingeniero
JULIO CESAR CUEVAS
Gerente de Acuatodos

*Enviar a Autor
Min y 2 / Vivon*

Asunto: Solicitud

Cordial saludo,

REF1: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 048 DE 2023, OBJETO CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOTRES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONLA 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

De la manera más atenta solicito restaurar el siguiente daño causado en el predio No 28 de la manzana C del barrio Xiruma II, durante la ejecución del contrato anteriormente mencionado.

Novedad: Se dañó totalmente el pozo séptico, los días 17 de marzo y 21 de marzo en las mesas de trabajo se dejó estipulado el daño y no se ha hecho la reparación correspondiente, por lo cual me estoy viendo perjudicada económicamente, por lo tanto tengo que tomar medidas y pasar a la siguiente instancia interponiendo la respectiva demanda por daños y perjuicios.

Quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta de su parte.

Atentamente.

Nombres y apellidos: Zulma Patricia Arévalo Araque
Cedula de ciudadanía: 1118567257
Celular: 3144156280
Dirección: Manzana C casa 28 Barrio Xiruma II
Correo electrónico: patricia-25081996@hotmail.com

ZULMA PATRICIA AREVALO ARAQUE
1118567257


acuatodos s.a.
GERENCIA
FECHA: 22-04-2025
HORA: 8:11 AM
FIRMA: *[Signature]*
0504

Minaya
Piedemonte

Yopal, 29 de abril de 2025

Señores
ACUATODOS

**ASUNTO: PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑO ELÉCTRICO BARRIO PIEDEMONTE CALLE 41 CON
CARRERA 43 PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.**

Por medio de la presente se pone en conocimiento que el día 11 de marzo de 2025, en excavaciones hechas por el contratista de obra se sufrió daño eléctrico en el barrio piedemonte afectando cinco viviendas, para dar solución de manera inmediata que permitiera el restablecimiento del fluido eléctrico el Ingeniero de Obra en su momento Miguel Ángel propuso que las personas asumieran el costo del arreglo y que posteriormente se les cancelaría.

Es así como yo **VICTOR HUGO LATORRE LATORRE** asumí el costo de **\$80.000 Ochenta mil pesos** mientras me regresaban este dinero por parte del contratista de obra.

A la fecha no me han cancelado este valor y en comunicación establecida con el Ingeniero Miguel Ángel indica que el ya no esta en proyecto y refiere al Ingeniero Julián como la persona que quedo encargada, no obstante, no hemos podido tener contacto con él.

Solicitamos de su gestión para que el contratista pague el valor de \$80.000 pesos correspondiente al arreglo eléctrico.

Agradezco de su colaboración

Victor Hugo Latorre L.
VICTOR HUGO LATORRE LATORRE
CELULAR 3123341761 - 3125078904

PROPIETARIO CASA BARRIO PIEDEMONTE MZ D CASA 8
Clahu_18@hotmail.com


acuatos s.a.
GERENCIA
FECHA: 29-04-25
HORA: 3:21 pm
FIRMA: *Joheth O.*
(1 Folio)
0537- - -

Yopal, mayo 16 de 2025

Señores

ACUATODOS SA ESP

ASUNTO: AFECTACIÓN LOTES BARRIO PIEDEMONTE CALLE 40

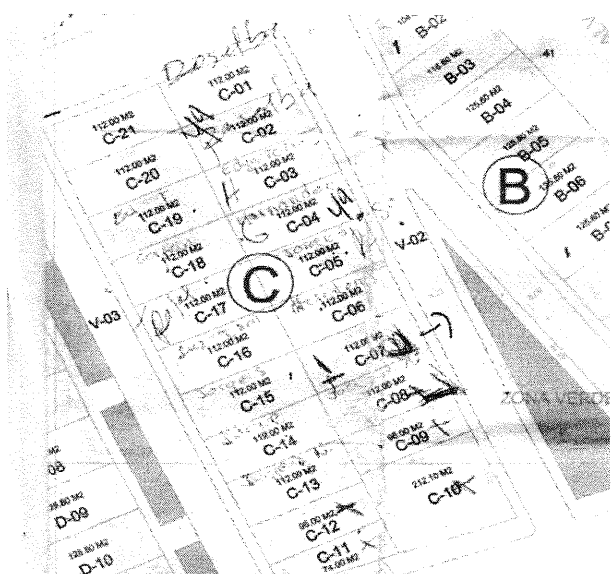
Por medio de la presente solicitamos se nos arregle los daños causados por el contratista en el **BARRIO PIEDEMONTE** en la instalación de las redes de alcantarillado sanitario y acueducto, ya que se sufrió daños en cercas de lotes (Postes en concreto) y se dispuso material sobrante en ellos. Esta afectación lleva más de un año.

LOTES CON CERCA AFECTADA

MANZANA C	LOTES 1 - 2 - (19-3) - (4-18) - (17-5) - (16-6) - (15-14-13) - 7 - 8
-----------	--

LOTES CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

MANZANA C	LOTES 1-2-3-4-7-8-13-14
-----------	-------------------------



En la manzana C lotes C 1 y C2 retiro o regar el material en los lotes y sobrante a los lotes C3 y C4 4:43 p.m.

Retiro de materia o esparcir materia en lotes C_13 y C14 4:44 p.m.

Postes de cemento y alambre de lotes C1-C2- 4:45 p.m.

El lote C19 y C3 son de un mismo dueño y tenían su cerca en postes de cemento y alambre de pua 4:46 p.m.

El lote C4 y C18 son de un solo dueño y también estaban cercados sin división en el centro 4:47 p.m.

Igual el lote C17 y C5 son de otro dueño y también estaba cercado 4:48 p.m.

Los lotes C16 y C6 de otro dueño y también estaban cercados sin división en el centro solo los frentes y laterales 4:50 p.m.

C15-C14 y C13 son de un mismo dueño solo estaban cercados por el frente y los laterales con poste de cemento y alambre de púa 4:51 p.m.

Los lotes C7- C8 tienen material para esparcir y también quitaron la cerca pero en totalidad faltan algunos postes y el alambre. 4:54 p.m.

ROSALBA ROJAS RUGES (HABITANTE PIEDEMONTE)

CELULAR (311)2442641

Rosalbaruge6@gmail.com

CARMENZA SANCHEZ NIÑO (HABITANTE PIEDEMONTE)

CELULAR 3134668391

acuatodos S.A.
GERENCIA

FECHA: 16-05-25

HORA: 5:07 pm

FIRMA:

054



130.20.10.

0450 - - - -

Yopal, Mayo 28 de 2025

Señores

No. Radicado	Fecha	Contacto
0457	09/04/2025	Nelly Soledad Arévalo Araque - Celular: 3223546378 - postobon02801@gmail.com
0458	09/04/2025	Zulma Patricia Arévalo Araque. - Celular: 3144156280 - patricia-25081996@hotmail.com
0459	09/04/2025	Bertilde Yadira López Pérez - Celular: 3208536188 - yadilop10@gmail.com
0504	22/04/2025	Zulma Patricia Arévalo Araque - Celular: 3144156280 - patricia-25081996@hotmail.com
0537	29/04/2025	Victor Hugo Latorre Latorre - Celular: 3123341761 - 3125078904 - clahu_18@hotmail.com
0647	16/05/2025	Rosalba Rojas ruges - Celular: 3112442641 - rosabaruget@gmail.com


REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: - RESPUESTA PQR BARRIO XIRUMA 2 Y PIEDEMONTE RADICADOS 2025 No. 0457 - 0458 - 0459 - 0504 - 0537 - 0647

Por medio de la presente se informa que se dio traslado a las PQR mediante oficio 0378 de 2025 a la interventoría para que en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra de la referencia requiera al contratista su solución y presentar informe donde se evidencie su subsanación.

Sin otro particular,


Revisó: Robert Asis Hernández Cachay
Subgerente Técnico y Operativo


JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

Proyectó: Jorge Iván Minaya Pulgarín
Profesional S.T.Y.O

Anexo: Oficio 0378 - 2025

05 Folios

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario
Copia: Archivo



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

RESPUESTA PQR BARRIO XIRUMA 2 Y PIEDEMONTE RADICADOS 2025 No. 0457 – 0458 –0459 – 0504 – 0537 - 0647

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co> 28 de mayo de 2025, 11:40
Para: postobon02801@gmail.com, patricia-25081996@hotmail.com, yadilop10@gmail.com, clahu_18@hotmail.com, rosalbaruge6@gmail.com

130.20.10-0450

Yopal, Mayo 28 de 2025

Señores

No. Radicado	Fecha	Contacto
0457	09/04/2025	Nelly Soledad Arévalo Araque - Celular: 3223546378 - postobon02801@gmail.com
0458	09/04/2025	Zulma Patricia Arévalo Araque. - Celular: 3144156280 - patricia-25081996@hotmail.com
0459	09/04/2025	Bertilde Yadira López Pérez - Celular: 3208536188 - yadilop10@gmail.com
0504	22/04/2025	Zulma Patricia Arévalo Araque - Celular: 3144156280 - patricia-25081996@hotmail.com
0537	29/04/2025	Victor Hugo Latorre Latorre - Celular: 3123341761 - 3125078904 - clahu_18@hotmail.com
0647	16/05/2025	Rosalba Rojas ruges - Celular: 3112442641 - rosalbaruge6@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024** “INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 “CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

ASUNTO: - RESPUESTA PQR BARRIO XIRUMA 2 Y PIEDEMONTE RADICADOS 2025 No. 0457 – 0458 – 0459 – 0504 – 0537 - 0647

Por medio de la presente se informa que se dio traslado a las PQR mediante oficio 0378 de 2025 a la interventoría para que en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra de la referencia requiera al contratista su solución y presentar informe donde se evidencie su subsanación.

Sin otro particular,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

Revisó: Robert Asis Hernández Cachay
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: Jorge Iván Minaya Pulgarín

Profesional S.T.Y.O

Anexo: Oficio 0378 – 202505 Folios

GESTION DOCUMENTAL:

Original: Destinatario

Copia: Archivo

Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

GERENTE GENERAL

gerencia@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

2 adjuntos



0378-2025 REMISIÓN PQR COMUNIDAD B. XIRUMA - PI.pdf
1141K



0450-RESPUESTA PQR.pdf
588K

I. DATOS GENERALES				
TEMA DE LA REUNIÓN:				
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".				
Fecha de la Reunión:		Hora de inicio	Hora de finalización	
28	05	2025	3:00	3:30
LUGAR DE LA REUNIÓN: Carrera 40 con calle 50 - Bodega				
ASISTENTES				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	DEPENDENCIA
1	Acuatodos			
2	contratista obra			
3	Interventoria			
4	Comunidad			
5			(ver firmas)	
6				
7				
8				
9				
10				
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN				
Formalizar entrega material tubería flexible acueducto				
1" y colasines barrio Sabana 2 en compensación a los				
daños tubería artesanal existentes por la ejecución de la obra.				
ORDEN DEL DÍA				
- Presentación asistentes.				
- Entrega material presidente SMC Sabana 2				

1/5

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Presentación asistentes.
- Relación de material entregado

1. Cinco (5) Rollos x 100 metros cada uno calibre 60 diámetro de 1"
2. Diez (10) Collarines de 1" x 1/2" polietileno
3. Diez (10) Uniones de 1"
4. Diez (10) Abrazadores industrial

Se tomó registro fotográfico de la entrega material


observación: el material se entrega en compensación a los daños tubería artesanal del barrio salome 2 en ejecución de la obra.

Representantes comunidad reciben y expresan su conformidad en relación al material entregado.


2/5

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Entrega Material

Firma : 
Nombre : Julián Molina Rojas
Cargo : Profesional de apoyo interseccional

Firma : 
Nombre : Oscar Julian Suarez
Cargo : Apoyo contratista

Firma : 
Nombre : Jorge Ivan Minaya
Cargo : Profesional Acuatodos

Firma : _____
Nombre : _____
Cargo : _____

Firma : _____
Nombre : _____
Cargo : _____

Firma : _____
Nombre : _____
Cargo : _____

Firma : _____
Nombre : _____
Cargo : _____

Firma : _____
Nombre : _____
Cargo : _____

4/5

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN

A. OBJETO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 048-2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

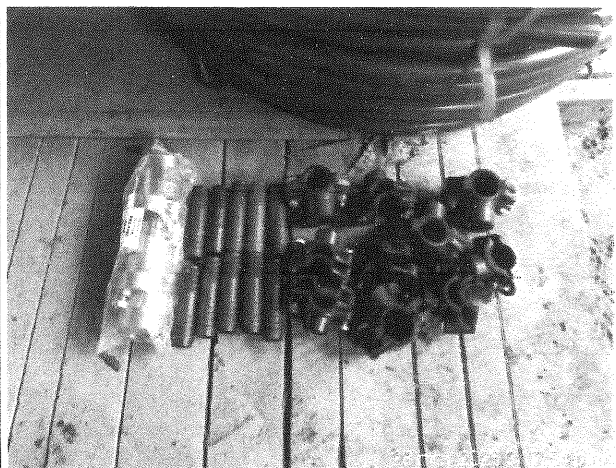
REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA MATERIAL SALOME 2 EN COMPENSACIÓN DAÑOS TUBERÍA AGUA ARTESANAL EXISTENTE



FECHA: 28/05/2025



FECHA: 28/05/2025



FECHA: 28/05/2025



FECHA: 28/05/2025



Subgerencia Tecnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

Fwd: Del impacto de sus obras sobre nuestra infraestructura de gas natural

1 mensaje

Contactenos Espacuatodos <contactenos@espacuatodos.gov.co>
Para: Subgerencia Tecnica <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

3 de junio de 2025, 17:49

Se remite comunicación con el radicado **0736**, para los fines pertinentes.

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL

contactenos@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

*Ing. Minya
H. Vivero
Eduin
Les ar
Cede uno ofra
a lo interve*

----- Forwarded message -----

De: Luis Nicacio Peña Cabulo <director.oymgas@enerca.com.co>

Date: mar, 3 jun 2025 a las 16:16

Subject: RE: Del impacto de sus obras sobre nuestra infraestructura de gas natural

To: contactenos@espacuatodos.gov.co <contactenos@espacuatodos.gov.co>

Cc: Elkin Omar Romero Camargo <gerente.gas@enerca.com.co>

Bunas tardes, nuevamente le solicitamos su colaboración para que le pongan freno a sus contratistas , iniciando por que rompen la infraestructura de gas y no avisan , ni reparan, cualquier explosión será responsabilidad , contraten un técnico una firma de gas natral avaladas por Enerca y reparen , so pena de que coloque esta situación en manos de la procuraduría.

De: Luis Nicacio Peña Cabulo

Enviado el: viernes, 04 de abril de 2025 11:12 a.m.

Para: 'contactenos@espacuatodos.gov.co'

CC: Elkin Omar Romero Camargo

Asunto: Del impacto de sus obras sobre nuestra infraestructura de gas natural

Cordial Saludo,

Nos permitimos comunicar que con frecuencia se ha venido afectando nuestras redes de gas natural en los diferentes puntos donde ustedes o sus contratista actúan , según el caso impactan nuestras redes en caliente, generando no solo las pérdidas del recurso minero energético, sino la afectación al usuario y el peligro que representa para la integridad de las personas , como quiera que se trata del transporte de un combustible con alto grado de explosión e incendio, por tal razón no se entiende que en los estudios previos no se tenga esta situación en cuenta que genera unos costo su reparación o traslado de las redes en cada caso que aplique, pero tampoco se entiende que su entidad no solicite la información al operador de red o una reunión en sito para explicar la existencia de las redes y el procedimiento seguir , tampoco mandan a reearar de inmediato la afectación según cada caso, como son las afectaciones en Xiruma, el Morro , Tilo, Getsemaní, Torres de San Marcos, entre otros,, así las cosas, pasaremos las respectivas cuentas de cobro por daño o afectación, solicitar que cuando afecten llamar urgente a la línea 115 para controlar las fugas y contratar el personal técnico para reparar, de conformidad con el listado de las firmas constructoras autorizadas para tal fin. Se deja constancia que cualquier riesgo o siniestro que causen, ustedes responderán ante terceros y demás. Se anexa listado de firmas instaladoras.

<Archivo: Firmas instaladoras.pdf >>

Cordialmente,

LUIS NICACIO PEÑA CABULO

DIRECTOR O& M GAS

ENERCA S.A E.S.P

Línea gratuita nacional: 018000-910182

Marginal de la Selva Km. 1 vía Yopal - Aguazul

PBX: (8) 6344680 EXT 110

Yopal – Casanare



COMUNICACIÓN INTERNA No. 110-108 de 2025

DE: **ROBERT ASIS HERNADEZ CACHAY**
Subgerente Técnico y Operativo

PARA: **BERTHA LEONELA SARAVIA MENDEZ**
Subgerente Jurídica

ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN PÓLIZAS

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 046-2022 (INTERVENORÍA FASE 2)

FECHA: JUNIO 06 DE 2025

SUB-GERENCIA JURÍDICA
FECHA: 06-Junio-2025
HORA: 9:50 AM
FIRMA:

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito solicitar la aprobación de las siguiente póliza de cumplimiento No. -CBO-100015914 así:

- Anexo No.4 correspondiente a la actualización según acta de reinicio de fecha 26 de septiembre de 2024.
- Anexo No. 5 correspondiente a la actualización según prórroga No.2 por un plazo de seis meses (06) de fecha 23 de octubre de 2024.
- Anexo No. 6 correspondiente a la actualización según prórroga No.3 por un plazo de doce meses (12) de fecha 23 de abril de 2025

Atentamente,

ROBERT ASIS HERNADEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo

Proyecto: **JORGE I. MINAYA PULGARÍN**
Profesional de Apoyo a la Supervisión

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

I. DATOS GENERALES				
TEMA DE LA REUNIÓN:				
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".				
Fecha de la Reunión:		Hora de inicio	Hora de finalización	
12	06	2025	3:00 PM	4:00 PM
LUGAR DE LA REUNIÓN:				
INSTALACIONES EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL				
ASISTENTES				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	DEPENDENCIA
1	Ingeniero Camilo Castillo		Profesional	EAAAY EICE ESP
2	Ingeniero Robert Asís Hernández Cachay		Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS SA ESP
3	Ingeniera Viviana Barón Mojica		Profesional Contratado STYO	ACUATODOS SA ESP
4	Ingeniero Jorge Iván Minaya		Profesional STYO	ACUATODOS SA ESP
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN				
Explicación del alcance proyecto fase 2 del Municipio de Yopal, ejecutado mediante contrato de obra pública No. 048 de 2023.				
Consulta de los lineamiento de la EAAAY EICE ESP como operador del sistema de acueducto el área urbana de Yopal para conexión a la red matriz existentes e instalación de acometidas.				
ORDEN DEL DÍA				
Presentaciones asistentes				
Explicación alcance del proyecto fase 2 ejecutado mediante contrato de obra pública 048 de 2023 suscrito por ACUATODOS SA ESP.				
Lineamientos EAAAY EICE ESP como operador del sistema de acueducto el área urbana del municipio de Yopal para conexión a la red matriz existentes e instalación de acometidas.				
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
Se hace presentación de los asistentes a la reunión por parte de la EAAAY EICE ESP Y ACUATODOS SA ESP				

Se procede hacer explicación del alcance del proyecto de fase 2 por parte de ACUATODOS SA ESP, indicando que se interviene seis barrios de la Comuna VII del Municipio de Yopal (Piedemonte, Bosques de Achagua, Bosques de Guarataros, Xiruma II, Salome II y Getsemani), para lo cual se tiene proyectado brindar cobertura en los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario.

A la fecha se posee un avance cercano al 90%, por consiguiente, se hace necesario coordinar con la EAAAY como operadora de los servicios de acueducto del municipio de Yopal la interconexión a la red matriz existentes a la red en construcción, así mismo fijar lineamientos para hacer el suministro e instalación de micromedidores de acueducto en los predios habitados.

LA EAAAY EICE ESP expresa en relación que para la interconexión a la red matriz existente con la red de acueducto en construcción se debe hacer previamente las pruebas de presión hidrostática, limpieza y desinfección de la tubería de acuerdo de acuerdo a lo establecido en la resolución 0330 de 2017, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, en el que se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017).

Se debe generar un documento técnico que evidencie la ejecución de esta actividad y la conformidad de la prueba.

Es así que se dará la viabilidad por parte de la EAAAY para que se efectúe la interconexión y se de servicio a la nueva red.

En relación a la instalación de micromedidores acometidas de acueducto se hace necesario llevarse a cabo un proceso conjunto entre ACUATODOS SA ESP y EAAAY EICE ESP con el fin de llevarse a cabo el suministro e instalación de los micromedidores de acueducto por parte del contratista de obra en los predios que actualmente se encuentran habitados.

Cada beneficiario debe previamente a la instalación del micromedidor tener formalizado su respectiva matricula ante la EAAAY EICE – ESP como operador del servicio de acueducto en la Ciudad de Yopal.

En la presente reunión se indica listado de los documentos que los beneficiarios deben entregar para proceder a la matricula. Cabe resaltar que esta actividad le competente al usuario realizar, no obstante, se podría coordinar con el área comercial de la EAAAY EICE ESP jornadas para facilitar la recepción de estos documentos.

Una vez se posea el listado de beneficiarios que formalizaron su matricula ante la EAAAY EICE ESP se informara ACUATODOS SA ESP, quien deberá generar un acta de suministro e instalación del micromedidor, accesorios y cajilla de protección la cual debe remitirse posteriormente a la EAAAY EICE ESP acompañada por el certificado de calibración del micromedidor y su respectiva factura de compra.

Es de indicarse que se recomienda que la instalación de las acometidas de acueducto se ejecute posterior a la pruebas hidrostáticas y a la interconexión a la red matriz, de tal forma se instale los collarines y micromedidores con la red presurizada.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Coordinar mesas periódicas de trabajo entre ACUATODOS SA ESP, contratista de obra, interventoría y EAAAY EICE ESP

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma : 
Nombre : Lider. Infraestructura
Cargo : Camilo Castillo P.

Firma : 
Nombre : Robert Hernandez
Cargo : Subgerente Técnico.

Firma : 
Nombre : José I. Minaya P.
Cargo : Profesional Acuatodos

Firma : 
Nombre : Vianca Baren
Cargo : Prof. Acuatodos

REQUISITOS PARA MATRICULA

ITEM	DOCUMENTO
1	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD (VIGENTE)
	ESCRITURA O PROMESA DE COMPRAVENTA
	DECLARACION JURAMENTADA DONDE INDIQUE EN QUE CALIDAD ESTA OCUPANDO EL PREDIO
2	CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y ESTRATIFICACION
3	COPIA DE CEDULA DEL PROPIETARIO DEL PREDIO
4	COPIA DEL RUT DEL PROPIETARIO ACTUALIZADO CON CORREO ELECTRONICO Y NUMERO DE TELEFONO
5	EN CASO TAL QUE EL SOLICITANTE NO SEA EL DUEÑO DEL INMUEBLE DEBE DILIGENCIAR LA AUTORIZACIÓN DE TERCEROS Y ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL TERCERO AUTORIZADO (EL FORMATO DEBE SER SOLICITADO EN LA OFICINA DE FIDELIZACIÓN)
NOTA	UNA VEZ RADICADOS LOS DOCUMENTOS, LA EAAAY CUENTA CON 10 DIAS HABILES PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS NO DEBEN SER MAYORES A 30 DIAS DE VIGENCIA
	LA SOLICITUD SE VENCE A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE RADICACION Y SE DEBE ACTUALIZAR NUEVAMENTE DOCUMENTOS

REQUISITOS PARA MATRICULA

ITEM	DOCUMENTO
1	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD (VIGENTE)
	ESCRITURA O PROMESA DE COMPRAVENTA
	DECLARACION JURAMENTADA DONDE INDIQUE EN QUE CALIDAD ESTA OCUPANDO EL PREDIO
2	CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y ESTRATIFICACION
3	COPIA DE CEDULA DEL PROPIETARIO DEL PREDIO
4	COPIA DEL RUT DEL PROPIETARIO ACTUALIZADO CON CORREO ELECTRONICO Y NUMERO DE TELEFONO
5	EN CASO TAL QUE EL SOLICITANTE NO SEA EL DUEÑO DEL INMUEBLE DEBE DILIGENCIAR LA AUTORIZACIÓN DE TERCEROS Y ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL TERCERO AUTORIZADO (EL FORMATO DEBE SER SOLICITADO EN LA OFICINA DE FIDELIZACIÓN)
NOTA	UNA VEZ RADICADOS LOS DOCUMENTOS, LA EAAAY CUENTA CON 10 DIAS HABLES PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS NO DEBEN SER MAYORES A 30 DIAS DE VIGENCIA
	LA SOLICITUD SE VENCE A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE RADICACION Y SE DEBE ACTUALIZAR NUEVAMENTE DOCUMENTOS

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: COMITÉ TECNICO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Fecha de la Reunión:

Hora de inicio

Hora de finalización

13

06

2025

8 AM

9 AM

LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas ACUATODOS

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	ERIKA MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA FASE 2	CONSORCIOINTERFASE 2
2	LADY RINCON	PROF DE APOYO JURIDICO	SUB GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
3	ROBERT ASIS HERNANDEZ	SUB GENERENTE TECNICO	SUB GERENCIA TECNICA
4	JORGE MINAYA	PROFESIONAL ACUATODOS	SUB GERENCIA TECNICA
5	VIVIANA BARON	PROF DE APOYO	SIUB GERENCIA TECNICA
6	JUAN JOSE CEPEDA	RL MOPEM SAS	MOPEM
7	JORGE ELIECER CASTELLANOS	RL CONSORFCIO INTERFASE 2	INTERFASE 2
8			
9			
10			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ DE SEGUIMIENTO CTO DE OBRA 048 DE 2023

ORDEN DEL DÍA

ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

DESARROLLO DE LA REUNION

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  ACUATODOSS.A. E.S.P.  @ACUATODOS e-mail:
contactenos@espacuatodos.gov.co

Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Telefax:** (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO

POSTAL

850001


II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En desarrollo de comité de seguimiento, la interventoría socializa la solicitud por parte de la obra una modificatoria, al proyecto, y menciona lo siguiente:
Hace intervención la obra: Modificatoria: el contratista manifiesta que hay unos ítems nuevos, dentro de ellos accesorios de acueducto por especificaciones técnicas, e inclusión de cajas de inspección. Y la Instalación de micromedidores y cajillas de protección.
ACUATODOS Manifiesta y hace la salvedad a la interventoría y la obra, que todo sobre costo de los cálculos deben estar bien justificados técnicamente y soportados con relación a los tramites que requieran hacer ante la entidad.
ACUATODOS: le reitera a la obra y a la interventoría que de acuerdo a los lineamientos expuestos por la EAAAY EICE ESP, deben garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos para que se pueda realizar la interconexión a la red matriz, como también la instalación de los micromedidores y acometidas del acueducto. También se hace acotación sobre los tiempos que maneja la EAAAY EICE ESP para el recibido del sistema, basados en la información suministrada en el comité del día 12 de junio de 2025 con la EAAAY EICE ESP.
la interventoría manifiesta que ha requerido al municipio de Yopal, ratificar los perfiles viales existentes, ya que en campo se evidencia que los las redes eléctricas y de gas no lo se están respetando.
ACUATODOS solicita a la interventoría entregar la trazabilidad de dichos requerimientos a la alcaldía, para poder gestionar dichos requerimientos por parte de acuatodos.
ACUATODOS Solicita a la interventoría hacer seguimiento a las cajas de inspección construidas, de acuerdo a las quejas por parte de la comunidad, en cuanto faltantes de tapas y falta de señalización.
ACUATODOS solicita a la interventoría, tomarla medidas correctivas que mitiguen el impacto negativo que se ha venido presentado con relación los pozos inspección
Desde la sub gerencia técnica y operativa se dan claridades técnicas a los requerimientos expuestos por parte de la interventoría y la obra.
VIGENCIA DEL CONTRATO: el contrato tiene fecha de terminación el 28 de junio de 2025.
El contratista manifiesta que, a la fecha de terminación actual del contrato, no alcanzarían a terminar en los tiempos establecidos, por consiguiente, solicitara una prórroga y modificatoria, la cual será radicada ante ACUATODOS el día lunes 20 de junio de 2025, para su revisión.


COMPROMISOS Y RESPONSABLES


El contratista manifiesta que, a la fecha de terminación actual del contrato, no alcanzarían a terminar en los tiempos establecidos, por consiguiente, solicitara una prórroga y modificatoria, la cual será radicada ante ACUATODOS el día lunes 20 de junio de 2025, para su revisión.


Una vez recibida la solicitud de prórroga por parte de la interventoría, ACUATODOS SA ESP, revisará y emitirá un concepto de acuerdo a lo solicitado por el contratista.


FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma : 
Nombre : Mariana Barón
Cargo : Prof. de Apoyo.

Firma : 
Nombre : Robert Asis Hernández
Cargo : Subgerente Técnico J.C.

Firma : 
Nombre : Leidy Rincón
Cargo : Prof. de Apoyo.

Firma : 
Nombre : Jorge I. Miquel
Cargo : Profesional SIG/ Acuatodos.

Firma : 
Nombre : MOPEX SAS.
Cargo : _____

Firma : 
Nombre : Jorge Eliecer Castellano
Cargo : SICAL SAS RL.

Firma : <u>Erika Martinez.</u> Nombre : <u>Residente de Interventoria</u> Cargo : _____	Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____
Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____	Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____
Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____	Firma : _____ Nombre : _____ Cargo : _____

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.										
Registro de Asistencia										
Nombre dependiente responsable del proyecto o contrato (representante legal ante el contratante)										
DEPENDENCIA RESPONSABLE				GERENCIA						
FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	HORA	TEMAS A TRATAR				
OBJETO	23 07 2025				5:00 pm				1 Estado del proyecto	
									2	
									3 Intervención comunidad	
									4 (PQR)	
									8	
Contrato 040-2023										
No	NOMBRES Y APELLIDOS				ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO/e-mail	HORA	FIRMA
1	Javier Ciron				Jabot	Edic 7	3138681230	lorayk		
2	Hosel Unzu				JACOM 7	Edic 7	3138681230			
3	Hosel Unzu				JACOM 7	Edic 7	3138681230			
4	Hosel Unzu				JACOM 7	Edic 7	3138681230			
5	Diana Lopez Luna				JACOM 7	Edic 7	3138681230			
6	Balduino Ferrer Ferrer				JACOM 7	Edic 7	3138681230			
7	Alejandro Monsalve				Verdunia	Verdunia	3134077590	cp.alcandino.monsalve@gmail.com		
8	Margarita Santos Velandio				JAC salomede	Presidente	3133120563	margaritasantos1210@gmail.com		
9	Julio Morales Montoya				Acuatodos	Contador	321702248	contadordesemucubda.gov.co		
10	Jose Meche				Verdunia	Verdunia				
11	Julio Cesar Carias				Acuatodos	GERENTE	9105586446	calidatnail.com		
12										
OBSERVACIONES										

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizadm)

FECHA	DD	MM	AA	LUGAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	GERENCIA
23 07 2025	23	07	2025	HORA	5:00 p.m.	TEMAS A TRATAR
OBJETO						
consulta 048.2023						
1 estado del proyecto						1
2						2
3 Intervención comunidad						3
4						4
5						5
6						6
7						7
8						8
9						9
10						10
11						11
12						12

OBSERVACIONES



110.18.2. 0656-2-2-4

Yopal, Julio 08 de 2025

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csinterfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023** "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025

Cordial saludo;

Dado a las obligaciones de seguimiento y control que se tiene a la ejecución del contrato de obra No. 048 de 2023 se requiere a la interventoría dar cumplimiento a la CLÁUSULA No. 8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA numeral 29 y 41 del contrato de consultoría No. 001 de 2024 que establece:

29. Solicitar al contratista de obra, informes mensuales sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e inversión del anticipo.

41. Presentar informes mensuales de interventoría sobre la ejecución del contrato de obra objeto de la vigilancia, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual, anexos, ensayos de laboratorio y los que solicite la Supervisión. En este informe deben relacionar las funciones administrativas, técnicas, ambientales, financieras, contables y jurídicas ejecutadas con relación a la obra objeto de control; la ejecución de estas funciones debe estar certificadas por cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo de la interventoría según su competencia. Este informe debe contener como mínimo:

- a). Avance de cada una de las actividades programadas del contrato de obra vigilado y de la interventoría.
- b.) Registros fotográficos.
- c). Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.


- d). Fotocopia de la bitácora.
- e). Resumen de las actividades realizadas en el mes.
- f). Relación del personal empleado en la ejecución del contrato.
- g). Informe de seguridad industrial y salud ocupacional.
- h). Informe de manejo socio ambiental.
- i). Informe de manejo del plan de manejo de aseguramiento de la calidad de la obra.
- j). Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes (cuando aplique).
- k). Actualización del programa de ejecución de obra.
- l). Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios ni Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, así como riesgos laborales cuando corresponda.

Lo anterior se motiva en que a la fecha no se tiene registro de entrega del informe mensual de obra e interventoría correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO de 2025, ni reporte de GESPROY mes de junio de 2025.


Sin otro particular,



JULIO CESAR GUEVAS JIMENEZ
Gerente General



Revisó: Roberto Luis Hernández Cachay
Subgerente Técnico y Operativo



Proyectó: Jorge Iván Minaya Pulgarín
Profesional S.T.Y.O

CC. MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA
E-MAIL: mopensas@gmail.com – gerenciamopen@gmail.com

GESTION DOCUMENTAL: Original: Destinatario Copia Archivo



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025

1 mensaje

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

8 de julio de 2025, 16:04

Para: csinterfase2@gmail.com, sical5sas@gmail.com

Cc: mopensas@gmail.com, gerenciamopen@gmail.com

110.18.2-0056

Yopal, Julio 08 de 2025

Ingeniere:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csinterfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023** "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: - PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Y OBRA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025

Cordial saludo;

Dado a las obligaciones de seguimiento y control que se tiene a la ejecución del contrato de obra No: 048 de 2023 se requiere a la interventoría dar cumplimiento a la CLÁUSULA No. 8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA numeral 29 y 41 del contrato de consultoría No. 001 de 2024 que establece:

Lo anterior se motiva en que a la fecha no se tiene registro de entrega del informe mensual de obra e interventoría correspondiente a los meses de MAYO y JUNIO de 2025, ni reporte de GESPROY mes de junio de 2025.

Sin otro particular,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

Revisó: Robert Asis Hernández Cachay
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: Jorge Iván Minaya Pulgarín
Profesional S.T.Y.O

CC: MOPEN SAS - CONTRATISTA CBRA
E-MAIL: mopensas@gmail.com - gerenciamopen@gmail.com

GESTION DOCUMENTAL: Original: Destinatario Copia Archivo
Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
GERENTE GENERAL
gerencia@espacuatodos.gov.co
+57 (8) 6341324
Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.
www.espacuatodos.gov.co



0656-PRESENTACION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Y OBRA MES DE MAYO.pdf
889K

Yopal, 14 de julio 2025

Minaya
Rta

Señores
ACUATODOS SAS
Ingeniero
JULIO CESAR CUEVAS
Ciudad

Referencia: Solicitud del arreglo de los daños causados en el Asentamiento Humano
Piedemonte

Cordial saludo.

Por medio de la presente solicito a ACUATODOS realizar el arreglo de la tubería subterránea del servicio de energía de la casa B 2, la cual lleva expuesta varios meses. Solicito también se haga la caja de aguas negras; ya que estos daños fueron ocasionados por los trabajadores de la empresa contratista que labora en las obras del contrato 048 – 2023 que incluye obras de alcantarillado, acueducto y otras, que se lleva a cabo en este barrio por parte de ACUATODOS. De igual manera, respetuosamente se solicita que se remueva el material de relleno que dejaron en los lotes C 1, C 2, C 3, C 4 y que el mismo relleno se disponga y se deposite en otros lotes H 1, H 2, H 3 y H 4 del mismo barrio.

Agradezco su valiosa colaboración

Adjunto a este documento envío la evidencia de los daños y estaré atenta para orientar en el terreno a los trabajadores que envíen a colaborar con la solución de estos problemas.

Atentamente,

ANGELICA VARGAS
ANGELICA MARÍA VARGAS AGUDELO
C.C. 1032421557
Celular: 313 8607946
Email: vargasagudeloangelica@gmail.com


acuatodos S.A.
E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 14-07-25
HORA: 2:11 PM
FIRMA: Julio Cesar Cuevas
(2 Folios)
0985- - - -

Archivos adjuntos: SOLICITUD ASENTAMIENTO GUMANO PIEDEMONTE





JUNTA DE ACCION COMUNAL A. H. XIRUMA II
RESOLUCION N° -016 DEL 13 MARZO DE 2024
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL



*Memo
rta*

Yopal, Casanare 15 de julio del 2025

Ingeniero

JULIO CESAR CUEVA
GERENTE DE ACUATODOS

Cordial saludo,

Por medio de la presente les agradezco nos instalen las tapas de las cajas de alcantarillado de las casas y lotes de Xiruma 2 que ya están hechas, las cuales actualmente se encuentran destapadas y generan un peligro de seguridad para niños, formación masiva de zancudos con posibles enfermedades y demás riesgos que esto conlleva.

Agradezco su atención prestada y espero una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,


WILSON GOMEZ SALAMANCA
PRESIDENTE DE JAC A.H XIRUMA II
CEL: 310 687 6671
NOTIFICACIONES:
wilsongomezinmobiliaria@gmail.com
MANZANA C, CASA 32 XIRUMA II


acuatodos S.A.
E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 15-07-25.
HORA: 11:26 am
FIRMA: 
(1 folio)

0990 - - -





110.18.2.

0697- - -

Yopal, Julio 15 de 2025

Ingeniero:

JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

R.L CONSORCIO INTERFASE 2 – INTERVENTORIA - Tel. 3133950340

E-MAIL: csointerfase2@gmail.com - C.C sical5sas@gmail.com

Ingeniero:

JUAN JOSE CEPEDA PEREZ

R.L MOPEN SAS - CONTRATISTA OBRA - Tel. 3132920247

E-MAIL: mopensas@gmail.com - gerenciamopen@gmail.com

Con copia:

Angelica María Vargas Agudelo Celular: 3138607946 vargasagudeloangelica@gmail.com	Wilson Gómez Salamanca Presidente de JAC A.H Xiruma II Cel: 3106876671 wilsongomezinmobiliaria@gmail.com Manzana C, Casa 32 Xiruma II
--	---

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2024 "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 048 DE 2023 "CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: - REMISIÓN DE PQR COMUNIDAD BARRIO PIEDEMONTE Y XIRUMA 2 – RESPUESTA RADICADO 0985-0990 DE 2025.

Por medio de la presente se remite por escrito las siguientes PQR elevadas ante ACUATODDOS SA ESP:

No. Radicado	Fecha	Descripción de la PQR	Barrio	Contacto
0985	14/07/2025	Solicitud arreglo tubería subterránea de servicio de energía eléctrica – Hacer caja de aguas negras.	Casa B-2 – (Barrio Piedemonte)	Angelica María Vargas Agudelo Celular: 3138607946 vargasagudeloangelica@gmail.com
		Remover material de relleno en lotes C1, C2, C3, C4 y que el mismo se disponga y se deposite en otros lotes del mismo barrio H1, H2, H3 y H4.	Lotes C1, C2, C3, C4 (Barrio Piedemonte)	
