



MINCIVIL S.A
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA N°28
SEPTIEMBRE 2023

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
				FECHA	30/10/2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	28	
(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)	
			PERIODO MES:	septiembre-23	
			VALOR BÁSICO ACTA:	-\$ 15.810.008,00	
			CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31 10 2023		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ C.	ENTREGA DE ACTA DE AJUSTE CON CONSECUTIVO 0940 - 1745 DEL 30/10/2023
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	4 11 2023		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA	SOLICITUD CORRECCIONES DE FORMA EN SOPORTES DE ACTA. INTERVENTORIA AUTORIZA LA FIRMA DE LAS ACTAS
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7 11 2023		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ C.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8 11 2023		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA M.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08-nov-23		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	16-nov-23		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ C.	Para que se atiendan observaciones efectuadas por el supervisor
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	21-nov-23		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	No aplica		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		Atendiendo el trámite virtual no requiere ser entregada al contratista
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24-Nov-2023		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS GUILLERMO PINTO SOLER	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN JOSE OYUELA SOLER	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.					
ORDEN DE PAGO					
CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.					
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1					
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING JUAN JOSE OYUELA SOLER AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. (Indicar el ordenador del pago)					
VALOR TOTAL A PAGAR: -\$ 15.925.543,00 VALOR EN LETRAS: MENOS (-) QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)					
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 28 DEL PERIODO septiembre-23 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)					
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Matricula profesional N°: 25202 21081CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC GESTOR TECNICO DEL PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	
				Firma:	
				Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER Matricula profesional No.: 25202-157094 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.					



2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒ 28D	sep-2023
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 984223 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -\$ 15,925,543

TOTAL ACTA -\$ 15,925,543

Firma *Victor Manuel Ruiz V.*
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado RP984223;11;-15925543
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 28 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 28 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11;-15925543

AVC



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato No. 987 de 2021

Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

ACTA DE AJUSTE

DEFINITIVA

28

Valor basico -\$

15,810,008.00

Período

sep-2023

Valor incluido el Iva

-\$ 15,925,543.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

13-abr-21

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños, Gestión Social y Predial, Implementación Protocolo bioseguridad	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	57	Duitama -Charalá	-\$ 15,925,543.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 15,925,543.00
2	57	Charalá -San Gil				
		TOTALES	-\$ 15,925,543.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 15,925,543.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	Boyacá	Duitama	-\$ 15,925,543.00	-\$ 15,810,008.00
891801240-1	Boyacá	Paipa	\$ 0.00	\$ 0.00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	-\$ 15,925,543.00	-\$ 15,810,008.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	Santander	Gambita	\$ 0.00	\$ 0.00
890205063-4	Santander	Charalá	\$ 0.00	\$ 0.00
800099819-2	Santander	Paramo	\$ 0.00	\$ 0.00
800099824-1	Santander	San Gil	\$ 0.00	\$ 0.00
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	\$ 0.00	\$ 0.00

Alexandra Maria Greidinger Restrepo

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá




**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,


ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)



6. COPIA DEL RUT DEL CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14862813091



(415)7707212489984(8020) 000001486281309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 0 5 4 5 1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico

notificaciones@mincivil.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 8 9 7 7 0

45. Teléfono 2

6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 2 1 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 6 6 3

0 8 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	2	2	3						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 12 / 15 : 53: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN4-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA		FECHA 26/09/2023 (Día) (Mes) (Año)					
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER										ACTA N° 28 ACTA FINAL SI NO X (Indicar con Una X)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.238.028.932.00 MES septiembre-23					
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año) ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Includas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.392.00							
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375.00																	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICCOV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 4 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023				OBRA EJECUTADA			
				GRAL.	PART.	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	PRESENTE ACTA	VALOR	CANTIDAD	ACUMULADO
EXPLANACIONES																	
1.0	1.0	0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	34.00	\$ 1.137.185.00	\$ 38.664.290.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
1.1	1.0	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	\$ 1.137.185.00	\$ -	36.00	\$ 40.938.660.00	0.00	\$ -	-	0.40	\$ 454.874.00
2.0	1.0	0	201.7	201-13	0.0	Demolicion de Estructuras	m3	213.00	\$ 109.175.00	\$ 23.254.275.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
2.1	1.0	11601	201.7	201-13		Demolicion de Estructuras	m3	-	\$ 109.175.00	\$ -	214.00	\$ 23.363.450.00	8.70	\$ 949.823.00	74.35	\$ 8.117.162.00	
3.0	1.0	0	201.2	201-13		Remocion de alcantarillas	m	1.278.00	\$ 66.695.00	\$ 85.236.210.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
3.1	1.0	11601	201.2	201-13		Remocion de alcantarillas	m	-	\$ 66.695.00	\$ -	1.281.00	\$ 85.436.295.00	0.00	\$ -	-	94.00	\$ 6.269.330.00
4.0	1.0	0	210.1.2	210-13	0.0	Excavacion sin clasificar de prestamos	m3	257.483.00	\$ 12.048.00	\$ 3.102.155.184.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	210-13		Excavacion sin clasificar de prestamos	m3	-	\$ 12.048.00	\$ -	1.625.00	\$ 19.578.000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
5.0	1.0	0	210.2.1	210-13	0.0	Excavacion en roca de la explanación y canales	m3	93.986.00	\$ 60.236.00	\$ 5.661.340.696.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
5.1	1.0	11601	210.2.1	210-13		Excavacion en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.236.00	\$ -	85.699.00	\$ 5.154.334.284.00	2.424.00	\$ 146.012.064.00	12268.00	\$ 737.165.612.00	
6.0	1.0	0	210.2.2	210-13	0.0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2.168.927.00	\$ 10.193.00	\$ 22.107.872.911.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
6.1	1.0	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	\$ 10.193.00	\$ -	1.966.824.90	\$ 20.047.846.208.00	3.636.00	\$ 37.061.748.00	46681.50	\$ 496.210.530.00	
7.0	1.0	0	211.1	211-13	0.0	Remocion de Derrumbes	m3	116.576.00	\$ 9.335.00	\$ 1.089.236.960.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
7.1	1.0	11601	211.1	211-13		Remocion de Derrumbes	m3	-	\$ 9.335.00	\$ -	123.833.00	\$ 1.155.981.055.00	0.00	\$ -	-	1707.20	\$ 159.415.982.00
8.0	1.0	0	220.1	220-1	0.0	Terraplenes	m3	514.966.00	\$ 12.565.00	\$ 6.470.547.790.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
8.1	1.0	11601	220.1	220-1		Terraplenes	m3	-	\$ 12.565.00	\$ -	390.406.00	\$ 4.905.451.390.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
SUB TOTAL										\$ 38.577.308.316.00		\$ 31.599.798.562.00	\$ 184.023.635.00	\$ 1.466.312.926.00			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
9.0	2.0	0	310.1	310-13	0.0	Conformacion de la calzada existente	m2	613.952.00	\$ 888.00	\$ 545.189.376.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	121265.00	\$ 107.683.320.00
9.1	2.0	11602	310.1	310-13		Conformacion de la calzada existente	m2	-	\$ 888.00	\$ -	596.897.00	\$ 521.164.536.00	0.00	\$ -	-	154636.00	\$ 137.316.768.00
10.0	2.0	0	311.1	311-13	0.0	Afirmado	m3	161.539.00	\$ 106.030.00	\$ 17.127.980.170.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	13428.30	\$ 1.423.802.649.00
10.1	2.0	11602	311.1	311-13		Afirmado	m3	-	\$ 106.030.00	\$ -	159.110.70	\$ 15.916.237.521.00	0.00	\$ -	-	27076.90	\$ 2.870.963.707.00
11.0	2.0	0	320.1	320-13	0.0	Subbase Granular clase A	m3	75.232.00	\$ 152.246.00	\$ 11.453.771.072.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	591.60	\$ 90.068.734.00
11.1	2.0	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 152.246.00	\$ -	74.840.00	\$ 11.363.702.338.00	0.00	\$ -	-	2457.80	\$ 374.190.219.00
12.0	2.0	0	330.1	330-13	0.0	Base granular clase A	m3	155.841.00	\$ 169.384.00	\$ 26.363.091.144.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
12.1	2.0	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 169.384.00	\$ -	1.000.00	\$ 169.384.000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
13.0	2.0	0	330.4	330-13	0.0	Base granular para bacheo clase A	m3	22.950.00	\$ 184.265.00	\$ 4.218.211.750.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
13.1	2.0	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 184.265.00	\$ -	5.000.00	\$ 921.325.000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
SUB TOTAL										\$ 99.718.917.512.00		\$ 30.513.368.098.00	\$ 5.004.925.397.00				
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
14.0	8.0	0	420.2	420-13	0.0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	330.033.00	\$ 2.799.950.00	\$ 922.442.235.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	525.00	\$ 1.467.375.00
14.1	8.0	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	\$ 2.799.950.00	\$ -	329.509.00	\$ 920.974.867.00	0.00	\$ -	-	767.20	\$ 21.458.054.00
15.0	8.0	0	421.1	421-13	0.0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330.033.00	\$ 1.771.00	\$ 584.488.443.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
15.1	8.0	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.771.00	\$ -	330.033.00	\$ 584.488.443.00	0.00	\$ -	-	2700.00	\$ 4.761.700.00
16.0	8.0	0	450.2P	0.0		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	57.777.30	\$ 807.206.00	\$ 46.476.499.862.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
16.1	8.0	11603	450.2P	0.0		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 807.206.00	\$ -	57.577.00	\$ 46.476.499.862.00	0.00	\$ -	-	955.10	\$ 774.191.275.00
17.0	8.0	0	450.9P	0.0		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.830.00	\$ 834.513.00	\$ 4.030.697.790.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
17.1	8.0	11603	450.9P	0.0		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 834.513.00	\$ -	3.702.60	\$ 3.089.867.834.00	0.00	\$ -	-	1440.50	\$ 1.202.115.977.00
18.0	8.0	0	460.1P	0.0		Fresado de pavimento asfáltico	m3	3.450.00	\$ 69.747.00	\$ 240.827.150.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	1093.80	\$ 76.289.269.00
18.1	8.0	11603	460.1P	0.0		Fresado de pavimento asfáltico	m3	-	\$ 69.747.00	\$ -	2.356.20	\$ 164.337.881.00	0.00	\$ -	-	1541.40	\$ 107.508.026.00
19.0	8.0	0	465.1	465-13	0.0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el	m3	6.900.00	\$ 75.562.00	\$ 521.377.800.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	34.50	\$ 2.606.889.18
19.1	8.0	11603	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el	m3	-	\$ 75.562.00	\$ -	6.865.50	\$ 518.770.911.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
20.0	8.0	0	466.1	466-13	0.0	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	2.500.00	\$ 4.159.00	\$ 10.397.500.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
20.1	8.0	11603	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	-	\$ 4.159.00	\$ -	2.500.00	\$ 10.397.500.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
SUB TOTAL										\$ 52.786.530.780.00		\$ 52.786.530.336.00	\$ 3.131.248.521.18				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21.0	6.0	0	600.1.1	600-13	0.0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	79.580.00	\$ 31.287.00	\$ 2.489.819.460.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
21.1	6.0	11402	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 31.287.00	\$ -	61.628.00	\$ 1.928.155.236.00	297.90	\$ 9.320.397.00	16612.10	\$ 519.742.775.00	
21.2	6.0	11604	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 31.287.00	\$ -	26.412.00	\$ 826.352.244.00	0.00	\$ -	-	861.10	\$ 26.941.236.00
22.0	6.0	0	600.2.1	600-13	0.0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	40.802.00	\$ 78.424.00	\$ 3.199.856.048.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
22.1	6.0	11402	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 78.424.00	\$ -	16.787.40	\$ 1.316.535.058.00	0.00	\$ -	-	10.00	\$ 784.240.00
22.2	6.0	11604	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 78.424.00	\$ -	12.252.60	\$ 960.897.902.00	0.00	\$ -	-	95.20	\$ 7.465.965.00
23.0	6.0	0	610.1	610-13	0.0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31.832.00	\$ 42.839.00	\$ 1.366.834.248.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
23.1	6.0	11402	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$ 42.839.00	\$ -	9.450.40	\$ 405.790.726.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
23.2	6.0	11604	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$ 42.839.00	\$ -	9.549.60	\$ 410.050.274.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
24.0	6.0	0	610.2	610-13	0.0	Relleno para estructuras con rebase	m3	34.225.00	\$ 67.218.00	\$ 2.300.536.050.00	-	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -
24.1	6.0	11402	610.2	610-13		Relleno para estructuras con rebase	m3	-	\$ 67.218.00	\$ -	27.198.50	\$ 1.828.228.773.00	0.00	\$ -	-	8674.90	\$ 448.673.428.00
24.2	6.0	11604	610.2	610-13		Relleno para estructuras con rebase	m3	-	\$ 67.218.00	\$ -	11.656.50	\$ 783.526.617.00					

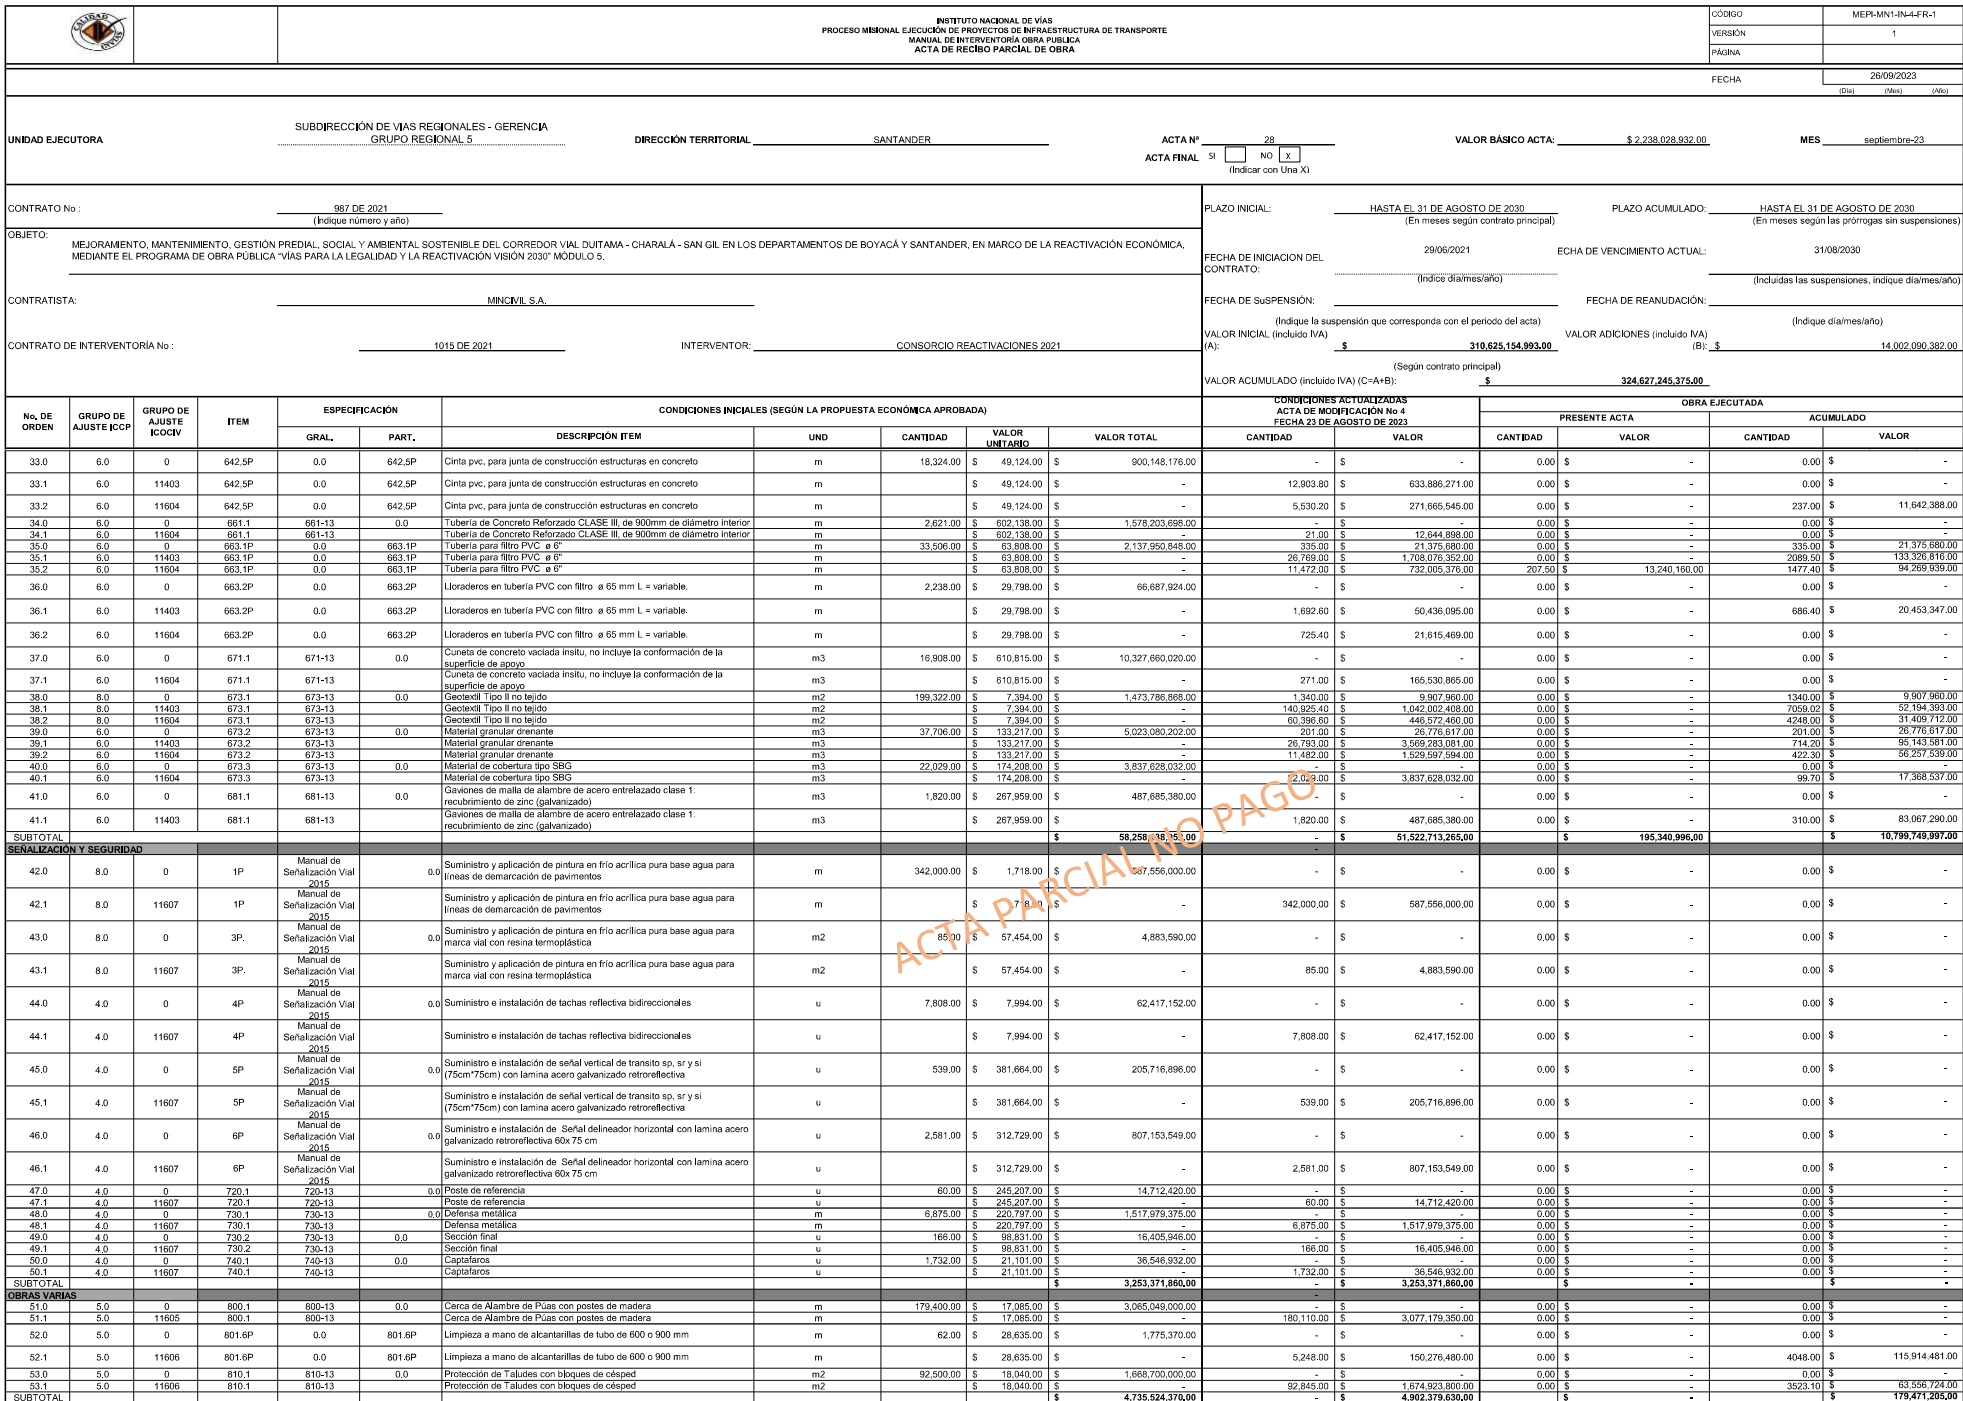

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								CÓDIGO MEPM-MN-IN-A-F-R-1																					
										VERSIÓN 1																					
										PÁGINA																					
										FECHA 26/09/2023 (Dia) (Mes) (Año)																					
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5												DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER		ACTA N° 28		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.238.028.932,00		MES septiembre-23													
UNIDAD EJECUTORA												ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con Una X)																			
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórogas sin suspensiones)															
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOIR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 5.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)				ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)															
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.												FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021												INTERVENIOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00															
												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 319.625.154.993,00				(Según contrato principal)															
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00																			
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)												CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023				OBRA EJECUTADA															
No. DE ORDEN												GRUPO DE AJUSTE ICOP				PRESENTA ACTA				ACUMULADO											
ITEM												DESCRIPCIÓN ITEM				UND				CANTIDAD				VALOR UNITARIO				VALOR TOTAL			
GRAL.												PART.																			
11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada												\$ -				\$ -															
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenajes												\$ 9.320.397,00				\$ 969.200.443,00															
11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y explanación												\$ 1.866.227.634,00				\$ 31.870.083.021,00															
11601 - Preliminares y explanación												\$ 184.023.635,00				\$ 2.091.471.999,00															
11602 - Afirmados, subbases y bases												\$ -				\$ 3.382.470.694,00															
11603 - Pavimentos asfálticos / concreto												\$ 19.258.823,00				\$ 2.219.877.558,00															
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes												\$ 24.434.243,00				\$ 748.673.825,00															
11605 - Obras de urbanismo												\$ -				\$ -															
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental												\$ -				\$ 636.588.509,00															
11607 - Señalización y control de tránsito												\$ -				\$ -															
11608 - Transporte y sobre acarreo												\$ 134.764.200,00				\$ 1.417.133.250,00															
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes												\$ -				\$ -															
TOTAL												\$ 2.238.028.932,00				\$ 43.335.499.299,00															
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuáles de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. Para constancia de lo anterior firman:																															
Firma Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.																															
Firma Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula profesional No.: 167666-T																															



9. ANEXOS

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES		VALOR DE AJUSTE	MES INDICE	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR EJECUTAR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO					%	VALOR AJUSTE	
7	dic-21	\$ 2,619,791,147.60	\$ 2,850,340,859.00	\$ 484,661,362.31	\$ 1,810,403,591.00	\$ 1,810,403,591.00	dic-21	\$ (230,549,711)		100.00%	\$ 1,810,403,591	
8	ene-21	\$ 3,181,340,559.46	\$ 3,767,720,405.20	\$ 561,549,411.86	\$ 917,379,547.00	\$ 917,379,547.00	ene-21	\$ (586,379,846)		100.00%	\$ 917,379,547	
9	feb-22	\$ 3,883,277,324.29	\$ 4,562,897,511.45	\$ 701,936,764.83	\$ 795,177,106.00	\$ 795,177,106.00	feb-22	\$ (679,620,187)		100.00%	\$ 795,177,106	
10	mar-22	\$ 4,725,601,442.09	\$ 5,160,540,672.45	\$ 842,324,117.79	\$ 597,643,161.00	\$ 597,643,161.00	mar-22	\$ (434,939,230)		100.00%	\$ 597,643,161	
11	abr-22	\$ 5,848,700,265.81	\$ 5,636,678,666.25	\$ 1,123,098,823.73	\$ 476,137,993.00	\$ 476,137,993.00	abr-22	\$ 212,021,600	\$ 212,021,600	100.00%	\$ 476,137,993	
12	may-22	\$ 6,971,799,089.54	\$ 6,192,798,904.25	\$ 1,123,098,823.73	\$ 556,120,238.00	\$ 212,021,600.36	abr-22	\$ -		38.13%	\$ 212,021,600	
						\$ 344,098,637.64	may-22	\$ 779,000,186	\$ 779,000,185	61.87%	\$ 344,098,638	
13	jun-22	\$ 8,375,672,619.19	\$ 6,667,430,974.18	\$ 1,403,873,529.66	\$ 474,632,070.00	\$ 474,632,070.00	may-22	\$ 304,368,116		100.00%	\$ 474,632,070.0	
						\$ 0.00	jun-21	\$ 1,403,873,530	\$ 1,708,241,645	0.00%	\$ -	
14	jul-22	\$ 9,919,933,501.81	\$ 7,684,167,043.25	\$ 1,544,260,882.62	\$ 1,016,736,069.00	\$ 304,368,116.09	may-22	\$ -		29.94%	\$ 304,368,116.1	
						\$ 712,367,952.91	jun-21	\$ 691,505,577		70.06%	\$ 712,367,952.9	
							jul-22	\$ 1,544,260,883	\$ 2,235,766,459	0.00%	\$ -	
15	ago-22	\$ 11,695,869,835.40	\$ 9,356,523,945.30	\$ 1,775,936,333.59	\$ 1,672,356,902.00	\$ 691,505,576.74	jun-21	\$ -		41.35%	\$ 691,505,576.7	
						\$ 980,851,325.26	jul-22	\$ 563,409,557		58.65%	\$ 980,851,325.3	
						\$ 0.00	ago-22	\$ 1,775,936,334	\$ 2,339,345,890	0.00%	\$ -	
16	sep-22	\$ 13,687,277,082.90	\$ 12,403,627,043.30	\$ 1,991,407,247.52	\$ 3,047,103,092.00	\$ 563,409,557.36	jul-22	\$ -		18.49%	\$ 563,409,557.4	
						\$ 1,775,936,333.59	ago-22	\$ -		58.28%	\$ 1,775,936,333.6	
						\$ 707,757,201.04	sep-22	\$ 1,283,650,046	\$ 1,283,650,040	23.23%	\$ 707,757,201.0	
17	oct-22	\$ 17,639,779,895.40	\$ 15,865,228,801	\$ 3,952,502,812.50	\$ 3,461,601,764	\$ 1,283,650,046.48	sep-22	\$ -		37.08%	\$ 1,283,650,046	
						\$ 2,177,951,717.52	oct-22	\$ 1,774,551,095	\$ 1,774,551,094	62.92%	\$ 2,177,951,718	
18	nov-22	\$ 23,182,093,298.20	\$ 19,282,112,072	\$ 5,542,313,402.83	\$ 3,416,883,271	\$ 1,774,551,094.97	oct-22	\$ -		51.93%	\$ 1,774,551,095	
						\$ 1,642,332,176.03	nov-22	\$ 3,899,981,227	\$ 3,899,981,226	48.07%	\$ 1,642,332,176	
19	dic-22	\$ 28,731,199,561.80	\$ 24,446,958,823	\$ 5,549,106,263.62	\$ 5,164,846,751	\$ 3,899,981,226.81	nov-22	\$ -		75.51%	\$ 3,899,981,227	
						\$ 1,264,865,524.19	dic-22	\$ 4,284,240,739	\$ 4,284,240,739	24.49%	\$ 1,264,865,524	
20	ene-23	\$ 29,187,707,325.20	\$ 26,472,117,816	\$ 456,507,763.45	\$ 2,025,158,993	\$ 2,025,158,993.00	dic-22	\$ 2,259,081,746		100.00%	\$ 2,025,158,993	
						\$ 0.00	ene-23	\$ 456,507,763	\$ 2,715,589,509	0.00%	\$ 0	
21	feb-23	\$ 29,763,555,960.90	\$ 29,696,133,791	\$ 575,848,635.74	\$ 3,224,015,975	\$ 2,259,081,746.42	dic-22	\$ -		70.07%	\$ 2,259,081,746	
						\$ 456,507,763.45	ene-23	\$ -	\$ -	14.16%	\$ 456,507,763	
						\$ 508,426,465.13	feb-23	\$ 67,422,171	\$ 67,422,170	15.77%	\$ 508,426,465	
22	mar-23	\$ 30,455,097,421.70	\$ 33,692,461,652	\$ 691,541,460.76	\$ 3,996,327,861	\$ 67,422,170.61	feb-23	\$ -		1.69%	\$ 67,422,171	
						\$ 3,928,905,690.39	mar-23	\$ (3,237,364,230)	\$ -	98.31%	\$ 3,928,905,690	
23	abr-23	\$ 31,583,519,181.00	\$ 36,993,270,962	\$ 1,128,112,127.11	\$ 3,332,505,693	\$ 3,332,505,693.00	abr-23	\$ (5,441,757,796)		100.00%	\$ 3,332,505,693	
24	may-23	\$ 32,630,416,661.10	\$ 39,222,519,761	\$ 1,046,897,480.05	\$ 2,682,798,246	\$ 2,682,798,246.00	may-23	\$ (7,077,658,561)		100.00%	\$ 2,682,798,246	
25	jun-23	\$ 33,764,164,985.90	\$ 40,121,016,894	\$ 1,133,748,324.82	\$ 898,497,133	\$ 898,497,133.00	jun-23	\$ (6,842,407,370)		100.00%	\$ 898,497,133	
26	jul-23	\$ 34,993,079,114.70	\$ 40,429,962,070	\$ 1,228,914,128.84	\$ 308,945,176	\$ 308,945,176.00	jul-23	\$ (5,922,438,417)		100.00%	\$ 308,945,176	
27	ago-23	\$ 37,923,641,590.50	\$ 43,947,811,226	\$ 2,930,562,475.84	\$ 3,517,849,156	\$ 3,517,849,156.00	ago-23	\$ (6,509,725,097)		100.00%	\$ 3,517,849,156	
28	sep-23	\$ 40,883,509,691.10	\$ 46,185,840,158	\$ 2,959,868,100.60	\$ 2,238,028,932	\$ 2,238,028,932.00	sep-23	\$ (5,787,885,928)		100.00%	\$ 2,238,028,932	

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

GRUPO DE AJUSTE	MES DE DICIEMBRE-21	PROPORCION	APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES			TOTAL
	DISTRIBUCION POR GRUPOS		dic-21			
Obras de explanación	184,023,635.0	8.22%	184,023,635.00	-	-	184,023,635.00
Subbases y bases	-	0.00%	-	-	-	-
Transporte de materiales	134,764,200.0	6.02%	134,764,200.00	-	-	134,764,200.00
Aceros y elementos metálicos	1,459,636,986.0	65.22%	1,459,636,986.00	-	-	1,459,636,986.00
Aceros y elementos metálicos	-	0.00%	-	-	-	-
Concretos, morteros y obras varias	440,345,288.0	19.68%	440,345,288.00	-	-	440,345,288.00
Concreto para estructura de puentes	-	0.00%	-	-	-	-
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	19,258,823.0	0.86%	19,258,823.00	-	-	19,258,823.00
TOTAL OBRAS	2,238,028,932.0	100.000%	2,238,028,932.00	-	-	2,238,028,932.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

GRUPO DE AJUSTE	MES DE SEPTIEMBRE-23	PROPORCION	APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES			TOTAL
	DISTRIBUCION POR GRUPOS		ago-23	sep-23		
11401 - Preliminares, obras de contención y malla e	-	0.00%	-	-		-
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, relleno	9,320,397.0	0.42%	-	9,320,397.00		9,320,397.00
11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistema	1,866,227,634.0	83.39%	-	1,866,227,634.00		1,866,227,634.00
11601 - Preliminares y explanación	184,023,635.0	8.22%	-	184,023,635.00		184,023,635.00
11602 - Afirmados, subbases y bases	-	0.00%	-	-		-
11603 - Pavimentos asfálticos / concreto	19,258,823.0	0.86%	-	19,258,823.00		19,258,823.00
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	24,434,243.0	1.09%	-	24,434,243.00		24,434,243.00
11605 - Obras de urbanismo	-	0.00%	-	-		-
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental	-	0.00%	-	-		-
11607 - Señalización y control de tránsito	-	0.00%	-	-		-
11608 - Transporte y sobre acarreo	134,764,200.0	6.02%	-	134,764,200.00		134,764,200.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura,	-	0.00%	-	-		-
TOTAL OBRAS	2,238,028,932.0	100.00%	-	2,238,028,932.00	-	2,238,028,932.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Índices 2021													
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78	
Canasta General													
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26	
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20	
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43	
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56	
1 Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21	
2 Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43	
3 Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89	
4 Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28	
5 Acero estructural y cables de acero	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28	
6 Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30	
7 Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67	

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo						2021	2023								
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-	Capítulo constructivo	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11401	Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada	118.97	132.80	135.46	135.86	135.65	135.98	135.45	135.19	134.08	134.28
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11402	Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje	103.58	119.39	122.80	123.04	123.80	124.07	124.06	124.34	124.48	124.50
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11403	Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados	106.65	123.83	126.49	127.35	127.94	127.84	127.47	127.31	126.81	126.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	Preliminares y explanación	103.28	115.70	118.02	118.78	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	Afirmados, subbases y bases	102.44	114.91	117.90	119.71	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	104.35	126.71	131.73	132.31	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	109.42	123.17	125.08	125.23	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	Obras de urbanismo	105.35	121.13	123.23	123.96	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.95	123.30	125.51	125.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	Señalización y control de tránsito	102.36	128.39	131.60	130.88	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	Transporte y sobre acarreo	100.89	108.97	111.19	111.67	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.58	124.33	128.77	129.39	129.78	129.97	130.32	130.69	130.37	130.57

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C., en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 27 de octubre de 2023

MUROS DE CONTENCIÓN
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE
PUENTES

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No: 011920130 CPITVC
