



Fecha de Expedición: 11/10/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 10/11/2024

MINICIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo EBOG del 3001 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo: 0
TRM: 1,00

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia
Telefono: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:


"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1		Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 40 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUPERVISOR DEL CONTRATO: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINICIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100%	1,0000	94	1.395.517.118,00	0,00	0,00	1.395.517.118,00		0,00	
2		Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 40 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,0000	94	279.103.424,00	0,00	0,00	279.103.424,00			0,00
3		Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 40 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,0000	94	69.775.856,00	0,00	0,00	69.775.856,00			0,00
4		Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 40 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,0000	94	69.775.856,00	0,00	0,00	69.775.856,00	19	13.257.413,00	



Observaciones:
#\$24-02-00;987-2021;oacevedo@invias.gov.co#\$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Fecha de Expedición: 11/10/2024 00:00
Fecha de Vencimiento: 10/11/2024

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 3289770

Correo:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764065063054 del 6/02/2024 al 6/08/2025 Autoriza con Prefijo EBOG del 3001 al 4000.




Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	1.814.172.254,00
IVA	13.257.413,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	69.775.856,00
Bruto + Impuestos	1.827.429.667,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	1.827.429.667,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#\$24-02-00;987-2021;oacevedo@invias.gov.co#\$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°40

SEPTIEMBRE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
02/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PERIODO MES: septiembre-24

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 40
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,814,172,254

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2 10 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	3 10 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA	Mediante oficio 0940-2348 del 2/10/2024 se recibe el acta parcial de obra para rellisión. Mediante correo electrónico del 03/10/2024se devuelve la preacta de obra para correcciones de 14 ítems; se recibieron las conexiones el día 04/10/2024 y se recibe el 7/10/2024 el documento en PDF definitivo para revisión final
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7 10 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7 10 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7 10 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	NO APLICA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL INTERVENTOR
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	11 10 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1.827.429.667 VALOR EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 40
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO septiembre-2024
(Indicar el periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No. 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
Fecha firma: 11/10/24 RES 970 DE 02/04/24
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: 25202-59853
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	<u> </u>	ACTA DE OBRA	☒ 40	<u>septiembre-24</u>
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	<u> </u>	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	<u> </u>
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	<u> </u>	ACTA DE AJUSTE	☐	<u> </u>
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	<u> </u>
			OTRO	☐	<u> </u>
			CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 245024 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO \$ 1,827,429,667.00

TOTAL ACTA \$ 1,827,429,667.00

Firma *Victor Manuel Ruiz V.*
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado RP245024;10;1827429667
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE OBRA 40 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE OBRA 40 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP245024;10;1827429667



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFIN-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 987 DE 2021

Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

Acta N° 40 Valor basico \$ 1,814,172,254.00 Período septiembre-2024

Valor Incluido Iva \$ 1,827,429,667.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57	Duitama -Charalá	\$ 1,827,429,667.00		\$ -	\$ 1,827,429,667.00
2	57	Charalá -San Gil				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 1,827,429,667.00	\$		\$ 1,827,429,667.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	Boyacá	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	MUNICIPIO 1	Duitama	\$ 1,644,686,700.00	\$ 1,632,755,029.00
891801240-1	MUNICIPIO 2	Paipa		
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 1,644,686,700.00	\$ 1,632,755,029.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	Santander	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	MUNICIPIO 1	Gambita		
890205063-4	MUNICIPIO 2	Charalá	\$ 182,742,967.00	\$ 181,417,225.00
800099819-2	MUNICIPIO 3	Paramo		
800099824-1	MUNICIPIO 4	San Gil		
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 182,742,967.00	\$ 181,417,225.00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matricula profesional No.: 167666-T

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO 0.00 MEPLAN14N4-FR-1																			
		VERSIÓN 1										PÁGINA																			
												FECHA 2/10/2024 (Día) (Mes) (Año)																			
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5..... DIRECCIÓN TERRITORIAL..... SANTANDER														ACTA N°..... 40		VALOR BÁSICO ACTA:..... \$ 1.814.172.254,00		MES..... septiembre-24													
UNIDAD EJECUTORA														ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con Una X)																	
CONTRATO No.:..... 987 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL:..... HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:..... HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)															
OBJETO:..... MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA.- CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:..... 29/06/2021 (Indice día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:..... 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)															
CONTRATISTA:..... MINICIVIL S.A.														FOLIO DE SUSPENSIÓN:.....		FOLIO DE REANUDACIÓN:.....															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:..... 1015 DE 2021														INTERVENTOR:..... CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):..... \$ 310.625.154.993,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):..... \$ 14.002.090.382,00													
														(Según contrato principal)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):..... \$ 324.627.245.375,99															
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA															
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE ICCP		GRUPO DE AJUSTE ICCOV		ITEM		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO															
								GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ITEM		UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
EXPLANACIONES																															
1.0	1.0	0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	34,00	\$	1.137.185,00	\$	38.664.290,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
1.1	1.0	11601	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$	1.137.185,00	\$	-	36,00	\$	40.938.660,00	0,02	\$	22.744,00	2,82	\$	3.206.862,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
2.0	1.0	0	201.7	201-13	0.0	Demolición de Estructuras	m3	213,00	\$	109.175,00	\$	23.254.275,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
2.1	1.0	11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$	109.175,00	\$	-	435,70	\$	47.667.548,00	3,30	\$	360.278,00	339,85	\$	37.103.125,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
3.0	1.0	0	201.2	201-13	0.0	Remoción de alcantarillas	m	1.278,00	\$	66.695,00	\$	85.236.210,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
3.1	1.0	11601	201.2	201-13		Remoción de alcantarillas	m		\$	66.695,00	\$	-	1.281,00	\$	85.436.295,00	7,00	\$	466.885,00	118,00	\$	7.870.070,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
4.0	1.0	0	210.1.2	210-13	0.0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	257.483,00	\$	12.048,00	\$	3.102.185.184,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
4.1	1.0	11601	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3		\$	12.048,00	\$	-	1.625,00	\$	19.578.000,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
5.0	1.0	0	210.2.1	210-13	0.0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	93.966,00	\$	60.236,00	\$	5.661.340.696,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
5.1	1.0	11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$	60.236,00	\$	-	80.569,00	\$	4.853.154.284,00	0,00	\$	-	25077,40	\$	1.510.562.267,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
6.0	1.0	0	210.2.2	210-13	0.0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2.168.927,00	\$	10.193,00	\$	22.107.872.911,00	-	\$	-	0,00	\$	-	3352,10	\$	34.167.955,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
6.1	1.0	11601	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		\$	10.193,00	\$	-	1.666.824,90	\$	16.989.946.206,00	1,618,10	\$	16.493.293,00	81673,50	\$	832.497.986,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
7.0	1.0	0	211.1	211-13	0.0	Remoción de Derrumbes	m3	116.576,00	\$	9.335,00	\$	1.088.236.960,00	-	\$	-	0,00	\$	-	593,00	\$	5.535.655,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
7.1	1.0	11601	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		\$	9.335,00	\$	-	123.833,00	\$	1.155.881.050,00	82,80	\$	772.938,00	19043,10	\$	177.767.338,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
8.0	1.0	0	220.1	220-1	0.0	Terraplenes	m3	514.966,00	\$	12.565,00	\$	6.470.547.790,00	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
8.1	1.0	11601	220.1	220-1		Terraplenes	m3		\$	12.565,00	\$	-	190.406,00	\$	2.392.451.390,00	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
SUB TOTAL														\$ 38.577.308.316,00		-		\$ 25.661.922.660,00		\$ 18.116.118,00		\$ 2.645.876.811,00									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																															
9.0	2.0	0	310.1	310-13	0.0	Conformación de la calzada existente	m2	613.952,00	\$	888,00	\$	545.189.376,00	-	\$	-	0,00	\$	-	121.265,00	\$	107.883.320,00	0,00	\$	-	121.265,00	\$	107.883.320,00	0,00	\$	-	
9.1	2.0	11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		\$	888,00	\$	-	586.897,00	\$	521.164.538,00	2.723,60	\$	2.418.557,00	422839,40	\$	375.481.388,00	0,00	\$	-	422.839,40	\$	375.481.388,00	0,00	\$	-	
10.0	2.0	0	311.1	311-13	0.0	Afirmado	m3	161.539,00	\$	106.030,00	\$	17.127.980.170,00	-	\$	-	0,00	\$	-	13.428,30	\$	1.423.802.649,00	0,00	\$	-	13.428,30	\$	1.423.802.649,00	0,00	\$	-	
10.1	2.0	11602	311.1	311-13		Afirmado	m3		\$	106.030,00	\$	-	150.110,70	\$	15.916.237.521,00	342,90	\$	36.357.687,00	28868,20	\$	3.060.895.246,00	0,00	\$	-	28.868,20	\$	3.060.895.246,00	0,00	\$	-	
11.0	2.0	0	320.1	320-13	0.0	Subbase Granular clase A	m3	75.232,00	\$	152.246,00	\$	11.453.771.072,00	-	\$	-	0,00	\$	-	391,60	\$	90.968.754,00	0,00	\$	-	391,60	\$	90.968.754,00	0,00	\$	-	
11.1	2.0	11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$	152.246,00	\$	-	61.140,40	\$	9.308.361.338,00	1.398,40	\$	212.900.806,00	6375,60	\$	970.659.598,00	0,00	\$	-	6.375,60	\$	970.659.598,00	0,00	\$	-	
12.0	2.0	0	330.1	330-13	0.0	Base granular clase A	m3	155.641,00	\$	169.384,00	\$	26.363.095.144,00	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
12.1	2.0	11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		\$	169.384,00	\$	-	11.000,00	\$	1.863.224.000,00	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
13.0	2.0	0	330.4	330-13	0.0	Base granular para bacheo clase A	m3	22.950,00	\$	184.265,00	\$	4.228.881.750,00	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
13.1	2.0	11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		\$	184.265,00	\$	-	5.000,00	\$	921.325.000,00	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
SUB TOTAL														\$ 59.718.917.512,00		-		\$ 30.151.887.098,00		\$ 251.677.050,00		\$ 6.028.596.935,00									
PAVIMENTOS ASFALTICOS																															
14.0	8.0	0	420.2	420-13	0.0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	330.033,00	\$	2.795,00	\$	922.442.235,00	-	\$	-	525,00	\$	1.467.375,00	0,00	\$	-	525,00	\$	-	525,00	\$	1.467.375,00	0,00	\$	-	
14.1	8.0	11603	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$	2.795,00	\$	-	312.008,00	\$	872.062.360,00	0,00	\$	-	7677,30	\$	21.458.054,00	0,00	\$	-	7.677,30	\$	21.458.054,00	0,00	\$	-	
15.0	8.0	0	421.1	421-13	0.0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330.033,00	\$	1.771,00	\$	584.488.443,00	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
15.1	8.0	11603	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$	1.771,00	\$	-	315.033,00	\$	557.923.443,00	0,00	\$	-	2700,00	\$	4.781.700,00	0,00	\$	-	2.700,00	\$	4.781.700,00	0,00	\$	-	
16.0	8.0	0	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57.577,00	\$	807.206,00	\$	46.476.499.862,00	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
16.1	8.0	11603	450.2P	0.0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$	807.206,00	\$	-	55.077,00	\$	44.458.484.862,00	0,00	\$	-	959,10	\$	774.191.275,00	0,00	\$	-	9.591,10	\$	7.741.912.750,00	0,00	\$	-	
17.0	8.0	0	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4.830,00	\$	834.513,00	\$	4.030.697.790,00	-	\$	-	0,00	\$	-	1.127,40	\$	940.829.956,00	0,00	\$	-	1.127,40	\$	940.829.956,00	0,00	\$	-	
17.1	8.0	11603	450.9P	0.0	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$	834.513,00	\$	-	3.702,60	\$	3.089.867.833,80	0,00	\$	-	1483,60	\$	1.238.083.487,00	0,00	\$	-	1.483,60	\$	1.238.083.487,00	0,00	\$	-	
18.0	8.0	0	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	3.450,00	\$	69.747,00	\$	240.627.150,00	-	\$	-	1.093,80	\$	76.289.268,60	0,00	\$	-	1093,80	\$	-	10.938,00	\$	76.289.269,00	0,00	\$	-	
18.1	8.0	11603	460.1P	0.0	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$	69.747,00	\$	-	2.356,20	\$	164.337.881,00	0,00	\$	-	1541,40	\$	107.508.026,00	0,00	\$	-	1.541,40	\$	107.508.026,00	0,00	\$	-	
19.0	8.0	0	465.1	465-13	0.0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3	6.900,00	\$	75.562,00	\$	521.377.800,00	-	\$	-	34,80	\$	2.629.557,60	0,00	\$	-	34,50	\$	-	3.450,00	\$	2.606.889,18	0,00	\$	-	
19.1	8.0	11603	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3		\$	75.562,00	\$	-	16.787,40	\$	1.316.535.058,00	0,00	\$	-	10,00	\$	754.240,00	0,00	\$	-	10,00	\$	754.240,00	0,00	\$	-	
20.0	8.0	0	466.1	466-13	0.0	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	2.500,00	\$	4.159,00	\$	10.397.500,00	-	\$	-	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
20.1	8.0	11603	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m		\$	4.159,00	\$	-	2.500,00	\$	10.397.500,00	0,00	\$	-	-	\$	-	-	0,00	\$	-	-	0,00	\$	-	-	
SUB TOTAL														\$ 52.786.530.786,00		-		\$ 50.683.060.948,00		\$ -		\$ 3.167.216.031,18									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																															
2																															

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN14N-4-FR-1	
VERSIÓN 1													
PÁGINA													
FECHA 2/10/2024 (Día) (Mes) (Año)													
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5..... DIRECCIÓN TERRITORIAL..... SANTANDER.....													
UNIDAD EJECUTORA..... ACTA N° 40 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.814.172.254,00 MES septiembre-24													
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con Una X)													
CONTRATO No.: 987 DE 2021 (Indique número y año)													
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)													
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA.- CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5													
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030													
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. (Indique días/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique días/mes/año)													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021													
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00													
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00													
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024													
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)													
CONDICIONES ACTUALIZADAS													
OBRA EJECUTADA													
PRESENTE ACTA													
ACUMULADO													
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR													
27.2 6.0 11604 630.4 630-13 0.0 Concreto clase 21 MPA m3 311,00 \$ 670.387,00 \$ - 2.896,00 \$ 1.941.382.832,00 0,00 \$ - 94,70 \$ 63.483.755,00													
28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 Concreto clase 17,5 MPA m3 311,00 \$ 500.114,00 \$ 155.535.454,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
28.1 6.0 11403 630.5 630-13 0.0 Concreto clase 17,5 MPA m3 217,70 \$ 108.874.818,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
28.2 6.0 11604 630.5 630-13 0.0 Concreto clase 17,5 MPA m3 93,30 \$ 46.660.636,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 Concreto clase 14 MPA m3 1.264,00 \$ 493.322,00 \$ 623.559.008,00 - \$ - 0,00 \$ -													
29.1 6.0 11403 630.6 630-13 0.0 Concreto clase 14 MPA m3 493,322,00 \$ - 1.010,80 \$ 498.649.878,00 10,50 \$ 5.179.881,00 118,33 \$ 58.374.792,00													
29.2 6.0 11604 630.6 630-13 0.0 Concreto clase 14 MPA m3 493,322,00 \$ - 433,20 \$ 213.707.090,00 7,70 \$ 3.798.579,00 162,20 \$ 80.016.828,00													
30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P Baranda Metálica m 40,00 \$ 518.996,00 \$ 20.759.840,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P Baranda Metálica m 40,00 \$ 518.996,00 \$ 20.759.840,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1.351.834,00 \$ 5.151,00 \$ 6.963.296.934,00 - \$ - 0,00 \$ -													
31.1 4.0 11403 640.1 640-13 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.151,00 \$ - 1.644.590,20 \$ 8.471.284.120,00 51,996,70 \$ 267.835.002,00 128.265,40 \$ 6.806.942.512,00													
31.2 4.0 11604 640.1 640-13 0.0 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.151,00 \$ - 625.450,20 \$ 3.221.693.980,00 91,60 \$ 471.832,00 377,69 \$ 194.552.756,00													
32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110.609,00 \$ 5.251,00 \$ 580.807.859,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
32.1 4.0 11401 640.2 640-13 0.0 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 5.251,00 \$ - 22.853,00 \$ 120.001.103,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
33.0 6.0 0 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 18.324,00 \$ 49.124,00 \$ 900.148.176,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
33.1 6.0 11403 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 49.124,00 \$ - 12.903,80 \$ 633.866.271,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
33.2 6.0 11604 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 49.124,00 \$ - 5.530,20 \$ 271.865.545,00 0,00 \$ - 314,80 \$ 15.464.235,00													
34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de m 2.821,00 \$ 602.138,00 \$ 1.578.203.696,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
34.1 6.0 11604 661.1 661-13 0.0 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de m 602.138,00 \$ - 21,00 \$ 12.844.898,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 33.506,00 \$ 63.808,00 \$ 2.137.950.648,00 335,00 \$ 21.375.680,00 0,00 \$ - 335,00 \$ 21.375.680,00													
35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 63.808,00 \$ - 26.769,00 \$ 1.708.076.352,00 123,60 \$ 7.886.669,00 243,20 \$ 155.181.056,00													
35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 63.808,00 \$ - 11.472,00 \$ 732.005.376,00 114,90 \$ 7.331.539,00 4001,10 \$ 255.302.188,00													
36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P Libradores en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable m 2.238,00 \$ 29.798,00 \$ 66.687.924,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P Libradores en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable m 29.798,00 \$ - 1.692,60 \$ 50.436.095,00 0,00 \$ - 893,20 \$ 26.317.593,00													
36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P Libradores en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable m 29.798,00 \$ - 725,40 \$ 21.615.469,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 16.908,00 \$ 610.815,00 \$ 10.327.660.020,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
37.1 6.0 11604 671.1 671-13 0.0 Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 610.815,00 \$ - 271,00 \$ 165.530.865,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
38.0 6.0 0 673.1 673-13 0.0 Geotextil Tipo II no tejido m2 199.322,00 \$ 7.394,00 \$ 1.473.786.868,00 1.340,00 \$ 9.907.860,00 0,00 \$ - 1340,00 \$ 9.907.860,00													
38.1 6.0 11403 673.1 673-13 0.0 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.394,00 \$ - 140.925,40 \$ 1.042.002.408,00 467,50 \$ 3.456.895,00 7671,52 \$ 56.723.278,00													
38.2 6.0 11604 673.1 673-13 0.0 Geotextil Tipo II no tejido m2 7.394,00 \$ - 60.396,50 \$ 446.572.460,00 0,00 \$ - 10350,30 \$ 76.530.118,00													
39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 Material granular drenante m3 37.706,00 \$ 133.217,00 \$ 5.023.080.202,00 201,00 \$ 26.776.617,00 0,00 \$ - 201,00 \$ 26.776.617,00													
39.1 6.0 11403 673.2 673-13 0.0 Material granular drenante m3 133.217,00 \$ - 26.793,00 \$ 3.569.283.081,00 0,00 \$ - 518,60 \$ 69.086.335,00													
39.2 6.0 11604 673.2 673-13 0.0 Material granular drenante m3 133.217,00 \$ - 11.482,00 \$ 1.529.597.594,00 68,90 \$ 9.178.651,00 1663,70 \$ 221.633.123,00													
40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 Material de cobertura tipo SBG m3 22.029,00 \$ 174.208,00 \$ 3.837.628.032,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
40.1 6.0 11604 673.3 673-13 0.0 Material de cobertura tipo SBG m3 174.208,00 \$ - 22.029,00 \$ 3.837.628.032,00 10,30 \$ 1.794.342,00 243,50 \$ 42.419.648,00													
41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 1.820,00 \$ 267.959,00 \$ 487.685.380,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
41.1 6.0 11403 681.1 681-13 0.0 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 267.959,00 \$ - 1.820,00 \$ 487.685.380,00 0,00 \$ - 328,00 \$ 87.890.552,00													
SUBTOTAL \$ 58.258.138.952,00 \$ 52.625.523.821,00 \$ 584.209.814,00 \$ 15.002.400.203,00													
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
42.0 8.0 0 1P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 342.000,00 \$ 1.718,00 \$ 587.556.000,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
42.1 8.0 11607 1P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 1.718,00 \$ - 342.000,00 \$ 587.556.000,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
43.0 8.0 0 3P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica m2 85,00 \$ 57.454,00 \$ 4.883.590,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
43.1 8.0 11607 3P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica m2 57.454,00 \$ - 85,00 \$ 4.883.590,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
44.0 4.0 0 4P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 7.808,00 \$ 7.994,00 \$ 62.417.152,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
44.1 4.0 11607 4P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 7.994,00 \$ - 7.808,00 \$ 62.417.152,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
45.0 4.0 0 5P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, y y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 539,00 \$ 381.664,00 \$ 205.716.896,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -													
45.1 4.0 11607 5P Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, y y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 381.664,00 \$ - 539,00 \$ 205.716.896,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -													

776

	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO: MEPLANT-IN-4-FR-I-
		VERSIÓN: 1
		PÁGINA:

FECHA: 2/10/2024
(Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5	DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	ACTA N°: 40	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.814.172.254,00	MES: septiembre-24	
		ACTA FINAL: Si ☐ No ☒	(Indicar con Una X)		

CONTRATO NO.: 987 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR VÍAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.	H-LUMA UT: SUSPENSIÓN:	H-LUMA UT: REANUDACIÓN:
<small>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)</small>		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN NO.: 1015 DE 2021	INTERVENIENTE: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (\$): 14.002.090.382,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALESZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024					OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				ACUMULADO	
						DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
				GRAL.	PART.																
46.0	4.0	0	6P	Manual de Señalización Vial 2015.	0.0	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm	u	2.581,00	\$ 312,729.00	\$ 807,153,549.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
46.1	4.0	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015.		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x75 cm	u		\$ 312,729.00	\$ -	2.581,00	\$ 807,153,549.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
47.0	4.0	0	720.1	720+13	0.0	Poste de referencia	u	60.00	\$ 245,207.00	\$ 14,712,420.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
47.1	4.0	11607	720.1	720+13		Poste de referencia	u		\$ 245,207.00	\$ -	60.00	\$ 14,712,420.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
48.0	4.0	0	730.1	730+13	0.0	Defensa metálica	m	6,875.00	\$ 220,797.00	\$ 1,517,979,375.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
48.1	4.0	11607	730.1	730+13		Defensa metálica	m		\$ 220,797.00	\$ -	6,875.00	\$ 1,517,979,375.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
49.0	4.0	0	730.2	730+13	0.0	Sección final	u	166.00	\$ 98,831.00	\$ 16,405,946.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
49.1	4.0	11607	730.2	730+13		Sección final	u		\$ 98,831.00	\$ -	166.00	\$ 16,405,946.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
50.0	4.0	0	740.1	740+13	0.0	Captafaros	u	1,732.00	\$ 21,101.00	\$ 36,546,932.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
50.1	4.0	11607	740.1	740+13		Captafaros	u		\$ 21,101.00	\$ -	1,732.00	\$ 36,546,932.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
SUBTOTAL OBRAS VARIAS									\$ 3,253,371,860.00	\$ -	3,253,371,860.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -				
51.0	5.0	0	800.1	800+13	0.0	Cerca de Alambre de Puas con postes de madera	m	179,400.00	\$ 17,085.00	\$ 3,065,049,000.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
51.1	5.0	11605	800.1	800+13		Cerca de Alambre de Puas con postes de madera	m		\$ 17,085.00	\$ -	180,110.00	\$ 3,077,179,350.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
52.0	5.0	0	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	62.00	\$ 28,635.00	\$ 1,775,370.00	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
52.1	5.0	11606	801.6P	0.0	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm															

<

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPA/MN/4N-4-FR-1	
										VERSIÓN 1			
										PÁGINA			
										FECHA 2/10/2024			
										(Dia) (Mes) (Año)			
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA N° 40 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.814.172.254,00 MES septiembre-24													
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA N° 40 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.814.172.254,00 MES septiembre-24													
CONTRATO No.: 987 DE 2021 (Indique número y año)													
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 5.													
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021													
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030													
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)													
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/09/2030													
(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)													
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:													
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)													
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00													
(Según contrato principal)													
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00													
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024													
OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA ACUMULADO													
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
Ajuste al peso								\$ 504,00					
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								\$ 264.764.334.092,00		\$ 278.033.191.146,00		\$ 1.814.172.254,00	
PROVISIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 32.965.433.319,00		\$ 33.620.063.999,00		\$ 12.833.280.431,00	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 1.450.000.000,00		\$ -		\$ -	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 299.202.765.411,00		\$ 313.103.275.145,00		\$ 83.752.970.757,18	
VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 2.136.481.747,00		\$ 2.288.062.395,00		\$ 13.257.413,00	
VALOR OBRAS INCLUYE IVA F=(D+E)								\$ 301.399.247.158,00		\$ 315.391.137.540,00		\$ 84.385.011.701,49	
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1.140.000.000,00		\$ 1.140.000.000,00		\$ 787.262.045,00	
IVA - REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								\$ 216.600.000,00		\$ -		\$ 149.579.786,55	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=H+G								\$ 1.356.600.000,00		\$ 1.356.600.000,00		\$ 936.841.832,55	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL INCLUYE IVA (J)								\$ 7.555.307.835,00		\$ 7.555.307.835,00		\$ 552.459.376,00	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 INCLUYE IVA								\$ 324.000.000,00		\$ -		\$ -	
VALOR TOTAL (F+I+J)								\$ 310.625.154.993,00		\$ 324.627.245.375,00		\$ 1.827.429.667,00	
\$ 85.854.312.965,04													
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.													
AUI 30 %	Utilidad 5 %												
Valor Anticipo Otorgado													
Valor Amortizado Presenta Acta													
Valor Amortizado Acumulado													
Valor Saldo por Amortizar													
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO													
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.													
VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES													
OBRA	\$ 1.814.172.254,00	\$	13.257.413,00	\$ 1.827.429.667,00									
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES													
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN													
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1.814.172.254,00	\$	13.257.413,00	\$ 1.827.429.667,00									
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 1.814.172.254												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 1.814.172.254												
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 1.827.429.667 VALOR EN LETRAS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE												
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.													
OBSERVACIONES													
AGrupación índices ICCIV													
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO													

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO MEP/MN-IN-4-FR-1				
												VERSION 1				
												PAGINA 				
												FECHA 2/10/2024				
												(Dia) (Mes) (Año)				
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL \$ DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA N° 40 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.814.172.254,00 MES septiembre-24																
UNIDAD EJECUTORA _____ ACTA FINAL SI NO X (Indicar con Una X)																
CONTRATO No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA- CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 5.																
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1015 DE 2021 INTERVENIOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:																
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.825.154.993,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00 (Según contrato principal)																
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.827.245.375,00																
No. de ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE IDOCV	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA			
					DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
					GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada	\$	-	\$	-												
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje	\$	64.646.128,00	\$	1.486.618.909,00												
11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados	\$	1.340.667.997,00	\$	50.573.568.190,00												
11601 - Preliminares y explanación	\$	29.983.706,00	\$	3.515.730.427,00												
11602 - Afirmados, subbases y bases	\$	251.677.050,00	\$	4.407.036.232,00												
11603 - Pavimentos asfálticos / concreto	\$	16.742.166,00	\$	2.418.356.047,00												
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	\$	51.037.497,00	\$	2.204.500.687,00												
11605 - Obras de urbanismo	\$	-	\$	-												
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental	\$	9.813.760,00	\$	739.150.997,00												
11607 - Señalización y control de tránsito	\$	-	\$	-												
11608 - Transporte y sobre caminos	\$	49.603.950,00	\$	2.724.387.978,00												
11414 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	\$	-	\$	-												
TOTAL	\$	1.814.172.254,00	\$	68.069.349.467,00												
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Intervenor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el caso de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. Si Interventory el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y los demás anexos a sus planes recurrentes). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																
Para constancia de lo anterior firman																
Firma Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratasta Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.																
Firma Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula profesional No.: 167666-T																
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratasta, Interventor y Dirección Territorial																



SEDE BOGOTÁ D.C.

PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carretera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal





SEDE BOGOTÁ D.C.
PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carretera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,


ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T



CR2021-0558-24

Duitama (Boyacá), 07 de octubre de 2024

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS

mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de septiembre de 2024.

El director de Interventoría para las obras de "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" Módulo 4",

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el **mes de septiembre de 2024**; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra.

Atentamente;


ARISTÓBULO MUÑOZ C.

Director de Interventoría

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co.
Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoría. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS.
vruiz@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboró, Revisó: AMC.

Anexo: N.A.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario14951770506

QR

(415)7707212489984(8020)0000014951770506

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)890930545112. Dirección seccionalOperativa de Grandes Contribuyentes14. Buzón electrónico31

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialMINCIVIL S.A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electróniconotificaciones@mincivil.com

43. Código postal

44. Teléfono 13289770

45. Teléfono 26760251

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código4290

47. Fecha inicio actividad19820510

48. Código4210

49. Fecha inicio actividad19820510

50. Código1246630811

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código357891013141518264142485255

03- Impuesto al patrimonio14- Informante de exogena52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinari15- Autorretenedor55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código2223

55. Forma1

56. Tipo1

Servicio123

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. AnexosSI[]NO[X]

60. No. de Folios:0

61. Fecha2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. NombreGREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. CargoRepresentante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :	987 DE 2021		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.		
CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A.		
NIT	890930545-1		
		No	FECHA
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	40	sep-24

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	\$ 1,632,755,029.00	1%	\$ 16,328,000.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No: 01192-0130 CPITVC

 <p>Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>		<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>	
Número Estampilla		7612882		
Contratista:	MINCIVIL SA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	890930545			
Objeto del Contrato	Vias para la recuperacion y la legalidad vision 2030			
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT			
  <p>N° 7612882</p>	Numero de Contrato:	987	Vigencia:	2021
	Base Gravable	\$A632755029	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 16,328,000.00
	Fecha de Pago:	08/10/2024 		

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co


Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA		DE	3
--------	--	----	---

FECHA	2/10/2024		
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: septiembre-24

PROYECTO : 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021


RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo de Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 2,101,479,500.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 51,728,079.00	\$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 16,380,768,477.00	\$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 851,108,816.00	\$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,767,142,857.00	
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,850,000,000.00	\$ 0.00
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 27,508,663,071.00	\$ 4,820,647,850.96
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 125,602,643.00	
TOTAL						\$ 88,847,531,069.00	\$ 4,820,647,850.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	324,627,245,375.00
-------------------------------	----	--------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
														SI	NO	
1	Obra	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 3,073,574,974.00		\$ 324,627,245,375.00				
2	Obra	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 3,073,574,974.00	\$ -	\$ 324,627,245,375.00				
3	Obra	ago-21	\$ 250,062,720.00	\$ 1,827,381.00	\$ 251,890,101.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,821,684,873.00	\$ 251,890,101.00	\$ 324,375,355,274.00				
4	Obra	sep-21	\$ 442,429,850.00	\$ 31,879,295.00	\$ 474,309,145.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,347,375,728.00	\$ 726,199,246.00	\$ 323,901,046,129.00				
5	Obra	oct-21	\$ 284,843,391.18	\$ 2,081,547.86	\$ 286,924,939.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,060,450,788.96	\$ 1,013,124,185.04	\$ 323,614,121,189.96				
6	Obra	nov-21	\$ 219,401,307.00	\$ 1,603,317.00	\$ 221,004,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 1,839,446,164.96	\$ 1,234,128,809.04	\$ 323,393,116,565.96				
7	Obra	dic-21	\$ 1,810,403,591.00	\$ 13,229,872.00	\$ 1,823,633,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 15,812,701.96	\$ 3,057,762,272.04	\$ 321,569,483,102.96				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 16,470,437,162.00	\$ 3,057,762,272.04	\$ 321,569,483,102.96				
8	Obra	ene-22	\$ 917,379,547.00	\$ 6,703,927.00	\$ 924,083,474.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 15,546,353,688.00	\$ 3,981,845,746.04	\$ 320,645,599,628.96				
9	Obra	feb-22	\$ 1,005,261,151.00	\$ 45,726,880.00	\$ 1,050,988,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 14,495,365,657.00	\$ 5,032,833,777.04	\$ 319,594,411,597.96				
10	Obra	mar-22	\$ 597,643,161.00	\$ 4,367,392.00	\$ 602,010,553.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 13,893,355,104.00	\$ 5,634,844,330.04	\$ 318,992,401,044.96				
11	Obra	abr-22	\$ 476,137,993.00	\$ 3,479,470.00	\$ 479,617,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 13,413,737,641.00	\$ 6,114,461,793.04	\$ 318,512,783,581.96				
12	Obra	may-22	\$ 556,120,238.00	\$ 4,063,956.00	\$ 554,371,492.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ -	\$ 6,130,274,495.00	\$ 318,496,970,880.00				
13	Obra	jun-22	\$ 684,912,070.00	\$ 43,421,665.00	\$ 728,333,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,869,366,148.96	\$ 6,674,645,987.04	\$ 317,952,599,387.96				
1D	Ajuste Definitivo	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
2D	Ajuste Definitivo	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
3D	Ajuste Definitivo	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
4D	Ajuste Definitivo	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
5D	Ajuste Definitivo	oct-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
6D	Ajuste Definitivo	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
7D	Ajuste Definitivo	dic-21	\$ 58,920,378.00	\$ 430,572.00	\$ 59,350,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,081,681,463.96	\$ 7,462,330,672.04	\$ 317,164,914,702.96				
14	Obra	jul-22	\$ 1,016,736,069.00	\$ 7,429,994.00	\$ 1,024,166,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 11,057,515,400.96	\$ 8,486,496,735.04	\$ 316,140,748,639.96				
15	Obra	ago-22	\$ 1,917,862,902.00	\$ 58,867,210.00	\$ 1,976,730,112.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 9,080,785,288.96	\$ 10,463,226,847.04	\$ 314,164,018,527.96				
16	Obra	sep-22	\$ 3,047,103,092.00	\$ 22,267,292.00	\$ 3,069,370,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 6,011,414,904.96	\$ 13,532,597,231.04	\$ 311,094,648,143.96				
8D	Ajuste Definitivo	ene-22	\$ 57,744,578.00	\$ 421,979.00	\$ 58,166,557.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,953,248,347.96	\$ 13,590,763,788.04	\$ 311,036,481,586.96				
9D	Ajuste Definitivo	feb-22	\$ 30,007,410.00	\$ 219,284.00	\$ 30,226,694.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,923,021,653.96	\$ 13,620,990,482.04	\$ 311,006,254,892.96				
10D	Ajuste Definitivo	mar-22	\$ 35,521,914.00	\$ 259,584.00	\$ 35,781,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,887,240,155.96	\$ 13,656,771,980.04	\$ 310,970,473,394.96				
11D	Ajuste Definitivo	abr-22	\$ 26,121,626.00	\$ 190,889.00	\$ 26,312,515.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,860,927,640.96	\$ 13,683,084,495.04	\$ 310,944,160,879.96				
12D	Ajuste Definitivo	may-22	\$ 35,095,222.00	\$ 256,465.00	\$ 35,351,687.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,825,575,953.96	\$ 13,718,436,182.04	\$ 310,908,809,192.96				
17	Obra	oct-22	\$ 3,461,601,764.00	\$ 25,296,321.00	\$ 3,486,898,085.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 2,338,677,888.96	\$ 17,205,334,267.04	\$ 307,421,911,107.96				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 14,002,090,382.00	\$ 17,205,334,267.04	\$ 307,421,911,107.96				
18	Obra	nov-22	\$ 3,416,883,271.00	\$ 24,969,532.00	\$ 3,238,677,868.96	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ -	\$ 19,544,012,136.00	\$ 305,083,233,239.00				
					\$ 1,103,174,934.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,898,915,447.96	\$ 20,647,187,070.04	\$ 303,980,058,304.96				
13D	Ajuste Definitivo	jun-22	\$ 45,473,699.00	\$ 332,308.00	\$ 45,806,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,853,109,440.96	\$ 20,692,993,077.04	\$ 303,934,252,297.96				
14D	Ajuste Definitivo	jul-22	\$ 112,206,815.00	\$ 819,973.00	\$ 113,026,788.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,740,082,652.96	\$ 20,806,019,865.04	\$ 303,821,225,509.96				
15D	Ajuste Definitivo	ago-22	\$ 200,557,074.00	\$ 1,465,610.00	\$ 202,022,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,538,059,968.96	\$ 21,008,042,549.04	\$ 303,619,202,825.96				
16D	Ajuste Definitivo	sep-22	\$ 336,689,475.00	\$ 2,460,423.00	\$ 339,149,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,198,910,070.96	\$ 21,347,192,447.04	\$ 303,280,052,927.96				
17D	Ajuste Definitivo	oct-22	\$ 288,661,658.00	\$ 2,109,451.00	\$ 290,771,109.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 11,908,138,961.96	\$ 21,637,963,556.04	\$ 302,989,281,818.96				
19	Obra	dic-22	\$ 5,164,846,751.00	\$ 37,743,111.00	\$ 5,202,589,862.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 6,705,549,099.96	\$ 26,840,553,418.04	\$ 297,786,691,956.96				
18P	Ajuste Provisional	nov-22	\$ 325,696,804.00	\$ 2,380,092.00	\$ 328,076,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 6,377,472,203.96	\$ 27,168,630,314.04	\$ 297,458,615,060.96				
19P	Ajuste Provisional	dic-22	\$ 532,308,549.00	\$ 3,889,947.00	\$ 536,198,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,841,273,707.96	\$ 27,704,828,810.04	\$ 296,922,146,564.96				
18D	Ajuste Definitivo	nov-22	\$ 3,891,403.00	\$ 28,437.00	\$ 3,919,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,837,353,867.96	\$ 27,708,748,650.04	\$ 296,918,496,724.96				
19D	Ajuste Definitivo	dic-22	\$ 10,062,400.00	\$ 73,533.00	\$ 10,135,933.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,827,217,934.96	\$ 27,718,884,583.04	\$ 296,908,360,791.96				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 13,817,142,857.00	\$ 27,718,884,583.04	\$ 296,908,360,791.96				
20	Obra	ene-23	\$ 2,025,158,983.00	\$ 14,799,239.00	\$ 2,039,958,222.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 11,777,184,625.00	\$ 29,758,842,815.04	\$ 294,868,402,559.96				



FECHA	2/10/2024		
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No:	987 DE 2021	CONTRATISTA:	MINICIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL:	septiembre-24	PROYECTO :	0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1015 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	324,627,245,375.00
-------------------------------	----	--------------------


Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
20D	Ajuste Definitivo	ene-23	\$ 250,475,510.00	\$ 1,830,398.00	\$ 252,305,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 11,524,878,717.00	\$ 30,011,148,723.04	\$ 294,616,096,651.96				
21	Obra	feb-23	\$ 3,224,015,975.00	\$ 23,560,117.00	\$ 3,247,576,092.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 8,277,302,625.00	\$ 33,258,724,815.04	\$ 291,368,520,559.96				
21P	Ajuste Provisional	feb-23	\$ 463,656,280.00	\$ 3,388,257.00	\$ 467,044,537.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 7,810,258,088.00	\$ 33,725,769,352.04	\$ 290,901,476,022.96				
22	Obra	mar-23	\$ 3,996,327,861.00	\$ 29,203,934.00	\$ 4,025,531,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,784,726,293.00	\$ 37,751,301,147.04	\$ 286,875,944,227.96				
22P	Ajuste Provisional	mar-23	\$ 709,191,911.00	\$ 5,182,556.00	\$ 714,374,467.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,070,351,826.00	\$ 38,465,675,614.04	\$ 286,161,569,760.96				
22D	Ajuste Definitivo	mar-23	\$ 57,822,473.00	\$ 422,549.00	\$ 58,245,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,012,106,804.00	\$ 38,523,920,636.04	\$ 286,103,324,738.96				
23	Obra	abr-23	\$ 2,847,259,863.00	\$ 20,806,899.00	\$ 800,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,027,217,934.96	\$ 39,323,920,636.04	\$ 285,303,324,738.96				
23P	Ajuste Provisional	abr-23	\$ 731,200,721.00	\$ 5,343,390.00	\$ 2,068,066,762.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 944,040,042.00	\$ 31,931,987,398.04	\$ 283,235,257,976.96				
23D	Ajuste Definitivo	abr-23	\$ 11,991,279.00	\$ 87,629.00	\$ 286,544,111.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 4,740,673,822.96	\$ 41,678,531,509.04	\$ 282,948,713,865.96				
24	Obra	may-23	\$ 2,775,671,849.00	\$ 33,373,204.00	\$ 450,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 494,040,042.00	\$ 42,128,531,509.04	\$ 282,498,713,865.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	\$ 663,402,525.00	\$ 4,847,942.00	\$ 12,078,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 481,961,134.00	\$ 42,140,610,417.04	\$ 282,486,634,957.96				
24P	Ajuste Provisional	may-23	\$ 2,775,671,849.00	\$ 33,373,204.00	\$ 2,809,045,053.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 1,931,628,769.96	\$ 44,949,655,470.04	\$ 279,677,589,904.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	\$ 663,402,525.00	\$ 4,847,942.00	\$ 334,125,233.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 1,597,503,536.96	\$ 45,283,780,703.04	\$ 279,343,464,671.96				
25	Obra	jun-23	\$ 947,856,887.00	\$ 6,794,681.00	\$ 334,125,234.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 147,835,901.00	\$ 45,617,905,937.04	\$ 279,009,339,437.96				
25P	Ajuste Provisional	jun-23	\$ 947,856,887.00	\$ 6,794,681.00	\$ 806,815,667.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 790,687,869.96	\$ 46,424,721,604.04	\$ 278,202,523,770.96				
25D	Ajuste Definitivo	jun-23	\$ 254,012,075.00	\$ 1,856,242.00	\$ 147,835,901.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ -	\$ 46,572,557,505.04	\$ 278,054,687,869.96				
26	Obra	jul-23	\$ 308,945,176.00	\$ 2,257,676.00	\$ 255,868,317.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 534,819,552.96	\$ 46,828,425,822.04	\$ 277,798,819,552.96				
26P	Ajuste Provisional	jul-23	\$ 154,675,847.00	\$ 1,130,323.00	\$ 311,202,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 223,616,700.96	\$ 47,139,628,674.04	\$ 277,487,61				





6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES


MEPI-MN1-IN-6-FR-2

[illegible]

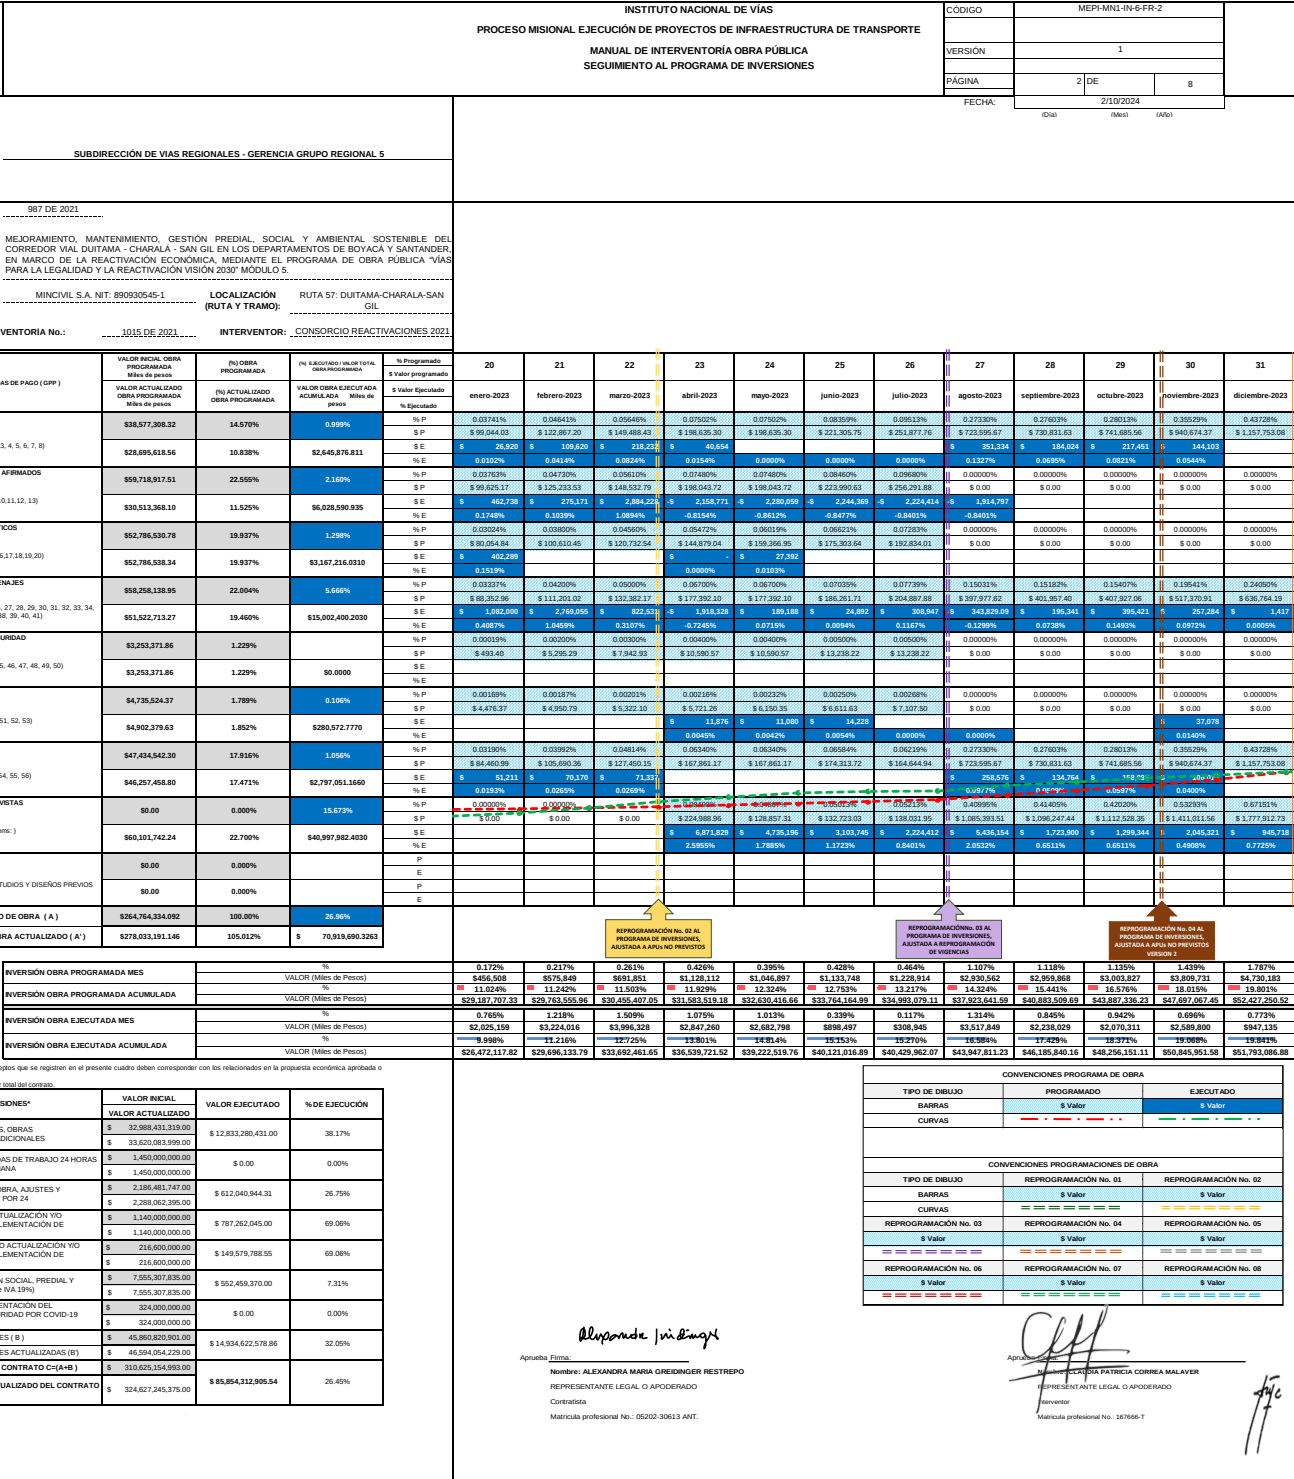

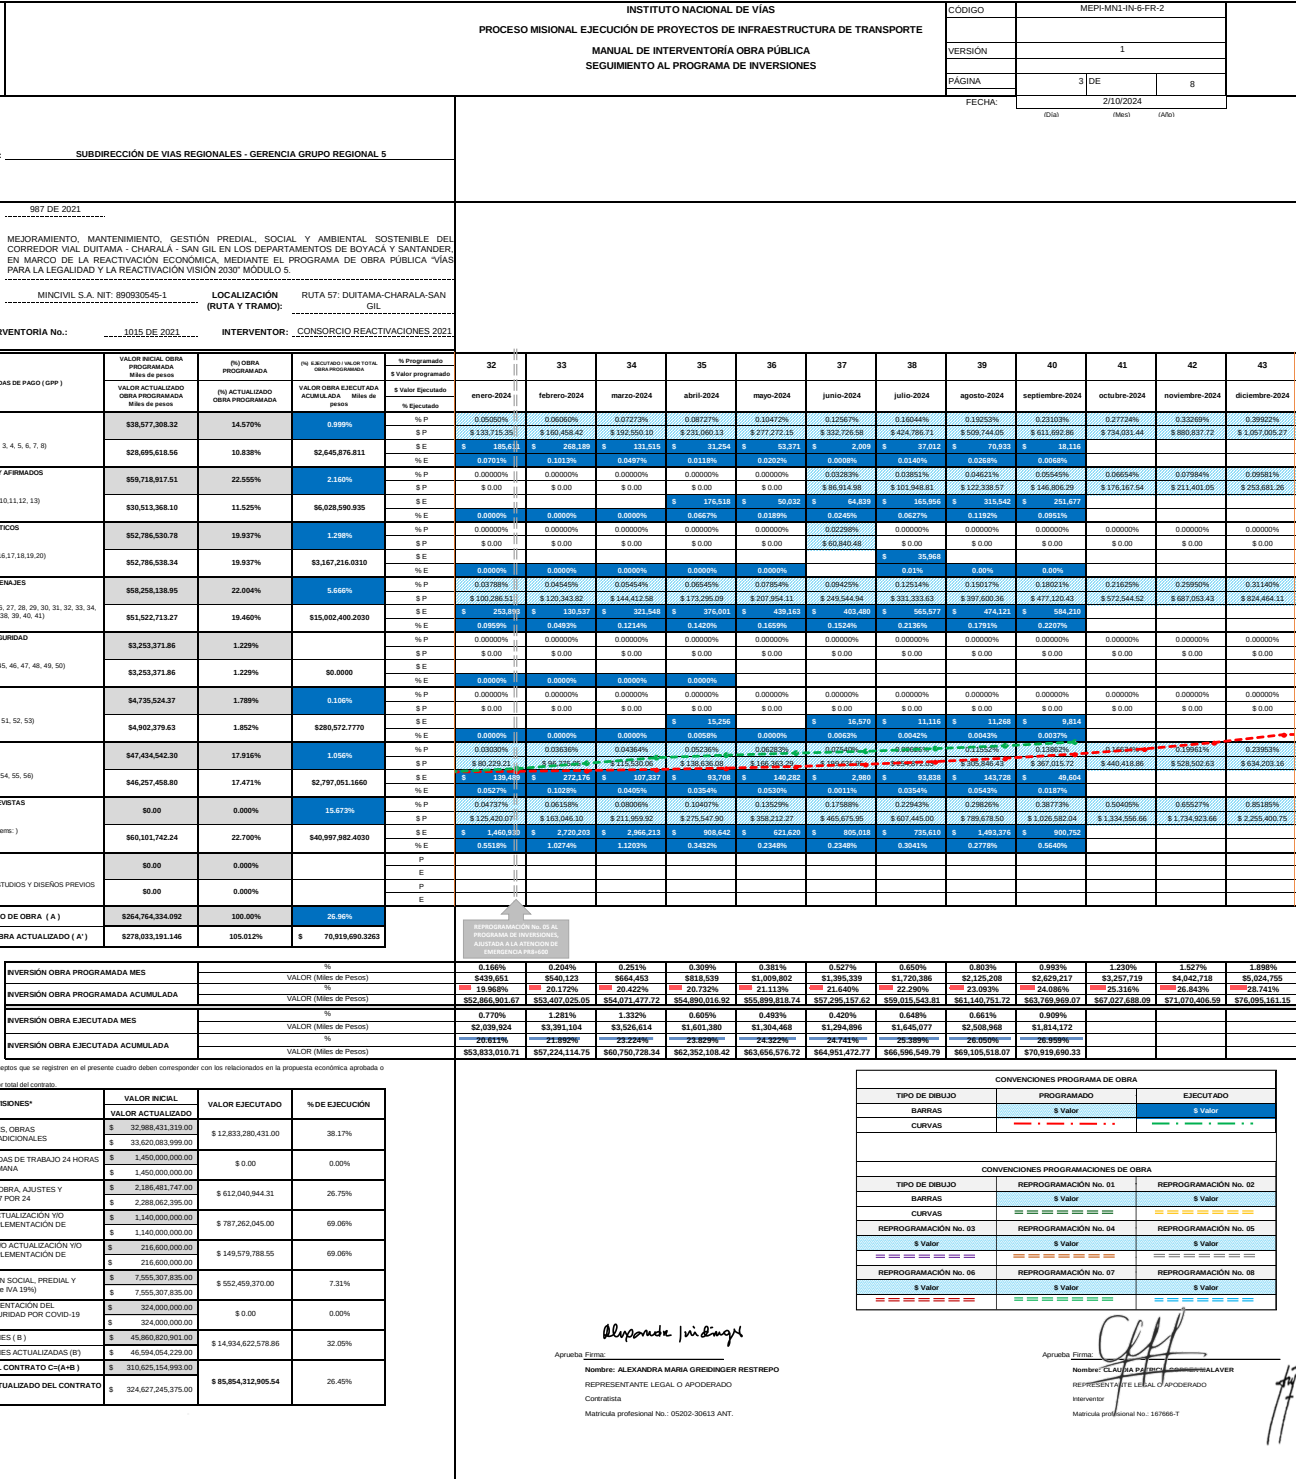

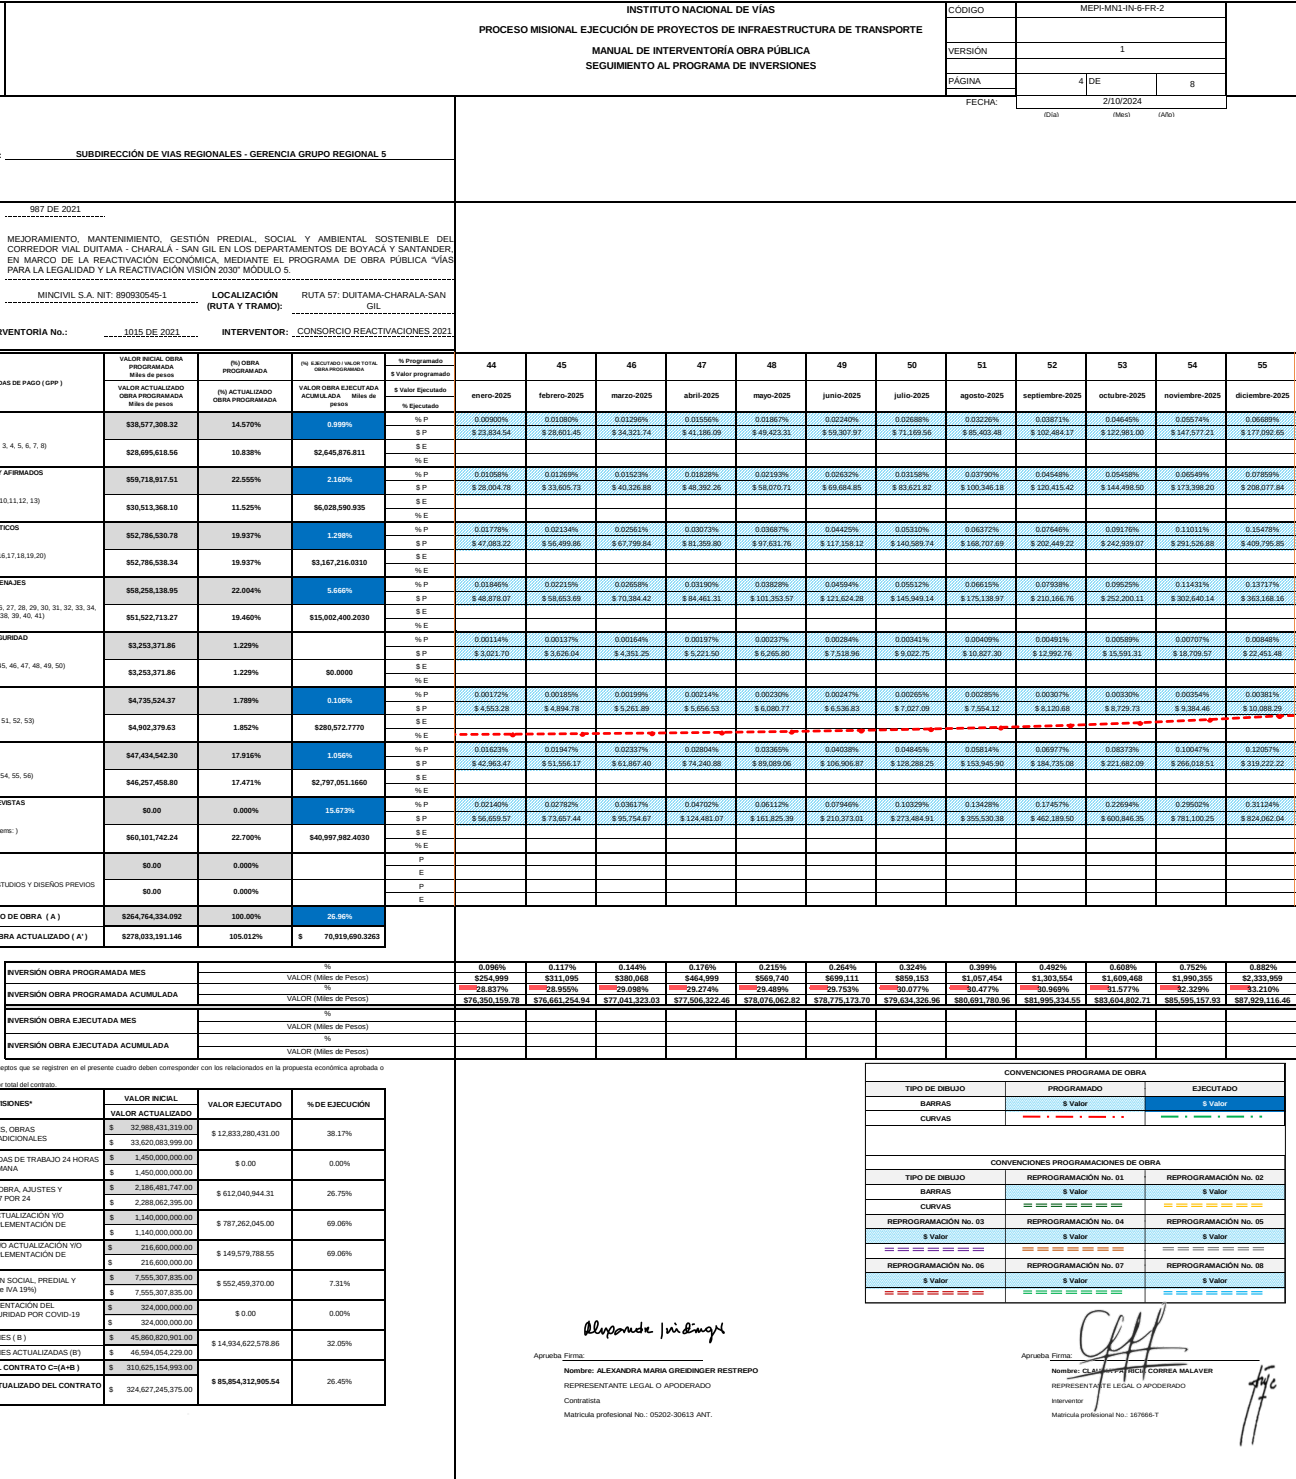




FECHA: 2/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

[illegible]


PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 2,988,431,319.00	\$ 12,833,280,431.00	38.17%
	\$ 23,620,283,999.00		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1,450,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
	\$ 1,450,000,000.00		
PROVISION PARA RUA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y FOR 24	\$ 2,388,481,747.00	\$ 6,612,040,944.31	26.78%
	\$ 2,388,481,747.00		
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,140,000,000.00	\$ 77,787,262,045.00	69.06%
	\$ 1,140,000,000.00		
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 219,600,000.00	\$ 149,578,788.55	69.06%
	\$ 219,600,000.00		
PROVISION PARA GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (INCLUIR PAGOS E VAL. INCL)	\$ 7,550,307,875.00	\$ 505,469,370.00	7.31%
	\$ 7,550,307,875.00		
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FOR COVID-19 ACTIVOS VAL.	\$ 324,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
	\$ 324,000,000.00		
ALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45,860,820,905.00		32.00%
ALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B)	\$ 46,559,054,229.00	\$ 14,934,622,578.86	32.00%
	\$ 46,559,054,229.00		
ALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$ 330,625,154,999.00		26.40%
	\$ 330,625,154,999.00		
ALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$ 324,627,245,379.00	\$ 85,854,312,905.54	26.40%
	\$ 324,627,245,379.00		

Aprueba Firma: 
Nombre: CLARA EUGENIA CORREA MALAVE
REPRESENTANTE LEGAL FIDELICADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T



GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR BÍASO OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUCIÓN OBRA PROGRAMADA	Si Programado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	Miles de pesos		Miles de pesos	Valor programado												
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA - Miles de pesos	Si Ejecutado	enero-2027	febrero-2027	marzo-2027	abril-2027	mayo-2027	junio-2027	julio-2027	agosto-2027	septiembre-2027	octubre-2027	noviembre-2027	diciembre-2027
PP1 - EXPLANACIONES (E)	538.577.308,32	14,570%	5.996%	% P	0.03158%	0.03190%	0.03222%	0.03254%	0.03286%	0.03319%	0.03353%	0.03386%	0.03420%	0.03454%	0.03489%	0.03524%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)				S P	\$ 83.818,20	\$ 84.454,38	\$ 85.209,92	\$ 86.151,91	\$ 87.213,43	\$ 87.883,57	\$ 88.762,49	\$ 89.650,03	\$ 90.348,52	\$ 91.451,99	\$ 92.586,51	\$ 93.293,18
	528.695.618,56	10,838%	52.645,876.811	S E												
PP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	138.718.917,51	22,555%	2.160%	% P	0.05185%	0.06234%	0.07481%	0.08977%	0.10773%	0.12927%	0.15513%	0.18615%	0.22338%	0.26800%	0.32167%	0.38600%
(Items: 9,10,11,12,13)				S P	\$ 137.547,96	\$ 160.057,55	\$ 198.069,06	\$ 237.082,87	\$ 285.219,44	\$ 342.263,33	\$ 410.716,00	\$ 482.859,20	\$ 591.431,04	\$ 709.717,25	\$ 851.660,70	\$ 1.021.992,83
	530.511.368,10	11,525%	56.025.590.935	S E												
PP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS	552.786.530,78	18,937%	1.730%	% P	0.08102%	0.09773%	0.11670%	0.14025%	0.16818%	0.20325%	0.24218%	0.29060%	0.34873%	0.41848%	0.50235%	0.72715%
(Items: 15,16,17,18,19,20)				S P	\$ 214.735,32	\$ 257.462,38	\$ 309.216,88	\$ 371.062,63	\$ 445.275,15	\$ 534.330,38	\$ 641.196,22	\$ 769.435,47	\$ 920.322,56	\$ 1.107.987,07	\$ 1.329.584,49	\$ 1.625.240,81
	552.786.530,78	18,937%	53.167.216.030	S E												
PP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	558.758.138,95	22,004%	5.666%	% P	0.08403%	0.10104%	0.12124%	0.14549%	0.17459%	0.20951%	0.25141%	0.30169%	0.36203%	0.43432%	0.52132%	0.63778%
(Items: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)				S P	\$ 222.921,21	\$ 247.505,45	\$ 321.008,54	\$ 385.207,85	\$ 462.248,42	\$ 554.093,31	\$ 665.639,17	\$ 798.767,00	\$ 958.020,41	\$ 1.150.224,48	\$ 1.391.359,52	\$ 1.686.688,52
	551.822.713,27	18,460%	515.002.490.200	S E												
PP6 - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	53.253.371,86	1,229%		% P	0.00440%	0.00539%	0.00634%	0.00761%	0.00913%	0.01087%	0.01379%	0.01677%	0.02037%	0.02473%	0.02977%	0.03572%
(Items: 42,43,44,45,46,47,48,49,50)				S P	\$ 13.901,49	\$ 16.284,25	\$ 19.919,97	\$ 23.775,78	\$ 28.180,97	\$ 33.616,45	\$ 40.819,74	\$ 49.788,68	\$ 60.140,42	\$ 60.168,50	\$ 72.202,21	\$ 86.642,65
	53.253.371,86	1,229%	50.000%	S E												
PP7 - OBRAS VARIAS	54.735.524,37	1,789%	0.100%	% P	0.00422%	0.00545%	0.00680%	0.00825%	0.00954%	0.01060%	0.00952%	0.00707%	0.00705%	0.00810%	0.00870%	0.00936%
(Items: 51,52,53)				S P	\$ 11.181,93	\$ 12.020,57	\$ 12.822,11	\$ 13.891,27	\$ 14.933,12	\$ 16.053,10	\$ 17.257,08	\$ 18.561,36	\$ 19.942,72	\$ 21.438,42	\$ 23.046,30	\$ 24.714,77
	54.802.378,63	1,852%	528.572.770	S E												
PP8 - TRANSPORTES	547.434.542,30	17,916%	1.956%	% P	0.09105%	0.10630%	0.13118%	0.15740%	0.18888%	0.22660%	0.27198%	0.32638%	0.39156%	0.46999%	0.56398%	0.67678%
(Items: 54,55,56)																


Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.		CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA		
El caje IVA, debe sumar el valor total del contrato.		TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO


Aguafina Firmo

Nombre: ALEXANDRA MARIA GRIEDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Assinatura: _____
Nome: **NEUSA MARIA PATRÍCIA CORREIA MALAVER**
Representante Legal do APODERADO
Interpretador
Matrícula profissional No.: 167666-T


 Aprova: _____
 Nome do Signatário: PATRÍCIA CORRÊA MALAVER
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 Intermediar
 Matrícula profissional No.: 167666-T



CONTRATO Nº: 987 DE 2021

CONTRATISTA:	MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1	LOCALIZACIÓN	ruta 57: DUITAMA-CHARALA-SAN
	-----	(RUTA Y TRAMO):	GIL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

[illegible]

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 32,288,431,313.00	\$ 12,852,280,421.00	39.71%
	\$ 33,620,838,999.00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1,450,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
	\$ 1,450,000,000.00		
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y OBRAS DE TRABAJO Y POR 24	\$ 2,188,481,747.00	\$ 612,040,944.31	26.75%
	\$ 2,288,082,396.00		
PROVISIÓN AJUSTE ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,140,000,000.00		69.00%
	\$ 1,140,000,000.00		
EL REVENIR SOBRE LA ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 218,600,000.00	\$ 149,579,788.55	69.00%
	\$ 218,600,000.00		
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDAI Y AMBIENTAL (INCLuye PACSA e IVA INCL)	\$ 5,955,387,638.00	\$ 5,602,459,370.00	7.31%
	\$ 7,555,307,878.00		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FOR COVID-19 ACTUARE IVA	\$ 324,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
	\$ 324,000,000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45,860,820,903.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B)	\$ 46,554,054,225.00	\$ 14,934,622,578.86	32.05%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$ 310,625,154,999.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$ 324,627,245,375.00	\$ 85,854,332,905.54	26.45%

CONVENIONES PROGRAMA DE OBRA			
PROGRAMADO		EJECUTADO	
\$ Valor		\$ Valor	

CONVENIONES PROGRAMACIONES DE OBRA			
REPROGRAMACIÓN No. 01		REPROGRAMACIÓN No. 02	
\$ Valor		\$ Valor	
REPROGRAMACIÓN No. 04		REPROGRAMACIÓN No. 05	
\$ Valor		\$ Valor	
REPROGRAMACIÓN No. 07		REPROGRAMACIÓN No. 08	
\$ Valor		\$ Valor	

Aprueba Firma: 
 Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
 REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
 Interventor
 Matricula profesional No.: 167666-T

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

CONTRATO No.: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57: DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL


CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado	enero-2029	febrero-2029	marzo-2029	abril-2029	mayo-2029	junio-2029	julio-2029	agosto-2029	septiembre-2029	octubre-2029	noviembre-2029	diciembre-2029	enero-2030	febrero-2030	marzo-2030	abril-2030	mayo-2030	junio-2030	julio-2030	agosto-2030
GPP1 - EXPLANACIONES (E)	\$38,577,308.32	14.570%	0.999%	\$ Valor programado	0.00073%	0.07399%	0.07342%	0.08339%	0.09379%	0.09867%	0.00762%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	\$28,696,618.56	10.833%	\$2,646,876.611	\$ E	\$ 181,977.34	\$ 195,625.64	\$ 235,297.56	\$ 226,069.88	\$ 243,025.12	\$ 261,252.01	\$ 20,712.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$59,718,917.51	22.555%	2.160%	\$ E	0.08070%	0.08681%	0.08333%	0.10032%	0.10785%	0.11594%	0.12463%	0.13769%	0.14499%	0.15833%	0.16644%	0.17893%	0.07000%	0.07350%	0.07718%	0.08103%	0.08509%	0.08934%	0.11373%	0.18261%
(Items: 9,10,11,12,13)	\$30,513,368.10	11.525%	\$6,028,590.935	\$ E	\$ 213,817.19	\$ 229,853.48	\$ 247,002.49	\$ 265,624.43	\$ 285,546.26	\$ 306,962.23	\$ 230,988.46	\$ 254,763.23	\$ 381,338.22	\$ 409,938.59	\$ 440,663.98	\$ 478,735.28	\$ 185,336.63	\$ 194,601.79	\$ 204,331.87	\$ 214,548.47	\$ 225,275.89	\$ 236,539.69	\$ 301,121.00	\$ 1,013,027.99
GPP3 - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	\$52,786,530.78	19.937%	1.238%	\$ E	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%	0.16233%
(Items: 15,16,17,18,19,20)	\$52,786,530.78	19.937%	\$3,167,216.0310	\$ E	\$ 359,481.58	\$ 431,377.89	\$ 517,053.47	\$ 621,184.17	\$ 745,421.00	\$ 894,508.20	\$ 1,073,496.24	\$ 1,288,087.49	\$ 1,546,704.98	\$ 1,854,845.98	\$ 2,225,615.18	\$ 2,921,694.04	\$ 308,173.48	\$ 321,482.15	\$ 337,556.26	\$ 354,434.07	\$ 372,156.77	\$ 390,763.56	\$ 430,303.74	\$ 736,227.88
GPP4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$58,258,138.95	22.004%	5.666%	\$ E	0.14095%	0.16914%	0.20373%	0.24359%	0.29227%	0.32150%	0.35305%	0.38902%	0.42792%	0.47071%	0.51779%	0.56959%	0.15640%	0.16109%	0.16592%	0.17090%	0.17603%	0.18244%	0.00000%	0.00000%
(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	\$51,522,713.27	19.460%	\$15,002,400.2030	\$ E	\$ 373,185.32	\$ 447,822.39	\$ 537,386.87	\$ 644,864.24	\$ 773,837.09	\$ 931,225.79	\$ 936,342.87	\$ 1,029,977.16	\$ 1,132,374.88	\$ 1,246,272.37	\$ 1,370,899.60	\$ 1,507,989.58	\$ 434,091.42	\$ 426,514.16	\$ 439,309.59	\$ 452,488.87	\$ 466,063.54	\$ 2,389,342.54	\$ 0.00	\$ 0.00
GPP5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$3,253,371.86	1.229%	\$0.0000	\$ E	0.00073%	0.01046%	0.01205%	0.01506%	0.01807%	0.02168%	0.02602%	0.03122%	0.03747%	0.04496%	0.05399%	0.06474%	0.00400%	0.00420%	0.00441%	0.00463%	0.00486%	0.00511%	0.00536%	0.00561%
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	\$3,253,371.86	1.229%	\$0.0000	\$ E	\$ 23,070.76	\$ 27,684.91	\$ 33,221.89	\$ 39,865.27	\$ 47,839.52	\$ 57,407.42	\$ 68,888.91	\$ 82,666.69	\$ 99,200.03	\$ 119,040.03	\$ 142,848.04	\$ 171,417.65	\$ 10,590.57	\$ 11,120.10	\$ 11,676.11	\$ 12,259.91	\$ 12,872.01	\$ 13,516.55	\$ 14,182.38	\$ 666,712.20
GPP7 - OBRAS VARIAS	\$4,735,524.37	1.789%	0.166%	\$ E	0.00939%	0.00988%	0.01062%	0.01142%	0.01227%	0.01310%	0.01418%	0.01529%	0.01639%	0.01762%	0.01894%	0.02039%	0.00406%	0.00487%	0.00564%	0.00701%	0.00841%	0.01009%	0.01211%	0.01979%
(Items: 51, 52, 53)	\$4,735,524.37	1.852%	\$280,572.7770	\$ E	\$ 24,339.50	\$ 26,140.23	\$ 28,122.25	\$ 30,321.42	\$ 32,498.77	\$ 34,938.18	\$ 37,596.39	\$ 40,373.12	\$ 43,403.11	\$ 46,686.10	\$ 50,155.43	\$ 53,917.58	\$ 10,788.84	\$ 12,886.61	\$ 15,463.93	\$ 18,556.72	\$ 22,288.06	\$ 26,721.87	\$ 32,066.61	\$ 38,173.96
GPP8 - TRANSPORTES	\$47,424,542.30	17.916%	1.000%	\$ E	0.12389%	0.14857%	0.17943%	0.21409%	0.25691%	0.30829%	0.36995%	0.37969%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00000%
(Items: 54, 55, 56)	\$46,251,458.80	17.471%	\$2,797,051.1660	\$ E	\$ 328,027.23	\$ 393,632.67	\$ 472,359.21	\$ 566,931.05	\$ 680,197.26	\$ 816,236.71	\$ 979,484.05	\$ 2,593,837.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$0.00	0.000%	15.473%	\$ E	0.00400%	0.00449%	0.00537%	0.00649%	0.00814%	0.12297%	0.13956%	0.16386%	0.19921%	0.23435%	0.28110%	0.37359%	0.45479%	0.47753%	0.50140%	0.52649%	0.55290%	0.58046%	0.60946%	0.63987%
(Items:)	\$80,101,742.24	22.790%	\$40,997,882.4030	\$ E	\$ 120,203.03	\$ 144,243.61	\$ 175,092.33	\$ 207,716.80	\$ 249,252.96	\$ 299,103.55	\$ 358,924.28	\$ 430,709.11	\$ 516,850.93	\$ 620,271.12	\$ 744,265.34	\$ 724,271.29	\$ 1,204,119.07	\$ 1,264,326.02	\$ 1,327,541.27	\$ 1,393,918.34	\$ 1,463,614.26	\$ 1,538,794.96	\$ 1,613,634.71	\$ 2,273,459.70
TOTAL OTROS ITEMS	\$0.00	0.000%		\$ E																				
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS	\$0.00	0.000%		\$ E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$264,794,334.092	100.00%	26.96%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$278,035,191.146	105.012%	\$	\$																				

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.613%	0.716%	0.838%	0.983%	1.155%	1.339%	1.437%	2.198%	1.405%	1.629%	1.879%	2.211%	0.805%	0.843%	0.882%	0.924%	0.968%	1.735%	0.896%	1.887%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	80.29%	81.01%	81.852%	82.839%	83.989%	85.319%	86.757%	88.959%	90.360%	91.983%	93.862%	96.074%	98.877%	97.720%	96.602%	95.526%	100.454%	102.229%	105.124%	106.912%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	\$212,098,208.08	\$214,094,608.90	\$216,713,634.97	\$219,316,217.22	\$222,373,835.20	\$225,899,459.23	\$229,700,769.19	\$235,521,143.17	\$239,240,613.32	\$243,557,587.59	\$248,612,205.14	\$254,365,280.02	\$260,486,328.43	\$268,727,258.26	\$261,063,137.29	\$263,509,343.67	\$266,071,094.10	\$270,665,273.07	\$273,036,588.92	\$278,033,190.64
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, según el valor total del contrato.


PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR ACTUALIZADO			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 30,888,431,919.00	\$ 12,833,280,431.00	38.17%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS OBRAS Y OBRAS DE LA SEMANA	\$ 1,450,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	\$ 2,336,483,747.00	\$ 612,040,944.31	26.75%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,140,000,000.00	\$ 787,262,045.00	69.06%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 216,600,000.00	\$ 149,579,788.55	69.06%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA a IVA 19%)	\$ 7,555,307,835.00	\$ 502,469,370.00	7.32%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 324,000,000.00	\$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	\$ 45,860,820,901.00	\$ 14,934,632,578.86	32.05%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	\$ 46,594,054,229.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 310,625,154,993.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 324,627,245,375.00	\$ 85,854,312,905.54	26.45%

Aprobada Firma: 
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREINDIGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula profesional No.: 05202-30613-ANT.

Aprobada Firma: 
Nombre: CLAUDIA PATRICIA HERRERA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula profesional No.: 157960-T

CONVENIONES PROGRAMA DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	\$ Valor	\$ Valor

CONVENIONES PROGRAMACIONES DE OBRA		
TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACIÓN No. 01	REPROGRAMACIÓN No. 02
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	\$ Valor	\$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 03	\$ Valor	REPROGRAMACIÓN No. 05
REPROGRAMACIÓN No. 04	\$ Valor	\$ Valor
REPROGRAMACIÓN No. 06	\$ Valor	REPROGRAMACIÓN No. 08
REPROGRAMACIÓN No. 07	\$ Valor	\$ Valor

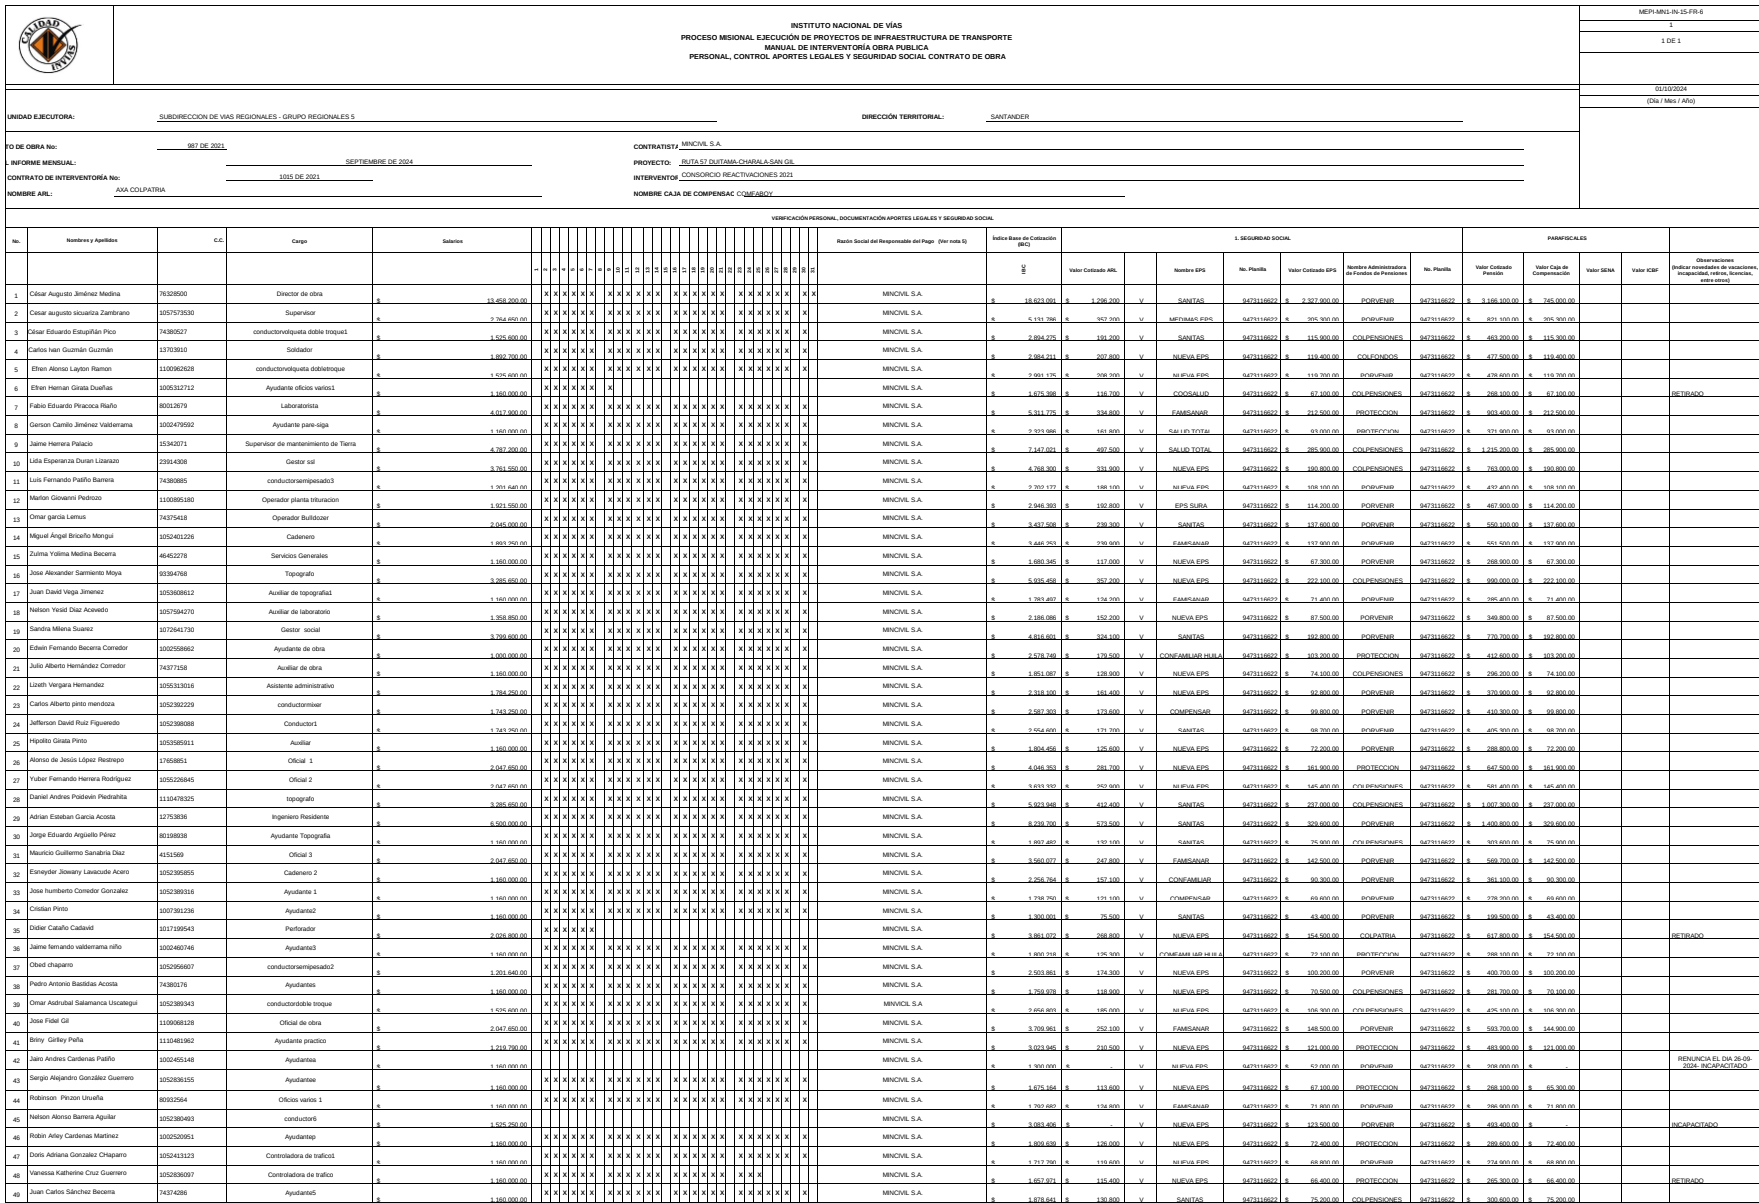

[illegible]

File

<p align="center">OBSERVACIONES DE LA INTERVENORIA Numeral 4 disponibilidad del personal requerido:</p>	
<p>El contratista adjunta la certificación de fecha <u>04/10/2024</u> a la que se refiere la nota 8 del presente formato.</p>	
<p>NOTAS:</p> <p>1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.</p> <p>2. Es responsabilidad de la Interventoría seleccionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".</p> <p>3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adopta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.</p> <p>4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, deben indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.</p> <p>5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normalidad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplica.</p> <p>6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la entidad.</p> <p>7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.</p>	
<p>Firma _____</p> <p>Nombre: CESAR ALBERTO JIMENEZ MEDINA Director de Obra Matrícula Profesional No. 1920-099134, Cauca</p>	<p>Firma _____</p> <p>Nombre: ARIOH OCHOA GARCIA CRUZ Director de Interventoría Matrícula No. 0119-4830 CPVTC</p>



7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6								
															VERSIÓN		1								
															PÁGINA		Página 1 de 5								
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. <small>(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)</small>				40		FECHA										01		OCTUBRE		2024	
1. DATOS DEL PROYECTO																				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021			
																								No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.															
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																							
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																									
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		4				INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	** E E M	18	ENERO	2024	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)					
Información y Divulgación	Volantes informativos		Unitario	60000	\$ 280,00	\$ 16.800.000,00	X			\$ 17.299.800,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1500	\$ 432.495,00	\$ 16.867.305,00						
	Instalación en Puntos Satélites de Información, cartelera en corcho.		Unitario	8	\$ 130.000,00	\$ 1.040.000,00	X			\$ 1.070.940,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	5,538462	\$ 741.420,00	\$ 329.520,00						
	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, carátula a full color plastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto).		Unitario	600	\$ 5.700,00	\$ 3.420.000,00	X			\$ 3.521.745,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.521.745,00						
	Cuñas radiales Charalá		Unitario	1200	\$ 3.000,00	\$ 3.600.000,00	X			\$ 3.707.100,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	90	\$ 278.032,50	\$ 3.429.067,50						
	Cuñas radiales Duitama		Unitario	1560	\$ 7.700,00	\$ 12.012.000,00	X			\$ 12.369.357,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	12,98701	\$ 102.975,00	\$ 12.266.382,00						
	Cuñas radiales Gámbita		Unitario	960	\$ 8.000,00	\$ 7.680.000,00	X			\$ 7.908.480,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	12	\$ 98.856,00	\$ 7.809.624,00						
	Pasacalles		Unitario	40	\$ 130.000,00	\$ 5.200.000,00	X			\$ 5.354.700,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	5,769231	\$ 772.312,50	\$ 4.582.387,50						
	Kits para campañas de cultura vial (mini agenda y esfero; marcados)		Unitario	3200	\$ 12.500,00	\$ 40.000.000,00	X			\$ 41.190.000,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 41.190.000,00						

776

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6										
														VERSIÓN	1										
														PÁGINA	Pagina 2 de 5										
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				40		FECHA										01		OCTUBRE		2024		
1. DATOS DEL PROYECTO																									
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021			
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																				No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																									
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	4		ENERO		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL					OBSERVACIONES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)									
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar)	Unitario	70	\$ 500.000,00	\$ 35.000.000,00	X		\$ 36.041.250,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	3,730652	\$ 1.920.819,45	\$ 34.120.430,55									
	Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres y refrigerios para reuniones).	Unitario	110	\$ 150.000,00	\$ 16.500.000,00	X		\$ 16.990.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	6,208667	\$ 959.006,18	\$ 16.031.868,83									
Proyectos productivos -Obras con participación comunitaria	Obras con Participación Comunitaria (Charalá)	Unitario	1	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	X		\$ 278.032.500,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 278.032.500,00									
	Obras con Participación Comunitaria (Duitama)	Unitario	1	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	X		\$ 185.355.000,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 185.355.000,00									
	Obras con Participación Comunitaria (Paipa)	Unitario	1	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	X		\$ 41.190.000,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 41.190.000,00									
	Obras con Participación Comunitaria (Cámbita)	Unitario	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	X		\$ 20.595.000,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 20.595.000,00									
	Obras con Participación Comunitaria (San Gil)	Unitario	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	X		\$ 30.892.500,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 30.892.500,00									
	Obras con participación Comunitaria (Páramo)	Unitario	1	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	X		\$ 61.785.000,00		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 61.785.000,00									
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 31/03/2022	Alquiler de carpas, pantalla, sonido, sillas y mesas	Unitario	1	\$ 3.550.000,00	\$ 3.550.000,00	X		\$ 3.655.612,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 3.655.612,50	\$ -									
	Alquiler de espacio	Unitario	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	X		\$ 154.462,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 154.462,50	\$ -									
	Kits de bioseguridad	Unitario	52	\$ 6.000,00	\$ 312.000,00	X		\$ 321.282,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 321.282,00	\$ -									
	Hidratación	Unitario	120	\$ 925,00	\$ 111.000,00	X		\$ 114.302,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 114.302,25	\$ 0,05									
	Refrigerio	Unitario	100	\$ 7.000,00	\$ 700.000,00	X		\$ 720.825,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 720.825,00	\$ -									
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X		\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 514.875,00	\$ -									
	Cascos amarillos	Unitario	25	\$ 29.750,00	\$ 743.750,00	X		\$ 765.876,60	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 765.876,56	\$ 0,04									
	Chalecos reflectivos	Unitario	30	\$ 35.700,00	\$ 1.071.000,00	X		\$ 1.102.862,30	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 1.102.862,25	\$ 0,05									
Socialización "Ojos en la Vía" en Santander, Liderado por INVIAS. Fecha: 14/05/2022	Refrigerio - Hayacas	Unitario	150	\$ 2.690,00	\$ 403.500,00	X		\$ 415.504,13	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 415.504,13	\$ -									
	Refrigerios - Tenedores, platos, servilletas, bocadillos, jugo, bebida	Global	1	\$ 426.400,00	\$ 426.400,00	X		\$ 439.085,40	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 439.085,40	\$ -									
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de	Unitario	1	\$ 4.540.000,00	\$ 4.540.000,00	X		\$ 4.675.065,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 4.675.065,00	\$ -									
	Kits de bioseguridad	Unitario	40	\$ 6.000,00	\$ 240.000,00	X		\$ 247.140,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 247.140,00	\$ -									
	Servicio de transporte en la ruta Charalá - Virolin	Unitario	1	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	X		\$ 1.338.675,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 1.338.675,00	\$ -									

496

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6							
															VERSIÓN		1							
															PÁGINA		Pagina 3 de 5							
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			40		FECHA										01		OCTUBRE		2024	
1. DATOS DEL PROYECTO																								
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5			OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021				
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021				
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																								
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA	4		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES				
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	18 E E M	2024	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)							
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVIAS. Fecha: 15/07/2022	Refrigerios	Unitario	100	\$ 7.000,00	\$ 700.000,00	X			\$ 720.825,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 720.825,00	\$ -							
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X			\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 514.875,00	\$ -							
	Alquiler de espacio	Unitario	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	X			\$ 154.462,50		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 154.462,50							
	Hidratación	Unitario	96	\$ 925,00	\$ 88.800,00	X			\$ 91.441,80	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	96	\$ 91.441,80	\$ -							
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	X			\$ 3.604.125,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 3.604.125,00	\$ -							
Caminata ecológica en Boyacá, liderada por INVIAS 01/04/2022	Pañoleta mascotas, cachucha malla y camiseta tshirt polialgodon	Global	1	\$ 2.049.905,00	\$ 2.049.905,00	X			\$ 2.110.889,70	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.110.889,67	\$ 0,03							
	Refrigerio canasta de pic nic	Unitario	50	\$ 15.000,00	\$ 750.000,00	X			\$ 772.312,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	50	\$ 772.312,50	\$ -							
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X			\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 514.875,00	\$ -							
	Hidratación	Unitario	192	\$ 925,00	\$ 177.600,00	X			\$ 182.883,60	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	192	\$ 182.883,60	\$ -							
	Antibacterial con microesferas de vitamina glicerín x 30ML, Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado spray X60 ml	Global	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	X			\$ 308.925,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 308.925,00	\$ -							
Recorrido técnico "Del aula a la obra", Universidad Juan de Castellanos	Material POP - Cartillas impresas	Unitario	40	\$ 5.950,00	\$ 238.000,00	X			\$ 245.080,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 245.080,50	\$ -							
	Etiquetas pequeñas para cascos, manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm	Global	1	\$ 42.840,00	\$ 42.840,00	X			\$ 44.114,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 44.114,49	\$ 0,01							
	Refrigerios	Unitario	70	\$ 7.000,00	\$ 490.000,00	X			\$ 504.577,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	70	\$ 504.577,50	\$ -							
	Transporte	Unitario	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	X			\$ 1.029.750,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.029.750,00	\$ -							
	Cascos blancos	Unitario	40	\$ 29.700,00	\$ 1.188.000,00	X			\$ 1.223.343,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 1.223.343,00	\$ -							
	Tula	Unitario	40	\$ 14.000,35	\$ 560.014,00	X			\$ 576.674,42	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 576.674,42	\$ 0,00							
	Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado spray X60ml	Global	1	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	X			\$ 185.355,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	30	\$ 185.355,00	\$ -							

476

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6																		
															VERSIÓN		1																		
															PÁGINA		Pagina 4 de 5																		
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			40		FECHA													01		OCTUBRE		2024									
																																		(Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021													
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																		No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO		1015/2021													

476

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
														VERSIÓN	1					
														PÁGINA	Página 5 de 5					
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			40		FECHA										01	OCTUBRE	2024
																		1. DATOS DEL PROYECTO		
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5					OBJETO DEL CONTRATO			MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.							No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021		
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander															No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021		
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA	18		ENERO		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	E	E	T	E	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
Feria de comercialización rural, municipio de Charalá	Refrigerio, pastel ranchero	Unitario	45	\$ 2.300,00	\$ 103.500,00	X				\$ 106.579,13	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 45	\$ 106.579,13	\$ -		
	Refrigerio, flautas - hojaldres	Unitario	45	\$ 2.500,00	\$ 112.500,00	X				\$ 115.846,90	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 45	\$ 115.846,88	\$ 0,02		
	Hidratación	Global	1	\$ 264.100,00	\$ 264.100,00	X				\$ 271.957,00	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 1	\$ 271.956,96	\$ 0,04		
	Almuerzos	Unitario	45	\$ 13.600,00	\$ 612.000,00	X				\$ 630.207,00	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 45	\$ 630.207,00	\$ -		
	Alquiler mesas y sillas	Global	1	\$ 315.000,00	\$ 315.000,00	X				\$ 324.371,30	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 1	\$ 324.371,25	\$ 0,05		
	Techo 10x24 y 15 stand	Global	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	X				\$ 4.119.000,00	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 0	\$ -	\$ 4.119.000,00		
	Gorra malla, camisa, escarapela, pendón, sticker	Global	1	\$ 2.195.550,00	\$ 2.195.550,00	X				\$ 2.260.867,61	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 1	\$ 2.260.867,61	\$ 0,00		
Servicio de transporte de dos (02) camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - Charalá - Duitama) y un bus (recorrido de Virolin a Charalá y regreso).	Global	1	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00	X				\$ 1.750.575,00	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 1	\$ 1.750.575,00	\$ -			
Relacionamiento con comunidades.	Provisión para próximas vigencias	Global	1	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	X				\$ 154.462.500,00	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 0,034369	\$ 5.308.739,52	\$ 149.153.760,48		
Escuelas Verdes	Escuelas Verdes	Global	3	\$ 4.002.000,00	\$ 12.006.000,00	X				\$ 12.363.178,50		\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 0	\$ -	\$ 12.363.178,50		
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																				
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No. FECHA	18		ENERO		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (\$)	E	E	T	E	VALOR GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)		
Gestión Sociopredial	Factor por Unidad Mínima de Vivienda (UMV)	Unitario	1	\$ 1.578.780.141,64	\$ 1.578.780.141,64	X				\$ 1.625.748.850,90	0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 1	\$ 83.519.521,35	\$ 1.514.364.294,55		
	Factor por Traslado (TDO)	Unitario	1			X					0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 1	\$ 5.066.370,00			
	Unidad Mínima Económica (UME)	Unitario	1			X					0	\$ -	- 2,5%	\$ -	\$ -	- 1	\$ 22.798.665,00			
4. RESUMEN																				
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS				\$					-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO				\$	-			
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA				\$					-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA				\$	-			
C	VALOR IVA MENSUAL				\$					-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL				\$	-			
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL				\$					-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL				\$	-			
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)				\$					2.460.989.793,43	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				\$	168.121.053,57			
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA				\$					2.629.110.847,00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)					6,39%			
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																				
6. FIRMAS																				
Firma:																				
Firma:																				
Firma:																				
Firma:																				
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre-actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																				
Original: Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																				

FECHA

31/08/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1. UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

3. AÑO

2024

MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. LOCALIZACIÓN:

RUTA:

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL

TRAMO:

5701

6. CONTRATO DE OBRA No:

987 2021

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5

8. CONTRATISTA:

MINICIVIL

NIT

890930545-1

9. INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

NIT

901481447-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1015 DE 2021

11. PLAZO INICIAL:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

12. FECHA DE INICIO:

29/06/2021

13. FECHA DE REANUDACIÓN:

AAAA-MM-DD

14. PLAZO ACUMULADO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

15. FECHA DE SUSPENSIÓN:

AAAA-MM-DD

16. FECHA DE VENCIMIENTO:

31/08/2030

17. TIPO DE GESTIÓN:

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

18. VR. DE LA GESTIÓN:

\$ 7.555.307.835

19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

\$ 2.934.774.443

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):

\$ 7.555.307.835

21. VR. ANTICIPO:

22. VR. ADICIÓN No:

23. VR. ADICIÓN No:

24. VR. TOTAL ADICIONES:

25. VR. TOTAL ACUMULADO:

\$ 7.555.307.835

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)

CANTIDAD

V/R UNIDAD.

TOTAL

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE

\$ -

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

\$ -

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

\$ -

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)

\$ -

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES

\$ -

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL

\$ -

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)

\$ -

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)

\$ -

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

\$ -

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

\$ -

ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS

\$ -

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)

\$ -

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO

\$ -

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.

\$ -

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV

\$ -

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV

\$ -

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV

\$ -

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV

\$ -

1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN

\$ -

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA

\$ -

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

\$ -

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA

\$ -

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR

\$ -

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS

\$ -

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

\$ -

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL

\$ -

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)

\$ -

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

\$ -

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

\$ -

55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA

\$ -

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE

\$ -

1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS

\$ -

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

\$ -

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA

\$ -

60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

\$ -

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN

\$ -

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61

\$ -

IVA

\$ -

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL

\$ -

45

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 7
FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

Contrato N° 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO:

\$324,627,245,375

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

CONTRATISTA

MINICIVIL S.A.

INTERVENIOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

FECHA DE
CORTE:

27/09/2024

PERIODO

25 DE AGOSTO DE 2024 al 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2024

sep/2024

ACTA Nro.40

40

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)
EXPLANACIONES										
1	1.0		200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		\$ 1,137,185.00	\$ -		\$ -
1.1	1.0	11601	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	\$ 1,137,185.00	\$ 40,938,660.00	0.02	\$ 22,744.00
2	1.0		201.7	Demolición de Estructuras	m3		\$ 109,175.00	\$ -		\$ -
2.1	1.0	11601	201.7	Demolición de Estructuras	m3	436	\$ 109,175.00	\$ 47,567,548.00	3.30	\$ 360,278.00
3	1.0		201.2	Remoción de alcantarillas	m		\$ 66,695.00	\$ -		\$ -
3.1	1.0	11601	201.2	Remoción de alcantarillas	m	1,281	\$ 66,695.00	\$ 85,436,295.00	7.00	\$ 466,885.00
4	1.0		210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		\$ 12,048.00	\$ -		\$ -
4.1	1.0	11601	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1,625	\$ 12,048.00	\$ 19,578,000.00		\$ -
5	1.0		210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	617	\$ 60,236.00	\$ 37,165,612.00		\$ -
5.1	1.0	11601	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	80,569	\$ 60,236.00	\$ 4,853,154,284.00		\$ -
6	1.0		210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3,352	\$ 10,193.00	\$ 34,167,955.00		\$ -
6.1	1.0	11601	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,666,825	\$ 10,193.00	\$ 16,989,946,206.00	1,618.10	\$ 16,493,293.00
7	1.0		211.1	Remoción de Derrumbes	m3	593	\$ 9,335.00	\$ 5,535,655.00		\$ -
7.1	1.0	11601	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	123,833	\$ 9,335.00	\$ 1,155,981,055.00	82.80	\$ 772,938.00
8	1.0		220.1	Terraplenes	m3		\$ 12,565.00	\$ -		\$ -
8.1	1.0	11601	220.1	Terraplenes	m3	190,406	\$ 12,565.00	\$ 2,392,451,390.00		\$ -
TOTAL EXPLANACIONES								\$ 25,861,922,880.00		\$ 18,116,118.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
9	2.00		310.1	Conformación de la calzada existente	m2	121,265	\$ 888.00	\$ 107,883,320.00		\$ -
9.1	2.00	11602.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	586,897	\$ 888.00	\$ 521,164,536.00	2,723.60	\$ 2,418,557.00
10	2.00		311.1	Afirmado	m3	13,428	\$ 106,030.00	\$ 1,423,802,649.00		\$ -
10.1	2.00	11602.00	311.1	Afirmado	m3	150,111	\$ 106,030.00	\$ 15,916,237,521.00	342.90	\$ 36,357,687.00
11	2.00		320.1	Subbase Granular clase A	m3	592	\$ 152,246.00	\$ 90,068,734.00		\$ -
11.1	2.00	11602.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	61,140	\$ 152,246.00	\$ 9,308,381,338.00	1,398.40	\$ 212,900,806.00
12	2.00		330.1	Base granular clase A	m3		\$ 169,384.00	\$ -		\$ -
12.1	2.00	11602.00	330.1	Base granular clase A	m3	11,000	\$ 169,384.00	\$ 1,863,224,000.00		\$ -
13	2.00		330.4	Base granular para bacheo clase A	m3		\$ 184,265.00	\$ -		\$ -
13.1	2.00	11602.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	5,000	\$ 184,265.00	\$ 921,325,000.00		\$ -
TOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								\$ 30,151,887,098.00		\$ 251,677,050.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS										
14	8.00		420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525	\$ 2,795.00	\$ 1,467,375.00		\$ -
14.1	8.00	11603.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	312,008	\$ 2,795.00	\$ 872,062,380.00		\$ -
15	8.00		421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1,771.00	\$ -		\$ -
15.1	8.00	11603.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	315,033	\$ 1,771.00	\$ 557,923,443.00		\$ -
16	8.00		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 807,206.00	\$ -		\$ -
16.1	8.00	11603.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	55,077	\$ 807,206.00	\$ 44,458,484,862.00		\$ -
17	8.00		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1,127	\$ 834,513.00	\$ 940,829,956.00		\$ -
17.1	8.00	11603.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,703	\$ 834,513.00	\$ 3,089,867,833.80		\$ -
18	8.00		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,094	\$ 69,747.00	\$ 76,289,268.60		\$ -
18.1	8.00	11603.00	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,356	\$ 69,747.00	\$ 164,337,881.00		\$ -
19	8.00		465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	35	\$ 75,562.00	\$ 2,629,557.60		\$ -
19.1	8.00	11603.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	6,866	\$ 75,562.00	\$ 518,770,911.00		\$ -
20	8.00		466.1	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m		\$ 4,159.00	\$ -		\$ -
20.1	8.00	11603.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	2,500	\$ 4,159.00	\$ 10,397,500.00		\$ -
TOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								\$ 50,693,060,948.00		\$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
21	6.00		600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 31,287.00	\$ -		\$ -
21.1	6.00	11402.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	61,628	\$ 31,287.00	\$ 1,928,155,238.00	469.30	\$ 14,682,989.00
21.2	6.00	11604.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	26,412	\$ 31,287.00	\$ 826,352,244.00	109.70	\$ 3,432,184.00
22	6.00		600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 78,424.00	\$ -		\$ -
22.1	6.00	11402.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	16,787	\$ 78,424.00	\$ 1,316,535,058.00		\$ -
22.2	6.00	11604.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	12,253	\$ 78,424.00	\$ 960,897,902.00	23.00	\$ 1,803,752.00
23	6.00		610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		\$ 42,939.00	\$ -		\$ -
23.1	6.00	11402.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9,450	\$ 42,939.00	\$ 405,790,726.00		\$ -
23.2	6.00	11604.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9,550	\$ 42,939.00	\$ 410,050,274.00		\$ -
24	6.00		610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 67,218.00	\$ -		\$ -
24.1	6.00	11402.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	27,199	\$ 67,218.00	\$ 1,828,228,773.00	743.30	\$ 49,963,139.00
24.2	6.00	11604.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	11,657	\$ 67,218.00	\$ 783,526,617.00		\$ -
25	6.00		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2,869,762.00	\$ -		\$ -
25.1	6.00	11403	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	765	\$ 2,869,762.00	\$ 2,195,367,930.00		\$ -
26	6.00		630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 813,312.00	\$ -		\$ -
26.1	6.00	11403.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	7,083	\$ 813,312.00	\$ 5,760,932,890.00	255.00	\$ 207,394,560.00
26.1	6.00	11604.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3,036	\$ 813,312.00	\$ 2,468,971,238.00		\$ -
27	6.00		630.4	Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 670,367.00	\$ -		\$ -
27.1	6.00	11403.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	6,759	\$ 670,367.00	\$ 4,531,010,553.00		\$ -
27.2	6.00	11604.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	2,896	\$ 670,367.00	\$ 1,941,382,832.00		\$ -
28	6.00		630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3		\$ 500,114.00	\$ -		\$ -
28.1	6.00	11403.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	218	\$ 500,114.00	\$ 108,874,818.00		\$ -
28.2	6.00	11604.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	93	\$ 500,114.00	\$ 46,660,636.00		\$ -



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACIÓN No 7
FECHA 28 DE JUNIO DE 2024

Contrato N° 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO:

\$324,627,245,375

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

CONTRATISTA

MINICIVIL S.A.

INTERVENIOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

FECHA DE
CORTE:

27/09/2024

PERIODO

25 DE AGOSTO DE 2024 al 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2024

sep/2024

ACTA Nro.40

40

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)
54	3.00		900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		\$ 1,012.00	\$ -		\$ -
54.1	3.00	11608	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	678,921	\$ 1,012.00	\$ 687,068,052.00		\$ -
55	3.00		900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	62,000	\$ 1,125.00	\$ 69,749,887.00		\$ -
55.1	3.00	11608	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	38,790,303	\$ 1,125.00	\$ 43,639,080,988.00	44,082.40	\$ 49,603,950.00
56	3.00		900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5,090	\$ 1,125.00	\$ 5,725,800.00		\$ -
56.1	3.00	11608	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,649,621	\$ 1,125.00	\$ 1,855,824,075.00		\$ -
TOTAL TRANSPORTES										\$ 49,603,950.00
ITEMS NO PREVISTOS										
57.1	1.00	11601	200.2P	Rocaría y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2	395,285	\$ 845.00	\$ 334,015,825.00		\$ -
58.1	1.00	11601	221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3	5,125	\$ 118,439.00	\$ 606,998,875.00	100.20	\$ 11,867,588.00
59.1	8.00	11603	420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2	32,200	\$ 2,989.00	\$ 96,213,600.00		\$ -
60.1	8.00	11603	465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m	10,140	\$ 8,855.00	\$ 89,789,700.00		\$ -
61.1	8.00	11603	673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro 100 mm	m2	6,213	\$ 53,319.00	\$ 331,270,947.00	314.00	\$ 16,742,168.00
62.1	6.00	11403	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobranes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autorivelante de 28 MPa)	m	1,680	\$ 453,664.00	\$ 762,155,520.00		\$ -
63.1	6.00	11403	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	60	\$ 2,387,110.00	\$ 143,226,600.00		\$ -
63.1	6.00	14104	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	50	\$ 2,387,110.00	\$ 119,355,500.00		\$ -
	6.00	11403	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1,889	\$ 3,163,203.00	\$ 5,975,290,467.00	84.00	\$ 202,444,992.00
64.1	6.00	14104	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	176	\$ 3,163,203.00	\$ 556,723,728.00		\$ -
65.1	6.00	11403	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1,052	\$ 3,869,276.00	\$ 4,070,478,352.00	98.40	\$ 380,736,758.00
65.1	6.00	14104	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	78	\$ 3,869,276.00	\$ 301,803,528.00		\$ -
66.1	6.00	11403	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	1,926	\$ 438,105.00	\$ 843,790,230.00	2.40	\$ 1,051,452.00
66.1	6.00	11604	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	214	\$ 438,105.00	\$ 93,754,470.00		\$ -
67.1	6.00	11604	661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e instalación, no incluye material de atraque y solado)	m	2,621	\$ 557,097.00	\$ 1,460,151,237.00	14.00	\$ 7,798,368.00
68.1	6.00	11604	671.30	Berna cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3	14,811	\$ 687,938.00	\$ 10,188,980,924.00		\$ -
69.1	6.00	11403	674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m	8,085	\$ 262,251.00	\$ 2,120,299,335.00	39.00	\$ 10,227,789.00
70.1	6.00	11601	801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material)	m	172,000	\$ 3,128.00	\$ 538,016,000.00		\$ -
71.1	6.00	11606	811.2	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2	28,250	\$ 15,052.00	\$ 425,219,000.00		\$ -
72.1	6.00	11606	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2	28,250	\$ 12,002.00	\$ 339,056,500.00		\$ -
73.1	6.00	11604	671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m	800	\$ 187,036.00	\$ 149,628,800.00		\$ -
74.1	6.00	11606	7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3	945	\$ 46,757.00	\$ 44,185,365.00		\$ -
75.1	6.00	11606	8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und	2,870	\$ 35,419.00	\$ 101,652,530.00		\$ -
76.1	6.00	11606	9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und	1,435	\$ 52,166.00	\$ 74,858,210.00		\$ -
77.1	6.00	11606	10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und	820	\$ 100,101.00	\$ 82,082,820.00		\$ -
78.1	6.00	11606	11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und	820	\$ 164,783.00	\$ 135,122,060.00		\$ -
79.1	4.00	11403	810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2.7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2	23,821	\$ 284,333.00	\$ 6,773,039,526.00	736.80	\$ 209,496,554.00
80.1	4.00	11403	623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m	13,119	\$ 287,855.00	\$ 3,776,427,316.00	54.00	\$ 15,544,170.00
81.1	4.00	11403	623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m	27,430	\$ 240,099.00	\$ 6,585,867,550.00	36.00	\$ 8,643,564.00
	4.00	11403	623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m	78	\$ 285,961.00	\$ 22,281,558.00		\$ -
83.1	4.00	11403	623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m	2,277	\$ 411,856.00	\$ 937,796,112.00		\$ -
84.1	4.00	11403	623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m	95	\$ 542,377.00	\$ 51,525,815.00		\$ -

02/10/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato N° 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$324,827,245,375

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

CONTRATISTA

MINICIVIL S.A.

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

FECHA DE CORTE:

27/09/2024

PERIODO

25 DE AGOSTO DE 2024 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 7

FECHA 26 DE JUNIO DE 2024

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)
85.1	4.00	11403	623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m	7,742	\$ 170,567.00	\$ 1,320,461,487.00	75.00	\$ 12,792,525.00
86.1	6.00	11403	631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg	3,747,997	\$ 1,149.00	\$ 4,306,448,783.00	3,995.00	\$ 4,590,255.00
87.1	6.00	11604	600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3	4,080	\$ 87,400.00	\$ 356,592,000.00	1.10	\$ 96,140.00
88.1	4	11403	810.2P	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada de alambre de acero de alta resistencia a la tensión, igual o superior a 130Kn/m, Calibre No. 12	m2	13,500	\$ 276,166.00	\$ 3,728,241,000.00		\$ -
89.1	4	11403	623.1.7P	Perno pasivo R38-550 55Ton Ø>115mm Autoperforante	m	14,596	\$ 411,856.00	\$ 6,011,450,176.00		\$ -
90.1	6.00	11604	671.7P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación	m	2,700	\$ 130,405.00	\$ 352,093,500.00		\$ -
91.1	6.00	11604	671.8P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento, con tres (3) sacos por sección, incluye excavación sin geotextil	m	1,802	\$ 121,869.00	\$ 219,607,938.00	125.80	\$ 15,331,120.00
92.1	6.00	11403	673.2P	Suministro, transporte e instalación de geomembrana HDPE 20 mils	m2	3,650	\$ 16,885.00	\$ 61,631,939.00	200.60	\$ 3,387,131.00
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS								\$ 64,487,585,823.00		\$ 900,751,562.00

								ACTA 40	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS								\$ 278,033,191,146.00	\$ 1,814,172,254.00
VALOR IVA (OBRA)								\$ 2,031,781,012.00	\$ 13,257,413.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 280,064,972,158.00	\$ 1,827,429,667.00

OBSERVACIONES:

ACTA 40

\$ 1,827,429,667.00

ING. ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA

Residente de Obra

Matricula Profesional: 52202-164293 NRÑ

Contratista

ING. HENRY BUITRAGO CARVAJAL

Residente de Interventoría

Matricula Profesional: 15202117965 BYC

Interventoría
