



Yopal, 27 de abril de 2023

EL SUPERVISOR DEL SIGUIENTE PROYECTO:

CERTIFICA QUE

A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S., NIT. 901.126.140-3, representado legalmente por IVON MAYERLY FORERO ABRIL identificado (a) con CÉDULA CIUDADANÍA 33.647.084 de AGUAZUL; dio cumplimiento a las actividades correspondientes a la ETAPA PRECONSTRUCTIVA pactadas en el CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-023-2022 y No. INTERNO 0487 de 2023-02-08, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE", haciendo entrega real en original del informe físico del informe pre-constructivo, realizado en el periodo comprendido entre el 14/03/2023 hasta 27/04/2023, por un valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (Iva incluido) (\$8'568,995.00), según CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO del contrato, pudiéndose cobrar a partir de la fecha por el contratista una vez cumpla con lo exigido en las CLAUSULAS 8, 9 Y 10 de la minuta principal y el lleno de requisitos procedimentales establecidos por la Administración Departamental para su pago.

ING. BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES
Supervisor



842
PROYECTOS

Yopal, 04 de julio de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN -- CORRESPONDENCIA

04 JUL 2023

Hora: 10:08 am *Roberto*
No. de Radicación: **06929--**

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega del informe mensual de interventoría, del mes de mayo del 2023

Mediante el presente oficio esta interventoría realiza la entrega del informe mensual de interventoría del contrato de obra 2653 del 2022. Correspondiente desde el 28 de abril del 2023 hasta el 2 de junio del 2023, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Folios: 218

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE
AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

CONTRATO 0487 DE 2023



PERIODO DEL INFORME

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 0487 DEL 8 DE FEBRERO DE 2023
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Interventoria

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Contratista

PERIODO DEL INFORME
28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023



INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A
NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA –
MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

II. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Secretaria de Infraestructura

Original

III. REVISIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe fue elaborado por el residente de la interventoría, revisado y avalado por el director y representante legal del contratista de interventoría.

Elaboró:

Carlos A. Fonseca

Carlos Andres Fonseca

A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Ingeniero Residente de interventoria

Revisó:

Paola Andrea Maldonado

A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Directora de Interventoria

Aprobó:

IVON MAYERLY FORERO ABRIL

R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA0487 DEL 8 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO: TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría tiene como fundamento exponer el desarrollo del proyecto denominado "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Así mismo describir las actividades contractuales realizadas en este periodo, dentro de la ejecución del proyecto y de esta manera cumplir con el objeto del contrato. Esta obra tiene un plazo inicial de tres (03) meses a partir del acta de inicio firmada el 28 de Abril de 2023 y con fecha de terminación actual al 27 de Julio de 2023.

El acta de inicio del contrato de interventoría se suscribió el día 14 de Marzo de 2023, la cual tiene una duración de cuatro (4) meses, y con fecha de terminación actual al 13 de Julio de 2023.

La Interventoría es ejecutada por la empresa **A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**, con el objeto de verificar y controlar la acción del contratista de obra, para comprobar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, ambientales, actividades administrativas, financieras, contables y jurídicas, establecidas en los términos de referencia del contrato.

Se presenta el informe mensual de interventoría N° 1 al contrato de obra. 2653 del 2022 firmado entre la Gobernación de Casanare y la empresa **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** representada legalmente por **ELIZABETH CAINA DELGADO**, correspondiente al periodo del 28 de Abril de 2023 al 31 de Mayo de 2023, se informa el avance físico y financiero de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra del contrato en mención, y en general todos los datos necesarios para suministrar una información actualizada de la ejecución del contrato y así dar cumplimiento a lo establecido contractualmente, informado a la Gobernación de Casanare por medio del supervisor designado.

847



INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL
DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO
DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

218

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

Aguazul es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Casanare, distante a 27 km por tierra de la capital departamental, Yopal, y de Bogotá 361 km. Cuenta con 43.183 habitantes, de los cuales 32.910 residen en el casco urbano. Es el segundo municipio con mayor población en el departamento del Casanare, después de Yopal, su capital.

Cuenta con una altitud de la cabecera municipal de 300 msnm y se localiza en las coordenadas geográficas de 5°10'08"N de latitud norte y 72°32'48"O de longitud oeste del meridiano de Greenwich, tiene una superficie total de 1455 km².

El presente proyecto se ejecuta en el Municipio de Aguazul -Casanare, en la vereda La Turua, a una distancia aproximada de 25 Km del casco urbano del municipio de Aguazul y su referencia es que está comprendido entre los accesos PR054+074 y el PR055+750 de la marginal de la selva, sector Monterrey – Yopal ruta 65.

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

1.1.1 ANTECEDENTES

Actualmente el área a intervenir hace parte del mejoramiento y rehabilitación de la red vial terciaria del departamento. Este proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado de la vereda la Turua y cuenta con una longitud de 1834m. El proyecto se encuentra inconcluso debido a que inicialmente el contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA representada legalmente por el señor GONZALO DANIEL SALAZAR MONTES, identificado con número de cedula 1.020.760.773 de Bogotá, no alcanzo el 100% de las actividades a ejecutar.

Al contratista se le impuso multas por no cumplir con el objeto del contrato, valores los cuales fueron pagados por la aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS.

El proyecto cuenta con un avance ejecutado del 59.88% equivalente financieramente a \$ 1.342.314.271,00 pesos.

Para este proyecto se designó a un nuevo contratista para concluir con los trabajos pendientes, esta empresa se denomina CAIPRO CONSTRUCTORES SAS representada legalmente por el señor WILLIAM CAINA DELGADO, identificado con número de cedula 79.794.193 de Bogotá. La interventoría fue designada a la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS, cuyo representante legal es la señora IVON MAYERLY FORERO ABRIL, identificada con número de cedula 33.647.084 de Aguazul.

El presupuesto general de obra aprobado en el proceso de licitación es de \$ 946.540.231,20 pesos para un tiempo de ejecución de 3 meses.

82

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

1.1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Con la ejecución del proyecto se pretende realizar:

Realizar el mejoramiento a nivel de pavimento flexible de aproximadamente 1,8 km de vía terciaria en la vereda la Turua:

Intervención que incluye la construcción de estructura de pavimento con carpeta de rodadura en concreto asfáltico en una calzada de ancho promedio 6m, para la demarcación de dos carriles (uno en cada sentido), señalización vial vertical y horizontal, elementos de contención vial, elementos de drenaje longitudinal con filtro francés y cunetas en concreto, drenaje transversal con alcantarillas y box culvert y obras de geotecnia.

 PROYECTOS	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023
1.2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 2653 DE 2022.		
Entidad Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE	
Contratista	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	
C.C. / NIT.	900.119.570-4	
Representante Legal	ELIZABETH CAINA DELGADO	
Numero del Contrato	2653 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo inicial (Meses)	TRES (3) MESES	
Valor fiscal	\$946.540.231,20	
Valor anticipo 50%	\$473.270.115,60	
Fecha de Inicio	viernes, 28 de abril de 2023	
Fecha de Terminación Actual	jueves, 27 de julio de 2023	
Objeto	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
INFORMACIÓN FINANCIERA		
Valor inicial del contrato	\$ 946.540.231,20	
Valor del anticipo 50%	\$ 473.270.115,60	
Valor facturado	\$ 0,00	
Valor por facturar	\$ 946.540.231,20	
Anticipo por amortizar	\$ 473.270.115,60	
DATOS DEL CONTRATISTA		
Firma Contratista	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	
C.C. / NIT.	900.119.570-4	
Representante Legal	ELIZABETH CAINA DELGADO	
Dirección de Correspondencia	CALLE 73 N° 20A - 66	
Teléfono / Celular	3007978856	
Ciudad / Municipio	BOGOTÁ DC	
E: mail	www.caipro.com.co	

802

 <p>PROYECTOS</p>	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	
<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1</p>		<p>28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023</p>

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0487 DE 2023	
Entidad Contratante	MUNICIPIO DE AGUAZUL- CASANARE
Contratista	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
C.C. / NIT.	901.126.140-3
Representante Legal	IVON MAYERLY FORERO ABRIL
Numero del Contrato	0487 DEL 8 DE FEBRERO DE 2023
Plazo inicial (Meses)	CUATRO (4) MESES
Valor fiscal	\$87.217.113,00
Fecha de iniciación	martes, 14 de marzo de 2023
Fecha de terminación	jueves, 13 de julio de 2023
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO ACTUAL	
Valor inicial del contrato	\$ 87.217.113,00
Valor del anticipo	\$ 0,00
Valor por Facturar	\$ 87.217.113,00
Anticipo por amortizar	\$ 0,00
DATOS DEL INTERVENTOR	
Firma Interventora	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
C.C. / NIT.	901.126.140-3
Representante Legal	IVON MAYERLY FORERO ABRIL
Dirección de Correspondencia	CLLE 11 No 04-20
Teléfono / Celular	3233118725
Ciudad / Municipio	Trinidad (CASANARE)
E: mail	aypingingenieriasas@gmail.com

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1	28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023	

1.3 CONTROL CONTRACTUAL

ETAPA PRECONSTRUCTIVA: Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista e Informar en caso de que se encuentren erróneos, incompletos o exista diferencias entre estos. Revisión requerimientos ambientales. 1 Revisión estado predial de los sitios donde se desarrollara el proyecto. Revisión de Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos. Revisión de Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales.

ETAPA CONSTRUCTIVA:

2.1 interventoría Técnica: Dar iniciación a las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obras. Conocer los estudios técnicos del proyecto, memorias de diseño y planos constructivos, tanto arquitectónicos como técnicos. Exigir al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares del proyecto. Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y demás controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten. Control de programación y avance de obras, a través de la línea de balance. Remisión y aprobación y coordinación, de la señalización preventiva que se utilizará en la obra. Control de recursos, tales como materiales, mano de obra y equipos. Solución de problemas técnicos de obra. Medición y revisión de cantidades de obra que será la base de las actas. Verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas. Revisión y aprobación de los estudios y/o rediseños propuestos en desarrollo de las obras. Revisión y aprobación del personal profesional exigido en los términos de referencia. Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residente de obra, una memoria diaria de la obra en la Bitácora. Apoyar la Gobernación de Casanare en los comités de obra y seguimiento de obra.

2.2 interventoría Ambiental: Conocer los estudios técnicos del proyecto y los estudios de impacto ambiental. Velar porque el contratista cumpla los requerimientos de las medidas ambientales generales para cualquier proyecto de obra civil. Realizar control y seguimiento ambiental a las actividades de construcción con el fin de evitar impactos no previstos y evitar daños a terceros. Solicitar al contratista el cumplimiento del programa de seguridad industrial e higiene en el trabajo. Verificar el alcance de los permisos ambientales, su vigencia y las necesidades de ampliación o modificación de este, si llegasen a ser requeridos según el tipo de obra a ejecutar. Realizar acciones adelantadas por parte del contratista para minimizar y mitigar impactos. Hacer cumplir la normatividad ambiental vigente y actos administrativos de CORPORINOQUIA a través de cual se toman y promulgan las decisiones ambientales. Presentar informes de interventoría Ambiental a la entidad contratante.

804

 <p>PROYECTOS</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	 <p>Gobernación de Casanare</p>
<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1</p>		<p>28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023</p>

2.3 Interventoría Administrativa: Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera. O Establecer medidas ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con los contratistas, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la Gobernación intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados. Coordinar con las dependencias de la Gobernación que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. Procurar que por causas atribuibles a la Gobernación de Casanare no se cause un rompimiento del equilibrio financiero. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza del mismo; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento de los contratos, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración de los contratos. Aprobación de modificaciones y entregar a la Entidad soportes técnicos y planos aprobados. Elaboración de informes periódicos mensuales.

2.4. Interventoría Financiera: Llevar el control financiero del contrato. Estudio y aplicación del programa de obra, flujos de fondos de inversión del anticipo. Seguimiento, aprobación y control de anticipos. Emitir el concepto sobre los análisis de precios elaborados por el constructor y de ítems no previstos. Preparar con el contratista las actas de recibo de los bienes, servicios y obras contratadas, estableciendo las cantidades correctas de ítems de los bienes, servicios y obras ejecutadas y recibidas, así como los valores a pagar y los valores a descontar. Mantener información actualizada sobre los valores pagados al contratista y la amortización al anticipo. Llevar un cuadernillo financiero con todos aquellos documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas en desarrollo del contrato.

805

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación del Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

2.5. interventoría Contable: Constatar la expedición del certificado de disponibilidad presupuesta! y el registro presupuestal. Solicitar al de la constitución de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, según sea el caso, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. Solicitar al contratista el informe mensual de inversión del anticipo, soportado los pagos realizados. Revisar que las facturas presentadas por el contratista para efectos de pago, cumplan los requisitos legales y los establecidos en el contrato (IVA, ICA, amortización de anticipo). Constatar el pago oportuno de las facturas presentadas por el contratista. Presentar informe del estado de los rendimientos financieros y verificar la correcta devolución de los mismos.

2.6 interventoría Jurídica: Conocer el clausulado y demás componentes que hacen parte de la ejecución del proyecto cuyo objeto es "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE." . Consultar con el comité de seguimiento y control del contrato las decisiones y/o actuaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto. Conocer el clausulado del contrato y establecer el cumplimiento de los requisitos de legalización (publicación y timbre entre otros). Conocer la etapa precontractual. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales. Constatar el registro presupuestal del contrato. Obtener copia de la garantía única y su póliza anexa junto con su aprobación, verificar vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. Solicitar al contratista la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su póliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio. Informar a la Oficina Asesora Jurídica el incumplimiento de cualquier obligación contractual. Solicitar al ordenador del gasto, en los casos estipulados en el contrato, la aplicación de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, multas o caducidad. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica los documentos mediante los cuales se haga constar las modificaciones del contrato.

88

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1	28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023	

Solicitar al contratista, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en el amparo de estabilidad de obra y modificatorio de los demás amparos así como de la póliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual, junto con su aprobación. Llevar un cuadernillo legal, que contendrá copia de todos aquellos documentos del seguimiento, según la modalidad del contrato: Proyecto de pliego de condiciones o términos de referencia, pliego o términos definitivos y adendas. Disponibilidad y reserva presupuestal. Contrato. • Acta de Iniciación del contrato. • Acta de recibo y aprobación de diseño. • Acta de anticipo. • Informe de Inversión y buen manejo de anticipo. • Acta de liquidación del anticipo. • Acta de reajuste. • Acta de recibo parcial de obra o consultoría • Análisis unitarios de actividades no previstas • Acta de suspensión • Acta de cambio de supervisor o interventoría • Acta de recibo final de contrato de obra • Acta de terminación del contrato • Acta de liquidación del contrato de obra • Acta de recibo final y liquidación de consultoría • Control de Ajustes • Acta de fijación de precios no previstos • Control de legalidad contrato • Autorización reintegro de anticipo • Evaluación cumplimiento de obligaciones contractuales • Solicitud de prórroga o adición • Acta de reiniciación • Solicitud de sanción del contratista. Todas las solicitudes, órdenes, documentación, determinaciones, consultas, definiciones y demás gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, etc., que realice el interventor, deben constar por escrito. Estudio y aplicación de las cláusulas del contrato de Obra. Velar por el cumplimiento Manual de interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, Informar al personero departamental o veedurías ciudadanas cuando sea requerido. Liquidar el contrato de acuerdo con la normatividad nacional vigente, la interventoría contratada tendrá que entregar todas las obras terminadas de acuerdo con las condiciones contractuales y realizarla respectiva liquidación del contrato.

Conocer en todas sus partes el contenido de los contratos y demás documentos correspondientes al proyecto. Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto plazo determinado. En caso de incumplimiento por parte del contratista de la orden impartida, solicitar la aplicación de la sanción. Asegurar que no se presenten litigios o conflictos por repetición en contra de la Gobernación de Casanare en el aspecto laboral, civil o daños a terceros. Emitir concepto para modificar y/o aclarar las cláusulas de los contratos suscritos por la Gobernación de Casanare, para realizar ajustes a los contratos de obra pública en lo que respecta a mayores y/o menores cantidades de obra contratada, para adicionar el valor del contrato y para prorrogar el plazo de ejecución de los mismos, concepto que debe estar debidamente soportado y argumentado. Conocer, manejar y emplear el Manual de interventoría y Supervisión, y los formatos adoptados por la entidad. Solicitar a la Gobernación las licencias y documentos requeridos para la construcción del proyecto o ejecución del objeto contractual.

87



INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL
DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO
DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

2. INFORME JURÍDICO

888

 PROYECTOS		 Casanare						
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1								
28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023								
2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA								
DATOS ESPECÍFICOS								
OBJETO DEL CONTRATO								
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA SUPERVISOR								
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S Brenda Roraima Barrera								
2.1. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA								
PÓLIZAS MINUTA								
Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		%	Fecha aprobación	Acta con el que se genero la aprobación
SEGUROS DEL ESTADO S A	57-44-101003391/0	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	\$ 8.721.711,30	Desde	Hasta	10%	28/02/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA No1
SEGUROS DEL ESTADO S A	57-44-101003391/0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA	\$ 4.360.855,65	9/02/2023	17/03/2023	5%	28/02/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA No1
SEGUROS DEL ESTADO S A	57-44-101003391/0	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 8.721.711,30	15/06/2023	17/11/2027	10%	28/02/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA No1

809



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.909.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD. SUC 57		NO PÓLIZA 57-44-101003391		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO 27 03 2023			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 09 02 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 15 06 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACIÓN											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL AAP SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.126.140-3
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 17 - 50-47	Ciudad: YOPAL, CASANARE
TELÉFONO: 3208147010	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
ASEGURADO / BENEFICIARIO GOBERNACIÓN DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN NIT: 892.889.216-6
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 8 - 02	Ciudad: YOPAL, CASANARE
TELÉFONO: 83360339	
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO
CON SUjecION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN SEGUROS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA ANEXO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
Garantiza el cumplimiento de las obligaciones del contrato INTERCOMUNICACIÓN DEL PAPEL DEL AUTO-COMPRO, CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, VIGILANCIA TECNICA Y LOGISTICA PARA LA TERMINACION DEL PERMANENTE A TERCEROS PATRIMONIO DE LA PMA DE AUTOS A LA SERVICIO TONCA MUNICIPIO DE BUENA VENTURA DE CASANARE.

AMPAROS
Asesoría, INTERCOMUNICACIÓN
NO SE APLICA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA FORMA AUTOMÁTICA FORMA AUTOMÁTICA

ACLARACIONES
REVISAR EL PRESENTE SEGURO DE REALIZACIÓN TRÁMITE DE VIGILANCIA TÉCNICA (MODO DE TRÁMITE DE PEDIR) 11 DE 10000 DEL 2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLANE DE PAGO
\$ ****(256.728.00)	\$ ****(8.000.00)	\$ ****(50.298.00)	\$ *****(315.027.00)	\$ *****(21.804.278.25)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS Y SERVICIOS SAIGRA - COSEGUROS	170104	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3162010306 - YOPAL

57-44-101003391

FIRMA AUTORIZADA: Gerente A. Ezequiel B. - SAGRAMA GARCIA



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 30 NO. 16-61 TELÉFONO: 461-219677, 461-040000

LIBRARYONA

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

860



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 903.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COO.SUC 57	NO.PÓLIZA 57-44-10100391	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 03 2023	09 02 2023		00:00	15 06 2028		23:59	ANEXO DE MODIFICACIÓN	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ASP SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.128.140-3	
DIRECCIÓN CR 29 NRD. 17 - 59 41			CIUDAD: YOPAL CASANARE		TELÉFONO: 3208147010

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO


ASEGURADO / BENEFICIARIO:		GOBERNACION DE CASANARE		IDENTIFICACIÓN NIT: 903.009.216-6	
DIRECCIÓN: CR 20 NRD. 8 - 02			CIUDAD: YOPAL CASANARE		TELÉFONO: 6336330
ADICIONAL:					

ADICIONAL:



P. GUESTADO
PUERTO DEL PASADO

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *** (256.726.00)	GASTOS EXPEDICIÓN \$ ***** (8.000.00)	IVA \$ *** (50.296.00)	TOTAL A PAGAR \$ ***** (315.027.00)	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ***** (21.804.278.25)	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUIDOR COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	N. DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	N. PART.	VALOR ASEGURADO
EDYTH HENRIE BARRON BOCHICA	271094	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRETA 7 NO. 23 - 54 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

861



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-4

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57		NO.POLIZA 57-44-101003391		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 03 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 02 2023			A LAS HORAS 00 00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 06 2028			A LAS HORAS 23 59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE MODIFICACIÓN												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS											
IDENTIFICACIÓN NIT: 891.126.140-3											
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 17 - SB 41						CIUDAD: YOPAL CASANARE			TELÉFONO: 3208147010		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: GOBERNACION DE CASANARE											
IDENTIFICACIÓN NIT: 892.889.216-6											
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 6 - 02						CIUDAD: YOPAL CASANARE			TELÉFONO: 8336300		

ADICIONAL:

TEXTO ADICIONAL

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTANAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELÉFONO: 3163010300 - YOPAL

57-44-101003391

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zárate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

862



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.879-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD. SUC 57		NO. PÓLIZA 57-44-101003391		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 03 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 18 07 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.126.140-3	
DIRECCIÓN: CR 29 NRD. 17 - 58 41						CIUDAD: YOPAL, CASANARE			TELÉFONO: 3206147010		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO GOBERNACION DE CASANARE										IDENTIFICACIÓN NIT: 862.009.216-4	
DIRECCIÓN: CR 20 NRD. 8 - 02						CIUDAD: YOPAL, CASANARE			TELÉFONO: 6338339		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO											
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUADOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:											
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO INTERVENCIÓN DEL 14/03/2023, CON SUJETO EN INTERVENCIÓN TECNICA, ANALISIS ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FISCAL PARA LA VERIFICACIÓN DEL REGIMENIZADO A FINE DE PAGAMENTO DE LA CTA DE RUTAS A LA VENTA TONIA SUJETO DE AYUDAS DESARROLLO DE PROYECTOS.											

AMPAROS				
Escriba el contenido de los amparos.				
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR ASEG. ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/03/2023	17/11/2023	\$8.721.711.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/03/2023	18/07/2024	\$4.360.855.65	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/07/2023	18/07/2026	\$8.721.711.30	

ACLARACIONES											
RESPECTO AL AMPARO NÚM. 14/03/2023 DE VERIFICACIÓN DE REGIMENIZADO A FINE DE PAGAMENTO DE LA CTA DE RUTAS DEL 2023.											

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 256.728.00	\$ 8.000.00	\$ 50.298.00	\$ 315.027.00	\$ 21.804.273.25	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COSEGURO		
NOMBRE	CLASE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA NOMBRE ASESURADORA	CLASE	% DE PART.			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRETERA 7 NO. 28 - 64 - TELÉFONO: 3102010300 - YOPAL



57-44-101003391

PRIMA AUTORIZADA: Decreto A. Decreto S. - Secretaría General

PRIMA AUTORIZADA

VIGILADO

863



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD.SUC 57	NO.POLIZA 57-44-101003391	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 03 2023	14 03 2023		00:00	18 07 2028		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.126.146-3
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 17 - 56 41	Ciudad: YOPAL CASANARE
	TELÉFONO: 3208147010


DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO GOBERNACIÓN DE CASANARE	IDENTIFICACIÓN NIT: 892.099.216-0
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 8 - 02	Ciudad: YOPAL CASANARE
	TELÉFONO: 6336338

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSABLES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****256,728.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****50,298.00	TOTAL A PAGAR \$ *****315,027.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****21,804,278.25	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMISIÓN		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMISIÓN	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
EDUARDO HERNAN NARCIZA RODRIGUEZ	1781208	2.00%			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 MO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1102055025911-3

14154102055025911-3 (803) 1102055025911-3 1102055025911-3 1102055025911-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO

864



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 800.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION YOPAL			SUCURSAL AGENCIA YOPAL			COD. SUC 57		NO. POLIZA 57-44-101003391		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICION DIA MES AÑO 27 03 2023			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 14 03 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 18 07 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	IDENTIFICACION NIT: 801.126.146-3
DIRECCION: CR 28 NRO. 17 - 55 41	CUIDAD: YOPAL, CASANARE
	TELEFONO: 3208147010

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
ASEGURADO / BENEFICIARIO: GOBERNACION DE CASANARE	IDENTIFICACION NIT: 892.099.216-8
DIRECCION: CR 20 NRO. 8 - 02	CUIDAD: YOPAL, CASANARE
	TELEFONO: 8336239

ADICIONAL:

TEXTO ADICIONAL

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 27 - 64 - TELEFONO: 3162010300 - YOPAL

57-44-101003391

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

LESIONADA

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

865

 Casanare		INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	
 PROYECTOS			
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1			
28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023			
TIEMPO PRÓRROGA		NÚMERO	CAUSALES
2.3. CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR			
VALOR ADICIÓN		NÚMERO	CAUSALES
2.4. SANCIONES			
RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
2.5. ACCIONES LEGALES			
CLASE		ETAPA PROCESAL	FECHA
2.6. ACTAS TRAMITADAS			
No.	OBJETO	FECHA	VALOR
	ACTA RESUMEN	7/03/2023	Devolucion información 01969 - 01968
1	ACTA DE INICIO	14/03/2023	
	ACTA DE COMITÉ	16/03/2023	
	ACTA DE COMITÉ	23/03/2023	
	ACTA DE COMITÉ	19/04/2023	
	ACTA DE COMITÉ	25/04/2023	
	ACTA DE COMITÉ	26/04/2023	
	ACTA DE COMITÉ	5/05/2023	
	ACTA SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD	12/05/2023	
	ACTA DE COMITÉ	19/05/2023	



ACTA RESUMEN

FO-GD-11

2015-12-10

V. 04

TEMA:	Devolución información 01969-01968.
LUGAR:	FECHA: 07-03-2023
OBJETIVO:	cto. consultoría N° 0.487 de 2023.

AGENDA/ACTIVIDADES

- 1.
- 2.
- 3.

DESARROLLO:

De acuerdo a lo radicado 01969-01968 del 28 de febrero de 2023, del cto. 0487 de 2023 se realiza devolución de 1 carpeta con el fin de realizar la subsanación de los 5to observaciones:

1. Hojas de vida: Completar la información solicitada para dar cumplimiento a los requisitos.
2. Programación de intervenciones: anexar plan de carga extendido se aclarará que se debe anexar F.M. y que el personal debe ser pagado de acuerdo a la propuesta.
3. Grupo: actualizar documentos venidos.

Compromiso: para el 10 de Marzo de 2023.

Se entregó la subsanación de las observaciones de los documentos de legalización, protocolo de política y certificación de seguridad social.

Compromisos:

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Lya Pérez	Apoyo Supervisión	ngara.pichot@casanare.gov.co	[Firma]
Yon M. TORERO ABEL	R/L REP SOLUCIONES	ayp@casanare.gov.co	[Firma]
Alex Efraim Gomez	RECIBO RECIBIDOS	Int. a casanare1@casanare.gov.co	[Firma]



ACTA No. _____

FECHA: 16-03-2023
 HORA: 9.00 a.m.
 LUGAR: OTE

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Iron. Moyerly Forero
Lya Yanett Perez V.
Brenda Barrera

a/l A&P Soluciones y Proyectos
Apoyo Supervisor OTE
Director Técnico de Construcciones

CONTRATO: 0487 de 2023

OBJETO:

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Entrega de documentación proyecto ~~para~~ 2017005850047
Mejoramiento o nivel de pavimento de la vía de acceso a la
Vereda Turva - Municipio de Apuruzul.



ACTA No. ____

DESARROLLO:

Se realiza entrega de la siguiente documentación para dar inicio a la etapa preconstructiva.

- Proyecto inicial - 6 archivos de PDF
- 1 Carpeta - 1 carpeta con 4 planos en PDF
- 6 Carpetas del adjuvante - Carpeta 1 → 5 archivos PDF.
 - Carpeta 2 → 3 archivos PDF.
 - Carpeta 3 → 2 archivos PDF.
 - Carpeta 4 → 3 archivos PDF.
 - Carpeta 5 → 3 archivos PDF.
 - Carpeta 6 → 12 archivos PDF.
- 2 carpetas de documento técnica nueva obra - Carpeta 1 → 16 archivos de PDF.
 - Carpeta 2 → 14 archivos PDF.
- 1 carpeta. Geoproyectos técnicos → 2 archivos PDF.
- 1 carpeta. Últimas Torres → 20 archivos PDF
 - 1 archivo compilado con anexo hidrología trazo → 4 archivos PDF.
- 1 carpeta documentos costados iniciales → 7 archivos PDF.
- 1 carpeta documentos anexos estudio previo → 12 archivos PDF.
- 1 carpeta. Anexos aprobación → 7 archivos PDF.
- 1 archivo PDF con la MCA del proyecto.



ACTA No. ____

A large rectangular area with horizontal ruling lines, intended for the text of the act. The lines are evenly spaced and cover most of the page below the header.




ACTA No. ____

COMPROMISOS PACTADOS:

PRÓXIMO COMITÉ 23-03-2023

Firman:


Nombre: CASAT 0512-2023
Apoyo a la supervisión
Nombre: _____


Nombre: Ivon Kellys Forero Alvarado
P.L. ASP PROYECTOS SAS
Nombre: _____


Nombre: Ednel Romero
DE
Nombre: _____

Nombre: _____
Nombre: _____

Transcriptor: _____
Cargo: _____



ACTA No. ____

FECHA: 23-03-2023
 HORA: 9:00 a.m.
 LUGAR: DTC-

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ivan Moyerly Forero
Alexander Ruiz
Alex Garcia

R/L ABP Soluciones y proyectos
Administrador del contrato
Apoyo tecnico.

Paola Andrea Maldonado
Brenda Barrera

Directora del proyecto
Directora tecnica de Construcciones

CONTRATO: 0487 de 2023.

OBJETO, _____

EJECUTOR _____

TEMAS TRATADOS:

- Avance de preconstructivos.
 - Salubridad de aplicacion personal.
 - Avance con contrato de obra
- _____



ACTA No. ____

DESARROLLO:

Se inicia el conite indicado por parte de la interventoría que se solicitó al contratista de obra la documentación referente de acuerdo a lo pliego, se abrió el día 21 de Marzo con el fin de avanzar en la revisión de esa documentación para el adelanto de inicio y se dio hasta el 24 de Marzo para la radicación de dicha información.

Con respecto a la información entregada se informa por parte de la interventoría que ya se está realizando levantamiento topográfico para determinar claramente el alcance del proyecto actualmente, así mismo se ha realizado revisión documental de la información entregada.

La supervisión solicitada tiene en cuenta los requerimientos exigidos en el Anexo técnico del proceso de contratación donde se determinan lo que se exige en el informe preconstitutivo. Por otra parte solicitan sean reducidos los ~~costos~~ aplicaciones a SS y parafiscales del personal propuesto.

La interventoría indica que son exonerados de parafiscales.

Con respecto a la documentación se realizan aclaraciones de la entrega de información y revisiones que deben realizarse de ahora y deben certificar el cumplimiento de cada etapa del preconstitutivo, certificación que debe firmar el profesional idóneo propuesto.

Se realiza entrega del formato FO-AB-20, FONG-24, FO-AB-21 FOAB-36 y la lista de chequeo de revisión de la etapa preconstitutiva.

Se realiza entrega de planos impresos del proyecto inicial en total 22 planos.



ACTA No. ____

A large rectangular area with horizontal ruling lines, intended for the text of the act. The area is mostly empty, with some faint, curved lines drawn across it, possibly indicating a signature or a placeholder for a drawing.



ACTA No. ____

COMPROMISOS PACTADOS:

- Realizar entrega del informe preconstructivo para el 30 de Marzo de 2023.
- Realizar actualizacion de poligonos con el acta de inicio.

PRÓXIMO COMITÉ: 30-03-2023 4:00 P.M

Firman:


Nombre: C.A.P.P. ASIA-2023
Apoyo Supervisión.

Nombre: _____


Nombre: ALEX GARCIA GARCIA
Asesor Técnico ASP Soluciones


Nombre: Sandy Barrios
Asesor

Transcriptor: _____
Cargo: _____


Nombre: Ivan Madero Fajardo
R/L. ASP Soluciones y Proyectos de Ingeniería.


Nombre: Pedro A. Madero
DIRECTOR DEL PROYECTO. ASP.

Nombre: _____



ACTA No. ____

FECHA: 19-04-2023
HORA: 8:00 am.
LUGAR: DTC - Infraestructura

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing. Alexander Peña.
Ing. Ivonne. Torero
Lya Perez
Brenda Barrera

Director interventora ASP.
E/L ASP Soluciones y Proyectos
Apoyo Supervision DTC.
Directora Técnica de Construcciones

CONTRATO: 0487 de 2023.

OBJETO:

EJECUTOR

TEMAS TRATADOS:

- Socialización observaciones preconstructivas.
- Avances con contratista de obra.



ACTA No. ____

DESARROLLO

Teniendo en cuenta la información radicada el día 11 de abril de 2023 con número de radicación 03507, con asunto "entrega de informe pre constructivo" se solicita ajuste del índice de redacción, así como definir claramente en cuanto a las actividades a ejecutar de acuerdo a las condiciones encontradas en terreno, para tener ~~en~~ un balance aterrizado para el inicio de la ejecución de la obra.

Adicionalmente se solicita información con respecto al inicio de la obra, para lo cual se solicita a la interventoría indicar que requerimientos se ha realizado al contratista de obra para la suscripción del acta de inicio, la interventoría indica que el día 16 de marzo de 2023 se envió comunicación con asunto: Solicitud de documento requiriendo para el inicio del contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre del 2022, posteriormente el día 17 de abril de 2023 se realizó comunicación con asunto: Solicitud de documento faltante requiriendo para el inicio del Cto de obra N° 2653 del 30 de diciembre de 2022; donde se indica que información faltante se requiere de acuerdo a lo radicado por obra. Posteriormente el 19 de abril de 2023 se radica al CMARO CONSTRUCCIONES S.A.S. opuso con asunto: Respuesta a Oficio OFCAT-VAZ-004 del 18 de abril de 2023, con el fin de solicitar la subsanación con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la hoja de vida radicada a lo cual se dio un plazo de dos días para subsanarlas, actual/ estimo a la espera de dichas conexiones.

La supervisión solicita el seguimiento a dichas observaciones por parte de la interventoría.



GOBERNACIÓN
DE CASANARE
NIT. 892199216-6

ACTA No. ____

La Supremacia también solicita la subsección de
la corrección del informe preconstituido a la intervención
de los involucrados en el presente comité.
Se solicita la presencia de dicha información dado la
plaza de reunión que tenemos.



ACTA No. ____

COMPROMISOS PACTADOS:

PRÓXIMO COMITÉ: 25-04-2023

Firmar:

[Signature]
Nombre: JOS 0512 de 2023
Apoyo Supervisión.

Nombre: _____

[Signature]
Nombre: [Signature]

Nombre: _____

[Signature]
Nombre: WILFREDO NAR
R/L MIP PROYECTOS S.A.S.

Nombre: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

Transcriptor: _____
Cargo: _____



ACTA No. ____

FECHA: 25 de abril de 2023
 HORA: 8:00 a.m.
 LUGAR: DTC - Infraestructura.

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

<u>Ing. Alexander Peña</u>	<u>Director intersectorial A.S.P.</u>
<u>Ing. Ivonne Ferrero</u>	<u>A/L A.S.P. Soluciones y Proyectos.</u>
<u>Wila Pérez</u>	<u>Apoyo Supervisión OTC.</u>
<u>Graciela Barrera</u>	<u>Directora Técnica de Construcciones.</u>
_____	_____
_____	_____

CONTRATO: 0487 de 2023

OBJETO: _____

EJECUTOR: _____

TEMAS TRATADOS:

- Solicitud de informe preconstructivo.
- Avance solicitud acta de inicio de obra.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____



ACTA No. ____

DESARROLLO:

La supervisión solicita a la interventoría de acuerdo a compromiso del 19 de abril de 2023, la radicación de los observaciones realizadas al informe preconstitutivo, realizando las aclaraciones respectivas solicitadas y lo cambio de puma solicitadas (redacción). La interventoría indica que el día de mañana 26 de abril de 2023 radicando los ajustes y se entregan el balance ajustado a las necesidades actuales dejando claro por cada actividad con registro fotográfico el alcance y definir la situación encontrada. Adicionalmente entregar las certificaciones de aprobación por parte de interventor de cada componente imprimiendo su viabilidad para iniciar y firmado por el propietario competente. Asimismo se reitera la solicitud de seguimiento frente a los documentos de la obra frente para suscribir ante de inicio del contrato de obra 2653-1022. Se indica por parte de interventoría que la obra ha entregado de manera parcial toda la documentación requerida y se está a la espera de consolidar y unificar dicha información. Que nuevamente se solicita la agilidad en este proceso por los plazos de ejecución que se tienen. La interventoría indica que ya se tiene acceso a los actos de veracidad por parte de la interventoría donde quedaran expuestas situaciones y se están presentando para el acceso a las veredas y se están tomando para tenerlos en cuenta en el balance final y ponerlos a discusión una vez inicie la obra y con la supervisión.

807



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892698216-8

ACTA No. ____

Area con líneas horizontales para el desarrollo del acta, delimitada por una gran curva que la rodea.

802



ACTA No. ____

COMPROMISOS PACTADOS:

Entrega observaciones informe preconstitutivo → 26 de
abril de 2023.

PRÓXIMO COMITÉ: _____

Firman:

[Signature]
Nombre: JOSP-012-2023,
Apoyo supervisión.

[Signature]
Nombre: Non Kian de Forno Alon
RIL RUP PROYECTOS SAS

[Signature]
Nombre: _____

Nombre: _____

[Signature]
Nombre: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

Transcriptor: _____
Cargo: _____



ACTA No. ____

FECHA: 26 - abril de 2023
 HORA: 8:00 AM
 LUGAR: OTC - Infraestructura.

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Ing Iván Forero
Ing Alexander Peña
Ing Alpeza Restrepo
Ing Lya Perez
Ing Brando Borrero

E/L A & P Soluciones y proyectos
Director de intervención A & P
Director de obra - Caspro.
Apoyo supervision OTC - Infraestructura
Asesoría técnica de construcciones

0487-2023
 CONTRATO: 2653-2022

OBJETO:

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS:

- Inicio de obra.
- Verificación documental de procesos. para inicio obra.



ACTA No. _____

DESARROLLO:

Teniendo en cuenta la comunicacion N=520-302 del
14 de abril de 2023, enviada por la Supervision al
contratista de obra del contrato P-2653-2022
CASPRO CONSTRUCTORES S.A.S. R/L William Hernando Caira
en donde se cita en la inspeccion de la Secretaria de
Infraestructura - OTC quinto piso para tener el tema
de la suspension del alto de obras de dicho contrato,
en donde se solicita indicar el avance de la
demanstracion y se debe radicar así como el cumplimiento
de la responsabilidad y ha realizado la intermediana al
contratista de obra.
El director del proyecto del cto de obra 2653-2022 informa
que se está consolidando toda la informacion con el fin de
solventar las observaciones de la interventoria, en cuanto al
tema documental, pero adicionalmente ellos han
realizado labores en campo como apijos para verificar
el estado actual de los materiales granulares instalados,
se está adelantando topografía, pero la comunidad
indica que no permite labores hasta tanto no se
realice la socialización del proyecto, por lo tanto
solicita de manera urgente la programación de la misma.
La supervisión indica ante esta solicitud que se debe
hacer primero acta de inicio de obra y
ahí se programará la socialización, por lo tanto
solicita de manera inmediata la suscripción del
acta de inicio para programar lo que debería por
terminar a día después del acta de inicio.
Así lo cora; se establece en el presente comite la
suscripción del acta de inicio el día 28 de abril
de 2023, y se cita al R/L de CASPRO CONSTRUCTORES S.A.S para
la firma, se informa que el R/L cambio y por lo tanto

ACTA No. ____

Se solicita se anexe los documentos de autotoma
dicho cambio como causa de concurso, la cual
se debe anexar al acta de inicio; si mismo se le
revisa anexa la soporte de pago de estampillas,
aplicacion a seguridad social, pago y latencia
de y la empresa este al día en seguridad social y
verificados firmes por contador y la remisor fiscal
con los documentos del mismo y pago ss del 27 de
de enero.

Dicha informacion debe estar revisada y aprobada
por la interventoria quien deberá recibir los pliegos
de suscripcion de afirmaciones firmes por ellos y con
los soportes anexos antes mencionados.

En el presente comité se establecen las siguientes tareas
de obra e interventoria para ~~esta~~ realizar las comunicaciones
opuestas:

- Interventoria: aypinjeneriasas@gmail.com.
- Obra: viaaguayultriva@gmail.com.

Teniendo en cuenta que obra está realizando actividades
preliminares de campo como topografía, se solicita
y dichas actividades se coordinen con la interventoria
para verificar balance de los trabajos a realizar.
Igualmente se solicita la actualización de pliegos.
Una vez se suscriba acta de inicio de obra y se
solicite a la interventoria indicar si ella actualiza
pliegos con el acta de inicio; la interventoria indica
que ya se radicaron los de ella y se encuentran
la aprobada desde el 27 de marzo de 2023.

Por lo tanto, se suscriba acta de inicio el 28 de abril
de 2023 y para la primera semana de Mayo del 1 al 5

Se programan y coordinan acta de socialización del proyecto,
para lo cual se solicita una presentación con toda la
información relevante del proyecto.



ACTA No. ____

COMPROMISOS PACTADOS:

Suspensión obra de inicio del 28 de abril de 2023.
Programación socialización del 1 al 5 de Mayo de 2023.

PRÓXIMO COMITÉ 28 abril de 2023

Firman:

[Signature]
Nombre: JCRP-10512-2023
Proyecto Supervisión
OTC - Infraestructura

[Signature]
Nombre: Alfredo Restrepo

Nombre: _____

[Signature]
Nombre: CONSEJO REGIONAL
DEL SUR PROYECTOS S.A.

[Signature]
Nombre: [Illegible]

Nombre: _____

Transcriptor: _____
Cargo: _____

807



SOCIALIZACION OBRAS A LA COMUNIDAD

FO-AB-50
26-03-2014
V. 03

FECHA: 05 may. 2023	CONTRATO No: 2853-2022
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES	
SOCIALIZACION AL INICIAR ☒	SOCIALIZACION AL TERMINAR ☐
CONTRATANTE: <u>Departamento de Casanare</u>	
CONTRATISTA: <u>Caipro Constructores S.A.S</u>	
OBJETO: <u>Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la vía del acceso a la Vereda Trava - Municipio de Aguazul.</u>	
FECHA DE INICIACION DE OBRA: 28 abr. 2023.	
FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 23 jul. 2023	
OBJETO DE LA SOCIALIZACION: <u>Para conocer a la comunidad de la vereda la turva el alcance del contrato, la programación de obra a ejecutar, el plan de manejo del tránsito a implementar en la ejecución del contrato.</u>	
ESTADO EN QUE SE CULMINA LA OBRA: <u>pavimentación total, con todo sus obras anexas de 1,8 km de la vía.</u>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO: <u>Cumple la Meta propuesta de 1,8 km con lo cual se cumplirá el 100% del alcance.</u>	

888



SOCIALIZACION OBRAS A LA COMUNIDAD

FO-AB-50
26-03-2014
V. 03

RECOMENDACIONES: Realizar la acta de rendición con
cada propietario y escuchar sus observaciones


INFORMA:


INTERVENTOR DESIGNADO


R/L CONTRATISTA


REPRESENTANTE DE LA GOBERNACION

ENTERADOS:


REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

COMUNIDAD:

Se anexa listado de asistencia general formato FO-GD-12.

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____



LISTA ASISTENCIA GENERAL
FO-QD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA: Socialización nuevo proyecto Terminación vía la Tuerca.

FECHA: 05 de Mayo de 2023

DEPENDENCIA/LUGAR: Via la Tuva - Vereda la Tuva, CUDADIMCPIO Aguil-Casabore

QUIEN DIRIGE y/o
EXPONE: _____

TIPO DE EVENTO	
CAPACITACION	
DIVULGACION	
OTRO	

NO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Diana Rossio Lopez V	Comunidad	-		3212981666	Diana Rossio
2	Alcira Hernandez Mallina	Comunidad		alciherandezmallina@gmail.com	3107562467	Alcira Hernandez
3	Jenny Suby Martinez	Secretaria JAC			3107865745	Jenny Suby
4	Magia Salamanca	Religioso			3115912366	Magia Salamanca
5	Elizabeth Molano	Presidenta		elizabethmolano2000@gmail.com	3112726121	Elizabeth Molano
6	Yeni Cardenas Ballester	Secretaria JAC		Cardenasyeni2005@yahoo.com	3223741094	Yeni Cardenas
7	Aracelis Holan A	Hogar			3214890952	Aracelis Holan
8	Alberto F. Martinez	Presidente	ASOCIACION	albertomartinez@gmail.com	345825421	Alberto Martinez
9	Lubor Hernandez	Concejal	Agrupación	hormubor3208@yahoo.com	3143013961	Lubor Hernandez
10	Maria Mercedes Castellanos P	Asesora	-		3402423320	Maria Mercedes Castellanos
11	Jessica Maria Aguilera	TESORERO JAC	Junta C		3115896747	Jessica Maria Aguilera
12	Mauricio Villamay V	-			3711323421	Mauricio Villamay
13	Bartolome Molano	TAJAS 22A	Turma		3108735991	Bartolome Molano
14	Glaciela Zepeda	Financiera	Turma		3116307301	Glaciela Zepeda
15	Blanca Ines Vega R	Amadoras	Turma		3135422801	Blanca Ines Vega



LISTA ASISTENCIA GENERAL
FO-GD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA: _____
FECHA: _____
DEPENDENCIA/LUGAR: _____
QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: _____
HORA: _____
CIUDAD/MUNICIPIO: _____
FIRMA: _____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: _____
DIVULGACIÓN: _____
OTRO: _____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Juan David Buitrago	Asesor	Tulua	vega715@gmail.com	312243499	[Firma]
2	Christian Camacho	Asesor	Tulua	luisanica@gmail.com	312243499	[Firma]
3	Alfonso Rodriguez	Asesor	Tulua		312243499	[Firma]
4	Christian Hernandez	Asesor	Tulua		312243499	[Firma]
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



ACTA No. ____

FECHA: 12 de Mayo de 2023
HORA: 9 00 a.m.
LUGAR: Via la Turva - Mpio. de Aquezul

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES

<u>Ing. Alfredo Restrepo</u>	<u>Director obra Caipiro</u>
<u>Ing. John Acosta</u>	<u>Apoyo tecnico obra - Caipiro</u>
<u>Ing. Alexander Rúa</u>	<u>Director interv. ARP</u>
<u>Ing. Alex Garcia</u>	<u>Apoyo tecnico Inter ARP</u>
<u>Ing. Lya Pérez</u>	<u>Apoyo supervisor OTC - Inpatrotm</u>
<u>Ing. Brenda Barrera</u>	<u>Directora Técnica de Construcciones OTC</u>

2653-2022

CONTRATO: 0487-2023

OBJETO: Terminacion via la Turva, Mpio de Aquezul

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS

- Vis. t. de obra
- Avance de ejecución de actividades
- Reunion Balance de ejecución



ACTA No. ____

DESARROLLO:

Se realiza recorrido de la vía iniciando en el salomonal intersección con vía Marginal de la Selva.

Se observa bastante contaminación del material de base existente, ppal/ con material vegetal, así mismo se observan que por corriente se ha lavado el material granular, lo que ha dejado este material con mucho fino lo que no permitiría dar densidad necesaria para instalar el asfalto, la interrentoria y obra debido a esto realizarse en audios con apiques, lo que evidencia que es necesario realizar la inducción de riego no prevista y realizar un balance general para definir los ajsts de menores y mayores cantidades.

Este trabajo ya se había analizado igual/ por interrentoria en el preconstitutivo, por ahora se está realizando con la obra para después computar y lograr el alcance del proyecto.

Se solicita radicar de nueva urgente los diseños soporte de la obra de acuerdo a lo establecido capítulo de inicio y terminando cada la plaza establecida allí.

Es necesario poder tramite al anticipo, el cual fue devuelto para correcciones.

Por otro lado se solicita a la interrentoria, radicar los ajsts solicitados al informe preconstitutivo y anexar los pleuaciones conjunta con la obra en el balance.

Se solicita realizar la entrega de los informes de los 2 informes (semales) semanales del 28/04/2023 al 05/05/2023 y del 05/05/2023 al 12/05/2023.

Igualmente se dejaron ~~factos~~ encontrados fallos en algunas etapas, entre los cuales es necesario retirar el material y realizar mejoramiento. Así mismo los profesionales de obra, indican que se verifica en terrenos que se están presentando fisuras en los hombros de ~~del~~ al contravilla del asfalto instalado, esto lo informa para que quede en cuenta.



ACTA No. ____

que esto existe y no es por el pao q se va a
presentar con la magistración ^{proceda}.
Se revira en el xcolo si ya se encuentra la ^{de obra} poliza
actualizada del acta de inicio, la cual no está
reportada. Se soluciona a la interventoria pagando al
contratista de obra, al respecto.




ACTA No. ____


COMPROMISOS PACTADOS:


- Entregar el balance actualizado. → 15-05-2023
- Actualizar plan de obra de INICIO → 17-05-2023
- Informar resultados → 17-05-2023

PRÓXIMO COMITÉ: 19-05-2023

Firman:


Nombre: Jhon Pineda
CDSP - 0572-2023


Nombre: Alberto Latorre
CDSP - 0572-2023


Nombre: Alfredo Restrepo


Nombre: _____


Nombre: Alex Garcia
CDSP - 0572-2023


Nombre: Jhon Pineda
INB. opay (contrato de obra)

Nombre: _____

Nombre: _____

Transcriptor: _____
Cargo: _____



ACTA No. 03

FECHA: 19 de Mayo de 2013
HORA: 9:00 a.m.
LUGAR: Vía la Tuna - Mpio de Aquezul

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES

<u>Ing Alfredo Restrepo</u>	<u>Director de obra - Caspro</u>
<u>Ing John Acosta</u>	<u>Apoyo Técnico obra - Caspro</u>
<u>Ing Alexander Rera</u>	<u>Académico de intervención A & P</u>
<u>Ing Alex Gorua</u>	<u>Apoyo Técnico Inter A & P</u>
<u>Ing Lya Peréz</u>	<u>Apoyo Supervisión OTC - Inspección</u>
<u>Ing Brenda Barrera</u>	<u>Directora Técnica de construcciones</u>

CONTRATO: 2653-20122
0487-2023

OBJETO: Terminación vía la Tuna, Municipio de Aquezul.

EJECUTOR:

TEMAS TRATADOS

- Visita de obra
- Avance de ejecución de actividades
- Análisis Balance de ejecución



ACTA No.

DESARROLLO

Se solicita a la interventoría la documentación; de toda parte precontractual del contratista de obra ya que a la fecha no se ha podido cuenta con dicha información, la interventoría, la forma que ya se han realizado registros al contratista de obra, se realiza devolución de una primera entrega y se este a la espera de la otra corrección a las observaciones. A tu actividad estaba para terminar el día 04/05/2023.

En cuanto a la actividad de levantamiento topográfico se había realizado un preliminar, pero no se había tomado el rumbo al mismo ¹¹⁰ de la intersección y actual/ están realizando el resto por otra parte, con respecto a la etapa de verificación, esta ¹¹⁰ debía haber terminado el 10 de Mayo de 2023, aun no se ha terminado, el Cta de obra informa que la principal causa es la demora de este actividad es que la comunidad entre suaviza no se encuentran y se tiene que esperar al fin de semana, aproximadamente se tiene un avance de 50% de esta actividad. En cuanto a la actividad de excavación y debió iniciarse el 17 de Mayo de 2023, la intersección informa que el Cta de obra informa que ya cuenta con el equipo que es del sector para esta actividad, están a la espera de la señalización para lo cual devisa la cual tiene proyectada llegar el día 23 de Mayo de 2023 y estaría iniciado el 25 de Mayo de 2023. De acuerdo a esto se tiene a la fecha un porcentaje ejecutado del 19% frente al 21% programado.

Por otra parte se solicita informes sobre la radicación de los polijos del año de inicio de obra; se impone q el día de la semana se vayan a radicar.

Se solicita la atención del personal y ya se unido todo por
obra como por intervención si se opuso alguna.

Con respecto a los procedimientos de fomento plurianual lo informo



ACTA No. _____

semanales.

El contratista solicita analizar el pago que nos sea por hito o por por el proceso constructivo y podría generar pago de study. La suspensión indica que dicho fue es proyecto del sistema General de regalías; allí se exige que el pago se debe realizar por obra; de esta manera, tema que se analizará en el próximo comité, a cualquier en DTE.

El contratista con respecto a la parte contractual informa que se está organizando la información por la entrega el día martes 23 (hoja de vida y documentos de inscripción). El contratista indica que el día de hoy radica a la interventoría los informes semanales, la interventoría informará y los revisará y remitirá el de ellos con el de interventoría el día 23 de mayo de 2023.



ACTA No. ____

COMPROMISOS PACTADOS:

- Entrega de informacion precontractual contratista de obra →
23 de Mayo de 2023
- Informes semanales el 23 de Mayo de 2023
- Informes APP 10 previos y modificaciones 23 de Mayo 2023

PRÓXIMO COMITÉ por Compromiso

Firman:

[Signature]
Nombre: Apoyo Inyección
CTO 0512-2023
OTC - Construcción

[Signature]
Nombre: Alfredo Restrepo V.
[Signature]
Nombre: Director Obra

[Signature]
Nombre: Topografía
Transcriptor: [Signature]
Cargo: Topografía

[Signature]
Nombre: Alex Guerra Gonzalez
Proteccion Medio Ambiente

[Signature]
Nombre: Jhonatan Agosto
[Signature]
Nombre: Ing Apur a obra

[Signature]
Nombre: Maria Delia Aguilar
Apoyo SI SO MA



Gobierno del
Casanare

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

DATOS ESPECÍFICOS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Brenda Roraima Barrera

21. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATISTA DE OBRA

PÓLIZAS MINUTA

[illegible]

900



HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Numero Poliza: 4007834 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia: 014001000000-00	Fecha de Expedición: 05/05/2023	WANCIA SUTINJO Desde los 24 horas (Anexo) 02/05/2023	WANCIA SUTINJO Hasta los 24 horas (Anexo) 05/05/2023	Apoyos: 1	WANCIA SUTINJO Desde 00:00	WANCIA SUTINJO Hasta 00:00	Confianza: PROFESIONAL
Beneficiario: SEGUROS EL POBLE LTDA		Clase: 400784		% Participación: 100.00	Excepciones Cobro: SI		SI

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Empresa: CAMPO CONSTRUCTORES SAS	NIT: 9001160704	Domicilio: CL 70 N° 204 - 05	Ciudad: BOGOTÁ SUTINJO CAPITAL	Fecha: 05/05/2023
Aguinaldo: DEPARTAMENTO DE CASANARE	100 \$50.000.000.000			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE CASANARE	100 \$50.000.000.000			

PRODUCTO Y PRIMA

Origen: CL 12 N° 25 - 05		Duración: 100%		Total Prima Anualizada		\$ 1.700.000.000.000
Aguinaldo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Condición de Pago	Fecha Máxima Pago Prima	
CUMPLIMIENTO	20/05/2023	20/11/2023	\$ 1.000.000.000.000	Impag.	18/05/2023	\$ 0.00
ESTABLECIMIENTO/CAJAS CORRECCIONALES/INCARCELADOS	05/05/2023	05/05/2023	\$ 1.000.000.000.000	Otro concepto		\$ 0.00
MANEJO DEL ANTEPO	20/05/2023	20/11/2023	\$ 470.000.000.000	Gastos de expedición		\$ 0.00
PRESTACIÓN SALUD, PRESTACIÓN VIGILANCIA	20/05/2023	20/11/2023	\$ 1.000.000.000.000	NA		\$ 0.00
Prima total						\$ 0.00



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, sujeta al derecho principal y la ley de la República de Colombia, y que en adelante se denominará "la Compañía", asegura con sujeción a los términos, condiciones, exclusiones y modificaciones contenidos en la presente póliza o anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los seguros adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATM	ALMACENES	ESPECTO / SERVIDORERA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA UNIVERSIDAD	EL VITO SANTANDREA CAROLLA	PÓLIZAS GENERALES - CONVENIO 11000	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ MODO CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUPONES COMENTOS O DE ABOGADO

SE DEBE AUTORIZAR A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. DARSE LOS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE PÓLIZA. DEBE SER CON C.C.

FECHA BANCOS	NÚMERO DE PÓLIZA	VALOR CANCELADO	VALOR EFECTIVO	TOTAL	\$ 0.00
--------------	------------------	-----------------	----------------	-------	---------

HDI
SEGUROS

WANCIA SUTINJO
Carrera 7 N° 12-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono: (01) 5488988

NOTA: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECARGO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GRACIAS POR SU COMPRA Y PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA PRIMERA PRIMERA.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

901

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO - A VÍDEO UNIDADES ESTATALES

Numero Póliza: 4007834 Anexos: 1 Sucursal: TUNJA C.H.H. 29

Intermedia	Fecha de Emisión	Desde las 24 Horas (d-m-a)	Hasta las 24 Horas (d-m-a)	Area TP	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Código de Participación
Intermedia	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2028	1	05/05/2023	05/05/2028	
Intermedia				Cotiz	% Participación	Cuota por Cobro	% Paga Cobro
SEGUROS EL NOROCCIDENTAL				400204	100.00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Telefono
CARRO CONSTRUCTORES SAS	9051135704	CL 73 NO 20 A - 68	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	9051135704
Asegurado	Beneficiario			
DEPARTAMENTO DE CASANARE	VARIOS SEGUN RELACION			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Rango 1	Cobro	Departamento VARIOS		
Seguros				
Beneficiario	Tipo Des.	Nro Des.		
DEPARTAMENTO DE CASANARE	NIT	9051135704		
Rango 1 Rango 2 Rango 3	Valor asegurado	Valor asegurado	SALICIDA	Valor Variable
CONTRATO		\$ 716,905,174.00	%	Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 716,905,174.00		
MANEJO DEL ANTIGO		\$ 473,210,116.00		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		\$ 47,327,011.00		
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO		\$ 94,654,023.20		
CUMPLIMIENTO		\$ 94,654,023.20		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, tiene domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "la Compañía", asegura con sujeción a las cláusulas, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o anexos a ella, contra los riesgos indicados y por los asegurados adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 de junio 2023

TERMIN AUTORIZADA

Carro de Transporte

Regimen: 100 - 2.4.2.2.2.2

Resolución: 4007

Fecha: 05/05/2023 17:00:00

Fecha: 05/05/2023 17:00:00

Carro de Transporte





SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Numero de identificación: 900.119.570-4

Numero Póliza: 4007834 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA CN H 29

Certificado de: PRORROGA

NOTA: ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA 28 DE ABRIL DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. SECOP 11 CAS-043-LP-021-2022 Y OTROSI MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TIERRA - MUNICIPIO DE AQUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (05) AÑOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA.


FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFICADO: 09/04/2023

verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 726, Bogotá 801 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga certificación en <https://www.hdi.com.co/webConsulta_Pol_Cumplimiento/>

903

¡Bienvenido!

Ahora eres parte fundamental de una compañía que trabaja por tu bienestar, el de tu familia y tu patrimonio.



HDI
SEGUROS

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - RESP CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001574

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H. 29

Referencia	Fecha de Expedición	Vigencia Seguro Desde las 24 horas (8-m-a)	Hasta las 24 horas (8-m-a)	Anexo IV	Vigencia APEX Desde (8-m-a)	Hasta (8-m-a)	Contratado en
01020103040-10	09/09/2023	09/09/2023	29/07/2023	1	09/09/2023	29/07/2023	BOGOTÁ
Intermediario:	Clase			% Participación	Cuota por Crédito		% Participación
SEGUROS EL ROBLE LTDA.	4003964			100.00			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NI	Dirección	Ciudad	Telefono
CAIRO CONSTRUCTORES SAS	900 119 5754	CL 73 NO. 20 A - 80	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0019000000
Asegurado	NI			
CAIRO CONSTRUCTORES SAS	900 119 5754			
Beneficiario	NI			
TERCEROS AFECTADOS	900 119 5754			

PRODUCTO Y PRIMA

Código CNV	TOTAL SUMA ASEGURADA	CONDUCTO DE PAGO	
7112 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	\$ 332.000.000,00	CONTADO	CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RUMBO TÉCNICO		FECHA NACIONAL PAGO PRIMA	
		19/09/2023	
RESP CIVIL EXT.	\$ 332.000.000,00	PRIMA NETA	PRIMA
		\$ 0,00	\$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS	OTROS CONCEPTOS
		\$ 0,00	\$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN	GASTOS DE EXPEDICIÓN
		\$ 0,00	\$ 0,00
		IVA	IVA
		\$ 0,00	\$ 0,00
		PRIMA TOTAL	PRIMA TOTAL
		\$ 0,00	\$ 0,00



VALORES
CONCEPTOS
GASTOS DE EXPEDICIÓN

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "la Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los riesgos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATM	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTRAGA	INTERNET
BANCO DE COLOMBIA BANCOLOMBIA SANTANDER	EXFO SURIMAR CAROLIA	PÓLIZAS GENERALES - CONVENIO 116025	www.hdi.com.co/pagos-en-linea PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CREDITO CORRIENTE O DE AHORRO

✓ SENTO AUTORIZADO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA ENVIAR LOS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

TODOS BANCOS	NÚMERO DE CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TERMINA	FECHA
--------------	------------------	--------------	----------------	---------	-------

HDI
SEGUROS

AV. BOGOTÁ 870-4
Carrera 147 No. 45 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono: 001 900 000 0000

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y CAJEROS DE AUTOMATOS PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO JUNTAMENTE CON LA PÓLIZA O ANEXO Y PAGAR EL VALOR (BASTA EL ESTE DOCUMENTO)

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

904

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

HDI
SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 40015/4 Anexo: 1 Sucursal: TUNIA C.N.H 29

Oficina	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas (d-m-a)	Hasta las 24 horas (d-m-a)	Asesor	Desde (d-m-a)	Hasta (d-m-a)	Certificado de
PROCESO 000001	25/05/2021	02/05/2021	25/05/2021	1	02/05/2021	25/05/2021	PROCESO 000001

Entidad	Ciudad	% Participación	Cuando Cede	% Participación
SEGUROS EL PORVENIR	BOGOTÁ	100%		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Servicio	Ciudad	Teléfono
CARPO CONSTRUCTORES SAS	900 115 010	CL. 114 NO. 20 A - 06	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	608 65 21 00
Asegurado		Beneficiario		
CARPO CONSTRUCTORES SAS		CARPO CONSTRUCTORES SAS		

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo 1	Ciudad	Exposición	Exposición
Riesgo 1	BOGOTÁ	Exposición	Exposición
Terminos: MODERADO ALTO			
Beneficiario		Tipo Riesgo	Seg. Riesgo
TERCEROS AFECTADOS		100	100 000 000 00

Copias y Remite a Asegurar	Valor asegurado	Valor asegurado	Salvador	Indice Variable
UNICOMUNICAR	\$ 232 000 000 00			%

RESP. CIVIL EXT

\$ 232 000 000 00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

\$ 232 000 000 00

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo: 1.000.000.000 - No aplica a 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, según documento principal en la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se denominará "la Compañía", asegura con su póliza a los asegurados, excluyendo, exceptuando y restringiendo cualquier cobertura en la presente póliza o anexo a ella, contra los riesgos indicados y por los seguros adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

21 de junio

FIRMA AUTORIZADA

www.hdi.com.co


Sede principal: Bogotá D.C.

Teléfono: +57 (0)1 271 1000

Sede principal: Bogotá D.C.

Teléfono: +57 (0)1 271 1000

www.hdi.com.co



905



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP. CIVIL EXTRACON. DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Número de identificación: 900119570-4

Quintero Pólice: 8001574 Anexo 1 Sucursal: TUNIA C.N.H.29

Certificado de PRORROGA

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

RESPECTO EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NO. 40007034

AMPARO LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1082 DE 2015, POR QUINCE (15) PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. SECOP II CAS-047-LP-021-2022 Y OTROSI MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURRA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

- AMPARO
- PREGIOS, LABORES Y OPERACIONES
- NATURALES
- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
- VEHICULOS PROPIOS
- VEHICULOS NO PROPIOS
- EXTRAPATRIMONIALES
- LIQUIDACION
- DAÑO EMERGENTE
- CRUZADA

TOMADOR/AIANZADO: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS NIT 800119570-4

ASEGURADOS: GOBERNACION DE CASANARE, NIT. 892099218-6 Y CAIPRO CONSTRUCTORES SAS NIT. 800119570-4

BENEFICIARIOS: GOBERNACION DE CASANARE, NIT. 892099218-6 Y TERCEROS AFECTADOS

ELIZABETH REINA
 Jefa del Tomador - Aianzado

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 800 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga certificación en https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

 PROYECTOS	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1		
28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023		
2.2. CONTROL PRÓRROGAS AL PLAZO		
TIEMPO PRÓRROGA	NÚMERO	CAUSALES
2.3. CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR		
VALOR ADICIÓN	NÚMERO	CAUSALES
2.4. SANCIONES		
RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR
2.5. ACCIONES LEGALES		
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA
2.6. ACTAS TRAMITADAS		
No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	28/04/2023
No. EXPEDIENTE		
DESPACHO		
OBSERVACIONES		
VALOR		

2.7 ANEXO JURÍDICO

Se deja constancia en el presente escrito que se conoce el clausulado del contrato de obra 2653 de 2022 y 0487 de 2022 de interventoría firmados con la Gobernación de Casanare, se verifica que ambos contratos cumplieron los requisitos de legalización (publicación y timbre entre otros) según como lo establecen ambos contratos. Igualmente se verifica el cumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a las garantías de ambos contratos, por tal motivo se deja constancia que ambas pólizas se expidieron en los porcentajes que lo exige cada contrato, igualmente se anexa las aprobaciones de las mismas por parte de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare tal y como se reportan en los cuadros anexos 2,1 de obra e interventoría del presente informe.

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La Gobernación de Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1	28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023
--------------------------------------	---

3. INFORME ADMINISTRATIVO

708

**PROYECTOS**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

**Casanare**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1 28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

3. INFORME PERSONAL Y CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES, CONTROL DE EQUIPO DE INTERVENTORÍA

3.1 CONTROL DE PERSONAL

3.1.1 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO INTERVENTORÍA

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación	soporte de cambio de personal
1	PAOLA ANDREA MALDONADO	PAOLA ANDREA MALDONADO	DIR. INTERVENT	25%	
2	CARLOS ANDRES FONSECA	CARLOS ANDRES FONSECA	RESIDENTE	100%	
3	HECTOR ALONSO GÓMEZ SANDOVAL	HECTOR ALONSO GÓMEZ SANDOVAL	INGENIERO AMBIENTAL	10%	
4	LISSETH NATALIA RAMIREZ SAGANOME	LISSETH NATALIA RAMIREZ SAGANOME	PROFESIONAL SISCOMA	10%	
5	ELENA SOLER MALDONADO	ELENA SOLER MALDONADO	CONTADOR	7.5%	
6	MARIA CAMILA SOTELO VEGA	MARIA CAMILA SOTELO VEGA	ABOGADO	10%	

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO EN OBRA

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación	soporte de cambio de personal
1	ALFREDO RESTREPO VARON	ALFREDO RESTREPO VARON	DIRECTOR DE OBRA	50%	
2	SANDRA MILENA MOYANO MORALES	SANDRA MILENA MOYANO MORALES	RESIDENTE DE OBRA	100%	
3	SERVULO ANDRES MACIAS BELLO	SERVULO ANDRES MACIAS BELLO	PROFESIONAL SEGURIDAD, SALUD Y GESTION SOCIAL	100%	
4	JORGE ANDRES ROA MORENO	JORGE ANDRES ROA MORENO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA O PAVIMENTOS	25%	
5	JAVIER ANDRES CAINA DELGADO	JAVIER ANDRES CAINA DELGADO	GERENTE DE CALIDAD	100%	

9/10

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1	28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023	
3.2	NOMINAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, AVALADAS Y APROBADAS POR INTERVENTORÍA.	
	Nota: En el presente periodo se anexan copia de las nominas del contratista de interventoría del mes de Mayo 2023	
3.3	SOPORTE PAGO DE PARAFISCALES (SEGUN PROPUESTA)	
	Nota: En el presente periodo se anexan soporte de pago de PARAFISCALES del contratista de consultoría del mes de Mayo de 2023 de acuerdo a lo establecido a la propuesta.	
3.4	SOPORTE PAGO DE FIC	
	Nota: En el presente periodo no se anexan soporte de pago del FIC del contratista de obra	
3.5	CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	
	Nota: En el presente periodo se anexan soporte de pago de seguridad social del contratista de interventoría del mes de Mayo de 2023 de acuerdo a lo establecido a la propuesta.	

911

	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>																																															
<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1</p>																																																
<p>28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023</p>																																																
<p>Ivon Mayerly Forero Abril, identificado con CC 33.647.084 de Aguazul (Casanare), en mi condición de Representante legal de la empresa A&P Soluciones Y Proyectos de Ingeniería S.a.s y Elena Soler Maldonado con CC 47.433.170 de Yopal (Casanare) y con Tarjeta Profesional No. 122522-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora publica de la empresa A&P Soluciones Y Proyectos de Ingeniería S.a.s , con NIT 901.126.140-3, según contrato de interventoría No 0487 de 2023. Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE " CERTIFICAMOS el pago de los aportes de la seguridad social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).</p>																																																
<p>CONTRATO DE CONSULTORIA 100 DE 2022</p>																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</th><th colspan="3">APORTES PARAFISCALES</th></tr><tr><th>NUMERO DE LA PLANILLA</th><th>PERIODO</th><th>BASE COTIZACIÓN</th><th>SALUD</th><th>RIESGOS PROFESIONAL</th><th>PENSIÓN</th><th>CAJAS DE COMPEN</th><th>ICBF</th><th>SENA</th><th>FIC</th></tr></thead><tbody><tr><td>9451465684</td><td>Abril</td><td></td><td>\$ 339.600</td><td>\$ 590.900</td><td>\$ 1.358.100</td><td>\$ 339.600</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9449889394</td><td>Mayo</td><td></td><td>\$ 337.700</td><td>\$ 587.700</td><td>\$ 1.350.800</td><td>\$ 337.700</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 5.242.100,0</td><td></td><td>\$ 677.300,00</td><td>\$ 1.178.600,00</td><td>\$ 2.708.900,00</td><td>\$ 677.300,0</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>			SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES			NUMERO DE LA PLANILLA	PERIODO	BASE COTIZACIÓN	SALUD	RIESGOS PROFESIONAL	PENSIÓN	CAJAS DE COMPEN	ICBF	SENA	FIC	9451465684	Abril		\$ 339.600	\$ 590.900	\$ 1.358.100	\$ 339.600				9449889394	Mayo		\$ 337.700	\$ 587.700	\$ 1.350.800	\$ 337.700				TOTAL	\$ 5.242.100,0		\$ 677.300,00	\$ 1.178.600,00	\$ 2.708.900,00	\$ 677.300,0	\$ -	\$ -	\$ -
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES																																													
NUMERO DE LA PLANILLA	PERIODO	BASE COTIZACIÓN	SALUD	RIESGOS PROFESIONAL	PENSIÓN	CAJAS DE COMPEN	ICBF	SENA	FIC																																							
9451465684	Abril		\$ 339.600	\$ 590.900	\$ 1.358.100	\$ 339.600																																										
9449889394	Mayo		\$ 337.700	\$ 587.700	\$ 1.350.800	\$ 337.700																																										
TOTAL	\$ 5.242.100,0		\$ 677.300,00	\$ 1.178.600,00	\$ 2.708.900,00	\$ 677.300,0	\$ -	\$ -	\$ -																																							
 <p>IVON MAYERLY FORERO ABRIL REPRESENTANTE LEGAL</p>	 <p>ELENA SOLER MALDONADO CONTADOR T.P No. 155295-T</p>																																															

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

122522-T


ELENA
SOLER MALDONADO
C.C. 47433170

RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIVERSITARIA DE SAN GIL

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZÓN 132781





FIRMA DEL TITULAR 43312

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **47.433.170**

SOLER MALDONADO

APELLIDO **ELENA**

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1975**

YOPAL
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-FEB-1994 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
EMILIO BRIL VARGAS TORRES

NOICE DERECHO



A-M00100-00007444 F-0047400170-20100100 00196119133A 1 1790574799

914

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

32825B0F4F5B919E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ELENA SOLER MALDONADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47433170 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 122522-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Razonal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Estrategia de Pago	
915113142	3	AYP PRODUCTOS	9 - APOYOS DE 300 COTIZANTES	AYP PRODUCTOS	Calle 40 n° 34-40	YOPAL, CALDAS	6126119	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Muestra	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	1023-06	100000000	945145584	E	2023-06-30	2023-06-30	CAJEROS	11	\$1.438.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO						PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
Nº	Identificación	Apellidos	Nombre	Clase	Plan	Planilla	Aporte	Cuotas	Plan	RIC	Aporte	Cuotas	Plan	RIC	Aporte	Cuotas	Plan	RIC	Plan	Aporte	Cuotas	Plan	RIC	Plan	Aporte				
1	C.E.	774-4780	PEREZ DAIS ROY	20081	20	11,440,000	\$45,140	170000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	\$115,400				
2	C.E.	11002044	GARCIA CONSUELO	20081	30	\$1,440,000	\$120,000	170000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	\$115,400				
3	C.E.	107200157	MACEDONIO NINA	20081	30	\$1,440,000	\$104,000	170000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	\$115,400				
4	C.E.	100-6402	PERLA ALANZAC	20081	30	\$1,440,000	\$400,000	170000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	30	\$1,440,000	104,400	127000	\$115,400				
Total						\$6,339,000						\$4,385,000						\$4,385,000						\$4,385,000					
Total						Añilados(4)																							

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1.375.400	\$32.500	\$0	\$1.358.100
PORTAFOLIO	200001	800.374.808	8	4	\$1.375.400	\$32.500	\$0	\$1.358.100
ABL ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$576.700	\$14.200	\$0	\$590.900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-21	860.011.153	6	4	\$576.700	\$14.200	\$0	\$590.900
CCF ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$331.400	\$8.200	\$0	\$339.600
CONFACASURARE	CCF08	844.003.782	8	4	\$331.400	\$8.200	\$0	\$339.600
EPS ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$331.400	\$8.200	\$0	\$339.600
SANTAS	EP0005	800.251.440	6	4	\$331.400	\$8.200	\$0	\$339.600
TOTAL				4	\$2.565.100	\$63.100	\$0	\$2.445.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Razonal Principal		Direccion		Exonerado SEMA e ICSP
NIT 901131448	8	AVP PRODUCTOS	8 - MENOS DE 200 COLTAMIENTOS		AVP PRODUCTOS		valle 40 n° 24-49		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Planilla	Dos MORA	Valor
2023-04	1023-07	21004-0170	94-0001034	8	8	2023-05-10	2023-05-10	16	\$1,413,800
RESUMEN DE PAGO									
RUBRO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AVP (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$1,325,600	\$25,200	\$0	\$1,350,800
PORVENIR		230201	800,224,808	8	4	\$1,325,600	\$25,200	\$0	\$1,350,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$576,700	\$11,000	\$0	\$587,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-13	860,071,153	6	4	\$576,700	\$11,000	\$0	\$587,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$331,400	16,300	\$0	\$337,700
COMFACASAPARE		CCF69	844,003,592	8	4	\$331,400	\$6,300	\$0	\$337,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$331,400	\$6,300	\$0	\$337,700
SANTAS		EP9005	800,251,440	6	4	\$331,400	\$6,300	\$0	\$337,700
TOTAL:					4	\$1,565,100	\$48,800	\$0	\$1,613,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	IN	Razon Social	Clase Aportante	Sumaval Principal	Straccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Empleador IENA o ICBF	
MT 101214-4	9	AVP PROYECTOS	9 - MENOS DE 100 COLTAMEROS	AVP PROYECTOS	1480-4011-34-40	TOTAL CABAVAL	6120619	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Planilla	Valor
2023-04	0001-01	1100000720	140000304			2023/05/06	5486738780000720	10	52.813.905

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RESGOS					
No.	Identificación	Nombres	Reg	Ext	Ind	Dis	Ret	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol	Vol
1	02	124/0204	PIEROPI POMA										20	21.400.000	120.000	120.000	30	31.400.200	344.000	027.000	30	31.400.000	561.000	14.12	30									
2	02	11101000	CAPULA ALDO										20	32.000.000	1330.000	179.000	30	32.000.000	100.000	027.000	30	32.000.000	500.000	14.12	30									
3	02	10010101	ARCEBONAN HADILA										20	31.015.000	1300.000	179.000	30	31.015.000	344.000	027.000	30	31.015.000	561.000	14.12	30									
4	02	10010102	POMA LUIS										20	32.000.000	3400.000	179.000	30	32.000.000	1100.000	027.000	30	32.000.000	5100.000	14.12	30									
Total		afiliados(4)												80	126.415.000				126.415.000	1417.000			126.415.000	3317.000										

918



PROYECTOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA
TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA
TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE



Casanare

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1 28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

CONTROL DE EQUIPO

Maquinaria y Equipo propuesto

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exigida	Estado	Si cumple	No cumple	Actuación del interventor frente al incumplimiento
1	Terminadora de asfalto	1	Bick Knox 2010		FUNCIONAL	X		
2	Vibro compactador x 10 Ton	1	Cat CS533E	10 TON	FUNCIONAL	X		
3	Motorveladora	1	CAT 120K	190 HP	FUNCIONAL	X		
4	Volqueta Doble Troque	3	Capacidad mínima	12 M3	FUNCIONAL	X		
5	Compactador Neumático	1	Autopropulsado BOMAG 2011		FUNCIONAL	X		
6	Retroexcavadora de Oruga	1	CAT 320D		FUNCIONAL	X		

3.6.2 Maquinaria en obra

No.	Tipo	Cantidad	Referencia	Capacidad Exigida	Estado	Si cumple	No cumple	Actuación del interventor frente al incumplimiento

No se encuentra maquinaria ni equipo en la obra, debido a que no han iniciado actividades.

919

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare																																																																				
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1																																																																						
28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023																																																																						
3.6.3 Anexo Administrativo																																																																						
3.6.3.1 oficios y correspondencia recibida																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No RADICADO</th><th>DEPENDENCIA</th><th>ASUNTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>7/03/2023</td><td>520-229</td><td>GOBERNACIÓN DE CASANARE</td><td>Respuesta a oficio N° 01969 y 01968 del 28 de febrero del 2023</td></tr><tr><td>30/03/2023</td><td>OFCAI-VAZ-001</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de Documentación requerida previo firma Acta de Inicio para el Contrato de Obra No. 2653 del 30 de diciembre de 2022.</td></tr><tr><td>10/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-002</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de Plan de Manejo de Tránsito PMT.</td></tr><tr><td>10/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-003</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de Presupuesto Paga. Dando respuesta al oficio de fecha 16</td></tr><tr><td>18/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-004</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de Hoja de vida de profesionales.</td></tr><tr><td>19/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-005</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega Plan de calidad del Proyecto.</td></tr><tr><td>20/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-006</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega del Plan de Gerencia del Proyecto.</td></tr><tr><td>20/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-008</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de Documentación Maquinaria.</td></tr><tr><td>25/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-008</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de documentos personal de obra de acuerdo a solicitud de oficio de fecha 19 de abril de</td></tr><tr><td>28/04/2023</td><td>OFCAI-VAZ-009</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Documentos Maquinaria de Asfalto y Volquetas.</td></tr><tr><td>2/05/2023</td><td>OFCAI-VAZ-010</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Definición de socialización del proyecto con la comunidad</td></tr><tr><td>3/05/2023</td><td>OFCAI-VAZ-011</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Envío diseño de Valla informativa</td></tr><tr><td>5/05/2023</td><td>OFCAI-VAZ-012</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Aprobación diseño de Valla informativa</td></tr><tr><td>6/05/2023</td><td>OFCAI-VAZ-013</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Documentos para el trámite del cobro del anticipo</td></tr><tr><td>11/05/2023</td><td>OFCAI-VAZ-014</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de ensayos de caracterización de base y sub-base</td></tr><tr><td>11/05/2023</td><td>OFCAI-VAZ-015</td><td>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</td><td>Entrega de reprogramación ajustada al acta de inicio.</td></tr></tbody></table>	FECHA	No RADICADO	DEPENDENCIA	ASUNTO	7/03/2023	520-229	GOBERNACIÓN DE CASANARE	Respuesta a oficio N° 01969 y 01968 del 28 de febrero del 2023	30/03/2023	OFCAI-VAZ-001	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Documentación requerida previo firma Acta de Inicio para el Contrato de Obra No. 2653 del 30 de diciembre de 2022.	10/04/2023	OFCAI-VAZ-002	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Plan de Manejo de Tránsito PMT.	10/04/2023	OFCAI-VAZ-003	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Presupuesto Paga. Dando respuesta al oficio de fecha 16	18/04/2023	OFCAI-VAZ-004	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Hoja de vida de profesionales.	19/04/2023	OFCAI-VAZ-005	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega Plan de calidad del Proyecto.	20/04/2023	OFCAI-VAZ-006	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega del Plan de Gerencia del Proyecto.	20/04/2023	OFCAI-VAZ-008	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Documentación Maquinaria.	25/04/2023	OFCAI-VAZ-008	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de documentos personal de obra de acuerdo a solicitud de oficio de fecha 19 de abril de	28/04/2023	OFCAI-VAZ-009	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Documentos Maquinaria de Asfalto y Volquetas.	2/05/2023	OFCAI-VAZ-010	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Definición de socialización del proyecto con la comunidad	3/05/2023	OFCAI-VAZ-011	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Envío diseño de Valla informativa	5/05/2023	OFCAI-VAZ-012	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Aprobación diseño de Valla informativa	6/05/2023	OFCAI-VAZ-013	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Documentos para el trámite del cobro del anticipo	11/05/2023	OFCAI-VAZ-014	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de ensayos de caracterización de base y sub-base	11/05/2023	OFCAI-VAZ-015	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de reprogramación ajustada al acta de inicio.		
FECHA	No RADICADO	DEPENDENCIA	ASUNTO																																																																			
7/03/2023	520-229	GOBERNACIÓN DE CASANARE	Respuesta a oficio N° 01969 y 01968 del 28 de febrero del 2023																																																																			
30/03/2023	OFCAI-VAZ-001	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Documentación requerida previo firma Acta de Inicio para el Contrato de Obra No. 2653 del 30 de diciembre de 2022.																																																																			
10/04/2023	OFCAI-VAZ-002	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Plan de Manejo de Tránsito PMT.																																																																			
10/04/2023	OFCAI-VAZ-003	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Presupuesto Paga. Dando respuesta al oficio de fecha 16																																																																			
18/04/2023	OFCAI-VAZ-004	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Hoja de vida de profesionales.																																																																			
19/04/2023	OFCAI-VAZ-005	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega Plan de calidad del Proyecto.																																																																			
20/04/2023	OFCAI-VAZ-006	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega del Plan de Gerencia del Proyecto.																																																																			
20/04/2023	OFCAI-VAZ-008	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de Documentación Maquinaria.																																																																			
25/04/2023	OFCAI-VAZ-008	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de documentos personal de obra de acuerdo a solicitud de oficio de fecha 19 de abril de																																																																			
28/04/2023	OFCAI-VAZ-009	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Documentos Maquinaria de Asfalto y Volquetas.																																																																			
2/05/2023	OFCAI-VAZ-010	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Definición de socialización del proyecto con la comunidad																																																																			
3/05/2023	OFCAI-VAZ-011	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Envío diseño de Valla informativa																																																																			
5/05/2023	OFCAI-VAZ-012	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Aprobación diseño de Valla informativa																																																																			
6/05/2023	OFCAI-VAZ-013	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Documentos para el trámite del cobro del anticipo																																																																			
11/05/2023	OFCAI-VAZ-014	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de ensayos de caracterización de base y sub-base																																																																			
11/05/2023	OFCAI-VAZ-015	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de reprogramación ajustada al acta de inicio.																																																																			

920

	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	
<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1</p>		
<p>12/05/2023</p>	<p>OFCAI-VAZ-016</p>	<p>CAIPRO CONSTRUCTORES SAS</p>
<p>Entrega de polizas actualizadas según acta de inicio.</p>		
<p>28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023</p>		



520-229

Yopal, 07 de marzo de 2023.

Señores

A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.**R/L IVON MAYERLY FORERO ABRIL**

Calle 11 No. 04-20

Trinidad – Casanare

Tel: 3208147010 – 3233118725

aypingenieriasas@gmail.com

Referencia: Contrato de Consultoría (interventoría) No.0487-2023, objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto: Respuesta a oficio No. 01969 Y 01968 del 28 de febrero de 2023.

Cordial saludo,

De acuerdo a la comunicación del asunto, y una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar la subsanación de las siguientes observaciones, con respecto a los documentos radicados para dar cumplimiento al numeral 4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) y numeral 9.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los miembros del personal Clave Evaluable. La verificación de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito para iniciar la ejecución del contrato. Las hojas de vida anexas deben anexar las respectivas certificaciones que determinen claramente el inicio y fin del término de los contratos, para el cumplimiento de la experiencia general y específica exigida en el anexo técnico. No se pueden anexar auto certificaciones que no estén soportadas con copias de los contratos (actas de terminación y/o liquidación) y/o certificaciones de las entidades contratantes. A la presente comunicación se remite la revisión realizada.
2. Programa de interventoría: Se debe anexar el cronograma y plan de cargas extendido, para determinar la programación de las actividades a realizar por la interventoría, en el plazo de ejecución del contrato.
3. Equipo mínimo: Actualizar documentos vencidos.



Así las cosas, se requiere en el termino no mayor a tres (03) días hábiles, la subsanación de dichos documentos, para continuar con los tramites respectivos.

Atentamente,

[Signature]
BRENDA RORAIMA BARRERA
Directora Técnica de Construcciones
Supervisor

[Signature]
Revisado
Elizabeth González Roa
Profesional de apoyo jurídico

[Signature]
Proyecto
Luz Yanelis Pérez Vargas
Profesional de apoyo a la supervisión
CPSF 38123-023

Copia: Oficina Asesora Jurídica



Bogotá, 30 de marzo, Municipio de Guayatá de 2023

920
OFCAI-VAZ-001

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023, INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Asunto: Entrega de Documentación requerida previo firma Acta de Inicio para el Contrato de Obra No. 2653 del 30 de diciembre de 2022.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega de la siguiente información previa al Acta de Inicio, a continuación, se relacionan la siguiente documentación:

- Programación de Obra en diagrama de Gant.
- Flujo de caja mes a mes, acorde al cronograma de obra.
- Presupuesto Oficial y Análisis de Precios Unitarios (Apus).
- Plan de Inversión de Anticipo.
- Documentación laboratorio de suelos certificados de calidad y calibración de equipos.
- Comisión topográfica Certificación de Equipos.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Proyectos Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

En proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 10 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-002

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega de Plan de Manejo de Transito PMT.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega de la siguiente información previa al Acta de Inicio, a continuación, se relaciona la siguiente documentación:

- Informe de PMT, Proyecto vía rural vereda Turua.
- Plano PMT, proyecto vía rural vereda Turua.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Proyectos Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto,
nuestro
compromiso

965



Bogotá, 10 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-003

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega de Presupuesto Paga.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega del presupuesto del PAGA, información necesaria previo al Acta de Inicio, a continuación, se relaciona la siguiente documentación:

- Presupuesto PAGA.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Proyectos Calpro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 18 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-004

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega de Hoja de vida de profesionales.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega de las hojas de vida de los siguientes profesionales:

- Director de Obra, Ingeniero Alfredo Restrepo Varón
- Residente de Obra, Sandra Milena Moyano Morales
- Ingeniero Especialista Geotecnia y Pavimentos, Ingeniero Jorge Andrés Roa Romero

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Proyectos Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 19 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-005

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega Plan de calidad del Proyecto.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega del Plan de calidad para el proyecto en referencia, lo anterior para su revisión y aprobación, se adjunta la siguiente documentación:

- Plan de Gestión del Proyecto.
- Plan de Ensayos

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Proyectos Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 20 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-006

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega del Plan de Gerencia del Proyecto.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega del Plan de Gerencia para la ejecución del proyecto en referencia, lo anterior para su revisión y aprobación, se adjunta la siguiente documentación:

- Informe Implementación Plan de Gerencia.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Obras Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto
nuestro
compromiso



Bogotá, 25 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-008

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega de documentos personal de obra de acuerdo a solicitud de oficio de fecha 19 de abril de 2023.

Dando respuesta al oficio de fecha 19 de abril de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), donde nos solicitan la entrega de la documentación del personal en un formato específico, nos permitimos adjuntar nuevamente la documentación para el personal mínimo requerido, con las subsanaciones a la solicitud del oficio en asunto, con lo anterior se adjuntan los siguientes anexos de cada uno de los profesionales:

- Hoja de vida del profesional.
- Registro de Experiencia del Profesional.
- Certificación de Compromiso del Profesional.
- Certificación del Sistema de Registro Nacional de Medicas Correctivas (RNMC)
- Certificado de Contraloría.
- Certificado de Procuraduría
- Certificado de Antecedentes Judiciales

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Obras Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 20 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-008

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega de Documentación Maquinaria.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega de la siguiente documentación referente a la maquinaria mínima necesaria para la ejecución del proyecto, lo anterior para su revisión y aprobación, se adjunta la siguiente documentación:

- Ficha Técnica Volqueta Internacional.
- Licencia de Tránsito Volqueta
- Soat Volqueta Placa WFL457
- Ficha Técnica Retroexcavadora Kubota KX080-3
- Ficha Técnica Retroexcavadora (Pajarita) 3CX B

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Obras Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto,
nuestro
compromiso.

951



Bogotá, 28 de abril de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-009

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: Documentos Maquinaria de Asfalto y Volquetas.

Dando respuesta al oficio de fecha 16 de marzo de 2023, emitido por la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S (Interventoría), me permito hacer entrega de los documentos que corresponden a la maquinaria para la instalación de asfalto y Transporte de Agregados, lo anterior para su revisión y aprobación, se adjunta la siguiente documentación:

- Finisher PF3200, Marca Blaw-Knox, Año de Fabricación 2003, Serial No. 320035-18,
- Hayster PS130, Código Maquina CNC-01, Fecha 10 de agosto de 2013, Marca Caterpillar, Modelo PS-130.
- Vibro Bitelly C-80, Marca Bora C-80, Serie 58940210, Año de Fabricación 1996,
- Volqueta Kenworth, Capacidad 20000Kg, Placa XJA893, Modelo 2008.
- Volqueta Hino, Capacidad 20000Kg, Placa SBL207, Modelo 2007.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALEX DARWIN SOTO VELASCO
C.C. 1.120.558.575 de San José del Guaviare
Coordinador de Obras Caipro Constructores S.A.S
Cel: 312 5671428

Su proyecto,
nuestro
compromiso





Bogotá, 2 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-010

Señores
ASP SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Definición de Socialización del Proyecto con la comunidad.

Teniendo en cuenta que el pasado 28 de Abril del año en curso se firmó el acta de inicio del contrato de la referencia, queremos solicitarles, muy comedidamente, se nos indique la fecha programada para la socialización del inicio del proyecto, con la Comunidad en el área de influencia, toda vez que en la visita de obra realizada por nuestro equipo de obra la semana anterior la señora Luz Mila, quien se identificó como Presidente de la JAC de la vereda Turua, nos manifestó no tener conocimiento del estado del contrato ni de su inicio y que dados los antecedentes con obras anteriores, NO permiten el inicio de las actividades de la Obra, ni están de acuerdo con el inicio de la movilización de nuestros equipos de personal ni de maquinaria, así como tampoco nos permiten tener acceso a la información de posibles vinculaciones de personal de mano de obra no calificada de la región, hasta tanto la entidad contratante no realice la socialización.


Es de aclarar que, de acuerdo a las condiciones del contrato de la referencia, nuestro plazo contractual inicia con la firma del acta de inicio, y este plazo se vería afectado por la NO realización de la Socialización por lo que nos varíamos en la necesidad de generar una reprogramación de las actividades y/o la consideración o estudio de una posible prórroga, equivalente al tiempo que se tome la entidad en poder coordinar y llevar a cabo la socialización.

Es claro para nosotros que paralelamente a la definición de la socialización nosotros estamos realizando las actividades administrativas necesarias para que una vez se tenga definida la fecha real de inicio de actividades ésta se pueda llevar a cabo sin ningún inconveniente o retraso.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO REGALADO VARÓN
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Calpro Constructores S.A.S
Cel: 3108677585

Recibido
02-may-2023

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 3 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-011

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: Envío diseño de Valla informativa

En respuesta a su comunicación OF-001-CTO 0487-2023 de fecha 2 de mayo de 2023 en la cual nos solicitan la implementación de la Valla Informativa del proyecto, dando cumplimiento al numeral 22 de la cláusula 10, Obligaciones específicas del contrato de obra pública de la referencia. Adjunto a la presente, enviamos diseño generado para la Valla, para su revisión y validación, con el fin de poder proceder a la producción e impresión de la misma, para su posterior instalación en obra.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



ING. ALFREDO RESTREPO VARÓN
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto.
nuestro
compromiso

934



Bogotá, 5 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-012

Señores

A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Aprobación diseño de Valla informativa

De acuerdo a la revisión realizada por interventoría al diseño de la valla informativa del contrato de la referencia, les solicitamos muy amablemente se haga la validación, con el fin de proceder a la impresión y posterior instalación en obra, por tal motivo adjuntamos el diseño.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3106677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 6 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-013

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Documentos para el trámite del cobro del anticipo.

Anexo a la presente estamos enviando la siguiente documentación adicional requerida para realizar el trámite del cobro del anticipo del contrato de la referencia:

1. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales firmado por revisor fiscal y representante legal.
2. Pagos de seguridad social y certificado de afiliación de:
 - ELIZABETH CAINA DELGALDO.
 - ALFREDO RESTREPO VARON.
 - SANDRA MILENA MOYANO MORALES.
 - JOHANN LEONARDO ACOSTA BETANCOURT.
 - SERVULO ANDRES MACIAS BELLO.
 - JAVIER ANDRES CAINA DELGADO.
 - JORGE ROA ROMERO
3. Certificado bancario fiducia.
4. Contrato de fiducia mercantil.
5. Registro único tributario.
6. Acta de inicio.
7. Plan de inversión del anticipo en original.
8. Acta de entrega del anticipo en original.
9. Cuenta de cobro.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C/19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Recibido 08-05-2023
[Signature]
Al Pagado

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 11 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-014

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: entrega de ensayos de caracterización de base y sub-base.

Anexo a la presente estamos radicando los ensayos de laboratorio de la caracterización realizada a la sub-base y base del material de la planta T Y A DEL CUSIANA S.A.S., para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARÓN
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 11 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-015

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: entrega de la reprogramación de obra ajusta al acta de inicio.

Anexo a la presente estamos radicando la reprogramación de obra, ajustada de acuerdo al acta de inicio firmada el día 28 de abril del 2023, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

tu proyecto,
nuestro
compromiso



938

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S.

Bogotá, 12 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

RECIBIDO
12/05/23
RESIDENCIA DE VEREDAS

OFCAI-VAZ-016

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: entrega de pólizas actualizadas según acta de inicio.

Anexo a la presente estamos radicando la actualización de las pólizas de obra, ajustada de acuerdo al acta de inicio firmada el día 28 de abril del 2023, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 17 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-018

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: Respuesta a oficio del 26/04/2023 entregando el presupuesto del PAGA.

Anexo a la presente estamos radicando el presupuesto del PAGA firmado en original, teniendo en cuenta la solicitud del oficio del día 26 de abril del 2023, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto
nuestro
compromiso

940



Bogotá, 17 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-019

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Respuesta a oficio del 26/04/2023 entregando informe implementación plan de gerencia.

Anexo a la presente estamos radicando el informe de implementación del plan de gerencia, subsanando las observaciones que fueron solicitadas mediante el oficio del día 26 de abril del 2023, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso

941



Bogotá, 17 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-020

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Respuesta a oficio del 24/04/2023 entrega documentos varios.

Anexo a la presente se radican los siguientes documentos, subsanando las observaciones que fueron solicitadas mediante el oficio del día 24 de abril del 2023, para su revisión y aprobación:

- Flujo de caja mes a mes, acorde al cronograma.
- Análisis de precios unitarios APU ítems 201, 202, 203, 401 y 403.
- Información general del laboratorio de suelos.
- Certificado de calibración de los equipos de topografía.
- Hoja de vida del topógrafo.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso

992



Bogotá, 17 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-021

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Respuesta a oficio del 25/04/2023 entregando el plan de gestión del proyecto.

Anexo a la presente estamos radicando el plan de gestión del proyecto, subsanando las observaciones que fueron solicitadas mediante el oficio del día 25 de abril del 2023, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARÓN
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 20 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-022

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Respuesta a oficio del 27/04/2023 y entrega documentos maquinaria mínima.

Anexo a la presente estamos enviando la siguiente documentación de la maquinaria mínima del proyecto, subsanando las observaciones que fueron solicitadas mediante el oficio del día 27 de abril del 2023 y complementando la información que fue radicada a ustedes el día 28 de abril del 2023 mediante oficio OFCAI-VAZ-009, para su revisión y aprobación:

- Certificado de disponibilidad de los equipos.
- Carta de propiedad del equipo.

EQUIPOS:

- Terminadora de asfalto con potencia bruta mínima de motor 100 HP cantidad (1).
- Vibrocompactador autopropulsado con un peso operativo de 10 TN cantidad (1).
- Vibrocompactador neumático autopropulsado mínimo de cuatro llantas por tandem con ~~función~~ de funcionamiento y presión de inflada variable según necesidad de amasado de potencia neta de motor de 80 HP cantidad (1)

nuestro
compromiso



- Retroexcavadora sobre orugas de potencia neta de motor de 128 HP y 0,9 M3 de cucharón cantidad (1).
- Motoniveladora de potencia de motor mayor a 120 HP y un ancho de cuchara mínimo de 3.5 mts cantidad (1).

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso

995.

Recibido
19/05/23



Bogotá, 19 de mayo de 2023, Municipio de Yopal Casanare

OFCAI-VAZ-023

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: entrega de informes semanales No.1 y No.2.

Anexo a la presente estamos radicando los informes semanales No.1 comprendido desde el 28/04/2023 al 05/05/2023 y el No.2 comprendido desde el 05/05/2023 al 12/05/2023, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso



Bogotá, 23 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

946
Recibido
24/05/23
OFCAI-VAZ-024

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Respuesta a oficio del 26/06/2023 Hojas de vida

Anexo a la presente se radican los siguientes documentos, subsanando las observaciones que fueron solicitadas mediante el oficio del día 26 de abril del 2023, con observaciones respecto a las hojas de vida de los profesionales propuestos, para su revisión y aprobación:

- Director de obra.
- Residente De Obra.
- Sisoma.
- Ingeniero especialista Geotecnia y pavimentos.
- Profesional en Gerencia de Proyectos.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

su compromiso
nuestro
compromiso



Bogotá, 23 de mayo de 2023, Municipio de Aguazul Casanare

OFCAI-VAZ-025

Señores
Oficina Jurídica
Gobernación de Casanare

GOBERNACION DEL CASANARE
OFICINA ASESORA JURIDICA
FECHA: 24/5/23 HORA: 2:41 pm
RADICADO No: 50005
RECIBIDO POR: [Firma]

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: Entrega de Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad civil Ajustadas

Anexo a la presente radican los siguientes documentos firmados por la representante legal y ajustadas al acta de inicio.

- Póliza de cumplimiento Número 4007834, Seguros el Roble
- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Número 4001574, Seguros el Roble
- Copia del Acta de Inicio

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Calpro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Calpro es
nuestro
compromiso



Bogotá, 24 de mayo de 2023, Municipio de Yopal Casanare

OFCAI-VAZ-026

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: comunicación de novedad administrativa.

Cordial saludo a través de la presente y de forma respetuosa nos permitimos informar que mediante documento allegado a la cámara de comercio se procedió a la modificación del representante legal de la empresa **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S** identificada con NIT: 900.119.570-4, siendo designada como nueva gerente la señora **ELIZABETH CAINA DELGADO** identificada con cedula 40.037.628, adicional a esta situación administrativa fue designado como subgerente el señor **WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO** identificado con cedula 79.794.193, por lo anterior y únicamente en caso de requerirlo la entidad, se informa la anterior situación administrativa para todos los efectos legales y administrativos del contrato que se encuentra vigente, así mismo se indica que de conformidad con los estatutos internos los dos representantes legales cuentan con la totalidad de las facultades.

Se adjunta copia del certificado de existencia y representación legal y copia de la cedula del representante legal

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


ING. ALFREDO RESTREPO VARÓN
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

El proyecto
nuestro
compromiso



Bogotá, 30 de mayo de 2023, Municipio de Yopal Casanare

OFCAI-VAZ-027

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: entrega de informes semanales No.3 y No.4.

Anexo a la presente estamos radicando los informes semanales No.3 comprendido desde el 12/05/2023 al 19/05/2023 y el No.4 comprendido desde el 19/05/2023 al 26/05/2023, para su revisión y aprobación.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso

970

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADIACIÓN DE DOCUMENTOS

31 MAY 2023

HORA: 4:46 PM Tomara
- 05617 -



Bogotá, 31 de mayo de 2023, Municipio de Yopal Casanare

OFCAI-VAZ-028

Señores
Gobernación del Casanare
Secretaría de infraestructura
Dirección técnica de construcciones

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare."

Asunto: entrega de documentos para tramites del desembolso del anticipo de obra.

Anexo a la presente estamos radicando la siguiente documentación requerida para realizar el tramites del cobro del anticipo del contrato de la referencia:

- Formato FO-AB-20
- Copia de RUT actualizado.
- Certificado de revisor fiscal.
- Copia de cedula del representante legal.
- Certificado bancario de la fiducia.
- Cuenta de cobro.
- Contrato fiduciario.
- Copia de RUT de la fiducia.
- Copia de cámara de comercio de la fiducia.
- Acta de inicio de obra.
- Cámara de comercio contratista de obra (caipro constructores s.a.s).
- Certificado de junta de contadores del revisor fiscal.
- Acta de entrega del anticipo en original.
- Plan de inversión del anticipo FO-AB-36 en original y copia.
- Pago de seguridad social y certificado de afiliaciones de:
 1. ELIZABETH CAINA DELGALDO.
 2. ALFREDO RESTREPO VARON.
 3. SANDRA MILENA MOYANO MORALES.

Proyecto
nuestro
compromiso

970

987

<div></div> <div>PROYECTOS</div>		INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE		<div></div> <div>Casanare</div>
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023		
17/05/2023		OFCAL-VAZ-018	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta oficio del 26/4/23 entregando el presupuesto PAGA.
17/05/2023		OFCAL-VAZ-019	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta oficio del 26/4/23 entregando informe implementación plan de gerencia.
17/05/2023		OFCAL-VAZ-020	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta oficio del 24/4/23 entrega documentos varios
17/05/2023		OFCAL-VAZ-021	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta oficio del 25/4/23 entregando plande gestion del proyecto
20/05/2023		OFCAL-VAZ-022	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio del 27/4/23 y entrega de documentos maquinaria mínima.
19/05/2023		OFCAL-VAZ-023	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de informes semanales N° 1 Y 2.
23/05/2023		OFCAL-VAZ-024	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta oficio del 26/6/23 hojas de vida
23/05/2023		OFCAL-VAZ-025	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de polizas de cumplimiento y responsabilidad civil ajustadas
24/05/2023		OFCAL-VAZ-026	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Comunicación de novedad administrativa
30/05/2023		OFCAL-VAZ-027	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de informes semanales N° 3 Y 4.
31/05/2023		OFCAL-VAZ-028	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Entrega de documentos para tramites del desembolso del anticipo de obra.
3.6.3.2 oficios y correspondencia enviada				
FECHA		No RADICADO	DEPENDENCIA	ASUNTO
27/02/2023		N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de revision y aprobación de polizas del contrato N° 0487 del 8 de febrero de 2023
27/02/2023		N/A	OFICINA ASESORIA JURIDICA	Solicitud de revision y aprobación de polizas del contrato N° 0487 del 8 de febrero de 2023
28/02/2023		N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de información requerida según oficio 520-149 del 24 de febrero del 2023. Información para el control de la ejecución de la obra.
28/02/2023		N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de información requerida según oficio 520-149 del 24 de febrero del 2023. Clausula 22 suscripción, perfeccionamiento y ejecución.

912

<div>PROYECTOS</div>		<div>INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE</div>		<div>Casanare</div>	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1				28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023	
13/03/2023	N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Subsanaciones requeridas según oficio 520-229 del 07 de marzo del 2023. Información para el control de la ejecución de la obra y equipo de trabajo.		
16/03/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Solicitud de documentos requeridos para el inicio del contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre del 2022.		
27/03/2023	N/A	OFICINA ASESORIA JURIDICA	Solicitud de revisión y aprobación de pólizas del contrato N° 0487 del 8 de febrero de 2023, actualizada acta de inicio.		
11/04/2023	N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de informe preconstructivo		
17/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Solicitud de documentos faltantes requeridos para el inicio del contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre del 2022.		
19/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-004 del 18 de abril de 2023		
24/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-001 del 31 de marzo de 2023		
25/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-002 del 10 de abril de 2023		
26/04/2023	N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de informe de mayores y menores cantidades y presupuesto de obra ajustado por interventoría.		
26/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-003 del 10 de abril de 2023		
26/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-005 del 19 de abril de 2023		
26/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-006 del 20 de abril de 2023		
26/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-007 del 25 de abril de 2023		
27/04/2023	N/A	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-008 del 25 de abril de 2023		
26/05/2023	N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de documentos requeridos para el inicio del contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre del 2022.		

983

 PROYECTOS		INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE		 Casanare	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1			28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023		
31/05/2023	N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de APU de items no previstos e Informe de interventoria del contrato N° 2653 del 30 de diciembre del 2022. para modificatoria # 1		



Yopal, 27 de febrero de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
28 FEB 2023
16:49 am
01967---

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de revisión y aprobación de pólizas del contrato N° 0487 del 08 febrero de 2023.

Mediante el presente oficio esta interventoría informa, que se realizó la solicitud de revisión y aprobación de las pólizas de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N° 57- 44 -101003391 anexo 0, para la aprobación del acta de inicio. Las cuales fueron cargadas a la plataforma SECOP II el día 23/2/23 y al no tener respuesta alguna, se radico oficio con solicitud de aprobación el día de hoy 27/2/23, a lo cual manifiestan que se dará respuesta dentro de tres días hábiles a partir de hoy.

Es por esto que solicito su gestión para dar celeridad a este proceso y poder firmar el acta de inicio para interventoría.

Atentamente,


IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3



PROYECTOS

Yopal, 27 de febrero de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA ASESORIA JURIDICA
La ciudad.



Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de revisión y aprobación de pólizas del contrato N° 0487 del 08 febrero de 2023.

Mediante el presente oficio esta interventoria solicita la revisión y aprobación de las pólizas de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N° 57- 44 - 101003391 anexo 0. Para la aprobación del acta de inicio.

Atentamente,



IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

97



PROYECTOS

Yopal, 28 de febrero de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

28 FEB 2023
11:54 am Robertt
No. de Radicación 01969--

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega de información requerida según oficio 520-149 del 24 de febrero del 2023. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Mediante el presente oficio se realiza la entrega de la documentación requerida en el oficio 520-149 del 24 de febrero del 2023. Los cuales se enumeran a continuación.

- Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los miembros del grupo clave evaluable. La verificación de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito para iniciar la ejecución del contrato.
- Programa de interventoría
- Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad en el numeral 4.3 del pliego de condiciones.
- Los demás que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

917



PROYECTOS

Yopal, 28 de febrero de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

28 FEB 2023
Nº 520-149 del 24 de febrero del 2023
01968-22

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega de información requerida según oficio 520-149 del 24 de febrero del 2023. Clausula 22 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

Mediante el presente oficio se realiza la entrega de la documentación requerida en el oficio 520-149 del 24 de febrero del 2023. Los cuales se enumeran a continuación.

- Registro presupuestal
- Pago de impuestos
- Aprobación de las garantías por parte de la oficina Asesora jurídica de la gobernación
- Acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

958



PROYECTOS

Yopal, 13 de marzo de 2023

GOBERNACIÓN DE CASANARE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

13 MAR 2023

92414 Gómez
026.12.---

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: *Subsanaciones requeridas según oficio 520-229 del 07 de marzo del 2023.*
INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA y EQUIPO DE TRABAJO.

Mediante el presente oficio se realiza la entrega de la documentación requerida en el oficio 520-229 del 07 de marzo del 2023. Los cuales se enumeran a continuación.

- Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los miembros del grupo clave evaluable. La verificación de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito para iniciar la ejecución del contrato.
- Programa de interventoria
- Equipo mínimo.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Folios: 356

Aguazul, 16 de marzo de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAJIA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: ***Solicitud de documentos requeridos para el inicio del contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre del 2022.***

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Se solicita la información que se describe a continuación:

1. Programación de obra, Plan de inversiones, Flujo de caja
2. Listado de APU del proyecto para cada uno de los ítems
3. Plan para el manejo y la correcta inversión del anticipo
4. Hojas de vida del personal del contrato (enviar cuadro Excel para cada uno de los profesionales)

• **DIRECTOR**

El profesional ofrecido para el cargo de director debe acreditar lo siguiente: 1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, vigente con especialización en Gerencia de proyectos. 2. Tener la siguiente experiencia: a. General: Mínimo Doce (12) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. b. Específica: Mínimo Siete (7) años acumulada, contada dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en: Ejercicio profesional, como Director de Obra de proyectos relacionados con construcción, adecuación, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías.

**• INGENIERO RESIDENTE**

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente: 1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, vigente con especialización en gerencia de proyectos de construcción y/o geotecnia vial y pavimentos. 2. Tener la siguiente experiencia: a. General: Una experiencia general no menor de siete (7) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente Licitación Pública. b. Específica: Poseer mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del Periodo comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en Ejercicio profesional como Ingeniero Director y/o Residente de Obra de proyectos relacionados con construcción, adecuación, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías.

• PROFESIONAL SISOMA

Profesional en el área de salud ocupacional con especialización en gestión ambiental. Debe tener una permanencia en obra del 100 % del tiempo efectivo como mínimo, respecto de la duración de la misma. 1. Poseer licencia ocupacional vigente: el profesional propuesto debe tener un título de Especialista en el Área de gestión ambiental. 2. Tener la siguiente experiencia: a. General: Mínimo siete (7) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente licitación pública. b. Específica: Mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del periodo comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, dicha experiencia debe estar relacionada con el objeto del presente estudio previo. Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido.

• INGENIERO ESPECIALISTA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

El profesional ofrecido para el cargo de especialista en geotecnia debe acreditar lo siguiente: a) Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado, en el área a participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. b) Tener una experiencia general no menor de ocho (8) años, contada entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. c) Poseer mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del Periodo comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto. Para el estudio de la experiencia específica del especialista se tendrán en cuenta el siguiente criterio general: Especialista en Vías o Pavimentos, Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías, que tenga título de Especialista en Geotecnia Vial y pavimentos. Solo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS.

5. Maquinaria mínima del proyecto (acuerdo de disponibilidad, hojas de vida de equipos)

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

- Una (1) Terminadora de asfalto con potencia bruta mínima de motor 100 HP o superior, con un ancho estándar de pavimentación mínimo de 10 Pies como mínimo.
- Un (1) Vibrocompactador autopropulsado con un peso operativo de 10 toneladas.
- Un (1) Compactador neumático autopropulsado mínimo de cuatro llantas por tandem con peso de funcionamiento y presión de inflado variable según necesidad de amasado, de potencia neta de motor de 80 Hp.
- Una (1) Retroexcavadora sobre orugas de potencia neta de motor de 128 Hp y 0.9 m³ de cucharón.
- Una (1) Motorveladora de potencia de motor mayor a 120HP y un ancho de cuchilla mínimo de 3.6 m.
- Tres (3) Volquetes tipo doble troque de 12 m³ de capacidad cada uno.

Otros equipos inherentes al trabajo:

- Una (1) Barredora o compresor para soplado y barrido 100 p.e.i.
- Un (1) Carrotanque irrigador de asfalto con capacidad de 10000 Kg.
- Un (1) Carrotanque para agua con capacidad de 15000 Kg.
- Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana) potencia de motor 3HP profundidad de compactación 200 a 300 milímetros fuerza de impacto máxima 1 520 kilogramos.
- Un (1) Apisonador manual potencia de motor 3HP fuerza de impacto mínima 1 325 kilogramos tipo rana y tipo canguro.
- Una (1) Mezcladora de concreto con una capacidad mínima de 20 metros cúbicos por día. Podrá utilizarse Mezcladoras de concreto con capacidad de 2 bultos. Motor de combustión de 8 HP o 1800 RPM.
- Una (1) Retroexcavadora cargadora sobre llantas con capacidad mínima de 125 HP.

6. Plan de manejo de tránsito

7. Presentación programa y presupuesto PAGA

8. Programa de gerencia de proyectos

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

- A. Opción 2. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de infraestructura vial.

9. Plan de calidad del proyecto

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

10. Documentación laboratorio de suelos certificados de calidad y calibración de equipos

11. Comisión topográfica Certificación de equipos y hojas de vida del personal

Agradezco el envío de la información para adelantar su revisión.


Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Dirección – Calle 11 # 04-20 Trinidad Casanare – TEL 57 (8)-6328619 – Cel. 3233118725
Email: aypingenieriasas@gmail.com

**PROYECTOS**

Yopal, 27 de marzo de 2023



SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA ASESORIA JURIDICA
La ciudad.

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Solicitud de revisión y aprobación de pólizas del contrato N° 0487 del 08 febrero de 2023.

Mediante el presente oficio esta interventoría solicita la revisión y aprobación de las pólizas de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES N° 57- 44 - 101003391 anexo 2. Actualizada según acta de inicio.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3



963

PROYECTOS

Yopal, 11 de abril de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

11 ABR 2023

hora: 2:31 pm

Nº de Radicación: 3507

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023
INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE
Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO
DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega de informe pre constructivo

Mediante el presente oficio esta interventoria hace entrega del informe pre constructivo para su revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Folios: 210
Planos: 2

Aguazul, 17 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAIÑA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: *Solicitud de documentos faltantes requeridos para el inicio del contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre del 2022.*

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Se solicita sea suministrada la información faltante según lo requerido en el oficio del 17/04/23.

La información faltante se describe a continuación.

1. Hojas de vida del personal del contrato (enviar cuadro Excel para cada uno de los profesionales)

• **DIRECTOR**

El profesional ofrecido para el cargo de director debe acreditar lo siguiente: 1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, vigente con especialización en Gerencia de proyectos. 2. Tener la siguiente experiencia: a. General: Mínimo Doce (12) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. b. Específica: Mínimo Siete (7) años acumulada, contada dentro del periodo comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en Ejercicio profesional, como Director de Obra de proyectos relacionados con construcción, adecuación, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías.



• **INGENIERO RESIDENTE**

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente: 1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, vigente con especialización en gerencia de proyectos de construcción y/o geotecnia vial y pavimentos. 2. Tener la siguiente experiencia: a. General: Una experiencia general no menor de siete (7) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente Licitación Pública. b. Específica: Poseer mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del Periodo comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en Ejercicio profesional como Ingeniero Director y/o Residente de Obra de proyectos relacionados con construcción, adecuación, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de vías.

• **PROFESIONAL SISOMA**

Profesional en el área de salud ocupacional con especialización en gestión ambiental. Debe tener una permanencia en obra del 100 % del tiempo efectivo como mínimo, respecto de la duración de la misma. 1. Poseer licencia ocupacional vigente, el profesional propuesto debe tener un título de Especialista en el Área de gestión ambiental. 2. Tener la siguiente experiencia: a. General: Mínimo siete (7) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente licitación pública. b. Específica: Mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del periodo comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, dicha experiencia debe estar relacionada con el objeto del presente estudio previo. Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido.

• **INGENIERO ESPECIALISTA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS**

El profesional ofrecido para el cargo de especialista en geotecnia debe acreditar lo siguiente: a) Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado, en el área a participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. b) Tener una experiencia general no menor de ocho (8) años, contada entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública. c) Poseer mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del Periodo comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto. Para el estudio de la experiencia específica del especialista se tendrán en cuenta el siguiente criterio general: Especialista en Vías o Pavimentos, Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías, que tenga título de Especialista en Geotecnia Vial y pavimentos. Solo se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS.

2. Maquinaria mínima del proyecto (acuerdo de disponibilidad, hojas de vida de equipos)

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

- Una (1) Terminadora de asfalto con potencia bruta mínima de motor 100 HP o superior, con un ancho estándar de pavimentación mínimo de 10 Pies como mínimo.
- Un (1) Vibrocompactador autopropulsado con un peso operativo de 10 toneladas.
- Un (1) Compactador neumático autopropulsado mínimo de cuatro llantas por tandem con peso de funcionamiento y presión de inflado variable según necesidad de amasado, de potencia neta de motor de 60 Hp.
- Una (1) Retroexcavadora sobre orugas de potencia neta de motor de 128 Hp y 0.9 m³ de cucharón.
- Una (1) Motorizadora de potencia de motor mayor a 120HP y un ancho de cuchilla mínimo de 3.6 m.
- Tres (3) Volquetas tipo doble troque de 12 m³ de capacidad cada una.



966

PROYECTOS

Otros equipos inherentes al trabajo:

- Una (1) Barridora o compresor para sopiado y barrido 100 p.s.i.
- Un (1) Carrotanque irrigador de asfalto con capacidad de 10000 Kg.
- Un (1) Carrotanque para agua con capacidad de 15000 Kg.
- Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana) potencia de motor 8HP profundidad de compactación 200 a 300 milímetros, fuerza de impacto mínima 1 520 kilogramos.
- Un (1) Apisonador manual potencia de motor 3HP, fuerza de impacto mínima 1 325 kilogramos tipo rana y tipo canguro.
- Una (1) Mezcladora de concreto con una capacidad mínima de 20 metros cúbicos por día. Podrá utilizarse Mezcladoras de concreto con capacidad de 2 bultos. Motor de combustión de 8 HP o 1800 RPM.
- Una (1) Retroexcavadora cargadora sobre llantas con capacidad mínima de 125 HP.

3. Presentación programa PAGA

4. Programa de gerencia de proyectos

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

- A. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de infraestructura vial.

5. Plan de calidad del proyecto

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

6. Comisión topográfica, hojas de vida del personal

Agradezco el envío de la información para adelantar su revisión.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Aguazul, 19 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAIÑA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: ***Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-004 del 18 de abril de 2023***

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de las hojas de vida radicadas para el proyecto.

- Se debe incluir toda la información de las hojas de vida en un formato donde se muestre en resumen las experiencias, general y específica. (anexo modelo guía para su diligenciamiento).
- Anexar en las hojas de vida los certificados de: policía, contraloría, procuraduría y Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
- Anexar las cartas de disponibilidad de cada profesional en su respectiva hoja de vida.
- Se debe certificar el tiempo de experiencia general y específica exigida en el anexo técnico desde la expedición de la tarjeta profesional.



968

PROYECTOS

Se requiere hacer llegar esta información y la solicitada en ocasiones anteriores en su totalidad para su revisión y aprobación. Es de aclarar que el proceso de elaboración y aprobación del informe pre constructivo ha culminado, por lo cual solo estaría pendiente para dar inicio de obra la documentación a suministrar por el contratista.

Como se ha manifestado en anteriores ocasiones por esta interventoría, en donde se solicita el suministro de la información requerida en su totalidad, a lo cual se han realizado entregas parciales; ha provocado una prolongación en el tiempo de revisión y aprobación de la misma. Lo cual está conllevando a la no aprobación del acta de inicio de obra.

Una vez expuesto lo anterior se estaría incurriendo en un incumplimiento por parte del contratista y un retraso en el inicio de la ejecución de la obra, por esto se solicita subsanar estos pendientes en un tiempo no mayor a 2 días a partir de la entrega de este comunicado.

Agradezco se tomen las medidas correctivas pertinentes para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE GOBERNACIÓN DE CASANARE						
EXPERIENCIA PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN						
TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE						
EXPERIENCIA DEL PERSONAL						
CONTRATISTA						
NOMBRE DEL CURSO						
NOMBRE DEL PROFESIONAL						
ESPECIALIZACIÓN						
ESPECIALIZACIÓN ADICIONAL						
TÍTULO PROFESIONAL						
MATRÍCULA PROFESIONAL						
FECHA DE EXPEDICIÓN						
EXPERIENCIA GENERAL						
No.	PROFESOR	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	Duración (Meses)	Duración (Años)
TOTAL					0.00	0.00
CARGO	ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	Duración (Meses)	Duración (Años)
					0.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
CARGO	ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	Duración (Meses)	Duración (Años)
					0.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00
ESPECIALIZACIÓN					0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO DE VÍAS Y TRANSPORTES CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS				CUMPLE	NO CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL	GENERAL INGENIERO CIVIL Y/O DE TRANSPORTE Y VÍAS POSGRADO EN GERENCIA DE PROYECTOS Y/O GERENCIA DE OBRAS Y/O GEOTECNIA VIAL NO MENOR DE SEIS (06) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL				X	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	ESPECÍFICA EL HABERSE DESEMPEÑADO COMO DIRECTOR DE INTERVENCIÓN NO MENOR DOS (02) AÑOS EN PROYECTOS EN CUYO OBJETO HAYA SIDO O QUE GUARDE SIMILITUD CON EL OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO				X	
Empresa No contratista			Visto GOBERNACIÓN DE CASANARE NOMBRE CARGO			

Aguazul, 24 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: ***Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-001 del 31 de marzo de 2023***

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la documentación suministrada.

- Programación de Obra en diagrama de Gantt.

Se realizó la revisión del documento suministrado y se pudo corroborar que incluye la totalidad de los ítems aprobados en la oferta económica. Igualmente se pudo constatar que el costo de cada capítulo es igual al indicado en la misma. Se verificó el que el tiempo estimado de ejecución no sobre pase el estipulado en la minuta del contrato. Por lo consiguiente esta interventoria avala la programación de obra presentada y se dispone para su revisión final por parte de la supervisión del contrato.

Es de aclarar que una vez firmado el acta de inicio de deberá actualizar dicha programación y deberá ser remitida a interventoría para su revisión y aprobación.



- Flujo de caja mes a mes, acorde al cronograma de obra.

Se realizó la revisión del documento suministrado y se solicita que este, debe estar firmado en original y con un lugar destinado para el visto bueno por parte de interventoría.

El flujo de caja está acorde al cronograma de obra y a los valores que se aprobaron en el presupuesto de obra.

Se avala para revisión final por parte de la supervisión del contrato. Es de aclarar que una vez firmado el acta de inicio de deberá actualizar dicha programación.

- Presupuesto Oficial y Análisis de Precios Unitarios (Apus).

Se realiza la revisión al análisis de precios unitarios y se solicita ajustar los siguientes hallazgos.

Ítem 201 Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado tmax. 3"

No se observa que este contemplado el vibro compactador para el proceso de compactación del material y el carro tanque para la distribución del agua.

Ítem 202 Sub Base Granular Triturada

No se observa que este contemplado el carro tanque para la distribución del agua.

Ítem 203 Base Granular Triturada

No se observa que este contemplado el carro tanque para la distribución del agua.

Ítem 401 líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (inv. 700.1)

No se observa que este contemplado el compresor para el proceso de aplicado de la pintura acrílica.

Ítem 403 Marcas Viales Con Pintura Acrilica Para Demarcación (Símbolos Y Letreros)

No se observa que este contemplado el compresor para el proceso de aplicado de la pintura.

- Plan de Inversión de Anticipo.

Se realizó la revisión del documento suministrado y se verificó que los valores estipulados como anticipo están acorde a los gastos iniciales requeridos en obra, se verificó que los topes expuestos en el plan de inversión no sobre pasan los valores acordados en el presupuesto de obra y están distribuidos dentro del tiempo pactado en el cronograma. Se avala para revisión final por parte de la supervisión del contrato.

Adicionalmente el documento debe estar firmado en original

Es de aclarar que una vez firmado el acta de inicio se deberá actualizar dicho plan de inversión del anticipo.

- Documentación laboratorio de suelos certificados de calidad y calibración de equipos.

Se realizó la revisión de los certificados de calidad y de calibración de los equipos a utilizar en el laboratorio de suelos, a lo cual se determinó que cuenta con la documentación suficiente e idónea para su uso en obra. Los equipos certificados se enuncian a continuación.

Tamiz 2", tamiz 1-1/2", Tamiz 3/4", Tamiz 3", Tamiz 1/4", Tamiz No 4, Tamiz No 16, Tamiz No 8, Tamiz No 30, Tamiz No 100, Tamiz No 200, Pie de rey, Martillo MT 03, Cazuela aparato de límite líquido, Equipo de equivalente de arena y Molde cilíndrico 4".

Hace falta anexar la información general del laboratorio de suelos a emplear en el proyecto.

- Comisión topográfica Certificación de Equipos.

Se verificó los certificados de calibración de los equipos a utilizar en campo, se pudo observar que los mismos se encuentran próximos a vencer, para el día 2 de mayo del 2023. Por lo cual al ser firmada el acta de inicio es probable que estos certificados no tengan validez.

Se recomienda actualizar estos certificados y remitirlos a interventoría para una nueva verificación.



Falta las anexar las hojas de vida del personal de topografía para su verificación y aprobación.

Agradezco se tomen las medidas correctivas pertinentes para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Aguazul, 25 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: ***Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-002 del 10 de abril de 2023***

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la documentación suministrada.

- Informe de PMT, Proyecto vía rural vereda Turua.

En el informe de PMT los siguientes numerales están estructurados en base al manual de señalización vial del 2004.

- 3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
- 5.8. SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DEL CONTROL DEL TRANSITO
 - 5.8.1. SEÑALES PREVENTIVAS
 - 5.8.2. SEÑALES REGLAMENTARIAS
 - 5.8.3. SEÑALES INFORMATIVAS


Se debe actualizar las normas conforme a lo estipulado en el manual de señalización vial del 2015y así mismo las normas que se encuentren vigentes en cada uno de los casos.

- Plano PMT, proyecto vía rural vereda Turua.

Los planos se encuentran acorde a lo requerido en obra, y se avala para revisión final por parte de supervisan del contrato.

Agradezco se tomen las medidas correctivas pertinentes para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Atentamente,



IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3



Yopal, 26 de abril de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADIACIÓN DE INTERVENCIÓN
26 ABR 2023 -
Rocio
Hora 3:59
Nro. de Radicación 104110

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega del informe de mayores y menores cantidades y presupuesto de obra ajustado por interventoría.

Mediante el presente oficio esta interventoría hace entrega del informe de mayores y menores cantidades al igual que el presupuesto de obra ajustado por interventoría, para su revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Folios: 99



Aguazul, 26 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: **Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-003 del 10 de abril de 2023**

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la documentación suministrada.

- Presupuesto Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA

El presupuesto del plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA se encuentra acorde a lo aprobado en los documentos de licitación y se avala para su implantación en obra.

Se requiere hacer llegar el presupuesto con firma original a interventoría

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Aguazul, 26 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: **Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-005 del 19 de abril de 2023**

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la documentación suministrada.

- Plan de Gestión del Proyecto.

En el plan de gestión del proyecto se encontró en los compromisos contractuales en el numeral 1, se enuncia la ciudad de Fusagasugá. Se debe corregir.

Firmar en original el documento y remitir a interventoría.

- Plan de Ensayos

El plan de ensayos se encuentra acorde a lo requerido en obra, se requiere firmar el documento en original y radicar ante interventoría. Se avala su implementación en obra



Agradezco se tomen las medidas correctivas pertinentes para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Aguazul, 26 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: ***Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-006 del 20 de abril de 2023***

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la documentación suministrada.

- Informe Implementación Plan de Gerencia.

una vez revisado el informe de implementación del plan de gerencia se pudo evidenciar los siguientes detalles.

Estipular el nombre del profesional sisoma en el organigrama del proyecto.

Para el cargo de director de interventoria del proyecto esta designada la Ing. Paola Andrea Maldonado, matrícula profesional No 68202-215319STD. Realizar el cambio de profesional en donde aparece el Ing. Alexander Peña, como se evidencia en el *Plan De Gestión Del Tiempo, Plan De Gestión De Costos* y demás numerales a que haya lugar,



981

PROYECTOS

Agradezco se tomen las medidas correctivas pertinentes para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3



Aguazul, 26 de abril de 2023

SEÑORES:
CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: ***Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-007 del 25 de abril de 2023***

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la documentación suministrada.

- Hojas de vida personal del personal del contrato

Director de obra:

1. Firmar hoja de vida en original
2. Firmar certificado copia en original
3. Fechas del certificado IHC ingeniería no coincide con el cuadro resumen
4. No esta soportado la experiencia específica con certificados
5. Faltan certificados de la experiencia general
6. No se encuentran los soportes del cuadro resumen en la hoja de vida
7. En la carta de compromiso se debe incluir el porcentaje de dedicación según anexo técnico.



8. El profesional presenta un reporte en el certificado de la contraloría como DEUDA SOLIDARIA

Residente De Obra:

1. Se presentan dos hojas de vida para el cargo de Residente de obra en el cuadro resumen, la ingeniera Sandra Milena Moyano y el ingeniero Johann Leonardo Acosta.
2. Se realiza la revisión de la información suministrada de la Ing. Sandra Milena Moyano
3. Firmar hoja de vida en original
4. Las fechas suministradas en el cuadro resumen deben coincidir con los certificados laborales presentados en la hoja de vida
5. Los contratos que se presentan como certificación laboral se debe anexar acta de inicio o liquidación para determinar las fechas de inicio y terminación reales.
6. No se encuentra el certificado en la hoja de vida de los siguientes resúmenes de experiencia.

Ingeniera Residente interventora	TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA	Analizar y supervisar la ejecución de las acciones impeditas por la Dirección de la Interventoría y acordadas con el contratista.
-------------------------------------	--------------------------------	---

Ingeniera Residente contratista	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, normas técnicas y planos entregados por la entidad contratante
------------------------------------	--	--

7. Anexar diploma de la especialización en Gerencia integral de obras
8. En la carta de compromiso se debe incluir el porcentaje de dedicación según anexo técnico.
9. Ver observaciones en el cuadro resumen.

Sisoma:

1. Anexar diploma de pregrado
2. Anexar diploma de la especialización
3. Firmar hoja de vida en original
4. Anexar certificado copia en original
5. En la carta de compromiso se debe incluir el porcentaje de dedicación según anexo técnico
6. No cumple con la experiencia específica en el cuadro resumen certifica 3.5 años y se requiere 5 años



Ingeniero especialista Geotecnia y pavimentos:

1. Firmar hoja de vida en original
2. Firmar certificado copia en original
3. No cuenta con certificados laborales en la hoja de vida, no se puede corroborar el cuadro resumen de experiencia general y específica.
4. En la carta de compromiso se debe incluir el porcentaje de dedicación según anexo técnico.

Profesional en Gerencia de Proyectos:

1. Firmar hoja de vida en original
2. Anexar acta de grado y diploma de pregrado
3. Anexar acta de grado del posgrado
4. No se encuentran adjuntos los certificados laborales en la hoja de vida
5. El certificado profesional de arquitectura se encuentra vencido
6. No se puede tomar la especialización en gerencia de construcciones por equivalencia en experiencia específica. Ya que esta ya ha sido cuantificada para la aceptación de la hoja de vida del profesional.
7. Se deben anexar al cuadro resumen las actividades y certificados que avalen el tiempo de experiencia general y específica ya que no cumple con el tiempo requerido.
8. En la carta de compromiso se debe incluir el porcentaje de dedicación según anexo técnico.

Agradezco se tomen las medidas correctivas pertinentes para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3



Aguazul, 27 de abril de 2023

SEÑORES:

CAIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S
WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
Representante Legal
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: **Respuesta a oficio OFCAI-VAZ-008 del 25 de abril de 2023**

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez revisada la información suministrada, se solicita realizar las siguientes subsanaciones con el fin de continuar con la revisión y aprobación de la documentación suministrada.

- Maquinaria mínima del proyecto (acuerdo de disponibilidad, hojas de vida de equipos
- Tres (3) Volquetas tipo doble troque de 12 m3 de capacidad cada una.

Se realizó la revisión de la documentación suministrada por parte del contratista de obra, en la cual se identificó la ficha técnica, licencia de tránsito y soat vigente para una volqueta de marca International serie Work Star 7600. Dicha documentación cumple y es avalada para la incorporación al proyecto.

Como se muestra en el anexo técnico se requiere de 3 vehículos por lo cual se debe hacer llegar la documentación de los dos restantes.



- Una (1) Retroexcavadoras sobre orugas de potencia neta de motor de 128 Hp y 0.9 m³ de cucharón

La retro excavadora propuesta no cumple con la potencia requerida la cual es de 128 HP y esta cuenta con 63.9 HP según ficha técnica

Se debe anexar tarjeta de propiedad

- Una (1) Retroexcavadora cargadora sobre llantas con capacidad mínima de 125 HP.

Se debe anexar la ficha técnica del equipo

Cumple con tarjeta de propiedad y hoja de vida del equipo.

Una vez revisada la información recibida se requiere hacer llegar la documentación faltante que se relación a continuación dentro de 1 día hábil, a partir del recibido este comunicado.

b. Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

- Una (1) Terminadora de asfalto con potencia bruta mínima de motor 100 HP o superior, con un ancho estándar de pavimentación mínimo de 10 Pies como mínimo
- Un (1) Vibrocompactador autopropulsado con un peso operativo de 10 toneladas
- Un (1) Compactador neumático autopropulsado mínimo de cuatro llantas por tandem con peso de funcionamiento y presión de inflado variable según necesidad de amasado, de potencia neta de motor de 80 Hp
- Una (1) Retroexcavadoras sobre orugas de potencia neta de motor de 128 Hp y 0.9 m³ de cucharón
- Una (1) Motoniveladora de potencia de motor mayor a 120HP y un ancho de cuchilla mínimo de 3.6 m
- Dos (2) volquetas tipo doble troque de 12 m³ de capacidad cada una

Otros equipos inherentes al trabajo:

- Una (1) Barredora o compresor para soplado y barrido 100 p.s.i
- Un (1) Carro tanque irrigador de asfalto con capacidad de 10000 Kg
- Un (1) Carro tanque para agua con capacidad de 15000 Kg
- Un (1) Compactador manual vibratorio (Rana), potencia de motor 8HP, profundidad de compactación 200 a 300 milímetros, fuerza de impacto mínima 1 520 kilogramos



917

PROYECTOS

- Un (1) Apisonador manual potencia de motor 3HP, fuerza de impacto mínima 1.325 kilogramos tipo rana y tipo canguro
- Una (1) Mezcladora de concreto con una capacidad mínima de 20 metros cúbicos por día. Podrá utilizarse Mezcladoras de concreto con capacidad de 2 bultos; Motor de combustión de 8 HP o 1800 RPM.

Agradezco se tomen las medidas correctivas pertinentes para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

988



Aguazul, 25 de mayo de 2023

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

25 MAY 2023

Hora: 16:22 h m c a p i e

Nº de Radicación: 05345

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: *Entrega de documentos requeridos para el inicio del contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre del 2022.*

En relación al proyecto cuyo objeto es: "TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". Se verifico y avalo la información suministrada por el contratista de obra CAIRO CONSTRUCTORES SAS.

A continuación, se relaciona la información radicada.

1. Programación de obra. Flujo de caja
2. Listado de APU del proyecto para cada uno de los items
3. Plan para el manejo y la correcta inversión del anticipo
4. Hojas de vida del personal del contrato

- Director
- Ingeniero Residente
- Profesional Sisoma
- Ingeniero Especialista Geotecnia y Pavimentos
- Profesional en Gerencia de Proyectos

5. Maquinaria mínima del proyecto (acuerdo de disponibilidad, hojas de vida de equipos
6. Plan de manejo de tránsito



7. Presentación programa y presupuesto PAGA
8. Programa de gerencia de proyectos
9. Plan de calidad del proyecto
10. Documentación laboratorio de suelos certificados de calidad y calibración de equipos
11. Comisión topográfica Certificación de equipos y hojas de vida del personal

Se hace entrega a la supervisión para su verificación y aprobación final.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Folios: 480
Carpetas: 3



990
PROYECTOS

Yopal, 31 de mayo de 2023

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADM. AUT. DEPENDENCIA

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

31 MAY 2023
HORA 4:37 pm
Firma de Radm. - 05615 -
Firma de Radm. - 05615 -

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURIA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega de APU de ítems no previstos e informe de interventoría del contrato N° 2653 del 30 de diciembre de 2022. Para modificatoria # 1

Mediante el presente oficio esta interventoría realiza la entrega de los APU de ítems no previstos correspondientes a la modificatoria # 1 al contrato de obra N° 2653 del 30 de diciembre de 2022, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Atentamente,

IVON MAYER Y FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

16 Folios.

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA MES DE MAYO 2023

[illegible]

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA MES DE MAYO 2023

[illegible]

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 República de Colombia Casanare
--	--	---

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4. INFORME TÉCNICO

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	---

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1	26-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023
--------------------------------------	---

4. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo transcurrido entre el 28 de Abril de 2023 y el 31 de Mayo de 2023, se describen las actividades ejecutadas por la interventoría en cuanto al desarrollo del contrato No. 0487 de 2023 firmado entre la Gobernación de Casanare y la empresa A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

En el presente periodo se ha llevado a cabo el seguimiento a las actividades constructivas por parte de la interventoría del proyecto "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE".

En vista que el contrato de obra se dio inicio el día 28 de abril de 2023, y no se han adelantado actividades por parte del contratista de obra en este mes, debido a que antes iniciar la ejecución de obra, se debe contactar los comités laborales del área de influencia del proyecto, por tal motivo en el presente informe solo se relacionan las actividades pre constructivas adelantadas por la interventoría para el contrato de Obra, donde se incluye la revisión a todos los documentos que a la fecha, complementan, modifican, aclaran, interpretan el respectivo Contrato de Obra.

Para la elaboración del presente documento, esta interventoría pone a disposición el equipo de profesionales, recursos físicos adecuados y suficientes para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control al proyecto aprobado dentro de las obligaciones a cargo del contratista, en virtud del Contrato de Obra.

Por tal motivo se hace entrega de la revisión de las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los documentos y verificaciones en campo para el inicio de la ejecución de los trabajos en pro de dar cumplimiento a las actividades contractuales concernientes a la etapa de construcción, donde se adelantan las siguientes revisiones por lo cual se detalla las acciones adelantadas en cada una de las siguientes actividades:

- 1.1 Revisión y verificación en campo de los diseños
- 1.2 Cumplimiento requerimientos ambientales
- 1.3 Revisión predial
- 1.4 Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos
- 1.5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales

 PROYECTOS	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1	28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023
--------------------------------------	---

1.1 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS DISEÑOS:

La interventoría en pro de verificar que los estudios y diseños entregados con el proyecto de obra aprobado, con el fin de informar si cumplen o no con la normatividad vigente y con los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra, a partir de la información suministrada por la Gobernación de Casanare sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato, antes de suscribir el Acta de Iniciación de la obra, donde anexo a este documento se entrega los respectivos soportes de informe según como se identifica el presupuesto.

En el documento anexo se revisan los documentos que conforman los estudios y diseños de acuerdo al alcance del objeto del proyecto

Se establece la revisión sistemática de los estudios y diseños de la vía, donde se evalúa las condiciones actuales del terreno en el que se pretende a mejorar la ruta de acceso hacia la vereda la Turua, del municipio de aguazul, comparando la topografía presentada en el proyecto, frente al levantamiento topográfico actualmente encontrado en el sitio, y se evalúan las cantidades de material real requerido que permitan definir las cantidades de obra y los sobre acarreos que son items significativos dentro del presupuesto de obra.

Se validaron los aspectos del diseño para asegurar que los tramos viales estén dentro de los rangos aceptables para su construcción y así poder de cumplir y satisfacer las condiciones de uso previstas para este tipo de obra.

Se realizó el levantamiento topográfico en terreno con (Estación Total, GPS, Nivel de precisión) donde se realizó nivelación y contra nivelación y se comprobó los alineamientos

Se verifican los diseños del mejoramiento a nivel de pavimento para la vía de acceso hacia la vereda la Turua, del municipio de aguazul para evidenciar si cumple los requisitos aceptables en la norma Invias, se identifican problemas y se proponen acciones necesarias, se desarrollan estas revisiones con los profesionales de interventoría idóneos donde se evalúan y analizan los ensayos de materiales de las fuentes presentadas en el proyecto.

De acuerdo a la revisión y análisis de la información existente, y de las actividades adelantadas por la interventoría, con base en el levantamiento topográfico, estudio de suelos, revisión del geométrico y diseño estructural de las vías del proyecto; Me permito informarle a la Gobernación de Casanare las revisiones hechas en pro de dar cumplimiento a las actividades contractuales concernientes a la etapa de pre constructiva, donde se informa que no se requieren ajustes al diseño en base a los lineamientos de la vía encontrada actualmente, pero si se requiere realizar mejoras en la estructura de soporte de la vía ya que se evidencian fallos los cuales deben ser mejorados para así brindar las densidades y demás características requeridas por el proyecto.

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

Adicionalmente se requiere de la implementación de ítems no previstos los cuales fueron evidenciados en el informe pre constructivo debido a los hallazgos encontrados en obra. Una vez avalados estos no previstos se requiere de modificar el presupuesto de obra, con el fin de incluir estas nuevas actividades y dar prioridad al cumplimiento de la meta física del proyecto

No obstante estas cantidades que no queden incluidas dentro de esta modificatoria, se presentaran para su aprobación como cantidades para un adicional de obra y así cumplir con el 100% de lo establecido inicialmente.

1.2 CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.

Se realizó la revisión de las actividades ambientales para verificar el contenido de requerimientos de acuerdo con lo estipulado en el Componente Ambiental del Proyecto, tendientes a propiciar que las obras, se ejecuten de conformidad a la normatividad ambiental vigente, para el proyecto "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE".

De acuerdo a la revisión y análisis de la información existente, y de las actividades adelantadas por la interventoría, con base en la verificación de los requisitos ambientales para el contrato de obra de objeto me permito informar que no se requirió adelantar ningún tipo de trámite ante Corporinoquia.

1.3 REVISIÓN PREDIAL.

La interventoría certifica que los dos tramos a intervenir no tienen ningún impedimento o restricción de ninguna clase para adelantar la ejecución del proyecto en mención, también se verifico en campo donde se evidencio la delimitación de en cada uno de los sectores donde se ejecutara el "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Los predios colindantes están cercados con postes y alambre de púas y se deja la salvedad que se va a realizar el mejoramiento de una vía ya existente y con delimitaciones, el trayecto a intervenir cuenta con un derecho de via empradizado de esta forma se evitaran inconvenientes con los propietarios vecinos de la vía y en aras de contribuir con la evolución del proyecto cuando este inicie.

Al igual se cita textualmente la certificación emitida por la oficina de Planeación Municipal de Aguazul que dice "Que para la ejecución del proyecto "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE", no se requieren compra de terrenos, ya que las vías a intervenir son bienes de uso público administrados por la Alcaldía Municipal de Aguazul. " Nota se anexa Certificación

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 GOBIERNO DEPARTAMENTAL Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

Debido a que se verifico mediante el levantamiento topográfico los lineamientos del trazado del diseño de la vía y no se apreciaron variantes considerables respecto a lo existente en el terreno, esta interventoría y quienes aquí firman, certifican que el proyecto no va a afectar predios privados aledaños a la vía en el proceso de ejecución de la construcción de la vía presentado en los diseños.

1.4 PERMISOS Y/O DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Una vez revisados los documentos del proyecto "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE" no se evidencia ninguna certificación expedida por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Aguazul, informando que para el presente proyecto no se expidió ningún documento donde certifica que los tramos a intervenir, pasan líneas de acueducto, alcantarillado, gas natural y energía, por lo tanto hechas las verificaciones en campo se pudo constatar que en los costados derecho e izquierdo cuentan con redes de acueducto y red de gas, los cuales se encuentran a poca profundidad y en algunos sectores instalados bajo la cuneta de concreto. Estas redes fueron identificadas por esta interventoría y se le informara al contratista de obra para que se tomen las medidas pertinentes para evitar afectación a la línea de acueducto y gas respectivamente.

Se verifica que las redes de energía pasan por fuera del área a intervenir de la vía y no interfieren con la construcción de la obra.

Se deja constancia que para la "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE". No se requiere la Utilización de servicios públicos para su ejecución. No se requiere reposición de redes en el área ocupada por el proyecto a intervenir.

1.5 PERMISOS Y/O DISPONIBILIDAD FUENTES DE MATERIALES

Se realiza la verificación y análisis de las fuentes de materiales, con respectivo esquema de localización referenciando las distancias de acarreo al centro de gravedad de la obra y garantía de suministro del material por lo que para "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE", se tuvo en cuenta en el proyecto una fuentes de materiales a la cual se le realizo la respectiva verificación de los permisos por parte de las autoridades ambientales y se verifica la siguiente información.

Las FUEENTES DE MATERIAL más próximas al proyecto, se indican entonces en este capítulo, los nombres y localizaciones de las posibles fuentes de suministro de materiales constructivos para la ejecución del proyecto, la descripción del tipo de material allí existente y los resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestras obtenidas en el campo durante el desarrollo de otros proyectos y consultorías cercanos a esta zona en vista de la proximidad de los ríos y la posibilidad de utilización de su material de arrastre.

1. FUENTE RÍO CUSIANA “CANTERA TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS ”.

Esta fuente de materiales se encuentra localizada aguas abajo de la carretera Aguazul-Monterrey sobre el río Cusiana a unos 12,5 km. aproximadamente del Municipio de Tauramena, dista del centro de gravedad del proyecto a 6,3 km. El acceso al sitio de exploración se realiza saliendo a la marginal de la selva pasa el puente del río Cusiana y sigue por la marginal de la selva hasta ingresar por la margen derecha hacia el proyecto en cuestión.

Figura 1. Localización General – CANTERA TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS



Fuente: Google maps

DESCRIPCIÓN.

La playa de exploración está conformada por depósitos aluviales recientes contruidos en un 80% de gravas y un 20% de una matriz arenosa de grano medio a grueso. Las gravas son de forma sub-redondeada a redondeadas con diámetros desde 10 mm hasta 30 cm. y alguno que otro canto de gran tamaño hasta de 1.0 m de diámetro. Los materiales presentan diferente composición entre areniscas cuarzosas hasta encontrar fragmentos de cuarzo bastante retrabajados.

998

 <p>PROYECTOS</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	 <p>Gobernación de Casanare</p>
<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1</p>		<p>28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023</p>

<p>EXPLORACIÓN.</p> <p>Se realizó una inspección directa visual por parte de los consultores, y de especialistas en geología y pavimentos, así como del área ambiental. La exploración de campo consistió en la inspección visual del material, funcionamiento y disponibilidad de material, así como de recopilación de diferentes caracterizaciones en laboratorio del material.</p> <p>PERMISOS Y LICENCIAS</p> <p>La empresa TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS, cuenta con el contrato de Concesión (20803) y Registro Minero DSM-1057 del 04 de Octubre de 2006, para un área de 340 Ha aproximadamente, cuenta con una autorización de explotación minera, equivalente a un máximo de 200.000 m3/año de material otorgado por INGEOMINAS (hoy Agencia Nacional Minera), igualmente cuenta con Licencia Ambiental otorgada por CORPORINOQUÍA a través de la Resolución No. 500.41.13-0070 del 31 de enero de 2013 por un tiempo igual al título minero (30 años).</p> <p>DISTANCIA AL PROYECTO</p> <p>Vía Pavimentada: 5.104 km Vía Sin Pavimentar: 1,196 km</p> <p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>Para la fase constructiva del proyecto "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE", se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar los materiales provenientes del área de aprovechamiento sobre el río Cusiana, en las fuentes de material CANTERA TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS, por su calidad, facilidad de explotación y economía, de acuerdo con los usos recomendados (estudio de caracterización), así como la corta distancia y estado de vías de transporte, ya que facilita el oportuno despacho de material al proyecto. • La fuente de materiales analizadas en el presente estudio, cumplen con los criterios de calidad de materiales, localización geoespacial, volúmenes de disponibilidad, además de contar con la totalidad de los permisos por parte de la Autoridad Nacional Minera (ANM) y las respectivas autorizaciones de tipo Ambiental otorgadas por CORPORINOQUÍA. • Para efectos de programación presupuestal, se tomará la distancia de transporte existente desde la fuente de materiales descrita anteriormente.
--

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1	28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023
--------------------------------------	---

En virtud de los argumentos expuestos anteriormente, amparados bajo los criterios técnicos de la interventoría, determina que no se requirieron hacer ajustes al diseño de la "TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"; Por lo que, de requerirse hacerlos se contara con el aval técnico de los ingenieros diseñadores del proyecto.

4.2 INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES

Se identifica en campo fallos en la subrasante evidenciados sobre la vía, lo cual requiere de un mejoramiento en crudo de río para su estabilización. Debido a esto y a los múltiples hallazgos evidenciados en el informe pre constructivo se vio la necesidad de realizar una modificatoria al presupuesto de obra, con el fin de priorizar los recursos existentes y así garantizar la ejecución de la meta física del proyecto.

PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO MES: Teniendo en cuenta la programación de obra entregada por el contratista de obra, se tiene destinado para el mes de junio iniciar con la instalación de sub base y demoliciones de cuneta para proceder con los trabajos de excavación.

PROYECTOS		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 1								
		PERIODO DE EJECUCIÓN: 23 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023								
8.10 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO										
Item	Descripción	CONDICIONES NACIONALES			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE PERIODO		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		% AVANCE	
		Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	CANTIDAD	VALOR	VALOR		
4.A	Tacha reflectiva	und	2703.00	\$13.136.24	\$36.907.206.72	\$	-	\$	0.00%	
5.	TRANSPORTE				\$20.129.336.73		\$0.00	\$0.00	0.00%	
5.01	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	ML-KM	8426.42	\$1.912.44	\$16.132.234.82	\$	-	\$	0.00%	
5.02	Transporte de material Pétreo (vía desdopada)	MD-KM	1976.94	\$2.022.17	\$3.997.162.11	\$	-	\$	0.00%	
8.	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE				\$1.161.326.02		\$1.161.326.02	\$1.161.326.02	0.12%	
8.01	Exoneración mecánica con retiro y disposición final	m3	60.44	\$23.923.91	\$1.161.326.02	\$	60.44	\$	1.161.326.02	0.12%
			Costo directo		\$	803.112.181.20	\$	1.161.326.02	0.12%	
Nota: Los porcentajes que se muestran en la última columna, corresponde al porcentaje de cada ítem con relación al valor total del contrato de obra.										
					SUBTOTAL OBRAS		\$893.112.181.20			
					SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)		\$893.112.181.20			
					IMPLEMENTACIÓN PAGA		\$ 8.926.693.60			0.94%
					PMT		\$ 16.829.484.40			1.67%
					CARACTERIZACIÓN VIAL		\$ 917.072.06			0.67%
					VALOR TOTAL		\$ 24.532.546.02			
							2.80%			



INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.4.3. GRÁFICO AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

PORCENTAJE PARCIAL DE AVANCE CONTRATO DE OBRA No 2653 DE 2022


■ CONTRATADO ■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO

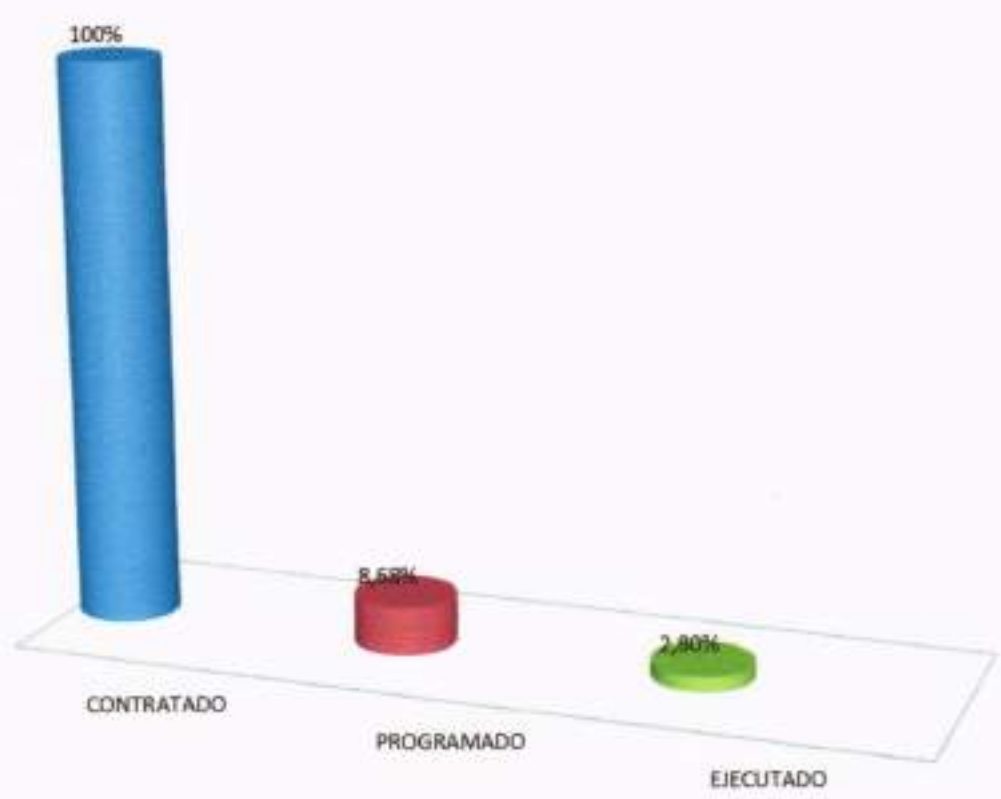

4.4.4. GRÁFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO EN EL PERIODO

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL POR ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS

■ EJECUTADO ■ CONTRATADO ■ PROGRAMADO



PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL POR ACTIVIDAD ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

■ EJECUTADO ■ CONTRATADO ■ PROGRAMADO





INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1

28-abril-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL POR ACTIVIDAD OBRAS DE DRENAJE

■ ELECUTADO ■ CONTRATADO ■ PROGRAMADO

3.8	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	0,00%	100,00%
3.7	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	0,00%	100,00%
3.6	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	0,00%	100,00%
3.5	Relleno de excavación (con material local)	0,00%	100,00%
3.4	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	0,00%	100,00%
3.3	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm ² - 2000 Psi	0,00%	100,00%
3.2	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	0,00%	100,00%
3.1	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	0,00%	100,00%


PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL POR ACTIVIDAD OBRAS DE URBANISMO

■ ELECUTADO ■ CONTRATADO ■ PROGRAMADO

4.4	Tacha reflectiva	0,00%	100,00%
4.3	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	0,00%	100,00%
4.2	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	0,00%	100,00%
4.1	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	0,00%	100,00%


PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL POR ACTIVIDAD TRANSPORTES

■ EJECUTADO
 ■ CONTRATADO
 ■ PROGRAMADO



PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL POR ACTIVIDAD RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE

■ EJECUTADO
 ■ CONTRATADO
 ■ PROGRAMADO





PROYECTOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN
DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE
ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

PROGRAMADO VS EJECUTADO CONT DE OBRA 2653 DE 2022

— PROGRAMADO — EJECUTADO — Lineal (EJECUTADO)

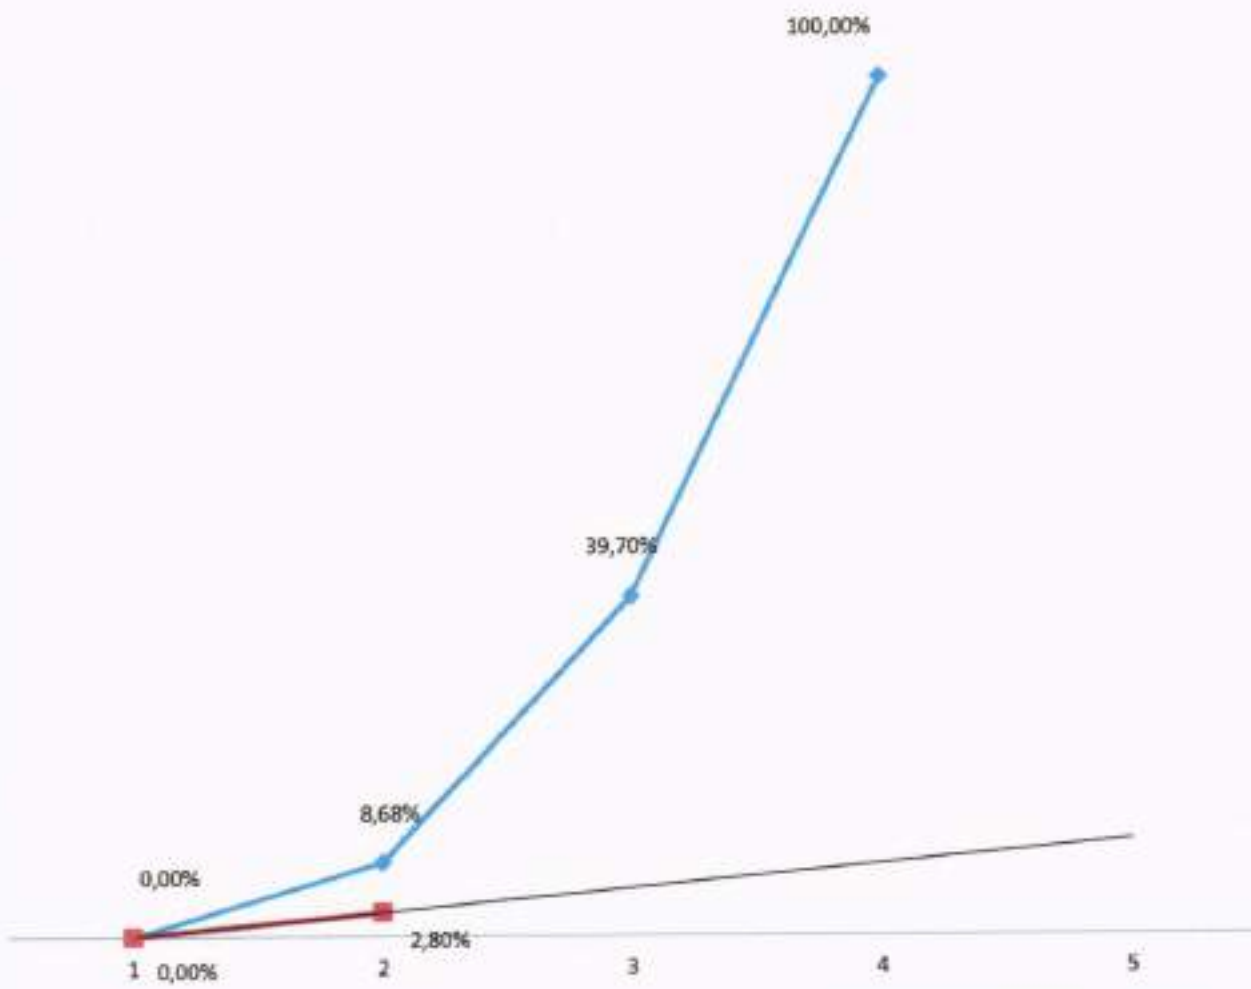

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.4.5 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 2653 DE 30/12/2022

Resumen financiero

Valor del contrato	\$	946.540.231,20
Valor del anticipo del 50%	\$	473.270.115,60
Valor ejecutado a la fecha	\$	26.503.126,47
% ejecutado		2,80%
Valor Facturado a la fecha	\$	-
Valor Amortizado	\$	-
Valor por Facturar	\$	946.540.231,20
Valor por Amortizar	\$	473.270.115,60

CONTRATO DE CONSULTORÍA . 0487 DE 08/2/23

Resumen financiero

Valor del contrato	\$	87.217.113,00
Valor del anticipo	\$	-
Valor ejecutado a la fecha	\$	65.412.834,75
% ejecutado		75,00%
Valor cobrado a la fecha	\$	-
% Cobrado		0,00%
Valor por Facturar	\$	87.217.113,00
Valor por Amortizar	\$	-

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación del Casanare
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1		28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023
4.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN		

TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO AL NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA- MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE			
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	
		ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1.	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1,1	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	INV ART 220-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
2.	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
2,1	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	INV ART 230-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
2,2	Sub base granular triturada	INV ART 320-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
2,3	Base granular (INV. 330. 1)	INV ART 330-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
2,4	Imprimación con emulsión asfáltica	INV ART 420-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
2,5	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	INV ART 450-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
3.	OBRAS DE DRENAJE		
3,1	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	INV ART 630-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
3,2	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	INV ART 640-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

3,3	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm ² - 2000 Psi	INV ART 630-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
3,4	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	INV ART 320-22,1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
3,5	Relleno de excavación (con material local)	INV ART 320-22,2P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
3,6	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	PART 001	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
3,7	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	PART 002	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
3,8	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	PART 003	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
4.	OBRAS DE URBANISMO		
4,1	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	1521-E GM.C - 2016-V2-INV	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
4,2	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	INV ART 710-22.1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
4,3	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	1521-E GM.C - 2016-V2-INV	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
4,4	Tacha reflectiva	INV ART 701-22.1P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	---

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

5.	TRANSPORTE		
5.01	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	PART 004	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
5.02	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	PART 005	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
6.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE		
6.01	Excavación mecánica con retiro y disposición final	INV ART 220-22.2P	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
7	NO PREVISTOS		
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	Especificacion Tecnica Particular del Proyecto	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
NP-02	Roceria con retiro	Especificacion Tecnica Particular del Proyecto	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	Especificacion Tecnica Particular del Proyecto	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfáltico (inc. Retiro)	Especificacion Tecnica Particular del Proyecto	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	Especificacion Tecnica Particular del Proyecto	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
NP-06	Desmante y limpieza (incluye retiro)	Especificacion Tecnica Particular del Proyecto	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	Especificacion Tecnica Particular del Proyecto	Remitir a Especificacion Tecnica Particular del Proyecto

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.7 EVALUACIÓN INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MGA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	UNIDAD
1	Vía terciaria mejorada	1,834	Km

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.8 ANEXOS

1. BITÁCORA CON FIRMAS

CONFUJO de Obra 2653/2022

OBJETO

Terminación del Mejoramiento a nivel
de pavimento de la vía de acceso a la
vivienda rural - municipio de apazaco
Departamento del Cesar

Firmas Autorizadas

Director Interventor

Asistente Interventor

Carlos Andrés Fonseca
Carlos A. Fonseca

Director Obra

Ing. Alfredo Restrepo V.




Asistente Obra

viernes, 28 de abril de 2023

Actividades

Se firmó el Acta de inauguración de obra en
los instalaciones de la granja de la
comunidad

Presencia: Director de obra, presidente de obra, ingeniero



Carlos A. Fonseca

Sábado, 29 de abril de 2023

Actividades

Trabajos de observación para el libro
del desarrollo de obra.

Presencia: Director de obra, presidente de obra



Carlos A. Fonseca

Domingo, 30 de abril de 2023

Actividades

Día festivo no se labora



Carlos A. Fonseca

Lunes, 1 de Mayo de 2023

Actividades


Día festivo no se labora

Montes, 2 de Mayo de 2023

Actividades

Se dialoga con la presidencia de la Junta de acción comunal de la Unidad Turun, pero presentamos como lo empresa contrainstituto de obio del proyecto y por sujeción reglas de vida del personal así como de bienes y servicios respectivos por parte del inicio a las actividades, haber manifestado que no permite el inicio de las actividades de la obio, ni sesión de acuerdo con el inicio de la movilización de Mapiripán ni el ingreso de personal así como tampoco nos permite tener acceso a la información de posibles vinculaciones de personal de mano de obra no calificado de la región, hasta tanto la entidad contratante no realice la socialización, por lo anterior se informa a la interventoría mediante oficio OFCAI-VA2 del 2 de Mayo de 2023.

Resolvi: Director de obio, Red de obio



Carlos A. Fonseca

Manizales, 3 de Mayo de 2023

Actividades

Labores administrativos para inclusión de contrato.

Resolvi: Director de obio, Red de obio



Carlos A. Fonseca

Jueves, 4 de Mayo de 2023

Actividades

Trabaja administrativos para iniciación del contrato

Personas: Director de obra, Residente de obra




Carlos A. Fonseca

Viernes, 5 de Mayo de 2023

Actividades

Realización del proyecto en la vereda Tona con presencia y representación por parte del Comités de obra el arquitecto William como director R/L y el ingeniero Alberto como Residente de obra, por parte de la intervención la ingeniera Ivon Mayeta como director R/L y por parte de la intervención de obras la ingeniera Brenda Rosalva Balleza, la ingeniera Lya Pérez y

Personas: Director de obra, Residente de obra



Carlos A. Fonseca


Sábado 6 de Mayo de 2023

Actividades

Reunión con la presencia de la Junta de acción comunal de la vereda Tona, con el fin de cumplir el proceso de bienes y servicios que serán requeridos a la comunidad

en la revisión de documentación el día 05 de Mayo de 2023 como son el diseño básico - ejecutivo, vinculación de personas no calificadas, Servicio de restaurante y Servicio de prospectado y vigilancia.

Presencia: director de obra, asistente de obra




Carlos A. Fonseca

Domingo, 7 de Mayo de 2023

Actividades

Visita de obra por parte de la intervención el ingeniero Carlos Andrés Fonseca residente y por parte de obra el arquitecto William Colino Delgado, R/L y el ingeniero Alfredo Restrepo Valero director, para realizar un recorrido por todo la vía, para visualizar y poder hacer el ajuste al balance de Mayores y menores cantidades de obra con los ítems no previstos respondidos en obra.

Presencia: director de obra, residente de obra



Carlos A. Fonseca

Lunes, 8 de Mayo de 2023

Actividades

Se inicia labores con la comisión topográfica a lo largo de toda la vía por parte del comitente de obra para poder realizar la verificación del diseño geométrico de vías presentados inicialmente a la intervención.

- Se inicio el diligenciamiento de los actos de veracidad con el acompañamiento de la interventora.
- Se realizaron algunas solicitudes por la interventora, de acuerdo al recorrido efectuado el día 07 de Mayo de 2023 para la verificación de la estructura existente.

Clima: Nuevo Material desde 07:00 a las 11:00

y en la tarde desde las 14:00 a las 17:00

Equipo: Nivel de precisión y estación

Responsables de obra, residente de obra



Carlos A. Fonseca

Martes, 9 de Mayo de 2023

Actividades

- De acuerdo al recorrido del día 07 de Mayo de 2023 se realizó el balance de obra con el fin de conocer el valor real del contrato.

- La comisión topográfica realizó la verificación del diseño geométrico de la vía presentada inicialmente a la interventora

Clima: Nuevo Material y parte de obra
todo el día

Responsables de obra, residente de obra



Carlos A. Fonseca

Miércoles, 10 de Mayo de 2023

Actividades:

- Se continuó con labores administrativas con el acompañamiento de la intervención realizando el balance de obra con el fin de conocer el valor real del contrato.
- La comisión topográfica realizó la verificación de diseño geométrico de la vía, teniendo como base la topografía realizada por la intervención, se suspenden actividades inicia a horas a partir de las 10:30 hasta 16:20
- Presupuesto de obra, estado de obra

Carlos A. Pineda

Jueves, 11 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continuó con labores administrativas con el acompañamiento de la intervención realizando el balance de obra con el fin de conocer el valor real del contrato.
- La comisión topográfica continuó realizando labores administrativas verificando el diseño geométrico de la vía, teniendo como base la topografía realizada por la intervención
- Presupuesto de obra, estado de obra

Carlos A. Pineda

Viernes, 12 de Mayo de 2023

Actividades:

Se realizó recorrido de obra a lo largo de todo
 la vía por parte de la subcomisión de cesante
 la ingeniero Liza Pérez, por parte de la interventor
 el ingeniero Alexander Peña apoyo a la interventor,
 el ingeniero Alex y sus profesores de apoyo a la
 interventor y por parte del cartógrafo de obra
 el ingeniero Alfredo Estigarribia Director de obra y el
 ingeniero Jhonny Alvarado profesores de apoyo
 para revisar en campo todas la actividades
 realizadas y para verificar para saber
 mediante el balance de obra si está mal del
 contrato.

Revisar: director de obra, residente de obra



Carlos A. Fonseca

• Sabado, 13 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continúa con el diligenciamiento de
 los datos de vecindad con el acompañamiento
 de la interventor
- la comisión topográfica continúa realizando
 labores administrativas verificando y registrando
 el diseño geométrico de la vía.

Clima: lluvioso moderado desde las 08:20 hasta
 las 13:40 por tal motivo se suspenden actividades

Revisar: director de obra, residente de obra




Carlos A. Fonseca

Domingo, 14 de Mayo de 2023

Actividades

Día festivo no se labora



Carlos A. Fonseca

Lunes, 15 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continúa con el diligenciamiento de los actos de vecindad con el acompañamiento de la intervención
- la comisión técnica continúa realizando administrativos y operativos ajustando el dicto sumatorio de la UO
- Se realizan actividades administrativas ante el interventor para ajustar el balance de Mayores y menores cantidades de obra repartidos y se presenta ante la UO la UO

Clima: soleado

tipos: Estación y nivel de presión



Carlos A. Fonseca

Marzo, 16 de Mayo de 2023

Actividades:

- Se continúa con el diligenciamiento de los datos de veriedad con el acompañamiento de la intervención.
- La comisión topográfica continúa realizando labores administrativas y operativas ajustando el diseño geométrico de la vía.
- Se continúa con las actividades administrativas entre ellas el interimiento para ajustar el balance de Muebles y muebles contenidos de obra reparados y en presente ante la entidad contratante.

Como: nuevos modelos en la materia

Equipos Estación y nivel de precisión



Carlos A. Fonseca

Marzo, 17 de Mayo de 2023


Actividades:

- La comisión topográfica continúa realizando labores administrativas y operativas ajustando el diseño geométrico de la vía.
- Se continúa con el diligenciamiento de los datos de veriedad con el acompañamiento de la intervención.

- Se continúan labores administrativas entre otros - inventario para ajustes - balances de Mayores y menores contables de obra repavida, para ser presentados ante la entidad constituyente para la revisión y aprobación.

Clima: Se presentaron lluvias en varias ocasiones y hubo un día nublado.

tipos: festivo y nivel de presencia.



Carlos A. Fonseca,

Jueves, 18 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica continúa realizando labores administrativos y operativos ajustando el diseño geográfico de la vía.
- Se continúa con el diligenciamiento de los actos de verificación con el comportamiento de la intervención.
- Se continúan labores administrativas entre otros - inventario para ajustes - balances de Mayores y menores contables de obra repavida, para ser presentados ante la entidad constituyente para la revisión y aprobación.

Clima: Soleado

tipos: festivo y nivel de presencia



Carlos A. Fonseca


Viernes, 19 de Mayo de 2023

Actividades:

- la comisión topográfica continúa realizando labores administrativas y operativas ajustando el diseño geométrico de la vía.
- Se continuó con el diligenciamiento de los actos de veracidad con el acompañamiento de la intercomunal.
- Se realizan labores administrativas entre ellas el intercomunal para ajustar el diseño de Mapas y planos controlados de obra respectivo, para ser presentados ante la entidad competente para su revisión y aprobación.

Además, se presentan nuevos métodos en la medición

tipos: ~~topografía~~ y nivel de precisión.



Carlos A. Fonseca

Sábado, 20 de Mayo de 2023

Actividades

- la comisión topográfica realiza labores administrativas ajustando el diseño geométrico de la vía.
- Se realizan labores administrativas entre ellas el intercomunal para ajustar el

balance de Mayas y Mayas contables de
obra respondiendo, para ser presentado ante
la entidad contratante para su revisión y
aprobación.

cl.mv: se presentan partes nuevas todo
lo moñono

topografía: revisar y nueva de presentar



Carlos A. Forseca

- Domingo, 21 de Mayo de 2023

Actividades

Día festivo no se labora



Carlos A. Forseca

- Lunes, 22 de Mayo de 2023

Actividades

- la comisión topográfica inicia actividades
en obra ubicando los ejes o el grupo de
obra y abarcando lo no

- Se continúa con el diligenciamiento de
los actos de veracidad con el acompañamiento
de la interventoría.

- Se realizan labores administrativas
entre mantenimiento de obra e interventoría

para ajustar el balance de Mayores y menores contributos de obra repando, para su presentación ante la entidad contratante para su revisión y aprobación.

Clima: lluvias moderadas en la mañana

Equipos: Estación y nivel de precisión



Carlos A. Pinseca


Montes, 23 de Mayo de 2023

Actividades

- La comisión topográfica continúa con actividades de observación y ubicación de ejes o trabajos de todo el día.
- Se presenta a la Supervisión del contrato el balance de obra ajustando mayores y menores contributos y contemplando los ítems no previstos repando en obra para su revisión y aprobación.
- Se continúa con el diligenciamiento de los actos de verificación con el acompañamiento de la intervención.

Clima: Soleado todo el día

Equipos: Estación y nivel de precisión.



Carlos A. Pinseca

Miércoles, 23 de Mayo de 2023

Actividades:

- la comisión topográfica continúa con las actividades de observación y ubicación de egos a lo largo de toda la vía.
- Se continúa con el diligenciamiento de los actas de reunión con el acompañamiento de la interventoría.

Clima: Soleado todo el día

Equipos: Baterías y niveles de precisión



Carlos A. Fonseca

Jueves, 23 de Mayo de 2023

Actividades

- la comisión topográfica continúa con las actividades de observación y ubicación de egos a lo largo de toda la vía.
- Se continúa con el diligenciamiento de los actas de reunión con el acompañamiento de la interventoría

Clima: Soleado todo el día

Equipos: Baterías y niveles de precisión



Carlos A. Fonseca


Viernes, 16 de Mayo de 2023

Actividades:

- la comisión Topografía continúa con las actividades de observación y ubicación del eje a lo largo de la vía.
- Se continúa con el diligenciamiento de los actos de unidad con el acompañamiento de la intervención.
- la supervisión de contrato realiza la entrega de equipos de trabajo de Maestros y mano de obra con algunos cambios para sus salarios y pagar de término al balance con la entidad contratante.

Clima: lluvias moderadas en la zona

Equipos: Estación y nivel de precisión



Carlos A. Pineda


Sábado, 27 de Mayo de 2023

Actividades

- la comisión Topografía realiza actividades de observación y ubicación del eje a lo largo de la vía.
- Se continúa con el diligenciamiento de los actos de unidad con el acompañamiento de la intervención.

- Se realizan las comisiones solicitadas por parte de la Supervisión de control al balance de vapores y menores actividades con el acompañamiento de la intervención.

clima: soleado de 07:00 a 07:50, luego empieza a llover fuerte y se suspenden actividades
Equipos: estación y mira de precisión



Carlos A. Fonseca

Domingo, 28 de Mayo de 2023

Actividades:

Día festivo no se labora.




Carlos A. Fonseca

Lunes, 29 de Mayo de 2023

Actividades:

- Se inició con la excavación mecánica de la zona de la vía donde se encuentra sombreado por la excavación de este hueco donde se obtiene PR14730 al PR14680 y se estabilizado con material clasificado Tom. Mx. 3".
- la comisión Topografía realiza el control de los excavaciones y continúa haciendo actividades de observación de vía
- Excavación mecánica con tipo de vía de PR14730 al PR14680
clima: soleado - 7:00 a 7:30, luego la noche anterior fueron soleados en la vía

tipos: estacion y nivel de precisión
motomovidos, vibracompartidos y
retroexcavadora




Carlos A. Fonseca

Martes, 30 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continuó con la excavación manual de la zona de la vía donde se encuentran sacos por la excavación de agua nueva desde la obelisco PR17680 al PR17640 y es estabilizado con material (asfalto) TM. 3".
- la comisión topográfica realizó el control de las excavaciones y trabajos realizados actuales de ubicación de obeliscos de vía.
- Excavación manual por la zona de la vía desde el PR17680 al PR17640 (límite: sacos - 700 m de, luego la zona anterior y presente futuro sacos en la vía
tipos: estacion y nivel de precisión
motomovidos, vibracompartidos y
retroexcavadora



Carlos A. Fonseca

Martes, 31 de Mayo de 2023

Actividades

- Se continuó con la excavación manual de la zona de la vía donde se encuentran sacos por la excavación de agua nueva desde


se observa PR1460 al PR1500 y se estabiliza con motor (usando Tam. M. 3")

- la motoniveladora realiza el palear y mover de su lugar de la vía excavada y se compacta por el vibrador

- la Comisión Topográfica continúa realizando los cortes de volúmenes de excavación.

- Excavación Manual con el uso del PR1460 al PR1500
Clima: Se realizan actividades después de las 10:00 am debido a que llueve todo el tiempo anterior y al tenerlo en la vía se encuentra saturado.

Tipos: excavación y nivel de pavación, motoniveladora, vibrador compactador y retroexcavadora.



Carlos A. Fonseca

Juárez, 1 de junio de 2023

Actividades:

- Se continúa con la excavación manual de la zona de la vía donde se encuentra saturado por la saturación de agua lluvia desde el PR1450 al PR1520 y se estabiliza con motor (usando Tam. M. 3")
- la motoniveladora realiza el palear y mover de su lugar de la vía excavada y se compacta por el vibrador
- Excavación Manual con el uso del PR1460 al PR1520
- la Comisión Topográfica continúa realizando los cortes de volúmenes de excavación.

 PROYECTOS	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.8 ANEXOS

**2.PRUEBAS DE LABORATORIO EN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA ,
(DEBIDAMENTE FIRMADAS CON NOMBRE Y FIRMA LEGIBLE DE LABORATORISTA),
SEGÚN EL CASO**

PROYECTO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUIAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE				
EMPRESA:	CAPRO CONSTRUCCIONES SAS	LOCALIZACIÓN:	TAURAMENA CASANARE	FECHA:	28-abr-23
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR BG-3B			CODIGO:	CP-BG-001
IDENTIFICACION:	CP-TURUA-BG-001			MUESTRA:	001
CANTERA:	TIETURADOS Y ASFALTOS SAS RIO CUSIANA			ENSAYO:	1

LIMITES DE CONSISTENCIA

Límite Líquido de los Suelos I.N.V. E-126-13

ENSAYO	1	2	3
N° Golpes	0	0	0
Tara N°	—	N/A	—
Tara+Suelo Humedo (gr.)	—	—	—
Tara + Suelo Seco (gr.)	—	—	—
Peso Tara (gr.)	—	—	—
N. Humedad	NP	NP	NP

Índice Plástico e Índice Plástico de Suave L.M.V.E-125

ENSAYO	1	2	NATURAL
Tara N°	0	0	0
Tara+Suelo Húmedo (gr.)	13485	13485	13485
Tara + Suelo Seco (gr.)	12980,0	12980,0	12980,0
Peso Tara (gr.)	405,30	405,30	405,30
% Humedad	NP	NP	4,02

Límite Líquido	9,00
Límite Plástico	8,00
Índice de Plasticidad	0,00




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE GRUÉOS Y FINOS I.N.V. E-213-13

Peso seco antes de lavar g		12574,7	Peso seco después de lavar g			11956,0		
TAMIZ		PESO	PORCENTAJE			ESPECIFICACION ART 326, TABLA 330,1 90-95		TOLERANCIA FORMULA DE TRABAJO
PULGADA	mm	RETENIDO	RETENIDO	RET. ACUM.	PASA			
3"	76.2	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	
2 1/2"	63.50	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	
2"	50.80	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	
1 1/2"	38.10	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	
1"	25.40	1346.5	9.9	9.9	90.1	70.0	100.0	
3/4"	19.05	1624.3	12.9	22.8	77.2	60.0	90.0	
3/8"	9.53	7644.3	23.4	46.2	53.8	45.0	75.0	
No. 4	4.75	1165.4	9.4	55.7	44.3	30.0	60.0	
No. 10	2.00	823.0	6.5	62.2	37.8	20.0	45.0	
No. 40	0.42	1532.5	12.2	74.4	25.6	10.0	30.0	
No. 200	0.074	2600.0	20.7	95.1	4.9	5.0	15.0	
P/200	P/0.074	618.7	4.9	100.0	0.0			

CLASSIFICATION

Gravas	55,7	%	Índice de Grupo	0	Cu	79,88	Humedad Natural	4,0
Arenas	39,4	%	A.A.S.H.T.O.	A-1-a	Cc	0,51		
Fines	4,9	%	U.S.C.S.	GP	D60	12,07		
					D30	0,95		
					D10	0,16		

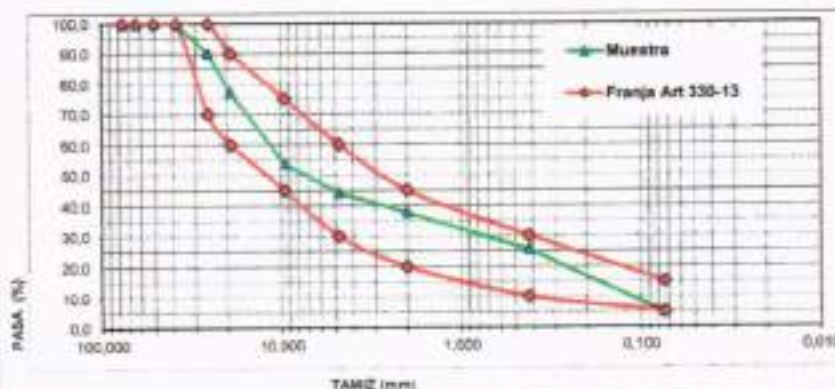

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADREGADOS SEGÚN SU REQUISITO

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	NORMA INVE	REQUISITO		RESULTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
LÍMITE LÍQUIDO	%	125	25%		0%	CUMPLE
ÍNDICE DE PLASTICIDAD	%	120	3%		0%	CUMPLE
GRANULOMETRÍA	N° TÁMICES QUE SE SALEN DE LA NORMA	213	CURVA UNIFORME * PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA		0	CUMPLE
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	mm	213	10 DEL ESPESOR DE LA CAPA	60.00	36.1	CUMPLE
Relación tamiz No. 200 / Tamiz No. 425	%	213	≤ 20	0.67	0.19	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Gustavo R.


Revisado: Jose Ibarra

 IBARRA INGENIERIA <small>y LABORATORIO S.A.S.</small> <small>TEL: 301.000.837</small>	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S. GESTIÓN OPERATIVA	Código: FT-GO-09
	RELACION DE HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION)	Version 01
	INV E - 142 -13	Fecha de Emisión - 18/09/2017

PROYECTO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE		
EMPRESA:	CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS	LOCALIZACIÓN:	TAURAMENA CASANARE
DESCRIPCIÓN:	BASE GRANULAR BG-08	FECHA:	28-abr-23
IDENTIFICACIÓN:	CP-TURUA-BG-001	CÓDIGO:	CP-BG-001
FUENTE:	TRITURADOS Y ASFALTOS SAS RIO CUSIANA	MUESTRA:	001
METODO:	C - PROCTOR MODIFICADO	N° CAPAS:	5
MARTILLO:	MANUAL	ALTURA DE CAIDA:	18"
		ENERGIA APROX:	2700 KJ/m ³

ENSAYO	1	2	3	4
Peso molde + muestra	7323	7543	7754	7600
Peso molde	2886,1	2886,1	2886,1	2886,1
Peso muestra húmeda	4437	4657	4868	4714
Volumen del molde (cm ³)	2104,9	2104,9	2104,9	2104,9
Densidad húmeda (gr/cm ³)	2,108	2,212	2,313	2,239
Contenido de Humedad				
Peso suelo seco + tara (P1)	296,98	346,37	326,56	428,49
Peso suelo se + tara (P2)	286,50	330,30	308,30	397,10
Peso tara (P3)	42,70	43,40	39,80	32,10
Humedad (%)	4,3	5,6	6,8	6,8
Densidad seca (gr/cm ³)	2,021	2,095	2,165	2,062
Peso Unitario Seco (KN/m ³)	19,82	20,55	21,24	20,22
Humedad de Saturación (%)	11,18	9,43	7,88	10,19

ENSAYO DE COMPACTACIÓN

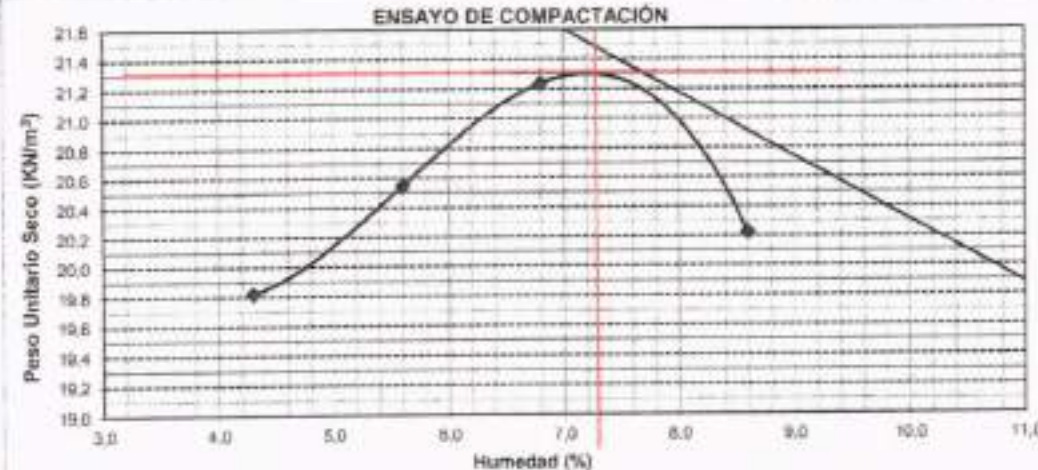

The graph plots Dry Unit Weight (KN/m³) on the y-axis (ranging from 19.0 to 21.8) against Moisture Content (%) on the x-axis (ranging from 3.0 to 11.0). A smooth curve is drawn through the data points, peaking at approximately 21.3 KN/m³ at 7.3% moisture content. A vertical red line marks the peak, and a horizontal red line indicates the maximum dry unit weight.

Densidad seca Maxima (gr/cm ³) 2,159 Peso Unitario Seco Max (lb/ft ³) 134,8 Peso Unitario Seco Max (KN/m ³) 21,30 Gravedad Especifica (3/4") 2,547	Humedad óptima de compactación % 7,3 Fracción Gruesa (%) 22,8 Fracción Fina (%) 77,2 Dens. seca Maxima Corregida (gr/cm ³) 2,228
---	---

Observaciones: _____


 Realizo: Gustavo R.


 Reviso: Jose Ibarra

1037

 I BARRA INGENIERÍA <small>S. LABORATORIO S.A.S</small> <small>NIT. 901.032.937-3</small>	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTION OPERATIVA	Codigo: FT-GO-13
	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS	Version 01
	INV E - 133 -13	Fecha de Emision - 18/09/2017

PROYECTO :	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE		
EMPRESA :	CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS	LOCALIZACION :	TAURAMENA CASANARE
DESCRIPCION :	BASE GRANULAR BG-38	FECHA:	28-abr.-23
IDENTIFICACION:	CP-TURUA-BG-001	CODIGO:	CP-BG-001
FUENTE :	TRITURADOS Y ASFALTOS SAS RIO CUSIANA	MUESTRA Nº :	001
		ENSAYO:	1

ENSAYO Nº	1	2	3	
ESTADO DE LA MUESTRA:	SECO AIRE	SECO AIRE	SECO AIRE	
Lectura de Arcilla mm (A)	142,0	142,0	140,0	
Lectura de Arena mm (B)	60,0	65,0	63,0	
Diferencia (C)	82,0	77,0	77,0	
Equivalente de arena (D)	43	46	45	45
Equivalente de arena promedio % (E)	44,7			
ESPECIFICACION (INV Art.330-13) % >=	30			
CRITERIO DE ACEPTACION	CUMPLE			

$$EQ. Arena. \% = \frac{B}{A} \times 100$$

OBSERVACIONES:

LECTURA DE ARCILLA A 20 MINUTOS - METODO DE AGITACION MANUAL


 Realizo: Gustavo R.


 Reviso: Jose Ibarra



TRABRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA

Codigo: FT-GO-10

ENSAJO DE CLASIFICACION DE AGREGADOS
INV E - 313 / INV E - 125-13 / INV E - 126 - 13

Version: 031

Fecha de Emisión - 18/09/2017

PROYECTO:

TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

EMERGENCY:

CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS

LOCALIZACIÓN: AGUAZUL, CASANARE

FECHA: 28-09-23

DESCRIPCIÓN

SUBBASE GRANULAR SBG-50

CODIGO: CP-583-002

IDENTIFICACION:

CP-TURKIA-SBG-002

MUESTRA: 00

CANTERA 7

TRITURADOS Y ASFALTOS SAS RIO CUBIANA

ENSAÏDO

LIMITES DE CONSISTENCIA

Límite Líquido de los Suelos I.N.V. E-123-13

ENSAYO	1	2	3
N° Golpes			
Tara N°			
Tara+Suelo Humedo (gr.)	—	—	—
Tara + Suelo Seco (gr.)	—	—	—
Peso Tara (gr.)	—	—	—
% Humedad	NP	NP	NP

Limite Plástico e Índice Plástico de Suelo L.M.V.E-126

ENSAYO	1	2	NATURAL
Tara N°			G6
Tara+Guano Humedo (gr.)			15035
Tara + Guano Seco (gr.)			14500
Peso Tara (gr.)			375,3
% Humedad	NP	NP	0.92

Límite Líquido	0,00
Límite Plástico	0,00
Índice de Plasticidad	0,00




ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE GRUPOS Y FINOS I.N.V. E-213-12

Peso seco antes de lavar g		14024,7	Peso seco después de lavar g			13900,0		
TAMIZ		PESO	PORCENTAJE			ESPECIFICACION		TOLERANCIA FORMULA DE TRABAJO
PULGADA	mm		RETENIDO	RET. ACUM.	PASA	AST 305, TABLA 320.1 880-66		
3"	75,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	
2 1/2"	63,50	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	
2"	50,80	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	
1 1/2"	38,10	1736,0	12,0	12,0	88,0	70	95	
1"	25,40	3348,0	23,9	35,0	65,0	60	80	
1/2"	12,50	2962,0	20,4	55,4	44,6	45	75	
3/8"	9,53	651,0	4,5	59,9	40,1	40	70	
No. 4	4,75	1079,0	7,4	67,3	32,7	25	55	
No. 10	2,00	845,0	5,9	73,1	26,9	15	40	
No. 40	0,42	1278,0	8,8	81,8	18,1	6	25	
No. 200	0,074	1700,0	11,7	93,6	6,4	2	15	
P200	P0,074	924,7	6,4	100,0	0,0			

CLASSIFICATION

Gravas	87,3	%	Indice de Grupo	8	Cu	122,80	Humedad Natural	0,32
Arenas	26,3	%	A.A.S.H.T.O.	A-1-s	Cc	3,86		
Fines	6,4	%	U.S.C.S.	GP GM	D60	22,30		
					D30	3,48		
					D10	0,18		

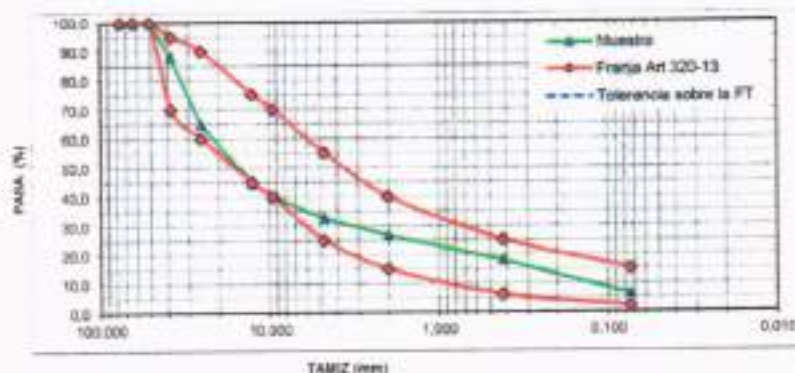

CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS SEGÚN SU REQUISITO

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	NORMA INVE	REQUISITO		RESULTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
LÍMITE LÍQUIDO	%	125	25%		0%	CUMPLE
LÍMITE PLÁSTICO	%	120	5%		0%	CUMPLE
GRANULOMETRÍA	Nº TAMESES QUE SE SALIEN DE LA NORMA	213	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA		0	CUMPLE
TAMANO MÁXIMO NOMINAL	mm	213	Nº 10 DEL ESPESOR DE LA CAPA	66.67	38.1	CUMPLE
Relación tamiz No. 200 / Tamiz No. 40	%	213	≤ 33	0.67	0.35	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Realiza: Gustavo R.

Revisor: Juan Ibarra



IBARRA
INGENIERIA
Y LABORATORIO S.A.S.
NIT 901.032.857-2

IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S GESTION OPERATIVA
RELACION DE HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION)
INV E - 142 -13

Código: FT-GO-09

Version 01

Fecha de Emisión - 18/09/2017

PROYECTO: TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

EMPRESA: CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS LOCALIZACION: AGUAZUL CASANARE

DESCRIPCION: SUBBASE GRANULAR S8G-50

FECHA: 28-mar-23

IDENTIFICACION: CP-TURUA-S8G-002

CODIGO: CP-S8G-002

FUENTE: TRITURADOS Y ASFALTOS SAS RIO CUSIANA

MUESTRA: 002

ENSAYO N°: 1

METODO: C - PROCTOR MODIFICADO

N° CAPAS: 5


MARTILLO: 10 Libras

MARTILLO: MANUAL

ALTURA DE CAIDA: 18"

ENERGIA APROX: 2700 KJ/m²

ENSAYO	1	2	3	4
Peso molde + muestra	7345	7599	7682	7600
Peso molde	2871,0	2871,0	2871,0	2871,0
Peso muestra húmeda	4474	4728	4811	4729
Volumen del molde (cm ³)	2105,0	2105,0	2105,0	2105,0
Densidad húmeda (gr/cm ³)	2,125	2,246	2,286	2,247
Contenido de Humedad				
Peso suelo seco + tara (P1)	263,70	298,85	156,13	232,27
Peso suelo Húmedo + tara (P2)	257,00	286,00	148,70	216,10
Peso tara (P3)	42,70	43,60	42,50	32,30
Humedad (%)	3,1	5,3	7,0	8,8
Densidad seca (gr/cm ³)	2,081	2,133	2,136	2,085
Peso Unitario Seco (KN/m ³)	20,21	20,92	20,95	20,25
Humedad de Saturación (%)	9,70	8,07	8,00	9,61

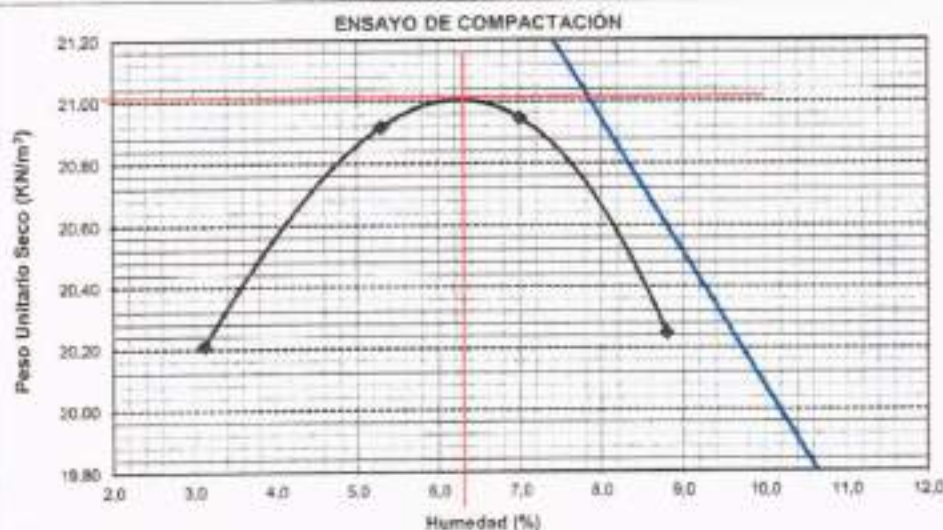

Densidad seca Maxima (gr/cm ³)	2,130	Humedad óptima de compactación %	6,3
Peso Unitario Seco Max (lb/ft ³)	132,9	Fracción Gruesa (%)	45,1
Peso Unitario Seco Max (KN/m ³)	21,01	Fracción Fina (%)	54,9
Gravedad Especifica (3/4")	2,560	Dens. seca Maxima Corregida (gr/cm ³)	2,285

Observaciones

JOSE IBARRA
Realizo: Gustavo R.

Revisó: Jose Ibarra

1040

 BARRA INGENIERÍA & LABORATORIO S.A.S. <small>Medición - Control de Calidad - Análisis de Suelos - Asesoría</small> NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTION OPERATIVA	Código: FT-GO-13
	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS	Version 01
	INV E - 133 -13	Fecha de Emisión - 18/09/2017

PROYECTO :	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE		
EMPRESA :	CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS	LOCALIZACION :	AGUAZUL CASANARE
DESCRIPCION :	SUBBASE GRANULAR SBG-50		FECHA: 28-abr-23
IDENTIFICACION:	CP-TURUA-SBG-002	CODIGO:	CP-SBG-002
FUENTE :	TRITURADOS Y ASFALTOS SAS RIO CUSIANA		MUESTRA N° : 002
		ENSAYO:	1

ENSAYO N°	1	2	3	
ESTADO DE LA MUESTRA:	SECO AIRE	SECO AIRE	SECO AIRE	
Lectura de Arcilla mm (A)	143,0	145,0	147,0	
Lectura de Arena mm (B)	70,0	70,0	72,0	
Diferencia (C)	73,0	75,0	75,0	
Equivalente de arena (D)	49	49	49	49
Equivalente de arena promedio % (E)	49,0			
ESPECIFICACION (INV Art.320-13) % >=	25			
CRITERIO DE ACEPTACION	CUMPLE			

$$EQ. Arena. \% = \frac{B}{A} \times 100$$

OBSERVACIONES: LECTURA DE ARCILLA A 20 MINUTOS - METODO DE AGITACION MANUAL


Realizo: Gustavo R.


Reviso: Jose Ibarra

 PROYECTOS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Gobernación de Casanare
--	--	--

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.8 ANEXOS

4. GRÁFICO DE DISTANCIA DE ACARREO DE MATERIAL PÉTREO DESDE LA FUENTE HASTA EL CENTRO DE GRAVEDAD DE PROYECTO, INDICANDO LAS DISTANCIAS EN PAVIMENTO Y SIN PAVIMENTO.



Fuente: Google Maps

Distancia entre planta trituradora y centro de gravedad de obra: 5.3 Km

 <p>PROYECTOS</p>	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	
---	---	---

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

4.8 ANEXOS

5. PLANOS GENERALES CON DETALLES DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL ACTA, DETALLES (PLANTA, PERFIL, CORTES, SECCIONES, ACOTADOS, A ESCALA) AVALADOS POR LA INTERVENTORÍA

En el presente informe no se anexan planos



INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO
A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1

26-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

5. FINANCIERO - CONTABLE



PROYECTOS

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

5. 1 balance financiero del proyecto

CONTRATO DE OBRA 2653 DE 2022

CONCEPTO	VR CONTRATADO	VR ACTAS	VR GIROS Y/O PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 946.540.231,20		
VALOR ANTICIPO 50%	\$ 473.270.115,60		
VALOR ADICIONAL			
VALOR ANTICIPO ADICIONAL			
VALOR PAGADO (PARCIAL) No 1			
ANTICIPO AMORT ACTA PARCIAL No 1			
VALOR EJECUTADO (PARCIAL) No 2			
ANTICIPO AMORT ACTA PARCIAL No 2			
VALOR GIRADO (PARCIALES)			
VALOR POR FACTURAR		\$ 946.540.231,20	
VALOR PENDIENTE DE AMORTIZAR			
SUMAS IGUALES	\$ 946.540.231,20	\$ 946.540.231,20	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA 0487 DE 2023

CONCEPTO	VR CONTRATADO	VR ACTAS	VR GIROS Y/O PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 87.217.113,00		
VALOR ANTICIPO			
VALOR ADICIONAL			
VALOR ANTICIPO ADICIONAL			
VALOR EJECUTADO (PARCIAL 1) AJUSTADO AL PESO			
VALOR GIRADO (PARCIAL No 1)			
VALOR EJECUTADO (PARCIAL 2) AJUSTADO AL PESO			
VALOR GIRADO (PARCIAL No 2)			
VALOR POR FACTURAR		\$ 87.217.113,00	
VALOR PENDIENTE DE GIRO			
SUMAS IGUALES	\$ 87.217.113,00	\$ 87.217.113,00	\$ -



INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN
DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE
ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA # 1

28-abr-viernes de 2023 a 31-may-miércoles de 2023

REGISTROS FOTOGRAFICOS

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 1



Texto explicativo de la fotografía. Socialización del proyecto a la comunidad.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 2



Texto explicativo de la fotografia. Socialización del proyecto a la comunidad.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 3



Texto explicativo de la fotografía. Instalación de puntos de referencia, levantamiento topográfico de interventoría.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 4



Texto explicativo de la fotografía. levantamiento topográfico de interventoría.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 5



Texto explicativo de la fotografía. Levantamiento actas de vecindad.

1012

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 6



Texto explicativo de la fotografia. Levantamiento topográfico por parte del contratista.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 7



Texto explicativo de la fotografía. Ubicación de puntos de amarre sobre la vía "Marginal de la selva"

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	9487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 6



Texto explicativo de la fotografía. Ubicación de puntos de amarre sobre la vía "Marginal de la selva"

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 9



Texto explicativo de la fotografia. Instalación de valla informativa

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 10



Texto explicativo de la fotografía. Excavación mecánica en PR 001+450 al PR 001+720.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0487 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 11



Texto explicativo de la fotografía. Excavación manual para el manejo de aguas lluvias.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FRF001
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-01-01

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LA TURUA - AGUAZUL - CASANARE
CONTRATISTA:	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CONTRATO No:	0497 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	MAYO DE 2023

FOTOGRAFÍA 12

