


		ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.2		Código: FO-GD-02-018 Versión: 28 Fecha de Modificación: 05/02/2026	
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		FECHA ACTA:	
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013		LP-SI-003-2025		Número Radicado Interno del Contrato: 08092025-1475	
Número de identificación del contratista - NIT		901979885-1		No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	
CONTRATISTA		CONSORCIO JE 2025 - CONFORMADO POR JULIO CESAR SALGADO GALEANO (90%) Y ELATIN SAS (10%)			
CONTRATO CEDIDO A:		N/A			
CODIGO VIA		N/A		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica		4290		Tipo de Contrato	
Objeto del Contrato:		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO.			
Valor del Contrato		Valor Adición		Valor Anticipo	
\$ 1.495.946.503		N/A		\$ 291.189.133	
APORTANTES		%		VALOR	
Aporte Departamento:		100%		\$ 1.495.946.503	
Aporte Convenio No				PÚBLICA	
Aporte Convenio No				Duración Contrato:	
				Fecha de Inicio	
				29 de septiembre de 2025	
				Fecha de Terminación de ejecución	
				30 de abril de 2026	
				Prórroga No. 1	
				4 meses	
Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
FE3	4500028745	1	\$ 473.947.951	\$ 94.789.590	\$ 379.158.361
			FONDO	CEN GEST	POS PRE
			6-FMN0381	16INF	23201010010302
			A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP	
			C240231455302AAA	INF-P-250082.01.02	
VALOR ACTA			\$ 473.947.951	\$ 94.789.590	\$ 379.158.361

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato	\$	1.495.946.503	Valor del Anticipo:	\$	291.189.133
Adición del Contrato			Amortización Acta 1	\$	78.589.995
Valor Acta Nro. 1	\$	382.949.873	Amortización Acta 2	\$	94.789.590
Valor Acta Nro. 2	\$	473.947.951	Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 3			Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 4			Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 5			Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 6			Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 7			Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 8			Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 9			Saldo por Amortizar:	\$	119.809.548
Saldo del Contrato:	\$	639.048.579	SUMAS IGUALES	\$	291.189.133
SUMAS IGUALES	\$	1.495.946.503		\$	291.189.133


OBSERVACIÓN: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, LA CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1º ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente," y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde sea involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social).

Firma
Nombre:


JHON RICARDO GUTIERREZ CARDONA
 Ordenador del gasto

Firma
Nombre:


JUAN DAVID DUCUE PEDRAZA
 Supervisor (a)

Firma
Nombre:


CONSORCIO GINPRO INV 199/22
 Interventor (a) - (SI APLICA)

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO JE2025
NIT 901.979.885-1
Carrera 24 N 2008
Tel: 3148473816
Manizales - Colombia
consorcioje2025@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3

Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS		
NIT	890.801.052-1	Teléfono	(312) 6426369 - Ext. 000
Dirección	CL 23 22 45	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 08:33
Expedición	25/02/2026, 08:34
Vencimiento	10/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO ACTA DE OBRA N° 2 SEGUN CONTRATO 08092025-1475	1.00	353,692,501.00
2	ADMINISTRACION (29%)	1.00	102,570,825.00
3	UTILIDAD (5%)	1.00	17,684,625.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatrocientos setenta y tres millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-10 por

\$ 473,947,951.00

Observaciones:

ACTA DE OBRA N° 2 SEGUN CONTRATO 08092025-1475, OBJETO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA, LOTE 2-ATENCION PUNTO CRITICO.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 0860-6999-6865 BANCO DAVIVIENDA.

Total Bruto	473,947,951.00
Total a Pagar	473,947,951.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100211526 aprobado en 20251015 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 734f6c73233b15c765243a9d7e1ac27e5619cc6ad977d063c05594e2e2e69d3f85529579227af45f46cb1fa54e81427d2

Elaborante Software y Proveedor tecnológico: Singo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre: Singo Nisha. Firma electrónica: ver en el XML



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 26/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO JE 2025** con NIT **901.979.885-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

086069996865

Cordialmente,


BANCO DAVIVIENDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 75.071.082
SALGADO GALEANO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1972
MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-JUL-1991 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSELMO TORRES




A-6900100-00907087-M-0075071082-00091231 0019524/56A-1 4480524212



CONSORCIO JE 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. 08092025-1475 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO".

Yo, Julio Cesar Salgado Galeano, identificado con cedula de ciudadanía No. 75.071.082 de Manizales, en calidad de representante legal del CONSORCIO JE 2025 identificado con Nit. 901.979.885-1, en cumplimiento de lo previsto en el marco del contrato No. 08092025-1475, suscrito con la Gobernación de Caldas, certifico que las obras se ejecutan en el Municipio de Villamaría (Caldas).

La presente certificación se expide el día 25 de febrero de 2026.

Atentamente,

JULIO CESAR SALGADO GALEANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JE 2025



Manizales, 25 de febrero de 2026.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002:

CERTIFICO:

Que el Consorcio JE 2025

Nit 901.979.885

Ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en aportes a Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Caja de compensación Familiar, Sena en los últimos seis meses.

Atentamente,

Adriana Lucía Alzate L
Contadora Pública
TP 71358-T
Cel 3108216668

Julio Cesar Salgado Galeano
C.C 75.071.082
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **30.338.836**

NOMBRES: **ALZATE LARGO**

APELLIDOS: **ADRIANA LUGIA**

FIRMA: *[Signature]*





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **07-ABR-1976**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **MANIZALES (CALDAS)**

ESTATURA: **1.60**
 G.S. RH: **O+**
 SEXO: **F**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: **31-OCT-1994 MANIZALES**

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL RANCIEZ TORRES



A-0900100-00068282-F-0030338836-20080910

0003194257A 1

4490008230

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

71358-T

ADRIANA LUCIA
ALZATE LARGO
C.C. 30338836
RESOLUCION INSCRIPCION 55
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 12/05/2000

Presidente *[Signature]* 80722

C. C. 30338836

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

03033836

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agudecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

030338836

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9507607455A0085


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA LUCIA ALZATE LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30338836 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 71358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141238059970



(415)7707212489984(8020) 000014123805997 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 7 9 8 8 5 1

Impuestos y Aduanas de Manizales

1 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO JE 2025

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caldas

40. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

41. Dirección principal

CR 24 20 08 OF 309

42. Correo electrónico

consorcioje2025@gmail.com

43. Código postal 1 7 0 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 4 8 4 7 3 8 1 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

Otras actividades

1

2

51. Código

52. Número

establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 5 0 8 2 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238059970



(415)7707212489984(8020) 000014123805997 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 7 9 8 8 5 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico

1 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de Identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de Identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238059970



(415)7707212489984(8020) 000014123805997 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 7 9 8 8 5 1

Impuestos y Aduanas de Manizales

1 0

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 6 2 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 5 0 7 1 0 8 2
102. DV	1	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SALGADO	105. Segundo apellido GALEANO	106. Primer nombre JULIO
107. Otros nombres CESAR	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 6 2 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 8 5 1 1 6 5 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TRUJILLO	105. Segundo apellido POTES	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres DAVID	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238059970



(415)7707212489984(8020) 000014123805997 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 7 9 8 8 5 | 1

Impuestos y Aduanas de Manizales

0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 5 0 7 1 0 8 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido SALGADO	116. Segundo apellido GALEANO	117. Primer nombre JULIO	118. Otros nombres CESAR	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 5 0 6 2 8	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 2 4 9 4 4	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social ELATIN S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 5 0 6 2 8	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

 GOBIERNO DE CALDAS		ACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 08092025-1475 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 08092025-1475	
Secretaría : Fecha acta		INFRAESTRUCTURA 25/02/2026	
Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra		08092025-1475	Acto Administrativo: N/A
No. Pedido en SAP:		4500028745	
NIT o RUT:		901979885-1	
Contratista:		CONSORCIO JE 2025 - CONFORMADO POR JULIO CESAR SALGADO GALEANO (90%) Y ELATIN SAS (10%)	
Representante Legal:		JULIO CESAR SALGADO GALEANO	
Valor del Contrato (\$):		\$ 1.495.946.503,00	Aporte Departamento: \$ 0,00
Valor Adición		\$ 0,00	Aporte otras entidades: \$ 1.495.946.503,00
Objeto del contrato		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO.	
Disponibilidad presupuestal		3500045900	FONDO
Duración del contrato (Plazo):		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Fecha de iniciación		29 de septiembre de 2025	Fecha de terminación: jueves, 30 de abril de 2026
Supervisor Departamento		JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
1		210.1.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3		\$ 22.996	
2		210.2.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3		\$ 46.464	
3			220.1P	TERRAPLENES COMPACTADOS CON AFIRMADO	m3		\$ 209.328	
4		330.3.2		BASE GRANULAR CLASE C	m3		\$ 184.472	
5		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3		\$ 111.715	
6		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		\$ 76.789	
7			621.1.2P	EXCAVACION PARA PILOTES (DIAMETRO 40CM)	m3		\$ 284.001	
8		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3		\$ 752.195	
9		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3		\$ 863.842	
10		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg		\$ 7.906	
11		311.1		AFIRMADO	m3		\$ 202.080	
12		663.1		TUBERIA DE PLASTICO TIPO _____, NORMA _____, DE DIAMETRO INTERNO _____ mm (Analizado para tubería de plástico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	m		\$ 1.340.000	
13			663.1P	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC 4"	m		\$ 30.399	
14		673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2		\$ 7.634	
15		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3		\$ 146.553	
16			642.2.1P	SELLO PARA JUNTAS EN PVC	m		\$ 67.438	
17		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base delrelleno)	m3		\$ 133.310	
18		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3		\$ 111.715	
19		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		\$ 76.789	
20			112.P	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN SUELO	m3		\$ 172.992	
21			600.2.1P	EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA	m3	74,70	\$ 1.705.851	\$ 127.427.070
22		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	201,5	\$ 863.842	\$ 174.064.163
23		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	21,30	\$ 752.195	\$ 16.021.754
24		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg	19528,3	\$ 7.906	\$ 154.390.740

24		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	19528.3	\$ 7,906	\$ 154,390,740
25		610.4		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-38 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3		\$ 168,428	
26		811.1.1		PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TIPO _____ (Analizado para manto permanente para refuerzo de la vegetación (TRM) y una pendiente	m2		\$ 60,934	
27		674.1		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m		\$ 44,035	
28		900.2.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)	m3-km	1456.00	\$ 1,404	\$ 2,044,224
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 473,947,951.00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 0.00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34% (ADMINISTRACION: 29% - U: 5%)								\$ 0.00

Valor Acta PARCIAL	☒	TOTAL	☐	\$473,947,951.00
Amortización Anticipo				\$94,789,590.00
Valor Ordenación del Gasto:				\$379,158,361.00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		1,495,948,503.00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	382,949,973.00	
Valor Acta No. 2:	473,947,951.00	
Saldo del contrato	639,048,579.00	
Sumas Iguales	1,495,946,503.00	1,495,946,503.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		291,189,133.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	76,589,995.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	94,789,590.00	
Saldo por amortizar:	119,809,548.00	
Sumas Iguales:	291,189,133.00	291,189,133.00

SE HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO JE 2025 representado legalmente por JULIO CESAR SALGADO GALEANO, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002 la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO JE 2025
Contratista

Firma
CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor Externo

Firma
JUA DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor contrato

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORRIENTE VEHICULAR ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILAMARÍA Y OCHOA, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CINTRO.

CONTABILISTA: CONCORDIO J. ZEPES
INTERVENCIÓN EXTERIOR: CONCORDIO GARCÍA RIVERO
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUEÑES PERAZA

Nº	ITEM DE PAJO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRAS CONTRATADAS PARCIAL	
							CANT.	VALOR
1	201.1.1	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN Y CABLES	m2	137.00	\$ 22.006	\$ 3.014.822.00		
2	201.2.1	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN Y CABLES	m2	35.00	\$ 45.000	\$ 1.575.000.00		
3	201.2.2	TERMINALES CONECTADOS CON ATENCIÓN	m2	14.00	\$ 290.328	\$ 4.064.592.00		
4	201.2.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	126.00	\$ 184.472	\$ 23.243.432.00		
5	201.2.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	154.00	\$ 111.725	\$ 17.205.665.00		
6	201.2.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	103.00	\$ 78.786	\$ 8.112.895.80		
7	201.2.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 284.001	\$ 2.840.010.00		
8	201.2.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	8.00	\$ 752.165	\$ 6.017.320.00		
9	201.2.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	18.00	\$ 883.242	\$ 15.898.356.00		
10	201.2.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	9.00	\$ 7.456	\$ 67.104.00		
11	201.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 203.080	\$ 2.030.800.00		
12	201.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	15.00	\$ 1.342.000	\$ 20.130.000.00		
13	201.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	55.00	\$ 36.500	\$ 2.007.500.00		
14	201.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	174.00	\$ 7.004	\$ 1.222.680.00		
15	201.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	23.00	\$ 148.555	\$ 3.416.765.00		
16	201.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	17.00	\$ 81.458	\$ 1.384.686.00		
17	201.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	27.00	\$ 133.710	\$ 3.610.170.00		
18	202.1	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	28.00	\$ 11.715	\$ 328.020.00		
19	202.2	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	187.00	\$ 78.786	\$ 14.733.042.00		
20	202.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	40.00	\$ 172.602	\$ 6.904.080.00		
21	202.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 1.768.411	\$ 17.684.110.00		
22	202.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	260.00	\$ 883.242	\$ 231.843.000.00		
23	202.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	74.00	\$ 752.165	\$ 55.630.470.00		
24	202.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	330.00	\$ 7.004	\$ 2.311.320.00		
25	202.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	43.00	\$ 198.028	\$ 8.517.264.00		
26	202.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	230.00	\$ 80.864	\$ 18.600.320.00		
27	203.1	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	210.00	\$ 44.835	\$ 9.415.350.00		
28	203.2	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	570.00	\$ 1.454	\$ 828.180.00		
VALOR TOTAL INCLUIDO AL ACTA 10 PARCIAL					\$ 1.455.945.810.00	\$ 1.455.945.810.00		

VALOR TOTAL INCLUIDO AL ACTA 10 PARCIAL

VALOR COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

VALOR TOTAL

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

Nº	ITEM DE PAJO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRAS CONTRATADAS PARCIAL	
							CANT.	VALOR
1	201.1.1	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN Y CABLES	m2	137.00	\$ 22.006	\$ 3.014.822.00		
2	201.2.1	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN Y CABLES	m2	35.00	\$ 45.000	\$ 1.575.000.00		
3	201.2.2	TERMINALES CONECTADOS CON ATENCIÓN	m2	14.00	\$ 290.328	\$ 4.064.592.00		
4	201.2.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	126.00	\$ 184.472	\$ 23.243.432.00		
5	201.2.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	154.00	\$ 111.725	\$ 17.205.665.00		
6	201.2.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	103.00	\$ 78.786	\$ 8.112.895.80		
7	201.2.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 284.001	\$ 2.840.010.00		
8	201.2.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	8.00	\$ 752.165	\$ 6.017.320.00		
9	201.2.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	18.00	\$ 883.242	\$ 15.898.356.00		
10	201.2.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	9.00	\$ 7.456	\$ 67.104.00		
11	201.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 203.080	\$ 2.030.800.00		
12	201.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	15.00	\$ 1.342.000	\$ 20.130.000.00		
13	201.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	55.00	\$ 36.500	\$ 2.007.500.00		
14	201.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	174.00	\$ 7.004	\$ 1.222.680.00		
15	201.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	23.00	\$ 148.555	\$ 3.416.765.00		
16	201.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	17.00	\$ 81.458	\$ 1.384.686.00		
17	201.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	27.00	\$ 133.710	\$ 3.610.170.00		
18	202.1	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	28.00	\$ 11.715	\$ 328.020.00		
19	202.2	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	187.00	\$ 78.786	\$ 14.733.042.00		
20	202.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	40.00	\$ 172.602	\$ 6.904.080.00		
21	202.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 1.768.411	\$ 17.684.110.00		
22	202.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	260.00	\$ 883.242	\$ 231.843.000.00		
23	202.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	74.00	\$ 752.165	\$ 55.630.470.00		
24	202.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	330.00	\$ 7.004	\$ 2.311.320.00		
25	202.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	43.00	\$ 198.028	\$ 8.517.264.00		
26	202.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	230.00	\$ 80.864	\$ 18.600.320.00		
27	203.1	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	210.00	\$ 44.835	\$ 9.415.350.00		
28	203.2	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	570.00	\$ 1.454	\$ 828.180.00		
VALOR TOTAL INCLUIDO AL ACTA 10 PARCIAL					\$ 1.455.945.810.00	\$ 1.455.945.810.00		

VALOR TOTAL INCLUIDO AL ACTA 10 PARCIAL

VALOR COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

VALOR TOTAL

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00

Nº	ITEM DE PAJO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRAS CONTRATADAS PARCIAL	
							CANT.	VALOR
1	201.1.1	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN Y CABLES	m2	137.00	\$ 22.006	\$ 3.014.822.00		
2	201.2.1	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN Y CABLES	m2	35.00	\$ 45.000	\$ 1.575.000.00		
3	201.2.2	TERMINALES CONECTADOS CON ATENCIÓN	m2	14.00	\$ 290.328	\$ 4.064.592.00		
4	201.2.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	126.00	\$ 184.472	\$ 23.243.432.00		
5	201.2.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	154.00	\$ 111.725	\$ 17.205.665.00		
6	201.2.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	103.00	\$ 78.786	\$ 8.112.895.80		
7	201.2.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 284.001	\$ 2.840.010.00		
8	201.2.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	8.00	\$ 752.165	\$ 6.017.320.00		
9	201.2.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	18.00	\$ 883.242	\$ 15.898.356.00		
10	201.2.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	9.00	\$ 7.456	\$ 67.104.00		
11	201.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 203.080	\$ 2.030.800.00		
12	201.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	15.00	\$ 1.342.000	\$ 20.130.000.00		
13	201.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	55.00	\$ 36.500	\$ 2.007.500.00		
14	201.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	174.00	\$ 7.004	\$ 1.222.680.00		
15	201.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	23.00	\$ 148.555	\$ 3.416.765.00		
16	201.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	17.00	\$ 81.458	\$ 1.384.686.00		
17	201.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	27.00	\$ 133.710	\$ 3.610.170.00		
18	202.1	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	28.00	\$ 11.715	\$ 328.020.00		
19	202.2	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	187.00	\$ 78.786	\$ 14.733.042.00		
20	202.3	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	40.00	\$ 172.602	\$ 6.904.080.00		
21	202.4	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	10.00	\$ 1.768.411	\$ 17.684.110.00		
22	202.5	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	260.00	\$ 883.242	\$ 231.843.000.00		
23	202.6	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	74.00	\$ 752.165	\$ 55.630.470.00		
24	202.7	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	330.00	\$ 7.004	\$ 2.311.320.00		
25	202.8	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	43.00	\$ 198.028	\$ 8.517.264.00		
26	202.9	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	230.00	\$ 80.864	\$ 18.600.320.00		
27	203.1	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	210.00	\$ 44.835	\$ 9.415.350.00		
28	203.2	TRABAJO DE CABLEADO EN CABLEADO	m2	570.00	\$ 1.454	\$ 828.180.00		
VALOR TOTAL INCLUIDO AL ACTA 10 PARCIAL					\$ 1.455.945.810.00	\$ 1.455.945.810.00		

VALOR TOTAL INCLUIDO AL ACTA 10 PARCIAL

VALOR COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

VALOR TOTAL

\$ 1.455.945.810.00

\$ 1.455.945.810.00



GOBIERNO DE
CALDAS

ACTA NRO. DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 09082025-1475
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 09082025-1475

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA		
Fecha acta	25/02/2026		
Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	09082025-1475	Acto Administrativo:	N/A
No. Pedido en SAP:	4500028745		
NIT o RUT:	901979885-1		
Contratista:	CONSORCIO JE 2025 - CONFORMADO POR JULIO CESAR SALGADO GALEANO (90%) Y ELATIN SAS (10%)		
Representante Legal:	JULIO CESAR SALGADO GALEANO		
Valor del Contrato (\$):	\$ 1.495,946,503.00	Aporte Departamento	\$ 0.00
Valor Adición	\$ 0.00	Aporte otras entidades	\$ 1,495,946,503.00
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO.		
Disponibilidad presupuestal	3500045900	FONDO	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ACTA DE INCIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Fecha de Iniciación	29 de septiembre de 2025	Fecha de terminación	jueves, 30 de abril de 2026
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
1		210.1.1	0	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	0.00
2		210.2.1	0	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	0.00
3			220.1P	TERRAPLENES COMPACTADOS CON AFIRMADO	m3	0.00	0.00
4		330.3.2		BASE GRANULAR CLASE C	m3	0.00	0.00
5		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0.00	0.00
6		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0.00	0.00
7			621.1.2P	EXCAVACION PARA PILOTES (DIAMETRO 40CM)	m3	0.00	0.00
8		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	0.00	0.00
9		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	0.00	0.00
10		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	0.00	0.00
11		311.1		AFIRMADO	m3	0.00	0.00
12		663.1		TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO _____, NORMA _____, DE DIÁMETRO INTERNO _____ mm (Analizado para tubería de plástico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	m	0.00	0.00
13			663.1P	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC 4"	m	0.00	0.00
14		673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	0.00	0.00
15		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	0.00
16			642.2.1P	SELLO PARA JUNTAS EN PVC	m	0.00	0.00
17		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	m3	0.00	0.00
18		600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0.00	0.00
19		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0.00	0.00
20			112.P	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN SUELO	m3	0.00	0.00
21			600.2.1P	EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA	m3	74.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
22		630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	201.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
23		630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	21.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
24		640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	19,528.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

25		610.4		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-38 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	0.00	0.00
26		811.1.1		PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TIPO _____ (Analizado para manto permanente para refuerzo de la vegetación (TRM) y una pendiente de inclinación de talud de relación 3:1 a 2:1)	m2	0.00	0.00
27		674.1		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m	0.00	0.00
28		900.2.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3-km	1,456.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				

Firm

CONSORCIO JE 2025
Contratista

Firma

CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor externo

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

CONSORCIO JE 2025

CONTRATO No. 08092025-1475

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA
CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 -
ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO.**

PERIODO ACTA:

01/12/2025 – 21/01/2026

**MUNICIPIO DE VILLAMARÍA
DEPARTAMENTO DE CALDAS**

CCF-CO0110-4461-2026

Contrato de Interventoría No. 1102 de 2022



Bogotá, 27 de enero de 2026

Señores:

CONSORCIO JE 2025

Atn. JULIO CESAR SALGADO GALEANO

Representante Legal

Carrera 24 No. 20-08 Oficina 309 Manizales

consorcioje2025@gmail.com

Bogotá

Objeto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1102 DE 2022: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA"

Convenio: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1181 DE 2021.

Contrato de Obra: 08092025-1475

Asunto: **AREA TECNICA:** RESPUESTA CJE2025-TEC-061; REMICION ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

Respetuoso saludo.

En virtud de las facultades derivadas del contrato de Interventoría, referentes al seguimiento, control, supervisión y verificación del contrato de obra de la referencia, nos permitimos remitir el acta de recibo parcial de obra No. 2 periodo del 01 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026.

Una vez realizada la respectiva revisión y verificación, se da **VIABILIDAD** por parte de esta interventoría, para la continuidad del proceso correspondiente, anexando toda la información requerida para el trámite del acta No. 2.

Cordialmente,

HELMUT YITZHAK
HERRERA BASTO

Firmado digitalmente por
HELMUT YITZHAK HERRERA
BASTO
Fecha: 2026.01.27 15:42:55 -05'00'

HELMUT YITZHAK HERRERA BASTO

Director de Interventoría

CONSORCIO GINPRO INV 199/22

Anexos: Lo enunciado
Elaboró: EJD – Residente de Interventoría
Revisó: HHB – Director Interventoría
Archivo: Interno de Interventoría.
Copia: Marlon Camilo Ruiz Parra – Supervisor Contrato de Interventoría – Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea.
María Sabina Montana Manrique – Gestor Convenio – Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea.
Ricardo Javier López Quintero: Abogado Grupo Férreo.

CCF-CO0110-4461-2026

Contrato de Interventoría No. 1102 de 2022



Juan David Duque – Gobernación de Caldas Supervisor contrato de obra.



INSTRUMENTOS DE TRÁFICO
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEP-MINI-4-FR-1
VERSIÓN
1
PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS. ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 473,047,951.00 MES 01/12/2025 AL 21/01/2026
ACTA FINAL

CONTRATO No.: 08020205-1475 (Indique número y año)
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO
CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025 (Indique la ruta y tramo del contrato según código via)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1102 DE 2022 INTERVENITOR: CONSORCIO GIMPRO INV 199/22
PLAZO INICIAL: 3 MESES (Exprese según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A) \$ 1,495,945,503.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B) \$ (Indique día/mes/año)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B) \$ 1,495,945,503.00 (Según contrato principal)

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
		ORAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	1	210.1.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	137.00	\$ 22,896	\$ 3,150,452				\$ 3,150,452				
2	1	210.2.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	205.00	\$ 46,464	\$ 9,525,120				\$ 9,525,120				
3	1		220.1P	TERRAPLENES COMPACTADOS CON AFIRMAO	m3	14.00	\$ 209,328	\$ 2,930,592				\$ 2,930,592				
				CAPÍTULO 2. SUPERFICIE DE RODADURA								\$ -				
4	2	330.3.2		BASE GRANULAR CLASE C	m3	125.00	\$ 184,472	\$ 23,059,000				\$ 23,059,000				
				CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE								\$ -				
5	6	600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	154.00	\$ 111,715	\$ 17,204,110				\$ 17,204,110				
6	6	600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	103.00	\$ 76,789	\$ 7,909,267				\$ 7,909,267				
7	6		621.1.2P	EXCAVACION PARA PILOTES (DIAMETRO 40CM)	m3	18.00	\$ 284,001	\$ 5,112,018				\$ 5,112,018				
8	6	630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	91.00	\$ 752,195	\$ 68,449,745				\$ 68,449,745				
9	6	630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 1028 Mpa (Analizado para concreto preliminarizado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	18.00	\$ 863,842	\$ 15,549,156				\$ 15,549,156				
10	4	640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg	9961.00	\$ 7,906	\$ 78,751,666				\$ 78,751,666				
11	2	311.1		AFIRMAO	m3	15.00	\$ 202,080	\$ 3,031,200				\$ 3,031,200				
12	6	663.1		TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO _____ NORMA _____, DE DIÁMETRO _____ mm	m	15.00	\$ 1,340,000	\$ 20,100,000				\$ 20,100,000				
13	6		663.1P	TUBERIA DE PLÁSTICO TIPO PVC 4"	m	65.00	\$ 30,399	\$ 1,975,935				\$ 1,975,935				
14	8	673.1.1		GEOTEXTIL TIPO MT 2500	m2	174.00	\$ 7,634	\$ 1,328,316				\$ 1,328,316				
15	6	673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	23.00	\$ 146,553	\$ 3,370,719				\$ 3,370,719				
16	8		642.1.1P	SELLO PARA JUNTAS EN PVC	m	127.00	\$ 67,438	\$ 8,564,626				\$ 8,564,626				
17	6	610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (Analizado para preparación de la superficie base del relleno)	m3	27.00	\$ 133,310	\$ 3,599,370				\$ 3,599,370				
				CAPÍTULO 4. OBRAS GEOTECNICAS								\$ -				
18	6	600.2.1		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	280.00	\$ 111,715	\$ 31,280,200				\$ 31,280,200				
19	6	600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	187.00	\$ 76,789	\$ 14,359,543				\$ 14,359,543				
20	6		112.P	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN SUELO	m3	48.00	\$ 172,992	\$ 8,303,616				\$ 8,303,616				
21	6		600.2.1P	EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA	m3	192.00	\$ 1,705,851	\$ 327,523,392				\$ 327,523,392			235.70	\$ 402,069,081
22	6	630.1.3.1		TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Analizado para concreto postensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	m3	293.00	\$ 863,842	\$ 253,105,706				\$ 253,105,706			201.5	\$ 174,064,163
23	6	630.1.4.1		TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	74.00	\$ 752,195	\$ 55,662,430				\$ 55,662,430			21.30	\$ 16,021,754
24	4	640.1		ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	kg	33600.00	\$ 7,906	\$ 265,641,600				\$ 265,641,600			19528.3	\$ 224,885,360
25	6	610.4		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SFG-38	m3	413.00	\$ 168,428	\$ 69,560,764				\$ 69,560,764				
26	8	811.1.1		PROTECCIÓN DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TIPO DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	m2	2305.00	\$ 60,934	\$ 140,452,870				\$ 140,452,870				
27	6	674.1			m	210.00	\$ 44,035	\$ 9,247,350				\$ 9,247,350				

PREACTA DE OBRA No. 02		CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO			
CONTRATO No.: 08092025-1475		CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1102 DE 2022		INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22	
No. DE ORDEN 22		FECHA: 21/01/2026	
ESPECIFICACIÓN TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Análizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, consistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)		PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026	
UNIDAD m ³			



DESCRIPCIÓN		MEDIDAS					CANTIDADES				ACUM	REGISTRO FOTOGRAFICO	
		kg	l	A	h	Und	kg	ml	m2	m3	UN		
	Caisson 1		13	0.95						12.35		12.35	
	Caisson 2		13	0.95						12.35		24.70	
	Caisson 3		13	0.95						12.35		37.05	
	Caisson 4		13	0.95						12.35		49.40	
	Caisson 5		13	0.95						12.35		61.75	
	Caisson 6		13	0.95						12.35		74.10	
	Caisson 7		13	0.95						12.35		86.45	
	Caisson 8		13	0.95						12.35		98.80	
	Caisson 9		13	0.95						12.35		111.15	
	Caisson 10		13	0.95						12.35		123.50	
	Caisson 11		13	0.95						12.35		135.85	
	Caisson 12		13	0.95						12.35		148.20	
	Caisson 13		13	0.95						12.35		160.55	
	Caisson 14		13	0.95						12.35		172.90	
	Caisson 15		13	0.95						12.35		185.25	
	Pantalla Módulo 1 - Entre caissons 1-2-3		9	0.30	3	1				0.00		185.25	
	Pantalla Módulo 2 - Entre caissons 4-5-6		9	0.30	3	1				8.10		193.35	
										8.10		201.45	

FIRMA:

 NOMBRE: RICARDO MESA GONZALEZ
 RESIDENTE CONTRATISTA

FIRMA:

 NOMBRE: EDISON JAVIER DIAZ NAVARRO
 RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA DE OBRA No. 02		CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILAMARÍA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO			
CONTRATO No.: 08/09/2025-1475		CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1102 DE 2022		INTERVETOR: CONSORCIO GINPRO INV /99/22	
No. DE ORDEN ESPECIFICACIÓN 23		FECHA: 21/01/2026	
DESCRIPCIÓN ITEM TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Análizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)		PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026	
UNIDAD m3			



DESCRIPCIÓN	kg	L	A	h	Unid	kg	ml	m2	m3	UN	ACUM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Anillos Caisson 1	13.71	0.38							5.21		5.21	
Anillos Caisson 3	11.8	0.38							4.48		9.69	
Anillos Caisson 5	11.48	0.38							4.36		14.05	
Anillos Caisson 7	12.56	0.38							4.77		18.82	
Anillos Caisson 9	11.36	0.38							4.32		23.14	
Anillos Caisson 11	10.48	0.38							3.98		27.12	
Anillos Caisson 13	10.3	0.38							3.91		31.03	
Anillos Caisson 15	13.2	0.38							5.02		36.05	
Anillos Caisson 2	5	0.38							1.90		37.95	
Anillos Caisson 4	2	0.38							0.76		38.71	
Anillos Caisson 6	4.05	0.38							1.54		40.25	
Anillos Caisson 8	4.05	0.38							1.54		41.79	
Anillos Caisson 10	2	0.38							0.76		42.55	
Anillos Caisson 12	5	0.38							1.90		44.45	
Anillos Caisson 14	4.03	0.38							1.53		45.98	
TOTAL CANTIDAD ACTA 01									46.0		46.00	
Anillos Caisson 2	6.75	0.38							2.57		48.55	
Anillos Caisson 4	9.5	0.38							3.61		52.16	
Anillos Caisson 6	7.73	0.38							2.94		55.10	
Anillos Caisson 8	8.1	0.38							3.08		58.18	
Anillos Caisson 10	9.58	0.38							3.64		61.82	
Anillos Caisson 12	5.35	0.38							2.03		63.85	
Anillos Caisson 14	9.12	0.38							3.47		67.32	
TOTAL CANTIDAD ACTA 02									21.3		67.30	

FIRMA:

 NOMBRE: RICARDO MESA GONZÁLEZ
 RESIDENTE CONTRATISTA

FIRMA:

 NOMBRE: EDISON JAVIER DÍAZ NAVARRO
 RESIDENTE INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA DE OBRA No. 02

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHIRCHINA, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO

CONTRATO No.:

08092025-1475

CONTRATISTA:

CONSORCIO JE 2025

FECHA:

21/01/2026

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:

1102 DE 2022

INTERVENCIÓN:

CONSORCIO GINPRO INV 199/22

PERIODO:

01/12/2025 AL 21/01/2026

No. DE ORDEN

24

ESPECIFICACIÓN

640.1

DESCRIPCIÓN ITEM



ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)


UNIDAD

kg

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			CANTIDADES			UN			ACUM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	kg	L	A	h	Und	kg	m	m2	m3		
Ac Long. Caisson 5 recta	3.98	6.75			8	214.9				6380.2	
Ac Long. Caisson 5 con escuadra	3.98	7.56			8	240.7				6621.0	
Ac Long. Caisson 5 recta	3.98	8.20			8	261.1				6882.0	
Ac Flejes Caisson 5	0.994	3.17			145	456.9				7336.9	
Ac varilla andaje pantalla a caisson 5	1.552	1.72			22	58.7				7397.7	
Ac Long. Caisson 7 con escuadra	3.98	9.00			8	286.6				7684.2	
Ac Long. Caisson 7 recta	3.98	6.75			8	214.9				7893.1	
Ac Long. Caisson 7 con escuadra	3.98	7.56			8	240.7				8139.9	
Ac Long. Caisson 7 recta	3.98	8.20			8	261.1				8400.9	
Ac Flejes Caisson 7	0.994	3.17			145	456.9				8857.8	
Ac varilla andaje pantalla a caisson 7	1.552	1.72			22	58.7				8916.6	
TOTAL CANTIDAD ACTA 01						8916.6				8916.6	
Fleje Anillos caisson 2	0.56	4.17		6.75	6	94.6				9011.1	
Perros anillos caisson 2	0.56	1.3		6.75	13	63.9				9075.0	
Fleje Anillos caisson 4	0.56	4.17		9.5	6	133.1				9208.1	
Perros anillos caisson 4	0.56	1.3		9.5	13	89.8				9298.0	
Fleje Anillos caisson 6	0.56	4.17		7.73	6	105.3				9406.3	
Perros anillos caisson 6	0.56	1.3		7.73	13	73.2				9479.5	
Fleje Anillos caisson 8	0.56	4.17		8.1	6	113.5				9593.0	
Perros anillos caisson 8	0.56	1.3		8.1	13	76.7				9669.7	
Fleje Anillos caisson 10	0.56	4.17		9.58	6	134.2				9803.9	
Perros anillos caisson 10	0.56	1.3		9.58	13	90.7				9894.5	
Fleje Anillos caisson 12	0.56	4.17		5.35	6	75.0				9969.5	
Perros anillos caisson 12	0.56	1.3		5.35	13	50.6				10020.1	
Fleje Anillos caisson 14	0.56	4.17		9.12	6	127.8				10147.9	
Perros anillos caisson 14	0.56	1.3		9.12	13	86.3				10234.2	
Ac Long. Caisson 9 con escuadra	3.98	9.00			8	286.6				10520.8	
Ac Long. Caisson 9 recta	3.98	6.75			8	214.9				10735.7	
Ac Long. Caisson 9 con escuadra	3.98	7.56			8	240.7				10976.4	
Ac Long. Caisson 9 recta	3.98	8.20			8	261.1				11237.5	
Ac Flejes Caisson 9	0.994	3.17			145	456.9				11694.4	
Ac varilla andaje pantalla a caisson 9	1.552	1.72			22	58.7				11753.1	
Ac Long. Caisson 11 con escuadra	3.98	9.00			8	286.6				12039.7	
Ac Long. Caisson 11 recta	3.98	6.75			8	214.9				12254.6	
Ac Long. Caisson 11 con escuadra	3.98	7.56			8	240.7				12495.3	
Ac Long. Caisson 11 recta	3.98	8.20			8	261.1				12756.4	
Ac Flejes Caisson 11	0.994	3.17			145	456.9				13213.3	
Ac varilla andaje pantalla a caisson 11	1.552	1.72			22	58.7				13272.0	
Ac Long. Caisson 13 con escuadra	3.98	9.00			8	286.6				13558.6	
Ac Long. Caisson 13 recta	3.98	6.75			8	214.9				13773.5	
Ac Long. Caisson 13 con escuadra	3.98	7.56			8	240.7				14014.2	
Ac Long. Caisson 13 recta	3.98	8.20			8	261.1				14275.3	
Ac Flejes Caisson 13	0.994	3.17			145	456.9				14732.2	
Ac varilla andaje pantalla a caisson 13	1.552	1.72			22	58.7				14790.9	
Ac Long. Caisson 15 con escuadra	3.98	9.00			8	286.6				15077.5	
Ac Long. Caisson 15 recta	3.98	6.75			8	214.9				15292.4	

PREACTA DE OBRA No. 02												CONTROL CANTIDADES DE OBRA					
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO																	
CONTRATO No. : 08092025-1475												CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:												INTERVETOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22					
No. DE ORDEN 24																	
ESPECIFICACIÓN 640.1																	
DESCRIPCIÓN ITEM ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analiado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)																	
UNIDAD kg																	
DESCRIPCIÓN												CANTIDADES				REGISTRO FOTOGRAFICO	
												kg	ml	m2	m3	UN	ACUM
Ac Long. Caisson 15 con escuadra												3.98	7.56				15533.1
Ac Long. Caisson 15 recta												3.98	8.20				15794.2
Ac Flejes Caisson 15												0.994	3.17				16251.1
Ac varilla andaje pantalla a caisson 15												1.552	1.72				16309.8
																	16309.8
Ac Long. Caisson 2 con escuadra												3.98	9.00				16596.4
Ac Long. Caisson 2 recta												3.98	6.75				16811.3
Ac Long. Caisson 2 con escuadra												3.98	7.56				17052.0
Ac Long. Caisson 2 recta												3.98	8.20				17313.1
Ac Flejes Caisson 2												0.994	3.17				17770.0
Ac varilla andaje pantalla a caisson 2												1.552	1.72				17828.7
																	17828.7
Ac Long. Caisson 4 con escuadra												3.98	9.00				18115.3
Ac Long. Caisson 4 recta												3.98	6.75				18330.2
Ac Long. Caisson 4 con escuadra												3.98	7.56				18570.9
Ac Long. Caisson 4 recta												3.98	8.20				18832.0
Ac Flejes Caisson 4												0.994	3.17				19288.9
Ac varilla andaje pantalla a caisson 4												1.552	1.72				19347.6
																	19347.6
Ac Long. Caisson 6 con escuadra												3.98	9.00				19634.2
Ac Long. Caisson 6 recta												3.98	6.75				19849.1
Ac Long. Caisson 6 con escuadra												3.98	7.56				20089.8
Ac Long. Caisson 6 recta												3.98	8.20				20350.9
Ac Flejes Caisson 6												0.994	3.17				20607.8
Ac varilla andaje pantalla a caisson 6												1.552	1.72				20866.5
																	20866.5
Ac Long. Caisson 8 con escuadra												3.98	9.00				21153.1
Ac Long. Caisson 8 recta												3.98	6.75				21368.0
Ac Long. Caisson 8 con escuadra												3.98	7.56				21608.7
Ac Long. Caisson 8 recta												3.98	8.20				21869.8
Ac Flejes Caisson 8												0.994	3.17				22326.7
Ac varilla andaje pantalla a caisson 8												1.552	1.72				22385.4
																	22385.4
Ac Long. Caisson 10 con escuadra												3.98	9.00				22672.0
Ac Long. Caisson 10 recta												3.98	6.75				22886.9
Ac Long. Caisson 10 con escuadra												3.98	7.56				23127.6
Ac Long. Caisson 10 recta												3.98	8.20				23388.7
Ac Flejes Caisson 10												0.994	3.17				23645.6
Ac varilla andaje pantalla a caisson 10												1.552	1.72				23904.3
																	23904.3
Ac Long. Caisson 12 con escuadra												3.98	9.00				24190.9
Ac Long. Caisson 12 recta												3.98	6.75				24405.8
Ac Long. Caisson 12 con escuadra												3.98	7.56				24646.5
Ac Long. Caisson 12 recta												3.98	8.20				24907.6
Ac Flejes Caisson 12												0.994	3.17				25364.5
Ac varilla andaje pantalla a caisson 12												1.552	1.72				25423.2
																	25423.2
Ac Long. Caisson 14 con escuadra												3.98	9.00				25709.8
Ac Long. Caisson 14 recta												3.98	6.75				25924.7
Ac Long. Caisson 14 con escuadra												3.98	7.56				26165.4
Ac Long. Caisson 14 recta												3.98	8.20				26426.5
Ac Flejes Caisson 14												0.994	3.17				26683.4
Ac varilla andaje pantalla a caisson 14												1.552	1.72				26942.1

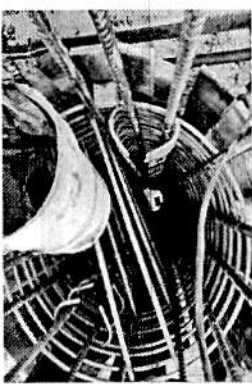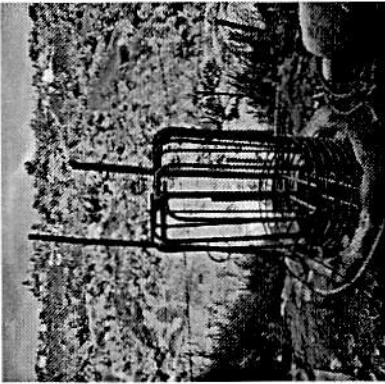


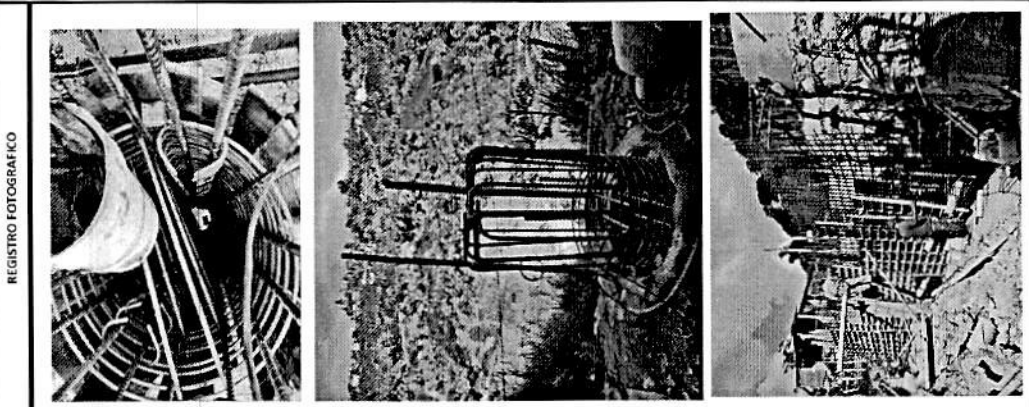


PREACTA DE OBRA No. 02										CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO											
CONTRATO No.: 08092025-1475											
CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1102 DE 2022											
INTERVENOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22											
No. DE ORDEN 24											
ESPECIFICACIÓN 640.1											
DESCRIPCIÓN ITEM ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa [Análizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa]											
UNIDAD kg											
PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026											
FECHA: 21/01/2026											
											
REGISTRO FOTOGRÁFICO											
ACUM											
27564.4											
27593.5											
28115.7											
28444.9											
28444.9											
TOTAL CANTIDAD ACTA 02											
19528.3											
FIRMA:											
NOMBRE: RICARDO MESA GONZÁLEZ											
RESIDENTE CONTRATISTA											
FIRMA:											
NOMBRE: EDISON JAVIER DÍAZ NAVARRO											
RESIDENTE INTERVENTORIA											

PREACTA DE OBRA No. 02		CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHIMCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO			
CONTRATO No.: 0809/2025-1475	CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025	FECHA: 21/04/2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1102 DE 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO GIMPRO INV 199/22	PERIODO: 01/12/2025 AL 31/01/2026	
No. DE ORDEN ESPECIFICACIÓN 900 2.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y UNIDAD m3-km			

DESCRIPCIÓN		MEDIDAS				Unid	kg	CANTIDADES				m3	UR	ACUM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
		L	A	h				ml	m2						
Recibo escombrera	349142			8	13						104.00		104.00		
Recibo escombrera	349315			8	13						104.00		208.00		
Recibo escombrera	349388			8	13						104.00		312.00		
Recibo escombrera	349529			8	13						104.00		416.00		
Recibo escombrera	350158			8	13						104.00		520.00		
Recibo escombrera	350626			8	13						104.00		624.00		
Recibo escombrera	351079			8	13						104.00		728.00		
Recibo escombrera	351166			8	13						104.00		832.00		
Recibo escombrera	351562			8	13						104.00		936.00		
Recibo escombrera	351783			8	13						104.00		1040.00		
Recibo escombrera	351890			8	13						104.00		1144.00		
Recibo escombrera	352102			8	13						104.00		1248.00		
Recibo escombrera	352246			8	13						104.00		1352.00		
Recibo escombrera	352591			8	13						104.00		1456.00		
Recibo escombrera	352755			8	13						104.00		1560.00		
Recibo escombrera	352863			8	13						104.00		1664.00		
Recibo escombrera	353519			8	13						104.00		1768.00		
Recibo escombrera	353789			8	13						104.00		1872.00		
Recibo escombrera	353972			8	13						104.00		1976.00		
Recibo escombrera	354109			8	13						104.00		2080.00		
Recibo escombrera	354602			8	13						104.00		2184.00		
Recibo escombrera	354869			8	13						104.00		2288.00		
TOTAL CANTIDAD ACTA 01											2288.0		2288.00		
Recibo escombrera	349142			8	13						104.00		2392.00		
Recibo escombrera	349315			8	13						104.00		2496.00		
Recibo escombrera	349388			8	13						104.00		2600.00		
Recibo escombrera	349529			8	13						104.00		2704.00		
Recibo escombrera	350158			8	13						104.00		2808.00		
Recibo escombrera	350626			8	13						104.00		2912.00		
Recibo escombrera	351079			8	13						104.00		3016.00		
Recibo escombrera	351166			8	13						104.00		3120.00		
Recibo escombrera	351562			8	13						104.00		3224.00		
Recibo escombrera	351783			8	13						104.00		3328.00		
Recibo escombrera	351890			8	13						104.00		3432.00		
Recibo escombrera	352102			8	13						104.00		3536.00		
Recibo escombrera	352246			8	13						104.00		3640.00		
Recibo escombrera	352591			8	13						104.00		3744.00		
TOTAL CANTIDAD ACTA 02											1456.0		3744.00		

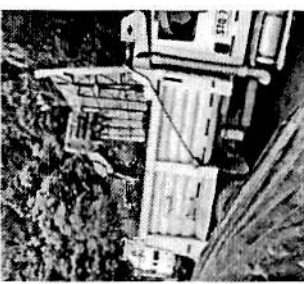	
--	--



FIRMA:
 NOMBRE: RICARDO MESA GONZÁLEZ
 RESIDENTE CONTRATISTA



FIRMA:
 NOMBRE: EDSON JAVIER DÍAZ NAVARINO
 RESIDENTE INTERVENTORÍA

PREACTA DE OBRA No. 02		CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO			
CONTRATO No.: 08092025-1475 CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025	FECHA: 21/01/2026		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1102 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22	PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026		
No. DE ORDEN ESPECIFICACIÓN 28 900.2.1			
DESCRIPCIÓN ÍTEM TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y			
UNIDAD m3-km			

ANEXO ACTA 2																																																									
																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Recibo</th> <th>Fecha</th> <th>Cant. M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>354981</td><td>25-nov</td><td>8</td></tr> <tr><td>356117</td><td>1-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>356243</td><td>2-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>357201</td><td>9-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>357278</td><td>10-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>357696</td><td>11-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>358263</td><td>15-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>358908</td><td>18-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>358993</td><td>19-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>359027</td><td>19-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>359350</td><td>12-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>359419</td><td>12-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>359457</td><td>23-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td>359486</td><td>29-dic</td><td>8</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>112</td></tr> <tr><td colspan="2">KM</td><td>13</td></tr> <tr><td colspan="2">M3-KM</td><td>1456</td></tr> </tbody> </table>				No. Recibo	Fecha	Cant. M3	354981	25-nov	8	356117	1-dic	8	356243	2-dic	8	357201	9-dic	8	357278	10-dic	8	357696	11-dic	8	358263	15-dic	8	358908	18-dic	8	358993	19-dic	8	359027	19-dic	8	359350	12-dic	8	359419	12-dic	8	359457	23-dic	8	359486	29-dic	8	TOTAL		112	KM		13	M3-KM		1456
No. Recibo	Fecha	Cant. M3																																																							
354981	25-nov	8																																																							
356117	1-dic	8																																																							
356243	2-dic	8																																																							
357201	9-dic	8																																																							
357278	10-dic	8																																																							
357696	11-dic	8																																																							
358263	15-dic	8																																																							
358908	18-dic	8																																																							
358993	19-dic	8																																																							
359027	19-dic	8																																																							
359350	12-dic	8																																																							
359419	12-dic	8																																																							
359457	23-dic	8																																																							
359486	29-dic	8																																																							
TOTAL		112																																																							
KM		13																																																							
M3-KM		1456																																																							
FIRMA:  NOMBRE: RICARDO MESA GONZALEZ RESIDENTE CONTRATISTA																																																									
FIRMA:  NOMBRE: EDISON JAVIER DIAZ NAVARRO RESIDENTE INTERVENTORIA																																																									


REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA No. 02		CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLANARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO			
CONTRATO No : 08092025-1475		CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1102 DE 2022		INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 159/22	
No. DE ORDEN 21		PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026	
ESPECIFICACIÓN EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA			
UNIDAD M3			



ANEXO



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA No. 02		CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO			
CONTRATO No : 08092025-1475		CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1102 DE 2022		INTERVETOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22	
No. DE ORDEN 630.1.3.1		FECHA: 21/01/2026	
ESPECIFICACIÓN TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Análizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)		PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026	
UNIDAD m3			




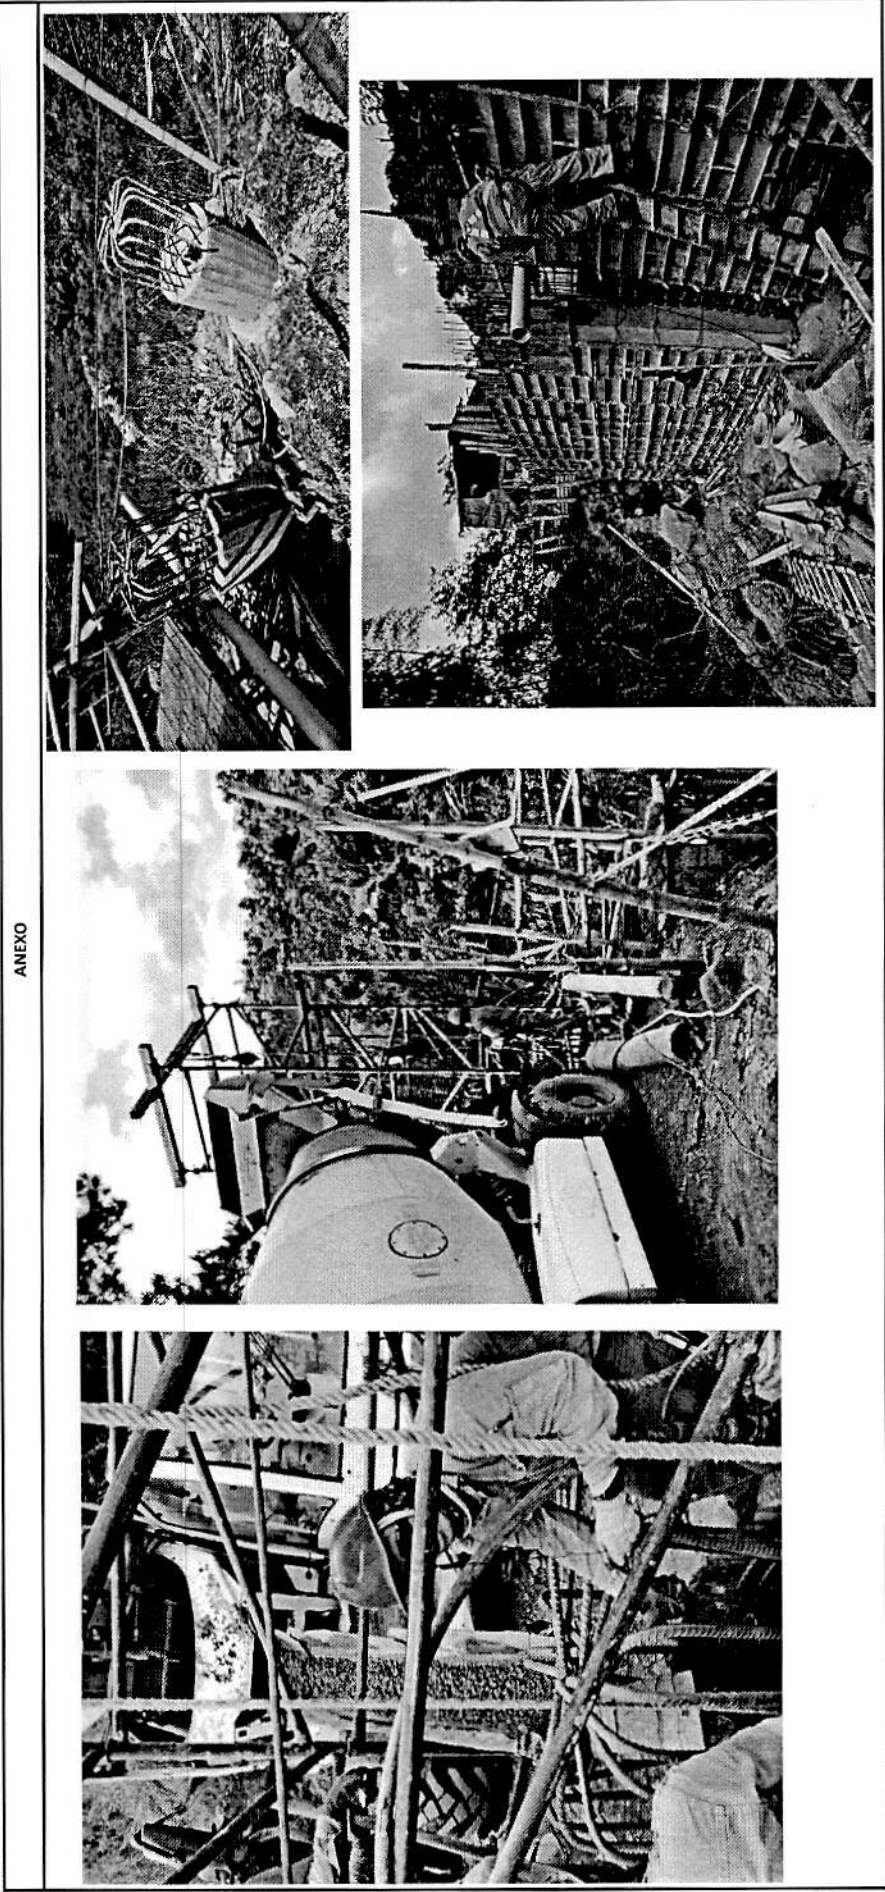


REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA No. 02		CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO			
CONTRATO No :	08092025-1475	CONTRATISTA:	CONSORCIO JE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1102 DE 2022	INTERVETOR:	CONSORCIO GINPRO INV 199/22
No. DE ORDEN	23	PERIODO:	01/12/2025 AL 21/01/2026
ESPECIFICACIÓN	630.1.4.1		
DESCRIPCIÓN ITEM	TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa. mezcla in situ)		
UNIDAD	m3		



ANEXO

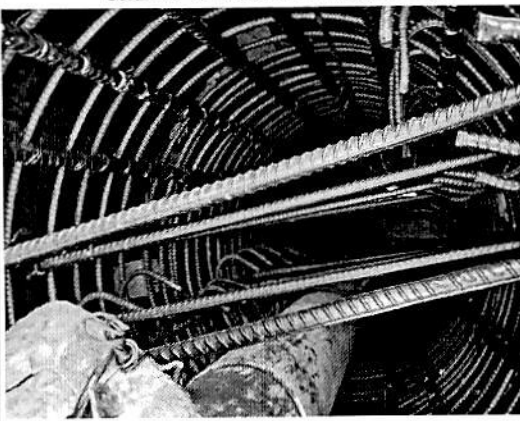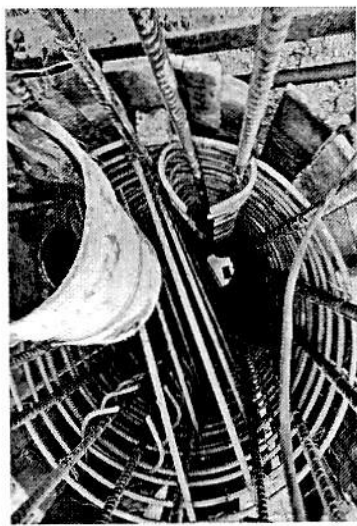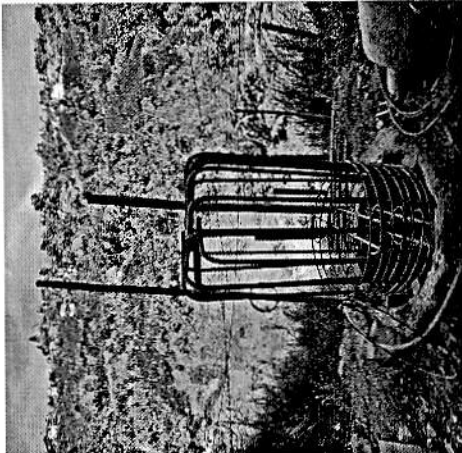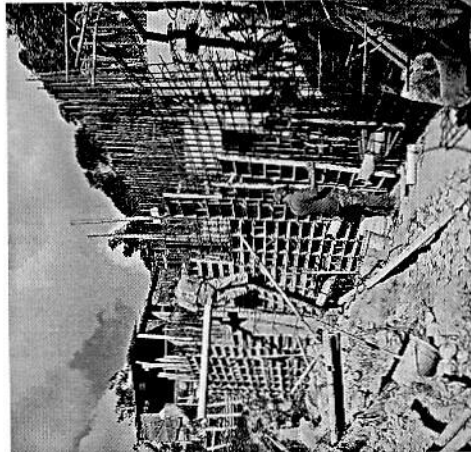

CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA No. 02	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO	
CONTRATO No : 08092025-1475	CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1102 DE 2022	INTERVETOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22
No. DE ORDEN 24	PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026
ESPECIFICACIÓN 640.1	
DESCRIPCIÓN ITEM ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de fy 4200 Mpa)	
UNIDAD kg	
ANEXO	
<div></div>	

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA No. 02

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO

CONTRATO No. :
08092025-1475

CONTRATISTA: CONSORCIO JE 2025

FECHA: 21/01/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
1102 DE 2022

INTERVETOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22

PERIODO: 01/12/2025 AL 21/01/2026

No. DE ORDEN
ESPECIFICACIÓN
900.2.1

DESCRIPCIÓN ITEM
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y

UNIDAD
m3-km



CONSORCIO JE
2025

ANEXO



<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352011</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352012</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352013</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352014</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352015</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352016</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352017</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352018</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352019</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>	<div><div>RECIBO</div><div>Nº 352020</div><div>Fecha: Da 19 Mar 25 Año 25</div><div>Placa Vehículo: STQ 311</div><div>1 7 0 9 14 16</div><div>Finca Responsables Escombrera</div></div>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND



PROYECTO:

INTERESADO: JULIO CESAR SALGADO GALEANO

LOCALIZACION:

PROCEDENCIA: TRITURADO 3/4" Y ARENA DEL RIO GUACAICA - EL GUINEO

FECHA: OCTUBRE DE 2025

MEZCLA PARA: **4000 PSI**


CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m ³ Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	160,0	Ton/m ³	160,0 Litros
Cemento **	355,6		355,6 Kg.
Arena	901,3	1,312	0,6871 m ³
Triturado	976,4	1,551	0,6295 m ³

Consumo de cemento Portland en bultos de 42,5Kg /m³ de concreto **8,37**

PROPORCIONES EN PESO DE LOS MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO PORTLAND

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0,45	(17-19) Litros
Cemento	1,00	42,5 Kg (1 bulto)
Arena	2,54	108 Kg
Triturado	2,75	117 Kg


AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

CUBICACION DE LOS MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	0,45	(17-19)	Litros
Cemento	32,7	1,00	1	Bulto de 42,5Kg
Arena	82,1	2,51	2	40cm x 40cm x 25,7 cm de alto
Triturado	75,2	2,30	2	40cm x 40cm x 23,5 cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,45	(17-19)	Litros
Cemento	32,7	1,00	-	Bulto de 42,5Kg
Arena	82,1	2,51	4	Cuñetes
Triturado	75,2	2,30	3 1/2	Cuñetes

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,45	(17-19)	Litros
Cemento	32,7	1,00	-	Bulto de 42,5Kg
Arena	82,1	2,51	9 1/2	Baldados
Triturado	75,2	2,30	9	Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construcción de volumen=8,5Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba: ARGOS U.E. DE 42,5Kg

La cantidad de agua se toma **siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre

de los agregados petreos. **El agua de la mezcla está calculada para un Slump de 2" a 3" sin aditivo**

Para un Slump de mayor a 4" o plastificar la mezcla, se recomienda utilizar aditivo Sikaplast MO al 1% del peso del cemento (400ml por bulto de 42,5Kg)

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

ENSAYOS DE LABORATORIO PARA AGREGADOS PETREOS

PROYECTO :
INTERESADO : JULIO CESAR SALGADO GALEANO
LOCALIZACION :
PROCEDENCIA: TRITURADO 3/4" y ARENA DE RIO GUACAICA (CASCARERO)
FECHA: OCTUBRE DE 2025



GRAVILLA TRITURADA 3/4" - CASCARERO

PESO ESPECIFICO y ABSORCION

Determinación	1	2	3
Peso sat.sup.seco (gr)	1314,00	1403,80	1397,50
Peso en inmersión (gr)	839,40	897,20	892,50
Peso seco (gr)	1302,40	1391,80	1384,90
Grav. Esp. Bulk aparente	2,813	2,814	2,813
Gravedad Esp. Bulk	2,744	2,747	2,742
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2,769	2,771	2,767
ABSORCION (%)	0,9	0,9	0,9

MASA UNITARIA SUELTA

Determinación	1	2
Vol. recip. (cm3)	14957,0	14957,0
Peso suelto (gm)	21745,0	21712,0
M.U.S. (gm/cm3)	1,454	1,452

MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)

Determinación	1	2
Peso compacto(gm)	23621,0	23636,0
M.U.C. (gm/cm3)	1,579	1,580

ANALISIS GRANULOMETRICO

Peso seco inicial (g) : 5585,5
Peso final fracciones (g): 5569,0

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum.	% pasa
2 1/2"				
2"				
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	71,0	1,3	1,3	98,7
1/2"	1420,0	25,4	26,7	73,3
3/8"	1232,0	22,1	48,8	51,2
No. 4	2646,5	47,4	96,1	3,9
No. 8	128,5	2,3	98,4	1,6
No. 16	29,0	0,5	99,0	1,0
No. 30	13,5	0,2	99,2	0,8
No. 50	9,5	0,2	99,4	0,6
No. 100	10,0	0,2	99,6	0,5
No. 200	9,0	0,2	99,7	0,3
Pasa T-200	16,5	0,3	100,0	0,0

AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

D60 10,50
D30 7,10
D10 5,30
Cu 2,0
Cc 0,9

RESUMEN DE ENSAYOS DE LA GRAVA

Grav. Esp. Bulk aparente gr/cm³	2,813
Gravedad específica bulk gr/cm³	2,746
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. gr/cm³	2,770
ABSORCION (%)	0,9
Masa Unitaria Suelta (ton/m³)	1,453
Masa Unitaria Compacta (ton/m³)	1,580
CLASIFICACION S.U.C.S.	GP

OBSERVACIONES: Grava de río, forma angulosa de las partículas.

ARENA DEL RIO GUACAICA - CASCAREROS

ANALISIS GRANULOMETRICO

Peso seco inicial (g) : 3266,0
Peso final fracciones (g): 3108,0

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum.	% pasa
1 1/2"				
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0
1/2"	12,5	0,4	0,4	99,6
3/8"	5,5	0,2	0,6	99,4
No. 4	193,0	5,9	6,5	93,5
No. 8	529,5	16,2	22,7	77,3
No. 16	483,0	14,8	37,5	62,5
No. 30	533,5	16,3	53,8	46,2
No. 50	754,5	23,1	76,9	23,1
No. 100	468,0	14,3	91,2	8,8
No. 200	128,5	3,9	95,2	4,8
Pasa T-200	158,0	4,8	100,0	0,0

MASA UNITARIA SUELTA

DETERMINACION	1	2
Vol. recip. (cm3)	14957,0	14957,0
Peso suelto (gm)	22981,0	23065,0
M.U.S. (gm/cm3)	1,536	1,542

MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)

DETERMINACION	1	2
Peso compacto(gm)	25735,0	25718,0
M.U.C. (gm/cm3)	1,721	1,719

D60 1,100
D30 0,380
D10 0,170
Cu 6,5
Cc 0,8

EQUIVALENTE DE ARENA

Determinación	1	2
Lectura de arcilla	9,1	9,2
Lectura de arena	7,1	7,2
Equiv. De arena %	78,0	78,3
Equivalente de arena promedio %	78,1	

RESUMEN DE ENSAYOS DE LA ARENA

MODULO DE FINURA	2,89
TAMAÑO MAXIMO	3/8"
Grav. Esp. Bulk aparente gr/cm³	2,786
Gravedad específica bulk gr/cm³	2,529
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. gr/cm³	2,621
ABSORCION (%)	3,6
Masa Unitaria Suelta (ton/m³)	1,539
Masa Unitaria Compacta (ton/m³)	1,720
CLASIFICACION S.U.C.S.	SP

PESO ESPECIFICO y ABSORCION

Determinación	1	2	3
Matraz (No.)	A	B	C
P sss. (gm)	366,50	365,20	373,55
P fws. (gm)	858,40	878,70	867,10
Temperatura (C)	20,4	20,4	20,3
P fw. (gm)	631,91	652,83	635,85
P seco (gm)	353,35	352,40	360,70
Grav. Esp. Bulk aparente	2,785	2,785	2,786
Gravedad Esp. Bulk	2,524	2,529	2,535
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2,618	2,621	2,625
ABSORCION (%)	3,7	3,6	3,6


OBSERVACIONES: Arena de río semilimpia

*Los resultados corresponden a la muestras ensayadas

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Unicauca

GRAFICAS GRANULOMETRICAS

PROYECTO :
INTERESADO : JULIO CESAR SALGADO GALEANO
LOCALIZACION :
PROCEDENCIA: TRITURADO 3/4" y ARENA DE RIO GUACAICA (CASCARERO)
FECHA: OCTUBRE 7 DE 2025

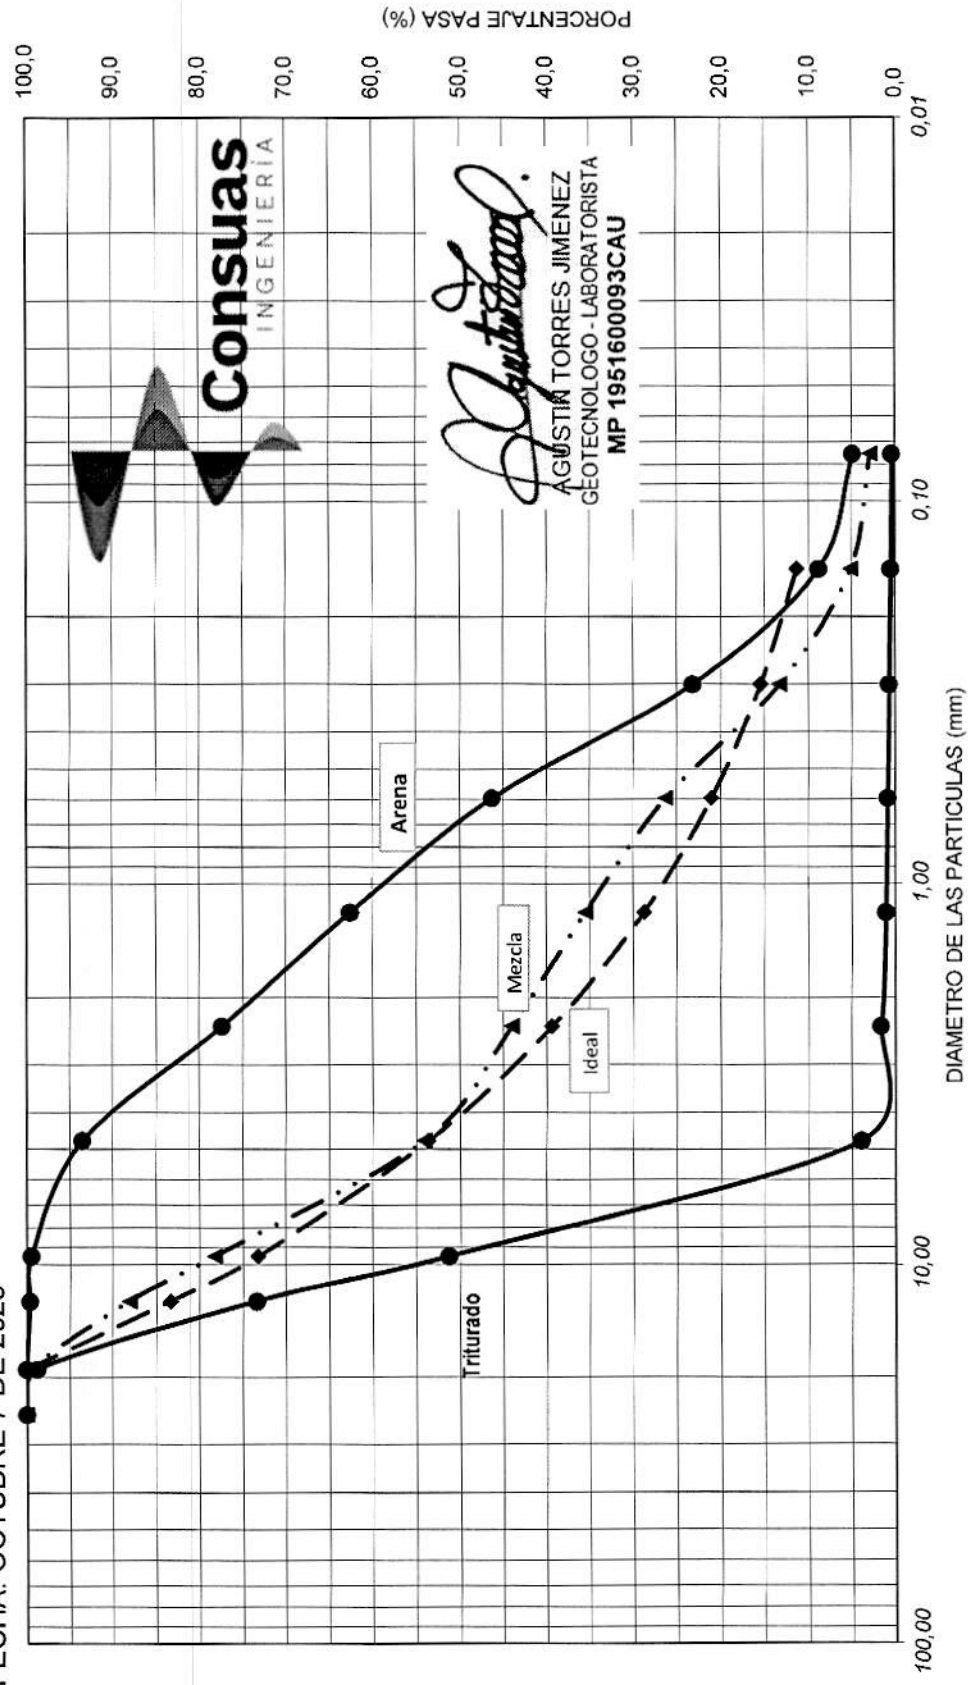

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CORREDOR VERDE** Fecha Impresión: **25/11/20** Informe N°: **137158**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA** No. Remisión: **187272289** Informe Ant N°:
 Teléfono: **3127695804** Página: **1 de 5** Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

				PROPIEDADES QUIMICAS											
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA-PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	60000015280	A012195418	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.16	0.016	0.015	0.45	0.159	0.061	0.153	0.004
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	60000015280	A012195419	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.16	0.016	0.015	0.45	0.159	0.061	0.153	0.004
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	60000015280	A012195501	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.90	0.16	0.014	0.015	0.45	0.140	0.058	0.153	0.004
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	60000015280	A012196605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.90	0.14	0.021	0.013	0.45	0.138	0.059	0.140	0.001
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	60000015280	BNSB031428	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.91	0.26	0.022	0.024	0.45	0.230	0.060	0.22	0.003
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	60000015280	BNSP029468	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	0.93	0.29	0.027	0.024	0.46	0.220	0.080	0.24	0.004
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	60000015280	BNS_01091S	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.94	0.23	0.026	0.025	0.45	0.230	0.060	0.20	0.003
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	60000015280	BNS_029093	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.94	0.23	0.026	0.025	0.45	0.230	0.060	0.20	0.003
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-182911	NTC 2289 GR60	Ternium	0.26	0.90	0.16	0.014	0.019	0.44	0.239	0.066	0.176	0.002
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185015	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.93	0.18	0.020	0.015	0.46	0.133	0.053	0.138	0.004
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185201	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.93	0.18	0.020	0.015	0.46	0.133	0.053	0.138	0.004
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185208	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.93	0.18	0.020	0.015	0.46	0.133	0.053	0.138	0.004
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	8000_15280	A012178524	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.86	0.15	0.021	0.020	0.46	0.285	0.102	0.175	0.001

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
 Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüí

Página Web: www.ternium.com.co

Cliente: **CORREDOR VERDE**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA**
 Teléfono: **3127695804**
 Fecha Impresión: **25/11/20**
 No. Remisión: **187272289**
 Página: **2 de 5**
 Informe N°: **137158**
 Informe Ant N°:
 Centro: **Centro Manizales**

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Mo
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196418	NTC 2289 GR60	Ternium	0.027
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196419	NTC 2289 GR60	Ternium	0.027
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196501	NTC 2289 GR60	Ternium	0.027
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.039
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNSB031428	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.012
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNSP029469	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.012
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_01091S	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.013
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_029093	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.013
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-182911	NTC 2289 GR60	Ternium	0.030
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185015	NTC 2289 GR60	Ternium	0.017
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185201	NTC 2289 GR60	Ternium	0.017
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185208	NTC 2289 GR60	Ternium	0.017
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A012178524	NTC 2289 GR60	Ternium	0.040

PROPIEDADES QUIMICAS

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
 Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüí

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CORREDOR VERDE**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA**
 Teléfono: **3127695804**
 Fecha Impresión: **25/11/20**
 No. Remisión: **187272289**
 Página: **3 de 5**
 Informe N°: **137158**
 Informe Ant N°:
 Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia		Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF
						Fluencia	Tracción			
						MPa	MPa	%		
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196418	NTC 2289 GR60	Ternium	457	604	16	Sin Grieta	1.32
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196419	NTC 2289 GR60	Ternium	457	604	16	Sin Grieta	1.32
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196501	NTC 2289 GR60	Ternium	484	633	15	Sin Grieta	1.31
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196605	NTC 2289 GR60	Ternium	441	594	19	Sin Grieta	1.35
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS8031428	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	480	703	14.7	Sin Grieta	1.47
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNSP029468	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	470	673	15.5	Sin Grieta	1.43
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_01091S	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	465	671	15.9	Sin Grieta	1.44
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_029093	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	465	671	15.9	Sin Grieta	1.44
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-182911	NTC 2289 GR60	Ternium	490	639	18	Sin Grieta	1.30
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185015	NTC 2289 GR60	Ternium	472	625	18	Sin Grieta	1.32
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185201	NTC 2289 GR60	Ternium	472	625	18	Sin Grieta	1.32
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185208	NTC 2289 GR60	Ternium	472	625	18	Sin Grieta	1.32
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A012178524	NTC 2289 GR60	Ternium	458	604	19	Sin Grieta	1.32

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

[Firma]
 Autoriza

Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüí

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CORREDOR VERDE** Fecha Impresión: **25/11/20** Informe N°: **137158**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA** No. Remisión: **187272289** Informe Ant N°:
 Teléfono: **3127695804** Página: **4 de 5** Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	PROPIEDADES DIMENSIONALES		
							Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196418	NTC 2289 GR60	Ternium	1.526	1.18	3.7	10.4
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196419	NTC 2289 GR60	Ternium	1.526	1.18	3.7	10.4
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196501	NTC 2289 GR60	Ternium	1.535	1.24	3.3	10.4
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196605	NTC 2289 GR60	Ternium	1.529	1.23	3.5	10.4
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNSB031428	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.981	0.65	2.3	8.2
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNSP029468	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.973	0.73	2.4	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_01091S	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.954	0.67	2.3	8.3
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_029083	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.954	0.67	2.3	8.3
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-182911	NTC 2289 GR60	Ternium	3.869	1.66	6.0	17.0
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185015	NTC 2289 GR60	Ternium	3.820	1.63	5.8	17.1
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185201	NTC 2289 GR60	Ternium	3.820	1.63	5.8	17.1
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185208	NTC 2289 GR60	Ternium	3.820	1.63	5.8	17.1
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A012178524	NTC 2289 GR60	Ternium	3.759	1.63	5.6	16.9

Los datos del presente Informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este Informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
 Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web: www.ternium.com.co

Cliente: **CORREDOR VERDE**
Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA**
Teléfono: **3127695804**

Fecha Impresión: **25/11/20**
Informe N°: **137158**
No. Remisión: **187272289**
Informe Ant N°:
Página: **5 de 5**
Centro: **Centro Manizales**

INFORMACION GENERAL

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196418	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196419	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196501	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	6000015280	A012196505	NTC 2289 GR60	Ternium	59
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNSB031428	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNSP029468	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_01091S	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	48
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015280	BNS_029093	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	48
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-182011	NTC 2289 GR60	Ternium	59
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185015	NTC 2289 GR60	Ternium	59
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185201	NTC 2289 GR60	Ternium	59
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A01-185208	NTC 2289 GR60	Ternium	59
C8011761	HIERRO FIG. G-60 1"	6000_15280	A012178524	NTC 2289 GR60	Ternium	59

PROPIEDADES DIMENSIONALES

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

[Signature]
Autoriza

Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Carrera 42 # 26 - 18. Itagüí

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CORREDOR VERDE**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA**
 Teléfono: **3127695804**
 Fecha Impresión: **25/12/15**
 No. Remisión: **187281601**
 Página: **1 de 5**
 Informe N°: **142578**
 Informe Ant N°:
 Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012106612	NTC 2289 GR60	Ternium	0.29	0.89	0.19	0.008	0.010	0.46	0.132	0.061	0.169	0.002
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107001	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.88	0.17	0.014	0.015	0.45	0.256	0.062	0.158	0.002
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107314	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.87	0.19	0.016	0.012	0.45	0.220	0.061	0.138	0.002
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107618	NTC 2289 GR60	Ternium	0.29	0.86	0.16	0.016	0.013	0.46	0.262	0.114	0.165	0.003
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012180607	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.86	0.15	0.025	0.012	0.44	0.114	0.057	0.136	0.001
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_153108	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.88	0.19	0.017	0.009	0.44	0.103	0.077	0.141	0.004
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188301	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.85	0.15	0.027	0.017	0.45	0.215	0.061	0.147	0.001
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188303	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.85	0.15	0.027	0.017	0.45	0.215	0.061	0.147	0.001
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188315	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.85	0.15	0.027	0.017	0.45	0.215	0.061	0.147	0.001

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza

Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



www.ternium.com.co

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web:

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CORREDOR VERDE** Fecha Impresión: **25/12/15** Informe N°: **142578**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA** No. Remisión: **187281601** Informe Ant N°:
 Teléfono: **3127695804** Página: **2 de 5** Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Mo
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012106612	NTC 2289 GR60	Ternium	0.025
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107001	NTC 2289 GR60	Ternium	0.041
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107314	NTC 2289 GR60	Ternium	0.029
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107618	NTC 2289 GR60	Ternium	0.035
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012180607	NTC 2289 GR60	Ternium	0.030
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_153108	NTC 2289 GR60	Ternium	0.025
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188301	NTC 2289 GR60	Ternium	0.038
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188303	NTC 2289 GR60	Ternium	0.038
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188315	NTC 2289 GR60	Ternium	0.038

PROPIEDADES QUIMICAS

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza

Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



www.ternium.com.co

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web:

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CORREDOR VERDE** Fecha Impresión: **25/12/15** Informe N°: **142578**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA** No. Remisión: **187281601** Informe Ant N°:
 Teléfono: **3127695804** Página: **3 de 5** Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA-PROD	FABRICANTE	Resistencia		Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF
						Fluencia	Tracción			
						MPa	MPa	%		
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012106612	NTC 2289 GR60	Ternium	466	627	16	Sin Grieta	1.35
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107001	NTC 2289 GR60	Ternium	477	630	16	Sin Grieta	1.32
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107314	NTC 2289 GR60	Ternium	464	630	16	Sin Grieta	1.36
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107618	NTC 2289 GR60	Ternium	492	673	16	Sin Grieta	1.37
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012180607	NTC 2289 GR60	Ternium	462	610	18	Sin Grieta	1.32
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_153108	NTC 2289 GR60	Ternium	459	601	17	Sin Grieta	1.31
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188301	NTC 2289 GR60	Ternium	464	615	16	Sin Grieta	1.33
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188303	NTC 2289 GR60	Ternium	464	615	16	Sin Grieta	1.33
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188315	NTC 2289 GR60	Ternium	464	615	16	Sin Grieta	1.33

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza

Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social:
NIT:
Teléfono:
Dirección:

Ternium Colombia S.A.S.
890932389-8
01 8000 423 724
Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web:

www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CORREDOR VERDE**
 Dirección: **VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA**
 Teléfono: **3127695804**
 Fecha Impresión: **25/12/15**
 No. Remisión: **187281601**
 Página: **4 de 5**
 Informe N°: **142578**
 Informe Ant N°:
 Centro: **Centro Manizales**

DATOS GENERALES

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012106612	NTC 2289 GR60	Ternium	0.990	1.06	2.8	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107001	NTC 2289 GR60	Ternium	0.993	1.05	2.3	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107314	NTC 2289 GR60	Ternium	0.969	0.84	1.8	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107618	NTC 2289 GR60	Ternium	0.982	0.87	1.9	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012180607	NTC 2289 GR60	Ternium	0.958	0.71	1.5	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_153108	NTC 2289 GR60	Ternium	0.969	0.95	2.6	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188301	NTC 2289 GR60	Ternium	1.009	0.71	2.7	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188303	NTC 2289 GR60	Ternium	1.009	0.71	2.7	8.1
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188315	NTC 2289 GR60	Ternium	1.009	0.71	2.7	8.1

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.

La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Sebastian Carmona Restrepo
Autoriza

Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL				
Cliente:	CORREDOR VERDE	Fecha Impresión	25/12/15	Informe N°: 142578
Dirección:	VIA CARRILERA K 4 + 700 VILLAMARIA	No. Remisión:	187281601	Informe Ant N°:
Teléfono:	3127695804	Página:	5 de 5	Centro: Centro Manizales

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012106612	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107001	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107314	NTC 2289 GR60	Ternium	62
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012107618	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A012180607	NTC 2289 GR60	Ternium	61
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_153108	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188301	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188303	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	6000015350	A01_188315	NTC 2289 GR60	Ternium	60

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este Informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
 Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager



REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: SODIMAC COLOMBIA SA

Sucursal:

Ciudad: Manizales

Dirección:

Remisiones: 461985,

Fecha Impresión: domingo, 19 de octubre de 2025

CDP#:

Placa:

Tiquete:

Despacho:

Tren:

209129

ESZ769

173.342

153.959

POMINI



NTC 2289:2020

Barra corrugada y

litas de acero de

baja aleación, para

refuerzo de concreto

importan o comercialicen

en Colombia.



Resolución 2003: 2022

Barra corrugada de baja

aleación, para refuerzo de

concreto, que se fabricuen,

importan o comercialicen

en Colombia.



Certificado

No. SC-446-1

Producto: Rollo Corrugado de [3/8] 9.52 mm

Area Nom. (mm²) 71.00

Marcado: COL SO 3 W 60

Designación: 3

Grado: 60 (420)

Norma NTC-2289

PROPIEDADES MECÁNICAS			CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS																
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE	
13/09/2025	135433	46717	446	631	1.42	18.00	0.554	0.68	6.10	54	1.29	320.693	0.267	0.930	0.011	0.031	0.190	0.002	0.190	0.060	0.150	0.011	0.025	0.443
18/10/2025	136782	47257	441	611	1.39	17.00	0.564	0.70	6.20	61	1.68	323.168	0.270	0.910	0.011	0.032	0.160	0.002	0.180	0.060	0.120	0.027	0.028	0.439
18/10/2025	136784	47259	437	597	1.37	16.50	0.554	0.72	6.20	61	1.57	323.178	0.258	0.910	0.012	0.035	0.160	0.002	0.200	0.070	0.120	0.020	0.028	0.427
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1.25	14	0.526	0.38		45														
		Máximos	540						6.70	70	3.60		0.300	1.500	0.035	0.045	0.500							0.550
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Observaciones:

Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1 "Métodos de ensayo doblado", NTC-5192 "Métodos de análisis químico", NTC-2289 - NTC-161 "Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentran en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo". SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "Barra corrugada de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

Marco Antonio Alomia

MARCO ANTONIO ALOMIA

Analista Físico:

Juan Diego Sanclemente

JUAN DIEGO SANCLEMENTE

Analista Químico:

Ing. EFRÉN RABON

Ing. EFRÉN RABON

Jefe Técnico Control Calidad

Aprobado Por:





REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliete: SODIMAC COLOMBIA SA

Sucursal:

Ciudad: Manizales

Dirección:

Remisiones: 461378,

Fecha Impresión: miércoles, 15 de octubre de 2025

208748

ESZ771

173.059

153.755

POMINI

CDP#:

Placa:

Tiquete:

Despacho:

Tren:



NTC 2289-2020
Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto que se fabrican en Colombia.



Resolución 2003-2022
Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto que se fabrican en Colombia.



Certificado
No. SC-446-1

Producto: Redondo Corrugado de [1/4] 6.35 mm

FECHA RECEPCIÓN Y ENSAYO			N° REG FÍSICO		COLADA		PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS												Área Nom. (mm2)		31,67		Designación: 2		Norma NTC-2289													
15/10/2025			136640		47157		Esfuerzo Máximo [Mpa]		Relación [Rm/Rd]		% de Elong		Peso [Kg/m]		Altura del Resalte [mm]		Espa entre Resaltes [mm]		Ángulo del Resalte [°]		N° Reg Químico		%C		%Mn		%P		%S		%Si		%Nb		%Cu		%Ni		%Cr		%Mo		%V		%CE			
							430		1,43		16,40		0,257		0,42		4,00		60		1,21		322,737		0,251		0,910		0,015		0,030		0,130		0,002		0,210		0,070		0,190		0,014		0,026		0,428	
Especificaciones del Producto							420		1,25		14		0,234		0,25				45						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Validaciones			OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		4,45		70		3,00		1,500		0,300		1,500		0,035		0,045		0,500												0,550			

Producto: Redondo Corrugado de [3/8"] 9.52 mm

Producto: Redondo Corrugado de [3/8] 9.52 mm

PROPIEDADES MECÁNICAS										CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS												Norma NTC-2289
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Peso Líneal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Esp. entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE					
15/10/2025	136665	46724	439	1.43	17.00	0.552	0.66	6.10	54	1.42	320.723	0.256	0.950	0.011	0.036	0.180	0.002	0.180	0.070	0.170	0.012	0.025	0.437				
1/10/2025	136156	47013	457	1.49	15.50	0.558	0.70	6.10	55	1.22	322.130	0.272	0.970	0.013	0.026	0.160	0.002	0.200	0.080	0.180	0.010	0.024	0.458				
Especificaciones del Producto			420	1.25	14	0.526	0.38		45																		
Validaciones			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
Observaciones:																											
Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-161 "Requisitos dimensionales, peso." El plan y los procedimientos de ensayo de SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de las normas NTC-3353 y NTC-161.																											
SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de las normas NTC-3353 y NTC-161.																											
OK																											

Observaciones:

Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos", NTC-1 "Métodos de ensayo de laboratorio", NTC-161 "Requisitos dimensionales, peso", El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentran en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo". SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "Barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcialmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

VICTOR ORDOÑEZ LEON
Analista Físico:

HENRY BONILLA LOPEZ
Analista Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:



REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Ciente: SODIMAC COLOMBIA SA CDP#: 208375
Sucursal: ESZ770
Ciudad: Manizales Tiquete: 172.783
Dirección: Despacho: 153.458
Remisiones: 460671, POMINI

Fecha Impresión: viernes, 10 de octubre de 2025



Certificado
No. SC-446-1

Resolución 2003-2022
Barras corrugadas de baja
aleación, para refuerzo de
concreto, que se fabrican,
refuerzo de concreto
importan o comercializan
en Colombia.

NTC 2289-2020
Barras corrugadas y
lisas de acero de
baja aleación, para
refuerzo de concreto

Producto: Rollo Corrugado de [3/8] 9.52 mm

Area Nom. (mm²) 71.00 Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 3 W 60 Designación: 3
Grado: 60 (420)

PROPIEDADES MECÁNICAS			CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS																
Fecha Recepción y Ensayo	Nº Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Relación [Rm/Rl]	% de Elong	Dobado	Peso Lineal [kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Nº Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE	
12/09/2025	135387	46756	452	1,41	17,50	Sin graba	0,564	0,83	6,10	54	1,39	321,001	0,271	0,930	0,009	0,030	0,180	0,002	0,170	0,070	0,100	0,012	0,027	0,441
29/09/2025	136061	46979	440	1,43	18,50	Sin graba	0,557	0,87	6,10	55	1,26	321,991	0,270	0,940	0,012	0,026	0,170	0,003	0,160	0,060	0,140	0,011	0,026	0,445
30/09/2025	136119	47022	459	1,40	17,50	Sin graba	0,562	0,74	6,10	55	1,41	322,167	0,268	0,960	0,011	0,028	0,170	0,003	0,190	0,080	0,160	0,014	0,026	0,450
Especificaciones del Producto			Mínimos		14	Sin graba	0,526	0,38		45														
			Máximos			Con graba			6,70	70	3,60		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
			Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Observaciones:

Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1 "Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC-2289 - NTC-161 "Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentran en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo".

SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "Barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.


FIN DEL REPORTE

Marco Antonio Alomia

MARCO ANTONIO ALOMIA
Analista Físico:

MARCELO DUARTE AZCARATE
Analista Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:



PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine

4440 cm²/g

Retenido 325

2.2 %

Fraguado inicial

121 min

Fraguado final

237 min

Resistencia 1 día

18.6 MPa

Resistencia 3 días

32.8 MPa


Resistencia 7 días

38.4 MPa

Resistencia 28 días

(Blank) MPa

Edad ● R 1 día (MPa) ● R 3 días (MPa) ● R 7 días (MPa)

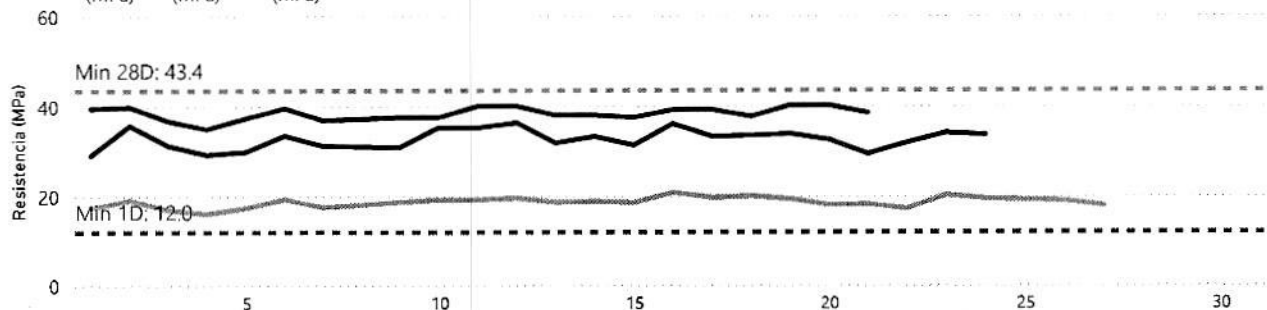

* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221

3,08 g/cm³

Contenido de Aire NTC 224

3,1 %

Expansión en autoclave
NTC 107


-0,008 %

Expansión barras de
mortero NTC 4927

0,009 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases mineralógicas (Bogue)



● C3A(%)

● C3S(%)

SiO₂

21.96 %

Al₂O₃

5.60 %

Fe₂O₃

3.40 %

CaO

57.55 %

SO₃

3.06 %

Perdidas por ignición

3.93 %

Equivalente alcalino

0.53 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm ² /g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/12/2025	4255	2.2	134	200	17.4	29.2	39.5	
2/12/2025	4516	2.1	130	230	19.1	35.8	39.9	
3/12/2025	4401	2.0	136	230	17.0	31.3	36.8	
4/12/2025	4206	1.4	132	260	16.1	29.3	35.0	
5/12/2025	4261	1.8	146	250	17.4	30.0	37.3	
6/12/2025	4365	1.9	131	250	19.3	33.5	39.6	
7/12/2025	4265	2.0	133	250	17.5	31.3	36.9	
9/12/2025	4419	1.8	134	240	18.7	31.0	37.5	
10/12/2025	4373	1.9	119	230	19.2	35.3	37.5	
11/12/2025	4305	1.8	125	240	19.2	35.3	40.0	
12/12/2025	4479	2.3	121	220	19.6	36.3	40.0	
13/12/2025	4582	2.9	113	230	18.6	31.9	38.0	
14/12/2025	4548	3.0	111	220	18.8	33.3	38.0	
15/12/2025	4557	2.3	111	240	18.5	31.4	37.5	
16/12/2025	4407	2.1	119	230	20.8	36.1	39.2	
17/12/2025	4505	2.3	135	250	19.6	33.3	39.2	



RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04
Fecha V: 21-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 2 Y 3 DE 2025

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm2	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm2	MPa	P.S.I.	
63	4/11/2025	2/12/2025	28	C1A11 / C7A8 / C9A1 / C11A1	3.000 PSI	3	2,5	78,1	20,0	223,8	292,3	28,67	4176	
64	4/11/2025	2/12/2025	28		3.000 PSI	3	2,5	79,7	20,0	219,9	281,3	27,59	4019	
69	5/11/2025	3/12/2025	28	CIA 12-13 / C7A9 / C9A2 / C11A2	3.000 PSI	4	2	78,3	20,1	198,2	258,2	25,32	3688	
70	5/11/2025	3/12/2025	28		3.000 PSI	4	2	80,9	20,5	212,2	267,6	26,25	3823	

Uso de refrentado no adherido para la determinación de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresión de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

** Resistencia Probable Proyectada de 7 días a 28 días, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d} = 50 + 1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm²)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

Consuas Ingeniería: Calle 46 No. 20 - 34 Barrio Saenz, (Manizales)
Teléfono: (6) 8853226 Celular: 3216403428



RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04
Fecha V: 21-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 4 Y 5 DE 2025

NUMERO REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm ²	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm ²	MPa	P.S.I.	
75	6/11/2025	4/12/2025	28	C5A11 / C7 A11 / C9 A3 / C15A4 / C15A3	3.000 PSI	3	3,0	79,7	20,1	221,2	283,0	27,75	4043	
76	6/11/2025	4/12/2025	28		3.000 PSI	4	3,0	79,9	20,0	225,0	287,3	28,18	4105	
157	27/11/2025	4/12/2025	7	C2A4 / C12 A4	3.000 PSI	4	2,5	80,9	20,3	158,5	199,7	19,59	2853	3939
158	27/11/2025	4/12/2025	7		3.000 PSI	4	2,5	79,4	19,8	158,0	202,8	19,89	2897	3988
81	7/11/2025	5/12/2025	28	C1A13 / C3A11 / C5A10 / C7A10 / C15A1	3.000 PSI	5	2,5	80,5	20,3	206,4	261,4	25,63	3718	
82	7/11/2025	5/12/2025	28		3.000 PSI	4	2,5	79,9	20,0	202,2	258,0	25,30	3670	
163	28/11/2025	5/12/2025	7	C4A2 / C10A2 / C12A5	3.000 PSI	4	2,5	81,1	20,3	121,8	153,2	15,02	2188	3187
164	28/11/2025	5/12/2025	7		3.000 PSI	3	2,5	81,4	20,3	134,4	168,2	16,50	2403	3430

Uso de refrentado no adherido para la determinación de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresión de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

** Resistencia Probable Proyectada de 7 días a 28 días, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm²)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

	RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FO-GS-04 Fecha V: 21-ABR-17 Versión: 01 Página 1 de 1
---	--	--

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 10 Y 11 DE 2025

NUMERO REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm2	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm2	MPa	P.S.I.	
169	3/12/2025	10/12/2025	7	CAISSON 1	4.000 PSI	3	2,5	78,9	19,8	200,6	259,3	25,43	3705	4901
170	3/12/2025	10/12/2025	7		4.000 PSI	3	2,5	84,9	19,9	203,1	243,8	23,91	3484	4651
111	13/11/2025	11/12/2025	28	C9A9 / C11A9 / C13A6 / C15A10	3.000 PSI	5	2	77,8	20,1	206,2	270,3	26,50	3861	
112	13/11/2025	11/12/2025	28		3.000 PSI	3	2	80,6	20,2	210,4	266,1	26,09	3801	
175	4/12/2025	11/12/2025	7	CAISSON 3	4.000 PSI	4	3	79,2	19,8	200,6	258,1	25,31	3688	4881
176	4/12/2025	11/12/2025	7		4.000 PSI	4	3	80,8	20,5	198,8	251,1	24,62	3587	4767


Uso de refrentado no adherido para la determinación de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresión de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado


** Resistencia Probable Proyectada de 7 días a 28 días, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm2)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.


Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó


Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

Consuas Ingeniería: Calle 46 No. 20 - 34 Barrio Saenz, (Manizales)
Teléfono: (6) 8853226 Celular: 3216403428

	RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FO-GS-04 Fecha V: 21-ABR-17 Versión: 01 Página 1 de 1
---	--	--

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 16 DE 2025

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA	FALLA	SLUMP	AREA	ALTURA	CARGA	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA
					ESPERADA	TIPO	Pulg	cm2	cm	KN	Kg/cm2	MPa	P.S.I.	PROYECT. P.S.I.
193	9/12/2025	16/12/2025	7	CAISSON 7	4.000 PSI	3	3	78,6	19,9	173,1	224,6	22,03	3209	4340
194	9/12/2025	16/12/2025	7		4.000 PSI	3	3	78,3	20,1	200,3	260,9	25,58	3727	4926
123	18/11/2025	16/12/2025	28	C6A2 / C15A13	3.000 PSI	4	2	76,8	20,0	220,2	292,5	28,69	4179	
124	18/11/2025	16/12/2025	28		3.000 PSI	4	2	78,0	20,0	228,1	298,1	29,24	4259	

Uso de refrentado no adherido para la determinación de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresión de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

** Resistencia Probable Proyectada de 7 días a 28 días, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm2)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

	RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FO-GS-04 Fecha V: 21-ABR-17 Versión: 01 Página 1 de 1
---	--	--

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 17 DE 2025

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA	FALLA	SLUMP	AREA	ALTURA	CARGA	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
					ESPERADA	TIPO	Pulg	cm2	cm	KN	Kg/cm2	MPa	P.S.I.	
129	19/11/2025	17/12/2025	28	C6A3 / C9A11 / C13A9 / C14A1 / C8A4	3.000 PSI	4	2	79,6	20,0	245,2	314,1	30,80	4487	
130	19/11/2025	17/12/2025	28		3.000 PSI	4	2	79,5	19,9	245,7	314,9	30,88	4499	
199	10/12/2025	17/12/2025	7	CAISSON 9	4.000 PSI	4	3	81,7	20,5	222,9	278,1	27,28	3973	5204
200	10/12/2025	17/12/2025	7		4.000 PSI	4	3	78,7	20,0	216,8	280,7	27,53	4010	5246

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado


** Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, segun ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm2)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.


Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó


Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

Consuas Ingeniería: Calle 46 No. 20 - 34 Barrio Saenz, (Manizales)
Teléfono: (6) 8853226 Celular: 3216403428



RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04
Fecha V: 21-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 19 DE 2025

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm2	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm2	MPa	P.S.I.	
141	21/11/2025	19/12/2025	28	C2A2 / C8A3 / C12A2 / C14A4	3.000 PSI	5	2	80,6	19,9	228,6	289,0	28,34	4129	
142	21/11/2025	19/12/2025	28		3.000 PSI	3	2	80,9	19,8	230,1	290,0	28,44	4143	
205	12/12/2025	19/12/2025	7	CAISSON 13	4.000 PSI	5	3	80,5	20,1	175,1	221,8	21,75	3169	4295
206	12/12/2025	19/12/2025	7		4.000 PSI	4	3	80,3	20,0	179,6	228,1	22,37	3259	4397

Uso de refrentado no adherido para la determinación de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresión de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

** Resistencia Probable Proyectada de 7 días a 28 días, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm²)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó


Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

	RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FO-GS-04 Fecha V: 21-ABR-17 Versión: 01 Página 1 de 1
---	--	--

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 20 Y 22 DE 2025

NUMERO REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA	FALLA	SLUMP	AREA	ALTURA	CARGA	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
					ESPERADA	TIPO	Pulg	cm2	cm	KN	Kg/cm2	MPa	P.S.I.	
211	13/12/2025	20/12/2025	7	C6A6 / C8A7	3.000 PSI	4	2	84,1	19,8	198,4	240,4	23,58	3434	4595
212	13/12/2025	20/12/2025	7		3.000 PSI	4	2	79,2	20,0	178,7	230,1	22,57	3288	4429
147	22/11/2025	20/12/2025	28	C8A4	3.000 PSI	3	2	80,1	20,0	282,0	359,2	35,22	5131	
148	22/11/2025	20/12/2025	28		3.000 PSI	3	2	78,9	20,1	284,1	367,4	36,03	5248	
217	15/12/2025	22/12/2025	7	CAISSON 11	4.000 PSI	3	3	78,3	20,0	211,5	275,3	27,00	3933	5158
218	15/12/2025	22/12/2025	7		4.000 PSI	3	3	80,2	20,1	209,6	266,4	26,12	3806	5015

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

** Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, segun ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d} = 50 + 1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm2)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó


Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

Consuas Ingeniería: Calle 46 No. 20 - 34 Barrio Saenz, (Manizales)
Teléfono: (6) 8853226 Celular: 3216403428



RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04
Fecha V: 21-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA

INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025

LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 23, 24, 25, 26 Y 27 DE 2025

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DÍA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DÍA / MES / AÑO	EDAD DÍAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm ²	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm ²	MPa	P.S.I.	
223	16/12/2025	23/12/2025	7	CAISSON 15	4.000 PSI	4	3	78,8	20,0	228,7	296,0	29,02	4228	5492
224	16/12/2025	23/12/2025	7		4.000 PSI	3	3	82,8	20,5	227,8	280,4	27,50	4006	5241
229	17/12/2025	24/12/2025	7	C2A12 / C4A7 / C6A8 / C8A9	3.000 PSI	3	2	81,6	20,3	209,9	262,3	25,72	3747	4949
230	17/12/2025	24/12/2025	7		3.000 PSI	3	2	78,9	20,3	200,9	259,6	25,46	3708	4905
159	27/11/2025	25/12/2025	28	C2A4	3.000 PSI	4	2,5	79,7	20,0	234,3	299,7	29,40	4282	
160	27/11/2025	25/12/2025	28		3.000 PSI	4	2,5	82,1	20,0	240,0	298,1	29,23	4258	
165	28/11/2025	26/12/2025	28	C4A2 / C10A2 / C12A5	3.000 PSI	4	2	78,9	20,0	183,4	237,2	23,26	3388	
166	28/11/2025	26/12/2025	28		3.000 PSI	4	2	78,4	20,8	186,8	243,0	23,83	3471	
235	19/12/2025	26/12/2025	7	C4A9 / C8A11	3.000 PSI	4	2	82,8	20,4	154,2	189,9	18,62	2702	3764
236	19/12/2025	26/12/2025	7		3.000 PSI	4	2	79,6	20,0	139,4	178,5	17,51	2540	3581
241	20/12/2025	27/12/2025	7	CAISSON 2	4.000 PSI	4	3	79,5	20,1	190,8	244,8	24,01	3497	4666
242	20/12/2025	27/12/2025	7		4.000 PSI	4	3	80,6	20,4	204,1	258,2	25,32	3688	4882

Uso de refrentado no adherido para la determinación de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresión de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

** Resistencia Probable Proyectada de 7 días a 28 días, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d} = 50 + 1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm²)

OBSERVACIONES:

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

Consuas Ingeniería: Calle 46 No. 20 - 34 Barrio Saenz, (Manizales)
Teléfono: (6) 8853226 Celular: 3216403428



RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04
Fecha V: 21-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO : CORREDOR VERDE VILLAMARIA - CHINCHINA
INTERESADO : Ingo. JULIO SALGADO GALEANO y/o CONSORCIO JE 2025
LOCALIZACION : PUNTO CRITICO K4+700. VIA VILLAMARIA - CHINCHINA EN CALDAS

DICIEMBRE 30 y 31 DE 2025

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm2	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm2	MPa	P.S.I.	
247	23/12/2025	30/12/2025	7	C6A12/C12A1	3.000 PSI	4	2	80,0	20,0	153,0	195,0	19,13	2774	3846
248	23/12/2025	30/12/2025	7		3.000 PSI	4	2	79,1	19,9	140,1	180,6	17,71	2569	3614
253	24/12/2025	31/12/2025	7	Caisson 8	4.000 PSI	3	3	80,8	20,3	221,9	280,0	27,46	4000	5234
254	24/12/2025	31/12/2025	7		4.000 PSI	3	3	82,2	20,5	225,4	279,6	27,42	3994	5227

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995
El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado
** Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, segun ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm2)

OBSERVACIONES:


La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 14 de febrero del 2025 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

Consuas Ingeniería: Calle 46 No. 20 - 34 Barrio Saenz, (Manizales)
Teléfono: (6) 8853226 Celular: 3216403428

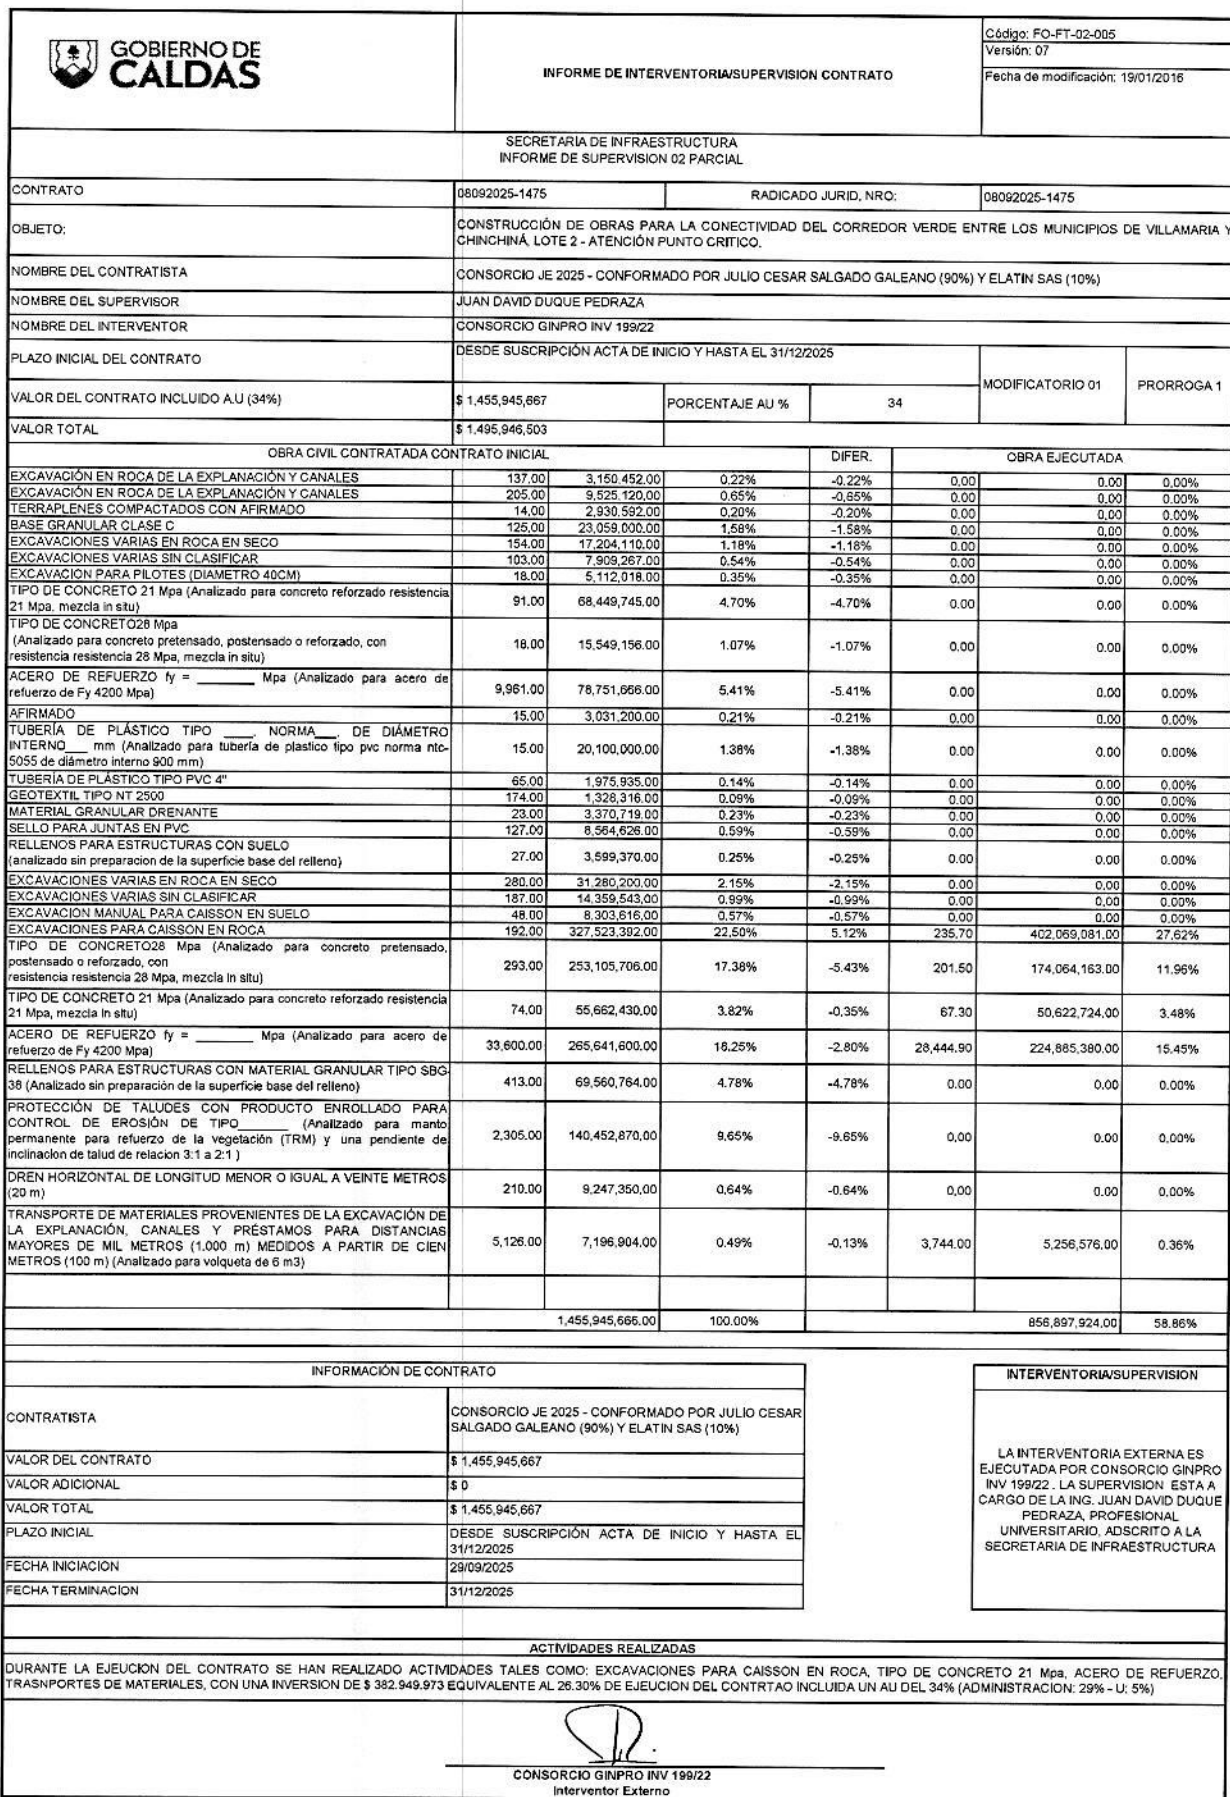



GOBIERNO DE
CALDAS

INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 02 PARCIAL AL
CONTRATO DE OBRA 080902025-1475

COPIA CONTROLADA
SIC

Código: FO-FT-02-005

Versión: 07

Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA

25/02/2026

ACTA NRO. 01 PARCIAL

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISION

CONTRATO 08092025-1475

CONSULTORIA

OBRA: ☒

Nro. CONTRATO RADICADO:

08092025-1475

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINÁ, LOTE 2 - ATENCIÓN PUNTO CRITICO.

CONTRATISTA:

CONSORCIO JE 2025 - CONFORMADO POR JULIO CESAR SALGADO GALEANO (90%) Y ELATIN SAS (10%)

SUPERVISOR

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

INTERVENTOR EXTERNO

CONSORCIO GINPRO INV 199/22

PREGUNTAS

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal

X

Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora

X

La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros

X

Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.

X

Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas

X

Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable

X

Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra

X

Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios

X

Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva

X

La obra cuenta con valla publicitaria

X

Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra

X

La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas

X

En la obra se realizan quemas a cielo abierto

X

Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil

X

Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado

X

El cambio de aceites se realiza en la obra

X

Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra

X

El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas

X

Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados

X

Se usan baños portátiles

X

Se entrega folantes informativos para la comunidad

X

Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra

X

Se afectan corredores de fauna nativa

X

Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región

X

Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra

X

Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra

X

Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)

X

Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire

X

Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición

X

se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra

X

Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región

X

OBSERVACIONES:

CONSORCIO GINPRO INV 199/22
Interventor Externo
