
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 13 V2
COMPONENTE AMBIENTAL**

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 30 de Abril de 2025)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 13 V2
COMPONENTE AMBIENTAL**

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 30 de Abril de 2025)



Control de Cambios	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<p>Versión 1 : Inicial</p> <p>V2: Atención observaciones STGSV 202532700647131</p>			
<p>V1 – Mayo/2025 V2- Junio/2025</p>	<p>Ing. Loly Vanegas Barrera Residente Ambiental Fecha 27-06-2025</p>	<p>Ing. Andrés Julián Bandera. Residente de Interventoría Fecha 27-06-2025</p>	<p>Ing. Jairo Geovanni Ortiz. Director de Interventoría Fecha 27-06-2025</p>

Tabla de contenido	
1	RESUMEN..... 3
1.1	GENERALIDADES DEL PROYECTO..... 4
1.2	DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2	ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE 6
2.1	COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 6
2.1.1	Del personal 7
2.1.2	Del cronograma ambiental y de Capacitaciones del contratista 7
2.1.3	De los permisos..... 8
2.2	COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO 9
2.2.1	Manejo ambiental de Campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio.. 9
2.2.2	Manejo de Materiales de Construcción 14
2.2.3	Manejo integral de Residuos sólidos 14
2.2.4	Control de Emisiones Atmosféricas 16
2.3	COMPONENTE C – MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 17
2.3.1	Gestión del componente Forestal por parte de Interventoría 17
2.3.2	Gestión del componente Forestal por parte del Contratista 19
2.3.3	Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte del Contratista..... 22
2.3.4	Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte de la Interventoría 23
2.4	COMPONENTE D – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23
2.5	COMPONENTE E – PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 24
3	ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL 25
3.1	FICHAS DE SEGUIMIENTO..... 25
3.2	PAGO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST..... 27
3.3	COMUNICACIONES DEL PERIODO 28
3.4	COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO 28
3.5	INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL 29
3.6	CRONOGRAMA AMBIENTAL 32
3.7	VISITAS A CAMPO 34
4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35
5	ANEXOS..... 36

Listado de Tablas

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023	4
Tabla 2. Personal SSTMA Interventoría.....	7
Tabla 3. Personal SSTMA Contratista	7
Tabla 4. Capacitaciones contratista	8
Tabla 5. Registro de Permisos Ambientales	8
Tabla 6. Listado predio demolidos en el periodo	10
Tabla 7. Listado predio de mantenimiento en el periodo	11
Tabla 8. Registro fotográfico	12
Tabla 9. Cantidades de materiales utilizados en obra	14
Tabla 10. Control de Residuos generados	15
Tabla 11. Vehículos Transportadores RCD.....	17
Tabla 12. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales	20
Tabla 13. Especies de Avifauna potencialmente presentes en los predios intervenidos	22
Tabla 14. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo	25
Tabla 15. Radicados Interventoría / Contratista / IDU	28
Tabla 16. Compromisos de Comités	29
Tabla 17. Indicadores Manejo de RCD	30
Tabla 18. Indicadores Programas MAO	30
Tabla 19. Seguimiento Cronograma Interventoría.....	32
Tabla 20. Capacitaciones Interventoría.....	33
Tabla 21. Visitas de campo.....	34

Listado de Gráficos

Ilustración No 1 – Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

Ilustración No 2 – Desempeño ambiental del periodo

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 celebró con el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”, con base en las obligación derivadas del mismo, en este documento se presenta la gestión del componente ambiental, forestal y fauna silvestre, mediante información y formatos que contemplan todas las actividades Ambientales desarrolladas por el Contratista de obra y la Interventoría durante el periodo del **1 al 30 de Abril de 2025**.

OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar registro de las actividades ejecutadas tanto por el contratista como por la interventoría durante el período del **1 al 30 de Abril de 2025**, en el marco del contrato IDU 1757-2023 cuyo objeto es la **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”** con el fin de corroborar que la implementación del MAO respondan al cumplimiento de las obligaciones descritas en apéndices técnicos respectivos, Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y normatividad ambiental y SST vigente.

Objetivos Específicos

- Dar a conocer a la entidad contratante (IDU), la gestión realizada por la interventoría en el desarrollo del contrato de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, en materia ambiental, forestal y avifauna en cumplimiento de los compromisos contractuales.
- Plasmar lo detectado durante el periodo analizado del componente Ambiental, Forestal y Fauna silvestre, basado en la supervisión realizada por interventoría.

1 RESUMEN

Mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 se celebró entre el IDU y el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”, a su vez mediante licitación pública se derivó el contrato de obra IDU 1711-2023 cuyo Objeto es “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

Por lo anterior, y con el fin de garantizar que las intervenciones cumplan con lo establecido en la etapa de ejecución, el Interventor CONSORCIO METRO CINCO, en cumplimiento de sus obligaciones de Interventoría presenta el siguiente **Informe Mensual Ambiental de Interventoría No 13** del periodo del **1 al 30 de Abril de 2025** al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

En este documento se presentan los lineamientos, información y formatos que contemplan todas las actividades ambientales desarrolladas por el Contratista de Obra en la etapa de ejecución. La formulación del documento se realizó de manera metodológica, con el objeto de establecer un seguimiento, control de todos los aspectos ambientales, que se verán potencialmente afectados por el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecución, dentro de las zonas de influencia directa e indirecta. En el Anexo 1 se consolida a través del FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría, la información del periodo.

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la tabla 1 se relacionan los aspectos generales del Contrato de obra y de Interventoría:

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023

INFORMACIÓN	CONTRATISTA		INTERVENTOR	
No. DEL CONTRATO	IDU-1711-2023		IDU-1757-2023	
OBJETO	“DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”		“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (si existen más de dos empresas que conformen el consorcio, inserte las filas que se necesiten)	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	Participación	CONSORCIO METRO CINCO	Participación
	N.A.	N.A.	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	90%
	N.A.	N.A.	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	10%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1/12/2023		22/12/2023	
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1/12/2023		22/12/2023	
FECHA DE INICIO:	19/02/2024		19/02/2024	
SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS		15 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS		15 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE	15 DÍAS		15 DÍAS	

SUSPENSIÓN No. 2		
PRORROGA No. 1	6 meses	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2025	30/04/2025

VALOR Y ADICIONES			
CONTRATO DE OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.758.862.804	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 619.959.912
ADICIÓN No. 1	N.A	ADICIÓN No. 1	\$ 531.526.172
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 5.758.862.804	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 1.151.486.084

Fuente: documentos contractuales

1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se realiza la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS de acuerdo al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento del espacio público. Así como los proyectos de la AVENIDA JORGE URIBE BOTERO Y CABLE SAN CRISTOBAL, donde aún no se ha concluido la demolición de predios.

Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregados por los propietarios dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.

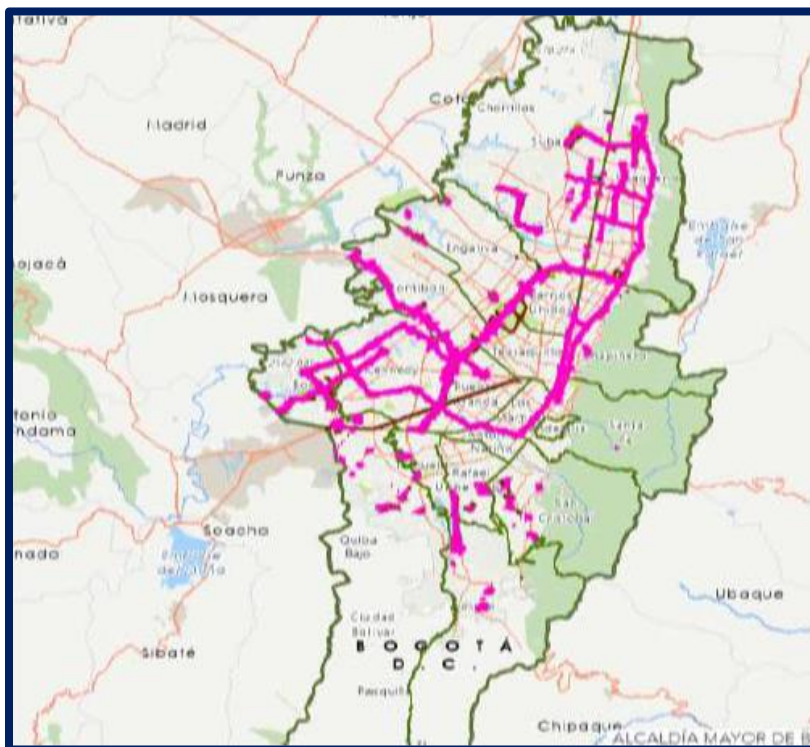


Ilustración 1 Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

La planeación de la gestión predial del contrato tiene estimado la intervención de 180 predios conforme al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRTE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento de espacio público. Así como otros predios que hacen parte de los proyectos AVENIDA JORGE URIBE BOTERO y CABLE SAN CRISTOBAL, y predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica de desarrollo de ciudad no se construyeron.

2 ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE

2.1 COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Este programa tiene como objetivo garantizar que el proyecto se desarrolle con altos estándares de desempeño ambiental y de seguridad, mediante el control de los impactos y riesgos que se generen por la ejecución de las obras, en este se detalla la información de personal, capacitaciones, permisos antes la AAC o terceros.

2.1.1 Del personal

A continuación, se describen los profesionales del área SSTMA de la Interventoría y del Contratista para la ejecución del contrato:

Tabla 2. Personal SSTMA Interventoría

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	VANEGAS	BARRERA	LOLY	MARITZA	52.853.531	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202517500092283
2	BACCA	GUTIERREZ	WILMER	EDUARDO	19.604.322	RESIDENTE SST	OGA20241750054801
3	MORENO	SALAZAR	NOEMI	-	52.981.857	ESPECIALISTA FAUNA	OGA202417500179043
4	SANDOVAL	BUITRAGO	WILSON	JAVIER	80.150.839	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA20241750054801

Tabla 3. Personal SSTMA Contratista

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	ARANGO	CRUZ	BRAYAN	STEVEN	1030654429	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202417500855171
2	VELASQUEZ	MUÑOZ	DIANA	MARCELA	53008087	RESIDENTE SST	OGA202417500044213
3	GOMEZ	SIERRA	HELENA	-	51.964.358	ESPECIALISTA EN FAUNA	OGA202417500044213
4	CASTILLO	CASTILLO	JOSE	HUMBERTO	79305644	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA202417500044213

Para el presente periodo no se presentaron cambios de personal ambiental, SST, forestal ni de fauna en el contrato de obra IDU 1711-2023 ni en el contrato de Interventoría IDU 1757-2023.

2.1.2 Del cronograma ambiental y de Capacitaciones del contratista

Frente al Cronograma Ambiental y de capacitaciones en el Anexo No 13, se adjunta el Cronograma de las actividades del área ambiental del contratista; en el cual se observa el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo evaluado, donde se desarrollaron las siguientes actividades con el seguimiento de la Interventoría a saber:

- Instalación, adecuación y manejo de campamentos con su respectiva señalización.
- Implementación de todas las actividades contempladas en el MAO.
- Ejecución de Capacitación a los trabajadores.
- Supervisión de las labores realizadas por la BOAL.

- Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental.
- Elaboración y entrega de informes ambientales mensuales.
- Verificación de utilización de proveedores y sitios de disposición final de escombros. Obtención de certificaciones.
- Coordinar y asistir a los Comités de Seguimiento Ambiental.
- Desmantelamiento y aseo de la zona donde se intervino (entrega de predios).

De igual forma se tiene el cronograma de capacitaciones y durante el presente periodo, se realizaron las siguientes (Ver Anexo 13- Cronograma):

Tabla 4. Capacitaciones contratista

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes	Concepto de interventoría
22/04/2025	Manejo de campamentos y acopios.	13	Si
22/04/2025	Implementación de medidas para controlar emisiones atmosféricas.	13	Si
22/04/2025	Residuos de construcción y demolición – PMA – RCD de reutilización	13	Si

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones del contratista para el próximo periodo (Mayo de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Funciones de BOAL – Jornadas de orden, aseo y limpieza, limpieza de llantas
- Manejo integral de residuos sólidos – Selección en la fuente, clasificación de residuos (reciclaje).
- Manejo de residuos peligrosos.

2.1.3 De los permisos

Para el desarrollo del Contrato, se describen a continuación los Permisos Ambientales que se han tramitado y que posiblemente pueden ser requeridos:

Tabla 5. Registro de Permisos Ambientales

PERMISO	Estado	TRAMITE
Tratamiento Silvicultural	No se ha requerido en el periodo	
Solicitud PIN - SDA	Asignado por la SDA 24931	IDU

Trabajo nocturno	No se ha requerido en el periodo	
-------------------------	----------------------------------	--

Fuente: El Autor

Como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6, a continuación se relaciona el cargue de información en la plataforma:

Periodo	Radicación en la SDA
1er Trimestre 2024 (Febrero-Marzo)	2025ER63036 – 25/03/2025
2º Trimestre 2024 (Abril-Mayo-Junio)	2025ER63405- 31/03/2025
3er Trimestre 2024 (Julio-Agosto-Septiembre)	2025ER67006 – 31/03/2025
4º Trimestre 2024 (Octubre- Noviembre- Diciembre)	2025ER67132 – 31/03/2025
1er Trimestre 2025 (Enero - Febrero-Marzo)	2025ER84873 – 25/04/2025

2.2 COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO

2.2.1 Manejo ambiental de Campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

De acuerdo a los requerimientos del Contrato, el Contratista tiene sus oficinas y adecuación de Campamento de Obra (Punto IDU) en la CARRERA 49 No 91 -76 Barrio la Castellana en Bogotá, D.C.; en esta oficina funciona las siguientes dependencias:

- Dirección y Gerencia de la Obra.
- Área Técnica.
- Área Ambiental: (Residente Ambiental, Residente SST, Especialista Forestal y especialista de fauna silvestre).
- Área Social (Residente Social).

Para el presente periodo, se han desarrollado las demoliciones y mantenimientos de los RT's que se relacionan en la tabla 6 y 7.

2.2.1.1 Actividades de Demolición

En el periodo analizado se intervinieron los predios mencionados en la siguiente tabla 6:

Tabla 6. Listado predio demolidos en el periodo

RT	LOCALIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA	ESTADO DE EJECUCIÓN
54800	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	PARCIAL
54851	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54860	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54861	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54833	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54868	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54867	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54866	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54865	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	EJECUTADO
54823	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DESMANTELAMIENTO	EJECUTADO
54302	SAN CRISTOBAL SUR – LA VICTORIA	DESMANTELAMIENTO	EJECUTADO
54321	SAN CRISTOBAL SUR – BELLO HORIZONTE	DESMANTELAMIENTO	EJECUTADO
42983	SAN CRISTOBAL SUR – LA VICTORIA	DESMANTELAMIENTO	EJECUTADO
54800	CIUDAD BOLIVAR – LA ESTANCIA	DEMOLICIÓN	PARCIAL

2.2.1.2 Actividades de Mantenimiento

Durante el periodo analizado y de acuerdo con los predios entregados por la entidad para mantenimiento, limpieza y cerramiento, se intervinieron los relacionados a continuación:

Tabla 7. Listado predio de mantenimiento en el periodo

RT	ACTIVIDAD EJECUTADA	ESTADO DE EJECUCIÓN
11512	CERRAMIENTO	EJECUTADO
11076	CERRAMIENTO	EJECUTADO
11277	PODA PTA DE TEJA	EJECUTADO
11292	PODA PTA DE TEJA	EJECUTADO
6935	JARILLONES	EJECUTADO
47719	LIMPIEZA Y CERRAMIENTO	EJECUTADO
47723	LIMPIEZA Y CERRAMIENTO	EJECUTADO
42464	CERRAMIENTO	EJECUTADO
11222	PODA PTA DE TEJA	EJECUTADO
11113	PODA PTA DE TEJA	EJECUTADO
11125	PODA PTA DE TEJA	EJECUTADO
49228	LIMPIEZA Y CERRAMIENTO	EJECUTADO

Para todos los casos de intervención realizado por el contratista, la Interventoría realizó la verificación de las actividades necesarias para la ejecución de las obras tales como: PMT, MAO, entre otros, hasta la culminación de actividad en cada predio.

Para el desarrollo de las actividades antes descritas y de acuerdo a la dinámica del contrato el contratista contó con campamentos móviles (carpas) o campamentos temporales con zonas para el cambio de ropa de los trabajadores y unidades sanitarias, puntos ecológicos, punto de hidratación, kit de derrames.

Para el periodo analizado en el presente informe, el Contratista adjunta la certificación del mantenimiento y manejo de 5 unidades sanitarias, en el anexo 14 se encuentran Certificado de los mantenimientos y de vertimiento de los baños móviles ubicados en los frentes de obra.

En el marco de las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua, previo a las intervenciones se verificó la existencia de sumideros o cuerpos de agua y para el periodo analizado no se evidenció cuerpos de agua y los sumideros aledaños se protegieron según lo requerido. Se deja registro en el anexo 7 mediante el formato FOAC50 Manejo de Aguas.

Dentro de las actividades de limpieza y mantenimiento a predios se incluye la actividad de corte de césped y los residuos generados son recolectados y llevados a sitio de aprovechamiento.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

Tabla 8. Registro fotográfico

 <p># 57X-2 Transversal 73j Ciudad Bolívar Bogotá, D.C. 9 abr. 2025 10:39:49 a. m.</p>	 <p># 57X-30 Carrera 73j Ciudad Bolívar Bogotá, D.C. 25 abr. 2025 9:51:17 a. m.</p>
 <p># 57X-84 Carrera 73j Ciudad Bolívar Bogotá, D.C. 15 abr. 2025 9:29:03 a. m.</p>	 <p># 73B-93 Avenida 57R Sur Ciudad Bolívar Bogotá, D.C. 25 abr. 2025 9:56:52 a. m.</p>
<p>Actividades de demolición de predios</p>	



En el Anexo 9 se encuentra el registro fotográfico total del periodo.

2.2.2 Manejo de Materiales de Construcción

Para el periodo del presente informe se describen los siguientes materiales que ingresaron y los residuos generados dispuestos en los sitios autorizados para tal fin, a saber:

De acuerdo al objeto del contrato y las actividades de ejecución de obra, a continuación se relacionan la cantidad de materiales utilizados a la fecha, los cuales son usados en las actividades de mantenimiento para realizar cerramientos, que certifican que cumplen con la normatividad ambiental vigente (Ver Anexo 2 FOAC53 Control de materiales).

Tabla 9. Cantidades de materiales utilizados en obra

N.	PERIODO	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD UND
1	19 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
2	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
		MADERAS DEL VALLE	DURMIENTE 4CM*4CM*3M	7
3	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300
4	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	120
5	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	60
6	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	40
7	1 SEPTIEMBRE AL 11 SEPTIEMBRE Y DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	680
8	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	370
9	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	575
10	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	310
11	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300
12	1 AL 31 DE MARZO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	850
13	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	435

2.2.3 Manejo integral de Residuos sólidos

2.2.3.1 Residuos de Construcción y Demolición -RCD

Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades de demolición manual y mecánica, cuyos RCD fueron trasladados a la planta de aprovechamiento de SECAM JR SAS (Ver Anexo 16), a continuación, se presenta en la siguiente tabla las cantidades correspondientes.

Tabla 10. Control de Residuos generados

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MATERIAL	CANTIDAD (m³) o (Ton)
SECAM JR SAS	RCD	1568 m3 (2459,09Ton)
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J SAS	Residuos metálicos	2,36 m3 (4,08 Ton)
ECO ENVIROMENTAL DE COLOMBIA	Poda de césped	1890 m3 (2422,98 Ton)

Fuente: El Autor

Para efectuar la conversión de metros cúbicos (m³) a toneladas (Ton), se hace uso de los valores proporcionados en la Tabla 9, específicamente de acuerdo al tipo de material. En el caso de los residuos Metálicos, se toma en consideración la certificación de SOLUCIONES AMBIENTALES A&J, que indica un volumen de 4.08 Ton, Al aplicar el factor de conversión correspondiente de Ton a m3, el cual es de 1,73 según lo establecido en la mencionada tabla, se obtiene un total de 2.36 metros cúbicos.

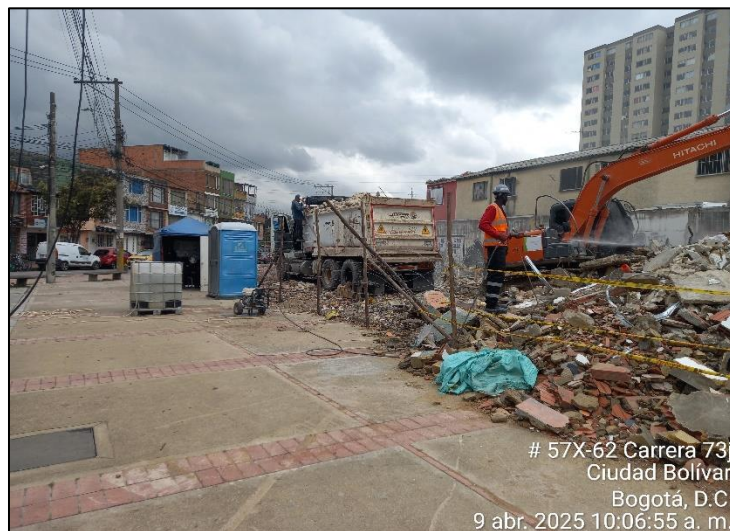
GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M3)
I - RESIDUOS COMUNES MEZCLADOS	1648,85
II - RESIDUOS DE MATERIAL FINO	1700,00
III - RESIDUOS COMUNES NO INERTES	698,88
IV - RESIDUOS METALICOS	7307,67
V - RESIDUOS ORGANICOS	1282,67
VI - RESIDUOS CONTAMINANTES	1891,28

Fuente: Guía para la elaboración del PGRCD de la SDA

Las certificaciones de disposición final del material generado, durante el periodo se encuentran en el Anexo 16, así mismo y como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6 del presente informe.

2.2.4 Control de Emisiones Atmosféricas

Durante el período, dado que se realizaron actividades de demolición mecánica, fue necesario controlar las emisiones usando carro tanques para humedecer el área.



Se garantizó para el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) que, durante su transporte, los vehículos autorizados transportan el material cubierto hasta la planta de aprovechamiento.

Las volquetas con las cuales se realizó retiro de RCD durante el periodo, previamente fue revisada por parte de Interventoría la documentación de SOAT, Tecno mecánica y el registro del PIN de transportador como se relacionan a continuación:

Tabla 11. Vehículos Transportadores RCD

PLACA	PIN	Revisión de interventoría
SQW491	3464	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 22/04/2013 y "ACTIVO"
LUW161	22653	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 23/02/2023 y "ACTIVO"
SZN675	21257	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 24/03/2022 y "ACTIVO"
TTY202	3446	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 22/04/2013 y "ACTIVO"
TGL341	12028	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 31/10/2016 y "ACTIVO"
CQN013	775	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 13/12/2012 y "ACTIVO"
FTI830	2662	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 15/01/2013 y "ACTIVO"

Fuente: El Autor

En el anexo 8 se incluye el FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas).

2.3 COMPONENTE C – MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

En el marco del contrato de Interventoría, a continuación, se describen las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría durante el periodo analizado así:

2.3.1 Gestión del componente Forestal por parte de Interventoría

La gestión adelantada por parte de la Interventoría, corresponde a:

2 de abril de 2025: La Interventoría asiste al Comité semanal Componente Ambiental, en el cual se informa acerca la cotización de las actividades forestales de remoción tanto de los individuos de *Ricinus communis* (Higuerilla) como de los individuos de *Ulex europaeus* (Retamo espinoso) que fue enviada por el contratista, sin embargo, se reitera que, aunque se consideren los altos valores de las actividades que allí se presentan, el IDU debe primero dar respuesta por escrito para dar alcance a los oficios GMC-134-035-2025 y GMC-134-042-2025 remitidos desde el mes de enero del año en curso, con el objetivo de aclarar la real necesidad de desarrollar un inventario forestal y una solicitud de aprovechamiento forestal, que a criterio de esta interventoría debe consultarse oficialmente a la autoridad ambiental competente (SDA), dado que se trata de un caso atípico y ante esto y ante el hecho de la inversión que

debe realizarse, es importante tener claro el procedimiento a ejecutar a través de una comunicación interinstitucional oficial, lo cual, es lo que se solicita en dichos oficios.

11 de abril de 2025: La Interventoría asiste al Comité semanal Componente Ambiental, en el cual se detalla el seguimiento al desarrollo de las actividades de la semana, donde se realiza seguimiento a las actividades de mantenimiento y recolección de residuos vegetales en los RT 11277 y 11292 ubicado en la localidad de Engativá. Al respecto se indica que, al predio aledaño a Diverplaza en donde están ubicados individuos de especie *Ricinus* comunis (Higuerilla), está pendiente la respuesta por parte del IDU frente a su manejo, en relación a lo indicado por el profesional forestal IDU, quien ha informado en anteriores comités que se ha trasladado la consulta del caso a la autoridad ambiental (SDA). Se informa también que, a la fecha no se ha realizado el manejo de *Ulex europaeus* (retamo espinoso) del predio de la ALO, el Contratista remitió cotización respecto a la actividad, la cual fue revisada y remitida a IDU.

25 de abril de 2025: La Interventoría asiste a Comité Integral Seguimiento CTO IDU 1711-2023 en el cual el arquitecto Mauricio de IDU solicita un informe resumen respecto a la tala de la Higuerilla en donde también se mencione si existe alguna otra alternativa de manejo.

30 de abril de 2024: La Interventoría recibe correo con remisión del oficio 202517500119813 del 15 de abril en donde la OGA solicita a la Dirección técnica de predios IDU que se alleguen los documentos de:

- Pagos por concepto de seguimiento ambiental.
- Trámite de salvoconductos de movilización de madera.
- Informe técnico de disposición de residuos.
- Formatos de ejecución silvicultural.
- Compensación ambiental.

Lo anterior respecto a las “talas por emergencia” ejecutadas durante el contrato del predio ubicado en la carrera 7ª con Calle 94, a lo cual, Interventoría con base en la información allegada por el Contratista y conforme a su labor de supervisión de las actividades ya ejecutadas, da respuesta indicando que, en relación a los conceptos técnicos de emergencia SSFFS-05631 del 31-05-2024 - acta CJB-20240900-00003 - SSFFS-05650 del 31-05-2024 – acta CJB-20240900-00002 SSFFS-05758 del 06-06-2024 – acta LEA-20240548-25275 Radicados IDU: 202552600416002, 202552600416422, 202552600376802, se desarrollaron actividades de tala en la carrera séptima, en una Fase I durante el mes de abril de 2024, se continuó con una Fase II en el mes de mayo de 2024 y finalizó con una Fase III en el mes de agosto de 2024 (ver informes No. 2, No.3 y No 6 y todos sus anexos) en donde cada uno de los informes se encuentran acompañado del registro fotográfico de liberación de avifauna, inventario forestal y fichas de tratamiento silvicultural. Estos informes, que incluyen tanto el informe de disposición de residuos y los formatos de fichas de ejecución silvicultural solicitados, fueron revisados por Interventoría y allegados al IDU en los informes mencionados.

No obstante, la información como pagos por concepto de seguimiento ambiental, trámite de salvoconductos y compensación ambiental, es una información que, de acuerdo a lo indicado

durante los comités llevados a cabo en los meses que secundaron la ejecución de estas talas, por parte del profesional forestal IDU de turno, por ser “talas de emergencia”, no se consideraban desarrollar en gestión por parte del contrato.

2.3.2 Gestión del componente Forestal por parte del Contratista

Durante abril de 2025 se continuó con el seguimiento a la solicitud de retiro de los ejemplares de higuierilla ubicados en el RT 6850. Con este propósito, se entrega un reporte de posibles actividades, en el cual se concluye que cualquier tipo de tratamiento silvicultural que se desee adelantar debe estar respaldado por un acta emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente. Por lo tanto, INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S. recomienda evaluar la posibilidad de realizar el inventario forestal de dicha especie, con el fin de presentar la solicitud de trámite ante la SDA.

Dicha información fue enviada mediante el oficio INF-INT-IDU1711-303-2025, el 30 de abril de 2025. La propuesta se encuentra en estudio por parte de la interventoría, la cual será trasladada a la supervisión técnica para proceder con la decisión final.

Tabla 12. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales

N.	Permiso			Autorizaciones												Fecha de ejecución	N. Informe	Periodo del informe	Obligaciones derivadas del permiso	Observaciones
				Tala			Traslado			Conservación			Poda							
	Tipo de permiso	Número	Fecha	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente					
1	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA LEA-20240548-00017	1-abr-24	18	18	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 36 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
2	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA- LEA-20240548-00018	1-abr-24	19	19	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 38 árboles.	
3	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	RADICADO SDA2024ER36451 ACTA JRGR-20240399-001	13-feb-24										1	1	0	23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Ninguna	Ninguna
4	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta 00002- radicado 2024ER72556	23-abr-24	11	11	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 22 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con
5	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta 00003 - radicado 2024ER72556	24-abr-24	9	9	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 18 árboles	

																			este requerimiento.
6	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	No. de visita: 25330 No. de acta: 25275 Radicado 2024EE118667	4-jun-24	12	12	0									2 y 3 de Agosto de 2024	6	1 a 31 de Agosto de 2024	Ninguna	Ninguna
7	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659	2-feb-24	33	0	33										6	1 a 31 de Agosto de 2024	Compensación por tala de árboles \$ 57.693.644. Por concepto de evaluación \$ 146.160 y por seguimiento \$ 302.760	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.

Las anteriores actividades se desarrollaron en las siguientes fases, en donde se describe la cantidad de fichas de manejo silvicultural entregadas:

- **Fase I -Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de abril del 2024 al 31 de abril del 2024:** Se entregan **114 fichas de manejo silvicultural**, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala y la limpieza del área la cual incluía árboles caídos, rebrotes e individuos arbóreos de la especie retamo liso en acta LEA-20240548-00017 y LEA-20240548-00018.
- **Fase II – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo del 2024:** Se entregan **20 fichas de manejo silvicultural**, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 002 y 003.
- **Fase III – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto del 2024:** Se entregan **16 fichas de manejo silvicultural**, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 25275.

Durante las tres (3) fases de tratamiento silvicultural se determinó en comités del área ambiental e integrales que la compensación estaría a cargo de la entidad, en este caso el instituto de desarrollo urbano (IDU), finalmente, INFRAESTRUCTURA INTEGRAL solicita aclaración de este tema bajo oficio INF-INT-IDU-1711-085-2024 del 07 de mayo de 2024. Es importante tener en cuenta que las tres (3) fases se ejecutaron bajo ACTAS DE EMERGENCIA. La obligación de la recolección de residuos estuvo a cargo de la entidad UAESP, por lo tanto, no se entregan certificaciones de disposición.

2.3.3 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte del Contratista

Durante el mes de abril de 2025, en el marco de las actividades de seguimiento y evaluación ambiental en la zona de intervención, se llevaron a cabo actividades correspondientes a mantenimiento de predios (podas, limpieza y recolección de residuos sólidos), con la participación de especialistas forestales y ambientales del contrato.

Durante los recorridos, se realizaron inspecciones detalladas del entorno con el objetivo de identificar la presencia de ejemplares de especies de fauna y/o nidos que pudieran ser vulnerables a las futuras actividades de manejo silvicultural en el área de los frentes de trabajo que se encontraban activos. Sin embargo, no se identificaron especies de fauna silvestre ni estructuras asociadas (como nidos o madrigueras) que pudieran verse afectadas por las intervenciones programadas. No obstante, se continuará con el monitoreo constante del área, en cumplimiento de las directrices ambientales y con el fin de garantizar la protección de la biodiversidad presente en la zona de influencia del proyecto. En el Anexo 9 Registro fotográfico, en la carpeta Mantenimientos se relacionan las fotografías de estas actividades.

Aunque no se visualizaron nidos y/o madrigueras, dada la gran superficie de las zonas verdes existentes y la vegetación observada en cada predio intervenido, en la siguiente tabla, se presentan las especies de avifauna de posible presencia y/o avistamiento en las áreas intervenidas.

Tabla 13. Especies de Avifauna potencialmente presentes en los predios intervenidos

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	GREMIO TRÓFICO	PATRÓN DE MIGRACIÓN
Apodiformes	Trochilidae	<i>Colibri coruscans</i> (Chillón común)	LC (Preocupación menor) UICN Apéndice II CITES	Nectarívoro	Residente
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i> (Gallinazo)	LC (Preocupación menor) UICN	Carroñero	Residente
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i> (Torcaza)	LC (Preocupación menor) UICN	Granívoro	Residente
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i> (Alcaraván)	LC (Preocupación menor) UICN	Omnívoro	Residente
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i> (copetón)	LC (Preocupación menor) UICN	Granívoro	Residente
	Fringillidae	<i>Spinus psaltria</i> (Chisga capanegra)	LC (Preocupación menor) UICN	Granívoro	Residente
	Hirundinidae	<i>Orochelidon murina</i> (Golondrina ahumada)	LC (Preocupación menor) UICN	Insectívoro	Residente
	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i> (chamón parásito)	LC (Preocupación menor) UICN	Insectívoro - granívoro	Residente

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	GREMIO TRÓFICO	PATRÓN DE MIGRACIÓN
	Turdidae	<i>Turdus fuscater</i> (Mirla común)	LC (Preocupación menor) UICN	Omnívoro	Residente

Otros grupos de fauna

Otras especies de potencial presencia son las pertenecientes al grupo *Herpetos*, representado por la especie *Atractus crassicaudatus* (culebra sabanera) y del grupo Mamíferos es posible la presencia de ejemplares de *Cavia anolaimae* (curi), asociados frecuentemente con ambientes húmedos. Así mismo, es muy probable la presencia de mamíferos con *Rattus rattus* (rata negra), *Mus musculus* (ratón casero) y *Rattus norvegicus* (rata gris), comúnmente asociados a los ambientes urbanos.

De acuerdo con las actividades de mantenimiento programadas en el próximo mes, se realizarán las actividades correspondientes al componente Fauna Silvestre.

2.3.4 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte de la Interventoría

Durante este mes, en el marco de las actividades de seguimiento y evaluación ambiental en la zona de intervención, se realizó el asesoría y soporte técnico a la profesional de fauna en la identificación potencial de la avifauna que puedan ser vulnerables a las futuras actividades de manejo silvicultural en el área de los frentes de trabajo que se encontraban activos.

Hasta la fecha, no se han identificado especies de fauna silvestre ni estructuras asociadas (como nidos o madrigueras) que pudieran verse afectadas por las intervenciones programadas. No obstante, se continuará acompañando al profesional con el monitoreo constante del área, en cumplimiento de las directrices ambientales y con el fin de garantizar la protección de la biodiversidad presente en la zona de influencia del proyecto y se hace el acuerdo para realizar la visita en el próximo mes.

Por otro lado, aunque no se registraron comportamientos reproductivos, se reportan especies de aves potenciales para áreas urbanas en la ciudad de Bogotá, tal como se mencionan en la Tabla N. 13.

2.4 COMPONENTE D – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se presenta reporte de este componente a través de la plataforma ZIPA.

2.5 COMPONENTE E – PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Para las intervenciones que se han realizado al corte del presente informe, se tiene que, previamente al inicio de las actividades de mantenimiento o de demolición se implementa demarcación del predio para aislar de las actividades de desmantelamiento y selección de residuos sólidos y voluminosos visualizados en cada predio, se garantizan pasos peatonales seguros de acuerdo con el PMT específico para cada intervención.



Indicadores de Cumplimiento de acuerdo al Plan de Acción

Componente	Indicador	Porcentaje	Valores	Cumplimiento
Componente A	No. Profesionales que laboran el proyecto/No. profesionales requeridos contractualmente *100	100%	4/4 *100%	100%

Fuente: El autor

3 ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Para el presente periodo se adelantaron actividades de seguimiento a las actividades de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, a través de visitas con registro en bitácora, el seguimiento fue reportado en comité semanal y con la presentación de los informes semanales (del 52 a 55) que contiene todos los componentes del contrato.

En el presente informe se recopila la gestión del mes y se complementa con la información presentada por el contratista, esta Interventoría una vez revisada la versión 2 del informe ambiental presentado por el Contratista, y dado a que dio atención a cada una de las observaciones, se *da concepto de Aprobación* del **Informe Ambiental No 13 v2**. Por lo que en el anexo 16 se encuentra el oficio respectivo.

En cumplimiento de las funciones de interventoría, específicamente de verificación de generación y disposición de RCD se aclara que en el Anexo No 12, se incluye el Acta de pago Parcial de Obra, por lo que se remiten las cantidades respectivas. Se aclara que dado a que la forma de pago es en metros cuadrados y no hay una conversión a cúbicos o toneladas la verificación del cumplimiento se realiza a través del formato FO-AC-55 PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION incluido en el Anexo 5.

A continuación, se detalla las actividades y herramientas de seguimiento utilizadas por la Interventoría.

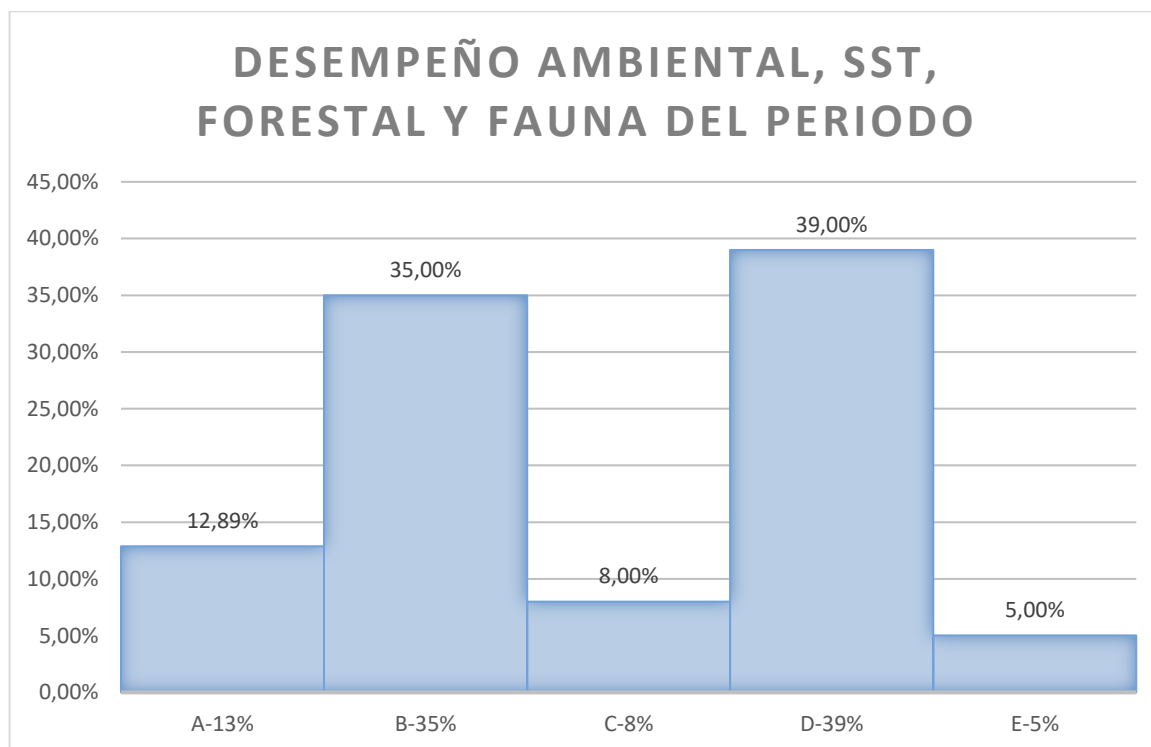
3.1 FICHAS DE SEGUIMIENTO

En este capítulo se presenta, la evaluación dada al contratista durante las actividades desarrolladas mediante el Formato FOAC-32 Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales que para el periodo se resume así:

Tabla 14. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
1	19 de Febrero al 31 de Marzo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
2	1 a 30 de abril de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
3	1 a 31 de mayo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
4	1 a 30 de Junio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
5	1 a 31 de Julio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
6	1 a 31 de Agosto de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
7	1 a 11 de Septiembre y del 24 al 31 de Octubre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
8	1 a 30 de Noviembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
9	1 a 31 de Diciembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	100%
10	1 a 31 de Enero de 2025	13%	35%	8%	38,54%	5%	99,54%
11	1 a 28 de Febrero de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	100%
12	1 a 31 de Marzo de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	100%
13	1 a 30 de abril de 2025	12,89%	35%	8%	39%	5%	99,89%



El desempeño mensual del Contratista fue de **99,89%**. Ver Anexo No 10 FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0.

3.2 PAGO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

De acuerdo con la cláusula 7 del contrato de obra la cual establece:

CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor se estima en la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (\$5.758.862.804) M/CTE**, equivalentes a 4.964,53 SMLMV para el año 2023, incluido los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la propuesta económica presentada por el oferente, distribuido de la siguiente manera:

EL VALOR DE COSTOS DIRECTOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE EL VALOR DEL A.I.U. corresponde a la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$5.273.569.895)

EL VALOR DE COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO INCLUYE A.I.U. es la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$393.317.474).

EL VALOR DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA es la suma NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$91.975.435).

Para el corte del periodo, conforme a la forma de pago la cual establece que:

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el avance de obra, así:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Valor} & & \text{Valor} & \% & \% \\ \text{mensual a} & & \text{Máximo} & \text{Cumplimiento} & \text{Avance} \\ \text{facturar} & = & \text{fijo} & \text{X} & \text{de} \\ \text{Componente} & & \text{SGA y} & \text{fichas de} & \text{Obra} \\ \text{SGA y SST} & & \text{SST} & \text{seguimiento} & \\ & & & \text{SGA y SST} & \end{array} \quad \text{X}$$

Se tiene que para el mes de **Abril de 2025**, dado a que se tramitó la respectiva acta de obra, a continuación se relaciona el valor respectivo del pago ambiental.

\$519.441.847 (V/R Global) x 6,11 % (**AVANCE**) x 99,89% (**Calificación**) = \$ **31.733.226 (V/R a pagar)***

***Nota:** Teniendo en cuenta que en el mes 13 se debía pagar \$ 31.733.226 y se reconocieron \$ 31.768.171 (como si hubiera obtenido una calificación de 100% de

desempeño Ambiental), se tiene que se descontará el monto de \$ 34.945 (valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado y lo que se debía pagar) para el próximo mes.

La calificación corresponde al promedio obtenido en los componentes AMBIENTAL, SST, SOCIAL y COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.

3.3 COMUNICACIONES DEL PERIODO

A continuación, se relaciona la correspondencia reportada en el mes:

Tabla 15. Radicados Interventoría / Contratista / IDU

Comunicación	Asunto	Destinatario	Fecha de Radicación
INF-INT-IDU1711-296-2025	Respuesta oficio GMC-134-111-2025 atencion observaciones inf ambiental N. 12	CONSORCIO METRO CINCO	10/04/2025
INF-INT-IDU1711-302-2025	Respuesta derecho de petición RT 54820 – Ciudad Bolivar, La Estancia	CONSORCIO METRO CINCO	24/04/2025
INF-INT-IDU1711-303-2025	Informacion de actividades silviculturales RT 3723	CONSORCIO METRO CINCO	30/04/2025
GMC-134-111-2025	Revisión informe mensual Ambiental N. 12 V1 Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	09/04/2025
GMC-134-123-2025	Remisión Informe Mensual Ambiental N. 12 V1 de Interventoría	IDU	14/04/2025
GMC-134-124-2025	Revisión y aprobación Informe Mensual Ambiental N. 12 V2 del Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	14/04/2025
GMC-134-134-2025	Respuesta al oficio IDU 202532500410971 - Aprobación HV Residente Ambiental Interventoría.	IDU	24/04/2025
GMC-134-136-2025	Remisión oficio INF-INT-IDU1711-302-2025 Atención derecho petición RT54820 La Estancia - Componente Ambiental	IDU	28/04/2025
GMC-134-137-2025	Respuesta Radicado 2025EE78494 de la SDA permiso de poda árboles - RT 8385 – Edificio Alcazaba de Córdoba	IDU	30/04/2025

Fuente: El Autor

3.4 COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO

En el marco del seguimiento que realiza la interventoría, se desarrollan comités semanales con la participación de Contratista, IDU e interventoría, para reportar la gestión y establecer los compromisos adquiridos con el siguiente contenido programático y temas tratados:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLE OBSERVACIONES DE LA MISMA:
2. Verificación de compromisos
3. Gestión documental
 - 3.1 Documentos del área ambiental (incluye forestal y Fauna)
 - 3.2 Documentos del área SST
4. COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
5. Componente forestal y Fauna
 - Componente SST
 - Componente E Señalización

A continuación, se relacionan los comités realizados en el periodo, indicando la fecha y los compromisos adquiridos, responsable y el estado así:

Tabla 16. Compromisos de Comités

Descripción del compromiso	Comité No.	Responsable	Se cumplió (S/N)
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 37 del 4 de Abril de 2025	Interventoría	Si
Atención observaciones informe SST #11 Contratista		Contratista	Si
Actas de cierre de talas de emergencia		IDU	Pendiente
Pronunciamiento del estado de informes mensuales Componente Forestal		IDU	Pendiente
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 38 del 11 de Abril de 2025	Interventoría	Si
Atención observaciones informe SST #11 Contratista		Contratista	Si
Actas de cierre de talas de emergencia		IDU	Pendiente
Pronunciamiento del estado de informes mensuales Componente Forestal		IDU	Pendiente
Informe de alternativas para manejo de individuos especie Higuierilla en predio Diverplaza	Comité Integral de Obra del 25 de Abril de 2025	Contratista e Interventoría	Si

Fuente: El Autor

En el anexo 11 se incluyen las actas de comité semanal realizadas en el periodo.

3.5 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

A continuación, se describen los indicadores para cada uno de los programas ofertados en el Manejo Ambiental de Obra – MAO, los indicadores de seguimiento que son aplicados mensualmente en el desarrollo de las actividades correspondientes al componente ambiental. Específicamente para el apartado RCD:

Tabla 17. Indicadores Manejo de RCD

Nombre del Indicador	Formula	Datos para Aplicar Formula		Aplicación Indicador
Indicador de Efectividad	Cantidad de Residuos dispuestos en sitio autorizado/ cantidad estimada de Residuos a generar x 100	Residuos Dispuestos	Cantidad a Generar	Indicador
		4886,15Ton	** 105.287,91 Ton	4,64 % Respecto del total a generar, No obstante respecto del mes se tiene un ** 99.92% de mes

** De acuerdo con la naturaleza y meta física del contrato se estableció en el PGIRCD un volumen total a generar por 105.287,71 Ton incluido material de demolición y residuos de material vegetal de poda por limpieza de predios, en cuya aplicación del Decreto 507 de 2023, se establece se debe cumplir con el 25%, sin embargo, la totalidad del material generado tanto de demolición como residuos vegetales ha sido entregado a planta de aprovechamiento.

Tabla 18. Indicadores Programas MAO

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	INDICADOR	CÁLCULO
A1	Acciones correctivas y/o preventivas a observaciones	No. De observaciones atendidas / No. De observaciones requeridas	N.A
	Manejo de campamentos	No. De baños por cantidad de obreros instalados / No. De baños por cantidad de obreros propuestos	5/5 = 1
	Desmantelamiento de instalaciones temporales	No. de instalaciones temporales retiradas / No. de instalaciones temporales ubicadas.	2/2 = 1
A2	Personal contractual profesional	No. De personal vinculado / No. De personal requeridas*100	$(4/4) \times 100 = 100\%$
	BOAL	No. De BOAL / No. De BOAL requerido * 100	$(2/2) * 100 = 100\%$
A3	Cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento	Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas*100	$(1/1) \times 100 = 100\%$
	Eficacia de las capacitaciones	No. Total de evaluaciones con calificación de 4 o 5 / No. Total de evaluaciones aplicadas *100	N:A

	Cobertura del proceso de capacitación en HSE.	N° de asistentes / N° de trabajadores programados * 100	N.A.
B2	Acopio de materiales	Volumen de material certificado / Volumen de material utilizado en el periodo	N.A
B3	Manejo integral de residuos solidos	No. de puntos para residuos instaladas / No. de puntos para residuos propuestos	4/4 = 1
	Manejo de residuos de construcción y demolición -RCD-	Volumen de RCD certificados / Volumen de RCD generados	3458/3458 = 100%
		Volumen de material de rehúso utilizado / Volumen de material de rehúso generado	N.A
	Manejo de residuos peligrosos y plan de contingencia	Volumen de Residuos peligrosos transportados certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A
		Volumen de Residuos peligrosos dispuestos certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A.
B4	Control emisiones atmosféricas	No. De vehículos en la obra con certificación técnico mecánica vigente / No. De vehículos en obra	7/7 = 1
		Puntos donde se realiza humectación / Puntos donde se identifica necesidad de humectación	1/1 = 1
B5	Limpieza de sumideros	No. De sumideros limpiados / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	N.A
		No. De sumideros protegidos / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	N.A
C1	Talas	No. De talas ejecutadas / No. De talas propuestas	0/0=0 Se tiene previsto realizar talas por emergencia en predio al frente de Diverplaza, se realizaran una vez se realice la coordinación con ENEL.
	Protecciones	No. De árboles para permanencia protegidos / No. De árboles para permanencia propuestos	N.A.
E1	Cerramientos por frente	N° de cerramientos realizados / N° Frentes que requirieron cerramiento*100	(1/1) × 100 = 100%

Fuente: El Autor

3.6 CRONOGRAMA AMBIENTAL

La interventoría realizó seguimiento al cronograma ambiental del contratista y al cronograma de capacitación, detallando en el capítulo 2 “Del Cronograma” las actividades adelantadas por el contratista y como soporte se tiene en el anexo 13 el seguimiento, allí también se relaciona el Cronograma Ambiental de Interventoría donde se describen las actividades, seguimiento y control a la gestión ambiental desarrollada por el Contratista en el periodo evaluado.

Respecto del cronograma de interventoría a continuación se detalla el seguimiento y capacitaciones realizado por la Interventoría.

Tabla 19. Seguimiento Cronograma Interventoría

PLAN / PROGRAMA	ITEM	OBSERVACIONES / REGISTRO
GESTION DE PERMISOS	Permiso para operación de equipos de construcción y reparación de vías generadores de ruido ambiental en horarios restringidos	Durante el periodo no se solicitaron permisos
INSPECCIONES	Inspección ambiental mediante recorridos a los frentes de obra	Se verifico en visitas - registro en bitácora
GESTION AMBIENTAL	Verificación de campamentos y sitios de acopio de materiales	Se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación de delimitación y cerramientos	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación orden, aseo y limpieza en los frentes de obra.	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación de la disposición correcta de materiales de obra.	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación de uso correcto de zonas verdes	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación del manejo integral de cuerpos de agua	

PLAN / PROGRAMA	ITEM	OBSERVACIONES / REGISTRO
		en las zonas intervenidas no se tuvo presencia de cuerpos de agua
GESTION MANEJO DE VEJETACION Y EL PAISAJE	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal
	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de liberación de nidos previo a ejecución de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron actividades de liberación de nidos, por cuanto no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal.
INFORMES	Elaboración del informe mensual ambiental	Elaboración del informe mensual N.13.
	Elaboración del informe semanal	Se presentaron los informes semanales del 52 a 55.

Respecto de las Capacitaciones al personal de Interventoría, en el cronograma incluido en el PAI, se indica que para el presente periodo, se tenía programado realizar Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas, teniendo en cuenta que no se tuvo personal nuevo de interventoría no se realizaron capacitaciones al respecto, y en cumplimiento del cronograma de interventoría se realizaron las siguientes capacitaciones:

Tabla 20. Capacitaciones Interventoría

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes
25/04/2025	Actualización Requisitos legales ambientales.	14

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones de Interventoría para el próximo periodo (Mayo de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Uso eficiente y ahorro de agua y energía.

3.7 VISITAS A CAMPO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó visitas a los frentes de obra, dejando anotaciones en la bitácora de uso exclusivo para el Componente E A&SST en el anexo 15 se incluye copia de la bitácora y en la siguiente tabla, se relaciona las fechas y los frentes visitados.

Tabla 21. Visitas de campo

Fecha de visita	Frente visitado	Hallazgo - Soporte
07/04/2025	Visita a frente Bosa La Estancia	Se solicita mantener orden y aseo en obra
10/04/2025	Visita a frente Bosa La Estancia	Se solicita realizar limpieza de malla de protección de sumideros
15/04/2025	Visita a frente Bosa La Estancia	Se solicita cambiar la malla de protección de sumideros, retirar RCD salientes de cerramientos
22/04/2025	Visita a frente Bosa La Estancia	Se solicita retirar RCD salientes de cerramientos
25/04/2025	Visita a frente Bosa La Estancia	Se solicita cambiar la malla de protección de sumideros, ajustar cerramiento de alambre y madera en predio intervenido dado que la comunidad arroja.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contratista remitió el Informe Mensual Ambiental N. 13 V2 y dado a que atendió las observaciones, se dio aprobación al mismo.
- La calificación de la gestión ambiental, SST, forestal y fauna del contratista para el periodo del **1 al 30 de Abril de 2025**, fue del **99,89%**.
- Para el periodo analizado dado que se realizaron actividades de demolición, los residuos generados se dispusieron en sitios autorizados para ello, todo el material generado de RCD está debidamente certificado.
- Se da cumplimiento a las medidas establecidas en el MAO, documento elaborado por el Contratista.
- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades ambientales programadas tanto por el Contratista como por la Interventoría.
- Se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones del periodo.
- Una vez realizados los hallazgos en las visitas de campo, estos fueron atendidos por el Contratista de manera inmediata.
- A la fecha los materiales suministrados en el periodo cuentan con la respectiva certificación de despacho del mismo.
- A la fecha se han realizado los respectivos cargues de información en la plataforma de la SDA respecto a los RCD generados en el proyecto.

5 ANEXOS

- Anexo 1. FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría
- Anexo 2. FOAC53 Control de materiales
- Anexo 3. FO-AC-54 Control de residuos de construcción y demolición - RCD
- Anexo 4. FO-AC-21. Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura
- Anexo 5. FOAC55 Planilla de RCD
- Anexo 6. Formatos SDA
- Anexo 7. FOAC50 Manejo de Aguas
- Anexo 8. FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas)
- Anexo 9. Registro fotográfico (Ver en digital)
- Anexo 10. FO-AC-32. Fichas de seguimiento de labores ambientales V 4.0
- Anexo 11. Actas de reunión comité integral y ambiental
- Anexo 12. Acta de recibo parcial de obra y memorias de ítems del componente ambiental
- Anexo 13. Cronograma de seguimiento ambiental de interventoría y de obra
- Anexo 14. Certificado de los mantenimientos unidades sanitarias
- Anexo 15. Bitácora Ambiental
- Anexo 16. Certificaciones y aprobación de Informe mensual Contratista

FORMATO

INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN



CÓDIGO

FO-AC-25

PROCESO

PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN

VERSIÓN

5

CICLO DE VIDA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

Fecha		
DD	MM	AÑO
28	JUNIO	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE DESARROLLO URBANO

PREDIOS

Correspondiente al periodo entre

1 DE ABRIL DE 2025

Y

30 DE ABRIL DE 2025

Informe N°

13

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

CONTRATISTA

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S / NIT: 900.579.723-7

Cto. Obra No.

IDU 1711-2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	19 DE FEBRERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	Suspensión 1 del contrato de obra IDU 1711/2023 desde el 12 de septiembre por 15 días
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	Ampliación 1 de la suspensión por 15 días
Construcción	N.A	N.A	Ampliación 2 de la suspensión por 15 días - Reinicio del contrato el 24 de octubre de 2024
Conservación	N.A	N.A	Prorroga del contrato de obra IDU 1711/2023 por 6 meses

INTERVENTOR

CONSORCIO METRO CINCO / NIT: 900.585.054-2

Cto. Interventoría No.

IDU 1757-2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	19 DE FEBRERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	Suspensión 1 del contrato de Interventoría IDU 1757/2023 desde el 12 de septiembre por 15 días
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	Ampliación 1 de la suspensión por 15 días
Construcción	N.A	N.A	Ampliación 2 de la suspensión por 15 días - Reinicio del contrato el 24 de octubre de 2024
Conservación	N.A	N.A	Prorroga del contrato de Interventoría IDU 1757/2023 por 6 meses

B. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PERMISO	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
Apertura del PIN ante la SDA	ASIGNADO EL NUMERO PIN: 24931	Reporte mensual en el aplicativo de la SDA	La información a reportar en el aplicativo se encuentra en el anexo 6 del presente informe.

C. NOVEDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO

Diligencie las novedades relacionadas con el componente ambiental tales como:

Seguimientos por parte de la Autoridad Ambiental

Monitoreos realizados en el mes

Otros

D. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

COMPONENTE AMBIENTAL	% Import. ambiental	% desempeño mes	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO			Medidas Correctivas
			ITEM INCUMPLIDO	DESCRIPCIÓN GENERAL	% CALIFICACIÓN ITEM	
A	CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES	13%	12,89%	N.A	Se evidencia en obra volquetas que no estan aprobadas por la Interventoría	99%
B	MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	35%	35%	N.A		100%
C	MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	8%	8%	N.A	No se realizaron intervenciones del componente fauna ni forestal.	100%
D	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39%	39%	N.A		100,00%
E	PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	5%	5%	N.A	Se implementa demarcación de los predios intervenidos para aislar de las actividades de desmantelamiento y selección de residuos sólidos y voluminosos visualizados en cada predio. Se garantiza seguridad del peaton	100%
TOTAL			100%	99,89%		

E. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

1. CONTROL DE MANEJO DE MATERIALES (Consolidado formato control de materiales pétreos)								
Tipo de material recibido	Razón social del Proveedor	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Cantidad Total Recibido (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
MADERA- ROLLIZA 3M	MADERAS DEL VALLE	REGISTRO DE OPERACIONES SDA N. 2139 DEL 19/03/24	435	4240	435	4240	0	0
MADERA -DURMIENTE 4M			0	7	0	7	0	0

Sitio de Disposición	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato: Control de Residuos de Construcción y Demolición generado)															
		Material Orgánico (Pedones y Cepedones) (M3)		Material de Excavación (M3)		Demolición Concreto (M3)		Demolición Asfalto (M3)		Demolición Edificaciones (M3)		Volumen Total Generado (M3)		Volumen Reutilizado (M3)		Cantidad Certificada (M3)	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO SAS	Comunicado N. 20212061291 del 10/08/2017 / REGISTRO IDU 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3126	0	3126	0	0	0	3126
SECAM JR	REGISTRO IDU 514-2019	0	0	0	204	1568	1871	0	0	0	0	1568	2075	0	0	1568	2075
Reciclados industriales de Colombia	511-2019 COMUNICADO No 20212074043 DEL 25/08/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0	0	108	0
ECO TRANDMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) - PODA CESPED	INFORME TECNICO: SDA N° 2020E56195 COE: 2020E56234 (DIRECTORIO DE PROVEEDORES SECRETARIA DE AMBIENTE - SDA)	1890	13087	0	0	0	0	0	0	0	0	1890	13087	0	0	1890	13087
ECOSAF (Gestor encargado del transporte) LADRILLERA SANTANDER (Disposición final y certificación) - PODA CESPED	En el marco de la resolución 1740 del 15 de agosto de 2008 y la resolución 50137000269 del 26 de febrero de 2021,	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	2260	0	0	0	2260	0
ECOMBITHOZ LTDA - PODA CESPED	CORPOGUAVIO radicado 20242105045 del 04/09/2024, registra que no hay sanciones en curso	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0
ECO TRANDMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) - MADERA	INFORME TECNICO: SDA N° 2020E56195 COE: 2020E56234 (DIRECTORIO DE PROVEEDORES SECRETARIA DE AMBIENTE - SDA)	0	19,24	0	0	0	0	0	0	0	0	19,24	0	0	0	19,24	0
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J - RESIDUOS METALICOS	Informe tecnico No. 01797, 28 de octubre de 2019 con radicado 2019E233080 Empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	2,36	7,85	2,36	7,85	0	0	2,36	7,85
ECO - RECICLAJE	RECUPERADOR ESPECIFICO PIN - RESP 25695 APROBADO CON RADICADO SDA N°. 2024E128055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,312	0	0,312	0	0	0	0,312

Vo.Bo:

CICLO DE VIDA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

Fecha

DD

MM

AÑO

28

JUNIO

2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE DESARROLLO URBANO

PREDIOS

Informe N°

13

Correspondiente al periodo entre

1 DE ABRIL DE 2025

y

30 DE ABRIL DE 2025

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGÍA

INFORME DE AVANCE/REPORTE DE HALLAZGOS

FECHA

FICHAS DE ARQUEOLOGÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS ASISTENCIA ARQUEOLOGÍA PÚBLICA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

J. COSTOS AMBIENTALES

GLOBAL AMBIENTAL

ACTA OBRA N°	MONTO GLOBAL AMBIENTAL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	% AVANCE DE OBRA	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
1	393.317.474	100,00%	100,00%	2,623026%	10.316.819	0	10.316.819	0
2	393.317.474	100,00%	100,00%	2,583962%	10.163.172	10.316.819	20.479.991	0
3	393.317.474	100,00%	100,00%	2,796179%	10.997.862	10.163.172	31.477.853	0
4	393.317.474	100,00%	100,00%	0,836815%	3.291.339	10.997.862	34.769.192	0
5	393.317.474	100,00%	100,00%	5,726781%	22.524.428	3.291.339	57.293.620	0
6	393.317.474	100,00%	100,00%	7,695312%	30.267.006	22.524.428	87.560.626	0
7	393.317.474	100,00%	100,00%	8,138588%	32.010.489	30.267.006	119.571.115	0
8	393.317.474	100,00%	100,00%	20,891697%	82.170.696	32.010.489	201.741.811	0
9	519.441.847	100,00%	100,00%	9,467594%	49.178.644	82.170.696	250.920.455	0
10	519.441.847	100,00%	99,54%	9,565748%	49.688.497	49.178.644	300.608.953	228.567
11	519.441.847	100,00%	100,00%	15,551168%	80.779.273	49.688.497	381.388.226	0
12	519.441.847	100,00%	100,00%	13,676945%	71.043.774	80.779.273	452.432.000	0
13	519.441.847	100,00%	99,89%	6,115828%	31.768.171	71.043.774	484.200.171	34.945

Nota: Teniendo en cuenta que en el mes 13 se debía pagar \$ 31.733.226 y se reconocieron \$ 31.768.171 (como si hubiera obtenido una calificación de 100% de desempeño Ambiental), se tiene que se descontará el monto de \$ 34,945 (valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado y lo que se debía pagar) para el próximo mes.

PRECIOS UNITARIOS

ACTA DE OBRA N°	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	VALOR PRECIOS UNITARIOS (\$)	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
				N/A			

VALOR AMBIENTAL A CANCELAR EN EL MES

31.768.171

COSTOS ARQUEOLOGÍA

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL	N/A
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	N/A
HERRAMIENTA Y EQUIPO	N/A

VALOR ARQUEOLOGÍA A CANCELAR EN EL MES

N/A

K. CONTROL DOCUMENTAL

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	N° DE COMUNICACIÓN DE RTA	FECHA DE LA RESPUESTA
INF-INT-IDU1711-296-2025	10/04/2025	Respuesta oficio GMC-134-111-2025 atención observaciones inf ambiental N. 12 v2	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-124-2025	14/04/2025
INF-INT-IDU1711-302-2025	24/04/2025	Respuesta derecho de petición RT 54820 – Ciudad Bolívar, La Estancia	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-136-2025	28/04/2025
INF-INT-IDU1711-303-2025	30/04/2025	Informacion de actividades silviculturales RT 3723	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-111-2025	9/04/2025	Revisión informe mensual Ambiental N. 12 V1 Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INF-INT-IDU1711-296-2025	10/04/2025
GMC-134-123-2025	14/04/2025	Remisión Informe Mensual Ambiental N. 12 V1 de Interventoría	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-124-2025	14/04/2025	Revisión y aprobación Informe Mensual Ambiental N. 12 V2 del Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	NO APLICA	NO APLICA
GMC-134-134-2025	24/04/2025	Respuesta al oficio IDU 202532500410971 - Aprobación HV Residente Ambiental Interventoría.	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	NO APLICA	NO APLICA
GMC-134-136-2025	28/04/2025	Remisión oficio INF-INT-IDU1711-302-2025 Atención derecho petición RT54820 La Estancia - Componente Ambiental	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-137-2025	30/04/2025	Respuesta Radicado 2025EE78494 de la SDA permiso de poda árboles - RT 8385 – Edificio Alcazaba de Córdoba	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
202532500410971	15/04/2025	Aprobación de hoja de vida profesional ambiental de interventoría	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-134-2025	24/04/2025

L. SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

1. VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Acción solicitada	Fecha	Plazo	Cumplió?	Observaciones
			Si No	
Durante el periodo no se tuvieron hallazgos tendientes a desarrollar acciones correctivas y/o preventiva, toda vez que el contratista cuenta con los protocolos y procedimientos ya establecidos para las actividades de mantenimiento y demolición				

M. LECCIONES APRENDIDAS

Durante el periodo analizado se realizaron visitas a los puntos intervenidos de los cuales no se evidenciaron hallazgos para atención y/o corrección por parte del contratista (Registro en bitacora), el contratista cuenta con los protocolos y procedimientos ya establecidos para las actividades de mantenimiento y demolición.

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 3

Vo.Bo:

CICLO DE VIDA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

Fecha

DD

MM

AÑO

28

JUNIO

2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE DESARROLLO URBANO

PREDIOS

Informe N°

13

Correspondiente al periodo entre

1 DE ABRIL DE 2025

y

30 DE ABRIL DE 2025

N. ANEXOS

Nombre del Anexo	Aplica		Anexo Número
	SI	NO	
1 Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa construcción y conservación	X		Anexo 1
2 FOAC53 Control de materiales	X		Anexo 2
3 FO-AC-54 Control de residuos de construcción y demolición - RCD	X		Anexo 3
4 FO-AC-21. Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura	X		Anexo 4
5 FOAC55 Planilla de RCD	X		Anexo 5
6 Formatos SDA: Indicadores RCD, Anexo 2. Formato seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra y Anexo 3. Informe de aprovechamiento IN SITU, base Excel de la SDA para el cargue de información en el aplicativo de la SDA. Certificado de reutilización de RCD y certificado de no generación de RCD expedido por la interventoría.	X		Anexo 6
7 FOAC50 Manejo de Aguas	X		Anexo 7
8 FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas)	X		Anexo 8
9 Registro fotográfico (Ver en digital)	X		Anexo 9
10 FO-AC-32. Fichas de seguimiento de labores ambientales V 4.0	X		Anexo 10
11 Actas de reunión comité integral y ambiental	X		Anexo 11
12 Acta de recibo parcial de obra y memorias de ítems del componente ambiental	X		Anexo 12
13 Cronograma de seguimiento ambiental de interventoría y de obra	X		Anexo 13
14 Certificado de los mantenimientos unidades sanitarias	X		Anexo 14
15 Bitácora Ambiental	X		Anexo 15
16 Certificaciones y aprobación de informe contratista	X		Anexo 16

(Nombre) LOLY VANEGAS BARRERA

Interventor Ambiental

(Nombre) JAIRO GEOVANNI ORTIZ

Director de Interventoría

Original: Expediente ORFEO No. _____

1era copia: Interventor

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 4

Va.Ba:



MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.
ABASTECEDOR DE MADERAS
DISTRIBUIDOR PARA PISOS Y ENCHAPES PARA TECHOS
MADERAS EN GENERAL
NIT. 901 244 7210 - RÉGIMEN COMÚN

BOGOTÁ D.C. MAYO 2 DE 2025

Señores:

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

Ref.: Certificación envío de maderas mes de ABRIL de 2025

Por medio de la presente estamos certificando que en el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2025 se suministraron a la empresa INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS NIT:900579723-7 CONTRATO IDU 1711-2023

Los siguientes productos:


- 435 - PARAL ROLLIZOS DE 3 MTS

Certificado de registro libro de la secretaria de ambiente acta N, 2139

Sin otro en particular,


Atentamente,

ALCIRA MONROY
DIRECTORA COMERCIAL
MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.
TEL: 3115922221



AV. BOYACÁ No 79A - 41 TEL: 2247210 - 3115922221 BOGOTÁ D.C.
maderasdelvalle2008@hotmail.com

FORMATO						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.C. Desarrollo Urbano	
CÓDIGO		PROCESO		VERSION			
FO-AC-54		GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST		4.0			
Objeto Contractual		DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”					
Interventoría		CONSORCIO METRO CINCO			Contrato	IDU-1757-2023	
Constructor		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.			Contrato	IDU-1711-2023	
Plan de gestión integral de RCD		Radiación aprobación por Interventoría			PIN: 24931		
Acta No.	18	de Recibo Parcial de Obra No.		13	Fecha Acta de Recibo Parcial de Obra		18 de Junio de 2025
Periodo Acta de Recibo Parcial de Obra				DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025			
RT= Registro topográfico - Demolición predios				Demolición RT 42978 (CL 40 SUR 3ª 67 ESTE) ubicados en el barrio La Victoria, localidad de San Cristóbal - Mantenimiento de predios (RT 3723, 4958B, 7073, 40977, 40978, 40979, 52870, 52871) Kr 7, Avenida ALO, Comuneros			
Fecha de Inicio de Construcción				19/02/2024			
Fecha de Terminación de Construcción				30/04/2025			
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO							
Código ¹	Items ²	Residuos de Construcción y Demolición Generados					Sitio en los que fueron dispuestos los RCD ⁵
		Cantidad Generada ³			Cantidad Generada (m3) ⁴		
		Periodo	Acumulado	Unidades	Periodo	Acumulado	
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	0,00	1243	M2	0	3126	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO SAS
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	0	298	M2			
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS	432	3099	M2			
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 3 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO EMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS	415,7	3165	M2			
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	0	256	M2	0	45	UNION TEMPORAL CABLE SAN CRISTOBAL
					1568	2075	SECAM JR SAS
					0	108	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	0	776	M2	2,36	7,85	** SOLUCIONES AMBIENTALES A&J
					0	0,312 m3 (0,54 TON)	ECORECICLAJE LHJ
					0	3,02	CYL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	0	334	M2	0	11,450 kg (6,02 m3)- SEPARACIÓN DE MATERIALES TEJAS	TRACOL

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO							
Código ¹	Items ²	Residuos de Construcción y Demolición Generados					Sitio en los que fueron dispuestos los RCD ⁵
		Cantidad Generada ³			Cantidad Generada (m3) ⁴		
		Periodo	Acumulado	Unidades	Periodo	Acumulado	
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA. <i>Item pagado en acta no. 3 - Cantidades reportadas en informe No. 2 del mes de abril de 2024</i>	0,00	82,00	m3	0	24,67 Ton (19,24 m3)	ECO TRAN SMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación)
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS)	53.112,00	591.310,51	m2	1890	15347	ECO TRAN SMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) / ECOSAF (Gestor encargado del transporte) LADRILLERA SANTANDER
					0	40	ECOAMBITHOZ
Elaboró		LOLY VANEGAS BARRERA Residente Ambiental Interventoría			Aprobó		JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría
Firma					Firma		
NOTA: El material reutilizado en obra deberá relacionarse en "Sitio en los que fueron dispuestos" y deberá anexarse un resumen especificando en que actividades y que cantidades se reutilizaron en cada una de dichas actividades.							
ACLARACIONES							
1. Escriba el código del ítem respectivo de los pliegos de condiciones o de los ítems no previstos en los cuales se reportan residuos de construcción y demoliciones.							
2. Liste las actividades de pago contractuales (nombre completo) correspondientes a las actividades de la obra que generan residuos de construcción y demolición (demoliciones, descapotes y excavaciones, e.t.c)							
3. Escriba las cantidades de RCD identificadas en el Acta de Recibo de Pago Parcial para el periodo y el acumulado, con su unidad respectiva, de acuerdo al periodo verificado.							
4. Escriba las cantidades de RCD para el periodo y el acumulado en metros cúbicos, teniendo en cuenta el factor de expansión respectivo - demoliciones 1,3 y excavaciones y descapotes 1,25.							
5. Liste para cada una de las actividades, los sitios en los cuales fueron dispuestos los RCD. En caso de ser reutilizados deberá aclararse en esta columna.							
<small>Original: dependencia responsable del control Para copia: Interventor Para copia: contratista</small>							

FORMATO		
Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-21	Prácticas Integrales de Gestión	2



N° del Contrato Obra:	CTO IDU 1711 DE 2023	Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	Fecha de terminación Contrato:	19 Septiembre de 2024
Objeto del Contrato:	Demolición, Limpieza, Cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano - IDU, para la ejecución del proyecto viales y de espacio publico que se encuentran en administración a cargo de la dirección tecnica de predios - proyectos varios, en bogota DC	N° del Contrato de Interventoría:	IDU-1757-2023	Fecha de terminación Prorroga	30 de abril de 2025
Pin del Contrato:	24931	Interventoría:	CONSORCIO METRO CINCO		

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA
				Suministrado por Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de fresado IDU como Receptor		Entregado a Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Entregado a otros Contratos IDU como receptores		Entregado a otros receptores		
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	
CL 40 A SUR #3A 70 ESTE	4003378	208489	19 DE FEBRERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,14	322,51	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5
CL 40 A SUR #3A 73 ESTE	4004029	208737														
CL 40 A SUR #3A 96 ESTE	4004115	208358														
KR 3 C ESTE #40 -25 SUR	4005629	212011														
KR 3 C ESTE #40 -25 SUR	4005629	212011	01 DE ABRIL 2024 AL 31 DE ABRIL 2024	0	0	0	0	0	0	1068,17	1393,33	0	0	0	0	1393,33
Calle 40 Sur # 3 A 67 Este	16004277	76555														
Kr 102 # 80 - 11 (ALO)	11007845	20010669														
Calle 163A N 14D 51	1006721	92088147														
KR 5 # 3-19	3001078	92058906														
Cr 7ma con Calle 94	200268	521284														
AC 57 R SUR 75D 77	19000002	92079815	01 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024	0	0	0	0	0	0	897,4	1150,3	0	0	0	0	1150,3
Kr 65 # 164-51	12001120	61346														
AK 72 # 163-70	11012300	518504														
Cr 63 # 112-90	11000705	169943														
Calle 171 con carrera 9na	1001035	525268														
Calle 170 con carrera 7ma	1006372	91062407														
Ac Cr 57 R Sur # 76-45 mj	8011587	92079815														
Cr 96 Con calle 65	9005121	91061528														
Cli 25g # 96-06	9001034	382610														
Av Cr 15 # 163 B 16	1001743	92088074														
Cli 170 con cr 92	50000109	91013821														
Cr 33 # 58-05 Sur	6002050	92085492														
Av Cr 7 # 190 - 63	1006364	34013290														
Cra 92 # 127 - 55	11012442	92057994														
Calle 147 con carrera 7ma	1003690	502858														
Cr 5H # 482-35	180006257	424027	01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	0	0	0	0	0	0	525	673,02	0	0	0	0	673,02
CLL 126 # 50-94	11010481	20004588														
DG 85 # 85B 03	10003968	91041589														
DG 85 # 85B 00	10003985	37974														
AK 86 # 84 A 29	10004580	515593														
AK 86 # 84 A 98	10010115	92086310														
AK 86 # 84 A 24	10004581	91060396														
Dg 85 b # 84 a 13	10003916	38337														
Dg 84 a 85B 16	10004020	37815														
Dg 84 a 85B 40	10004007	37892														
TV 85 B # 94A 17	10003985	161972														
Cr 5H # 482-35 (LA VICTORIA)	4002775	206653	01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024	0	0	0	0	0	0	790,312	1012,54	45	74,2	0	0	1086,74
CL 40A SUR 3A 47 ESTE	4003378	207378														
AK 15 163B 06	4008038	92076775														
Cr 5H # 482-35	18005723	423916	01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	0	0	0	0	0	0	3809	4884,16	0	0	0	0	4884,16
Cr 5H # 482-35	18005723	424105	01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE Y DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	1025	1314,05	0	0	0	0	1314,05
TV 73I 57X 02 S	19015007	91016928														
CLL 35 SUR # 0-46 ESTE	4002458	206159	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	0	0	0	0	0	147	188,16	0	0	0	0	188,16
CR 12 E # 42B 64 SUR	4002893	206788														
CLL 32 C SUR # 0 45 ESTE	4005290	211287														

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA
				Suministrado por Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de fresado IDU como Receptor		Entregado a Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Entregado a otros Contratos IDU como receptores		Entregado a otros receptores		
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Peso (ton)
CLL 32 C SUR # 0 45 ESTE	4005290	211287	01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	0	0	0	0	0	0	3254	4171,36	NA	0	0	0	4171,36
Cr 3a Este 40-38	4003397	207417	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	0	0	0	0	0	0	2388	3060,54	0	0	0	0	3060,54
Cr 7a Este 41-22	4003587	207771														
Calle 57y sur 73j 05	19000061	440196														
Carrera 73i #57-42	19015568	92070331	01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	0	0	0	0	0	0	700,00	941,06	0	0	0	0	941,06
Diagonal 32C Sur 0-100	4002778	20009009														
Diagonal 32 sur 31 F-1-31F-21	4003780	208136														
Calle 41 Sur 3A-38	4002520	206265														
Avenida Calle 183 8D-13	1000944	92083729														
Diagonal 32 sur 31 F-1-31F-21	4003780	208136	01 de marzo de 2025 al 31 de marzo del 2025	0	0	0	0	0	0	2182,00	2837,94	0	0	0	0	2837,94
Transversal 73i 57x-4	19000062	440192														
TV 73i 57X 02 S	19015568	19015568	01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	0	0	0	0	0	0	3458,00	4882,21	0	0	0	0	4882,21
TOTAL				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20495,0	26831,2	45,0	74,2	0,0	0,0	26905,4

RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (m3):
RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (Ton):
RCD aprovechado acumulado conforme a Res 1257 de 2021 (ton):
Porcentaje de cumplimiento Res 1257 de 2021 (%):
Porcentaje de cumplimiento a la fecha (%):

26060,86
15343,21
26905,4
25%
175%

NOTA: Los volúmenes reportado en el presente formato deben ser sueltos, no compactos.

Firma Director de Obra

DIRECTORA DE OBRA - MONICA JIMENA GUERRA

Firma Director de Interventoría

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - JAIRO ORTIZ

FORMATO								
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION								
CÓDIGO							VERSIÓN	
FO-AC-55							5	
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA				FECHA		
DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS				30 DE ABRIL DE 2025		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		NA						
CONTRATO DE OBRA No.		IDU 1711 DEL 2023						
OBJETO DEL CONTRATO								
CTO IDU 1711 DE 2023 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ DC								
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS						
PERIODO:		01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025				13		
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO:		SECAM JR						
FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado (aproximadamente)	RESPEL	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	Kg		
14/04/2025	SQW491	3464	2389	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
14/04/2025	SZN-675	21257	2391	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
14/04/2025	SWQ491	3464	16240	ESTANCIA - CASAS BOSA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
15/04/2025	SZN-675	21257	16252	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
15/04/2025	SQW491	3464	2407	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
15/04/2025	SQW491	3464	2416	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
15/04/2025	SZN-675	21257	16256	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
15/04/2025	SZN-675	21257	16262	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
15/04/2025	SZN-675	21257	16245	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
16/04/2025	SQW491	3464	2436	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
16/04/2025	SZN-675	21257	16270	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
16/04/2025	SQW491	3464	2445	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
16/04/2025	SQW491	3464	2448	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
21/04/2025	SQW491	3464	2455	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
21/04/2025	SZN675	21257	2456	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
21/04/2025	SQW491	3464	2458	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
21/04/2025	SZN-675	21257	16284	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
21/04/2025	SZN-675	21257	2475	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
21/04/2025	SZN675	21257	2477	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
21/04/2025	SZN-675	21257	2481	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
21/04/2025	SQW491	3464	16286	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
21/04/2025	SZN-675	21257	2487	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
22/04/2025	SZN-675	21257	16294	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
22/04/2025	SZN-675	21257	16303	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
22/04/2025	SQW491	3464	2489	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
23/04/2025	SQW491	3464	16315	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
23/04/2025	SQW491	3464	16316	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
23/04/2025	SZN-675	21257	16318	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
23/04/2025	SZN-675	21257	16322	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
23/04/2025	SQW491	3464	16324	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ

FORMATO								
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION								
CÓDIGO								idv
FO-AC-55								5
23/04/2025	SZN-675	21257	16325	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
23/04/2025	SQW491	3464	2499	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
23/04/2025	SQW491	3464	2530	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
23/04/2025	SZN-675	21257	16330	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SQW491	3464	16595	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SQW491	3464	16596	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SQW491	3464	16601	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SQW491	3464	16602	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SQW491	3464	16603	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SQW491	3464	16604	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SQW491	3464	16605	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SQW491	3464	16606	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/04/2025	SZN-675	21257	16607	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16608	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16342	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16365	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16366	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16367	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16368	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16369	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	16370	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
24/04/2025	SZN-675	21257	2546	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
25/04/2025	CQN-013	775	16609	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS
25/04/2025	FTI-830	2662	16610	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ
25/04/2025	SZN-675	21257	16611	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
25/04/2025	CQN-013	775	16612	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS
25/04/2025	FTI-830	2662	16613	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ
25/04/2025	SZN-675	21257	16614	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	SEBASTIAN FAJARDO
25/04/2025	CQN-013	775	16615	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS
25/04/2025	FTI-830	2662	16616	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ
25/04/2025	TGL-341	12028	16617	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ
25/04/2025	CQN-013	775	16618	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS
25/04/2025	FTI-830	2662	16619	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ
25/04/2025	TGL-341	12028	16620	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ

FORMATO									
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION									
CÓDIGO FO-AC-55								VERSIÓN 5	idu
25/04/2025	CQN-013	775	2562	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
25/04/2025	FTI-830	2662	16362	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
25/04/2025	TGL-341	12028	16363	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
25/04/2025	CQN-013	775	16364	BOSA LA ESTANCIA	18	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
25/04/2025	FTI-830	2662	16373	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
25/04/2025	TGL-341	12028	16374	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
25/04/2025	CQN-013	775	16375	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
25/04/2025	FTI-830	2662	16376	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
25/04/2025	TGL-341	12028	16377	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
25/04/2025	CQN-013	775	16378	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
25/04/2025	FTI-830	2662	2572	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
28/04/2025	TGL-341	12028	2575	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
28/04/2025	TGL-341	12028	16407	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
28/04/2025	CQN-013	775	16409	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
28/04/2025	FTI-830	2662	16419	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
28/04/2025	CQN-013	775	16428	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
28/04/2025	FTI-830	2662	16429	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
29/04/2025	FTI-830	2662	16436	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
29/04/2025	TGL-341	12028	16439	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
29/04/2025	TGL-341	12028	16440	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
29/04/2025	SQW491	3464	16449	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ	
29/04/2025	CQN-013	775	16450	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
29/04/2025	FTI-830	2662	16455	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
29/04/2025	CQN-013	775	16465	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
30/04/2025	FTI-830	2662	16470	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
30/04/2025	TGL-341	12028	16479	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
30/04/2025	TGL-341	12028	16486	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	DAIRO LOPEZ	
30/04/2025	CQN-013	775	16487	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
30/04/2025	FTI-830	2662	16498	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
30/04/2025	CQN-013	775	16503	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
30/04/2025	FTI-830	2662	16504	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	RUBEN LOPEZ	
30/04/2025	CQN-013	775	2643	BOSA LA ESTANCIA	16	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	PEDRO CASALLAS	
Total Peso (M3)							1568,00		
Total Peso (Ton)							2459,23		

Bogotá, 12 de Mayo de 2025

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Referencia: Contrato IDU-1711-2023, cuyo objeto es DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PIN

En el marco de las obligaciones contractuales de la interventoría del contrato en referencia, a cargo del CONSORCIO METRO CINCO bajo el contrato IDU-1757-2023, una vez revisada la información presentada por el contratista, correspondiente al periodo del **1 de Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025 (Trimestre 2 del año 2025)**, se avala por parte de interventoría el cargue de la información a la SDA en cumplimiento de las obligaciones del **PIN 24931** así:


PERIODO	GESTOR	MATERIAL	CANTIDAD		TOTAL PERIODO (Ton)	ACUMULADO (Ton)	% CUMPLIMIENTO APROVECHAMIENTO
			M³	Ton			
1 al 30 de Abril de 2025	SECAM JR SAS	RCD	1568	2459,09	4886,15	26905,24	99,92%
	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J SAS	Residuos Metálicos	2,36	4,08			
	ECO ENVIROMENTAL DE COLOMBIA	Residuos de rocería y poda de césped	1890	2422,98			
TOTAL RCD					4886,15		

Cordialmente,


ING. JAIRÓ GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consortio Metro Cinco

Elaboro: Loly Vanegas Barrera –Residente ambiental de Interventoría

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J	
Documento de identificación o NIT	901012164-1	
Representante Legal	ALEXANDER SUAREZ HUERFANO	
Dirección	Calle 74 Bis Sur # 87C - 27	
Teléfono	3107062829 - 3213435076	
Correo electrónico	solucionesambientalesaj@gmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	ECO ENVIRONMENT DE COLOMBIA	
Documento de identificación o NIT	900243916-9	
Representante Legal	EDUARDO ANDRES PEDRAZA SEGURA	
Dirección	Av. Carrera 72 N° 39c 09 sur	
Teléfono	3115847164	
Correo electrónico	eco.ambiente2929@hotmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	514	
Nombre o razón social	SECAM JR EU	
Documento de identificación o NIT	830507163-0	
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ	
Dirección	CARRERA 71D # 57-10 SUR	
Teléfono	3002414969	
Correo electrónico	j.anaueva@secamjr.com	
Municipio o Distrito	USME	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	24931	
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS CONTRATO IDU No 1711 DE 2023	
Documento de identificación o NIT	900579723-7	
Representante Legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	
Dirección domicilio	KR 49 91 76	
Teléfono	601635245	
Correo electrónico	ambientalintegral@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	RTs CTO IDU 1711-23	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO (ABRIL 2025)		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos de generador (t)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	2.423,0	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	2459,23	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	4,08	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0,0	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0,0	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se registrarán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0,0	
Total RCD recibidos (t)	4.886,29	
Fecha de recepción de los RCD	01 de Abril al 30 de Abril 2025	
 FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA Brayan S. Arango Cruz (Contratista - CONTRATO IDU No 1711 DE 2023)		

ANEXO III. FORMATO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GESTORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J	
Documento de identificación o NIT	901012164-1	
Representante Legal	ALEXANDER SUAREZ HUERFANO	
Dirección	Calle 74 Bis Sur # 87C - 27	
Teléfono	3107062829 - 3213435076	
Correo electrónico	solucionesambientalesaj@gmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA D.C	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	ECO ENVIRONMENT DE COLOMBIA	
Documento de identificación o NIT	900243916-9	
Representante Legal	EDUARDO ANDRES PEDRAZA SEGURA	
Dirección	Av. Carrera 72 N° 39c 09 sur	
Teléfono	3115847164	
Correo electrónico	eco.ambiente2929@hotmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA D.C	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	514	
Nombre o razón social	SECAM JR EU	
Documento de identificación o NIT	830507163-0	
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ	
Dirección	CARRERA 71D # 57-10 SUR	
Teléfono	3002414969	
Correo electrónico	j.panqueva@secamjr.com	
Municipio o Distrito	USME	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
<p>Nota: Teniendo en cuenta que el reporte de estos formatos es trimestral, se presentara formato con los volúmenes correspondientes al primer mes del SEGUNDO trimestre del 2025 (Abril)</p>		
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR TIPO (ABRIL 2025)		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD (t)	
	Aprovechamiento	Disposición final
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	2422,98	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	2459,23	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	4,08
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0
Total RCD recibidos (t)	4882,21	4,08
TOTAL RCD	4886,29	
Período de reporte de RCD	01 de Abril 2025 al 30 de Abril 2025	
 FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL C.C. o NIT: 1030654429 NOMBRE: BRAYAN ARANGO CRUZ		



Transforma Ambientes

Bogotá D.C., jueves, 8 de mayo de 2025

Certificación No. SEC-00667SO-2025

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 030 OCTUBRE 23 DE 2020
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☒ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24931.
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.
Número de identificación o NIT	900.579.723-7.
Representante legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON.
Dirección de domicilio	Carrera 49 # 91-76.
Teléfono	(601) 635-3245.
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
	Contrato de obra, cuyo objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR

Dirección de generación de RCD	EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	1,212.00 M3	1,900.78 TON
Total RCD recibidos	1,212.00 M3	1,900.78 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/04/2025 al 30/04/2025	

Atentamente,

Verificar autenticidad



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal



Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico solicitudes.soacha@secamjr.com

(310) 574 4863 

(300) 241 4969 

Carrera 71D No. 57-10 Sur, Bogotá D.C. 



Transforma Ambientes

Bogotá D.C., jueves, 8 de mayo de 2025

Certificación No. SEC-01535JR-2025

SECAM J.R S.A.S.

NIT. 830.507.163-0

GESTOR DE RCDS

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☒ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24931.
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.
Número de identificación o NIT	900.579.723-7.
Representante legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON.
Dirección de domicilio	Carrera 49 # 91-76.
Teléfono	(601) 635-3245.
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
	Contrato de obra, cuyo objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA,

Dirección de generación de RCD	CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	356.00 M3	558.31 TON
Total RCD recibidos	356.00 M3	558.31 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/04/2025 al 30/04/2025	

Atentamente,

Verificar autenticidad



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal



E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico

(310) 574 4863 

(300) 241 4969 

Suministros

Excavaciones

Compactaciones

Alquiler de Maquinaria



El Suscrito Representante Legal De La Empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES S&M S.A.S
NIT. 901753475 – 4

Empresa autorizada por la Secretaria Distrital de Ambiente bajo el
PIN Ambiental # **26083**; e informe Técnico No. 03927 del 08 de Agosto de 2024.

Certifica Que:

En cumplimiento con la normatividad legal ambiental vigente, la siguiente información es conforme a lo solicitado por la
Secretaria Distrital de Ambiente.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN (Aplica solo para gestores de punto limpio, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)				
# NTR G -2024 – S&M – 10133						
1. DATOS DEL GENERADOR						
PIN-GEN		24931				
Nombre del Proyecto (obra)		Demolición, limpieza y cerramiento predios adquiridos por el IDU para la ejecución de proyectos viales y de especie publica que se encuentran a cargo de la dirección técnica de predios - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.				
Nombre o razón social		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S				
Documento de identificación o NIT		900.579.723-7				
Representante Legal		YAMILL MONTENEGRO				
Dirección domicilio		BOGOTA D.C.				
Teléfono		3152370618				
Correo electrónico		Ambiental.integral1711@gmail.com				
Dirección de generación de RCD		CTO IDU 1711- 2023				
2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD						
Transportador:						
Razón Social: <u>SOLUCIONES Y FORMAS METALICAS M&O S.A.S</u> No. de Identificación <u>830099423-1</u>						
Vehículos asociados: Tipo <u>CAMION ESTACAS</u> Placa <u>DUA970</u>						
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador: _____ No. PIN TRANS <u>18283</u>						
3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)	Punto Limpio		Sitio de Disposición Final		Recuperador Específico	X
	Receptor		Planta de tratamiento y aprovechamiento		Otro ¿Cuál?	

PIN del Gestor		26083		Datos del Gestor	
NTR		# NTR G -2024 – S&M – 10133		Nombre o razón social	SOLUCIONES AMBIENTALES S&M SAS
Fecha de recepción RCD		ABRIL DE 2025			901.753.475-4
				Representante Legal	ANA LUCIA CASTRO MARTINEZ
				Dirección	CALLE 74 BIS SUR 87C 27
				Municipio	BOGOTA D.C.
				Teléfono de contacto	3105502043
01 RCD susceptibles de recuperación					
01 01 Excavación				Ton	
01 01 01	Coberturas vegetales				
01 01 02	Tierras limpias de excavación				
01 01 03	Limos				
01 01 04	Materiales pétreos de excavación				
01 01 05	Otros residuos de excavación				
01 02 Productos de cimentación y pilotaje				Ton	
01 02 01	Arcillas				
01 02 02	Bentonitas				
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje				
01 04 No pétreos				Ton	
01 04 01	Madera				
01 04 02	Plásticos				
01 04 03	Vidrio				
01 04 04	Papel y cartón				
01 04 05	Gomas y cauchos				
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)				
01 04 07	Acrílico				
01 04 08	Mezclas bituminosas alquitrán				
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento				
01 04 10	Otros residuos no pétreos				
Nombre del encargado de la obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)				Firma. C.C.	
Nombre del Representante Legal - gestor				Firma. Ana Lucia Castro M. C.C. 28.867.403 DE ORTG (TOL)	
01 03 Pétreos				Ton	
01 03 01	Concretos				
01 03 02	Gravas				
01 03 03	Cantos				
01 03 04	Ladrillos				
01 03 05	Arenas				
01 03 06	Morteros				
01 03 07	Materiales cerámicos				
01 03 08	Residuos de material asfáltico				
01 03 09	Bases y sub bases granulares				
01 03 10	Otros residuos pétreos				
01 05 Metales				Ton	
01 05 01	Acero hierro			4.08	
01 05 02	Zinc				
01 05 03	Cobre				
01 05 04	Aluminio				
01 05 05	Otros metales				
02 RCD NO susceptibles de aprovechamiento				Ton	
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados				
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado				
02 02	Los que tengan características de peligrosidad				
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan				
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN (Aplica solo para gestores de punto limpio, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)			
# NTR G -2024 – S&M- 10133					
Para los gestores de Punto Limpio y Recuperadores Específicos deberán diligenciar la información que a continuación se relaciona del gestor (receptor, sitio de disposición final y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento y/o recuperador específico a quien entregaron los RCD)					
4. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador:					
Razón Social: SOLUCIONES Y FORMAS METALICAS M&O S.A.S No. de Identificación 830099423-1					
Vehículos asociados: Tipo CAMION ESTACAS Placa DUA970					
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador: No. PIN TRANS 18283					
5. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)					
Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)		Receptor	X	Sitio de Disposición Final	
		Recuperador Específico		Planta de aprovechamiento y/o tratamiento	
PIN del Gestor		26083		Datos del Gestor	
NTR		# NTR G -2024 – S&M - 10133		Nombre o razón social SOLUCIONES AMBIENTALES S&M S.A.S	
Fecha de recepción RCD		ABRIL DE 2025		Identificación o NIT 901.753.475-4	
				Representante Legal ANA LUCIA CASTRO MARTINEZ	
				Dirección CALLE 74 BIS SUR 87C 27	
				Municipio BOGOTÁ D.C.	
				Teléfono de contacto 3105502043	
01 RCD susceptibles de recuperación					
01 01 Excavación				Ton	
01 01 01	Coberturas vegetales				
01 01 02	Tierras limpias de excavación				
01 01 03	Limos				
01 01 04	Materiales pétreos de excavación				
01 01 05	Otros residuos de excavación				
01 04 No pétreos				Ton	
01 04 01	Madera				
01 04 02	Plásticos				
01 04 03	Vidrio				
01 04 04	Papel y cartón				
01 02 Productos de cimentación y pilotaje				Ton	
01 02 01	Arcillas				
01 02 02	Bentonitas				
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje				
01 03 Pétreos				Ton	
01 03 01	Concretos				
01 03 02	Gravas				
01 03 03	Cantos				
01 03 04	Ladrillos				
01 03 05	Arenas				
01 03 06	Morteros				
01 03 07	Materiales cerámicos				
01 03 08	Residuos de material asfáltico				
01 03 09	Bases y sub bases granulares				
01 03 10	Otros residuos pétreos				
01 05 Metales				Ton	
01 05 01	Acero hierro			4.08	
01 05 02	Zinc				
01 05 03	Cobre				
01 05 04	Aluminio				
01 05 05	Otros metales				

01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

02 RCD NO susceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	


Nombre del Representante Legal (punto limpio - recuperador específico)	Firma. C.C.
Nombre del Representante Legal – gestor (disposición final y/o aprovechamiento)	Firma. Ana Lucía Castro M. C.C. 28.867.403 DE ORTG (TOL)

Nota:

1 La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo gravedad de juramento.

Este documento se expide a los **08** días del mes de **Mayo** del **2025** a solicitud del interesado para dar cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable (Resolución 1257 de 2021 y Decreto 507 de 2023).

En constancia firma:


ANA LUCIA CASTRO MARTINEZ
 REPRESENTANTE GENERAL
 C.C. 28.867.403 de Ortega - Tolima.





CERTIFICACION COMERCIAL

E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA SAS.
NIT: 900.243.916-9

Por medio de la presente se certifica que la organización **KUMULA S.A.S**, con NIT **901.004.401-7** hace parte de nuestro portafolio de clientes aliados, para el proceso de poda de pasto para disposición final. De los cuales se entregaron **1890 m3**, (poda) pasto del mes de Abril 2025, a la empresa **KUMULA S.A.S**, proveniente de la organización INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S con nit **900.579.723-7**, contrato IDU: 1711 de 2023. Objeto del contrato "Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en la administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en Bogotá D.C. `` Grupo 1, PIN asignado 24931.

Se expide la presente a los 06 días del mes de Mayo de 2025. Cualquier información adicional relacionada con el acta, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA SAS.

I.A EDUARDO ANDRÉS PEDRAZA S.


E.CO.
NIT: 900243916-9
Cra. 74 No. 44-29 Sur
Tel.: 311 584 7164
Environment de Colombia

ACTA DE DISPOSICION N° R000005-2025

Número consecutivo A05 con verificación interna aplicativo E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA S.A.S prohibida su reproducción no autorizada.

Somos recuperadores incluidos por la secretaria de medio ambiente.



E.CO





KUMULA

Servicios Agroforestales y ambientales el cumula
NIT: 901004401-7

ACTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS # 438

KUMULA.

NIT: 901004401-7

Certifica que la empresa ECO ENVIRONMENT DE COLOMBIA con Nit 900243916-9, realizo la entrega de los residuos orgánicos de poda de césped para el tratamiento y el aprovechamiento de los desechos de tipo orgánico no peligrosos (residuos vegetales no peligrosos – Césped, Poda) **1.890 m³** generados en el mes **Abril** de la actividad de corte de césped ejecutado por la empresa **INFRAESTRUTURA INTEGRAL S.A.S** con NIT **900579723-7**, **CONTRATO IDU 1711 DE 2023** de los Frentes de obra: varios -Objeto del Contrato" demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en BOGOTA D.C." **Pin Ambiental 24931**

Su aprovechamiento consistió en someter los residuos a compostaje cual fue realizado por KUMULA SAS

Dado a los 5 días del mes de mayo del año 2025.

Cordialmente.

Ing. Jairo Olaya Medina
Representante Legal.

Calle 83 No. 96 – 51 Bogotá D.C.

Móvil: 314 288 54 67

Email: jairolayam@hotmail.com

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR

Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	24931
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	900579723-7
Dirección	KR 49 # 91-76
Teléfono	635 3245
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Yamill Montenegro Calderon
Cantidad proyectada a generar durante el contrato 1711-23 (Ton)	105287,91
Valor aprovechamiento (25% - Decreto 507 2023)	26321,98

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

1.CAPACITACION AMBIENTAL ABRIL 2025

Capacitaciones Efectuadas		
FECHA	TEMA TRATADO	No. Asistentes
22/04/2025	Manejo de campamentos y Acopios	13
	Implementación de medidas para controlar emisiones atmosfericas	
	Residuos de construcción y demolición - PMA - RCD Reutilización	
Total asistentes		13

2. Se realizó el retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en los predios donde se llevaron a cabo demoliciones del cto idu 1711-23, durante el periodo de Abril 2025.

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL 2DO TRIMESTRE 2025 (Abril)

Periodo reportado: 01 DE Abril DE 2025 AL 30 DE Abril DE 2025	Proyección ejecución del contrato					
TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADOS EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00	0,00	0,00	2.423,0	0,00	2.422,98
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,00	0,00	0,00	2.459,23	0,00	2.459,23
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	4,08
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se registrarán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCD TOTAL DEL PROYECTO CON EXCAVACION					4.886,29	
RCD SIN EXCAVACION					4.886,29	
2.2 METAS						
NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)		INDICADOR / PORCENTAJE		
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	4.886,29		100%		
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0.00		0,00%		
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	0.0008		0,08%		
	% (t entregadas / t total)	$\frac{4,08}{4886,29} = 0,0008$				
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0,9992		99,92%		
		$\frac{4882,21}{4886,29} = 0,9992$				
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,0000		0,00%		
		$\frac{0,0}{0,0} = 0,0$				
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0,0000		0,00%		
		$\frac{0,0}{0} = 0,0$				
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO $\frac{(Cantidad\ RCD\ aprovechado\ en\ obra + cantidad\ RCD\ entregado\ a\ planta\ de\ aprovechamiento)}{(cantidad\ de\ RCD\ generado\ en\ obra - excavación\ y\ sobrantes\ de\ la\ adecuación\ del\ terreno)}$	$\frac{(0+4882,21)}{(4886,29 - 0)} = 0,99$		99,92%		

Cordialmente;

FIRMA

RESIDENTE AMBIENTAL (Contrato IDU No 1711 DE 2023)

C.C. o 1030654429

NOMBRE BRAYAN S. ARANGO CRUZ



Transforma Ambientes

Bogotá D.C., jueves, 8 de mayo de 2025

Certificación No. SEC-00667SO-2025

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 030 OCTUBRE 23 DE 2020
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☒ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24931.
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.
Número de identificación o NIT	900.579.723-7.
Representante legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON.
Dirección de domicilio	Carrera 49 # 91-76.
Teléfono	(601) 635-3245.
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
	Contrato de obra, cuyo objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR

Dirección de generación de RCD	EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	1,212.00 M3	1,900.78 TON
Total RCD recibidos	1,212.00 M3	1,900.78 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/04/2025 al 30/04/2025	

Atentamente,

Verificar autenticidad



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal



Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico solicitudes.soacha@secamjr.com

(310) 574 4863 

(300) 241 4969 

Carrera 71D No. 57-10 Sur, Bogotá D.C. 



Transforma Ambientes

Bogotá D.C., jueves, 8 de mayo de 2025

Certificación No. SEC-01535JR-2025

SECAM J.R S.A.S.

NIT. 830.507.163-0

GESTOR DE RCDS

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☒ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24931.
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.
Número de identificación o NIT	900.579.723-7.
Representante legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON.
Dirección de domicilio	Carrera 49 # 91-76.
Teléfono	(601) 635-3245.
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
	Contrato de obra, cuyo objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA,

Dirección de generación de RCD	CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	356.00 M3	558.31 TON
Total RCD recibidos	356.00 M3	558.31 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/04/2025 al 30/04/2025	

Atentamente,

Verificar autenticidad



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal



E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico

(310) 574 4863 

(300) 241 4969 

Suministros

Excavaciones

Compactaciones

Alquiler de Maquinaria



El Suscrito Representante Legal De La Empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES S&M S.A.S
NIT. 901753475 – 4

Empresa autorizada por la Secretaria Distrital de Ambiente bajo el
PIN Ambiental # **26083**; e informe Técnico No. 03927 del 08 de Agosto de 2024.

Certifica Que:

En cumplimiento con la normatividad legal ambiental vigente, la siguiente información es conforme a lo solicitado por la
Secretaria Distrital de Ambiente.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN (Aplica solo para gestores de punto limpio, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)				
# NTR G -2024 – S&M – 10133						
1. DATOS DEL GENERADOR						
PIN-GEN		24931				
Nombre del Proyecto (obra)		Demolición, limpieza y cerramiento predios adquiridos por el IDU para la ejecución de proyectos viales y de especie publica que se encuentran a cargo de la dirección técnica de predios - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.				
Nombre o razón social		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S				
Documento de identificación o NIT		900.579.723-7				
Representante Legal		YAMILL MONTENEGRO				
Dirección domicilio		BOGOTA D.C.				
Teléfono		3152370618				
Correo electrónico		Ambiental.integral1711@gmail.com				
Dirección de generación de RCD		CTO IDU 1711- 2023				
2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD						
Transportador:						
Razón Social: <u>SOLUCIONES Y FORMAS METALICAS M&O S.A.S</u> No. de Identificación <u>830099423-1</u>						
Vehículos asociados: Tipo <u>CAMION ESTACAS</u> Placa <u>DUA970</u>						
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador: _____ No. PIN TRANS <u>18283</u>						
3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)						
Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)	Punto Limpio		Sitio de Disposición Final		Recuperador Específico	X
	Receptor		Planta de tratamiento y aprovechamiento		Otro ¿Cuál?	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN (Aplica solo para gestores de punto limpio, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)			
# NTR G -2024 – S&M- 10133					
Para los gestores de Punto Limpio y Recuperadores Específicos deberán diligenciar la información que a continuación se relaciona del gestor (receptor, sitio de disposición final y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento y/o recuperador específico a quien entregaron los RCD)					
4. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD					
Transportador:					
Razón Social: SOLUCIONES Y FORMAS METALICAS M&O S.A.S No. de Identificación 830099423-1					
Vehículos asociados: Tipo CAMION ESTACAS Placa DUA970					
No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador: No. PIN TRANS 18283					
5. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)					
Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)		Receptor	X	Sitio de Disposición Final	
		Recuperador Específico		Planta de aprovechamiento y/o tratamiento	
PIN del Gestor		26083		Datos del Gestor	
NTR		# NTR G -2024 – S&M - 10133		Nombre o razón social SOLUCIONES AMBIENTALES S&M S.A.S	
Fecha de recepción RCD		ABRIL DE 2025		Identificación o NIT 901.753.475-4	
				Representante Legal ANA LUCIA CASTRO MARTINEZ	
				Dirección CALLE 74 BIS SUR 87C 27	
				Municipio BOGOTÁ D.C.	
				Teléfono de contacto 3105502043	
01 RCD susceptibles de recuperación					
01 01 Excavación				Ton	
01 01 01	Coberturas vegetales				
01 01 02	Tierras limpias de excavación				
01 01 03	Limos				
01 01 04	Materiales pétreos de excavación				
01 01 05	Otros residuos de excavación				
01 04 No pétreos				Ton	
01 04 01	Madera				
01 04 02	Plásticos				
01 04 03	Vidrio				
01 04 04	Papel y cartón				
01 02 Productos de cimentación y pilotaje				Ton	
01 02 01	Arcillas				
01 02 02	Bentonitas				
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje				
01 03 Pétreos				Ton	
01 03 01	Concretos				
01 03 02	Gravas				
01 03 03	Cantos				
01 03 04	Ladrillos				
01 03 05	Arenas				
01 03 06	Morteros				
01 03 07	Materiales cerámicos				
01 03 08	Residuos de material asfáltico				
01 03 09	Bases y sub bases granulares				
01 03 10	Otros residuos pétreos				
01 05 Metales				Ton	
01 05 01	Acero hierro			4.08	
01 05 02	Zinc				
01 05 03	Cobre				
01 05 04	Aluminio				
01 05 05	Otros metales				

01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

02 RCD NO susceptibles de aprovechamiento		Ton
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	


Nombre del Representante Legal (punto limpio - recuperador específico)	Firma. C.C.
Nombre del Representante Legal – gestor (disposición final y/o aprovechamiento)	Firma. Ana Lucía Castro M. C.C. 28.867.403 DE ORTG (TOL)

Nota:

1 La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo gravedad de juramento.

Este documento se expide a los **08** días del mes de **Mayo** del **2025** a solicitud del interesado para dar cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable (Resolución 1257 de 2021 y Decreto 507 de 2023).

En constancia firma:


ANA LUCIA CASTRO MARTINEZ
 REPRESENTANTE GENERAL
 C.C. 28.867.403 de Ortega - Tolima.





CERTIFICACION COMERCIAL

E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA SAS.
NIT: 900.243.916-9

Por medio de la presente se certifica que la organización **KUMULA S.A.S**, con NIT **901.004.401-7** hace parte de nuestro portafolio de clientes aliados, para el proceso de poda de pasto para disposición final. De los cuales se entregaron **1890 m3**, (poda) pasto del mes de Abril 2025, a la empresa **KUMULA S.A.S**, proveniente de la organización INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S con nit **900.579.723-7**, contrato IDU: 1711 de 2023. Objeto del contrato "Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en la administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en Bogotá D.C. `` Grupo 1, PIN asignado 24931.

Se expide la presente a los 06 días del mes de Mayo de 2025. Cualquier información adicional relacionada con el acta, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA SAS.

I.A EDUARDO ANDRÉS PEDRAZA S.

E.CO.
NIT. 900243916-9
Cra. 74 No. 44-29 Sur
Tel.: 311 584 7164

ACTA DE DISPOSICION N° R000005-2025

Número consecutivo A05 con verificación interna aplicativo E.CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA S.A.S prohibida su reproducción no autorizada.

Somos recuperadores incluidos por la secretaria de medio ambiente.



E.CO





KUMULA

Servicios Agroforestales y ambientales el cumula
NIT: 901004401-7

ACTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS # 438

KUMULA.

NIT: 901004401-7

Certifica que la empresa ECO ENVIRONMENT DE COLOMBIA con Nit 900243916-9, realizo la entrega de los residuos orgánicos de poda de césped para el tratamiento y el aprovechamiento de los desechos de tipo orgánico no peligrosos (residuos vegetales no peligrosos – Césped, Poda) **1.890 m³** generados en el mes **Abril** de la actividad de corte de césped ejecutado por la empresa **INFRAESTRUTURA INTEGRAL S.A.S** con NIT **900579723-7**, **CONTRATO IDU 1711 DE 2023** de los Frentes de obra: varios -Objeto del Contrato" demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en BOGOTA D.C." **Pin Ambiental 24931**

Su aprovechamiento consistió en someter los residuos a compostaje cual fue realizado por KUMULA SAS

Dado a los 5 días del mes de mayo del año 2025.

Cordialmente.

Ing. Jairo Olaya Medina
Representante Legal.

Calle 83 No. 96 – 51 Bogotá D.C.

Móvil: 314 288 54 67


Email: jairolayam@hotmail.com

ANEXO VI. FORMATO DE CERTIFICACION DE RECEPCION DE RCD

DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR	
Nombre o razón social	N/A
Documento de identificación o NIT	
Director de obra	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	
Municipio o Distrito	Bogotá
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Numero único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24931
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
Documento de identificación o NIT	900579723-7
Director de obra	MONICA JIMENA GUERRA
Dirección domicilio	KR 49 # 91 76
Teléfono	6353245
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
Dirección de generación de RCD	BOGOTA DC

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	Cantidad de RCD entregados por el generador (t)	Tipo de aprovechamiento
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,00	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	0
Total RCD recibidos (t)	0,00	0
Fecha de recepción de los RCD	01 De Abril de 2025 al 30 de Abril de 2025	
Notas: 1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. 2. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal. 3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental y copia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 4. Durante el presente periodo no se realiza entrega de RCD a receptor, sin embargo, dicho material ha sido entregado en su totalidad a planta de aprovechamiento.		

Cordialmente;


FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL
C.C. o NIT: 1030654429
NOMBRE: BRAYAN ARANGO CRUZ

FORMATO							
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA							
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN		
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión				3		
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA			FECHA		30/04/2025
DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS					
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		NA					
CONTRATO No.		CTO IDU 1711-23					
OBJETO DEL CONTRATO:		DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA DC					
FRENTES DE OBRA		NA					
SUMIDEROS	X	NÚMERO DE SUMIDEROS	2	CUERPO DE AGUA	0	TIPO DE CUERPO DE AGUA	0
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	N° ACTO ADMINISTRATIVO		NO APLICA	
PERIODO		ESTADO ACTUAL		ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		MEDIDAS DE MANEJO	
SUMIDEROS							
RT 54884		EN FUNCIONAMIENTO		DEMOLICION		LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MALLA AZUL	
RT 54884		EN FUNCIONAMIENTO		DEMOLICION		LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MALLA AZUL	
CUERPOS DE AGUA							
DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME, COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2025 Y EL 30 DE ABRIL DE 2025, SE RECONOCEN DOS (2) SUMIDEROS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN EN EL RT 54884 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, SECTOR DE LA ESTANCIA							
REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)							
 ANTES DE LA INTERVENCIÓN		 DURANTE LA INTERVENCIÓN		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">NA</div> DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN			
 ANTES DE LA INTERVENCIÓN		 DURANTE LA INTERVENCIÓN		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">NA</div> DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN			
<div style="text-align: right;">(Firma)</div> <div style="text-align: left;">(Nombre) <u>Brayan S. Arango Cruz</u> Residente Ambiental Contratista</div>		<div style="text-align: right;">(Firma)</div> <div style="text-align: left;">(Nombre) <u>LOLY VANEGAS</u> Residente Ambiental de Interventoría</div>					

FORMATO

LISTADO DE VEHICULOS

PRECISO

VISION

4

idU

CONTRATO

FO-AC-42

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

NA

1711 DE 2023

01 de ABRIL De 2025 A 30 de ABRIL De 2025

PERIODO EVALUADO

CONTRATO IDU 1711 "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Viales y de Espacio Público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios - Proyectos Varios en Bogotá D.C."

No.	No. IDENTIFICACIÓN IDU	VEHICULO			SOAT		RTM		PIN	CONTROL KILOMETRAJE HORAS		PROYECCIÓN PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Km O H)	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (H O Km)	LECTURA (H O Km) DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO EN EL PERIODO		ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS DESARROLLADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
		Placa	Modelo	Clase	Número	Fecha de Vencimiento	Número	Fecha de Vencimiento		Periodo actual	Acumulado			Preventivo	Correctivo		Preventivo	Correctivo	
1	1	NA	2023	MINICARGADOR	NA	NA	NA	NA	0	1195	1195	0	250						
2	3	LUW 161	2023	VOQUETA	41252972	14/02/2026	179500868	46065	435	NA PARA EL PERIODO	NA PARA EL PERIODO	2000	5000						
3	4	SQW 491	2012	VOQUETA	3334123000912	10/04/2025	174094598	26/06/2025	23500	263740.00	263793.00	250000	24000						
4	7	LUW 159	2023	VOQUETA	41252965	14/02/2026	179492154	46065	1000	NA PARA EL PERIODO	NA PARA EL PERIODO	0	1500						
5	13	SZN675	2010	VOQUETA	89122958-610129086	02/09/2025	179783495	46079	21257	400125.00	400345.00								
6	19	TGL341	2011	VOQUETA	3600026423	06/06/2025	175086124	09/08/2025	12028	286151.00	286202.00								
7	17	CQN013	1981	VOQUETA	3600027558	08/07/2025	174350785	45847	775	23293	23318.00								
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			

NOTAS

1899

CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LA CANTIDAD O EL TIPO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA UNA MAQUINARIA, EQUIPO O VEHICULO.

No. IDENTIFICACIÓN IDU

Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipo y/o Vehículos vinculados al Proyecto.

MODELO:

Año de fabricación, Importación o representación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

FIRMAS:

Las firmas abajo, corresponden a los profesionales responsables de maquinaria y equipos tanto de Obra como de Interventoría, que son los encargados de recopilar y hacer seguimiento a la documentación de maquinaria/equipos y vehículos.

(Firma)

(Nombre)

DIANA MUÑOZ

Responsable de Maquinaria y Equipos de Contratación de Obra

(Firma)

(Nombre)

Responsable de Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 1

10. LOS USUARIOS DE VEHÍCULOS DE TRÁNSITO PÚBLICO, AUTOMÓVILES												
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	MUNICIPIO			SECTOR		GÉNERO			EDAD DE LOS USUARIOS		
		URBANO	SUBURBANO	RURAL	URBANO	NO URBANO	MALESA	HEMBRA	NO DETERMINADO	DE 0 A 17 AÑOS	DE 18 A 64 AÑOS	65 AÑOS O MÁS
1	1	NO	2020	00000000000000000000	NO	NO	NO	NO	0	2000	NO	
2	2	URBANO	2020	00000000000000000000	URBANO	NO	NO	NO	0	2000	NO	
3	3	SUBURBANO	2020	00000000000000000000	SUBURBANO	NO	NO	NO	0	2000	NO	
4	4	RURAL	2020	00000000000000000000	RURAL	NO	NO	NO	0	2000	NO	

[illegible]

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

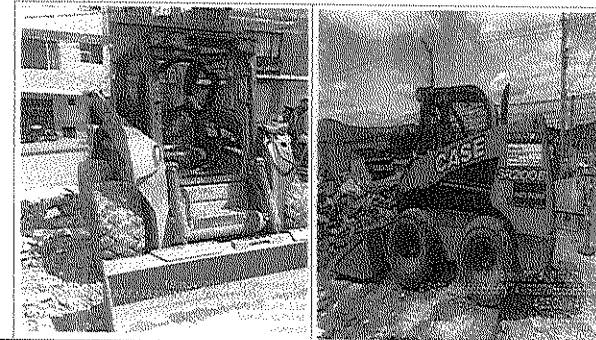
CODIGO
FO-AC-47

PROCESO
Prácticas Integrales de Gestión

VERSION
2

PLACA	120407	MODELO	2023	MARCA	CASE
No. IDENTIFICA	1	CAPACIDAD	3280 KG	PERIODO EVALUADO	08/04/25 AL 09/04/25
*LICENCIA DE TRANSITO	NA		TIPO DE VEHICULO	MINICARGADOR	
*LICENCIA DE CONDUCCION	NA		VENCE	NA	
*MANEJO DEFENSIVO	NA		VENCE	NA	
*REVISION TECNICO-MECANICA	NA		VENCE	NA	
*SOAT	NA		VENCE	NA	

FOTOGRAFÍAS



CONTRATO N° 1711 DE 2023

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCO.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				/		/									
	Indicador de temperatura				/		/									
	Indicador de aceite				/		/									
	Indicador de batería				/		/									
	Indicador de combustible				/		/									
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro				/		/									
	*Indicador de presión de aire				/		/									
	Conexiones eléctricas				/		/									
LUCES / SEÑALES	Fusibles				/		/									
	* Exteriores (Altas y bajas)				/		/									
	Direccionales delanteras				/		/									
	Direccionales traseras	NA			/		/									
	Traseras de trabajo (reflector)	NA			/		/									
	De estacionamiento	NA			/		/									
	De Stop y reversa	NA			/		/									
	*Baliza	NA			/		/									
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)				/		/									
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)				/		/									
	*Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)				/		/									
	*Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)				/		/									
	*Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)				/		/									
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores	NA			/		/									
GENERAL	Espejo central convexo				/		/									
	Espejos laterales				/		/									
	Alarma de retroceso	NA			/		/									
	Pito				/		/									
	* Freno de servicio				/		/									
	* Freno de emergencia				/		/									
	Cinturones de seguridad				/		/									
	Vidrio frontal / Limpia brisas				/		/									
	*Kit de control de emergencias ambientales	NA			/		/									
	Barra antivuelco				/		/									
	Asientos y tapiceria				/		/									
	Sistema de carpado				/		/									
	Grapas y anclaje de chasis				/		/									
	Cadena del cardan	NA			/		/									
	Ajustes y seguros de las puertas	NA			/		/									
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y	NA			/		/									
	Presión de aire de las llantas				/		/									
MECANICO	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				/		/									
	* Caja de cambios / transmisión	NA			/		/									
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)	NA			/		/									
	* Dirección	NA			/		/									
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				/		/									
	Estado Radiador				/		/									
	Estado y tensión de las correas				/		/									
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)	NA			/		/									
	Estado de filtro de aire				/		/									

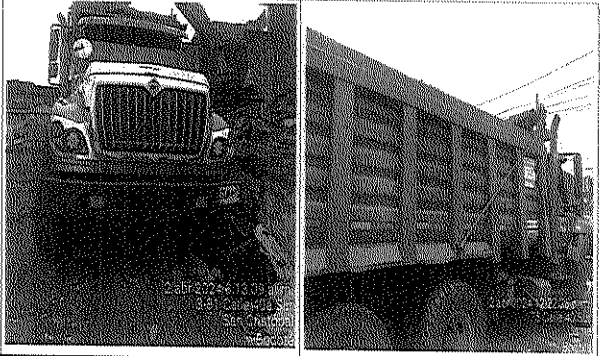
FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

Prácticas Integrales de Gestión

VERSION
2



Código		Prácticas Integrales de Gestión																VERSION			
FO-AC-47																		2			
EQUIPO DE CARRETERA	Estado de filtro de combustible																				
	Ruidos extraños en el motor																				
	*Motor sin grietas																				
	Humo de escape																				
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																				
	*Botiquín																				
	*cruceta																				
	*Tacos para bloquear el vehículo																				
*Triángulos reflectivos-Conos																					
*Linterna																					
*Caja de herramientas (alcate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)																					
*Extintor de incendios capacidad: 10 lb PQS																					
Operador	Nombre	YEISON CHIMBI				YEISON CHIMBI				YEISON CHIMBI				YEISON CHIMBI				YEISON CHIMBI			
	Firma																				
	Nombre																				
	Firma																				
	AutORIZACIÓN para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventor/a																				
SEGUIMIENTO DIARIO	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL					
			118877	119371	119371	119500															
OBSERVACIONES																					
NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.</p> <p>N/A: No aplica</p>																				
<p align="center">CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN</p> <p align="center">Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.</p>																					
(Firma) (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Vo. Bo. (Firma) (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría																			

FORMATO PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																				
CODIGO		PROCESO										VERSION								
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión										2								
PLACA	SQW 491		MODELO	2012		MARCA	INTERNACIONAL													
No. IDENTIFICA	4		CAPACIDAD	16580 kg		PERIODO EVALUADO	14.04.2023 AL 16.04.25													
*LICENCIA DE TRANSITO				10030544495		TIPO DE VEHICULO	VOLQUETA													
*LICENCIA DE CONDUCCION No.				1024171557		VENCE	26/01/2026													
*MANEJO DEFENSIVO No.						VENCE														
*REVISION TECNICO-MECANICA No.				174094598		VENCE	26/06/2025													
*SOAT No.				38996687		VENCE	10/04/2025													
CONTRATO N° 1711 DE 2023						FOTOGRAFÍAS														
																				
SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION					N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ELECTRICO/TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables						BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
	Indicador de temperatura						/		/		/									
	Indicador de aceite						/		/		/									
	Indicador de batería						/		/		/									
	Indicador de combustible						/		/		/									
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro						/		/		/									
	*Indicador de presión de aire						/		/		/									
	Conexiones eléctricas						/		/		/									
LUCES/SEÑALES	Fusibles						/		/		/									
	* Exteriores (Altas y bajas)						/		/		/									
	Direccionales delanteras						/		/		/									
	Direccionales traseras						/		/		/									
	Traseras de trabajo (reflector)						/		/		/									
	De estacionamiento						/		/		/									
	De Stop y reversa						/		/		/									
	* Baliza						/		/		/									
HIDRAULICO	* Nivel de aceite del motor (verificar fugas)						/		/		/									
	* Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)						/		/		/									
	* Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)						/		/		/									
	* Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)						/		/		/									
	* Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)						/		/		/									
	* Mangueras, tubos, conexiones y racores						/		/		/									
	Espejo central convexo						/		/		/									
	Espejos laterales						/		/		/									
GENERAL	Alarma de retroceso						/		/		/									
	Pito						/		/		/									
	* Freno de servicio						/		/		/									
	* Freno de emergencia						/		/		/									
	Cinturones de seguridad						/		/		/									
	Vidrio frontal / Limpia brisas						/		/		/									
	* Kit de control de emergencias ambientales						/		/		/									
	Barra antivuelco						/		/		/									
	Asientos y tapiceria						/		/		/									
	Sistema de carpado						/		/		/									
	Grapas y anclaje de chasis						/		/		/									
	Cadena del cardan						/		/		/									
	Ajustes y seguros de las puertas						/		/		/									
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin						/		/		/									
	Presión de aire de las llantas						/		/		/									
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)						/		/		/									
MECANICO	* Caja de cambios/transmisión						/		/		/									
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)						/		/		/									
	* Dirección						/		/		/									
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)						/		/		/									
	Estado Radiador						/		/		/									
	Estado y tensión de las correas						/		/		/									
Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)						/		/		/										

FORMATO																				
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																				
CODIGO		PROCESO														VERSION				
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión														2				
EQUIPO DE CARRETERA	Estado de filtro de aire																			
	Estado de filtro de combustible																			
	Ruidos extraños en el motor																			
	*Motor sin gñetas																			
	Fumo de escape																			
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																			
	*Botiquín																			
	*cruceta																			
	*Tacos para bloquear el vehículo																			
	*Triángulos reflectivos-Conos																			
*Linterna																				
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.																				
*Extintor de incendios capacidad: PQS																				
SEGUIMIENTO DIARIO	Operador	Nombre	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ		JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ		JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ		JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ		JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ		JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ		JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ		JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ			
		Firma			Johan Orlando Rodriguez															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
		Firma																		
			KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL	KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL	KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL	KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL	KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL	KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL	KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL	KM - HORÓMETRO INICIAL	KM - HORÓMETRO FINAL		
OBSERVACIONES																				
NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación, Importación del Vehículo.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.</p> <p>N/A: No aplica</p>										<p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.</p> <p>Para el resto de los ítems que se encontraron seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p> <p>Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.</p>									
<p align="center">CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN</p> <p align="center">Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.</p>																				
<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) _____</p> <p>Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista</p>										<p>Vo. So. (Firma) </p> <p>(Nombre) _____</p> <p>Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría</p>										

CODIGO
FO-AC-47

PROCESO
Prácticas Integrales de Gestión

VERSION
2



PLACA SQW 491 MODELO 2012 MARCA INTERNACIONAL

No. IDENTIFICA 4 CAPACIDAD 16580 kg

PERIODO EVALUADO 21.04.25 AL 24.04.25

*LICENCIA DE TRANSITO 10030544495

TIPO DE VEHICULO VOLQUETA

*LICENCIA DE CONDUCCION No. _____

VENCE 26/01/2026

*MANEJO DEFENSIVO No. _____

VENCE _____

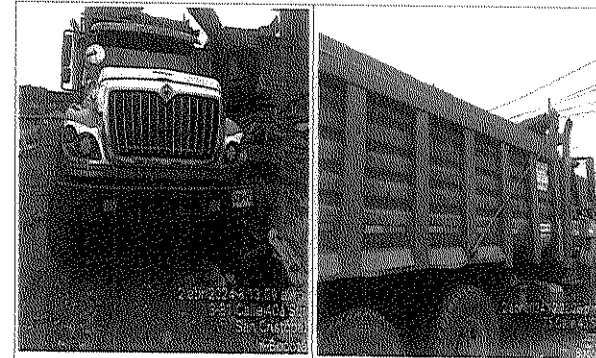
*REVISION TECNICO-MECANICA No. 174094598

VENCE 26/06/2025

*SOAT No. 38996687

VENCE 10/04/2025

FOTOGRAFÍAS



CONTRATO N° 1711 DE 2023

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de temperatura		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de aceite		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de bateria		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de combustible		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Indicador de presión de aire		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Conexiones eléctricas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LUCES / SEÑALES	Fusibles		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Exteriores (Altas y bajas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Direccionales delanteras		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Direccionales traseras		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Traseras de trabajo (reflector)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	De estacionamiento		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	De Stop y reversa		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Baliza		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HIDRAULICO	* Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Mangueras, tubos, conexiones y racores		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Espejo central convexo		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Espejos laterales		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
GENERAL	Alarma de retroceso		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pito		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de servicio		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Freno de emergencia		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cinturones de seguridad		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Vidrio frontal / Limpia brisas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Kit de control de emergencias ambientales		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Barra antivuelco		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Asientos y tapicería		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sistema de carpado		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Grapas y anclaje de chasis		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cadena del cardan		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ajustes y seguros de las puertas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Llantas: Profundidad de labrado (minimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Presión de aire de las llantas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CAMINCO	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Caja de cambios / transmisión		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Dirección		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado Radiador		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado y tensión de las correas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

FORMATO																		
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																		
CODIGO		PROCESO												VERSION				
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión												2				
EQUIPO DE CARRETERA	Estado de filtro de aire																	
	Estado de filtro de combustible																	
	Ruidos extraños en el motor																	
	*Motor sin grietas																	
	Humo de escape																	
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																	
EQUIPO DE CARRETERA	*Botiquín																	
	*Cruceta																	
	*Tacos para bloquear el vehículo																	
	*Triángulos reflectivos-Conos																	
	*Linterna																	
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)																	
EQUIPO DE CARRETERA	*Extintor de incendios capacidad: POS																	
	Operador	Nombre	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	
	Firma	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>	<i>JOR</i>		
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																	
	SEGUIMIENTO DIARIO	KM- HORÓMETRO INICIAL	263745	KM- HORÓMETRO FINAL	263748	KM- HORÓMETRO INICIAL	263748	KM- HORÓMETRO FINAL	263748	KM- HORÓMETRO INICIAL	263748	KM- HORÓMETRO FINAL	263748	KM- HORÓMETRO INICIAL	263748	KM- HORÓMETRO FINAL	263748	KM- HORÓMETRO INICIAL
EQUIPO DE CARRETERA	OBSERVACIONES																	
NOTAS	TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.	El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.																
	REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.	Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.																
NOTAS	No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.	Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, campers, automóviles.																
	MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.																	
NOTAS	CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.																	
	N/A: No aplica																	
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN																		
Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.																		
(Firma)		Vo. Bo.		(Firma)														
(Nombre)				(Nombre)														
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista				Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría														

FORMATO																		
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																		
CÓDIGO		PROCESO															VERSION	
FO-AC-47		Prácticas Integradas de Gestión															2	
EQUIPO DE CARRETERA	Estado de filtro de aire																	
	Estado de filtro de combustible																	
	Ruidos extraños en el motor																	
	*Motor sin grietas																	
	Humo de escape																	
EQUIPO DE CARRETERA	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																	
	*Botiquín																	
	*Cruceta																	
	*Tacos para bloquear el vehículo																	
	*Triángulos reflectivos-Conos																	
EQUIPO DE CARRETERA	*Linterna																	
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)																	
	*Extintor de incendios capacidad: PQS																	
	Nombre	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ	JOHAN ORLANDO RODRIGUEZ
	Firma																	
EQUIPO DE CARRETERA	Nombre																	
	Firma																	
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría																	
	SEGUIMIENTO DIARIO																	
	OBSERVACIONES																	
NOTAS	TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.																	
	REFERENCIA: Clasificación según la capacidad u especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.																	
	No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.																	
	MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.																	
	CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.																	
NOTAS	N/A: No aplica																	
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN																		
Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.																		
Firma)		Vo. Bo.																
(Nombre)		(Firma)																
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría																

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CÓDIGO FO-AC-47					PROCESO Prácticas Integrales de Gestión	VERSION 2	
PLACA <u>SZN675</u>	MODELO <u>2010</u>	MARCA <u>VOLVO</u>					
No. IDENTIFICA <u>13</u>	CAPACIDAD <u>15200</u>	PERIODO EVALUADO <u>09/01/25AL</u>					
*LICENCIA DE TRANSITO <u>10026036014</u>	TIPO DE VEHICULO <u>VOLQUETA</u>						
*LICENCIA DE CONDUCCION No. <u>1022432964</u>	VENCE <u>28/08/2026</u>						
*MANEJO DEFENSIVO No. _____	VENCE _____						
*REVISION TECNICO-MECANICA No. <u>179783495</u>	VENCE <u>26/02/2026</u>						
*SOAT No. <u>89122958-610129086</u>	VENCE <u>2/09/2025</u>						

FOTOGRAFÍAS



CONTRATO N° 1711 **DE 2023**

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Hórometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
	*Extensores (Altas y bajas)															
LUCES / SEÑALES	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	*Baliza															
	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)															
HIDRAULICO	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)															
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)															
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)															
	*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)															
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	*Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardán															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECANICO	* Caja de cambios/transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CÓDIGO		PROCESO														VERSIÓN	
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión														2	
EQUIPO DE CARRETERA	Estado de filtro de combustible																
	Ruidos extraños en el motor																
	*Motor sin gnetas																
	Humo de escape																
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																
	*Botiquín																
	*cruceta																
	*Tacos para bloquear el vehículo																
	*Triángulos reflectivos-Conos																
	*Linterna																
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)																	
*Extintor de incendios capacidad:	PQS																
	Operador	Nombre	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO	JHON SEBASTIAN FAJARDO
		Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
		Firma															
	SEGUIMIENTO DIARIO	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL
OBSERVACIONES																	
NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.</p> <p>N/A: No aplica</p>										<p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar. Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p> <p>Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, campers, automóviles.</p>						
<p align="center">CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN</p> <p align="center">Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.</p>																	
(Firma)  (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Vo. Bo. (Firma)  (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría															

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CÓDIGO FO-AC-47		PROCESO Prácticas Integrales de Gestión		VERSION 2	
PLACA	SZN675	MODELO	2010	MARCA	VOLVO
No. IDENTIFICA	13	CAPACIDAD	15200	PERIODO EVALUADO	14/04/25 AL 16/04/25
*LICENCIA DE TRANSITO	10026036014		TIPO DE VEHICULO VOLQUETA		
*LICENCIA DE CONDUCCION No.	1022432964		VENCE 28/08/2026		
*MANEJO DEFENSIVO No.			VENCE		
*REVISION TECNICO-MECANICA No.	179783495		VENCE 26/02/2026		
*SOAT No.	89122958-610129086		VENCE 2/09/2025		

FOTOGRAFÍAS



CONTRATO N° 1711 DE 2023

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		/		/		/									
	Indicador de temperatura		/		/		/									
	Indicador de aceite		/		/		/									
	Indicador de batería		/		/		/									
	Indicador de combustible		/		/		/									
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		/		/		/									
	*Indicador de presión de aire		/		/		/									
	Conexiones eléctricas		/		/		/									
LUCES / SEÑALES	Fusibles		/		/		/									
	* Exteriores (Altas y bajas)		/		/		/									
	Direccionales delanteras		/		/		/									
	Direccionales traseras		/		/		/									
	Traseras de trabajo (reflector)		/		/		/									
	De estacionamiento		/		/		/									
	De Stop y reversa		/		/		/									
	* Baliza		/		/		/									
HIDRAULICO	* Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/		/		/									
	* Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		/		/		/									
	* Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		/		/		/									
	* Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		/		/		/									
	* Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		/		/		/									
	* Mangueras, tubos, conexiones y racores		/		/		/									
GENERAL	Espejo central convexo		/		/		/									
	Espejos laterales		/		/		/									
	Alarma de retroceso		/		/		/									
	Pito		/		/		/									
	* Freno de servicio		/		/		/									
	* Freno de emergencia		/		/		/									
	Cinturones de seguridad		/		/		/									
	Vidrio frontal / Limpia brisas		/		/		/									
	* Kit de control de emergencias ambientales		/		/		/									
	Barra antivuelco		/		/		/									
	Asientos y tapicería		/		/		/									
	Sistema de carpado		/		/		/									
	Grapas y anclaje de chasis		/		/		/									
	Cadena del cardan		/		/		/									
	Ajustes y seguros de las puertas		/		/		/									
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y		/		/		/									
	Presión de aire de las llantas		/		/		/									
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		/		/		/									
MECANICO	* Caja de cambios/transmisión		/		/		/									
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		/		/		/									
	* Dirección		/		/		/									
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		/		/		/									
	Estado Radiador		/		/		/									
	Estado y tensión de las correas		/		/		/									
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		/		/		/									
	Estado de filtro de aire		/		/		/									

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA



CÓDIGO		PROCESO														VERSION	
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión														2	
EQUIPO DE CARRETERA	Estado de filtro de combustible																
	Ruidos extraños en el motor																
	*Motor sin gnetas																
	Humo de escape																
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																
	*Botiquín																
	*cruceta																
	*Tacos para bloquear el vehículo																
	*Triángulos reflectivos-Conos																
	*Linterna																
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.																	
*Extintor de incendios capacidad:	PQS																
OPERADOR	Nombre	JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO	
	Firma																
	Nombre																
	Firma																
	SEGUIMIENTO DIARIO	KM-HOROMETRO INICIAL	40193	40202	40202	40210	40210	40216									
		KM-HOROMETRO FINAL															
		KM-HOROMETRO INICIAL															
		KM-HOROMETRO FINAL															
	OBSERVACIONES																
NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.</p> <p>N/A: No aplica</p> <p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar. Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p> <p>Este formato es aplicable a: Volquetas, camiones, furgones, tractocamiones, camiones, automóviles.</p>																
<p align="center">CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN</p> <p align="center">Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.</p>																	
(Firma) (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Vo. Bo. (Firma) (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría															

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CÓDIGO FO-AC-47	PROCESO Prácticas Integrales de Gestión				VERSION 2
PLACA <u>SZN675</u>	MODELO <u>2010</u>	MARCA <u>VOLVO</u>	FOTOGRAFÍAS 		
No. IDENTIFICA <u>13</u>	CAPACIDAD <u>15200</u>	PERIODO EVALUADO <u>21/04/25 AL 25/04/25</u>			
*LICENCIA DE TRANSITO <u>10026036014</u>	TIPO DE VEHICULO <u>VOLQUETA</u>				
*LICENCIA DE CONDUCCION No. <u>1022432964</u>	VENCE <u>28/08/2026</u>				
*MANEJO DEFENSIVO No. _____	VENCE _____				
*REVISION TECNICO-MECANICA No. <u>179783495</u>	VENCE <u>26/02/2026</u>				
*SOAT No. <u>89122958-610129086</u>	VENCE <u>2/09/2025</u>				


CONTRATO N° 1711 **DE 2023**

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		/		/		/		/		/					
	Indicador de temperatura		/		/		/		/		/					
	Indicador de aceite		/		/		/		/		/					
	Indicador de batería		/		/		/		/		/					
	Indicador de combustible		/		/		/		/		/					
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Hórometro		/		/		/		/		/					
	*Indicador de presión de aire		/		/		/		/		/					
LUCES / SEÑALES	Conexiones eléctricas		/		/		/		/		/					
	Fusibles		/		/		/		/		/					
	* Exteriores (Altas y bajas)		/		/		/		/		/					
	Direccionales delanteras		/		/		/		/		/					
	Direccionales traseras		/		/		/		/		/					
	Traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/		/					
	De estacionamiento		/		/		/		/		/					
HIDRAULICO	De Stop y reversa		/		/		/		/		/					
	* Baliza		/		/		/		/		/					
	* Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/		/		/		/		/					
	* Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		/		/		/		/		/					
	* Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		/		/		/		/		/					
	* Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		/		/		/		/		/					
	* Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		/		/		/		/		/					
GENERAL	* Mangueras, tubos, conexiones y racores		/		/		/		/		/					
	Espejo central convexo		/		/		/		/		/					
	Espejos laterales		/		/		/		/		/					
	Alarma de retroceso		/		/		/		/		/					
	Pito		/		/		/		/		/					
	* Freno de servicio		/		/		/		/		/					
	* Freno de emergencia		/		/		/		/		/					
	Cinturones de seguridad		/		/		/		/		/					
	Vidrio frontal / Limpia brisas		/		/		/		/		/					
	* Kit de control de emergencias ambientales		/		/		/		/		/					
	Barra antivuelco		/		/		/		/		/					
	Asientos y tapicería		/		/		/		/		/					
	Sistema de carpado		/		/		/		/		/					
	Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/		/					
	Cadena del cardán		/		/		/		/		/					
	Ajustes y seguros de las puertas		/		/		/		/		/					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y		/		/		/		/		/					
MECANICO	Presión de aire de las llantas		/		/		/		/		/					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		/		/		/		/		/					
	* Caja de cambios/transmisión		/		/		/		/		/					
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		/		/		/		/		/					
	* Dirección		/		/		/		/		/					
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		/		/		/		/		/					
	Estado Radiador		/		/		/		/		/					
	Estado y tensión de las correas		/		/		/		/		/					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		/		/		/		/		/					
	Estado de filtro de aire		/		/		/		/		/					

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CÓDIGO		PROCESO												VERSIÓN		
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión												2		
EQUIPO DE CARRETERA	Estado de filtro de combustible															
	Ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas															
	Humo de escape															
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	*Botiquín															
	*cruceta															
	*Tacos para bloquear el vehículo															
	*Triángulos reflectivos-Conos															
	*Linterna															
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)																
*Extintor de incendios capacidad:	PQS															
Operador	Nombre	JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		JHON SEBASTIAN FAJARDO		
	Firma															
	Nombre															
	Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría															
SEGUIMIENTO DIARIO	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL	KM- HOROMETRO INICIAL	KM- HOROMETRO FINAL
	400313	400316	400318	400323	400323	400324	400324	400325	400325	400329	400329	400329	400329	400329	400329	400329
OBSERVACIONES																
NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación, importación del Vehículo.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.</p> <p>N/A: No aplica</p> <p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar. Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (multi), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p> <p>Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.</p>															
<p align="center">CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN</p> <p align="center">Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.</p>																
(Firma) (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Vo. Bo. (Firma) (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría														

FORMATO																
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																
CODIGO		PROCESO										VERSION		IDU		
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión										2				
PLACA		TGL 341		MODELO		2011		MARCA		VOLVO						
No. IDENTIFICA		16		CAPACIDAD		17000 KG		PERIODO EVALUADO		25/04/25AL						
*LICENCIA DE TRANSITO				10011951194		TIPO DE VEHICULO		VOLQUETA								
*LICENCIA DE CONDUCCION No.		19381452		VENCE		4/02/2026										
*MANEJO DEFENSIVO No.				VENCE												
*REVISION TECNICO-MECANICA No.		175086124		VENCE		9/08/2025										
*SOAT No.		3600026423		VENCE		6/06/2025										
FOTOGRAFIAS																
CONTRATO N° 1711 DE 2023																
SISTEMA DEL VEHICULO																
ITEM DE REVISION																
N/A																
LUNES																
BIEN																
MAL																
MARTES																
BIEN																
MAL																
MIERC.																
BIEN																
MAL																
JUEVES																
BIEN																
MAL																
VIERNES																
BIEN																
MAL																
SABADO																
BIEN																
MAL																
DOMINGO																
BIEN																
MAL																
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL																
Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables																
Indicador de temperatura																
Indicador de aceite																
Indicador de batería																
Indicador de combustible																
Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro																
*Indicador de presión de aire																
Conexiones eléctricas																
Fusibles																
LUCES / SEÑALES																
* Exteriores (Altas y bajas)																
Direccionales delanteras																
Direccionales traseras																
Traseras de trabajo (reflector)																
De estacionamiento																
De Stop y reversa																
*Baliza																
HIDRAULICO																
*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)																
*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)																
*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)																
*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)																
*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)																
*Mangueras, tubos, conexiones y racores																
GENERAL																
Espejo central convexo																
Espejos laterales																
Alarma de retroceso																
Pito																
* Freno de servicio																
* Freno de emergencia																
Cinturones de seguridad																
Vidrio frontal / Limpia brisas																
*Kit de control de emergencias ambientales																
Barra antivuelco																
Asientos y tapicería																
Sistema de carpado																
Grapas y anclaje de chasis																
Cadena del cardan																
Ajustes y seguros de las puertas																
Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin																
Presión de aire de las llantas																
Llanta de repuesto (CALIBRADA)																
MECANICO																
* Caja de cambios/Transmisión																
* Suspensión (muelles, amortiguadores)																
* Dirección																
* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)																
Estado Radiador																
Estado y tensión de las correas																
Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)																
Estado de filtro de aire																
Estado de filtro de combustible																
Ruidos extraños en el motor																

FORMATO																		
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																		
CÓDIGO		PROCESO												VERSIÓN		IDU		
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión												2				
EQUIPO DE CARRERETA	*Motor sin grietas																	
	*Humo de escape																	
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																	
	*Botiquín																	
	*cruceta																	
	*Tacos para bloquear el vehículo																	
	*Triángulos reflectivos-Conos																	
	*Linterna																	
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)																		
*Extintor de incendios capacidad: PQS																		
	Operador	Nombre	DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ			
		Firma																
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
		Firma																
	SEGUIMIENTO DIARIO	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	
	OBSERVACIONES																	
	NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación, Importación del Vehículo.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.</p> <p>N/A: No aplica</p> <p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.</p> <p>Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (ma), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p> <p>Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.</p>																
	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN																	
Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.																		
(Firma)																		
(Nombre)																		
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Vo. Bo.		(Firma)		(Nombre)												
						Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría												

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CÓDIGO FO-AC-47	PROCESO Prácticas Integrales de Gestión	VERSIÓN 2	
PLACA TGL 341	MODELO 2011	MARCA VOLVO	
No. IDENTIFICA 16	CAPACIDAD 17000 KG	PERIODO EVALUADO 28/04/25 AL 30/04/25	
*LICENCIA DE TRANSITO 10011951194		TIPO DE VEHICULO VOLQUETA	
*LICENCIA DE CONDUCCION No. 19381452		VENCE 4/02/2026	
*MANEJO DEFENSIVO No.		VENCE	
*REVISION TECNICO-MECANICA No. 175086124		VENCE 9/08/2025	
*SOAT No. 3600026423		VENCE 6/06/2025	

FOTOGRAFÍAS



CONTRATO N° 1711 DE 2023

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		/		/		/		/							
	Indicador de temperatura		/		/		/		/							
	Indicador de aceite		/		/		/		/							
	Indicador de batería		/		/		/		/							
	Indicador de combustible		/		/		/		/							
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		/		/		/		/							
	*Indicador de presión de aire		/		/		/		/							
	Conexiones eléctricas		/		/		/		/							
LUCES / SEÑALES	Fusibles		/		/		/		/							
	* Exteriores (Altas y bajas)		/		/		/		/							
	Direccionales delanteras		/		/		/		/							
	Direccionales traseras		/		/		/		/							
	Traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/							
	De estacionamiento		/		/		/		/							
	De Stop y reversa		/		/		/		/							
	* Baliza		/		/		/		/							
HIDRAULICO	* Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/		/		/		/							
	* Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		/		/		/		/							
	* Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		/		/		/		/							
	* Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		/		/		/		/							
	* Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		/		/		/		/							
	* Mangueras, tubos, conexiones y racores		/		/		/		/							
GENERAL	Espejo central convexo		/		/		/		/							
	Espejos laterales		/		/		/		/							
	Alarma de retroceso		/		/		/		/							
	Pito		/		/		/		/							
	* Freno de servicio		/		/		/		/							
	* Freno de emergencia		/		/		/		/							
	Cinturones de seguridad		/		/		/		/							
	Vidrio frontal / Limpia brisas		/		/		/		/							
	* Kit de control de emergencias ambientales		/		/		/		/							
	Barra antivuelco		/		/		/		/							
	Asientos y tapicería		/		/		/		/							
	Sistema de carpado		/		/		/		/							
	Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/							
	Cadena del cardan		/		/		/		/							
	Ajustes y seguros de las puertas		/		/		/		/							
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin		/		/		/		/							
	Presión de aire de las llantas		/		/		/		/							
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		/		/		/		/							
MECANICO	* Caja de cambios/transmisión		/		/		/		/							
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		/		/		/		/							
	* Dirección		/		/		/		/							
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		/		/		/		/							
	Estado Radiador		/		/		/		/							
	Estado y tensión de las correas		/		/		/		/							
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		/		/		/		/							
	Estado de filtro de aire		/		/		/		/							
	Estado de filtro de combustible		/		/		/		/							
	Ruidos extraños en el motor		/		/		/		/							

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CODIGO
FO-AC-47

PROCESO
Prácticas Integrales de Gestión

VERSIÓN
2

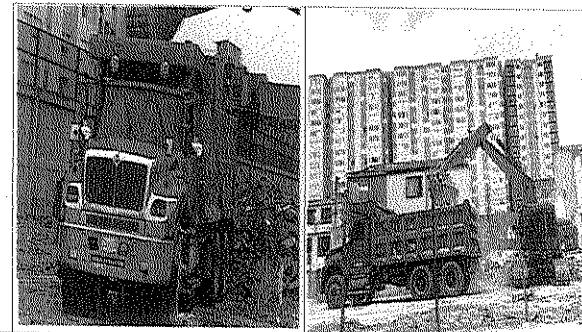


EQUIPO DE CARGA	*Motor sin grietas																
	Humo de escape																
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																
	*Botiquín																
	*cruceta																
	*Tacos para bloquear el vehículo																
	*Triángulos reflectivos-Conos																
	*Linterna																
	*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)																
	*Extintor de incendios capacidad: PQS																
	Operador	Nombre	DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		DAIRO HELI LOPEZ		
		Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
		Firma															
	SEGUIMIENTO DIARIO	KM- HOROMET RO INICIAL	238,177	KM- HOROMET RO FINAL	238,183	KM- HOROMETR O INICIAL	238,183	KM- HOROMET RO FINAL	238,195	KM- HOROMET RO INICIAL	238,191	KM- HOROMET RO FINAL	238,202	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL
	OBSERVACIONES																
	NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de los Vehículos.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación, Importación del Vehículo.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.</p> <p>N/A: No aplica.</p>															
		<p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita el vehículo para operar.</p> <p>Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mail), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p> <p>Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.</p>															
<p align="center">CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN</p> <p align="center">Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.</p>																	
<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) _____</p> <p>Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista</p>		<p>Vo. Bo. (Firma) </p> <p>(Nombre) _____</p> <p>Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría</p>															

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CÓDIGO FO-AC-47		PROCESO Prácticas Integrales de Gestión		VERSION 2	
PLACA	CQN 013	MODELO	1981	MARCA	FIAT
No. IDENTIFICA	17	CAPACIDAD	12000 KG	PERIODO EVALUADO	25.04/25 AL
*LICENCIA DE TRANSITO	10029344521	TIPO DE VEHICULO	VOLQUETA		
*LICENCIA DE CONDUCCION No.	1024462948	VENCE	25/11/2027		
*MANEJO DEFENSIVO No.		VENCE			
*REVISION TECNICO-MECANICA No.	174350785	VENCE	9/07/2025		
*SOAT No.	3600027558	VENCE	8/07/2025		

FOTOGRAFÍAS

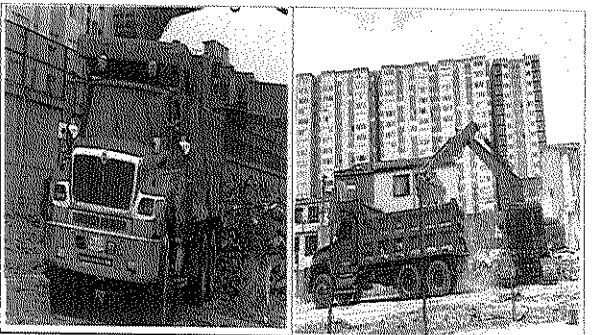


CONTRATO N° 1711 DE 2023

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de batería															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro															
	*Indicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
LUCES / SEÑALES	Fusibles															
	* Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	* Baliza															
HIDRAULICO	* Nivel de aceite del motor (verificar fugas)															
	* Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)															
	* Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)															
	* Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)															
	* Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)															
	* Mangueras, tubos, conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	* Freno de servicio															
	* Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal / Limpia brisas															
	* Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapicería															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															
	Cadena del cardan															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin															
	Presión de aire de las llantas															
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)															
MECANICO	* Caja de cambios / Transmisión															
	* Suspensión (muelles, amortiguadores)															
	* Dirección															
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)															
	Estado Radiador															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible															
	Ruidos extraños en el motor															

FORMATO																		
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																		
CODIGO		PROCESO												VERSION		idu		
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión												2				
EQUIPO DE CARRETERA	*Motor sin grietas																	
	*Humo de escape																	
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																	
	*Botiquín																	
	*cruceta																	
	*Tacos para bloquear el vehículo																	
	*Triángulos reflectivos-Conos																	
	*Linterna																	
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)																		
*Extintor de incendios capacidad: PQS																		
Operador		Nombre		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		
		Firma																
		Nombre																
		Firma																
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría		Nombre																
		Firma																
SEGUIMIENTO DIARIO				KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	KM-HOROMETRO INICIAL	KM-HOROMETRO FINAL	
				73,243 23,206														
OBSERVACIONES																		
NOTAS		TIPD: Conjunto de características (carrocería, chasis entre otras) que definen al Vehículo.																
		REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de los Vehículos.																
		No. IDENTIFICACIÓN IDU: Identificación exterior empleada por los vehículos, vinculados al Proyecto.																
		MODELO: Año de fabricación, Importación del Vehículo.																
		CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.																
		N/A: No aplica																
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN																		
Con el presente registro de ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.																		
(Firma)		(Firma)																
(Nombre)		(Nombre)																
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría																

FORMATO
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA

CODIGO FO-AC-47	PROCESO Prácticas Integrales de Gestión	VERSION 2	
PLACA CQN 013	MODELO 1981	MARCA FIAT	FOTOGRAFÍAS 
No. IDENTIFICA 17	CAPACIDAD 12000 KG	PERIODO EVALUADO 28-04-25 AL 30-04-25	
*LICENCIA DE TRANSITO 10029344521	TIPO DE VEHICULO VOLQUETA		
*LICENCIA DE CONDUCCION No. 1024462948	VENCE 25/11/2027		
*MANEJO DEFENSIVO No.	VENCE		
*REVISION TECNICO-MECANICA No. 174350785	VENCE 9/07/2025		
*SOAT No. 3600027558	VENCE 8/07/2025		

CONTRATO N° 1711 DE 2023

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		/		/		/									
	Indicador de temperatura		/		/		/									
	Indicador de aceite		/		/		/									
	Indicador de batería		/		/		/									
	Indicador de combustible		/		/		/									
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horometro		/		/		/									
	*Indicador de presión de aire		/		/		/									
	Conexiones eléctricas		/		/		/									
	Fusibles		/		/		/									
	* Exteriores (Altas y bajas)		/		/		/									
LUCES / SEÑALES	Direccionales delanteras		/		/		/									
	Direccionales traseras		/		/		/									
	Traseras de trabajo (reflector)		/		/		/									
	De estacionamiento		/		/		/									
	De Stop y reversa		/		/		/									
	*Baliza		/		/		/									
			/		/		/									
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/		/		/									
	*Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		/		/		/									
	*Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		/		/		/									
	*Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		/		/		/									
	*Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)		/		/		/									
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores		/		/		/									
			/		/		/									
GENERAL	Espejo central convexo		/		/		/									
	Espejos laterales		/		/		/									
	Alarma de retroceso		/		/		/									
	Pito		/		/		/									
	* Freno de servicio		/		/		/									
	* Freno de emergencia		/		/		/									
	Cinturones de seguridad		/		/		/									
	Vidrio frontal / Limpia brisas		/		/		/									
	* Kit de control de emergencias ambientales		/		/		/									
	Barra antivuelco		/		/		/									
	Asientos y tapicería		/		/		/									
	Sistema de carpado		/		/		/									
	Grapas y anclaje de chasis		/		/		/									
	Cadena del cardan		/		/		/									
	Ajustes y seguros de las puertas		/		/		/									
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin		/		/		/									
	Presión de aire de las llantas		/		/		/									
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		/		/		/									
	* Caja de cambios/Transmisión		/		/		/									
MECANICO	* Suspensión (muelles, amortiguadores)		/		/		/									
	* Dirección		/		/		/									
	* Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		/		/		/									
	Estado Radiador		/		/		/									
	Estado y tensión de las correas		/		/		/									
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		/		/		/									
	Estado de filtro de aire		/		/		/									
	Estado de filtro de combustible		/		/		/									
	Ruidos extraños en el motor		/		/		/									

FORMATO																	
PREOPERACIONALES VEHICULOS LIVIANOS CARGA																	
CÓDIGO		PROCESO														VERSIÓN	
FO-AC-47		Prácticas Integrales de Gestión														2	
EQUIPO DE CARRETERA	*Motor sin grietas																
	*Humo de escape																
	*Gato con capacidad de elevar el vehículo																
	*Botiquín																
	*Cruceta																
	*Tacos para bloquear el vehículo																
	*Triángulos reflectivos-Conos																
	*Linterna																
*Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.)																	
*Extintor de incendios capacidad: PQS																	
Operador	Nombre		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		PEDRO EDISSON CASALLAS		
	Firma																
	Nombre																
	Firma																
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría																
	Firma																
	SEGUIMIENTO DIARIO		KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	KM- HOROMET RO INICIAL	KM- HOROMET RO FINAL	
			23,305	23,307	23,307	23,312	23,312	23,318									
	OBSERVACIONES																
	NOTAS		El incumplimiento de cualquiera de los ítema (*) inhabilita el vehículo para operar. Para el resto de los ítema que se encuentren seleccionados en la opción (ma), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o Responsable de la maquinaria-equipos y/o vehículos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento. Este formato es aplicable a: Volquetas, camionetas, furgones, tractocamiones, camperos, automóviles.														
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN																	
Con el presente registro de Ingreso preoperacional de Vehículos, se da constancia que el vehículo es aceptado para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.																	
(Firma)																	
(Nombre)		Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista															
Vo. Bo.		(Firma)															
		(Nombre)															
		Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría															

CÓDIGO
FO-AC-45

FORMATO
PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS
PROCESO
Prácticas Integrales de Gestión

VERSIÓN
2

MARCA KOBELCO MODELO SK210LC AÑO 2007 REFERENCIA SK210 SERIAL YQ09-LG777

TIPO DE EQUIPO RETROEXCAVADORA *CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO VENCE

No. IDENTIFICACIÓN 2 CAPACIDAD 21700 KG MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN MC089831

*PRCE VENCE *CERTIFICADO OPERADOR 1,053,332,411 VENCE 18/09/2025

PERIODO EVALUADO 7/04/2025 AL 12/04/2025

CONTRATO N° IDU 1711 DE 2023

FOTOGRAFÍAS



SISTEMA DE LA MAQUINA		ITEM DE REVISION	NA	LUNES		MARTES		MIÉRC		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
ELECTRICO TABLERO DE CONTROL		Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI	BIEN	MAI
		Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X		X	
		Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X		X	
		Indicador de batería		X		X		X		X		X		X		X	
		Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X		X	
LUCE		Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X		X	
		Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X		X	
		Horómetro		X		X		X		X		X		X		X	
		Tráileres de trabajo (Rellector)		X		X		X		X		X		X		X	
		Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X		X	
HIDRÁULICO		Baluz		X		X		X		X		X		X		X	
		Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
		Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
		Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
		Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
GENERAL		Pasadores, Labos, Conexiones y Racores (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
		Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X		X	
		Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		X	
		Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X	
		PFO		X		X		X		X		X		X		X	
		Freno de servicio		X		X		X		X		X		X		X	
		Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X		X	
		Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X		X	
		Vidro (frotamiento)		X		X		X		X		X		X		X	
		M1 para derrames		X		X		X		X		X		X		X	
		Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X		X	
		Cabinas antiruido (R.O.P.S.)		X		X		X		X		X		X		X	
		Asiento		X		X		X		X		X		X		X	
		Escalera y acceso de escape		X		X		X		X		X		X		X	
		Llaves bien estado (sin soldaduras profundas y sin malfuncionamiento)		X		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO		Presión de aire de los neumáticos		X		X		X		X		X		X		X	
		Servotransmisión		X		X		X		X		X		X		X	
		Tracción		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado de los pedales		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado de motor		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado de Orugas (dentaduras)		X		X		X		X		X		X		X	
		Mecanismo de giro y estabilización (cuchillas)		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado de las placas de estabilización o Nivelación		X		X		X		X		X		X		X	
		Mecanismo de giro (primarios)		X		X		X		X		X		X		X	
		Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X		X	
		Correa de transmisión en buen estado		X		X		X		X		X		X		X	
		Mandos de avance		X		X		X		X		X		X		X	
		Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado general del operador (baldes)		X		X		X		X		X		X		X	
		Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado de tiro de aire		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado de tiro de combustible		X		X		X		X		X		X		X	
		Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X		X	
		Resguardos		X		X		X		X		X		X		X	
		Anchuras de contrapeso		X		X		X		X		X		X		X	
		Guardas		X		X		X		X		X		X		X	
		Estado del lavador		X		X		X		X		X		X		X	
		Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X		X	
	Motor sin ruidos		X		X		X		X		X		X		X		
	Estado (Humos de escape)		X		X		X		X		X		X		X		
SEGUIMIENTO DIARIO				HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO
OBSERVACIONES				7680	7683		7685		7688		7688		7688		7690		
OPERADOR			Nombre	EDMER AUGUSTO CARVAJAL		EDMER AUGUSTO CARVAJAL		EDMER AUGUSTO CARVAJAL		EDMER AUGUSTO CARVAJAL		EDMER AUGUSTO CARVAJAL		EDMER AUGUSTO CARVAJAL		EDMER AUGUSTO CARVAJAL	
			Firma	Augusto C.		Augusto C.		Augusto C.		Augusto C.		Augusto C.		Augusto C.		Augusto C.	
AUTORIZACIÓN PARA USO DE MÁQUINA POR ING. RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR INTERVENTORIA			Nombre														
			Firma														
NOTAS	TIPO: <u>Carta de características que define la función de la máquina.</u>	El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar. Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipo; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.															
	REFERENCIA: <u>Identificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca y Fabricante de la Maquinaria.</u>																
	No. IDENTIFICACIÓN: <u>Identificación asignada por los inspectores, una única por máquina.</u>																
	MODELO: <u>Identificación asignada al No. de máquina u/o carga a ser transportada.</u>																
	CAPACIDAD: <u>Verificar</u>																

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítems evaluados.

[Firma]

(Firma)
(Nombre)

Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo.
(Nombre)

Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor

ARCA _____ KOBELCO _____ MODELO _____ SK210LC _____ AÑO _____ 2007 _____ REFERENCIA _____ **SK 210** _____ SERIAL _____ YQ05-U3777 _____

PO DE EQUIPO _____ RETROEXCAVADORA _____ *CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO _____ VENCE _____

IDENTIFICACIÓN IDU _____ 2 _____ CAPACIDAD _____ 21700 KG _____ MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN _____ MC056931 _____

RCE _____ VENCE _____ *CERTIFICADO OPERADOR _____ 1.053,332.411 _____ VENCE _____ 18/09/2025 _____

PERIODO EVALUADO **27/04/2025** _____

INSTRUMENTO N° _____ IDU 1711 _____ DE _____ 2023 _____

FOTOGRAFÍAS



SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	NIA	LUNES	MARTES	MIÉRC.	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables								
	Indicador de temperatura								
	Indicador de aceite								
	Indicador de batería								
	Indicador de refrigerante								
LUCES	Indicador de combustible								
	Indicador de filtro de aire								
	Indicador de aceite								
	Indicador de temperatura								
	Indicador de combustible								
HIDRAULICO	Indicador de filtro de aire								
	Indicador de aceite								
	Indicador de temperatura								
	Indicador de combustible								
	Indicador de filtro de aire								
GENERAL	Indicador de aceite								
	Indicador de temperatura								
	Indicador de combustible								
	Indicador de filtro de aire								
	Indicador de aceite								
MECANICO	Indicador de temperatura								
	Indicador de combustible								
	Indicador de filtro de aire								
	Indicador de aceite								
	Indicador de temperatura								

SEGUIMIENTO DIARIO			HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO
OBSERVACIONES			7693	7698												
OPERADOR			EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL	EDIMER AUGUSTO CARVAJAL
AUTORIZACIÓN PARA USO DE MÁQUINA POR ING. RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR INTERVENTORA			Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

NOTAS

REFERENCIA: _____

IDENTIFICACIÓN: _____

MODELO: _____

CAPACIDAD: _____

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar. Para el resto de los ítems que se encuentran seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.



(Firma)

Vo. Bo.



FORMATO PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS									
PRÁCTICAS INTEGRADAS DE GESTIÓN									
VERSIÓN 2									
MARCA KOMATSU		MODELO PC210-10MO		AÑO 2021		REFERENCIA		SERIAL 600896	
TIPO DE EQUIPO RETROEXCAVADORA		CAPACIDAD 20600 KG		*CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO		VENCE		FOTOGRAFÍAS	
No. IDENTIFICACIÓN IDU 6		VENCE		MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 482021000446639		VENCE		2025-12-04	
*PRICE 14-02-25		VENCE 20-4-25		*CERTIFICADO OPERADOR 804A232		VENCE		2025-12-04	
PERIODO EVALUADO		CONTRATO N° IDU 1711 DE 2823							
SISTEMA DE LA MAQUINA									
ITEM DE REVISION									
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL									
LUCES									
HIDRAULICO									
GENERAL									
MECANICO									
SEGUIMIENTO DIARIO									
OBSERVACIONES									
OPERADOR									
AUTORIZACION PARA USO DE MAQUINA POR ING. RESIDENTE TECNICOINSPECTOR INTERVENTORIA									
NOTAS									
CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION									

FORMATO		PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS		PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN		VERSIÓN			
FO-AC-45		2							
MARCA	LINK BELT	MODELO	210X2	AÑO	2013	REFERENCIA	4HK1-495165		
TIPO DE EQUIPO	EXCAVADORA	SERIAL	L8X210Q5NCHEX1968						
No. IDENTIFICACIÓN	B	CAPACIDAD	21500 KG	*CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO					
*PRCE	VENCE	*CERTIFICADO OPERADOR		VENCE					
PERIODO EVALUADO	20/04/25 AL 26/04/25								
CONTRATO N°	IDU 1711	DE	2023						
FOTOGRAFÍAS									
 									
SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES	MARTES	MIÉRC	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables Indicador de temperatura Indicador de aceite Indicador de batería Indicador de refrigerante Indicador de combustible Indicador de filtro de aire *Horómetro *Fonógrafos de trabajo *Fusibles de trabajo (Relíndor) Señales de giro (derecha, izquierda) *Baliza								
LUCES	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas) *Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas) *Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas) *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas) *Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas) *Espejo central convexo *Espejos laterales *Alarma de retroceso								
MECANICO	*Freno de servicio *Freno de estacionamiento *Cinturones de seguridad *Vidrio Panorámico *Kit para Derrames *Extintor de incendios Capacidad: POS *Cablea antivuelco (R.O.P.S) *Acertido Escaleras y apoyos de acceso Llaves buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) Presión de aire de las llantas Servomotorización *Dirección Estado de pasadores Estado y tensión de las correas Estado de pedales Estado de Orugas (tensionadas) Mecanismo de giro y actualización cuchillas Estado de las Hojas de empuje o Nivelación Mecanismo de giro (hidráulica) *Bomba Hidráulica Corona de tornamaza en buen estado *Mandos de avance *Mando de estacionamiento Estado general desgarrador (balde) *Mandos de levantar el brazo Estado de filtro de aire Estado de filtro de combustible Pasadores y tornillos en buen estado *Estado de cilindro (amortiguadores) *Resguardos Anchales de contrapeso Guardas Estado del traidor Ruidos extraños en el motor *Motor sin grietas Exhausto (Humo de escape)								
SEGUIMIENTO DIARIO		HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO	HOROME TRO
OBSERVACIONES		12953	12961	12961	12962	12962	12969	12976	12976
OPERADOR		DANIEL MAURICIO MARTINEZ	DANIEL MAURICIO MARTINEZ	DANIEL MAURICIO MARTINEZ	DANIEL MAURICIO MARTINEZ	DANIEL MAURICIO MARTINEZ	DANIEL MAURICIO MARTINEZ	DANIEL MAURICIO MARTINEZ	DANIEL MAURICIO MARTINEZ
AUTORIZACIÓN PARA USO DE MÁQUINA POR ING. RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR INTERVENTORIA		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
NOTAS		<p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación de la Máquina.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de toneladas a cargar a ser transportada.</p> <p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar. Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p>							
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN		<p>Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítems evaluados.</p>							
<p>(Firma)</p> <p>(Nombre)</p> <p>Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista</p>		<p>(Firma)</p> <p>(Nombre)</p> <p>Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría</p>							

[illegible]

FORMATO										PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS									
PROCESO										PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN									
CÓDIGO										VERSIÓN									
FO-AC-45										2									
MARCA		KOBELCO		MODELO		SK210LC-10		AÑO		2018		REFERENCIA		MC082886		SERIAL		YQ1520858	
TIPO DE EQUIPO		EXCAVADORA		*CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO				VENCE											
No. IDENTIFICACIÓN IDU		11		CAPACIDAD		21980 KG		MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN		352018000301586									
*PRCE		VENCE		*CERTIFICADO OPERADOR				VENCE											
PERIODO EVALUADO		31.03.25		AL		05.04.25													
CONTRATO N°		IDU 1711		DE		2023													

FOTOGRAFÍAS

REGISTRO DE INSPECCIÓN

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de temperatura		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de aceite		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de batería		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de refrigerante		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LUCES	Indicador de combustible		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Indicador de filtro de aire		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HIDRAULICO	*Horómetro		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Frontales de trabajo		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Traseros de trabajo (Reflector)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Senales de giro (derecha, izquierda)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Brazo		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
GENERAL	*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Espejo central convexo		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Espejos laterales		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Alarma de retroceso		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Piso		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Freno de servicio		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Freno de estacionamiento		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Cinturones de seguridad		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Vista Panorámica		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		/	/	/	/										

FORMATO		
PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-AC-45	Prácticas Integrales de Gestión	2
NOTAS	REFERENCIA: Conjunto de características que definen la función de la Máquina. IDENTIFICACIÓN: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria. MODELO: Identificación anterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto. CAPAIDAD: Año de fabricación de la Máquina. CAPAIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada. NA: No aplica.	El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar. Para el resto de los ítems que se encuentran seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN		
Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.		
		
(Firma)	(Firma)	
(Nombre)	(Nombre)	
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista	Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría	
Original: Dependencia responsable del control		
1era copia : interventor		

FORMATO																					
PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS																					
PROCESO																					
Prácticas Integrales de Gestión																					
VERSION 2																					
CÓDIGO		FO-AC-45																			
MARCA		KOBELCO		MODELO		SK210LC-10		AÑO		2018		REFERENCIA		MC082886		SERIAL		YQ1520858			
TIPO DE EQUIPO		EXCAVADORA		*CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO														VENCE			
No. IDENTIFICACIÓN IDU		11		CAPACIDAD		21980 KG		MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN		352018000301586											
*PRCE		VENCE		*CERTIFICADO OPERADOR														VENCE			
PERIODO EVALUADO		07.04.25		AL		12.04.25															
CONTRATO N°		IDU 1711		DE		2023															
FOTOGRAFIAS																					
SISTEMA DE LA MAQUINA		ITEM DE REVISION																			
ELECTRICO		Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables																			
LUCE		Indicador de temperatura																			
HIDRAULICO		Indicador de aceite																			
GENERAL		Indicador de batería																			
MECANICO		Indicador de refrigerante																			
		Indicador de combustible																			
		Indicador de filtro de aire																			
		Horometro																			
		Frontales de trabajo																			
		Traseros de trabajo (Reflector)																			
		Señales de giro (derecha, izquierda)																			
		Baliza																			
		Nivel de aceite del motor (verificar fugas)																			
		Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)																			
		Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)																			
		Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)																			
		Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)																			
		Espejo central convexo																			
		Espejos laterales																			
		Alarma de retroceso																			
		Pito																			
		Freno de servicio																			
		Freno de estacionamiento																			
		Cinturones de seguridad																			
		Vidrio Panorámico																			
		Kit para Derriames																			
		Extintor de incendios Capacidad POS																			
		Cabinas antielectro (R.O.P.S)																			
		Asiento																			
		Escaleras y apoyos de acceso																			
		Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y en abultamientos)																			
		Presión de aire de las llantas																			
		Servotransmisión																			
		Dirección																			
		Estado de pasadores																			
		Estado y tensión de las correas																			
		Estado de pedales																			
		Estado de Cruces (tensionados)																			
		Mecanismo de giro y escualización cuchillos																			
		Estado de las Hojas de empuje o Nivelación																			
		Mecanismo de giro (Tornamaza)																			
		Bombas Hidráulicas																			
		Corona de tornamaza en buen estado																			
		Mandos de avance																			
		Mando de estacionamiento																			
		Estado general desgarrador (balde)																			
		Mandos de levante del brazo																			
		Estado de filtro de aire																			
		Estado de filtro de combustible																			
		Pasadores y tornillos en buen estado																			
		Estado de cilindro (amortiguadores)																			
		Resguardos																			
		Anclajes de contrapeso																			
		Guardas																			
		Estado del basidor																			
		Ruidos excesivos en el motor																			
		Motor sin grietas																			
		Exhausto (Humo de escape)																			
SEGUIMIENTO DIARIO		HIDROMETRO INICIAL HIDROMETRO FINAL																			
OBSERVACIONES		HIDROMETRO INICIAL HIDROMETRO FINAL																			
OPERADOR		HIDROMETRO INICIAL HIDROMETRO FINAL																			
AUTORIZACIÓN PARA USO DE MAQUINA POR ING. RESIDENTE TECNICO/INSPECTOR INTERVENTORIA		HIDROMETRO INICIAL HIDROMETRO FINAL																			

FORMATO		PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS	
CODIGO		PROCESO	
FO-AC-45		Prácticas Integrales de Gestión	
VERSION		2	
NOTAS	TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina. REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria. No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto. MODELO: Año de fabricación de la Máquina. CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada. N/A: No aplica.	El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar. Para el resto de los ítems que se encuentran seleccionados en la opción (ma), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.	
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN			
Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.			
			
(Firma)		(Firma)	
(Nombre)		(Nombre)	
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría	
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor			


FORMATO										PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS		PROCESO		Prácticas Integrales de Gestión		VERSIÓN	
CODIGO		FO-AC-45										2					
MARCA	KOBELCO	MODELO	SK210LC-10	AÑO	2018	REFERENCIA	MC082886	SERIAL	YQ1520858								
TIPO DE EQUIPO	EXCAVADORA		*CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO		VENCE												
No. IDENTIFICACIÓN IDU	11	CAPACIDAD	21980 KG	MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN		352018000301586											
*PRCE	VENCE		*CERTIFICADO OPERADOR		VENCE												
PERIODO EVALUADO	21.04.25		AL		25.04.25												
CONTRATO N°	IDU 1711	DE	2023														

SISTEMA DE LA MAQUINA		ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
				BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL		Funcionamiento y estado de la batería, bornes y cables		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Indicador de temperatura		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Indicador de aceite		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Indicador de batería		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Indicador de refrigerante		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LUCES		Indicador de combustible		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Indicador de filtro de aire		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Horometro		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Frenos de trabajo (Reflector)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Señales de giro (derecha, izquierda)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HIDRAULICO		*Baliza		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
GENERAL		*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Espejo central convexo		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Espejos laterales		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Alarmas de retroceso		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Freno de servicio		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Freno de estacionamiento		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Conectores de seguridad		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Vidrio Panorámico		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Kit para Derrames		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Extintor de incendios Capacidad: POS		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Cabinas antivuelco (R.O.P.S)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Asiento		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Escaleras y apoyos de acceso		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Llantas buen estado (sin cordaduras profundas y sin abultamientos)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	MECANICO		Presión de aire de las llantas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Servotransmisión		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Dirección		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Estado de pasadores		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Estado y tensión de las correas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Estado de podales		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Estado de Orugas (falconadas)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Mecanismo de giro y escualización cuchillas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Mecanismo de giro (Tornanteza)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Bomba Hidráulica		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Corona de tornanteza en buen estado		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Mandos de avance		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		*Mando de estacionamiento		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Estado general desgarrador (balde)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	*Mandos de levante del brazo		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado de filtro de combustible		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pasadores y tornillos en buen estado		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	*Estado de cilindro (amortiguadores)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	*Resguardos		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Anclajes de contrapeso		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Guardas		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado del bastidor		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ruidos extraños en el motor		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	*Motor sin golpes		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Exosto (Humo de escape)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
SEGUIMIENTO DIARIO				96227	96235	96235	96239	96245	96247	96247	96249	96252	96256				
OBSERVACIONES																	
OPERADOR																	
AUTORIZACION PARA USO DE MAQUINA POR ING. RESIDENTE TECNICO/INSPECTOR INTERVENTORIA																	

FOTOGRAFÍAS



		FORMATO		
		PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS		
CODIGO	PROCESO			VERSION
FO-AC-45	Prácticas Integrales de Gestión			2
NOTAS	TIPO:	Conjunto de características que definen la función de la Máquina		
	REFERENCIA:	Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria		
	No. IDENTIFICACION:	Identificación exterior impresa por las Máquinas, vinculadas al Proyecto		
	MODELO:	Año de fabricación de la Máquina		
	CAPACIDAD:	Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada		
	REA:	No aplica		
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN				
Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.				
				
(Firma) (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Vo. Bo. (Nombre) Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría		
Original: Dependencia responsable del contrato 1era copia : interventor				

FORMATO																						
PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS																						
PROCESO																						
Prácticas Integrales de Gestión																						
VERSIÓN																						
2																						
CÓDIGO		FO-AC-45																				
MARCA		KOBELCO		MODELO		SK210LC-10		AÑO		2018		REFERENCIA		MC082886		SERIAL		YQ1520858				
TIPO DE EQUIPO		EXCAVADORA		*CERTIFICADO INSPECCION DEL EQUIPO													VENCE					
No. IDENTIFICACION IDU		11		CAPACIDAD		21980 KG		MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN		352018000301586												
*PRCE		VENCE		*CERTIFICADO OPERADOR													VENCE					
PERIODO EVALUADO		14.04.25		AL		16.04.25																
CONTRATO N°		IDU 1711		DE		2023																
FOTOGRAFÍAS																						
SISTEMA DE LA MAQUINA		ITEM DE REVISION																				
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL		Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables Indicador de temperatura Indicador de aceite Indicador de batería Indicador de refrigerante Indicador de combustible Indicador de filtro de aire *Barómetro																				
LUCES		*Frontales de trabajo *Traseras de trabajo (Reflector) Señales de giro (derecha, izquierda) Baliza																				
HIDRAULICO		*Nivel de aceite del motor (verificar fugas) *Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas) *Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas) *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas) Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas) *Espejo central convexo *Espejos laterales *Alarma de retroceso																				
GENERAL		Pito *Plano de servicio *Freno de estacionamiento *Cinturones de seguridad Vidrio Panorámico *Kit para Derrames *Extintor de incendios Capacidad: POS *Cabinas antirruído (R.O.P.S) Asiento Escaleras y apoyos de acceso Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) Presión de aire de las llantas *Servotransmisión *Dirección Estado de pasadores Estado y tensión de las correas Estado de pedales Estado de Drugas (tensionadas) Mecanismo de giro y escualización cuchillas Estado de las Hojas de empuje o Nivelación Mecanismo de giro (Tornavieja) *Bomba Hidráulica Corona de tornavieja en buen estado *Mandos de avance *Mando de estacionamiento *Estado general de guardador (óxido) *Mandos de levante del brazo Estado de filtro de aire Estado de filtro de combustible Pasadores y tornillos en buen estado *Estado de cilindro (amortiguadores) *Resguardos Anclajes de contrapeso Guardias Estado del bastidor Ruidos extraños en el motor *Motor sin gomas Exhausto (Humo de escape)																				
MECANICO																						
SEGUIMIENTO DIARIO		HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL HORA METRO INICIAL HORA METRO FINAL																				
OBSERVACIONES		06/05/24 06/06/24 06/07/24 06/08/24 06/09/24 06/10/24																				
OPERADOR		Nombre MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA Firma [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] Nombre MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA MAURICIO MONTOYA Firma [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]																				
AUTORIZACIÓN PARA USO DE MÁQUINA POR ING. RESIDENTE TÉCNICO/INSPECTOR INTERVENTORIA																						

FORMATO		PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS	
CÓDIGO		PROCESO	
FO-AC-45		Prácticas Integrales de Gestión	
VERSIÓN		2	
NOTAS	<p>TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina.</p> <p>REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria.</p> <p>No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto.</p> <p>MODELO: Año de fabricación de la Máquina.</p> <p>CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de piezas o a cargo a ser transportada.</p> <p>NA: No aplica.</p>	<p>El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.</p> <p>Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (na), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.</p>	
CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN			
Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.			
			
(Firma)		(Firma)	
(Nombre)		(Nombre)	
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista		Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría	
Original: Dependencia responsable del contrato			
1era copia: interventor			

[illegible]

FORMATO
PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

PROCESO
Prácticas Integrales de Gestión

VERSIÓN
2

CODIGO
FO-AC-45

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria
No. IDENTIFICACIÓN: Identificación exterior empleada por las Máquinas, vinculadas al Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada
N/A: No aplica

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (na), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y esto determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma)
(Nombre)

Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor

Vo. Bo.
(Nombre)

Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

	<p>CTO IDU 1711 DE 2023</p> <p>DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.”.</p>				
INFORME AMBIENTAL MENSUAL No. 13					
PERIODO MENSUAL No.	13	DEL	01/04/2025	AL	30/04/2025
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
 		 			
Foto 1. LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS #1		Foto 2. LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS #2			
					
Foto 3. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES # 1		Foto 4. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES # 2			
					
Foto 5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES # 3		Foto 6. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES # 4			



Foto 7. RECOLECCION DE RCD # 1



Foto 8. RECOLECCIÓN DE RCD # 2



Foto 9. PROCESO DE HUMECTACIÓN #5



Foto 10. PROCESO DE HUMECTACIÓN #6

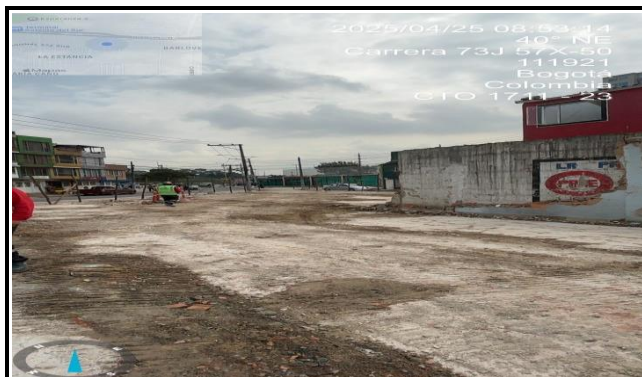


Foto 11. ORDEN ASEO Y LIMPIEZA DEL FRENTE DE OBRA



Foto 12. MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS # 1



Foto 13. MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS # 2

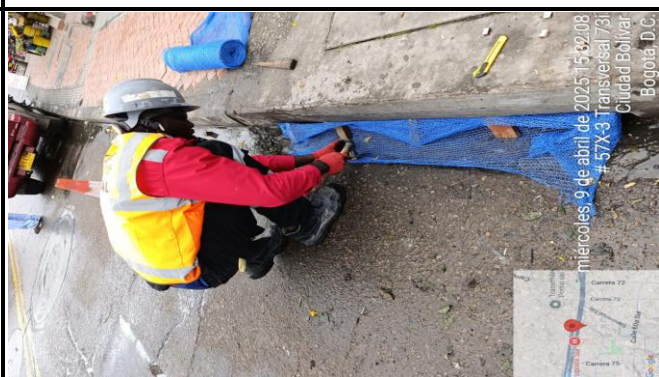


Foto 14. MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS #3



Foto 15. MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS # 4



Foto 16. MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS # 5



Foto 17. LIMPIEZA DE NEUMATICOS

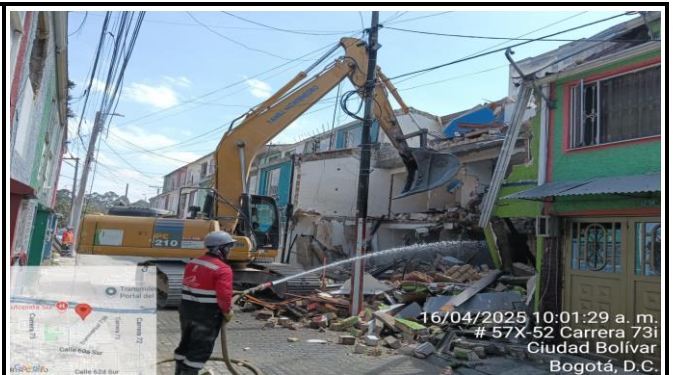


Foto 18. CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO # 1

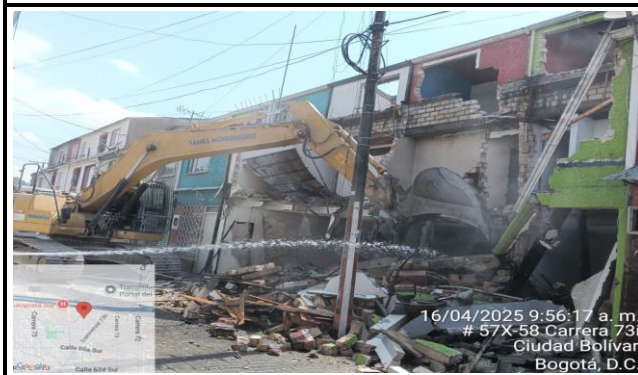


Foto 19. CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO # 2



Foto 20. CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO # 3



Foto 21. CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO # 4



Foto 22. CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO # 5



Foto 23. CAPACITACION AMBIENTAL # 1



Foto 24. CAPACITACION AMBIENTAL # 2



<p>Foto 25. INSTALACION DE CAMPAMENTOS</p>  <p>25/04/2025 9:08:56 a. m. 4.752886666666667N 74.05384166666666W Altitud: 2568.0m Velocidad: 0.0km/h Número de fotos: 12</p>	<p>Foto 26. ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO</p>  <p>25/04/2025 9:08:56 a. m. 4.752886666666667N 74.05384166666666W Altitud: 2568.0m Velocidad: 0.0km/h Número de fotos: 12</p>
<p>Foto 27. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PREDIOS # 1</p>  <p>28 abr 2025 9:06:26 a. m. 4.752886666666667N 74.05384166666666W 82° E # 54A-57 Calle 170 Suba Bogotá, D.C. Altitud: 2584.0m Velocidad: 0.0km/h</p>	<p>Foto 28. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PREDIOS # 2</p>  <p>25/04/2025 2:23:35 p. m. 4°41'56,388" N 74°6'53,286" W ±3,30m 284° W Altitud: 2571.8m Velocidad: 0.4km/h</p>
<p>Foto 29. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PREDIOS # 3</p>  <p></p>	<p>Foto 30. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PREDIOS # 4</p>  <p></p>

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																		
CÓDIGO	PROCESO				VERSION																													
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST				4,0																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th style="width:33%;">DÍA</th> <th style="width:33%;">MES</th> <th style="width:33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	1	MAYO	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023 </div> <div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width:16%;">DÍA</th> <th style="width:16%;">MES</th> <th style="width:16%;">AÑO</th> <th style="width:16%;">DÍA</th> <th style="width:16%;">MES</th> <th style="width:16%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table> </div> </div>				PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA </div> <div> INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS </div> </div>	
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																		
DÍA	MES	AÑO																																
1	MAYO	2025																																
PERIODO ENTRE HASTA																																		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																													
1	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025																													
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																																		
Porcentaje Total Componentes 100% CALIFICACION MENSUAL																																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																							
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											13,00%																							
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		12,89%																							
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																									
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																									
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%	3%																									
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4%	3%	4%	4%	4%	4%																									
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											35,00%																							
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		35,00%																							
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%	6%																									
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%																									
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%	4%																									
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%	3%																									
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%	6%																									
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%	6%																									

FORMATO																																																																																																																																																																
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4,0																																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>1</td><td>MAYO</td><td>2025</td></tr></table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	1	MAYO	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO						SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS																																																																																																																																													
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																																																																																																																																																
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																														
1	MAYO	2025																																																																																																																																																														
		CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																																																																																																																																																														
		CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023																																																																																																																																																														
		CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023																																																																																																																																																														
		<table><tr><td colspan="3">PERIODO ENTRE HASTA</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>1</td><td>ABRIL</td><td>2025</td><td>30</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>						PERIODO ENTRE HASTA			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025																																																																																																																																										
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																																																																																
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																											
1	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025																																																																																																																																																											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">Porcentaje Total Componentes</td><td>100%</td><td colspan="9">CALIFICACION MENSUAL</td></tr><tr><td>ÍTEM</td><td>COMPONENTE AMBIENTAL</td><td>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</td><td>APLICABILIDAD</td><td>SEMANA 1</td><td>SEMANA 2</td><td>SEMANA 3</td><td>SEMANA 4</td><td>SEMANA 5</td><td>PROMEDIO COMPONENTE</td><td>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</td><td>COMPONENTE</td></tr><tr><td colspan="11">COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO</td><td>8,00%</td></tr><tr><td>13</td><td>Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.</td><td>2,0%</td><td>Aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td><td rowspan="4">8,00%</td></tr><tr><td>14</td><td>Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.</td><td>2,0%</td><td>No aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC</td><td>2,0%</td><td>No aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.</td><td>2,0%</td><td>No aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td colspan="11">COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td><td>39,00%</td></tr><tr><td>17</td><td>Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente</td><td>2,0%</td><td>Aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>18</td><td>Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.</td><td>2,0%</td><td>No aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</td><td>5,0%</td><td>Aplica</td><td>5%</td><td>5%</td><td>5%</td><td>5%</td><td>5%</td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.</td><td>2,0%</td><td>Aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.</td><td>2,0%</td><td>Aplica</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td></td></tr></table>												Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL									ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8,00%	13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		8,00%	14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39,00%	17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%			18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL																																																																																																																																																													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																					
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8,00%																																																																																																																																																					
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		8,00%																																																																																																																																																					
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																																																																																																																																																							
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																																																																																																																																																							
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																																																																																																																																																							
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39,00%																																																																																																																																																					
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																																																																																																																																																							
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																																																																																																																																																							
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%																																																																																																																																																							
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																																																																																																																																																							
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																																																																																																																																																							

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES											
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0			

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MAYO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFRAESTRUCTURA
DE PREDIOS

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025



OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		39,00%
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%	4%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmado por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%	3%		

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

24

Vo.Bo:

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES						ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST				VERSIÓN 4,0																			
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO				SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
DÍA	MES	AÑO					INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS																		
1	MAYO	2025																							
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																						
CONTRATO DE OBRA N°			1711-2023																						
CONTRATO INTERVENTORIA N°			1757-2023																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </tbody> </table>								PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																									
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																				
1	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025																				
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																									
Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL																						
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE														
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%	2%																
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5,00%														
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%	5%		5,00%														
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO									99,89%													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>(FIRMA) </p> <p>ING. LILY VANEGAS BARRERA</p> <p>PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</p> <p>(FIRMA) </p> <p>WILMER BACCA GUTIERREZ</p> <p>PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</p> <p>(FIRMA) </p> <p>ING. JAIRO GEOVANNI ORTIZ</p> <p style="text-align: right;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <p>Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(FIRMA) </p> <p>ING. BRAYAN ARAÑO CRUZ</p> <p>PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</p> <p>(FIRMA) </p> <p>DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ</p> <p>PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</p> <p>(FIRMA) </p> <p>ING. MONICA JIMENA GUERRA V.</p> <p style="text-align: right;">DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA</p> </div> </div>																									

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																																																																																																																																																																																																																									
CÓDIGO	PROCESO							VERSIÓN																																																																																																																																																																																																																											
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							4,0																																																																																																																																																																																																																											
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">DÍA</th> <th style="width:33%;">MES</th> <th style="width:33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	7	ABRIL	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS							SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DIRECCIÓN TÉCNICA _____ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____		INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS																																																																																																																																																																																																																		
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																	
7	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																																																																	
CONTRATO DE OBRA N° _____		1711-2023							<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width:16.6%;">DÍA</th> <th style="width:16.6%;">MES</th> <th style="width:16.6%;">AÑO</th> <th style="width:16.6%;">DÍA</th> <th style="width:16.6%;">MES</th> <th style="width:16.6%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025	CONTRATO INTERVENTORÍA N° _____		1757-2023																																																																																																																																																																																																				
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																																																																																																																																																			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																														
1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																																																														
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Porcentaje Total Componentes</th> <th colspan="11" style="text-align: center;">Calificación semanal</th> </tr> <tr> <th style="width:5%;">ÍTEM</th> <th style="width:25%;">COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th style="width:5%;">ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th style="width:5%;">APLICABILIDAD</th> <th style="width:5%;">1-abr</th> <th style="width:5%;">2-abr</th> <th style="width:5%;">3-abr</th> <th style="width:5%;">4-abr</th> <th style="width:5%;">5-abr</th> <th style="width:5%;">6-abr</th> <th style="width:5%;">TOTAL SEMANA</th> <th style="width:5%;">TOTAL INDICE</th> <th style="width:15%;">OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th style="width:10%;">COMPONENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center;">COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES</td> <td style="text-align: center;">13%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 1.5em;">13,0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.</td> <td style="text-align: center;">3,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado</td> <td style="text-align: center;">4,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center;">COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 1.5em;">35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.</td> <td style="text-align: center;">6,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">6,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.</td> <td style="text-align: center;">4,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.</td> <td style="text-align: center;">3,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.</td> <td style="text-align: center;">6,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">6,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.</td> <td style="text-align: center;">6,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">6,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Porcentaje Total Componentes			Calificación semanal											ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%	1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%	2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica							0%	2,00%		3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%	6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		35%	7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%	
Porcentaje Total Componentes			Calificación semanal																																																																																																																																																																																																																																
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																																																																																						
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													13%																																																																																																																																																																																																																						
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%																																																																																																																																																																																																																						
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica							0%	2,00%																																																																																																																																																																																																																								
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																																																																								
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%																																																																																																																																																																																																																								
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%																																																																																																																																																																																																																								
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													35%																																																																																																																																																																																																																						
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		35%																																																																																																																																																																																																																						
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%																																																																																																																																																																																																																								
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																																																																																																																																																																																																																								
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%																																																																																																																																																																																																																								
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%																																																																																																																																																																																																																								
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%																																																																																																																																																																																																																								
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%																																																																																																																																																																																																																								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																								
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																								
CÓDIGO	PROCESO								VERSIÓN																																																																																																																																																																																																															
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								4,0																																																																																																																																																																																																															
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO						SUBDIRECCIÓN GENERAL				INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																																																																												
DÍA	MES	AÑO							DIRECCIÓN TÉCNICA				DE PREDIOS																																																																																																																																																																																																											
7	ABRIL	2025							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																																																																																																																															
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																																																																																																																																																																																																																					
			CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023																																																																																																																																																																																																																					
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </tbody> </table>														PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																									
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																																																																																																																																								
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																			
1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																																																			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Porcentaje Total Componentes</th> <th colspan="11">Calificación semanal</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th>1-abr</th> <th>2-abr</th> <th>3-abr</th> <th>4-abr</th> <th>5-abr</th> <th>6-abr</th> <th>TOTAL SEMANA</th> <th>TOTAL INDICE</th> <th>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: right; background-color: #0070c0; color: white;">8%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td>Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">8%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td>Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td>Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td>Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: right; background-color: #0070c0; color: white;">39%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td>Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td>Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td>Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td>Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Porcentaje Total Componentes			Calificación semanal											ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%														13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		8%	14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica							0%	2,00%		15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica							0%	2,00%		16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica							0%	2,00%		COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%														17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%			18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%						0%	2,00%		19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%	
Porcentaje Total Componentes			Calificación semanal																																																																																																																																																																																																																					
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																																																																											
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																																																																																																																																																																																																																								
8%																																																																																																																																																																																																																								
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		8%																																																																																																																																																																																																											
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica							0%	2,00%																																																																																																																																																																																																													
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica							0%	2,00%																																																																																																																																																																																																													
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica							0%	2,00%																																																																																																																																																																																																													
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																																																																																																																																																																								
39%																																																																																																																																																																																																																								
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																																																													
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%						0%	2,00%																																																																																																																																																																																																													
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																																																																																																																																																																																																													
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																																																													
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																																																													

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																																																																																																																																																																											
CÓDIGO	PROCESO							VERSION																																																																																																																																																																													
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							4,0																																																																																																																																																																													
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">DÍA</th> <th style="width:33%;">MES</th> <th style="width:33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	7	ABRIL	2025	INTERVENITORIA: CONSORCIO METRO CINCO CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS					SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DIRECCIÓN TÉCNICA _____ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____																																																																																																																																																																								
DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																			
7	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA N° _____ 1711-2023 CONTRATO INTERVENITORIA N° _____ 1757-2023		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width:16%;">DÍA</th> <th style="width:16%;">MES</th> <th style="width:16%;">AÑO</th> <th style="width:16%;">DÍA</th> <th style="width:16%;">MES</th> <th style="width:16%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>						PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025																																																																																																																																																												
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																																																																																																					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																
1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:25%;">Porcentaje Total Componentes</th> <th style="width:5%;">100%</th> <th colspan="10" style="text-align: center;">Calificación semanal</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th>1-abr</th> <th>2-abr</th> <th>3-abr</th> <th>4-abr</th> <th>5-abr</th> <th>6-abr</th> <th>TOTAL SEMANA</th> <th>TOTAL INDICE</th> <th>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td>Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td>No aplica</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em; font-weight: bold;">39%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td>El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagraciones</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td>Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.</td> <td style="text-align: center;">4,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">4,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td>Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td>Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.</td> <td style="text-align: center;">1,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td>Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.</td> <td style="text-align: center;">1,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td>Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td>Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.</td> <td style="text-align: center;">1,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td>Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.</td> <td style="text-align: center;">1,0%</td> <td>No aplica</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td>Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.</td> <td style="text-align: center;">3,0%</td> <td>Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td></td> </tr> </table>												Porcentaje Total Componentes	100%	Calificación semanal										ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	0%						0%	2,00%		39%	23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%						0%	1,00%		32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%	
Porcentaje Total Componentes	100%	Calificación semanal																																																																																																																																																																																			
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																																								
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	0%						0%	2,00%		39%																																																																																																																																																																								
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																										
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%																																																																																																																																																																										
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																																																																																																																																																																										
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																																																																																																																																																																										
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																																																																																																																																																																										
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																										
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																																																																																																																																																																										
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																										
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%						0%	1,00%																																																																																																																																																																										
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%																																																																																																																																																																										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.S. Desarrollo Urbano																																																																																				
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0																																																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO</p> <p>CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</p> <p>CONTRATO DE OBRA N° _____</p> <p>CONTRATO INTERVENTORÍA N° _____</p> </div> </div>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	7	ABRIL	2025	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>SUBDIRECCIÓN GENERAL _____</p> <p>DIRECCIÓN TÉCNICA _____</p> <p>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>INFRAESTRUCTURA _____</p> <p>DE PREDIOS _____</p> </div> </div>																																																																													
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																																																																								
DÍA	MES	AÑO																																																																																						
7	ABRIL	2025																																																																																						
<p>CONTRATO DE OBRA N° _____ 1711-2023</p> <p>CONTRATO INTERVENTORÍA N° _____ 1757-2023</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>				PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025																																																																	
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																								
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																			
1	ABRIL	2025	6	ABRIL	2025																																																																																			
<p>OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."</p>																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Porcentaje Total Componentes</th> <th style="background-color: #008080; color: white;">100%</th> <th colspan="10">Calificación semanal</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th>1-abr</th> <th>2-abr</th> <th>3-abr</th> <th>4-abr</th> <th>5-abr</th> <th>6-abr</th> <th>TOTAL SEMANA</th> <th>TOTAL ÍNDICE</th> <th>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">33</td> <td>Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD</td> <td style="background-color: #008080; color: white; text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34</td> <td>Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="background-color: #008080; color: white; text-align: center;">100%</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">TOTAL EVALUADO</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal										ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL ÍNDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%			COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD													5%	34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%	TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																																																																																					
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr	6-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL ÍNDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																											
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																													
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD													5%																																																																											
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%																																																																											
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%																																																																											
<p></p> <p>_____ ING. LILY VANEGAS BARRERA</p> <p>PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)</p>			<p></p> <p>_____ ING. BRAYAN ARANGO CRUZ</p> <p>PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</p>																																																																																					
<p></p> <p>_____ WILMER BACCA GUTIERREZ</p> <p>PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)</p>			<p></p> <p>_____ DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ</p> <p>PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</p>																																																																																					
<p></p> <p>_____ ING. JAIRO GEOVENNI ORTIZ</p> <p style="text-align: right;">DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>			<p></p> <p>_____ ING. MONICA JIMENA GUERRA V.</p> <p style="text-align: right;">DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA</p>																																																																																					
<p>Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU</p>																																																																																								

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES												 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>											
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST									VERSION 4.0													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th></tr> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th><th style="width: 33%;">MES</th><th style="width: 33%;">AÑO</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO</p> <hr/> <p>CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</p> <hr/> <p>CONTRATO DE OBRA N° <u>1711-2023</u></p> <p>CONTRATO INTERVENTORÍA N° <u>1757-2023</u></p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>SUBDIRECCIÓN GENERAL _____</p> <p>DIRECCIÓN TÉCNICA _____</p> <p>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____</p> </div> <div style="width: 40%;"> <p>INFRAESTRUCTURA</p> <hr/> <p>DE PREDIOS</p> <hr/> </div> </div>														FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	14	ABRIL	2025	
FECHA DILIGENCIAMIENTO																							
DÍA	MES	AÑO																					
14	ABRIL	2025																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>PERIODO ENTRE HASTA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 16%;">DÍA</th><th style="width: 16%;">MES</th><th style="width: 16%;">AÑO</th><th style="width: 16%;">DÍA</th><th style="width: 16%;">MES</th><th style="width: 16%;">AÑO</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">MAYO</td><td style="text-align: center;">2025</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td></tr> </table> </div> </div>												DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																		
7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025																		
<p>OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”</p>																							
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																				
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE									
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%									
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		12,4%									
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%											
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL, está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%											
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%											
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	86%	3,43%	9 Abril: se evidencian volquetas en obra no aprobadas por la Interventoría incumpliendo procedimiento de manejo de vehículos.										
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%									
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		35%									
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%											
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%											
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%											
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%											
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%											
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%											

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES												 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																	
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST										VERSIÓN 4.0																		
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">DÍA</th> <th style="width:33%;">MES</th> <th style="width:33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	14	ABRIL	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS										SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____											
DÍA	MES	AÑO																											
14	ABRIL	2025																											
CONTRATO DE OBRA N° _____ 1711-2023 CONTRATO INTERVENTORÍA N° _____ 1757-2023		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th style="width:16%;">DÍA</th> <th style="width:16%;">MES</th> <th style="width:16%;">AÑO</th> <th style="width:16%;">DÍA</th> <th style="width:16%;">MES</th> <th style="width:16%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>										PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025																								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																													
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																										
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE															
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%															
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		8%															
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%																	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%																	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%																	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%															
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%																	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																	
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																	
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																	



FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>																			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							VERSION 4.0																					
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO							INFRAESTRUCTURA																				
DÍA	MES	AÑO								DIRECCIÓN TÉCNICA																			
14	ABRIL	2025								DE PREDIOS																			
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
CONTRATO DE OBRA N°			1711-2023																										
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			1757-2023																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>MAYO</td> <td>2025</td> <td>13</td> <td>ABRIL</td> <td>2025</td> </tr> </tbody> </table>												PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025																								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																													
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																										
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE															
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		39%															
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																	
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%																	
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																	
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																	
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																	
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																	
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																	
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																	
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%							0%	1,00%																	
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%																	

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										VERSION 4.0																																																																																											
CÓDIGO FO-AC-32			PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST																																																																																																		
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	14	ABRIL	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO							SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DIRECCIÓN TÉCNICA _____ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____																																																																																					
DÍA	MES	AÑO																																																																																																			
14	ABRIL	2025																																																																																																			
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS							INFRAESTRUCTURA _____ DE PREDIOS _____																																																																																											
CONTRATO DE OBRA N° _____			CONTRATO INTERVENTORÍA N° _____							<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>				PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025																																																																						
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																																
7	MAYO	2025	13	ABRIL	2025																																																																																																
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Porcentaje Total Componentes</th> <th style="text-align: center;">100%</th> <th colspan="11" style="text-align: center;">Calificación semanal</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th>7-abr</th> <th>8-abr</th> <th>9-abr</th> <th>10-abr</th> <th>11-abr</th> <th>12-abr</th> <th>13-abr</th> <th>TOTAL SEMANA</th> <th>TOTAL ÍNDICE</th> <th>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">33</td> <td>Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.</td> <td style="text-align: center;">2,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;">COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34</td> <td>Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.</td> <td style="text-align: center;">5,0%</td> <td style="text-align: center;">Aplica</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td colspan="11" style="text-align: center;">TOTAL EVALUADO</td> <td style="text-align: center;">99,43%</td> </tr> </tbody> </table>														Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL ÍNDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%			COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%	TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											99,43%
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																																																																																																		
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	7-abr	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL ÍNDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																							
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																									
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD																																																																																																					
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%																																																																																							
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											99,43%																																																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ (FIRMA)</p> <p>ING. LOLY VANEGAS BARRERA</p> <p>PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</p> <p>_____ (FIRMA)</p> <p>WILMER BACCA GUTIERREZ</p> <p>PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</p> <p>_____ (FIRMA)</p> <p>ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ</p> <p style="text-align: right;">DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ (FIRMA)</p> <p>ING BRAYAN ARANGO CRUZ</p> <p>PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</p> <p>_____ (FIRMA)</p> <p>DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ</p> <p>PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</p> <p>_____ (FIRMA)</p> <p>ING MONICA JIMENA GUERRA V.</p> <p style="text-align: right;">DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA</p> </div> </div>																																																																																																					
<p>Original: Interventoría 1era copia: Contratista 2da copia: IDU</p>																																																																																																					

FORMATO																															
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																															
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4.0																					
<table><tr><th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>21</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	21	ABRIL	2025	INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO								SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																															
DÍA	MES	AÑO																													
21	ABRIL	2025																													
		CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS								DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS																			
										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																					
CONTRATO DE OBRA N°		1711-2023								<table><tr><th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th></tr><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>14</td><td>ABRIL</td><td>2025</td><td>20</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>				PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																															
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																										
14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025																										
CONTRATO INTERVENTORIA N°		1757-2023																													
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																															
Porcentaje Total Componentes		100%		Calificación semanal																											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%																	
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%																	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%																			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%																			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%																			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%																	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		35%																	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%																			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%																			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%																			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%																			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%																			

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																																														
CÓDIGO	PROCESO							VERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																						
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							4,0																																																																																																																																																																																																																																						
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO					SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA																																																																																																																																																																																																																																					
DÍA	MES	AÑO						DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS																																																																																																																																																																																																																																				
21	ABRIL	2025						SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																																																																																																																																																						
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																																																																																																																																																																																																																																											
			CONTRATO DE OBRA N° <u>1711-2023</u>																																																																																																																																																																																																																																											
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° <u>1757-2023</u>																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </tbody> </table>												PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																																																	
PERIODO ENTRE HASTA																																																																																																																																																																																																																																														
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																																																																																																																																																																																																																																									
14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025																																																																																																																																																																																																																																									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Porcentaje Total Componentes</th> <th colspan="10">Calificación semanal</th> </tr> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>COMPONENTE AMBIENTAL</th> <th>100%</th> <th>ÍNDICE DE PONDERACIÓN</th> <th>APLICABILIDAD</th> <th>14-abr</th> <th>15-abr</th> <th>16-abr</th> <th>17-abr</th> <th>18-abr</th> <th>19-abr</th> <th>20-abr</th> <th>TOTAL SEMANA</th> <th>TOTAL INDICE</th> <th>OBSERVACIONES EN CASO DE 0%</th> <th>COMPONENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16" style="text-align: center;">COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO</td> </tr> <tr> <td colspan="16" style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.</td> <td>2,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>2,00%</td> <td></td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">8%</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.</td> <td>2,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC</td> <td>2,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.</td> <td>2,0%</td> <td>No aplica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="16" style="text-align: center;">COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td> </tr> <tr> <td colspan="16" style="text-align: right;">39%</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,00%</td> <td></td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.</td> <td>2,0%</td> <td>No aplica</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.</td> <td>5,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.</td> <td>2,0%</td> <td>Aplica</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Porcentaje Total Componentes			Calificación semanal										ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	100%	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE	COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																8%																13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica									0%	2,00%		8%	14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica									0%	2,00%		15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica									0%	2,00%		16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica									0%	2,00%		COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																39%																17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%			18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%								0%	2,00%		19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%	
Porcentaje Total Componentes			Calificación semanal																																																																																																																																																																																																																																											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	100%	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																																																																																																																																																																																																																															
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																																																																																																																																																																																																																																														
8%																																																																																																																																																																																																																																														
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica									0%	2,00%		8%																																																																																																																																																																																																																															
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica									0%	2,00%																																																																																																																																																																																																																																	
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica									0%	2,00%																																																																																																																																																																																																																																	
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica									0%	2,00%																																																																																																																																																																																																																																	
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																																																																																																																																																																																														
39%																																																																																																																																																																																																																																														
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																																																																																	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%								0%	2,00%																																																																																																																																																																																																																																	
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																																																																																																																																																																																																																																		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																																																																																		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																																																																																																																																																																																																																																		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																																	
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSIÓN 4,0																							
<table><tr><td colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>21</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>			FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	21	ABRIL	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO								SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA													
FECHA DILIGENCIAMIENTO																																	
DÍA	MES	AÑO																															
21	ABRIL	2025																															
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS								DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																						
											SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																						
CONTRATO DE OBRA N°			1711-2023								<table><tr><td colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>14</td><td>ABRIL</td><td>2025</td><td>20</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>					PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																																	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																												
14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025																												
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			1757-2023																														
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																																	
Porcentaje Total Componentes			100%	Calificación semanal																													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																		
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra		2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		39%																		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagiares		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.		4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%																				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.		1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.		1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.		1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%																				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.		1,0%	No aplica	0%							0%	1,00%																				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.		3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%																				

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES							 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small>																			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST					VERSION 4,0																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</th></tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr> <td>21</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr> </table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	21	ABRIL	2025	INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023 CONTRATO INTERVENTORIA N° 1757-2023					SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																										
DÍA	MES	AÑO																								
21	ABRIL	2025																								
							<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th></tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr> <tr> <td>14</td><td>ABRIL</td><td>2025</td><td>20</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr> </table>		PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																										
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																					
14	ABRIL	2025	20	ABRIL	2025																					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																										
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE												
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%														
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%												
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%												
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											100,00%												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> <small>(FIRMA)</small> ING. LILY VANEGAS BARRERA <small>PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</small></p> <p> <small>(FIRMA)</small> WILMER BACCA GUTIERREZ <small>PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</small></p> <p> <small>(FIRMA)</small> ING. JAIRO GEOVANNI ORTIZ <small>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</small></p> <p><small>Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU</small></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> <small>(FIRMA)</small> ING. BRAYAN ARANGO CRUZ <small>PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</small></p> <p> <small>(FIRMA)</small> DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ <small>PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</small></p> <p> <small>(FIRMA)</small> ING. MONICA JIMENA GUERRA V. <small>DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA</small></p> </div> </div>																										

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES												 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano															
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST									VERSIÓN 4,0																	
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO										SUBDIRECCIÓN GENERAL		INFRAESTRUCTURA													
DÍA 28	MES ABRIL	AÑO 2025										DIRECCIÓN TÉCNICA		DE PREDIOS													
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS									SUBDIRECCIÓN TÉCNICA															
			CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023									PERIODO ENTRE HASTA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> <th style="width: 16.6%;">DÍA</th> <th style="width: 16.6%;">MES</th> <th style="width: 16.6%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>ABRIL</td> <td>2025</td> <td>27</td> <td>ABRIL</td> <td>2025</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	21	ABRIL	2025	27	ABRIL	2025		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																						
21	ABRIL	2025	27	ABRIL	2025																						
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023																								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																											
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE													
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%													
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%													
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%															
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%															
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%															
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%															
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%													
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		35%													
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%															
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%															
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%															
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%															
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%															
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%															

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																					
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSION 4,0																						
FECHA DILIGENCIAMIENTO		INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO								SUBDIRECCIÓN GENERAL _____																					
DÍA	MES	AÑO									INFRAESTRUCTURA _____																				
28	ABRIL	2025									DIRECCIÓN TÉCNICA _____																				
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____																				
			CONTRATO DE OBRA N° _____ 1711-2023																												
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° _____ 1757-2023																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">21</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td><td style="text-align: center;">27</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </tbody> </table>														PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	21	ABRIL	2025	27	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																															
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																										
21	ABRIL	2025	27	ABRIL	2025																										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																															
Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal																												
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																	
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																															
8%																															
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica									2,00%		8%																	
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%																			
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%																			
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica								0%	2,00%																			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																															
39%																															
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																			
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%																			
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en las buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%																			
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																			
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																			




FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano				
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST								VERSIÓN 4,0				

FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">DÍA</th> <th style="width:33%;">MES</th> <th style="width:33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">ABRIL</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	28	ABRIL	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO										SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DIRECCIÓN TÉCNICA _____ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____					INFRAESTRUCTURA _____ DE PREDIOS _____				
DÍA	MES	AÑO																										
28	ABRIL	2025																										
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																									
CONTRATO DE OBRA N° _____			1711-2023																									
CONTRATO INTERVENTORÍA N° _____			1757-2023																									

PERIODO ENTRE HASTA					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
21	ABRIL	2025	27	ABRIL	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal												OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE				
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		39%		
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%				
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%				
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%				
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%				
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%				
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%				
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%				
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%				
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%							0%	1,00%				
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%				

FORMATO																													
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																													
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0																					
<table><tr><td colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>28</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>		FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	28	ABRIL	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO						SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA												
FECHA DILIGENCIAMIENTO																													
DÍA	MES	AÑO																											
28	ABRIL	2025																											
		CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS						DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS																					
								SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																					
CONTRATO DE OBRA N°		1711-2023						<table><tr><td colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>21</td><td>ABRIL</td><td>2025</td><td>27</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>				PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	21	ABRIL	2025	27	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
21	ABRIL	2025	27	ABRIL	2025																								
CONTRATO INTERVENTORÍA N°		1757-2023																											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																													
Porcentaje Total Componentes		100%		Calificación semanal																									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	21-abr	22-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE															
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%																	
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%															
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%															
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO										100,00%																
<div><div> ING. LOLY VANEGAS BARRERA PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</div><div> WILMER BACCA GUTIERREZ PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)</div><div> ING JAIRO GEOVANNI ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div></div> <div><div> ING BRAYAN ARAÑO CRUZ PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</div><div> DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</div><div> ING MONICA JIMENA GUERRA V. DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA</div></div> <div>Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU</div>																													

FORMATO										 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																													
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST							VERSIÓN 4.0																					
FECHA DILIGENCIAMIENTO <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MAYO</td> <td>2025</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	1	MAYO	2025	INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO				SUBDIRECCIÓN GENERAL				INFRAESTRUCTURA												
DÍA	MES	AÑO																											
1	MAYO	2025																											
								DIRECCIÓN TÉCNICA				DE PREDIOS																	
				CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																					
CONTRATO DE OBRA N°			1711-2023			<table border="1"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>28</td> <td>ABRIL</td> <td>2025</td> <td>30</td> <td>ABRIL</td> <td>2025</td> </tr> </table>						PERIODO ENTRE HASTA						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	28	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																													
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO																								
28	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025																								
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			1757-2023																										
OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”																													
Porcentaje Total Componentes			100%	Calificación semanal																									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	28-abr	29-abr	30-abr			TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																	
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																													
13%																													
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	2,00%		13,0%																	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica						0%	2,00%																			
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	2,00%																			
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	3,00%																			
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	4,00%																			
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																													
35%																													
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	No aplica	100%	100%	100%			100%	5,00%		35%																	
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	6,00%																			
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	5,00%																			
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	4,00%																			
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	3,00%																			
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	6,00%																			
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	6,00%																			

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES										 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano			
CODIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4,0					

FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORIA: CONSORCIO METRO CINCO						SUBDIRECCIÓN GENERAL				INFRAESTRUCTURA			
DÍA	MES	AÑO							DIRECCIÓN TÉCNICA				DE PREDIOS			
1	MAYO	2025							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							

CONTRATO DE OBRA N°			1711-2023						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</th> </tr> <tr> <th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </table>				PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	28	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																														
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																									
28	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025																									
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			1757-2023																											

OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	28-abr	29-abr	30-abr			TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedar en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica						0%	2,00%		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica						0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC.	2,0%	No aplica						0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica						0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%					0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	2,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES						 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small> Desarrollo Urbano			
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSIÓN 4.0	





FECHA DILIGENCIAMIENTO			INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO				SUBDIRECCIÓN GENERAL				INFRAESTRUCTURA			
DÍA	MES	AÑO					DIRECCIÓN TÉCNICA				DE PREDIOS			
1	MAYO	2025												

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS														
CONTRATO DE OBRA N°			1711-2023											
CONTRATO INTERVENTORÍA N°			1757-2023											

PERIODO ENTRE HASTA					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
28	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: “DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal										
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	28-abr	29-abr	30-abr				TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra.	2,0%	No aplica	0%						0%	2,00%		39%
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convención Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%						0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%				100%	3,00%		

FORMATO																														
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES																														
CÓDIGO FO-AC-32		PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST						VERSION 4.0																						
<table><tr><td colspan="3">FECHA DILIGENCIAMIENTO</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>1</td><td>MAYO</td><td>2025</td></tr></table>			FECHA DILIGENCIAMIENTO			DÍA	MES	AÑO	1	MAYO	2025	INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO				SUBDIRECCIÓN GENERAL				INFRAESTRUCTURA										
FECHA DILIGENCIAMIENTO																														
DÍA	MES	AÑO																												
1	MAYO	2025																												
							DIRECCIÓN TÉCNICA				DE PREDIOS																			
			CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																							
			CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023				<table><tr><td colspan="6">PERIODO ENTRE HASTA</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>28</td><td>ABRIL</td><td>2025</td><td>30</td><td>ABRIL</td><td>2025</td></tr></table>						PERIODO ENTRE HASTA						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	28	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025
PERIODO ENTRE HASTA																														
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																									
28	ABRIL	2025	30	ABRIL	2025																									
			CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023																											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."																														
Porcentaje Total Componentes			100%		Calificación semanal																									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL		ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	28-abr	29-abr	30-abr			TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE																	
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.		2,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	2,00%																			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD													5%																	
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.		5,0%	Aplica	100%	100%	100%			100%	5,00%		5%																	
TOTAL			100%	TOTAL EVALUADO									100,00%																	
<div><div> ING. LOLY VANEGAS BARRERA PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)</div><div> ING. BRAYAN ARAÑO CRUZ PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</div></div>																														
<div><div> WILMER BACCA GUTIERREZ PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (INTERVENTORIA)</div><div> DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRAFACTUALES (CONTRATO DE OBRA)</div></div>																														
<div><div> ING. JAIRO GEOVANNI ORTIZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div><div> ING. MONICA JIMENA GUERRA V. DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA</div></div>																														
Original: Interventoria 1era copia: Contratista 2da copia: IDU																														

FORMATO							
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO							
CODIGO	CODIGO	VERSION					
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3					
COMITÉ No. <u>37</u>		FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">2025</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; font-size: 0.8em;">(Fecha de realización del comité de r-m-a)</div>			4	4	2025
4	4	2025					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
CONTRATO No. <u>1711</u> DE <u>2023</u>							
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)					
CONTRATISTA <u>INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</u>		(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. <u>1757</u> DE <u>2023</u>							
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)					
INTERVENTOR <u>CONSORCIO METRO CINCO</u>		(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)					
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA <u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS</u>		(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)					
I. PARTICIPANTES							
NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA				
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO		Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)			
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS					
BRAYAN ARANGO	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS					
LOLY VANEGAS BARRERA	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO					
WILSON SANDOVAL	RESIDENTE FORESTAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO					
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUBDIRECCION AREA AMBIENTAL	IDU					
DANIEL MANOTAS	APOYO A LA SUBDIRECCION AREA FORESTAL	IDU					
II. OBJETO							
COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No. 1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST							
III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA							
Se da lectura al acta de comité No. 36. De la cual no se tiene observaciones							
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)							
Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar		
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	36	1	Interventoria	Si	Permanente		
Atencion observaciones del informe SST # 11 del contrato 1711-2023	36	2	CONTRATISTA	Si	Recibido		
Actas de cierre de talas de emergencia	36	3	IDU	No	Pendiente		
Pronunciamiento del estado informes mensuales Componente Forestal	36	4	IDU	No	Pendiente		
Revisión manejo de tanque de agua subterráneo en La Estancia	36	5	Contratista /Interventoría	Si			
Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió							

FORMATO			idu
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CODIGO	CODIGO	VERSION	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

*Se recibió aprobación de hoja de vida de profesional Loly Vanegas bajo Memorando OGA 202517500092283 del 21/03/2025 por correo electrónico, se está a la espera del oficio formal por parte de la entidad.

Gestion documental: La Interventoría aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

- **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoría y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 51, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envían por correo electrónico.
- **Informes mensuales:**
 - **Contratista:**
 - Informe mensual Ambiental No. 1 al 11 del Contratista: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
 - Informe mensual Ambiental No. 12 del Contratista: Está programada la entrega para el próximo 7 de Abril de 2025,
 - **Interventoría:**
 - Informe mensual Ambiental No. 1 a 4 de Interventoría: Estan aprobados por parte de la entidad, esta pendiente si hay o no observaciones por parte del componente forestal. El IDU comenta que esta aprobado el informe N.4 y estan en validación los N. 1, 2 y 3; sin embargo aún no se han recibido los oficios.
 - Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoría: Se cuenta con la aprobación de las áreas ambiental, fauna y forestal segun radicado OGA 202517500021223.
 - Informe mensual Ambiental No. 6 Interventoría: Se cuenta con la aprobación de áreas ambiental y fauna. Está pendiente el área forestal.
 - Informe mensual Ambiental No. 7 Interventoría: Se dio aprobación del area ambiental según radicado OGA 202517500024263, faltan áreas forestal y fauna. El IDU componente fauna menciona que ya tiene memorando de aprobación y que lo remitirá mediante correo electrónico.
 - Informe mensual Ambiental No. 8 Interventoría: Se cuenta con la aprobación de áreas ambiental y fauna. Está pendiente el área forestal.
 - Informe mensual Ambiental No. 9 Interventoría: Se dió atención a las observaciones de la Versión 1, se cuenta con la aprobación componente fauna, falta área forestal.
 - Informe mensual Ambiental No. 10 Interventoría: Se radico a la entidad la V1 bajo radicado 202552600237492 del 14/02/2025, el cual esta en revisión de la entidad.
 - Informe mensual Ambiental No. 11 Interventoría: Se radicó a la entidad.

El Asesor Forestal del IDU, menciona que está en trámite el envío de los memorandos de aprobación de los informes forestales entregados a la fecha.

- Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se realizó el cargue por parte del IDU del trimestre N. 1 del año 2024, por lo que faltarían los trimestres 2, 3 y 4 del año 2024. El IDU menciona que ya realizó el respectivo cargue de los trimestres faltantes con corte hasta el mes de Diciembre de 2024, se enviarán los radicados por correo electrónico a la Interventoría.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST

- Se apueba Informe SST # 10 CTO 1711-2023 bajo oficio GMC-134-106-2025 del 07/04/2025.
- Se emite concepto de aprobacion al MEV # 10 bajo oficio GMC-134-107-2025 del 07/04/2025.
- Se emite concepto de aprobacion al MEV # 11 bajo oficio GMC-134-109-2025 del 07/04/2025.
- SST # 11 de contatistta obsrvado bajo oficio GMC-134-099-2025 del 17/03/2025.

Informe

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

La interventoría reporta las actividades que se estan desarrollando en el contrato así:

*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demolición y recolección de RCD en RT 54800 ubicado en la localidad de ciudad bolivar.

*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demolición y recolección de RCD en RT 54851 ubicado en la localidad de ciudad bolivar.

*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de recolección de RCD en RT 54850 ubicado en la localidad de BOSA barrio la estancia.

*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de recolección de RCD en RT 54849 ubicado en la localidad de BOSA barrio la estancia.

*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de recolección de RCD en RT 54844 ubicado en la localidad de BOSA barrio la estancia.

Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de recolección de RCD en RT 54845 ubicado en la localidad de BOSA barrio la estancia.

Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de recolección de RCD en RT 54846 ubicado en la localidad de BOSA barrio la estancia.

Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de recolección de RCD en RT 54847 ubicado en la localidad de BOSA barrio la estancia.

*Se realiza seguimiento a las actividades de cerramiento en el RT 44407 localidad de suba.

*Se realiza seguimiento a las actividades de cerramiento en el RT 11076 localidad de Engativa.

*Se realiza seguimiento ambiental a la conformación de jarillones en el RT 6935.

*Se realiza capacitación ambiental, enfocada en temas de manejo de avifauna y vegetación y Funciones BOAL, limpieza de neumáticos y jornadas de orden aseo y limpieza.

*Durante la semana, se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecánica en los RTs 54800, 54851,54850, 54844, 54845, 54846 y 54847 en donde se realizó humectación constante de manera simultánea a la demolición.

*Se continua con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales deben contar con unidades sanitarias móviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidratación fijos.

*Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias presentes en los campamentos temporales, dicha limpieza se realiza dos veces por semana a cada una de las unidades sanitarias.

* Respecto a la inspección realizada al tanque subterráneo evidenciado en el predio de La Estancia, se definió por inspección que el agua no es residual dado que no presenta malos olores ni residuos en su interior, parece ser un almacenamiento de agua limpia sin embargo si presenta residuos de poco tamaño lo cual se presume se generaron por el almacenamiento o deficiencia en la tapa; se acuerda con el Contratista el retiro del agua con motobomba para posteriormente ser almacenada en el carrotanque y así reutilizar el recurso y no su desperdicio.

FORMATO			
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CODIGO	CODIGO	VERSION	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO			
<p>Durante el desarrollo de actividades de la semana , se realiza seguimiento a las actividades de mantenimiento y recolección de residuos vegetales (producto de poda de césped) en los RT 11319 y 42464 ubicado en la localidad de Fontibon.</p> <p>- Respecto al predio aledaño a Diverplaza en donde estan ubicados individuos de especie Higuevilla, se comenta por parte del IDU que se remitió la respectiva solicitud a la SDA respecto a la necesidad o no de trámite de permiso para la tala de los individuos, se comenta por parte de la Interventoría que se remitió por parte del Contratista la cotización de la realización del inventario como la tala. La Interventoría menciona que tratará el tema en Comité Integral para definir o no la necesidad de pronunciamiento</p> <p>- A la fecha no se ha realizado el manejo de retamo espinoso del predio de la ALO, el Contratista remitió cotización respecto a la actividad, se enviará pronunciamiento por parte de la Interventoría.</p> <p>* No se realizaron actividades de componente fauna, en donde se realiza verificación previa de predios intervenidos para la poda de cesped, la existencia de madrigueras y nidos de especies, no se evidencia ninguno de estos por ello se procede a realizar las actividades, garantizando que no hay afectación a la fauna. El IDU solicita que la profesional en Fauna del Contratista realice las capacitaciones respectivas al personal frente a las inspecciones previas, solicita que antes de realizar las actividades de manejo de la higuevilla se cuente con la participación del Componente Fauna en cabeza de su especialista.</p>			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
<p>• Desde el componente de SST se realizan recorridos de control y verificación de aplicación de los protocolos propuestos en el MAO, por parte del contratista.</p> <p>• Se realizan inspección a la actividad de demolición que se desarrolla en el frente de trabajo de la estancia.</p> <p style="text-align: right;">• Se verifica que en los frentes de obra se cuente con el kit de atención de emergencias(camilla, botiquín, extintor), los puntos de hidratación a disposición de los trabajadores.</p> <p style="text-align: right;">• En el presente periodo semanal no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la población trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.</p> <p>• Se realiza inspección a los vehículos y maquinaria que desarrollan actividades de demolición en los frentes de trabajo.</p> <p>• Se realiza verificación del punto de hidratación en el frente de trabajo para el bienestar del personal del proyecto.</p> <p>• En recorrido se verifica la existencia de los puntos de atención de emergencias y los puntos de acopio de materiales y herramientas</p>			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD			
<p>• Se informa por parte de Interventoría que ha mejorado la señalización implementada en los predios de mantenimiento y demolición y es adecuada para las labores que se realizan, se garantiza su colocación en todo momento. Se evidenció instalación de tapa en madera en tanque de agua subterráneo del predio La Estancia, con respecto a las excavaciones de los registros de agua se implementaron los correctivos solicitados.</p>			
f. Varios			
<p>• Listas de chequeo: Para el periodo del 1 al 31 de Marzo de 2025; se presenta una calificación mensual de gestión ambiental, SST, forestal y fauna del 100%. Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.</p>			
DECISIONES TOMADAS			
Las mencionadas en la presente acta.			
VI. COMPROMISOS PACTADOS			
No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atención observaciones del informe SST # 11 del contrato 1711-2023	contratista	4/11/2025
3	Actas de cierre de talas de emergencia	IDU	Pendiente
4	Pronunciamiento del estado informes mensuales Componente Forestal	IDU	Pendiente
ANEXOS DEL ACTA			
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios	
1	Listado de asistencia	1	
2	Registro fotográfico	1	
VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
FECHA	11	Abril	2025
DÍA	MES	AÑO	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los			
Cuatro	4	días del mes de	Abril de 2025
<small>(Lugar en letras)</small>	<small>(Lugar en números)</small>	<small>(Mismo en que se firma el acta)</small>	<small>(Mismo de firma del acta)</small>
<small>(Firma)</small>	<small>(Firma)</small>		
LOLY VANEGAS B.	WILMER EDUARDO BACCA		
Interventoría			
NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.			
Original : Expediente de ORFEO No. _____			
1ra copia : Interventor. _____			



LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO COMPONENTE E # 37 CONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023 (04/04/2025)						
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Numero de docu	Cargo	Entidad/empresa	
4/4/2025 9:36:50	danielmava@gmail.com	Daniel Manotas Valencia	80912524	PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A	IDU-OGA	
4/4/2025 9:37:38	sstcontrato1757@gmail.com	Wilmer bacca	19604322	Residente SST	Consorcio metro cinco	
4/4/2025 9:51:27	desarrollosostenible1757@gmail.com	Loly vanegas	52853531	Residente Ambiental	Consorcio Metro Cinco	
4/4/2025 10:05:23	forestalsandovalbwj@gmail.com	Wilson Sandoval	80150839	Especialista Forestal	Consorcio Metro Cinco	
4/4/2025 10:05:25	barangoc11@gmail.com	BRAYAN ARANGO CRUZ	1030654429	RESIDENTE AMBIENTAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
4/4/2025 10:05:40	sstinfraintegral1711@gmail.com	Diana Marcela Velásquez Muñoz	53008087	Residente sst	Infraestructura Integral	
4/4/2025 10:06:10	monica.granados@idu.gov.co	Mónica Alejandra Granados Rodríguez	52214307	Apoyo supervisión ambiental	IDU-OGA	

FORMATO						
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO						
CÓDIGO	CÓDIGO	VERSIÓN				
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3				
COMITÉ No. 38		FECHA:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">11</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2025</td> </tr> </table> <small>(Fecha de realización del comité de-mm-a)</small>	11	4	2025
11	4	2025				
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA				
CONTRATO No. 1711 DE 2023						
<small>(Número de Contrato)</small>		<small>(Año de suscripción)</small>				
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS				
		<small>(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)</small>				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.		1757 DE 2023				
		<small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>				
INTERVENTOR		CONSORCIO METRO CINCO				
		<small>(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)</small>				
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS				
		<small>(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de Interventoría)</small>				
I. PARTICIPANTES						
NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA			
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)			
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS				
BRAYAN ARANGO	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS				
LOLY VANEGAS BARRERA	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO				
WILSON SANDOVAL	RESIDENTE FORESTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO				
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUBDIRECCION AREA AMBIENTAL	IDU				
II. OBJETO						
COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No. 1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST						
III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA						
Se da lectura al acta de comité No. 37. De la cual no se tiene observaciones						
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)						
Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar	
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	37	1	Interventoria	Si	Permanente	
Atencion observaciones del informe SST # 11 del contrato 1711-2023	37	2	CONTRATISTA	Si	Recibido	
Actas de cierre de talas de emergencia	37	3	IDU	No	Pendiente	
Pronunciamento del estado informes mensuales Componente Forestal	37	4	IDU	No	Pendiente	
Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió						

FORMATO			idu
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CÓDIGO	CÓDIGO	VERSIÓN	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoría aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

- **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoría y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 52, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envían por correo electrónico.
- **Informes mensuales:**
 - **Contratista:**
 - Informe mensual Ambiental No. 1 al 11 del Contratista: Los informes están aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
 - Informe mensual Ambiental No. 12 del Contratista: El Contratista remite atención a observaciones al Informe, las cuales están siendo revisadas por la Interventoría.
 - **Interventoría:**
 - Informe mensual Ambiental No. 1 a 4 de Interventoría: Están aprobados por parte de la entidad, esta pendiente si hay o no observaciones por parte del componente forestal. El IDU comenta que está aprobado el informe N.4 y están en validación los N. 1, 2 y 3; sin embargo aún no se han recibido los oficios.
 - Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoría: Se cuenta con la aprobación de las áreas ambiental, fauna y forestal según radicado OGA 202517500021223.
 - Informe mensual Ambiental No. 6 Interventoría: Se cuenta con la aprobación de áreas ambiental y fauna. Está pendiente el área forestal.
- Informe mensual Ambiental No. 7 Interventoría: Se dio aprobación del área ambiental según radicado OGA 202517500024263, faltan áreas forestal y fauna. El IDU componente fauna menciona que ya tiene memorando de aprobación y que lo remitirá mediante correo electrónico.
- Informe mensual Ambiental No. 8 Interventoría: Se cuenta con la aprobación de áreas ambiental y fauna. Está pendiente el área forestal.
- Informe mensual Ambiental No. 9 Interventoría: Esta en revisión por parte del IDU la versión 2 componente Ambiental, aprobado componente fauna, falta componente forestal.
- Informe mensual Ambiental No. 10 Interventoría: Se radica a la entidad la V1 bajo radicado 202552600237492 del 14/02/2025, el cual está en revisión de la entidad.
- Informe mensual Ambiental No. 11 Interventoría: Se radicó a la entidad.
- Informe mensual Ambiental No. 12 Interventoría: Se tiene programada la radicación para el próximo 14 de Abril de 2025.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

• PGRCD: Se recibió por parte del IDU el cargue de RCD trimestrales N. 2, 3 y 4 del año 2024.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST

- Se apueba Informe SST # 10 CTO 1711-2023 bajo oficio GMC-134-106-2025 del 07/04/2025.
- Se emite concepto de aprobación al MEV # 10 bajo oficio GMC-134-107-2025 del 07/04/2025.
- Se emite concepto de aprobación al MEV # 11 bajo oficio GMC-134-109-2025 del 07/04/2025.
- SST # 11 de contatista observado bajo oficio GMC-134-099-2025 del 17/03/2025.

Informe

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

La interventoría reporta las actividades que se están desarrollando en el contrato así:

- Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demolición y recolección de RCD en RT 54800 ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
- Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demolición y recolección de RCD en RT 54851 ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.
- Se realiza seguimiento a las actividades de cerramiento en el RT 11512 localidad de Engativá.
- Se realiza seguimiento a las actividades de cerramiento en el RT 11076 localidad de Engativá.
- Se realiza seguimiento ambiental a la conformación de jarillones en el RT 6935.
- Se continúa con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales deben contar con unidades sanitarias móviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidratación fijos.
- Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias presentes en los campamentos temporales, dicha limpieza se realiza dos veces por semana.
- Está pendiente el retiro del agua almacenada en predio del barrio La Estancia.

FORMATO			
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CÓDIGO	CÓDIGO	VERSIÓN	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO			
<p>Durante el desarrollo de actividades de la semana , se realiza seguimiento a las actividades de mantenimiento y recolección de residuos vegetales en los RT 11277 y 11292 ubicado en la localidad de Engativa.</p> <p>- Respecto al predio aledaño a Diverplaza en donde estan ubicados individuos de especie Higuierilla, está pendiente la respuesta por parte del IDU frente a su manejo.</p> <p>- A la fecha no se ha realizado el manejo de retamo espinoso del predio de la ALO, el Contratista remitió cotización respecto a la actividad, se enviará pronunciamiento por parte de la Interventoría.</p> <p>* No se realizaron actividades de componente fauna, en donde se realiza verificación previa de predios intervenidos para la poda de cesped, la existencia de madrigueras y nidos de especies, no se evidencia ninguno de estos por ello se procede a realizar las actividades, garantizando que no hay afectación a la fauna. El IDU solicita que la profesional en Fauna del Contratista realice las capacitaciones respectivas al personal frente a las inspecciones previas, solicita que antes de realizar las actividades de manejo de la higuierilla se cuente con la participación del Componente Fauna en cabeza de su especialista.</p>			
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
<ul style="list-style-type: none"> • Desde el componente de SST se realizan recorridos de control y verificación de aplicacion de los protocolos propuestos en el MAO, por parte del contratista. • Se realiza inspeccion a la actividad de demolicion que se desarrolla en el frente de trabajo de la estancia. • Se verifica que en los frentes de obra se cuente con el kit de atencion de emergencias(camilla, botiquin, extintor), los puntos de hidratacion a disposicion de los trabajadores. • En el presente periodo semanal no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades. • Se realiza inspeccion a los vehiculos y maquinaria que desarrollan actividades de demolicion en los frentes de trabajo. • Se realiza verificación del punto de hidratacion en el frente de trabajo para el bienestar del personal del proyecto. • En recorrido se verifica la existencia de los puntos deatencion de emergencias y los puntos de acopio de materiales y herramientas • Se verifica que el contratista tenga los campamentos y vestieres disponibles para el personal de la obra. • En bitacora se dejan los respectivos registros de visitas realizadas por interventoria con las observaciones que se le han echo al contratista. 			
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD			
<p>•Se informa por parte de Interventoria que ha mejorado la señalización implementada en los predios de mantenimiento y demolición y es adecuada para las labores que se realizan, se garantiza su colocación en todo momento. Se evidenció instalación de tapa en madera en tanque de agua subteraneo del predio La Estancia, con respecto a las excavaciones de los registros de agua se implementaron los correctivos solicitados.</p>			
f. Varios			
<p>• Listas de chequeo: Para el periodo del 1 al 6 de Abril de 2025; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del 100%. Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.</p>			
DECISIONES TOMADAS			
<p>Las mencionadas en la presente acta.</p>			
VI. COMPROMISOS PACTADOS			
No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atencion observaciones del informe SST # 11 del contrato 1711-2023	contratista	11/04/2025
3	Actas de cierre de talas de emergencia	IDU	Pendiente
4	Pronunciamiento del estado informes mensuales Componente Forestal	IDU	Pendiente
ANEXOS DEL ACTA			
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios	
1	Listado de asistencia	1	
2	Registro fotográfico	1	
VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
FECHA	25	Abril	2025
DÍA	MES	AÑO	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p>			
Cuatro	11	días del mes de	Abril de 2025
(Firma)	(Firma)		
(Nombre)	(Nombre)		
OLY VANEGAS B.	WILMER EDUARDO BACCA		
Interventoría			
<p>NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.</p>			
<p>Original : Expediente de ORFEO No. _____</p> <p>Una copia : Interventor. _____</p>			

	LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL # 20 CONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023 (11/04/ 2025)						
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Numero de docu	Cargo	Entidad/empresa		
4/11/2025 9:36:50	desarrollosostenible1757@gmail.com	Loly Vanegas	52853531	Residente Ambiental	Consortio Metro Cinco		
4/11/2025 9:46:23	monica.granados@idu.gov.co	Alejandra Granados Rodríguez	52214307	Apoyo supervisión ambiental	IDU-OGA		
4/11/2025 10:05:03	sstcontrato1757@gmail.com	Wilmer bacca	19604322	Residente SST	Consortio metro cinco		
4/11/2025 10:11:21	sstinfraintegral1711@gmail.com	Diana Marcela Velásquez	53008087	Residente SST	Infraestructura Integral		
4/11/2025 10:38:31	barangoc11@gmail.com	BRAYAN ARANGO CRUZ	1030654429	Residente ambiental	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS		
4/11/2025 14:19:16	forestalsandovalbwj@gmail.com	Wilson Sandoval	80150839	Especialista Forestal	Consortio Metro Cinco		

FORMATO					
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO					
CODIGO	CÓDIGO	VERSIÓN			
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3			
COMITÉ No. <u>25</u>		FECHA:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 25 4 2025 </div> <small>(Fecha de realización del comité de-mm-a)</small>		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No <u>1711</u> <small>(Número de Contrato)</small>		DE <u>2023</u> <small>Año de suscripción</small>			
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)</small>			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.		<u>1757</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>			
INTERVENTOR		CONSORCIO METRO CINCO <small>(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)</small>			
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS <small>(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)</small>			
I. PARTICIPANTES					
NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA		
SE ANEXA EL LISTADO DE ASISTENCIA					
II. OBJETO					
COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023					
III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA					
N.A.					
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)					
Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<small>Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió</small>					
V. TEMAS TRATADOS					
COMPONENTE TECNICO					
a. Seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Obra y Programa de Inversión:					
N.A.					
b. Seguimiento al cumplimiento de RCD y Grano Caucho (si aplica)					
N.A.					
c. Seguimiento a PMT					
N.A.					

FORMATO			idu
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CODIGO	CÓDIGO	VERSIÓN	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
d. Seguimiento a la Señalización y/o Demarcación			
N.A.			
e. Seguimiento al trámite y aprobación de apus no previstos (Trazabilidad)			
N.A.			
f. Varios			
<p>Para el comité de seguimiento Integral No. 25, por parte del Contratista de obra, Interventoría e IDU se tienen los siguientes temas por tratar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se mencionan compromisos del acta de comité técnico social No. 24, para lo cual, hace falta que remitan el acta 11 para firma y poder remitirla a la entidad. 2. Se hace mención del predio Suba para el cierre en malla eslabonada, lo cual a la fecha aun no se ha culminado por parte del Contratista, El residente de obra menciona que hicieron la recolección de basura del Lote de Suba, ya hoy estan instalando campamento y estan procediendo a hacer el cerramiento de malla eslabonada. <p>Menciona que hay una situación social un poco compleja. El vecino ha salido a comentar que no se deje hueco descubierto. Es decir, se retiró la basura y quedó muy hondo el terreno. Y eso ha hecho que el agua se le esté infiltrando al señor de la casa. Solicitó el favor de que se hiciera un relleno y que en lo posible, implementar una zona dura ahí. Se va a seguir presentando ese inconveniente. Y por otro lado, todo el cerramiento que se había hecho en madera rolliza y alambre de púa estaba intacto. La situación es que la comunidad sigue disponiendo de la basura por encima de la malla, en este sentido, a pesar de que se haga un cerramiento en malla eslabonada, se va a seguir acumulando basura.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Se hace mención de las actividades de demolición que se estan realizando en la Estancia para los predio que ya han sido entregados por parte del IDU al Contratista de obra para las actividades a realizar, se estan adelantando desmantelamiento manual en el interior de los predios, para que una vez que se cuente con mas predios recibidos, realizar la demolición de estos. 4. En relación al RT 54800, se han seguido las actividades de demolición de la bodega que se encontraba ubicada en este predio. 			
DECISIONES TOMADAS			
N.A.			
COMPONENTE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL			
Trámites en curso			
N.A.			
DECISIONES TOMADAS			
N.A.			

FORMATO			idu
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CODIGO	CÓDIGO	VERSIÓN	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
COMPONENTE FINANCIERO			
* Control Financiero			
N.A.			
* Anticipo			
N.A.			
DECISIONES TOMADAS			
N.A.			
COMPONENTE LEGAL			
N.A.			
DECISIONES TOMADAS			
N.A.			
COMPONENTE AMBIENTAL			
A. Ambiental			
<p>Los profesionales ambientales del Contratista de obra, Interventoría e IDU dan inicio al seguimiento del componente haciendo mención de los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han entregado 54 informes semanales, tanto por parte del contratista como por parte de la interventoría. Entonces, en este caso, se esta al día. En cuanto a los informes mensuales, el contratista ha remitido a la fecha 12 informes, de los cuales los mismos 12 están aprobados por parte de la interventoría. En cuanto a los informes de la interventoría, se tienen aprobados del 1 al 8 de los componentes fauna y ambiental. Está pendiente todavía por parte del componente ambiental la revisión de los informes 9, 10, 11 y 12. 2. La profesional del IDU menciona que en relación a los informes mensuales de la Interventoría, los informes 9, 10 y 11 se encuentran devueltos con observaciones y el informe 12 se espera a más tardar la siguiente semana sacar el concepto. 3. En los frentes de trabajo con las unidades sanitarias para el personal, con el punto ecológico, también se ha evidenciado la separación de los RCDs, también se ha evidenciado el retiro de los residuos metálicos y también de los residuos de construcción y demolición. Esta pendiente la actividad de retiro del agua almacenada en el predio del barrio La Estancia. El contratista el día de hoy mencionó que está programada para la siguiente semana, por temas de logística se ha retrasado un poco la actividad . 4. Se menciona que ya quedó el cargue de la información de generación de RCDs. Se esta al día hasta el mes de marzo de 2025. Entonces, solo quedaria esperar cualquier pronunciamiento por parte de la entidad. 			
B. SST			
<p>Los profesionales del componente SST haciendo mención de los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han entregado doce informes de los cuales el hasta el informe 9 aprobado por la por la entidad del informe 10 y 11 tiene unas observaciones las cuales se están atendiendo y el informe 12 ya fue entregado por medio del del ZIPA. Los informes del MEV o maquinaria equipos y vehículos también se han entregado doce informes, los cuales 11 han sido recibidos y aprobados, y el 12 está en revisión por parte de la entidad. 2. En cuanto a los informes por parte del contratista, esta interventoría ha recibido doce informes, de los cuales hay aprobados hasta el 10, tiene observación el 11, y el número 12 fue aprobado también esta semana. El informe MEV por parte del contratista también se han recibido los doce de los cuales se han se han revisado y se han dado aprobación. Se tiene el informe número doce pendiente por entregar por parte del contratista. 3. En la parte operativa del contrato, se viene viene haciendo los seguimientos respectivos a los la obra, lo que tiene que ver con la demolición mecánica, con la maquinaria. Por ese lado se han hecho inspecciones permanentes a maquinaria, a lo que tiene que ver con herramientas, lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, dotación de los trabajadores, puntos de hidratación, lo que tiene que ver también con los kits de emergencias. Por la parte documental también se recibe comunicado de aprobación del ingreso de la profesional ambiental Loli Vanegas el día quince de abril por parte de la de la entidad. 4. Al momento no se tiene ningún reporte de accidente dentro del contrato, ni del personal del contratista, ni del personal, no se tienen reportes de incidentes con la comunidad. Se vienen realizando los cerramientos como lo estipula el contrato y se vienen desarrollando las actividades dentro de los procedimientos que fueron planteados y por el contratista. 			

FORMATO			idu
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CODIGO	CÓDIGO	VERSIÓN	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	

C. Forestal

1. El contratista en el predio que está aledaño al centro comercial de Diverplaza, donde hay unos individuos de especie higuerrilla, el contratista remitió una cotización por un valor total cercano a los 216 millones, que incluye la tala de estos individuos, el cargue, el transporte la disposición final de los residuos y adicionalmente también pues tiene proyectada para la elaboración del inventario forestal en caso de que se llegara a ser necesario por un total de 18 millones adicionales. Se indaga al IDU si cuenta con un concepto claro de qué se va a hacer con esta especie dado interventoría contratista hicieron las respectivas visitas. Desde el IDU se recibe la respuesta que es necesario validar efectivamente la necesidad si se requiere hacer esa intervención de la higuerrilla, ya que si no se va a hacer algún movimiento de tierras en cierta forma grande y proximo a la intervención a realizar, en cierta forma esa tarea se va a perder teniendo en cuenta que es una especie invasiva. Así mismo, se menciona que para este caso es recomendable un informe mencionando la evaluación del tema, cuesta tanto, eso puede durar seis meses, un año y desde el IDU se evalúa si vale la pena o no hacer esa labor.

2. Se habla del tema del retamo espinoso que es otro tema bastante complejo ya que es una especie invasora y adicionalmente que el tema es complejo regeneración y se indaga igualmente al IDU sobre el procedimiento a realizar. En este caso para el manejo del retamo espinoso del predio de la ALO, el contratista remite una cotización respecto a la actividad donde se incluye todo el cargue, retiro, disposición final e incineración, porque ser una especie bastante compleja de manejar. Mencionan que cuesta 130 millones de pesos, sería otro predio que presenta esos inconvenientes y se estaría a la respuesta por parte del IDU.

3. Esta semana se recibió un correo electrónico del IDU en donde informa que la Secretaría de le dio un alcance a la queja que había presentado el edificio Alcazaba de Córdoba, que está ubicado en la calle 169 con carrera 54A. Ellos específicamente están pidiendo la poda de unos árboles, la Secretaría ya le indicó al IDU que debe hacer esa poda de los árboles, que ellos ya hicieron la visita y evidentemente se verificó que estos árboles están atravesados por líneas de mediana tensión. En conjunto con contratista y la interventoría se realizó la visita. Se dio concepto desde el 10 de marzo y se esta a la espera del pronunciamiento por parte de la entidad. Así mismo, la secretaria menciona que al ser predio del IDU, el IDU es el encargado de hacer la poda, pero entonces vuelve a relucir el tema que había surgido en el predio de Diver Plaza, los árboles están atravesados por líneas de media tensión y se llega nuevamente al tema de medidas para el personal que realizará esa poda. Desde el IDU se manifiestan mencionando que se revisara el tema internamente para da un concepto.

D. Maquinaria y Equipos

N.A.

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL

N.A.

OTROS

N.A.

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE INFORMACIÓN:

N.A.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN:

N.A.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

N.A.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:

N.A.

FORMATO			idu
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CODIGO	CÓDIGO	VERSIÓN	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
PROGRAMA APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO:			
N.A.			
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD			
N.A.			
LISTA DE CHEQUEO			
N.A.			
OTROS			
<p>La profesional social de Interventoría menciona los siguientes aspectos en el seguimiento del Componente social:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desde la gestión documental del área social se tienen aprobados informes semanales 52, 53 y 54. En lo referente a aprobación informe mensuales se tiene ya aprobado hasta el informe número 12 versión 2 entregados a la entidad pero aprobados se tiene hasta el informe número 11 entonces para qué sólo restaría ese informe número 12 versión 2. En el programa de servicio de atención a la ciudadanía en el punto Iru está en funcionamiento con normalidad, no se ha presentado ninguna novedad para su atención. En cuanto al programa de información para el proyecto, está la verificación de los tres PSI ubicados en la estancia sin ninguna novedad alguna hasta la fecha. En cuanto al programa de cultura ciudadana, acciones de formación a empleados de obra, se ha realizado la capacitación número 12 sobre la proactividad e iniciativa de la labor que cada uno de los colaboradores ayuda en el proyecto. En cuanto a el funcionamiento de la plataforma Bachue, el reporte del área social es que esta plataforma está funcionando apropiadamente, no se han tenido inconvenientes para el recargue de la información correspondiente. Y por último, el programa referente al acompañamiento de actividades técnicas de obra, se tiene la aprobación de tres actas de vecindad de cierre. Se menciona acerca de las visitas técnicas y sociales de contratista interventorial al predio de La Victoria, en el predio de la calle número 1 Sur 13 12 Este, en el cual se pudo verificar lo referente al estado del muro que colimba con el predio que se va a demoler, en el que es muy probable que se afecte el muro con las demoliciones que se deben adelantar. 			
DECISIONES TOMADAS			
N.A.			
VARIOS			
N.A.			
DECISIONES TOMADAS			
N.A.			
SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA			
* Informe Semanal			
N.A.			
* Informe Mensual			
N.A.			
* Otros Informes			
N.A.			

FORMATO			
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
CODIGO	CÓDIGO	VERSIÓN	
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
* Facturación			
N.A.			
* Legal			
N.A.			
DECISIONES TOMADAS			
N.A.			
VI. COMPROMISOS PACTADOS			
No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1			
2			
3			
ANEXOS DEL ACTA			
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios	
1			
VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
FECHA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">23</div> <small>DÍA</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div> <small>MES</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2025</div> <small>AÑO</small>
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p>			
<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></div> <small>(Día en letras)</small>	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></div> <small>(Día en números)</small>	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></div> <small>(Mes en que se firma el acta)</small>	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></div> <small>(Año de firma del acta)</small>
<small>(Firma)</small> <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 300px;"></div>			
<small>(Nombre)</small> <div style="text-align: center;"> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div>			
NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.			
<small>Original : Expediente de ORFEO No. _____</small> <small>1ra copia : Interventor.</small> <small>2da copia : Contratista.</small>			

LISTADO ASISTENCIA COMITÉ INTEGRAL No. 25					
MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	CARGO	No. DOCUMENTO	CORREO ELECTRONICO
4/25/2025 15:52:05	Jairo Ortiz	Interventoría	Director Interventoría	79719870	direcciontecnica@grupometrocolombia.com
4/25/2025 15:42:47	Diana Marcela Velásquez Muñoz	Infraestructura Integral	Residente SST	53008087	sstinfracintegral1711@gmail.com
4/25/2025 15:41:51	Laura Valentina Leon Beltrán	1711 2023	Profesional Auxiliar social	1015468800	gestionsocial1711@gmail.com
4/25/2025 15:18:30	Mauricio Pombo	IDU	Profesional especializado	79524348	mauricio.pombo@idu.gov.co
4/25/2025 15:18:22	Daniel Antonio Manotas Valencia	IDU-OGA	Apoyo supervision contrato de interventoria	80912524	daniel.manotas@idu.gov.co
4/25/2025 15:16:49	LEIDY JOHANA QUIROGA LASSO	IDU	PROFESIONAL DE APOYO SST	1075540047	LEIDY.QUROGA@IDU.GOV.CO
4/25/2025 15:16:11	Alejandro Cortés	Contratista Infraestructura Integral	Residente de Obra	1053798159	demoliciones1711@gmail.com
4/25/2025 15:14:01	Helena Gómez Sierra	Consortio Infraestructura	Bióloga	51964358	hgs.biologa@gmail.com
4/25/2025 15:12:50	mónica alejandra granados rodríguez	IDU-OGA	Apoyo supervisión ambiental	52214307	monica.granados@idu.gov.co
4/25/2025 14:53:22	Noemi Moreno	Metrocolombia	Bióloga	52981857	noemisa7@gmail.com
4/25/2025 14:42:59	Brayan Steven Arango Cruz	Infraestructura integral sas	residente ambiental	1030654429	ambiental.integral1711@gmail.com
4/25/2025 14:39:22	Andrés Felipe Arboleda	Interventoría	Ingeniero Auxiliar	1030654006	interventoriademoliciones1757@gmail.com
4/25/2025 14:39:18	ANDRÉS BANDERA PÁEZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1013676065	interventoriademoliciones1757@gmail.com
4/25/2025 14:34:40	Loly Vanegas	Consortio Metro Cinco	Residente Ambiental	52853531	desarrollosostenible1757@gmail.com

CÓDIGO FO-ED-48		FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA 1 PROCESO Construcción de Proyectos													VERSION 1.0		idu			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL					GESTIÓN DE SUELO Y VALOR										
ACTA No	18	DE	RECIBO PARCIAL DE OBRA	No.	13	CORRESPONDIENTE AL PERIODO					1/04/2025 <small>Fecha inicio del periodo</small>		AL	30/04/2025 <small>Fecha fin del periodo</small>						
CONTRATO No					IDU 1711-2023 <small>(Número de Contrato)</small>					ETAPA/FASE										
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	11.022	\$71.607	\$	789.245.166			\$-	-	5.242,79	-\$375.420.178	5.779,11	\$413.824.988	432,00	\$	30.934.224	3.099	\$	221.890.759
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	8.000	\$83.668	\$	669.344.000	+	353,64	\$29.588.352	-	4.862,31	-\$406.819.589	3.137,69	\$262.524.411	415,70	\$	34.780.788	3.166	\$	264.866.951
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	4.591	\$51.857	\$	238.075.487			\$-	-	3.000,00	-\$155.571.000	1.591,00	\$82.504.487		\$	-	256	\$	13.275.392
1,07	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	3.420	\$35.801	\$	122.439.420			\$-	-	2.000,00	-\$71.602.000	1.420,00	\$50.837.420		\$	-	-	\$	-
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M3	467	\$50.227	\$	23.456.009			\$-	-		\$-	467,00	\$23.456.009		\$	-	-	\$	-
1,09	DEMOLICIÓN MUROS e=0.15m (Incluye cargue)	M2	312	\$22.375	\$	6.981.000			\$-	-		\$-	312,00	\$6.981.000	-	\$	-	-	\$	-
1,10	DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue)	M2	312	\$31.563	\$	9.847.656			\$-	233,80		\$7.379.429	545,80	\$17.227.085	-	\$	-	546	\$	17.227.085
1,11	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	312	\$85.993	\$	26.829.816			\$-	-		\$-	312,00	\$26.829.816	-	\$	-	160	\$	13.758.880
1,12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	374	\$92.257	\$	34.504.118			\$-	-		\$-	374,00	\$34.504.118		\$	-	-	\$	-
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	2.909	\$26.060	\$	75.808.540			\$-	-	703,52	-\$18.333.783	2.205,48	\$57.474.757	-	\$	-	776	\$	20.217.348
2	CERRAMIENTO																			
2,01	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA BLANCA 3 MANOS 60 CM, EN LA PARTE SUPERIOR, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DATOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML	1.405	\$86.380	\$	121.369.661			\$-	-		\$-	1.405,07	\$121.369.661		\$	-	99	\$	8.575.975

CODIGO		FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA 1 PROCESO Construcción de Proyectos														VERSION 1.0		idu						
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS						SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL						GESTIÓN DE SUELO Y VALOR												
ACTA No	18	DE	RECIBO PARCIAL DE OBRA	No.	13	CORRESPONDIENTE AL PERIODO						1/04/2025		AL	30/04/2025									
CONTRATO No						IDU 1711-2023						ETAPA/FASE												
2.02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)					ML	500	\$54.695	\$	27.347.500				\$-	11.000,00	\$601.645.000	11.500,00	\$628.992.500	503,50	\$	27.538.933	9.447	\$	516.709.135
2.03	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTACIÓN CICLOPEA DE 0.35 M X 0.35 M Y VIGA DE AMARRE DE 0.12 M X 0.15 M Y COLUMNETAS DE 0.20 M X 0.12 M., CADA 3.50 M., ENTRE SÍ. INCLUYE TODOS LOS REFUERZOS EN HIERRO NECESARIOS.					ML	90	\$219.325	\$	19.739.250				\$-	-	90,00	-\$19.739.250	-	\$-	\$	-	-	\$	-
2.04	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PÚAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.					ML	200	\$418.406	\$	83.681.200				\$-	-	\$-	200,00	\$83.681.200		\$	-	-	\$	-
2.05	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (Referencia: PI-16. Incluye Suministro y Construcción)					M2	42	\$89.491	\$	3.758.622				\$-	-	42,00	-\$3.758.622	-	\$-	\$	-	-	\$	-
2.06	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN CONCRETO CON SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM, EXCAVACIÓN, VIGA DE PISO (0.45 M X 0.20 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN					ML	20	\$3.740.148	\$	74.802.960	-			\$-	-	20,00	-\$74.802.960	-	\$-	\$	-	-	\$	-
2.07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.					M2	206	\$43.960	\$	9.055.760				\$-		128,00	\$5.626.880	334,00	\$14.682.640	\$	-	334	\$	14.682.640
2.08	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CONSTRUCCIÓN)					UN	32	\$58.124	\$	1.859.968				\$-	-	32,00	-\$1.859.968	-	\$-	\$	-	-	\$	-
2.09	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, transporte e Instalación).					ML	68	\$153.494	\$	10.437.592				\$-	-	68,00	-\$10.437.592	-	\$-	\$	-	-	\$	-
2.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN					M2	104	\$418.406	\$	43.514.224				\$-	-	\$-	104,00	\$43.514.224		\$	-	-	\$	-
2.11	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO ALTURA 2.00 M FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, DE 4.75 MM DE					UN	104	\$335.420	\$	34.883.680				\$-	-	104,00	-\$34.883.680	-	\$-	\$	-	-	\$	-
2.12	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					ML	276	\$990.114	\$	273.271.464				\$-	-	120,00	-\$118.813.680	156,00	\$154.457.784	\$	-	-	\$	-
2.13	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).					ML	2.753	\$10.411	\$	28.661.483				\$-	-	2.753,00	-\$28.661.483	-	\$-	\$	-	-	\$	-

CÓDIGO FO-EQ-49		FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA 1 PROCESO Construcción de Proyectos															VERSION 1.0		idu			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS				SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL										GESTIÓN DE SUELO Y VALOR								
ACTA No	18	DE	RECIBO PARCIAL DE OBRA	No.	13	CORRESPONDIENTE AL PERIODO					1/04/2025		AL	30/04/2025								
CONTRATO No				IDU 1711-2023					ETAPA/FASE													
2,14	POLISOMBRA CERRAMIENTO. INSTALACION.	VERDE	PARA E	ML	5.309	\$3.106	\$	16.489.754			\$-	-	\$-	5.309,00	\$16.489.754	\$	-	-	\$			
2,15	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL. INCLUYE VARA MADERA ROLLIZA H=1.22 m, LISTÓN DE MADERA, TELA COLOR BLANCO, ESPUMA DE POLIETILENO e=5 mm (Incluye suministro y colocación).			ML	850	\$57.629	\$	48.984.650			\$-	-	850,00	-\$48.984.650	-	\$-	\$	-	-	\$	-	
3	ACABADOS																					
3,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (Incluye suministro e instalación)			M2	175	\$9.761	\$	1.708.175			\$-	-	\$-	175,00	\$1.708.175	\$	-	-	\$	-		
3,02	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			M2	519	\$17.922	\$	9.301.518			\$-	-	\$-	519,00	\$9.301.518	\$	-	-	\$	-		
3,03	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)			M2	156	\$67.589	\$	10.543.884			\$-	-	\$-	156,00	\$10.543.884	\$	-	-	\$	-		
3,04	PISO EN ADOQUÍN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)			M2	156	\$85.405	\$	13.323.180			\$-	-	\$-	156,00	\$13.323.180	\$	-	-	\$	-		
3,05	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)			UN	32	\$163.937	\$	5.245.984			\$-	-	\$-	32,00	\$5.245.984	\$	-	-	\$	-		
3,06	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO)			UN	22	\$202.735	\$	4.460.170			\$-	-	\$-	22,00	\$4.460.170	\$	-	-	\$	-		
3,07	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).			M2	1.325	\$10.259	\$	13.590.645			\$-	-	\$-	1.324,75	\$13.590.645	\$	-	288	\$	2.954.592		
3,08	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BASE EN AGUA PARA EXTERIORES)			M2	519	\$9.674	\$	5.020.806			\$-	-	\$-	519,00	\$5.020.806	\$	-	-	\$	-		
3,09	PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).			M2	519	\$10.278	\$	5.334.282			\$-	-	\$-	519,00	\$5.334.282	\$	-	96	\$	986.688		
4	LIMPIEZA																					
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)			M3	2.905	\$46.654	\$	135.539.870	+	1.279,79	\$59.707.323	11.340,79	\$529.093.217	14.246,00	\$664.633.086	1.890,00	\$	88.176.060	14.246	\$	664.632.884	
4,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)			M3	4.153	\$5.205	\$	21.616.365			\$-	-	\$-	4.153,00	\$21.616.365	\$	-	-	\$	-		
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.			M3	2.077	\$36.108,0	\$	74.996.316			\$-	-	2.000,00	-\$72.216.000	77,00	\$2.780.316	\$	-	-	\$	-	
4,04	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN (e=0.1m. Incluye Cargue)			M2	20.764	\$870	\$	18.064.680			\$-		2.020,00	\$1.757.400	22.784,00	\$19.822.080	-	\$	-	22.461	\$	19.541.244
4,05	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.			M3	6.644	\$7.857	\$	52.201.908			\$-		10.323,00	\$81.107.811	16.967,00	\$133.309.719	-	\$	-	16.967	\$	133.309.719
4,06	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS			M2	170.600	\$545	\$	92.977.000			\$-		50.000,00	\$27.250.000	220.600,00	\$120.227.000	-	\$	-	108.652	\$	59.215.411
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.			KG	8.306	\$1.093	\$	9.078.458			\$-		-	\$-	8.306,00	\$9.078.458	\$	-	-	\$	-	

FORMATO		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA 1												VERSION		idu							
CODIGO		PROCESO												1.0									
FO-EQ-48		Construcción de Proyectos																					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS				SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO										GESTIÓN DE SUELO Y VALOR									
				SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL																			
ACTA No		18		DE		RECIBO PARCIAL DE OBRA		No.		13		CORRESPONDIENTE AL PERIODO		1/04/2025		AL		30/04/2025					
CONTRATO No				IDU 1711-2023						ETAPA/FASE													
				<small>(Número de Contrato)</small>																			
4,08	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS, F			KG	9.950	\$1.766	\$	17.571.700	-	-	5.328,67	-\$9.410.437	-	5.328,67	-\$9.410.437	4.621,33	\$8.161.263	\$	-	-	\$	-	
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.			M3	1.246	\$24.753	\$	30.842.238				\$-	189,51	\$4.690.886	1.435,51	\$35.533.124	\$	-	82	\$	2.029.746		
4,10	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO Y GUADUA.			KG	934	\$866	\$	808.844				\$-	-	\$-	934,00	\$808.844	\$	-	-	\$	-		
4,11	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APOYO CON MAQUINARIA. - RECOLECCIÓN POR M3 AFORO No. 1 (Incluye pajarita)			KG	1.077	\$47.606	\$	51.271.662	-	-	1.077,00	-\$51.271.662	-	1.077,00	-\$51.271.662	-	\$-	-	\$	-	-	\$	-
4,12	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ACCESO A MAQUINARIA)			M3	1.246	\$60.680	\$	75.607.280				\$-	14.226,00	\$863.233.680	15.472,00	\$938.840.960	-	\$	-	15.472	\$	938.840.960	
4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.			M3	328	\$37.078	\$	12.161.584				\$-	16.873,11	\$625.621.173	17.201,11	\$637.782.757	-	\$	-	17.201	\$	637.782.757	
4,14	TRANSPORTE DE PETREOS			M3-KM	6.230	\$1.507	\$	9.388.610				\$-	-	\$-	6.230,00	\$9.388.610	\$	-	-	\$	-		
4,15	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE			HR	449	\$150.861	\$	67.736.589	-	-	449,00	-\$67.736.589	-	449,00	-\$67.736.589	-	\$-		-	\$	-		
4,16	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE IDA Y VUELTA			VIAJE	9	\$923.696	\$	8.313.264				\$-	3,00	\$2.771.088	12,00	\$11.084.352	-	\$	-	12	\$	11.084.352	
5	MANTENIMIENTO																						
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).			M2	167.001	\$1.055	\$	176.186.305	+		48.417,30	\$51.080.252		448.417,30	\$473.080.252	615.418,54	\$649.266.556	53.112,00	\$	56.033.160	591.311	\$	623.832.588
5,02	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)			M2	18.272	\$363	\$	6.632.736				\$-	-	\$-	18.272,00	\$6.632.736	\$	-	-	\$	-		
5,03	PODA DE ARBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS)			UN	20	\$183.311	\$	3.666.220				\$-	-	\$-	20,00	\$3.666.220	\$	-	1	\$	183.311		
5,04	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación. Incluye 10cm de Tierra Negra)			M2	623	\$19.193	\$	11.957.239	-	-	623,00	-\$11.957.239	-	623,00	-\$11.957.239	-	\$-	\$	-	-	\$	-	
5,05	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)			M2	2.249	\$223	\$	501.527				\$-	-	\$-	2.249,00	\$501.527	\$	-	-	\$	-		
5,06	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE ANIMALES Y BASURAS, DESINFECTACIÓN CONTRA VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS)			M2	2.492	\$821,00	\$	2.045.932				\$-	-	\$-	2.492,00	\$2.045.932	\$	-	-	\$	-		
5,07	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m. Incluye Desentraíce, Retiro y Disposición Final)			UN	2	\$188.019	\$	376.038				\$-	4,00	\$752.076	6,00	\$1.128.114	\$	-	6	\$	1.128.114		
5,08	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m. Incluye Desentraíce, Retiro y Disposición Final)			UN	2	\$317.133	\$	634.266				\$-	75,00	\$23.784.975	77,00	\$24.419.241	\$	-	77	\$	24.419.241		
5,09	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 20 m. Incluye Desentraíce, Retiro y Disposición Final)			UN	2	\$330.892	\$	661.784				\$-	43,00	\$14.228.356	45,00	\$14.890.140	\$	-	45	\$	14.890.140		

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ESQUEMA 1

PROCESO

Construcción de Proyectos

CODIGO

FO-EO-49

VERSION

1.0

idu

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL

GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

ACTA No

18

DE

RECIBO PARCIAL DE OBRA

No.

13

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

1/04/2025

AL

30/04/2025

CONTRATO No

IDU 1711-2023

ETAPA/FASE

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADAS	ACTUALIZADAS	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
COSTO TOTAL REMUNERACION OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INCLUIDO AIU	\$0	\$ -	\$ -	\$ 7.725.504.184	\$ 322.522.471	\$ 5.834.120.479
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	\$0		\$ -	\$ 7.725.504.184	\$ 322.522.471	\$ 5.834.120.479
COSTO GLOBAL DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL- DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MANEJO DE TRÁFICO	\$393.317.474	\$ -	\$ 519.441.847	\$ 519.441.847	\$ 31.768.171	\$ 484.200.170
COSTO GLOBAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA - INSUMOS - PMA - PMT Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Ver Actas Anexas)	\$91.975.435	\$ -	\$ 393.348.175	\$ 393.348.175	\$ 61.088.267	\$ 310.133.046
COSTO TOTAL MAS AJUSTES	\$485.292.909	\$ -	\$ 912.790.022	\$ 8.638.294.206	\$ 415.378.909	\$ 6.628.453.696
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ -					
VR. PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%				\$ 12.461.368,00	\$ 198.853.614,00
VR. PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 3% DE LA OBRA EJECUTADA	3%				\$ 12.461.367,00	\$ 198.853.614,00
TOTAL A PAGAR					\$	390.456.174
SON:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE					

OBSERVACIONES

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO

(18)

das del mes de

JUNIO

de

2025

YAMIL MONTENEGRO CALDERON

REPRESENTANTE LEGAL

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.

MAURICIO POMBO SANTOS

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORIA CONSORCIO METRO CINCO

NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELO Y VALOR

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 7

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DURANTE



16/04/2025 9:56:03 a. m.
57X-37 Carrera 73i
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

DESPUES




30/04/2025 2:31:00 p. m.
57X-17 Transversal 73i
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) 
(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma) 
(Nombre) **ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma) 
(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original : Interventor.


1ra copia : Contratista.

2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma) 
(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma) 
(Nombre) **JAIRO GEOVANNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma) 
(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 731 57X 48 SUR - 54817

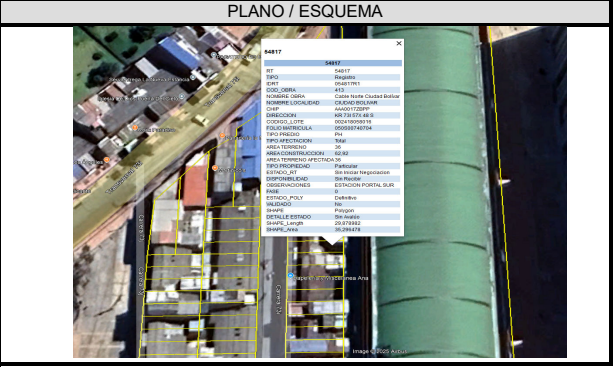
CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 10

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	

DURANTE



16/04/2025 9:56:17 a. m.
57X-58 Carrera 73i
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

DESPUES




OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) 

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma) 


(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma) 


(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.


REVISÓ

(Firma) 

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma) 

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma) 

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTDP

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO					
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."					
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
RECIBO PARCIAL No	<u>13</u>	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	<u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>		
ÍTEM N°	<u> </u>	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM <u>KR 73I 57X 52 SUR - 54818</u>					
CONTRATISTA	<u>INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO METRO CINCO</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	<u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS</u>				
	<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00
PLANO / ESQUEMA		ANTES			
					

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE



DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO					
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."					
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
RECIBO PARCIAL No	<u>13</u>	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	<u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>		
ÍTEM N°	<u> </u>	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM <u>KR 73I 57X 54 SUR - 54819</u>					
CONTRATISTA	<u>INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO METRO CINCO</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	<u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS</u>				
	<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00
PLANO / ESQUEMA		ANTES			
					

FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	

DURANTE



DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Instituto de Desarrollo Urbano</small>		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO					
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."					
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
RECIBO PARCIAL No	<u>13</u>	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	<u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>		
ÍTEM N°	<u>UNIDAD</u>	<u>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</u>			
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 73I 57X 45 SUR - 54855					
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>			
INTERVENTOR		CONSORCIO METRO CINCO <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>			
SUPERVISOR (A)		ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00
PLANO / ESQUEMA		ANTES			
					

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE

30/04/2025 1:21:42 p. m.
Ciudad Bolívar
Bogotá

DESPUES


30/04/2025 2:31:34 p. m.
57X-46 Carrera 731
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)


(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO					
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."					
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
RECIBO PARCIAL No	<u>13</u>	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	<u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>		
ÍTEM N°	<u> </u>	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM <u>KR 731 57X 49 SUR - 54856</u>					
CONTRATISTA	<u>INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO METRO CINCO</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	<u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS</u>				
	<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00
PLANO / ESQUEMA		ANTES			
					

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	

DURANTE



DESPUES




OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) 

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma) 

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma) 


(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.


REVISÓ

(Firma) 

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma) 

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma) 

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTPD

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711

DE 2023

(Número de Contrato)

Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025

HASTA 30/04/2025

ÍTEM N°

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

KR 731 57X 51 SUR - 54857

CONTRATISTA

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

CONSORCIO METRO CINCO

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A)

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2,00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2,00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE



DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)


(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTPD

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 73J 57X 78 SUR - 54838

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE



DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra



(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO					
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."					
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>					
RECIBO PARCIAL No	<u>13</u>	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	<u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>		
ÍTEM N°	<u> </u>	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM <u>KR 73J 57X 76 SUR - 54839</u>					
CONTRATISTA	<u>INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO METRO CINCO</u>				
	<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	<u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS</u>				
	<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00
PLANO / ESQUEMA		ANTES			
					

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Municipio</small> Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	
DURANTE	DESPUES
	
OBSERVACIONES <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	
ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: small;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP </div>

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 731 57X 75 SUR - 54865

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 83.668,00	\$ 3.012.048,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 3.176.133,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES






26 mar 2025 7:57:10 a. m.

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 26

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Municipio</small> Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	
DURANTE	DESPUES
	
OBSERVACIONES	
ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: 0.8em;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP </div>

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 731 57X 79 SUR - 54866

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



26 mar 2025 7:57:10 a. m.

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	





DURANTE



DESPUES



OBSERVACIONES

<p>ELABORÓ</p> <div style="margin-top: 20px;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU</p> </div> <p><small>Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato.</small></p>	<p>REVISÓ</p> <div style="margin-top: 20px;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTPD</p> </div>
---	---

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 731 57X 83 SUR - 54867

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES

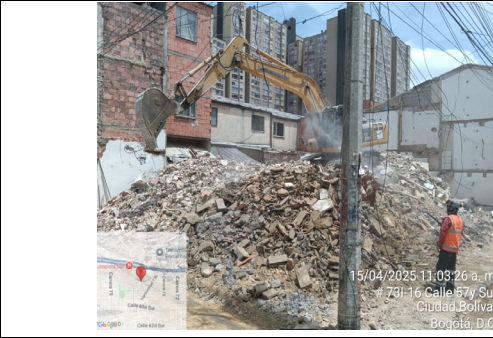


26 mar 2025 7:57:10 a. m.

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	

DURANTE



15/04/2025 11:03:26 a.m.
73-16 Calle 67y Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

DESPUES




OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) 

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma) 


(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma) 


(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.


REVISÓ

(Firma) 

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma) 

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma) 

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTDP

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 731 57X 85 SUR - 54868

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 71.607,00	\$ 2.577.852,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	3,00	\$ 54.695,00	\$ 164.085,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.741.937,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



26 mar 2025 7:57:10 a. m.

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE



09/04/2023 8:51:10 a.m.
577-5 Carrera 73
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

DESPUES




OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría


(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FARIÁN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 73I 57X 87 SUR - 54833

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	36,00	\$ 83.668,00	\$ 3.012.048,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	15,00	\$ 54.695,00	\$ 820.425,00
COSTO TOTAL RT					\$ 3.832.473,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



26 mar 2025 7:57:10 a. m.

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	

DURANTE







14/04/2025 3:19:26 p. m.
731-23 Calle 57 y Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.

DESPUES



OBSERVACIONES

ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: x-small;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP </div>
---	--

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 2 31C 16 SUR - 54321

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	64,00	\$ 83.668,00	\$ 5.354.752,00
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	8,00	\$ 54.695,00	\$ 437.560,00
COSTO TOTAL RT					\$ 5.792.312,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u>	DE <u>2023</u>
(Número de Contrato)	(Año de suscripción)

DURANTE








5/05/2025 11:34:29 a. m.
31C-18 Carrera 2
San Cristóbal
Bogotá, D.C.

DESPUES



OBSERVACIONES

ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 10px;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP </div>
--	---

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TV 731 57X 02 SUR - 54800

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	M2	279,70	\$ 83.668,00	\$ 23.401.940,00
COSTO TOTAL RT					\$ 23.401.940,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 38

FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)


DE 2023
Año de suscripción


DURANTE


DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ




(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Municipio</small> Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	
DURANTE	DESPUES
	
OBSERVACIONES	
ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTD </div>

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM KR 9 51 19 SUR - 47723, 47722, 47721, 47720, 47719

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
2,02	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)	ML	24,50	\$ 54.695,00	\$ 1.340.028,00
COSTO TOTAL RT					\$ 1.340.028,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

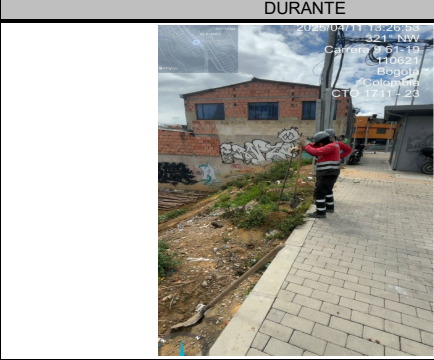
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE



DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
 Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
 Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
 Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
 1ra copia : Contratista.
 2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
 Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
 Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
 Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 **DE** 2023

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

“DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.”

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/04/2025 **HASTA** 30/04/2025

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AK 27 24C 32 - 45650 a 45638

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).	M2	2301,00	\$ 1.055,00	\$ 2.427.555,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.427.555,00

PLANO / ESQUEMA

ANTES

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE



DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.


REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTPD

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

FO-EO-04

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN

1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No

1711

DE

2023

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No

13

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE

1/04/2025

HASTA

30/04/2025

ÍTEM N°

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

CL 55 SUR 82B 81 - 13094

CONTRATISTA

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

CONSORCIO METRO CINCO

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A)

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).	M2	2119,00	\$ 1.055,00	\$ 2.235.545,00
COSTO TOTAL RT					\$ 2.235.545,00




PLANO / ESQUEMA

ANTES

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 46

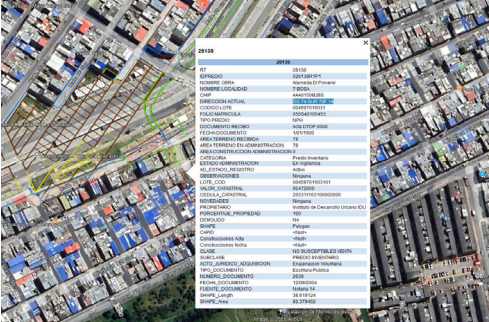
FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	
DURANTE	DESPUES
	
OBSERVACIONES	
ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: 0.8em;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTD </div>

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción)</small>	
OBJETO DEL CONTRATO	
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C"	
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>	
RECIBO PARCIAL No <u>13</u>	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE <u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>
ÍTEM N° _____	UNIDAD _____ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA _____
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DG 74 SUR 78F 14 - 28138
CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>
INTERVENTOR	CONSORCIO METRO CINCO <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>
SUPERVISOR (A)	ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).	M2	78,00	\$ 1.055,00	\$ 82.290,00
COSTO TOTAL RT					\$ 82.290,00

PLANO / ESQUEMA	
	

ANTES	
	

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

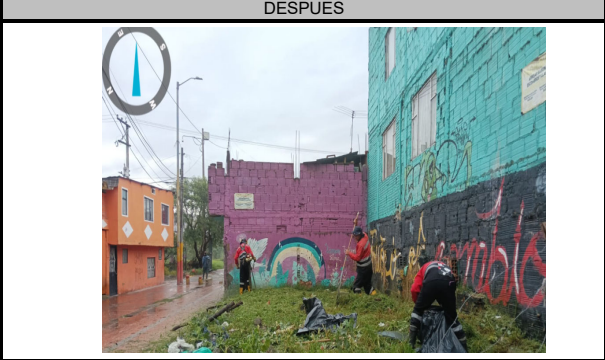
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)


DE 2023
Año de suscripción


DURANTE


DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTPD

FORMATO					
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		VERSIÓN 1.0		

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato)(Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DG 73H SUR 78F 28 - 28143

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA



ANTES



FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

CONTRATO No 1711 **DE** 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DURANTE



DESPUES


OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra


(Firma)

(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

FO-EO-04

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

VERSIÓN

1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No

1711

DE

2023

(Número de Contrato)

Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No

13

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE

1/04/2025

HASTA

30/04/2025

ÍTEM N°

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

AK 96 71A 10 - 11074

CONTRATISTA

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

CONSORCIO METRO CINCO

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A)

ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).	M2	10446,00	\$ 1.055,00	\$ 11.020.530,00
COSTO TOTAL RT					\$ 11.020.530,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u>	DE <u>2023</u>
<small>(Número de Contrato)</small>	<small>Año de suscripción</small>

DURANTE



DESPUES




OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) 

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma) 


(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma) 


(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.


REVISÓ

(Firma) 

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma) 

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma) 

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTDP

FORMATO					
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		VERSIÓN 1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AK 96 70 01 - 6850

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	525,00	\$ 46.654,00	\$ 24.493.350,00
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).	M2	11937,00	\$ 1.055,00	\$ 12.593.535,00
COSTO TOTAL RT					\$ 37.086.885,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES



FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711
(Número de Contrato)

DE 2023
Año de suscripción

DURANTE




DESPUES



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) **ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ**
Residente de Obra

(Firma)


(Nombre) **ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ**
Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS**
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU


Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) **MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA**
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre) **ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ**
Vo.Bo. Técnico DTD

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

DURANTE



5/4/2025 08:36:27 a.m.
4°41'23.521"N 74°7'34.239"W ±1.70m
148° 33'
3°46'52" Calle 253
Bogotá, D.C.
Altitud: 2776 Sm
Velocidad: 0 Km/h

DESPUES



5/04/2025 10:39:28 a. m.
4°40'57,162"N 74°7'37,362"W ±1.70m
153° S
Cra. 96 Bis B #25c-81, Bogotá, Colombia

OBSERVACIONES

ELABORÓ

REVISÓ

(Firma)

(Nombre)

Alejandro Cortés

ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Andrés Julian Bandera Páez

ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ

Residente de Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Arq. Mauricio Pombo Santos

ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS

Apoyo Técnico a la Supervisión IDU

Original

1ra copia

2da copia

: Interventor.

: Contratista.

: Dependencia responsable del contrato.

(Firma)

(Nombre)

Mónica Jimena Guerra Vergara

MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA

Director de Obra

(Firma)

(Nombre)

Jairo Geovanni Ortiz

JAIRO GEOVENNI ORTIZ

Director de Interventoría

(Firma)

(Nombre)

Arq. Nelson Fabian Cepeda Alvarez

ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ

Vo.Bo. Técnico DTPD

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 57

FORMATO				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0		

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 1711 DE 2023
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025

ÍTEM N° UNIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AC 22 96 03 - 11319

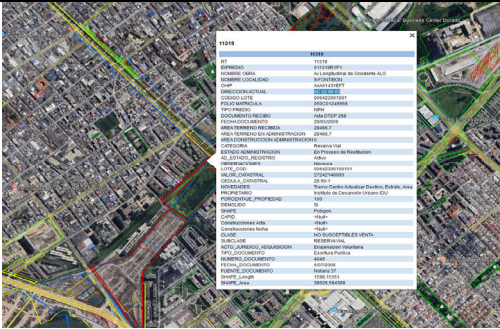
CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	325,00	\$ 46.654,00	\$ 15.162.550,00
COSTO TOTAL RT					\$ 15.162.550,00

PLANO / ESQUEMA



ANTES








FORMATO			 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano</small>
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	

DURANTE	DESPUES
	

OBSERVACIONES

ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTD </div>
---	---

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0		




SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO				
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato)</small> <small>Año de suscripción)</small>				
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C." </div> <div style="text-align: right; font-size: small;">(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</div>				
RECIBO PARCIAL No <u>13</u> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE <u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>				
ÍTEM N°	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Interseccion Av Jorge Gaitan Cortes por Av General Santander - 9290				
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS		
INTERVENTOR		CONSORCIO METRO CINCO		
SUPERVISOR (A)		ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS		
(Escriba el nombre o razón social del contratista) (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)				




ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	V/UNIT	TOTAL ITEM
4,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).	M3	455,00	\$ 46.654,00	\$ 21.227.570,00
COSTO TOTAL RT					\$ 21.227.570,00




PLANO / ESQUEMA	
	

ANTES	
	

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Municipio</small> Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	
DURANTE	DESPUES
	
OBSERVACIONES	
ELABORÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	REVISÓ <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div> <small>(Firma)</small>  <small>(Nombre)</small> ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP </div>

FORMATO			MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano				
CÓDIGO FO-EO-04		PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS			VERSIÓN 1.0					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO										
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
CONTRATO No 1711			DE 2023							
(Número de Contrato)			(Año de suscripción)							
OBJETO DEL CONTRATO										
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C"										
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)										
RECIBO PARCIAL No 13			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025			HASTA 30/04/2025				
ÍTEM N° 1,04			UNIDAD M2			ESPECIFICACIÓN TÉCNICA				
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM										
DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.										
CONTRATISTA			INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS							
(Escriba el nombre o razón social del contratista)										
INTERVENTOR			CONSORCIO METRO CINCO							
(Escriba el nombre o razón social del interventor)										
SUPERVISOR (A)			ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS							
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)										
UBICACIÓN						LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
KR 73I 57X 46 SUR - 54816								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 48 SUR - 54817								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 52 SUR - 54818								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 54 SUR - 54819								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 45 SUR - 54855								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 49 SUR - 54856								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 51 SUR - 54857								36,00	1,00	36,00
KR 73J 57X 78 SUR - 54838								36,00	1,00	36,00
KR 73J 57X 76 SUR - 54839								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 79 SUR - 54866								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 83 SUR - 54867								36,00	1,00	36,00
KR 73I 57X 85 SUR - 54868								36,00	1,00	36,00
										0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA										432,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES										
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO										
TOTAL POR EJECUTAR										
FOTOGRAFIA						FOTOGRAFIA				
										
OBSERVACIONES										
ELABORÓ						REVISÓ				
										
(Firma)						(Firma)				
(Nombre) ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ						(Nombre) MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA				
Residente de Obra						Director de Obra				
										
(Firma)						(Firma)				
(Nombre) ANDRÉS JULIÁN BANDERA PÁEZ						(Nombre) JAIRO GEOVANNI ORTIZ				
Residente de Interventoría						Director de Interventoría				
										
(Firma)						(Firma)				
(Nombre) ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS						(Nombre) ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ				
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU						Vo.Bo. Técnico DTDP				
Original : Interventor.										
Fotocopia : Contratista.										
Toda copia : Dependencia responsable del contrato.										

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano																																																																				
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA																																																																							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																																																																					
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0																																																																					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																																							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																					
CONTRATO No 1711 DE 2023																																																																							
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO																																																																							
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.																																																																							
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																																																																							
RECIBO PARCIAL No 13	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1/04/2025 HASTA 30/04/2025																																																																						
ÍTEM N° 1,05	UNIDAD M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA																																																																					
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM																																																																							
DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.																																																																							
CONTRATISTA		INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																																																																					
INTERVENTOR		CONSORCIO METRO CINCO																																																																					
SUPERVISOR (A)		ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS																																																																					
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>UBICACIÓN</th> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>AREA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KR 731 57X 75 SUR - 54865</td> <td></td> <td></td> <td>36,00</td> <td>1,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>KR 731 57X 87 SUR - 54833</td> <td></td> <td></td> <td>36,00</td> <td>1,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>KR 2 31C 16 SUR - 54321</td> <td></td> <td></td> <td>64,00</td> <td>1,00</td> <td>64,00</td> </tr> <tr> <td>TV 731 57X 02 SUR - 54800</td> <td></td> <td></td> <td>279,70</td> <td>1,00</td> <td>279,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</td> <td>415,70</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL POR EJECUTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL	KR 731 57X 75 SUR - 54865			36,00	1,00	36,00	KR 731 57X 87 SUR - 54833			36,00	1,00	36,00	KR 2 31C 16 SUR - 54321			64,00	1,00	64,00	TV 731 57X 02 SUR - 54800			279,70	1,00	279,70						0,00						0,00	TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					415,70	TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						TOTAL POR EJECUTAR					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL																																																																		
KR 731 57X 75 SUR - 54865			36,00	1,00	36,00																																																																		
KR 731 57X 87 SUR - 54833			36,00	1,00	36,00																																																																		
KR 2 31C 16 SUR - 54321			64,00	1,00	64,00																																																																		
TV 731 57X 02 SUR - 54800			279,70	1,00	279,70																																																																		
					0,00																																																																		
					0,00																																																																		
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					415,70																																																																		
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES																																																																							
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO																																																																							
TOTAL POR EJECUTAR																																																																							
FOTOGRAFIA			FOTOGRAFIA																																																																				
 <p style="font-size: x-small; text-align: center;">14/04/2025 3:19:26 p.m. # 731-23 Calle 57y Sur Ciudad Bolívar Bogotá, D.C.</p>			 <p style="font-size: x-small; text-align: center;">14/04/2025 3:51:30 p.m. # 57 y 5 Carrera 73 Ciudad Bolívar Bogotá, D.C.</p>																																																																				
OBSERVACIONES																																																																							
ELABORÓ			REVISÓ																																																																				
(Firma)  (Nombre) ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra			(Firma)  (Nombre) MONICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra																																																																				
(Firma)  (Nombre) ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría			(Firma)  (Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría																																																																				
(Firma)  (Nombre) ARO. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU			(Firma)  (Nombre) ARO. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP																																																																				
Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato.																																																																							

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>			
OBJETO DEL CONTRATO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."			
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
RECIBO PARCIAL No	<u>13</u>	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	<u>1/04/2025</u> HASTA <u>30/04/2025</u>
ÍTEM N°	<u>2,02</u>	UNIDAD	<u>ML</u> ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			
CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)			
CONTRATISTA	<u>INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS</u>		
	<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>		
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO METRO CINCO</u>		
	<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>		
SUPERVISOR (A)	<u>ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS</u>		
	<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>		

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
KR 73I 57X 46 SUR - 54816	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 48 SUR - 54817	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 52 SUR - 54818	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 54 SUR - 54819	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 45 SUR - 54855	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 49 SUR - 54856	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 51 SUR - 54857	3,00			1,00	3,00
KR 73J 57X 78 SUR - 54838	3,00			1,00	3,00
KR 73J 57X 76 SUR - 54839	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 75 SUR - 54865	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 79 SUR - 54866	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 83 SUR - 54867	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 85 SUR - 54868	3,00			1,00	3,00
KR 73I 57X 87 SUR - 54833	15,00			1,00	15,00
KR 2 31C 16 SUR - 54321	8,00			1,00	8,00
AC 170 54D 02 - 8388, 8387, 8386, 8385	417,00			1,00	417,00
KR 9 51 19 SUR - 47723, 47722, 47721, 47720, 47719	24,50			1,00	24,50
	0,00			1,00	0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					503,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

FOTOGRAFÍA





FOTOGRAFÍA





FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	Ejecución de Obras	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No <u>1711</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">FOTOGRAFÍA</div>  <p style="font-size: small; text-align: right;">30/04/2025 2:31:34 p. m. # 57X-48 Carrera 73i Ciudad Bolívar Bogotá, D.C.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">FOTOGRAFÍA</div> 
OBSERVACIONES	

ELABORÓ	REVISÓ
<div style="text-align: center;">  (Firma) (Nombre) ALEJANDRO CORTÉS PÁEZ Residente de Obra </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  (Firma) (Nombre) ANDRÉS JULIAN BANDERA PÁEZ Residente de Interventoría </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  (Firma) (Nombre) ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 10px;"> Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato. </div>	<div style="text-align: center;">  (Firma) (Nombre) MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  (Firma) (Nombre) JAIRO GEOVANNI ORTIZ Director de Interventoría </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  (Firma) (Nombre) ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP </div>

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Instituto de Desarrollo Urbano</small>																																																								
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0																																																									
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																											
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 2023																																																									
CONTRATO No 1711 DE _____ <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>																																																											
OBJETO DEL CONTRATO																																																											
"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."																																																											
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesiva)</small>																																																											
RECIBO PARCIAL No	13	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE M3	1/04/2025 HASTA 30/04/2025																																																								
ÍTEM N°	4,01	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA																																																								
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)																																																											
CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																																																											
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>																																																											
INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO																																																											
<small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>																																																											
SUPERVISOR (A) ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS																																																											
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (si delega (a) por el IDU)</small>																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">UBICACIÓN</th> <th style="width: 10%;">LARGO</th> <th style="width: 10%;">ANCHO</th> <th style="width: 10%;">M3</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC 22 96 03 - 11319</td> <td></td> <td></td> <td>325,00</td> <td>1,00</td> <td>325,00</td> </tr> <tr> <td>AC 170 54 17 - 8388</td> <td></td> <td></td> <td>585,00</td> <td>1,00</td> <td>585,00</td> </tr> <tr> <td>Interseccion Av Jorge Gaitan Cortes por Av General Santander - 9290</td> <td></td> <td></td> <td>455,00</td> <td>1,00</td> <td>455,00</td> </tr> <tr> <td>AK 96 70 01 - 6850</td> <td></td> <td></td> <td>525,00</td> <td>1,00</td> <td>525,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</td> <td>1890,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL POR EJECUTAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	M3	CANTIDAD	TOTAL	AC 22 96 03 - 11319			325,00	1,00	325,00	AC 170 54 17 - 8388			585,00	1,00	585,00	Interseccion Av Jorge Gaitan Cortes por Av General Santander - 9290			455,00	1,00	455,00	AK 96 70 01 - 6850			525,00	1,00	525,00	TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1890,00	TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						TOTAL POR EJECUTAR					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	M3	CANTIDAD	TOTAL																																																						
AC 22 96 03 - 11319			325,00	1,00	325,00																																																						
AC 170 54 17 - 8388			585,00	1,00	585,00																																																						
Interseccion Av Jorge Gaitan Cortes por Av General Santander - 9290			455,00	1,00	455,00																																																						
AK 96 70 01 - 6850			525,00	1,00	525,00																																																						
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1890,00																																																						
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES																																																											
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO																																																											
TOTAL POR EJECUTAR																																																											
FOTOGRAFIA 			FOTOGRAFIA 																																																								
OBSERVACIONES																																																											
ELABORÓ (Firma)  (Nombre) ALEJANDRO CORTES PAEZ Residente de Obra			REVISÓ (Firma)  (Nombre) MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra																																																								
(Firma)  (Nombre) ANDRÉS JULIAN BANDERA PAEZ Residente de Interventoría			(Firma)  (Nombre) JAIRO GEOVANNI ORTIZ Director de Interventoría																																																								
(Firma)  (Nombre) ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU			(Firma)  (Nombre) ARQ. NELSON FARFÁN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTPD																																																								
Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato.																																																											

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Municipio</small> Desarrollo Urbano																																																																																
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0																																																																																	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																																																																																			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 2023																																																																																	
CONTRATO No 1711		DE																																																																																	
<small>(Número de Contrato)</small>		<small>(Año de suscripción)</small>																																																																																	
OBJETO DEL CONTRATO "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."																																																																																			
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>																																																																																			
RECIBO PARCIAL No	13	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE M2	1/04/2025																																																																																
		HASTA	30/04/2025																																																																																
ÍTEM N°	5,01	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA																																																																																
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM																																																																																			
CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS).																																																																																			
CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS																																																																																		
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>																																																																																			
INTERVENTOR	CONSORCIO METRO CINCO																																																																																		
<small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>																																																																																			
SUPERVISOR (A)	ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS																																																																																		
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>UBICACIÓN</th> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>M2</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AK 27 24C 32 - 45650 a 45638</td><td></td><td></td><td>2301,00</td><td>1,00</td><td>2301,00</td></tr> <tr><td>CL 55 SUR 82B 81 - 13094</td><td></td><td></td><td>2119,00</td><td>1,00</td><td>2119,00</td></tr> <tr><td>DG 74 SUR 78F 14 - 28138</td><td></td><td></td><td>78,00</td><td>1,00</td><td>78,00</td></tr> <tr><td>DG 73H SUR 78F 28 - 28143</td><td></td><td></td><td>70,00</td><td>1,00</td><td>70,00</td></tr> <tr><td>AK 96 71A 10 - 11074</td><td></td><td></td><td>10446,00</td><td>1,00</td><td>10446,00</td></tr> <tr><td>AK 96 70 01 - 6850</td><td></td><td></td><td>11937,00</td><td>1,00</td><td>11937,00</td></tr> <tr><td>AK 96 24C 43 - 11277 a 11126</td><td></td><td></td><td>26161,00</td><td>1,00</td><td>26161,00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td colspan="5">TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</td><td>53112,00</td></tr> <tr><td colspan="5">TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">TOTAL EJECUTADO ACUMULADO</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">TOTAL POR EJECUTAR</td><td></td></tr> </tbody> </table>						UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	M2	CANTIDAD	TOTAL	AK 27 24C 32 - 45650 a 45638			2301,00	1,00	2301,00	CL 55 SUR 82B 81 - 13094			2119,00	1,00	2119,00	DG 74 SUR 78F 14 - 28138			78,00	1,00	78,00	DG 73H SUR 78F 28 - 28143			70,00	1,00	70,00	AK 96 71A 10 - 11074			10446,00	1,00	10446,00	AK 96 70 01 - 6850			11937,00	1,00	11937,00	AK 96 24C 43 - 11277 a 11126			26161,00	1,00	26161,00						0,00	TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					53112,00	TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						TOTAL POR EJECUTAR					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	M2	CANTIDAD	TOTAL																																																																														
AK 27 24C 32 - 45650 a 45638			2301,00	1,00	2301,00																																																																														
CL 55 SUR 82B 81 - 13094			2119,00	1,00	2119,00																																																																														
DG 74 SUR 78F 14 - 28138			78,00	1,00	78,00																																																																														
DG 73H SUR 78F 28 - 28143			70,00	1,00	70,00																																																																														
AK 96 71A 10 - 11074			10446,00	1,00	10446,00																																																																														
AK 96 70 01 - 6850			11937,00	1,00	11937,00																																																																														
AK 96 24C 43 - 11277 a 11126			26161,00	1,00	26161,00																																																																														
					0,00																																																																														
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					53112,00																																																																														
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES																																																																																			
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO																																																																																			
TOTAL POR EJECUTAR																																																																																			
FOTOGRAFIA			FOTOGRAFIA																																																																																
																																																																																			
OBSERVACIONES																																																																																			
ELABORÓ			REVISÓ																																																																																
(Firma)  (Nombre) ALEJANDRO CORTES PAEZ Residente de Obra			(Firma)  (Nombre) MONICA JIMENA GUERRA VERGARA Director de Obra																																																																																
(Firma)  (Nombre) ANDRES JULIAN BANDERA PAEZ Residente de Interventoría			(Firma)  (Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ Director de Interventoría																																																																																
(Firma)  (Nombre) ARQ. MAURICIO POMBO SANTOS Apoyo Técnico a la Supervisión IDU			(Firma)  (Nombre) ARQ. NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ Vo.Bo. Técnico DTDP																																																																																
Original : Interventor. 1ra copia : Contratista. 2da copia : Dependencia responsable del contrato.																																																																																			

CERTIFICACIÓN

ECOBANO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ			
328461	2025-04-02	Aseo de 1 baño (592)	Luis Mora Leon NHQ141
328790	2025-04-07	Aseo de 1 baño (592)	Luis Miguel Cobos SMY324
329126	2025-04-10	Aseo de 1 baño (592)	Luis Miguel Cobos SMY324
329433	2025-04-14	Aseo de 1 baño (592)	Luis Miguel Cobos SMY324
329773	2025-04-16	Aseo de 1 baño (592)	Luis Miguel Cobos SMY324
330079	2025-04-21	Aseo de 1 baño (592)	Luis Miguel Cobos SMY324
330324	2025-04-24	Aseo de 1 baño (592)	Luis Miguel Cobos SMY324
330630	2025-04-28	Aseo de 1 baño (592)	Luis Miguel Cobos SMY324

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de mayo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: [601 674-7660](tel:601-674-7660) • Cel: [320 234-9898](tel:320-234-9898)

CERTIFICACIÓN

ECOBANO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
CL 87 CON CR102, BOGOTÁ			
328428	2025-04-02	Aseo de 1 baño (144L)	Luis Mora Leon NHQ141
328753	2025-04-08	Aseo de 1 baño (144L)	Luis Mora Leon NHQ141
329409	2025-04-14	Aseo de 1 baño (144L)	Reynis Herrera EQQ458
329732	2025-04-15	Aseo de 1 baño (144L)	Gilberto Beleño WLM415
330054	2025-04-21	Aseo de 1 baño (144L)	Carlos Cárdena WOY319
330404	2025-04-24	Aseo de 1 baño (144L)	Luis Miguel Cobos SMY324
330732	2025-04-28	Aseo de 1 baño (144L)	Luis Miguel Cobos SMY324

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de mayo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: [601 674-7660](tel:601-674-7660) • Cel: [320 234-9898](tel:320-234-9898)

CERTIFICACIÓN

ECOBANO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ			
328466	2025-04-03	Aseo de 1 baño (480)	Luis Mora Leon NHQ141
328787	2025-04-07	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324
329122	2025-04-10	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324
329414	2025-04-14	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324
329744	2025-04-16	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324
330060	2025-04-21	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324
330315	2025-04-24	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324
330632	2025-04-28	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de mayo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: [601 674-7660](tel:601-674-7660) • Cel: [320 234-9898](tel:320-234-9898)

CERTIFICACIÓN

ECOBANO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
CRA 96 CON CL 74A, BOGOTÁ			
328176	2025-04-02	Aseo de 1 baño (145L)	Gilberto Beleño TGV665
328837	2025-04-08	Aseo de 1 baño (145L)	Luis Miguel Cobos SMY324
329171	2025-04-11	Aseo de 1 baño (145L)	Luis Mora Leon NHQ141

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de mayo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco

Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS

email: comercial@ecobano.com.co

Tel: [601 674-7660](tel:6016747660) • Cel: [320 234-9898](tel:3202349898)

CERTIFICACIÓN

ECOBANO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ			
328097	2025-04-01	Aseo de 1 baño (271)	Carlos Cárdena WOY319
328432	2025-04-03	Aseo de 1 baño (271)	Reynis Herrera EQQ458
328751	2025-04-08	Aseo de 1 baño (271)	Luis Miguel Cobos SMY324
329404	2025-04-14	Aseo de 1 baño (271)	Reynis Herrera EQQ458
329736	2025-04-15	Aseo de 1 baño (271)	Gilberto Beleño WLM415
330053	2025-04-21	Aseo de 1 baño (271)	Carlos Cárdena WOY319
330405	2025-04-24	Aseo de 1 baño (271)	Reynis Herrera EQQ458

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de mayo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: [601 674-7660](tel:601-674-7660) • Cel: [320 234-9898](tel:320-234-9898)

CERTIFICACIÓN

ECOBANO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por CONSORCIO INFRADEMOL TRONCALES identificada con NI 901496627 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
TV. 73I #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ			
328448	2025-04-03	Aseo de 1 baño (755)	Luis Mora Leon NHQ141
328796	2025-04-07	Aseo de 1 baño (755)	Luis Miguel Cobos SMY324
329133	2025-04-10	Aseo de 1 baño (755)	Luis Miguel Cobos SMY324
329437	2025-04-14	Aseo de 1 baño (755)	Luis Miguel Cobos SMY324
329775	2025-04-16	Aseo de 1 baño (755)	Luis Miguel Cobos SMY324
330081	2025-04-21	Aseo de 1 baño (755)	Luis Miguel Cobos SMY324
330316	2025-04-24	Aseo de 1 baño (755)	Luis Miguel Cobos SMY324

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de mayo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: [601 674-7660](tel:601-674-7660) • Cel: [320 234-9898](tel:320-234-9898)

NI 830,085,399-9

Cliente: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS****Nº330630** CONTACTO: **VANESSA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/28/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/28/2025 15:24:28		Exitoso	HÉCTOR GARZON	<i>Hector Garzon</i>

Nº330324 CONTACTO: **VANESSA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/24/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/24/2025 17:05:40		Exitoso	HECTOR GARZÓN	<i>Hector Garzon</i>

Nº330079 CONTACTO: **VANESSA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/21/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/21/2025 16:59:17		Exitoso	NIDIA MARTÍNEZ	<i>Nidia Martinez</i>

Nº329773 CONTACTO: **VANESSA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/16/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/16/2025 15:26:44		Exitoso	HECTOR GARZON	

Nº329433 CONTACTO: **VANESSA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/14/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/14/2025 15:28:24		Exitoso	HECTOR GARZON	<i>Hector Garzon</i>

Nº329126 CONTACTO: **VANESSA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/10/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/10/2025 06:43:25		Exitoso	HECTOR GARZON	<i>Hector Garzon</i>

NI 830,085,399-9

Nº328790 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/07/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/07/2025 10:58:41	Operario: ESTE BANO YA NO SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DONDE SE LE HIZO EL ASEO ANTERIORMENTE LA SEÑORITA DIANA MUÑOZ INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN BOSA	No hay personal del cliente		
Luis Miguel Cobos SMY324	04/07/2025 17:06:03		Exitoso	HECTOR GARCIA	<i>Hector Garcia</i>

Nº328461 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/02/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (592)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/02/2025 12:19:46		Exitoso	DIANA VELÁSQUEZ	<i>Diana Velásquez</i>

Cliente: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

Nº330732 CONTACTO: **YESICA YAMIL**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/28/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **CL 87 CON CR102, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (144L)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/28/2025 15:13:15		Exitoso	CRISTIAN GIRÓN	

Nº330404 CONTACTO: **YESICA YAMIL**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/24/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **CL 87 CON CR102, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (144L)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Reynis Herrera EQQ458	04/24/2025 17:22:37		Exitoso	JHON OSPINA	
Luis Miguel Cobos SMY324	04/24/2025 17:24:06		Exitoso	NIDIA MARTINEZ	

Nº330054 CONTACTO: **YESICA YAMIL**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/21/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **CL 87 CON CR102, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (144L)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Carlos Cárdena WOY319	04/21/2025 08:02:15		Exitoso	ECTOR VERNAL	

Nº329732 CONTACTO: **YESICA YAMIL**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/16/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **CL 87 CON CR102, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (144L)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Gilberto Beleño WLM415	04/15/2025 17:42:30		Exitoso	JUAN DIEGO JULIANO	

Nº329409 CONTACTO: **YESICA YAMIL**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/14/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **CL 87 CON CR102, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (144L)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Reynis Herrera EQQ458	04/14/2025 14:49:45		Exitoso	HUBERTO TRUJILLO	


Nº328753 CONTACTO: **YESICA YAMIL**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/07/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **CL 87 CON CR102, BOGOTÁ**


DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (144L)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/07/2025 10:54:08	Operario: SE HABLA CON LA SEÑORA ANGIE MUÑOZ Y LA MISMA INFORMA QUE ESTE BAÑO SE ENCUENTRA EN LA 68 CON 17	No hay personal del cliente		
Luis Mora Leon NHQ141	04/08/2025 15:08:25		Exitoso	JHON DUEÑAS	

NI 830,085,399-9

Nº328428 CONTACTO: **YESICA YAMIL**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/02/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **CL 87 CON CR102, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (144L)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/02/2025 12:39:09		Exitoso	YIMI VARGAS	

NI 830,085,399-9

Cliente: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**
Nº330632 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/28/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (480)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/28/2025 15:23:47		Exitoso	HECTOR GARZÓN	<i>Hector Garzon</i>

Nº330315 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/24/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (480)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/24/2025 17:05:14		Exitoso	HECTOR GARZON	<i>Hector Garzon</i>

Nº330060 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/21/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (480)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/21/2025 17:00:25	Operario: TAMBIÉN SE ENCUENTRA EL 755	Exitoso	NIDIA MARTÍNEZ	<i>Nidia Martinez</i>

Nº329744 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/16/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (480)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/16/2025 15:27:38		Exitoso	HECTOR GARZON	<i>Hector Garzon</i>

Nº329414 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/14/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (480)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/14/2025 15:27:45		Exitoso	HECTOR GARZON	<i>Hector Garzon</i>

Nº329122 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/10/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (480)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/10/2025 06:42:29		Exitoso	HECTOR GARZON	

Nº328787 CONTACTO: **VANESSA FORERO**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/07/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (480)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/07/2025 17:05:22		Exitoso	HECTOR GARCIA	<i>Hector Garcia</i>

NI 830,085,399-9

Nº328466 CONTACTO: VANESSA FORERO

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: 04/03/2025

DIRECCION DE SERVICIO: AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ

DESCRIPCION DEL SERVICIO: Aseo de 1 baño (480)

ESTADO DEL SERVICIO: Realizado

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/03/2025 16:35:17		Exitoso	HECTOR GARZON	

NI 830,085,399-9

Cliente: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS****Nº329171** CONTACTO: **VANESA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/11/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 96 CON CL 74A, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (145L)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/11/2025 16:21:47	Operario: EL BANO QUE SE ENCUENTRA EN EL SITIO ES EL 144	Exitoso	JUAN OSPINA	

Nº328837 CONTACTO: **VANESA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/08/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 96 CON CL 74A, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (145L)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/08/2025 11:41:31		Exitoso	LIONARDO CASTRO	

Nº328176 CONTACTO: **VANESA FORERO**FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/01/2025**DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 96 CON CL 74A, BOGOTÁ**DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (145L)**ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Gilberto Beleño TGV665	04/02/2025 17:51:36		Exitoso	ÁNGEL BURGOS	

NI 830,085,399-9

Cliente: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

Nº330405 CONTACTO: **VANESSA FORERO**
DIRECCION DE SERVICIO: **CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (271)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/24/2025**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Reynis Herrera EQQ458	04/24/2025 17:21:23		Exitoso	JHON OSPINA	
Reynis Herrera EQQ458	04/24/2025 17:22:08		Exitoso	JHON OSPINA	

Nº330053 CONTACTO: **VANESSA FORERO**
DIRECCION DE SERVICIO: **CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (271)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/21/2025**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Carlos Cárdena WOY319	04/21/2025 08:02:38		Exitoso	ECTOR VERNAL	

Nº329736 CONTACTO: **VANESSA FORERO**
DIRECCION DE SERVICIO: **CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (271)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/16/2025**


ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Gilberto Beleño WLM415	04/15/2025 17:42:04		Exitoso	JUAN DIEGO RUBIANO	

Nº329404 CONTACTO: **VANESSA FORERO**
DIRECCION DE SERVICIO: **CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (271)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/14/2025**


ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Reynis Herrera EQQ458	04/14/2025 14:50:17		Exitoso	HUMBERTO TRUJILLO	

Nº328751 CONTACTO: **VANESSA FORERO**
DIRECCION DE SERVICIO: **CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (271)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/08/2025**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/08/2025 11:40:32		Exitoso	LIONARD CASTRO	

Nº328432 CONTACTO: **VANESSA FORERO**
DIRECCION DE SERVICIO: **CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (271)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/03/2025**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Reynis Herrera EQQ458	04/03/2025 06:48:59	Operario: SE REALIZA EL ASEO A LOS DOS BAÑOS	Exitoso	ANGEL BURGOS	

Nº328097 CONTACTO: **VANESSA FORERO**
DIRECCION DE SERVICIO: **CL 139 CON CRA 118, BOGOTÁ**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (271)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/01/2025**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Carlos Cárdena WOY319	04/01/2025 09:13:01		Exitoso	ANGEL BURGOS	

Cliente: **CONSORCIO INFRADEMOL TRONCALES**

Nº330316 CONTACTO: **HECTOR GARZÓN**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/24/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **TV. 731 #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (755)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/24/2025 17:25:30		Exitoso	NIDIA MARTINEZ	<i>Nidia Martinez</i>

Nº330081 CONTACTO: **HECTOR GARZÓN**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/21/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **TV. 731 #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (755)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/21/2025 17:37:21		Exitoso	WILMER	<i>WILMER</i>

Nº329775 CONTACTO: **HECTOR GARZÓN**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/16/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **TV. 731 #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (755)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/16/2025 15:26:12		Exitoso	HECTOR GARZON	<i>HECTOR GARZON</i>

Nº329437 CONTACTO: **HECTOR GARZÓN**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/14/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **TV. 731 #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (755)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/14/2025 15:18:10		Exitoso	CRISTIAN GIRON	<i>CRISTIAN GIRON</i>

Nº329133 CONTACTO: **HECTOR GARZÓN**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/10/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **TV. 731 #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (755)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/10/2025 06:34:05		Exitoso	JHON DUEÑAS	<i>Jhon Dueñas</i>

Nº328796 CONTACTO: **HECTOR GARZÓN**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/07/2025**

DIRECCION DE SERVICIO: **TV. 731 #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (755)**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Miguel Cobos SMY324	04/07/2025 17:07:11		Exitoso	HECTOR GARCIA	<i>HECTOR GARCIA</i>

Nº328448 CONTACTO: **HECTOR GARZÓN**


FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **04/03/2025**


DIRECCION DE SERVICIO: **TV. 731 #71S-57, BOGOTÁ, BOGOTÁ**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 1 baño (755)**


ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**


Conductor / Camión	Fecha/Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Luis Mora Leon NHQ141	04/03/2025 16:34:49		Exitoso	HECTOR GARZON	<i>HECTOR GARZON</i>


27/03/2025 Se realiza recorrido al frente de trabajo de Bosa la Estación y se verifica, punto de Hidratación y punto de Atención de emergencias. 

En recorrido ambiental se evidencia señalización y de pozo con agua, retiro de residuos como madera, instalación cerámico alambre puer, orden y aseo en obra en gual, frente a Estancia, barrio. 

01: 31/03/2025 En recorrido a obra se inspeccionan dos EPP y dos preparaciones de la Maquinaria en obra, en recorrido ambiental se solicita hacer revisión estado malla protección sumideros, en gual la obra está organizada y cumpliendo procedimientos del MAO.


Ldy Vanegas B - Interventora 


07/04/2025 Se realiza recorrido al frente de trabajo ubicado en Bosa la Estación, se revisa Botiquín, Señal y punto de Hidratación. 
En recorrido ambiental se evidencia limpieza de unidades sanitarias, separación de RCD, punto de acopio de RCD, protección de sumideros, se solicita mantener orden y aseo en obra.


Ldy Vanegas - Interventora. 


10/04/2024 Se realiza recorrido en obra, se verifica EPP y detalles con el personal de obra. 

En recorrido ambiental, se solicita realizar limpieza de malla protectora de sumideros ya que corresponde a residuos de la comunidad y pueden afectar su funcionamiento.


Ldy Vanegas - Interventora. 

27/03/2025 Se realiza recorrido al frente de trabajo de Bosa la Estación y se verifica, punto de Hidratación y punto de Atención de emergencia. 


En recorrido ambiental se evidencia señalización predial y de pozo con agua, retiro de residuos como madera, instalación cerramiento alambre púas, orden y aseo en obra en geral, frente a la Estación, bandedo. 
Ldy Vanegas B - Interventora

31/03/2025 En recorrido a obra se inspeccionan los EPP y los preparativos de la Maquinaria en obra, en recorrido ambiental se solicita hacer revisión estado malla protección sumideros, en geral la obra está organizada y cumpliendo procedimientos del MATO. 

Ldy Vanegas B - Interventora

07/04/2025 Se realiza recorrido al frente de trabajo ubicado en Bosa la Estación, se revisa la Estación, Señal y punto de Hidratación. 
En recorrido ambiental se evidencia limpieza de unidades sanitarias, separación de RCD, punto de acopio de RCD, protección de sumideros, se solicita mantener orden y aseo en obra. 

Ldy Vanegas - Interventora.

10/04/2024 Se realiza recorrido en obra, se verifica EPP y dotación al personal de obra. 


En recorrido ambiental, se solicita realizar limpieza de malla protectora de sumideros ya que corresponde a residuos de la comunidad y pueden afectar su funcionamiento. 

Ldy Vanegas - Interventora.

15/04/2025 En recorrido ambiental se evidencian unidades sanitarias limpias, se solicita retirar RCD salientes de ceramiento para evitar un accidente a terceros.

- Reponer malla de sumideros que lo requieran.
- Frente de obra en buenas condiciones de orden.
- Se evidencian retiro de metal generado en demolición.

Loly Viregas B. - Interventora

15/04/2025 Se realiza recorrido al frente de trabajo donde se verifica la utilización de sus EPP, se verifica herramientas y maquinaria en obra.

22/04/2025 En recorrido ambiental se evidencian:

* Se solicita retirar material sobresaliente de predios demoliciones.

* Se evidencian sumideros protegidos, se solicita mantener la protección instalada en todo momento.

* Se realiza retiro de RCD metálicos.

* Unidades sanitarias limpias

Loly Viregas - Interventora

22/04/2025 Se realiza recorrido a obra, se verifica EPP, botación y Horantes al personal de obra, se verifica que el contratista este dando cumplimiento a las procedimientos propuestos en el RSC.

25/04/2025 En recorrido ambiental se evidencian:

* Reposición de malla de protección de sumideros adyacentes a predios intervenidos.

* Limpieza de área adyacente a predios demolidos.

* Se solicita ajustar nuevamente ceramiento en madera y alambre de predio intervenido, ya que la comunidad está depositando residuos ajenos a la obra.

2

- * Separación de RCD según tipo.
- * Unidades sanitarias en buen estado de orden y limpieza.

by Vargas - Interventoria


30-04/2025 Se realiza inspección al frente de trabajo de Bosa la Estación donde se verifica el cumplimiento de los procedimientos propuestos para el control de obra, se inspecciona maquinaria en obra, personal en obra, Herramientas y Dotación, al igual se verifica que el personal utilice los GPR. 

0
3

02-05-2025 En recorrido ambiental de obra, se evidencia:

- * Cambio de protección de sumideros adyacentes a predios intervenidos.
- * Frentes de obra organizados y limpios.
- * Fundación de tapa en concreto para tanque subterráneo.
- * Unidades sanitarias limpias y en orden y aseo.
- * Separación de RCD (residuos metálicos) para aprovechamiento.

by Vargas - Interventoria

02/05/2025 Desde el Componente SST se realiza verificación de dos GPR, Dotación y Herramientas en el frente de trabajo, al momento no se separan basuras en obra. 

Bogotá, 2 de Julio de 2025

Señores

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON

Representante Legal

Carrera 49 No. 91 - 76 con

teléfonos 6353245, 3156481357 y

E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1711-2023, cuyo objeto es DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Revisión y aprobación Informe mensual Ambiental N.13 V2 Contratista

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta el comunicado INF-INT-IDU1711-312-2025; mediante el cual se remite el Informe Mensual Ambiental N. 13 V2 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Abril de 2025, una vez revisado se tiene que dado a que se dio atención a las observaciones y que cumple con lo requerido por la entidad, se da **aprobación** al mismo.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud

Cordialmente,



ING. JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consortio Metro Cinco

Elaboró: LMV
