

CONTRATO No. : 3601 DE 2022



ENTIDAD CONTRATANTE: INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7

TIPO DE INFORME: INFORME MENSUAL 04

CODIGO: IM-555-04

CONTROL DE REVISIONES

No. De Revisiones		0	1	2	3
Responsables					
Responsable de Elaboración	Nombre:	BIBIANA PATERNINA			
	Firma:				
	Fecha:	mar-24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma:				
	Fecha:	mar-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	ANDRES CASTILLA MOLINA			
	Firma:				
	Fecha:	mar-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7



SAMANÁ



PENSILVANIA



BELALCÁZAR



MARULANDA



RISARALDA



PALESTINA



FILADELFIA



SUPÍA




RIOSUCIO

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 04
PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

IM – 555 – 04



FEBRERO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 04	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	
	Bibiana Paternina Ingeniero Residente
REVISADO POR:	
	Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL SILENCIO</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: EL SILENCIO LONG. CORR.: 1,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 150 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: EL SILENCIO LONG. CORR.: 1,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 150 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO</u> , MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	VÍA: TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) LONG. CORR.: 0,35 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 158 ML OBRAS DE ARTE: 0	VÍA: TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) LONG. CORR.: 0,35 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 158 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA PATIO BONITO</u> , CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 130 ML OBRAS DE ARTE: 1	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 130 ML OBRAS DE ARTE: 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL CIRPIAL</u> , MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA <u>VEREDA EL DORADO</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: SARDINAS LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: SARDINAS LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL <u>VEREDA CALIFORNIA ALTA</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: CALIFORNIA ALTA LONG. CORR.: 6,2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 155 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: CALIFORNIA ALTA LONG. CORR.: 6,2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 155 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA CARACOLI</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: CARACOLI LONG. CORR.: 2,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 156 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: CARACOLI LONG. CORR.: 2,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 156 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA MONTEBELLO</u> DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	SECTOR: MONTEBELLO LONG. CORR.: 2,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 149 ML	SECTOR: MONTEBELLO LONG. CORR.: 2,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 149 ML

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OBRAS DE ARTE: 0	OBRAS DE ARTE: 0
	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE <u>ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO</u> MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL <u>VEREDA EL NARANJAL</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: EL NARANJAL LONG. CORR.: 1,8 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: EL NARANJAL LONG. CORR.: 1,8 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA LA LINDA</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: LA LINDA – SAN DANIEL LONG. CORR.: 0,26 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: LA LINDA – SAN DANIEL LONG. CORR.: 0,26 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA SANTA RITA</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	SECTOR: SANTA RITA BAJA LONG. CORR.: 0,69 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 135 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: SANTA RITA BAJA LONG. CORR.: 0,69 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 135 ML OBRAS DE ARTE: 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PENSILVANIA		EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA EL VERDAL</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN LONG. CORR.: 0,51 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 126 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN LONG. CORR.: 0,51 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 126 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA MIRAFLORES</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES LONG. CORR.: 1,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES LONG. CORR.: 1,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA LA HABANA</u> DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: LA HABANA – LAS PAVAS LONG. CORR.: 0,24 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 174 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: LA HABANA – LAS PAVAS LONG. CORR.: 0,24 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 174 ML OBRAS DE ARTE: 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA NARANJAL</u> DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	SECTOR: NARANJAL - MONTEBONITO LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA	SECTOR: NARANJAL - MONTEBONITO LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	LONG. PLACA HUELLA.: 152 ML OBRAS DE ARTE: 0	LONG. PLACA HUELLA.: 152 ML OBRAS DE ARTE: 0
	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL PARAMO</u> DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX LONG. CORR.: 3,38 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX LONG. CORR.: 3,38 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA SARCIRI</u> DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: GUAMITO – EL CRUCERO LONG. CORR.: 0,17 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: GUAMITO – EL CRUCERO LONG. CORR.: 0,17 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA MEDIA CUESTA</u> DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: MEDIA CUESTA - BANDERAS LONG. CORR.: 0,64 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 181 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: MEDIA CUESTA - BANDERAS LONG. CORR.: 0,64 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 181 ML OBRAS DE ARTE: 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA LOS LOBOS</u> DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS LONG. CORR.: 1,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 170 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS LONG. CORR.: 1,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 170 ML OBRAS DE ARTE: 0
FILADEFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA SAN LUIS</u> DEL MUNICIPIO DE FILADEFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA LONG. CORR.: 0,532 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 158 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA LONG. CORR.: 0,532 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 158 ML OBRAS DE ARTE: 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL VERSO</u> DEL MUNICIPIO DE FILADEFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) LONG. CORR.: 0,322 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 141 ML OBRAS DE ARTE: 2	SECTOR: CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) LONG. CORR.: 0,322 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 141 ML OBRAS DE ARTE: 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>ALTO CABUYAL</u> DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,533 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 163 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,533 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA: 163 ML OBRAS DE ARTE: 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA BAJO CABUYAL</u> DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,221 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 160 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,221 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 160 ML OBRAS DE ARTE: 0
	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y <u>EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) LONG. CORR.: 1,55 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 132 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) LONG. CORR.: 1,55 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 132 ML OBRAS DE ARTE: 0
RIOSUCIO	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS <u>PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO LONG. CORR.: 0,175 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 152 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO LONG. CORR.: 0,175 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 152 ML OBRAS DE ARTE: 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y <u>EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE	SECTOR: CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) LONG. CORR.: 4,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 140 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) LONG. CORR.: 4,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 140 ML OBRAS DE ARTE: 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO		LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y <u>EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) LONG. CORR.: 1,193 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 185 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ-CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) LONG. CORR.: 1,193 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 185 ML OBRAS DE ARTE: 0

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	46
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	46
1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS	47
1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	47
1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS	47
1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS	48
2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	48
2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA.....	48
2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	48
2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	49

2.4	SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	49
2.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	49
2.6	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	49
2.6.1	Seguimiento a la inversión del anticipo.	49
2.6.2	Seguimiento al plan de carga	49
3	INTRODUCCIÓN.....	52
4	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	53
4.1	LOCALIZACIÓN	53
4.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	54
4.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	54
4.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	54
5	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	54
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	54
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	56
5.2.1	Actividades Administrativas	56
5.2.2	Actividades Técnicas	56
5.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	56
5.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..	56
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	57
6.1	INFORME SEMANAL.....	57
6.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	57
6.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	57
6.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	58
6.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	58
6.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	58
6.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	58
6.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	58
6.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	58
6.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	58
6.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	58
6.9.3	Actas de Comités.....	59
6.9.4	Actas de Reunión	59
7	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	59
7.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	59
7.1.1	Actividades Administrativas	59
7.1.2	Actividades Técnicas	59
7.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	59
8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	59
9	ANEXO	60

9.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	60
9.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	60
9.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	60
9.4	BITÁCORA	60
10	INTRODUCCIÓN.....	63
11	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	64
11.1	LOCALIZACIÓN	64
11.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	65
11.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	65
11.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	66
12	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	66
12.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	66
12.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	68
12.2.1	Actividades Administrativas	68
12.2.2	Actividades Técnicas	68
12.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	69
12.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..	69
13	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	70
13.1	INFORME SEMANAL.....	70
13.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	70
13.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	70
13.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	70
13.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	70
13.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	71
13.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	71
13.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	71
13.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	71
13.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	71
13.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	71
13.9.3	Actas de Comités.....	72
13.9.4	Actas de Reunión	72
14	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	72
14.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	72
14.1.1	Actividades Administrativas	72
14.1.2	Actividades Técnicas	73
14.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	73
15	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	73
16	ANEXO	75
16.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	75

16.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	75
16.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	75
16.4	BITÁCORA	75
17	INTRODUCCIÓN.....	78
18	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	79
18.1	LOCALIZACIÓN	79
18.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	80
18.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	80
18.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	81
19	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	81
19.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	81
19.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	83
19.2.1	Actividades Administrativas	83
19.2.2	Actividades Técnicas	83
19.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	84
19.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..	84
20	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	85
20.1	INFORME SEMANAL.....	85
20.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	85
20.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	85
20.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	86
20.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	86
20.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	86
20.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	86
20.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	86
20.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	87
20.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	87
20.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	87
20.9.3	Actas de Comités.....	87
20.9.4	Actas de Reunión	87
21	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	87
21.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	87
21.1.1	Actividades Administrativas	87
21.1.2	Actividades Técnicas	88
21.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	89
22	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	90
23	ANEXO	91
23.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	91
23.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	91

23.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	91
23.4	BITÁCORA	91
24	INTRODUCCIÓN.....	94
25	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	95
25.1	LOCALIZACIÓN	95
25.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	96
25.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	96
25.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	96
26	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	96
26.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	96
26.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	98
26.2.1	Actividades Administrativas	98
26.2.2	Actividades Técnicas	98
26.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	98
26.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..	98
27	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	100
27.1	INFORME SEMANAL	100
27.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	100
27.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	100
27.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	100
27.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	100
27.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	100
27.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	100
27.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	100
27.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	100
27.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	100
27.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	101
27.9.3	Seguimiento al Programa de Inversiones.....	101
27.9.4	Actas de Comités.....	101
27.9.5	Actas de Reunión	101
28	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	101
28.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	101
28.1.1	Actividades Administrativas	101
28.1.2	Actividades Técnicas	101
28.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	102
29	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	102
30	ANEXO	102
30.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	102
30.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	102

30.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	103
30.4	BITÁCORA	103
31	INTRODUCCIÓN.....	106
32	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	107
32.1	LOCALIZACIÓN	107
32.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	108
32.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	108
32.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	109
33	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	109
33.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	109
33.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	111
33.2.1	Actividades Administrativas	111
33.2.2	Actividades Técnicas	111
33.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	111
33.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	111
34	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	112
34.1	INFORME SEMANAL	112
34.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	112
34.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	112
34.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	113
34.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	113
34.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	113
34.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	113
34.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	114
34.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	114
34.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	114
34.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	114
34.9.3	Actas de Comités.....	114
34.9.4	Actas de Reunión	114
35	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	114
35.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	114
35.1.1	Actividades Administrativas	115
35.1.2	Actividades Técnicas	115
35.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	116
36	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	116
37	ANEXO	117
37.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	117
37.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	117
37.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	117

37.4	BITÁCORA	117
38	INTRODUCCIÓN.....	120
39	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	121
39.1	LOCALIZACIÓN	121
39.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	122
39.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	122
39.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	122
40	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	122
40.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	122
40.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	124
40.2.1	Actividades Administrativas	124
40.2.2	Actividades Técnicas	124
40.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	124
40.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	124
41	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	125
41.1	INFORME SEMANAL	125
41.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	125
41.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	125
41.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	126
41.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	126
41.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	126
41.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	126
41.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	126
41.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	127
41.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	127
41.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	127
41.9.3	Actas de Comités.....	127
41.9.4	Actas de Reunión	127
42	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	127
42.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	127
42.1.1	Actividades Administrativas	128
42.1.2	Actividades Técnicas	128
42.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	128
43	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	129
44	ANEXO	130
44.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	130
44.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	130
44.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	130
44.4	BITÁCORA	130

45	INTRODUCCIÓN.....	133
46	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	134
46.1	LOCALIZACIÓN	134
46.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	135
46.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	135
46.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	136
47	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	136
47.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	136
47.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	138
47.2.1	Actividades Administrativas	138
47.2.2	Actividades Técnicas	139
47.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	139
47.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	139
48	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	140
48.1	INFORME SEMANAL	140
48.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	140
48.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	140
48.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	140
48.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	141
48.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	141
48.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	141
48.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	141
48.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	141
48.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	141
48.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	141
48.9.3	Actas de Comités.....	142
48.9.4	Actas de Reunión	142
49	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	142
49.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	142
49.1.1	Actividades Administrativas	142
49.1.2	Actividades Técnicas	143
49.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	144
50	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	144
51	ANEXO	145
51.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	145
51.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	145
51.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	145
51.4	BITÁCORA	145
52	INTRODUCCIÓN.....	148

53	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	149
53.1	LOCALIZACIÓN	149
53.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	150
53.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	150
53.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	150
54	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	150
54.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	150
54.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	152
54.2.1	Actividades Administrativas	152
54.2.2	Actividades Técnicas	152
54.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	153
54.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	153
55	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	153
55.1	INFORME SEMANAL.....	153
55.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	154
55.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	154
55.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	154
55.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	154
55.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	154
55.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	154
55.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	155
55.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	155
55.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	155
55.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	155
55.9.3	Actas de Comités.....	155
55.9.4	Actas de Reunión	156
56	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	156
56.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	156
56.1.1	Actividades Administrativas	156
56.1.2	Actividades Técnicas	156
56.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	157
57	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	157
58	ANEXO	158
58.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	158
58.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	158
58.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	158
58.4	BITÁCORA	158
59	INTRODUCCIÓN.....	161
60	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	162

60.1	LOCALIZACIÓN	162
60.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	163
60.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	163
60.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	163
61	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	163
61.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	163
61.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	165
61.2.1	Actividades Administrativas	165
61.2.2	Actividades Técnicas	165
61.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	165
61.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	165
62	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	167
62.1	INFORME SEMANAL	167
62.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	167
62.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	167
62.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	167
62.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	167
62.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	167
62.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	167
62.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	168
62.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	168
62.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	168
62.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	168
62.9.3	Actas de Comités.....	168
62.9.4	Actas de Reunión	168
63	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	168
63.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	168
63.1.1	Actividades Administrativas	168
63.1.2	Actividades Técnicas	169
63.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	169
64	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	169
65	ANEXO	170
65.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	170
65.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	170
65.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	170
65.4	BITÁCORA	170
66	INTRODUCCIÓN.....	173
67	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	174
67.1	LOCALIZACIÓN	174

67.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	175
67.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	175
67.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	176
68	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	176
68.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	176
68.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	177
68.2.1	Actividades Administrativas	177
68.2.2	Actividades Técnicas	178
68.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	178
68.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	178
69	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	179
69.1	INFORME SEMANAL	179
69.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	179
69.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	179
69.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	180
69.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	180
69.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	180
69.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	180
69.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	180
69.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	180
69.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	180
69.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	180
69.9.3	Actas de Comités.....	181
69.9.4	Actas de Reunión	181
70	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	181
70.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	181
70.1.1	Actividades Administrativas	181
70.1.2	Actividades Técnicas	182
70.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	182
71	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	183
72	ANEXO	184
72.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	184
72.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	184
72.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	184
72.4	BITÁCORA	184
73	INTRODUCCIÓN.....	187
74	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	188
74.1	LOCALIZACIÓN	188

74.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	189
74.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	189
74.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	190
75	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	190
75.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	190
75.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	192
75.2.1	Actividades Administrativas	192
75.2.2	Actividades Técnicas	192
75.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	193
75.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	193
76	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	194
76.1	INFORME SEMANAL	194
76.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	194
76.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	194
76.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	194
76.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	194
76.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	195
76.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	195
76.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	195
76.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	195
76.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	195
76.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	195
76.9.3	Actas de Comités.....	196
76.9.4	Actas de Reunión	196
77	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	196
77.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	196
77.1.1	Actividades Administrativas	196
77.1.2	Actividades Técnicas	197
77.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	197
78	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	198
79	ANEXO	199
79.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	199
79.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	199
79.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	199
79.4	BITÁCORA	199
80	INTRODUCCIÓN.....	202
81	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	203
81.1	LOCALIZACIÓN	203

81.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	204
81.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	204
81.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	205
82	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	205
82.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	205
82.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	206
82.2.1	Actividades Administrativas	207
82.2.2	Actividades Técnicas	207
82.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	208
82.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	208
83	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	208
83.1	INFORME SEMANAL	208
83.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	209
83.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	209
83.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	209
83.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	209
83.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	209
83.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	209
83.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	210
83.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	210
83.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	210
83.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	210
83.9.3	Actas de Comités.....	210
83.9.4	Actas de Reunión	210
84	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	210
84.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	210
84.1.1	Actividades Administrativas	211
84.1.2	Actividades Técnicas	211
84.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	212
85	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	212
86	ANEXO	213
86.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	213
86.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	213
86.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	213
86.4	BITÁCORA	214
87	INTRODUCCIÓN.....	217
88	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	218
88.1	LOCALIZACIÓN	218

88.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	219
88.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	219
88.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	220
89	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	220
89.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	220
89.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	221
89.2.1	Actividades Administrativas	221
89.2.2	Actividades Técnicas	222
89.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	222
89.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	222
90	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	223
90.1	INFORME SEMANAL	223
90.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	223
90.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	223
90.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	224
90.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	224
90.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	224
90.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	224
90.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	224
90.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	224
90.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	224
90.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	224
90.9.3	Actas de Comités.....	225
90.9.4	Actas de Reunión	225
91	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	225
91.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	225
91.1.1	Actividades Administrativas	225
91.1.2	Actividades Técnicas	226
91.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	226
92	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	227
93	ANEXO	228
93.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	228
93.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	228
93.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	228
93.4	BITÁCORA	228
94	INTRODUCCIÓN.....	231
95	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	232
95.1	LOCALIZACIÓN	232

95.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	233
95.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	233
95.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	234
96	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	234
96.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	234
96.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	236
96.2.1	Actividades Administrativas	236
96.2.2	Actividades Técnicas	236
96.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	237
96.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	237
97	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	237
97.1	INFORME SEMANAL	237
97.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	238
97.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	238
97.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	238
97.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	238
97.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	238
97.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	238
97.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	239
97.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	239
97.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	239
97.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	239
97.9.3	Actas de Comités.....	239
97.9.4	Actas de Reunión	240
98	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	240
98.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	240
98.1.1	Actividades Administrativas	240
98.1.2	Actividades Técnicas	241
98.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	241
99	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	242
100	ANEXO	243
100.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	243
100.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	243
100.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	243
100.4	BITÁCORA	243
101	INTRODUCCIÓN.....	246
102	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	247
102.1	LOCALIZACIÓN	247

102.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	248
102.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	248
102.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	249
103 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	249
103.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	249
103.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	251
103.2.1 Actividades Administrativas	251
103.2.2 Actividades Técnicas	251
103.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	252
103.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	252
104 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	253
104.1 INFORME SEMANAL	253
104.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	253
104.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	253
104.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	253
104.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	253
104.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	254
104.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	254
104.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	254
104.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	254
104.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	254
104.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	254
104.9.3 Actas de Comités.....	255
104.9.4 Actas de Reunión	255
105 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	255
105.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	255
105.1.1 Actividades Administrativas	256
105.1.2 Actividades Técnicas	256
105.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR	257
106 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	257
107 ANEXO	258
107.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	258
107.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	258
107.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	258
107.4 BITÁCORA	258
108 INTRODUCCIÓN.....	262
109 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	263
109.1 LOCALIZACIÓN	263

109.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	264
109.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	264
109.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	265
110 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	265
110.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	265
110.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	267
110.2.1 Actividades Administrativas	267
110.2.2 Actividades Técnicas	267
110.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	268
110.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	268
111 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	269
111.1 INFORME SEMANAL	269
111.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	269
111.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	269
111.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	269
111.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	270
111.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	270
111.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	270
111.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	270
111.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	270
111.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	270
111.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	270
111.9.3 Actas de Comités.....	271
111.9.4 Actas de Reunión	271
112 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	271
112.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	271
112.1.1 Actividades Administrativas	271
112.1.2 Actividades Técnicas	272
112.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA	273
113 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	273
114 ANEXO	274
114.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	274
114.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	274
114.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	274
114.4 BITÁCORA	274
115 INTRODUCCIÓN.....	277
116 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	278
116.1 LOCALIZACIÓN	278

116.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	279
116.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	279
116.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	279
117 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	279
117.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	279
117.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	281
117.2.1 Actividades Administrativas	281
117.2.2 Actividades Técnicas	281
117.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	281
117.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	281
118 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	282
118.1 INFORME SEMANAL	282
118.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	282
118.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	282
118.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	282
118.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	282
118.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	282
118.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	283
118.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	283
118.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	283
118.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	283
118.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	283
118.9.3 Actas de Comités	283
118.9.4 Actas de Reunión	283
119 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	283
119.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	283
119.1.1 Actividades Administrativas	283
119.1.2 Actividades Técnicas	284
119.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA	284
120 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	284
121 ANEXO	284
121.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	284
121.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	284
121.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	284
121.4 BITÁCORA	285
122 INTRODUCCIÓN	288
123 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	289
123.1 LOCALIZACIÓN	289

123.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	290
123.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	290
123.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	290
124 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	290
124.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	290
124.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	292
124.2.1 Actividades Administrativas	292
124.2.2 Actividades Técnicas	292
124.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	292
124.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	292
125 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	294
125.1 INFORME SEMANAL	294
125.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	294
125.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	294
125.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	294
125.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	294
125.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	294
125.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	294
125.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	294
125.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	294
125.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	294
125.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	294
125.9.3 Actas de Comités	295
125.9.4 Actas de Reunión	295
126 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	295
126.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	295
126.1.1 Actividades Administrativas	295
126.1.2 Actividades Técnicas	295
126.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA	295
127 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	295
128 ANEXO	296
128.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	296
128.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	296
128.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	296
128.4 BITÁCORA	296
129 INTRODUCCIÓN.....	299
130 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	300
130.1 LOCALIZACIÓN	300

130.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	301
130.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	301
130.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	302
131 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	302
131.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	302
131.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	304
131.2.1 Actividades Administrativas	304
131.2.2 Actividades Técnicas	304
131.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	305
131.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	305
132 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	306
132.1 INFORME SEMANAL	306
132.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	306
132.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	306
132.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	306
132.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	306
132.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	307
132.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	307
132.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	307
132.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	307
132.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	307
132.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	307
132.9.3 Actas de Comités	308
132.9.4 Actas de Reunión	308
133 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	308
133.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	308
133.1.1 Actividades Administrativas	308
133.1.2 Actividades Técnicas	309
133.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA	309
134 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	310
135 ANEXO	311
135.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	311
135.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	311
135.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	311
135.4 BITÁCORA	311
136 INTRODUCCIÓN.....	314
137 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	315
137.1 LOCALIZACIÓN	315

137.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	316
137.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	317
137.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	317
138 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	317
138.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	317
138.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	318
138.2.1 Actividades Administrativas	318
138.2.2 Actividades Técnicas	318
138.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	318
138.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	319
139 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	319
139.1 INFORME SEMANAL	319
139.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	319
139.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	320
139.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	320
139.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	320
139.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	320
139.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	320
139.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	320
139.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	320
139.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	320
139.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	320
139.9.3 Actas de Reunión	321
140 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	321
140.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	321
140.1.1 Actividades Administrativas	321
140.1.2 Actividades Técnicas	321
140.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA	321
141 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	321
142 ANEXO	322
142.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	322
142.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	322
142.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	322
142.4 BITÁCORA	322
143 INTRODUCCIÓN	325
144 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	326
144.1 LOCALIZACIÓN	326
144.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	327

144.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	327
144.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	327
145 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	327
145.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	327
145.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	329
145.2.1 Actividades Administrativas	329
145.2.2 Actividades Técnicas	329
145.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	329
145.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	329
146 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	330
146.1 INFORME SEMANAL	330
146.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	330
146.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	330
146.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	330
146.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	330
146.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	330
146.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	331
146.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	331
146.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	331
146.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	331
146.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	331
146.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones	331
146.9.4 Actas de Reunión	331
147 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	331
147.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	331
147.1.1 Actividades Administrativas	331
147.1.2 Actividades Técnicas	331
147.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA	332
148 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	332
149 ANEXO	332
149.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	332
149.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	332
149.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	332
149.4 BITÁCORA	332
150 INTRODUCCIÓN	335
151 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	336
151.1 LOCALIZACIÓN	336
151.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	337
151.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	337

151.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	337
152 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	337
152.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	337
152.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	339
152.2.1 Actividades Administrativas	339
152.2.2 Actividades Técnicas	339
152.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	339
152.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	339
153 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	341
153.1 INFORME SEMANAL	341
153.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	341
153.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	341
153.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	341
153.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	341
153.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	341
153.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	341
153.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	341
153.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	341
153.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	341
153.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	341
153.9.3 Actas de Reunión	342
154 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	342
154.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	342
154.1.1 Actividades Administrativas	342
154.1.2 Actividades Técnicas	342
154.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA.....	342
155 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	342
156 ANEXO	343
156.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	343
156.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	343
156.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	343
156.4 BITÁCORA	343
157 INTRODUCCIÓN.....	346
158 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	347
158.1 LOCALIZACIÓN	347
158.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	348
158.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	348
158.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	348
159 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	348

159.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	348
159.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	350
159.2.1 Actividades Administrativas	350
159.2.2 Actividades Técnicas	350
159.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	350
159.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	350
160 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	351
160.1 INFORME SEMANAL	351
160.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	351
160.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	351
160.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	351
160.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	351
160.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	351
160.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	352
160.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	352
160.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	352
160.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	352
160.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	352
160.9.3 Actas de Reunión	352
161 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	352
161.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	352
161.1.1 Actividades Administrativas	352
161.1.2 Actividades Técnicas	352
161.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA	353
162 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	353
163 ANEXO	353
163.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	353
163.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	353
163.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	354
163.4 BITÁCORA	354
164 INTRODUCCIÓN	357
165 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	358
165.1 LOCALIZACIÓN	358
165.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	359
165.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	359
165.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	359
166 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	359
166.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	359
166.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	361

166.2.1 Actividades Administrativas	361
166.2.2 Actividades Técnicas	361
166.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	361
166.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	361
167 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	362
167.1 INFORME SEMANAL	362
167.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	362
167.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	362
167.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	362
167.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	362
167.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	362
167.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	362
167.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	363
167.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	363
167.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	363
167.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	363
167.9.3 Actas de Reunión	363
168 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	363
168.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	363
168.1.1 Actividades Administrativas	363
168.1.2 Actividades Técnicas	363
168.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA	364
169 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	364
170 ANEXO	364
170.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	364
170.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	364
170.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	364
170.4 BITÁCORA	364
171 INTRODUCCIÓN.....	367
172 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	368
172.1 LOCALIZACIÓN	368
172.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	369
172.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	370
172.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	370
173 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	370
173.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	370
173.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	371
173.2.1 Actividades Administrativas	371
173.2.2 Actividades Técnicas	372

173.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	372
173.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	372
174 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	373
174.1 INFORME SEMANAL	373
174.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	373
174.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	373
174.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	373
174.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	373
174.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	373
174.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	373
174.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	373
174.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	373
174.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	373
174.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	373
174.9.3 Actas de Reunión	374
175 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	374
175.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	374
175.1.1 Actividades Administrativas	374
175.1.2 Actividades Técnicas	374
175.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	374
176 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	374
177 ANEXO	375
177.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	375
177.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	375
177.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	375
177.4 BITÁCORA	375
178 INTRODUCCIÓN.....	378
179 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	379
179.1 LOCALIZACIÓN	379
179.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	380
179.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	380
179.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	380
180 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	380
180.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	380
180.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	382
180.2.1 Actividades Administrativas	382
180.2.2 Actividades Técnicas	382
180.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	382
180.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	382

181	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	383
181.1	INFORME SEMANAL	383
181.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	384
181.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	384
181.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	384
181.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	384
181.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	384
181.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	384
181.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	384
181.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	384
181.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	384
181.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	384
181.9.3	Actas de Reunión	385
182	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	385
182.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	385
182.1.1	Actividades Administrativas	385
182.1.2	Actividades Técnicas	385
182.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	385
183	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	385
184	ANEXO	386
184.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	386
184.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	386
184.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	386
184.4	BITÁCORA	386
185	INTRODUCCIÓN.....	389
186	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	390
186.1	LOCALIZACIÓN	390
186.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	391
186.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	392
186.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	392
187	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	392
187.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	392
187.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	393
187.2.1	Actividades Administrativas	393
187.2.2	Actividades Técnicas	394
187.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	394
187.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	394
188	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	395
188.1	INFORME SEMANAL	395

188.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	395
188.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	395
188.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	395
188.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	395
188.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	396
188.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	396
188.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	396
188.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	396
188.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	396
188.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	396
188.9.3 Actas de Reunión	396
189 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	396
189.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	396
189.1.1 Actividades Administrativas	396
189.1.2 Actividades Técnicas	397
189.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	397
190 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	397
191 ANEXO	397
191.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	397
191.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	397
191.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	398
191.4 BITÁCORA	398
192 INTRODUCCIÓN.....	401
193 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	402
193.1 LOCALIZACIÓN	402
193.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	403
193.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	404
193.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	404
194 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	404
194.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	404
194.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	405
194.2.1 Actividades Administrativas	405
194.2.2 Actividades Técnicas	406
194.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	406
194.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	406
195 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	407
195.1 INFORME SEMANAL	407
195.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	407

195.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	407
195.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	407
195.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	407
195.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	407
195.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	407
195.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	407
195.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	407
195.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	407
195.9.2 Seguimiento al Programa de Obra	407
195.9.3 Actas de Reunión	408
196 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	408
196.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	408
196.1.1 Actividades Administrativas	408
196.1.2 Actividades Técnicas	408
196.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	408
197 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	408
198 ANEXO	409
198.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	409
198.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	409
198.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	409
198.4 BITÁCORA	409

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	53
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	54
ILUSTRACIÓN 3 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	64
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	65
ILUSTRACIÓN 5 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL	66
ILUSTRACIÓN 6 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	79
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	80
ILUSTRACIÓN 8 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	95
ILUSTRACIÓN 9 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	96
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	107
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	108
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	121
ILUSTRACIÓN 13 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	122
ILUSTRACIÓN 14 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	134
ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	135
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	149
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	150
ILUSTRACIÓN 18 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	162
ILUSTRACIÓN 19 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILED MAPS	163

ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS).....	174
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	175
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	188
ILUSTRACIÓN 23 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	189
ILUSTRACIÓN 24 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	203
ILUSTRACIÓN 25 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	204
ILUSTRACIÓN 26 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	218
ILUSTRACIÓN 27 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	219
ILUSTRACIÓN 28 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	232
ILUSTRACIÓN 29 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	233
ILUSTRACIÓN 30 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR (CALDAS).	247
ILUSTRACIÓN 31 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	248
ILUSTRACIÓN 32 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS).	263
ILUSTRACIÓN 33 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	264
ILUSTRACIÓN 34 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS).	278
ILUSTRACIÓN 35 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	279
ILUSTRACIÓN 36 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS).	289
ILUSTRACIÓN 37 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	290
ILUSTRACIÓN 38 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS).	300
ILUSTRACIÓN 39 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	301
ILUSTRACIÓN 40 ESTADO INICIAL DEL SECTOR.....	302
ILUSTRACIÓN 41 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).....	316
ILUSTRACIÓN 42 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	316
ILUSTRACIÓN 43 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS).	326
ILUSTRACIÓN 44 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	327
ILUSTRACIÓN 45 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS).	336
ILUSTRACIÓN 46 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	337
ILUSTRACIÓN 47 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA (CALDAS).....	347
ILUSTRACIÓN 48 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	348
ILUSTRACIÓN 49 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	359
ILUSTRACIÓN 50 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).....	369
ILUSTRACIÓN 51 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	369
ILUSTRACIÓN 52 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).....	379
ILUSTRACIÓN 53 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).....	391
ILUSTRACIÓN 54 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	391
ILUSTRACIÓN 55 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).....	403
ILUSTRACIÓN 56 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	403

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR	9
TABLA 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	47
TABLA 3 PERSONAL ASIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	49
TABLA 4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2073-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 5 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	58

TABLA 6 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	70
TABLA 7 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2435-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	82
TABLA 8 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	86
TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	98
TABLA 10 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	110
TABLA 11 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	113
TABLA 12 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	124
TABLA 13 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	126
TABLA 14 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	137
TABLA 15 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	140
TABLA 16 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	152
TABLA 17 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	154
TABLA 18 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	165
TABLA 19 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.....	177
TABLA 20 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.....	191
TABLA 21 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	194
TABLA 22 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.....	206
TABLA 23 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	209
TABLA 24 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.....	221
TABLA 25 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	223
TABLA 26 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.....	235
TABLA 27 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	238
TABLA 28 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR.....	250
TABLA 29 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	253
TABLA 30 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA.....	266
TABLA 31 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	269
TABLA 32 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA.....	281
TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA.....	292
TABLA 34 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA.....	304
TABLA 35 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	306
TABLA 36 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA.....	318
TABLA 37 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA.....	329
TABLA 38 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA.....	339
TABLA 39 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA.....	350
TABLA 40 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS).	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 41 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA.....	361
TABLA 42 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.....	371
TABLA 43 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.....	382
TABLA 44 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.....	393
TABLA 45 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.....	405

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL SILENCIO
----------------	--

ANEXO 1.1	Informe Semanal
ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 2.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 2.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 2.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 2.7	Registro Fotográfico
ANEXO 2.8	Bitácora de obra
ANEXO 2.9	Informe financiero
ANEXO 3	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA PATIO BONITO
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 3.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 3.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 3.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 3.7	Registro Fotográfico
ANEXO 3.8	Bitácora de obra
ANEXO 3.9	Informe financiero
ANEXO 4	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL CIRPIAL
ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL DORADO
ANEXO 5.1	Informe Semanal

ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 5.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 5.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 5.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 5.7	Registro Fotográfico
ANEXO 5.8	Bitácora de obra
ANEXO 5.9	Informe financiero
ANEXO 6	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CALIFORNIA ALTA
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 6.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 6.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 6.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 6.7	Registro Fotográfico
ANEXO 6.8	Bitácora de obra
ANEXO 6.9	Informe financiero
ANEXO 7	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CARACOLÍ
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 7.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 7.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 7.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 7.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 7.7	Registro Fotográfico
ANEXO 7.8	Bitácora de obra
ANEXO 7.9	Informe financiero

ANEXO 8	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA MONTEBELLO
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 8.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 8.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 8.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 8.7	Registro Fotográfico
ANEXO 8.8	Bitácora de obra
ANEXO 8.9	Informe financiero
ANEXO 9	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO
ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL NARANJAL
ANEXO 10.1	Informe Semanal
ANEXO 10.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 10.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 10.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 10.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 10.7	Registro Fotográfico
ANEXO 10.8	Bitácora de obra
ANEXO 10.9	Informe financiero
ANEXO 11	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA LA LINDA
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 11.4	Personal control Aportes y Seguridad Social

ANEXO 11.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 11.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 11.7	Registro Fotográfico
ANEXO 11.8	Bitácora de obra
ANEXO 11.9	Informe financiero
ANEXO 12	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA SANTA RITA
ANEXO 12.1	Informe Semanal
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 12.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 12.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 12.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 12.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 12.7	Registro Fotográfico
ANEXO 12.8	Bitácora de obra
ANEXO 12.9	Informe financiero
ANEXO 13	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA EL VERDAL
ANEXO 13.1	Informe Semanal
ANEXO 13.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 13.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 13.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 13.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 13.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 13.7	Registro Fotográfico
ANEXO 13.8	Bitácora de obra
ANEXO 13.9	Informe financiero
ANEXO 14	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA MIRAFLORES
ANEXO 14.1	Informe Semanal
ANEXO 14.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario

ANEXO 14.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 14.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 14.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 14.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 14.7	Registro Fotográfico
ANEXO 14.8	Bitácora de obra
ANEXO 14.9	Informe financiero
ANEXO 15	FORMATOS MUNICIPIO BELALCÁZAR, VEREDA LA HABANA
ANEXO 15.1	Informe Semanal
ANEXO 15.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 15.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 15.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 15.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 15.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 15.7	Registro Fotográfico
ANEXO 15.8	Bitácora de obra
ANEXO 15.9	Informe financiero
ANEXO 16	FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL NARANJAL
ANEXO 16.1	Informe Semanal
ANEXO 16.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 16.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 16.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 16.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 16.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 16.7	Registro Fotográfico
ANEXO 16.8	Bitácora de obra
ANEXO 16.9	Informe financiero
ANEXO 17	FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO

ANEXO 17.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 18	FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI
ANEXO 18.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19	FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, MEDIA CUESTA
ANEXO 19.1	Informe Semanal
ANEXO 19.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 19.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 19.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 19.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 19.7	Registro Fotográfico
ANEXO 19.8	Bitácora de obra
ANEXO 19.9	Informe financiero
ANEXO 20	FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS
ANEXO 20.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 21	FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS
ANEXO 21.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 22	FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO
ANEXO 22.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 23	FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, ALTO CABUYAL
ANEXO 23.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 24	FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL
ANEXO 24.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 25	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA
ANEXO 25.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 26	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II
ANEXO 26.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario

ANEXO 27	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
ANEXO 27.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 28	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
ANEXO 28.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29	FORMATOS INTERVENTORÍA
ANEXO 29.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 29.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29.3	Relación de correspondencia
ANEXO 29.4	Actas de comité
ANEXO 29.5	Informe de los especialistas
ANEXO 29.6	Actas de reunión
ANEXO 29.7	Informe financiero y presupuestal
ANEXO 29.8	Equipos de la Interventoría
ANEXO 29.9	Plan de Cargas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN

	COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7		
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.		
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	\$ 0,00 M/CTE		
DURACIÓN O PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO:	30/10/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	HASTA EL 30/04/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
G A R A N T I A S			
Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL ANEXO 2 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$116.701.510,20	11/09/2024	30/06/2025
Buen manejo del anticipo	\$196.136.992,00	11/09/2024	30/06/2025
Prestaciones sociales	\$233.403.020,40	11/09/2024	30/04/2028
Calidad del servicio	\$350.104.530,60	31/12/2024	30/04/2030

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informes de los especialistas. Ver Anexo 29.5.

1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Ver Anexo 29.8.

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–003–4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CINP–555–116–5318 solicitando el cambio de algunos profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ANDRES FELIPE CASTILLA MOLINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	BIBIANA PATERNINA
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	JUAN SEBASTIAN ROMERO
PROFESIONAL FINANCIERO	DELCY BARCASNEGRA
PROFESIONAL SOCIAL	ELVIRA FINOL
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	STEFANNY REY RUEDA
APOYO SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DAYANA TORRES JIMÉNEZ

Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver anexo 29.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En este periodo se presentó el acta parcial de costos correspondiente al periodo del informe. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 29.7.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta las pólizas del Contrato de Interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS. Ver anexo 29.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga

La Interventoría en este periodo presentó el seguimiento del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver Anexo 29.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4		MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	53
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	54
1	INTRODUCCIÓN		56
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		57
2.1	Localización		57
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		58
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		58
2.4	Características técnicas del proyecto		58
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		58
3.1	Información general del contrato		58
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		60
3.3	Seguimiento Items no previstos		60
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		60
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		61
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	469
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	478
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		62
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		63
7	Conclusiones y recomendaciones		63
8	Anexos		64
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																								
					VERSION	1																																																								
					PÁGINA																																																									
						FECHA	28/02/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																														
CONVENIO No.: 2073-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 201.837.169,00																																																								
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 3/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.837.169,00																																																								
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																								
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025																																																										
OAC: JAC VEREDA EL SILENCIO				FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																										
				PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/4/25																																																										
				FECHA DE TERMINACIÓN: 11/05/2025																																																										
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 107,00																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																										
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml 150,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml 150,00	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml -</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml -	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																												
Pavimentación	Construcción	ml 150,00																																																												
	Mejoramiento																																																													
	Rehabilitación																																																													
Estructuras	Túneles																																																													
	Puentes																																																													
	Pontones																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																											
Pavimentación	Construcción	ml -	-																																																											
	Mejoramiento																																																													
	Rehabilitación																																																													
Estructuras	Túneles																																																													
	Puentes																																																													
	Pontones																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-																																																											
AVANCE FINANCIERO																																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																										
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>152.164.517,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.564.935,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>43.607.718,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>200.337.170,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			152.164.517,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.564.935,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.607.718,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.337.170,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																											
OBRAS			152.164.517,00																																																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.564.935,00																																																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.607.718,00																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.337.170,00																																																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																										
OBRAS				0,00																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																										
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																														
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																										
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																														
N.A.																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																														
Firma:  Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.



Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

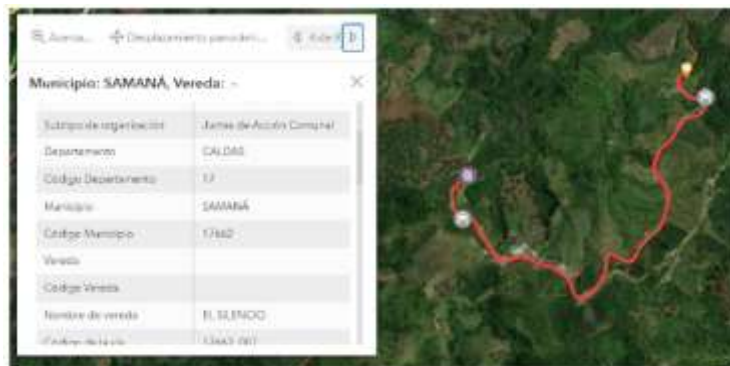


Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. Hasta el momento en que se dio la suspensión No. 1 de este convenio, la Interventoría se encontraba en la etapa de alistamiento realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8
TELÉFONO:	3107225125

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.837.169,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.837.169,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	03/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	DOS (2) MESES 20/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	HASTA EL 30/4/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/05/2025		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 11 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento del Contrato	\$20.183.717,00	27/06/2024	31/10/2025
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	\$10.091.859,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	\$40.367.343,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024
--	------------------	------------	------------

Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió el Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del proyecto.

5.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	114,75	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,51	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4063,44	0

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1.

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024. Este personal a pesar de estar aprobado aún no se encuentra vinculado laboralmente dado que el Convenio se encuentra suspendido.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2073 de 2024.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

6.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

6.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CINP-555-352-0586, CINP-555-388-0661, CINP-555-439-0810 y CINP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió al INVIAS el Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 debidamente firmada.

7.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio por parte de EL INSTITUTO.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2172-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	66
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	67
1	INTRODUCCIÓN		69
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		70
2.1	Localización		70
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		71
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		71
2.4	Características técnicas del proyecto		72
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		72
3.1	Información general del contrato		72
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		74
3.3	Seguimiento ítems no previstos		75
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		75
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		76
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	485
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	500
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	502
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	503
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	504
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	506
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	494
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		77
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A. N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		77
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	78 N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A. N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		79
7	Conclusiones y recomendaciones		79
8	Anexos		80
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		508
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		510

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUZ LILIANA TIBATA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	

			FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)
--	--	--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS	PERIODO MES:	feb-25
-------------------	------------------------------	------------------------	--------	--------------	--------

CONVENIO No.:	2172-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 200.688.268,00
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ -
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 200.688.268,00
		FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
		PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025		
		FECHA DE PRORROGA 02:	N/A		
OAC:	JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO	PLAZO PRORROGA 02:	N/A		
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	N/A		
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	179,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3601-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																		
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>158,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	158,00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																				
Pavimentación	Construcción	ml	158,00																																																																			
	Mejoramiento																																																																					
	Rehabilitación																																																																					
Estructuras	Túneles																																																																					
	Puentes																																																																					
	Pontones																																																																					
Mantenimiento																																																																						
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																			
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																																			
	Mejoramiento																																																																					
	Rehabilitación																																																																					
Estructuras	Túneles																																																																					
	Puentes																																																																					
	Pontones																																																																					
Mantenimiento																																																																						
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																			

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																										
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>151.845.017,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.555.351,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>42.787.900,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.188.268,00</td></tr></table>		VALOR	OBRAS	151.845.017,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.555.351,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.787.900,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.188.268,00		<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>35.067.837</td><td>35.067.837,07</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>21.527.004,20</td><td>21.527.004,20</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>56.594.841,27</td></tr></table>		VALOR	ACUMULADO	OBRAS	35.067.837	35.067.837,07	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.527.004,20	21.527.004,20	VALOR EJECUTADO	0,00	56.594.841,27	
	VALOR																											
OBRAS	151.845.017,00																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.555.351,00																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.787.900,00																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.188.268,00																											
	VALOR	ACUMULADO																										
OBRAS	35.067.837	35.067.837,07																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.527.004,20	21.527.004,20																										
VALOR EJECUTADO	0,00	56.594.841,27																										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																												
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 85.638.483,48	MANO DE OBRA CALIFICADA:	0																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 56.594.841,27	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	28,41%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0																									
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0																									

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO FOTO 1 - Amarre de hierro cunetas - 26/02/25	VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO FOTO 2 - Amarre hierro cunetas - 26/02/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
--	--

Firma 
Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.



Ilustración 3 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 4 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes

mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 5 Inventario y estado inicial

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5
TELÉFONO:	3145933199

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.688.268,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$200.688.268,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.068.827,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.034.414,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.137.654,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			
--	--	--	--

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC mediante correo electrónico de fecha 01/2/25 remitió a la Interventoría el Informe técnico No. 1.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-325-0531 de fecha 05/2/25 remitió a la JAC los formatos de la gestión social para su revisión y firma.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 06/2/25 remitió a la Interventoría los formatos de la gestión ambiental firmados.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 7/2/25, remitió a la Interventoría documentos para pago de profesionales.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió el informe No. 2.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió a la Interventoría el plan de compras.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió a la Interventoría el acta de inicio firmada.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió a la Interventoría el informe de manejo y auxiliar detallado.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió el informe No. 3 de obra del proyecto.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió documentos soportes para el pago de nómina, planillas de seguridad social, etc.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/2/25, remitió informe No. 4 de obra.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/2/25, remitió el plan de compras No. 4 para revisión y aprobación de la Interventoría.

12.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 54 ml, cantidad ejecutada: 41,31 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 18,17 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 89 ml, cantidad ejecutada: 837,84 m3.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	47%	42,67%	85.638.483,48
Ejecutado	32%	28,20%	56.594.841,27
Avance / Retraso	-15%	-14,47%	-29.043.642,21

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	34%	120,87	41,31
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	40%	19%	37,54	18,17
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	-	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	KG	14%	34%	605,65	1.462,11

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 2.1.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 2.3.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Carlos Moreno Moncaleano
Contador	Andrés Felipe Quiceno López
Maestro de Obra	Luis Antonio Diosa Álvarez

Tabla 6 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 2.4.

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$60.041.329,65 de fecha 24/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$4.620.000,00 de fecha 10/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 8.151.178,00 de fecha 13/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$74.981.400,39 correspondiente al 37% del valor del convenio.

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 2.5.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 2.6

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2172 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

Al finalizar el periodo de este informe la OAC se encontraba en el trámite para pagar el costo de la modificación de las pólizas, para así recibir de la aseguradora la respectiva actualización de las pólizas.

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1		 Placa Huella San Diego	60 días	lun 13/01/25	lun 7/04/25	47%	32%
2		 Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
3		Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	34%
4		 Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	40%	19%
5		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	0%	0%
6		 Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	14%	34%

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 85.638.483,48; la Inversión Ejecutada fue de 56.594.841,27. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 29.043.642,21.

13.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

13.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría mediante oficio CIMP-555-296-0464 de fecha 03/2/25 remite a la JAC los formatos de la gestión ambientales para su revisión y firma.
- La Interventoría mediante oficio CIMP-555-325-0531 de fecha 05/2/25 remite a la JAC los formatos de la gestión social para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-338-0557 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC la documentación pendiente sobre las pólizas.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-354-0589 de fecha 10/2/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-393-0669 de fecha 17/2/25, remitió al INVIAS el Plan de Gestión Social.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-413-0701 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-462-0919 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

14.1.2 Actividades Técnicas

El día 13 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 05 con presencia de JAC vereda Tarropintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de la carta justificando los reembolsos al presidente de la JAC.

El día 14 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda Tarropintado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la problemática para acceso de material a la obra. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de la carta para socializar la problemática al INVIAS.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 54 ml, cantidad ejecutada: 41,31 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 18,17 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 89 ml, cantidad ejecutada: 837,84 m3.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. Se recibió el reporte comprobante de operación del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de diciembre 2024. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de giro de rendimientos correspondiente al mes de enero 2025.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 32% e Inversión de 28% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 54 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud

ejecutada: 51 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 51 ml.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$74.981.400,39 correspondiente al 37% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

16 ANEXO

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 2.7.

16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

16.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 2.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	83
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	84
1	INTRODUCCIÓN		86
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		87
2.1	Localización		87
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		88
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		88
2.4	Características técnicas del proyecto		89
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		89
3.1	Información general del contrato		89
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		91
3.3	Seguimiento Items no previstos		92
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		92
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		93
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	522
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	537
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	539
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	540
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	541
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	543
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	531
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		95
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		95
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	95
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		97
7	Conclusiones y recomendaciones		98
8	Anexos		99
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		545
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		547

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$203.482.844,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.



Ilustración 6 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

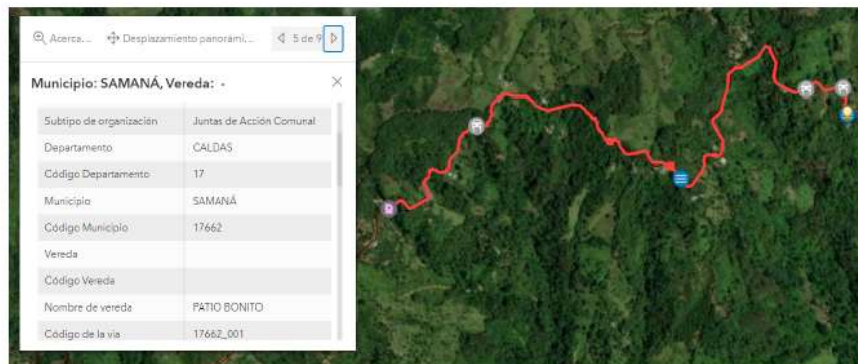


Ilustración 7 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Patio Bonito, corregimiento de Florencia, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo con una longitud de 2,40 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Patio Bonito y el punto final de referencia es PR02+400 a 2,40 km de Patio Bonito.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 8 Inventario y estado inicial JAC Patio Bonito

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$203.482.844,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$203.482.844,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.348.285,00	17/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.174.143,00	17/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.696.569,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	17/07/2024	31/12/2024

Tabla 7 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/2/25 remitió la Hoja de vida para el cambio Ingeniero Residente.
- Reunión de comité operativo No. 5 con fecha de 6/2/25.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió el permiso de extracción de agua.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió el plan de compras.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 13/2/25, remitió el resumen de compras, plan de trabajo y cronograma de obra.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, solicitó el Acta de Socialización del proyecto.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió el Acta de Inicio de ejecución firmada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió el desembolso del primero 40%.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió cartas de transferencia de retención en la fuente y reteica.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 20/2/25, remitió documentos ambientales (Autorización para uso del terreno y Autorización para extracción de agua).
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/2/25, remitió las subsanaciones de los documentos del primer desembolso.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió el certificado de extracción de agua.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 23/2/25 y 24/2/25, remitió el segundo plan de compras.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/2/25, remitió los documentos correspondientes a la solicitud de desembolso No. 2 para revisión de la Interventoría.

19.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 70 ml, cantidad ejecutada: 2,08 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 70 ml, cantidad ejecutada: 53,55 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 441,89 m3.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	12%	7,76%	15.788.429,20
Ejecutado	19%	11,55%	23.504.813,38
Avance / Retraso	7%	3,79%	7.716.384,18

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	31%	54%	1,20	2,08
2	Subbase Granular Clase C	M3	35%	54%	34,81	53,55
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	-	-
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	-	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	KG	0%	12%	-	441,89
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	-	-

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	-	-
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	-	-
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	-	-
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	KG	0%	0%	-	-
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	-	-
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	-	-
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	-	-

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 3.1.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 3.3.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida del personal remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-182-0106 de fecha 08 de enero de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Daniel Alejandro Guerra
Contador	Alejandro García

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Daniel Alejandro Guerra
Maestro de obra	Rogelio Loaiza

Tabla 8 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 3.4.

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$46.889.531,11 de fecha 20/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$46.889.531,11 correspondiente al 23% del valor del convenio.

.

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 3.5.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 3.6

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2435 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Módulo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1		CONVENIO 21113 -2024	53 días	lun 17/02/25	vie 18/04/25	12%	13%
2		ETAPA DE INICIO	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
3		Prerentista	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
4		CONSTRUCCIÓN PLACA BUELA	48 días	sáb 22/02/25	vie 18/04/25	8%	16%
5		Estación de control a la Ciénaga	12 días	sáb 22/02/25	sáb 04/03/25	31%	64%
6		Subvención Grupos Ciénaga C	15 días	vie 28/02/25	lun 18/03/25	36%	64%
7		Control de tránsito reubicación 21 MPa (D) - ancha en vía	30 días	sáb 15/03/25	vie 18/04/25	0%	0%
8		Control de tránsito reubicación 14 MPa (G)	30 días	jue 03/03/25	sáb 04/04/25	0%	0%
9		Acero de refuerzo de FY=4.200 Kg/m ² 2 (80.000 PSI)	25 días	vie 11/03/25	sáb 04/04/25	0%	12%

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 15.788.429,20; la Inversión Ejecutada fue de 23.504.813,38. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que ejecutada por valor de 7.716.384,18.

20.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

20.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CINP-555-352-0586, CINP-555-388-0661, CINP-555-439-0810 y CINP-555-451-0898.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-298-0489 de fecha 04/2/25 aclaró a la JAC la solicitud de los documentos ambientales.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-309-0500 de fecha 04/2/25 reiteró a la JAC la solicitud para la consignación de rendimientos financieros.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-320-0513 de fecha 05/2/25 aprobó la hoja de vida del Ingeniero residente presentado por la JAC.
- Reunión de comité operativo No. 5 con fecha de 6/2/25.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-339-0558 de fecha 07/2/25 solicitó a la JAC la documentación actualizada de las pólizas.
- La Interventoría mediante oficios CINP-555-372-0611 y CINP-555-381-0630 de fechas 11/2/25 y 12/2/25 solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-388-0661 de fecha 14/2/25, remitió al INVIAS los informes semanales No. 15.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-386-0653 de fecha 14/2/25, remitió la aprobación de la hoja de vida del maestro de obra.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-390-0660 de fecha 14/2/25, remitió el Acta de socialización solicitada por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-414-0702 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-400-0684 de fecha 18/2/25, solicitó una reunión social virtual.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-421-0723 de fecha 19/2/25, solicitó documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-431-0733 de fecha 19/2/25, remitió formatos de gestión social para la firma de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-443-0824 de fecha 24/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por el no giro de los rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-463-0920 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

21.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 05 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la documentación entregada por la JAC. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de plan de compras No. 1 y orden de desembolso. 2. Envío de Plan de Compra incluyendo cotizaciones y debidamente firmado. 3. Reunión No. 6 del Comité Operativo si se cumplen compromisos.

El día 10 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la documentación entregada por la JAC y se estableció compromisos para la entrega de orden de desembolsos para inicio de obra. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de orden de desembolso. Envío de licencias ambientales del proveedor. 2. Reunión No. 6 del Comité Operativo y envío de acta de inicio si se cumplen los compromisos. 3. Envío de acta de inicio e Inicio de obra el 17/02/25 si se cumplen los compromisos.

El día 26 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la documentación entregada por la JAC y se estableció compromisos para la entrega de orden de desembolsos para inicio de obra. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de orden de desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 70 ml, cantidad ejecutada: 2,08 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 70 ml, cantidad ejecutada: 53,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 27 ml, cantidad ejecutada: 441,89 m3.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 19% e Inversión de 12% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 70 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 70 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 27 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$46.889.531,11 correspondiente al 23% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

●

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 3.7.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 3.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4		MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	101
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	102
1	INTRODUCCIÓN		104
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		105
2.1	Localización		105
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		106
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		106
2.4	Características técnicas del proyecto		106
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		106
3.1	Información general del contrato		106
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		108
3.3	Seguimiento Items no previstos		108
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		108
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		110
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	559
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	568
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		110
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		111
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	111
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		112
7	Conclusiones y recomendaciones		112
8	Anexos		112
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.



Ilustración 9 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 10 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.898.462,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.898.462,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Patronal			
----------	--	--	--

Tabla 9 Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19/2/25, remitió la solicitud de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1, para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,57	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	7,30	0

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 4.1.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2159 de 2024

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.4 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.5 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 18/1/25, remitió al INVIAS el Acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio a diciembre 2024 y enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría realizará la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría realizará la reunión de conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	115
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	116
1	INTRODUCCIÓN		118
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		119
2.1	Localización		119
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		120
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		120
2.4	Características técnicas del proyecto		121
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		121
3.1	Información general del contrato		121
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		123
3.3	Seguimiento Items no previstos		123
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		123
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		124
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	575
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	590
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	592
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	593
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	594
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	596
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	584
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		126
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		126
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	126
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		128
7	Conclusiones y recomendaciones		128
8	Anexos		129
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		598
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		600

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																												
			VERSION	1																																																												
			PÁGINA																																																													
				FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: feb-25																																																												
CONVENIO No.: 2124-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 200.674.007,00																																																												
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO: 30/08/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																												
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.674.007,00																																																												
		FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2025		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																												
		PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																												
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025																																																														
OAC: JAC VEREDA EL DORADO		FECHA DE PRORROGA 02: N/A																																																														
		PLAZO PRORROGA 02: N/A																																																														
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N/A																																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																														
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>151,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	151,00	Mejoramiento			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones				Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones				Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																														
Pavimentación	Construcción	ml	151,00																																																													
	Mejoramiento																																																															
Estructuras	Túneles																																																															
	Puentes																																																															
Pontones																																																																
	Mantenimiento																																																															
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																													
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																													
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																													
	Mejoramiento																																																															
Estructuras	Túneles																																																															
	Puentes																																																															
Pontones																																																																
	Mantenimiento																																																															
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																													
AVANCE FINANCIERO																																																																
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																													
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>151.039.601,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.531.188,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.603.218,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.174.007,00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	151.039.601,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.603.218,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.174.007,00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>15.542.121</td><td>15.542.121,40</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>17.575.684,00</td><td>17.575.684,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>33.117.805,40</td><td>33.117.805,40</td></tr></tbody></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	15.542.121	15.542.121,40	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		0,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.575.684,00	17.575.684,00	VALOR EJECUTADO	33.117.805,40	33.117.805,40																																		
	VALOR																																																															
OBRAS	151.039.601,00																																																															
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00																																																															
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.603.218,00																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.174.007,00																																																															
	VALOR	ACUMULADO																																																														
OBRAS	15.542.121	15.542.121,40																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		0,00																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.575.684,00	17.575.684,00																																																														
VALOR EJECUTADO	33.117.805,40	33.117.805,40																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 89.535.696,74			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 33.117.805,40			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 16,63%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1																																																													
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1																																																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																
FOTO 1 - Señalización de obra - 26/02/2025			FOTO 2 - Concreto para huellas - 26/02/2025																																																													
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																
Firma: Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

**OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA
VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO
DE
CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..”**



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de \$200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 11 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 12 Localización vía a Intervénir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas – El Dorado con una longitud de 0,71 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 La Punta de la Inmaculada al frente de los potreros de Don Gonzalo y el punto final de referencia es PR 0+710 salida hacia la arenera al frente de Eliseo Villarraga.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 13 Inventario y estado inicial

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.674.007,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$200.674.007,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.067.401,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.033.701,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.134.802,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 10 Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 03/02/25 remitió al INVIAS una solicitud de mejora de la Subrasante en el tramo 3 de la vía para la placa huella.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió los resultados los ensayos de CBR.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió documentos soportes para el pago de nómina, planillas de seguridad social, etc.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/2/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría.

33.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 40 ml, cantidad ejecutada: 1,17 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 40 ml, cantidad ejecutada: 30,60 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 13 ml, cantidad ejecutada: 4,74 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 33 ml, cantidad ejecutada: 6,13 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 13 ml, cantidad ejecutada: 218,18 m3.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	44%	44,62%	89.535.696,74
Ejecutado	14%	16,50%	33.117.805,40
Avance / Retraso	-30%	-28,11%	-56.417.891,34

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	26%	4,41	1,17
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	26%	115,52	30,60
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	31%	5%	28,43	4,74
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	12%	22%	3,37	6,13
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	36%	5%	1.520,51	218,18

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 5.1.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 5.3.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-054-4924 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Albeiro López Clavijo
Contador	Andrés Antonio Quiceno López
Maestro de Obra	Jhon Fredy Sánchez

Tabla 11 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 5.4.

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$57.326.200,80 de fecha 24/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$4.620.000 de fecha 10/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$7.679.819,00 de fecha 14/04/2025.

Desembolso Total por valor de \$69.702.487,80 correspondiente al 35% del valor del convenio

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 5.5.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 5.6.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2124 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

N	Descripción	Cantidad	Unidad	Cl. Concepto	Clasificación	Fin	Costo	% prog	% completado
0	ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO NACIONAL DE MAYA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNITARIA DE LA VEREDA INFORMAR DEL MUNICIPIO DE INFORMAR DEL DESPLAZAMIENTO DE CALLES INFORMAR EL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			01	Inv 1000000	Inv 1000000	\$ 15.1.000.000,00	40%	10%
1	CONSTRUCCIÓN PLAZA NUEVA			02	Inv 1000000	Inv 1000000	\$ 15.1.000.000,00	40%	10%
2	Construcción de la Plaza Nueva	4,41	M2	02	Inv 1.300.000	Inv 1.300.000	\$ 11.0.000,00	100%	20%
3	Edificio Comunal Clave C	116,62	M2	02	Inv 1.700.000	Inv 1.700.000	\$ 25.000.000,00	100%	20%
4	Construcción de la Plaza Nueva 20 M2 (07) - construye la sala	01,70	M2	04	Inv 7.000.000	Inv 1.000.000	\$ 102.000.000,00	20%	0%
5	Construcción de la Plaza Nueva 1-000 (03)	25,00	M2	03	Inv 2.000.000	Inv 1.000.000	\$ 12.000.000,00	50%	20%
6	Area de estacionamiento de PV = 4.000 M2 (02) = 2.000.000,00	4.200,00	M2	05	Inv 2.000.000	Inv 1.000.000	\$ 20.000.000,00	20%	0%

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 89.535.696,74; la Inversión Ejecutada fue de 33.117.805,40. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 56.417.891,34.

34.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

34.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría mediante oficio CIMP-555-324-0530 de fecha 5/2/25 remite a la JAC los formatos de la gestión social para su revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-340-0559 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC la documentación actualizada de las pólizas.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-368-0607 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-410-0694 de fecha 18/2/25, programó una reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-415-0703 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-423-0725 de fecha 19/2/25, solicitó a la JA documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-464-0921 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

35.1.2 Actividades Técnicas

El día 12 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda El Dorado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la aprobación de documentación entregada, compromisos para la entrega de documentación para inicio de obra y citación comité operativo 03 y fecha de inicio de obra. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de orden de desembolso con soportes.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 40 ml, cantidad ejecutada: 1,17 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 40 ml, cantidad ejecutada: 30,60 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 13 ml, cantidad ejecutada: 4,74 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella, longitud ejecutada: 33 ml, cantidad ejecutada: 6,13 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 13 ml, cantidad ejecutada: 218,18 m3.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió el soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de Julio a Diciembre 2024, y se encuentra a la espera de la solicitud de giro del mes de enero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 14% e Inversión de 16% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 40 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 40 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 13 ml; Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) 33 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 13 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$69.702.487,80 correspondiente al 35% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

•

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 5.7.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 5.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	131
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	132
1	INTRODUCCIÓN		134
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		135
2.1	Localización		135
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		136
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		136
2.4	Características técnicas del proyecto		136
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		136
3.1	Información general del contrato		136
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		138
3.3	Seguimiento Items no previstos		138
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		138
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		139
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	626
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	641
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	643
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	644
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	645
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	647
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	635
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		141
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		141
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	141
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		142
7	Conclusiones y recomendaciones		143
8	Anexos		144
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		649
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		651

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<table><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEPI-MN-IN-15-FR-2</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>1</td></tr><tr><td>PÁGINA</td><td></td></tr></table>	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	VERSION	1	PÁGINA																																																																												
CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																		
VERSION	1																																																																																		
PÁGINA																																																																																			
		<table><tr><td>FECHA</td><td>28/02/2025 (Día / Mes / Año)</td></tr></table>	FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																															
FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																																			
CONVENIO No.: 2058-2024																																																																																			
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																			
OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA																																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																																			
<table><tr><td colspan="4">ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</td><td colspan="4">AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</td></tr><tr><td colspan="2">ACTIVIDAD</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD</td><td colspan="2">ACTIVIDAD</td><td>UNIDAD</td><td>CANTIDAD MES</td><td>CANTIDAD ACUMULAD</td></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>155,00</td><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td rowspan="2">Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	155,00	Pavimentación	Construcción	ml	-	-	Mejoramiento			Mejoramiento				Rehabilitación			Rehabilitación				Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles				Puentes			Puentes				Pontones			Pontones				Mantenimiento				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																															
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																											
Pavimentación	Construcción	ml	155,00	Pavimentación	Construcción	ml	-	-																																																																											
	Mejoramiento				Mejoramiento																																																																														
	Rehabilitación					Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles																																																																														
	Puentes				Puentes																																																																														
	Pontones				Pontones																																																																														
Mantenimiento				Mantenimiento																																																																															
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-																																																																											
<table><tr><td colspan="2">VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</td><td colspan="2">VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES</td></tr><tr><td></td><td>VALOR</td><td></td><td>VALOR</td><td></td><td>ACUMULADO</td></tr><tr><td>OBRAS</td><td>151.871.177,00</td><td>OBRAS</td><td>36.309</td><td>OBRAS</td><td>36.309,19</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.556.135,00</td><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.606.545,00</td><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>17.841.078,32</td><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>17.841.078,32</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>200.033.857,00</td><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>VALOR EJECUTADO</td><td>17.877.387,51</td></tr></table>			VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES			VALOR		VALOR		ACUMULADO	OBRAS	151.871.177,00	OBRAS	36.309	OBRAS	36.309,19	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.556.135,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.606.545,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.841.078,32	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.841.078,32	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.033.857,00	VALOR EJECUTADO	0,00	VALOR EJECUTADO	17.877.387,51																																															
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																	
	VALOR		VALOR		ACUMULADO																																																																														
OBRAS	151.871.177,00	OBRAS	36.309	OBRAS	36.309,19																																																																														
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.556.135,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-																																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.606.545,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.841.078,32	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.841.078,32																																																																														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.033.857,00	VALOR EJECUTADO	0,00	VALOR EJECUTADO	17.877.387,51																																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																			
INVERSIÓN EN OBRA																																																																																			
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 74.281.534,36																																																																																			
MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 17.877.387,51																																																																																			
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																																			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 8,94%																																																																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																																			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																																			
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																			
<div><div></div><div></div></div>																																																																																			
FOTO 1 - TRANSPORTE DE MATERIAL - 26/02/25																																																																																			
FOTO 2 - EXCAVACIÓN MANUAL - 26/02/25																																																																																			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																			
Firma: [Firma] Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 08202-342871 ATL																																																																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																																			

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.



Ilustración 14 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

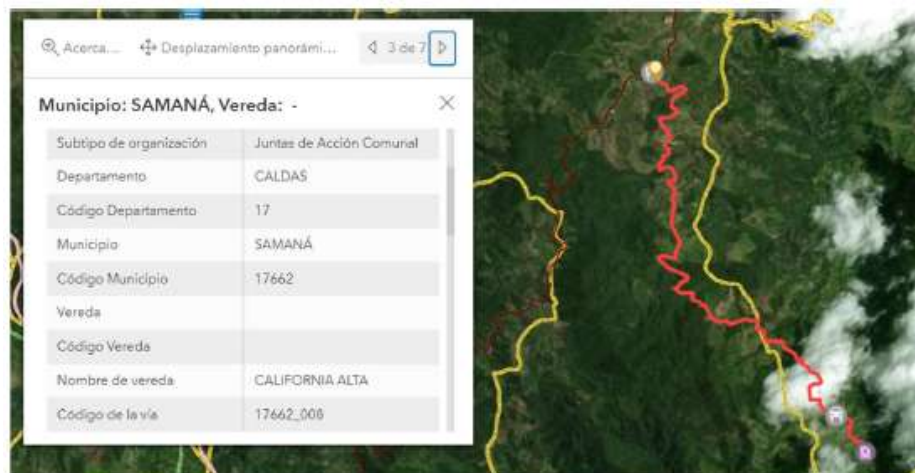


Ilustración 15 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta con una longitud de 6,20 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 puente quebrada La Vega y el punto final de referencia es PR 6+200 La Y California Alta. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
---------------------------	--------------------

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA				
NIT.	810.003.756-1				
TELÉFONO:	3124209265				
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024				
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.533.857,00 M/CTE				
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE				
VALOR TOTAL:	\$201.533.857,00 M/CTE				
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE				
ESTADO:	EN EJECUCIÓN				
FECHA DE INICIO:	30/08/2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024				
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25				
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025				
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ				
GARANTÍAS					
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999					
Amparos		Valor Asegurado		Vigencias	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0					
Cumplimiento		\$20.153.386,00	26/06/2024	31/10/2025	
Prestaciones sociales		\$10.076.693,00	26/06/2024	31/12/2027	
Estabilidad de la obra		\$40.306.772,00	31/12/2024	31/12/2029	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0					

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	26/06/2024	31/12/2024
--	------------------	------------	------------

Tabla 12 Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió los documentos para el pago de profesionales.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, remitió el formato de transferencia para pagar retefuente del mes de enero.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió los resultados de CBR.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió documentos soportes para el pago de nómina, planillas de seguridad social, etc.

40.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 50 ml, cantidad ejecutada: 1,45 m3.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	39%	36,86%	74.281.534,36
Ejecutado	2%	8,87%	17.877.387,52
Avance / Retraso	-37%	-27,99%	-56.404.146,84

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	32%	4,50	1,45
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	0%	118,58	-
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	27%	0%	24,84	-
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27%	0%	7,73	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	27%	0%	1.145,85	-

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 6.1.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 6.3.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-096-5088 de fecha 03 de diciembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francisco Madera Madrid
Contador	Eneriet Gómez Cuellar
Maestro de Obra	Willian Casbuenas Vásquez

Tabla 13 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 6.4.

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 60.715.551,28 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 probado por valor de \$ 4.620.000,00 de fecha 11/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 1.275.000,00 de fecha 17/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$66.615.270,08 correspondiente al 33% del valor del convenio.

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 6.5.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 6.6

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2058 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1		CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	38%	2%
2		INICIO	65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	38%	2%
3		Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	32%
4		Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	0%
5		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	27%	0%
6		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	27%	0%
7		Aceros de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	27%	0%
8		FINAL	0 días	vie 11/04/25	vie 11/04/25	0%	0%

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 74.281.534,36; la Inversión Ejecutada fue de 17.877.387,52. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 56.404.146,84.

41.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

41.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-341-0560 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC la documentación actualizada de las pólizas.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-373-0612 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-404-0688 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-416-0704 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-432-0753 de fecha 19/2/25, remitió el Acta de inicio de ejecución, con fecha de inicio 20/1/25.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-435-0789 de fecha 20/2/25, remitió los formatos ambientales para la revisión de la JAC.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió documentos soportes para el pago de nómina, planillas de seguridad social, etc.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-465-0922 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

42.1.2 Actividades Técnicas

El día 25 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 02 con presencia de JAC vereda California Alta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la aprobación de documentación entregada y compromisos para la entrega de documentación para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 50 ml, cantidad ejecutada: 1,45 m3.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para

validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió el soporte giro de los rendimientos del periodo 2024 al Tesoro Nacional, se encuentra a la espera de la solicitud de giro de rendimientos del mes de enero 2025 por parte de la JAC

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 2% e Inversión de 8% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 50 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$66.615.270,08 correspondiente al 33% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

- 7.3.2. *Un (1) profesional social*
- 7.3.3. *Un (1) profesional jurídico*
- (...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 6.7.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 6.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	146
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	147
1	INTRODUCCIÓN		149
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		150
2.1	Localización		150
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		151
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		151
2.4	Características técnicas del proyecto		152
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		152
3.1	Información general del contrato		152
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		154
3.3	Seguimiento Items no previstos		155
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		155
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		139
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	661
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	677
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	679
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	583
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	584
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	683
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	685
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		157
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		157
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	158
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		160
7	Conclusiones y recomendaciones		160
8	Anexos		161
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		685
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		687

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSION</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>																																																																												
		<div>FECHA</div> <div>28/02/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																																												
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCION VIAS REGIONALES</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CALDAS</div> <div>PERIODO MES:</div> <div>feb-25</div>																																																																														
<div>CONVENIO No.:</div> <div>2119-2024</div> <div>PLAZO INICIAL:</div> <div>HASTA EL 31/12/24</div> <div>FECHA DE INICIO:</div> <div>30/08/2024</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</div> <div>HASTA EL 31/12/24</div> <div>FECHA DE PRORROGA 01:</div> <div>24/12/2024</div> <div>PLAZO PRORROGA 01:</div> <div>4 MESES</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:</div> <div>30/04/2025</div> <div>FECHA DE PRORROGA 02:</div> <div>N/A</div> <div>PLAZO PRORROGA 02:</div> <div>N/A</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:</div> <div>N/A</div> <div>PLAZO ACUMULADO (DÍAS):</div> <div>182,00</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA) :</div> <div>\$ 203.002.573,00</div> <div>VALOR ADICIONALES (incluido IVA):</div> <div>\$ -</div> <div>VALOR ACUMULADO (incluido IVA):</div> <div>\$ 203.002.573,00</div> <div>ANTICIPO CONCEDIDO:</div> <div>\$ -</div> <div>ANTICIPO AMORTIZADO:</div> <div>\$ -</div>																																																																														
<div>OBJETO:</div> <div>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div>																																																																														
<div>OAC:</div> <div>JAC VEREDA CARACOLÍ</div>																																																																														
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>3601-2024</div> <div>INTERVENTOR:</div> <div>CONSORCIO CCSO</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>LUZ LILIANA TIBATÁ</div>																																																																														
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento			Rehabilitación		Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones		Mantenimiento			Otros			(Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<div>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-		Mejoramiento				Rehabilitación			Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones			Mantenimiento				Otros				(Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																												
Pavimentación	Construcción	ml																																																																												
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros																																																																														
(Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																																												
		-																																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																											
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																																											
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros																																																																														
(Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																											
<div>AVANCE FINANCIERO</div> <div>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</div> <table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>153.194.886,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.595.847,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.711.840,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>201.502.573,00</td></tr></tbody></table> <div>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</div> <div>\$ 124.051.237,38</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div> <div>\$ 71.403.071,35</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</div> <div>35,44%</div> <div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA:</div> <div>2</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:</div> <div>6</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</div> <div>1</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</div> <div>9</div>				VALOR	OBRAS	153.194.886,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.595.847,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.711.840,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.502.573,00																																																																		
	VALOR																																																																													
OBRAS	153.194.886,00																																																																													
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.595.847,00																																																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.711.840,00																																																																													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.502.573,00																																																																													
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>VEREDA CARACOLÍ</div><div>FOTO 1 - Concreto ciclopeo - 24/02/25</div></div> <div><div>VEREDA CARACOLÍ</div><div>FOTO 2 - Compactación de subbase - 25/02/25</div></div>																																																																														
<div>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</div>																																																																														
<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLÍ** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de \$203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.



Ilustración 16 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 17 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí con una longitud de 2,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 en el desvío desde el Corregimiento de Pueblo Nuevo hacia Caracolí, y el punto final de referencia es el PR 2+600 hacia la vereda Caracolí. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo.



Ilustración 18 Inventario y estado inicial

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 203.002.573,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$ 203.002.573,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1:	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.300.258,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.150.129,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.600.515,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

Tabla 14 Información general del Convenio 2119-2024 Municipio Samaná.

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC mediante correo electrónico de fecha 3/2/25 remitió a la Interventoría la documentación ajustada para el desembolso No. 1
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 3/2/25 remitió a la Interventoría la notificación sobre el ancho de vía permitido.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 7/2/25 solicita al Banco Avvillas los extractos bancarios de la cuenta del proyecto.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 10/2/25 remite a la Interventoría el permiso de ancho de la placa huella.
- La JAC mediante correo electrónico de fecha 13/2/25 remite a la Interventoría el plan de compras para el desembolso 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió nómina electrónica.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió documento de componente social.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 17/1/25, solicitó aprobación de motobomba estacionaria, y desagüe superficial de placa huella.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió documentos de cambio de proveedor de la ferretería.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió documentación faltante para el pago del trabajador Yeison Botero.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/2/25, remitió la propuesta social.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 20/2/25, remitió el plan de compras y su corrección.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió el plan de compras para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/2/25, remitió la solicitud de desembolso No. 3.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/2/25, remitió la cuenta de cobro del residente correspondiente al desembolso No. 2.

47.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 76,50 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 31,16 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 22 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 1.430,59 m3.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	61%	61,11%	124.051.237,38
Ejecutado	42%	35,17%	71.403.071,34
Avance / Retraso	19%	25,93%	-52.648.166,04

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	64%	119,34	76,50
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	31%	33%	29,55	31,16

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJE.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJE.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	58%	14%	16,96	4,12
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	50%	33%	2.187,96	1.430,59

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 7.3.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-043-4877 de fecha 18 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Mario Cardenas
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	José Daniel González Bedoya

Tabla 15 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 7.4.

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$51.028.008,66 de fecha 5/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$51.028.008,66 correspondiente al 25% del valor del convenio.

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 7.5.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 7.6

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2119 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Medio de comunicación	Nombre de tarea	Descripción	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1		CONVENIO 2015 -2024	53 días	mar 21/01/25	abr 22/03/25	61%	42%
2		ETAPA REVISIÓN	5 días	mar 21/01/25	dom 24/01/25	100%	100%
3		Presidencia	5 días	mar 21/01/25	dom 24/01/25	100%	100%
4		CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	48 días	dom 24/01/25	abr 22/03/25	33%	33%
5		Extracción de arena sin Clasificar	12 días	dom 24/01/25	dom 04/02/25	100%	100%
6		Subida a Gravelier Clase C	15 días	abr 14/02/25	mar 18/03/25	100%	84%
7		Control de reforzamiento en la línea 21 MPa (D) - en la línea 14 MPa (G)	30 días	dom 18/02/25	abr 22/03/25	31%	33%
8		Control de Cidspen Rm en la línea 14 MPa (G)	30 días	abr 22/03/25	jun 13/05/25	58%	14%
9		Acero de refuerzo de FY =4.200 Kg/cm ² (20.000 PSI)	25 días	abr 12/03/25	jun 13/05/25	50%	33%

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 124.051.237,38; la Inversión Ejecutada fue de 71.403.071,34. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 52.648.166,04.

48.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

48.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría mediante oficio CIMP-555-307-0498 de fecha 04/02/25 reiteró a la JAC la solicitud de dar trámite a la consignación de los rendimientos financieros.
- La Interventoría mediante oficio CIMP-555-323-0529 de fecha 05/02/25 remitió a la JAC los formatos de la gestión social para su revisión y firmas.
- La Interventoría mediante oficio CIMP-555-329-0542 de fecha 06/02/25 dio respuesta a la JAC sobre el ancho de la vía y de la placa huella.

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-337-0556 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC las pólizas actualizadas y soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-360-0595 de fecha 10/2/25, remitió a la JAC los formatos ambientales para su firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-366-0605 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-411-0695 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-412-0700 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-433-0755 de fecha 19/2/25, remitió respuesta a solicitudes de motobomba y desagüe de placa huella realizadas por la JAC.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 4 de fecha 21/2/25

49.1.2 Actividades Técnicas

El día 12 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 03 con presencia de JAC vereda Caracolí, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó los formatos a utilizar para las ordenes de desembolso. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 21 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda Caracolí, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se aprobó el plan de compras. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 76,50 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 31,16 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 22 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 51 ml, cantidad ejecutada: 1.430,59 m3.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de enero 2025.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 42% e Inversión de 35% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 100 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 51 ml; Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 22 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 51 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$51.028.008,66 correspondiente al 25% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 7.7.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 7.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	163
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	164
1	INTRODUCCIÓN		166
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		167
2.1	Localización		167
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		168
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		168
2.4	Características técnicas del proyecto		168
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		168
3.1	Información general del contrato		168
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		170
3.3	Seguimiento Items no previstos		171
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		171
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		171
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	702
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	717
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	719
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	721
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	722
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	723
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	711
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		173
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		173
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	173
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		63
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		175
7	Conclusiones y recomendaciones		175
8	Anexos		176
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		725
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		727

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																															
			VERSION	1																																																															
			PÁGINA																																																																
				FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: feb-25																																																															
CONVENIO No.: 2173-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 201.229.002,00																																																															
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																															
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.229.002,00																																																															
		FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																															
		PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																															
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025																																																																	
OAC: JAC VEREDA MONTEBELLO		FECHA DE PRORROGA 02: N/A																																																																	
		PLAZO PRORROGA 02: N/A																																																																	
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N/A																																																																	
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 179,00																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-			-	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																	
Pavimentación	Construcción	ml																																																																	
	Mejoramiento																																																																		
	Rehabilitación																																																																		
Estructuras	Túneles																																																																		
	Puentes																																																																		
	Pontones																																																																		
Mantenimiento																																																																			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																																	
		-																																																																	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																																
	Mejoramiento																																																																		
	Rehabilitación																																																																		
Estructuras	Túneles																																																																		
	Puentes																																																																		
	Pontones																																																																		
Mantenimiento																																																																			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																
		-	-																																																																
AVANCE FINANCIERO																																																																			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>152.578.686,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.577.361,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>42.572.955,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.729.002,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	OBRAS	152.578.686,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.577.361,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.572.955,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.729.002,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>5.547.779</td><td>5.547.779,15</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>14.339.050,34</td><td>14.339.050,34</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>19.886.829,49</td><td>19.886.829,49</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	ACUMULADO	OBRAS	5.547.779	5.547.779,15	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.339.050,34	14.339.050,34	VALOR EJECUTADO	19.886.829,49	19.886.829,49																																					
	BÁSICO																																																																		
OBRAS	152.578.686,00																																																																		
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.577.361,00																																																																		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.572.955,00																																																																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.729.002,00																																																																		
	BÁSICO	ACUMULADO																																																																	
OBRAS	5.547.779	5.547.779,15																																																																	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-																																																																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.339.050,34	14.339.050,34																																																																	
VALOR EJECUTADO	19.886.829,49	19.886.829,49																																																																	
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																			
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 74.157.623,58			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 19.886.829,49			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 9,96%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																			
FOTO 1 - COMPACTACIÓN DE SUBBASE - 24/02/25			FOTO 2 - EXCAVACIÓN MANUAL - 24/02/25																																																																
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																			
Firma: Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																																																			

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de \$201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 24 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.



Ilustración 19 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

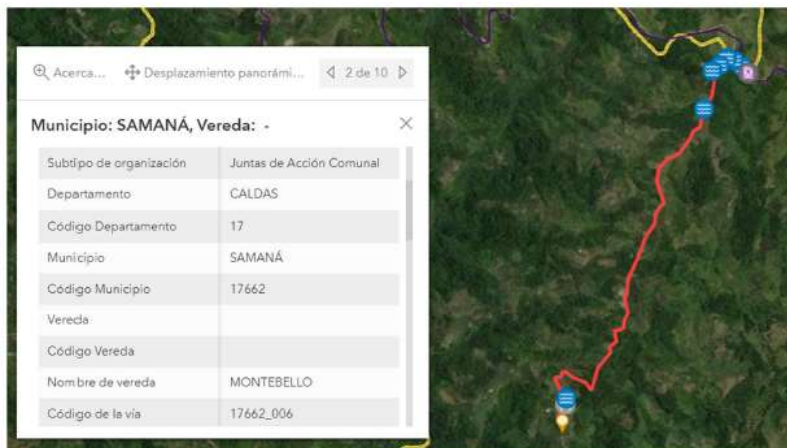


Ilustración 20 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello con una longitud de 2,50 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 ramal izquierdo hacia la vereda Montebello y el punto final de referencia es PR 2+500 a 2500 metros del inicio en el ramal izquierdo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
---------------------------	--------------------

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO			
NIT.	900.047.290-7			
TELÉFONO:	3124209265			
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.229.002,00 M/CTE			
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE			
VALOR TOTAL:	\$ 201.229.002,00 M/CTE			
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE			
ESTADO:	EN EJECUCIÓN			
FECHA DE INICIO:	02/09/2024			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024			
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25			
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025			
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ			
GARANTÍAS				
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300				
Amparos		Valor Asegurado	Vigencias	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0				
Cumplimiento		\$20.122.901,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales		\$10.061.451,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra		\$40.245.801,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0				

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024
--	------------------	------------	------------

Tabla 16 Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió documentos ambientales solicitados.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/2/25, remitió el formato de auxiliar detallado.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió las cartas de transferencia de retención en la fuente y reteica.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió los resultados de CBR.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/2/25, remitió el plan de compras No. 2 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/2/25, remitió los documentos correspondientes a la solicitud de desembolso No. 2 para revisión y aprobación de la Interventoría.

54.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 0,89 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 22,95 m3.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	38%	36,85%	74.157.623,58
Ejecutado	3%	9,88%	19.886.829,49
Avance / Retraso	-35%	-26,97%	-54.270.794,09

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	20%	4,41	0,89
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	20%	113,99	22,95
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	27%	0%	24,31	-
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	27%	0%	7,57	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	27%	0%	1.113,85	-

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 8.1.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 8.3.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-051-4921 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Williams Casasbuenas Vásquez

Tabla 17 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 8.4.

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$48.598.321,07 de fecha 13/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$48.598.321,07 correspondiente al 24% del valor del convenio.

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 8.5.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 8.6

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2173 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1		CONVENIO 2173DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO		65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	38%	3%
2		INICIO		65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	38%	3%
3		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	20%
4		Subbase Granular Clase C	M3	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	20%
5		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	27%	0%
6		Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	27%	0%
7		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (f	KG	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	27%	0%
8		FINAL		0 días	vie 11/04/25	vie 11/04/25	0%	0%

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 74.157.623,58; la Inversión Ejecutada fue de 19.886.829,49. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 54.270.794,09.

55.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

55.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CINP-555-352-0586, CINP-555-388-0661, CINP-555-439-0810 y CINP-555-451-0898.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-301-0492 de fecha 04/2/25 reiteró a la JAC la indicación de solicitar extractos bancarios y gestionar el pago de rendimientos financieros.
- La Interventoría mediante oficio CINP-555-311-0502 de fecha 04/2/25 reiteró a la JAC la solicitud de los documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-342-0561 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC las pólizas actualizadas y sus soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-374-0613 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-402-0686 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-417-0705 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-445-0826 de fecha 24/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por el no giro de los rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-447-0830 de fecha 25/2/25, remitió los formatos de gestión social para revisión y firma de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-448-0831 de fecha 25/2/25, remitió los formatos de gestión ambiental para revisión y firma de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-466-0923 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

56.1.2 Actividades Técnicas

El día 27 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 03 con presencia de JAC vereda Montebello, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el

estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Aclaración de cotización para uniformes y envío del desembolso con soportes.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 0,89 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 30 ml, cantidad ejecutada: 22,95 m3.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio a diciembre 2024 y enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no se recibieron los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 3% e Inversión de 9% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 30 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 20 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$48.598.321,07 correspondiente al 24% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 8.7.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 8.8.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	178
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	179
1	INTRODUCCIÓN		181
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		182
2.1	Localización		182
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		183
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		183
2.4	Características técnicas del proyecto		183
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		183
3.1	Información general del contrato		183
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		185
3.3	Seguimiento Items no previstos		185
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		185
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		187
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	735
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	744
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		188
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		188
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	188
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		188
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		189
7	Conclusiones y recomendaciones		189
8	Anexos		190
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																										
			VERSION	1																																																																										
			PÁGINA																																																																											
				FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																														
CONVENIO No.: 2524-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24 FECHA DE INICIO: 2/09/2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025 FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 18/02/2025 PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/4/25 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/05/2025 PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 108.00		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 202.753.245.00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ - VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 202.753.245.00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																										
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																														
OAC: JAC VEREDA TARRO PINTADO																																																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																											
<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>127.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	127.00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1.00	<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	-	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																											
Pavimentación	Construcción	ml	127.00																																																																											
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1.00																																																																											
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																										
Pavimentación	Construcción	ml	-	-																																																																										
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-																																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																											
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>153.543.699,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.606.311,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.103.235,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>201.253.245,00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	153.543.699,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.606.311,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.103.235,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.253.245,00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS		0,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		0,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																																
	VALOR																																																																													
OBRAS	153.543.699,00																																																																													
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.606.311,00																																																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.103.235,00																																																																													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.253.245,00																																																																													
	VALOR	ACUMULADO																																																																												
OBRAS		0,00																																																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		0,00																																																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00																																																																												
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																																																												
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																														
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																											
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																														
N.A.																																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																														
Firma: Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 21 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

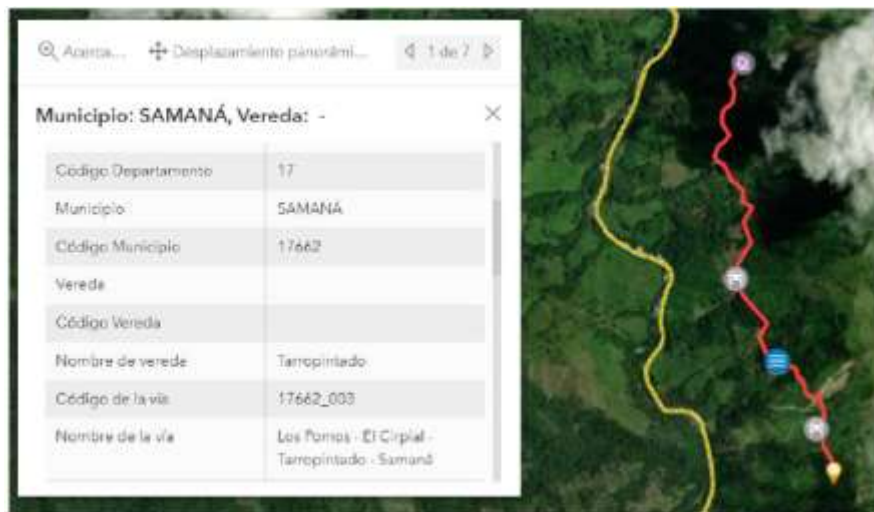


Ilustración 22 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066
---------------------------	--------------------

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO		
NIT.	810.003.143- 7.		
TELÉFONO:	142917720		
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$202.753.245,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$202.753.245,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	HASTA EL 30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 11 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027

Estabilidad de la obra	\$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Tabla 18 Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

61.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Se evaluarán las acciones a realizar para la ejecución de obras en secuencia.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,8	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,2	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,6	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,9	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3463,8	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJE.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJE.
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,40	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 9.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

La Interventoría se encuentra a la espera que la JAC remita las hojas de vida, para su revisión y aprobación.

62.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2524 de 2024

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

62.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

62.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 19/2/25, remitió al INVIAS el Acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

63.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto a diciembre 2024 y enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría preparará la realización de la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría preparará la reunión para la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	192
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	193
1	INTRODUCCIÓN		195
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		196
2.1	Localización		196
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		197
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		197
2.4	Características técnicas del proyecto		198
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		198
3.1	Información general del contrato		198
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		199
3.3	Seguimiento Items no previstos		200
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		200
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		201
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	751
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	766
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	769
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	770
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	771
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	773
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	760
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		202
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		202
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	203
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		203
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		204
7	Conclusiones y recomendaciones		205
8	Anexos		206
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		775
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		777

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSION</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>																																																																					
		<div>FECHA</div> <div>28/02/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																																					
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCION VIAS REGIONALES</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CALDAS</div> <div>PERIODO MES:</div> <div>feb-25</div>																																																																							
<div>CONVENIO No.:</div> <div>2175-2024</div> <div>PLAZO INICIAL:</div> <div>HASTA EL 31/12/24</div> <div>FECHA DE INICIO:</div> <div>2/09/2024</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</div> <div>HASTA EL 31/12/24</div> <div>FECHA DE PRORROGA 01:</div> <div>24/12/2024</div> <div>PLAZO PRORROGA 01:</div> <div>4 MESES</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:</div> <div>30/04/2025</div> <div>FECHA DE PRORROGA 02:</div> <div>N/A</div> <div>PLAZO PRORROGA 02:</div> <div>N/A</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:</div> <div>N/A</div> <div>PLAZO ACUMULADO (DÍAS):</div> <div>179,00</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA) :</div> <div>\$ 201.355.760,00</div> <div>VALOR ADICIONALES (incluido IVA):</div> <div>\$ -</div> <div>VALOR ACUMULADO (incluido IVA):</div> <div>\$ 201.355.760,00</div> <div>ANTICIPO CONCEDIDO:</div> <div>\$ -</div> <div>ANTICIPO AMORTIZADO:</div> <div>\$ -</div>																																																																							
<div>OBJETO:</div> <div>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</div>																																																																							
<div>OAC:</div> <div>JAC VEREDA EL NARANJAL</div>																																																																							
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>3601-2024</div> <div>INTERVENTOR:</div> <div>CONSORCIO CCSO</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>LUZ LILIANA TIBATÁ</div>																																																																							
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento			Rehabilitación		Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<div>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-		Mejoramiento				Rehabilitación			Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																					
Pavimentación	Construcción	ml																																																																					
	Mejoramiento																																																																						
	Rehabilitación																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																						
	Puentes																																																																						
	Pontones																																																																						
Mantenimiento																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																																					
		-																																																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																				
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																																				
	Mejoramiento																																																																						
	Rehabilitación																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																						
	Puentes																																																																						
	Pontones																																																																						
Mantenimiento																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																				
<div>AVANCE FINANCIERO</div> <div>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</div> <table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>151.698.936,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.550.968,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.605.856,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.855.760,00</td></tr></tbody></table> <div>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</div> <div>\$ 64.450.581,36</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div> <div>\$ 31.404.338,81</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</div> <div>15,71%</div> <div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA:</div> <div>2</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:</div> <div>6</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</div> <div>1</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</div> <div>9</div>				VALOR	OBRAS	151.698.936,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.550.968,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.605.856,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.855.760,00																																																											
	VALOR																																																																						
OBRAS	151.698.936,00																																																																						
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.550.968,00																																																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.605.856,00																																																																						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.855.760,00																																																																						
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div><div></div><div></div></div>																																																																							
<div>PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</div>																																																																							
<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																																							

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 23 Localización del municipio de Samaná (Caldas).



Ilustración 24 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la El Naranjal, en el corredor vial denominado "Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta" con una longitud de 1,80 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Rancho Largo y el punto final de referencia es PR01+800 a 1,80 km de Rancho Largo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.



Ilustración 25. Estado inicial de la vía

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.355.760,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$201.355.760,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.135.576,00	02/09/2026	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.067.788,00	02/09/2026	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.271.152,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Tabla 19 . Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 5/2/25, remitió el desembolso No. 1 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/2/25, solicitó al Banco Avillas los extractos bancarios de la cuenta del proyecto.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 10/2/25 y 11/2/25, remitió documentos correspondientes al desembolso No. 1.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/2/25, remitió la carta de reintegro de rendimientos financieros para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/2/25, remitió el formato de auxiliar detallado.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió los soportes de pago faltantes.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/2/25, remitió los soportes del desembolso No. 1 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió el permiso de captación de agua.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió el plan de compras de materiales.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/2/25, remitió documentos ambientales solicitados por la Interventoría.

68.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 90 ml, cantidad ejecutada: 2,66 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 391,47 m3.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	34%	32,01%	64.450.581,36
Ejecutado	11%	15,60%	31.404.338,81
Avance / Retraso	-23%	-16,41%	-33.046.242,55

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	62%	4,31	2,66

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	55%	111,69	61,20
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	21%	0%	18,19	-
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	5%	0%	1,37	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	41%	10%	1.627,34	391,47

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 10.1.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 10.3.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francy Elena Aristizábal González
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	Diego Márquez

Tabla 20 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 10.4.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$50.620.469,28 de fecha 11/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$50.620.469,28 correspondiente al 25% del valor del convenio.

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 10.5.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 10.6

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2175 de 2024.

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

#	Ítem	Nombre de obra	Descripción	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1		CONSTRUCCIÓN PLACA HUELTA 100 CUBETA	67 años	Jun 12/2012	Jun 12/2012	34%	19%
2		Extracción de tierra en el sitio	1 año	Jun 12/2012	Jun 12/2012	100%	52%
3		Rehabilitación de la Carretera C	16 años	Jun 12/2012	Jun 12/2012	100%	52%
4		Construcción de la vía en el sitio 21MFA (C) - Muestra de la zona para el sitio	26 años	Jun 12/2012	Jun 12/2012	21%	8%
5		Construcción de la vía en el sitio 14MFA (F) 50% con costo de 40% para el sitio 14MFA (F)	26 años	Jun 12/2012	Jun 12/2012	5%	8%
6		Asfalto de la vía en el sitio 43MFA (F) 2 (43MFA (F))	26 años	Jun 12/2012	Jun 12/2012	41%	18%

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 64.450.581,36; la Inversión Ejecutada fue de 31.404.338,81. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 33.046.242,55.

69.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

69.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-302-0493 de fecha 4/2/25, solicitó documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-313-0504 de fecha 4/2/25, solicitó los extractos bancarios y rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-343-0562 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC las pólizas actualizadas y sus soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-375-0614 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentos ambientales.

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-389-0662 de fecha 14/2/25, remitió el Acta de inicio de ejecución del convenio.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-399-0683 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-427-0729 de fecha 19/2/25, solicitó documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-430-0732 de fecha 19/2/25, remitió los formatos de gestión social para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-439-0810 de fecha 21/2/25, remitió al INVIAS los informes semanales No. 16.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-437-0794 de fecha 21/2/25, remitió los formatos de gestión ambiental para revisión y firma de la JAC.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió el permiso de captación de agua.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió el plan de compras de materiales.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 25/2/25, remitió documentos ambientales solicitados por la Interventoría.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 6 de fecha 25/2/25.

70.1.2 Actividades Técnicas

Se realizan actividades de topografía y seguimiento por parte de las áreas técnica, ambiental, SST y social. Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 90 ml, cantidad ejecutada: 2,66 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 391,47 m3.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio a diciembre de 2024 y enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría recibió el soporte del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de enero 2025.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 11% e Inversión de 15% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 90 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 24 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$50.620.469,28 correspondiente al 25% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 10.7.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 10.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	208
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	209
1	INTRODUCCIÓN		211
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		212
2.1	Localización		212
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		213
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		213
2.4	Características técnicas del proyecto		214
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		214
3.1	Información general del contrato		214
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		216
3.3	Seguimiento Items no previstos		217
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		217
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		218
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	806
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	822
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	824
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	825
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	826
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	828
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	815
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		219
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		219
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	219
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		220
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		221
7	Conclusiones y recomendaciones		222
8	Anexos		223
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		830
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		832


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

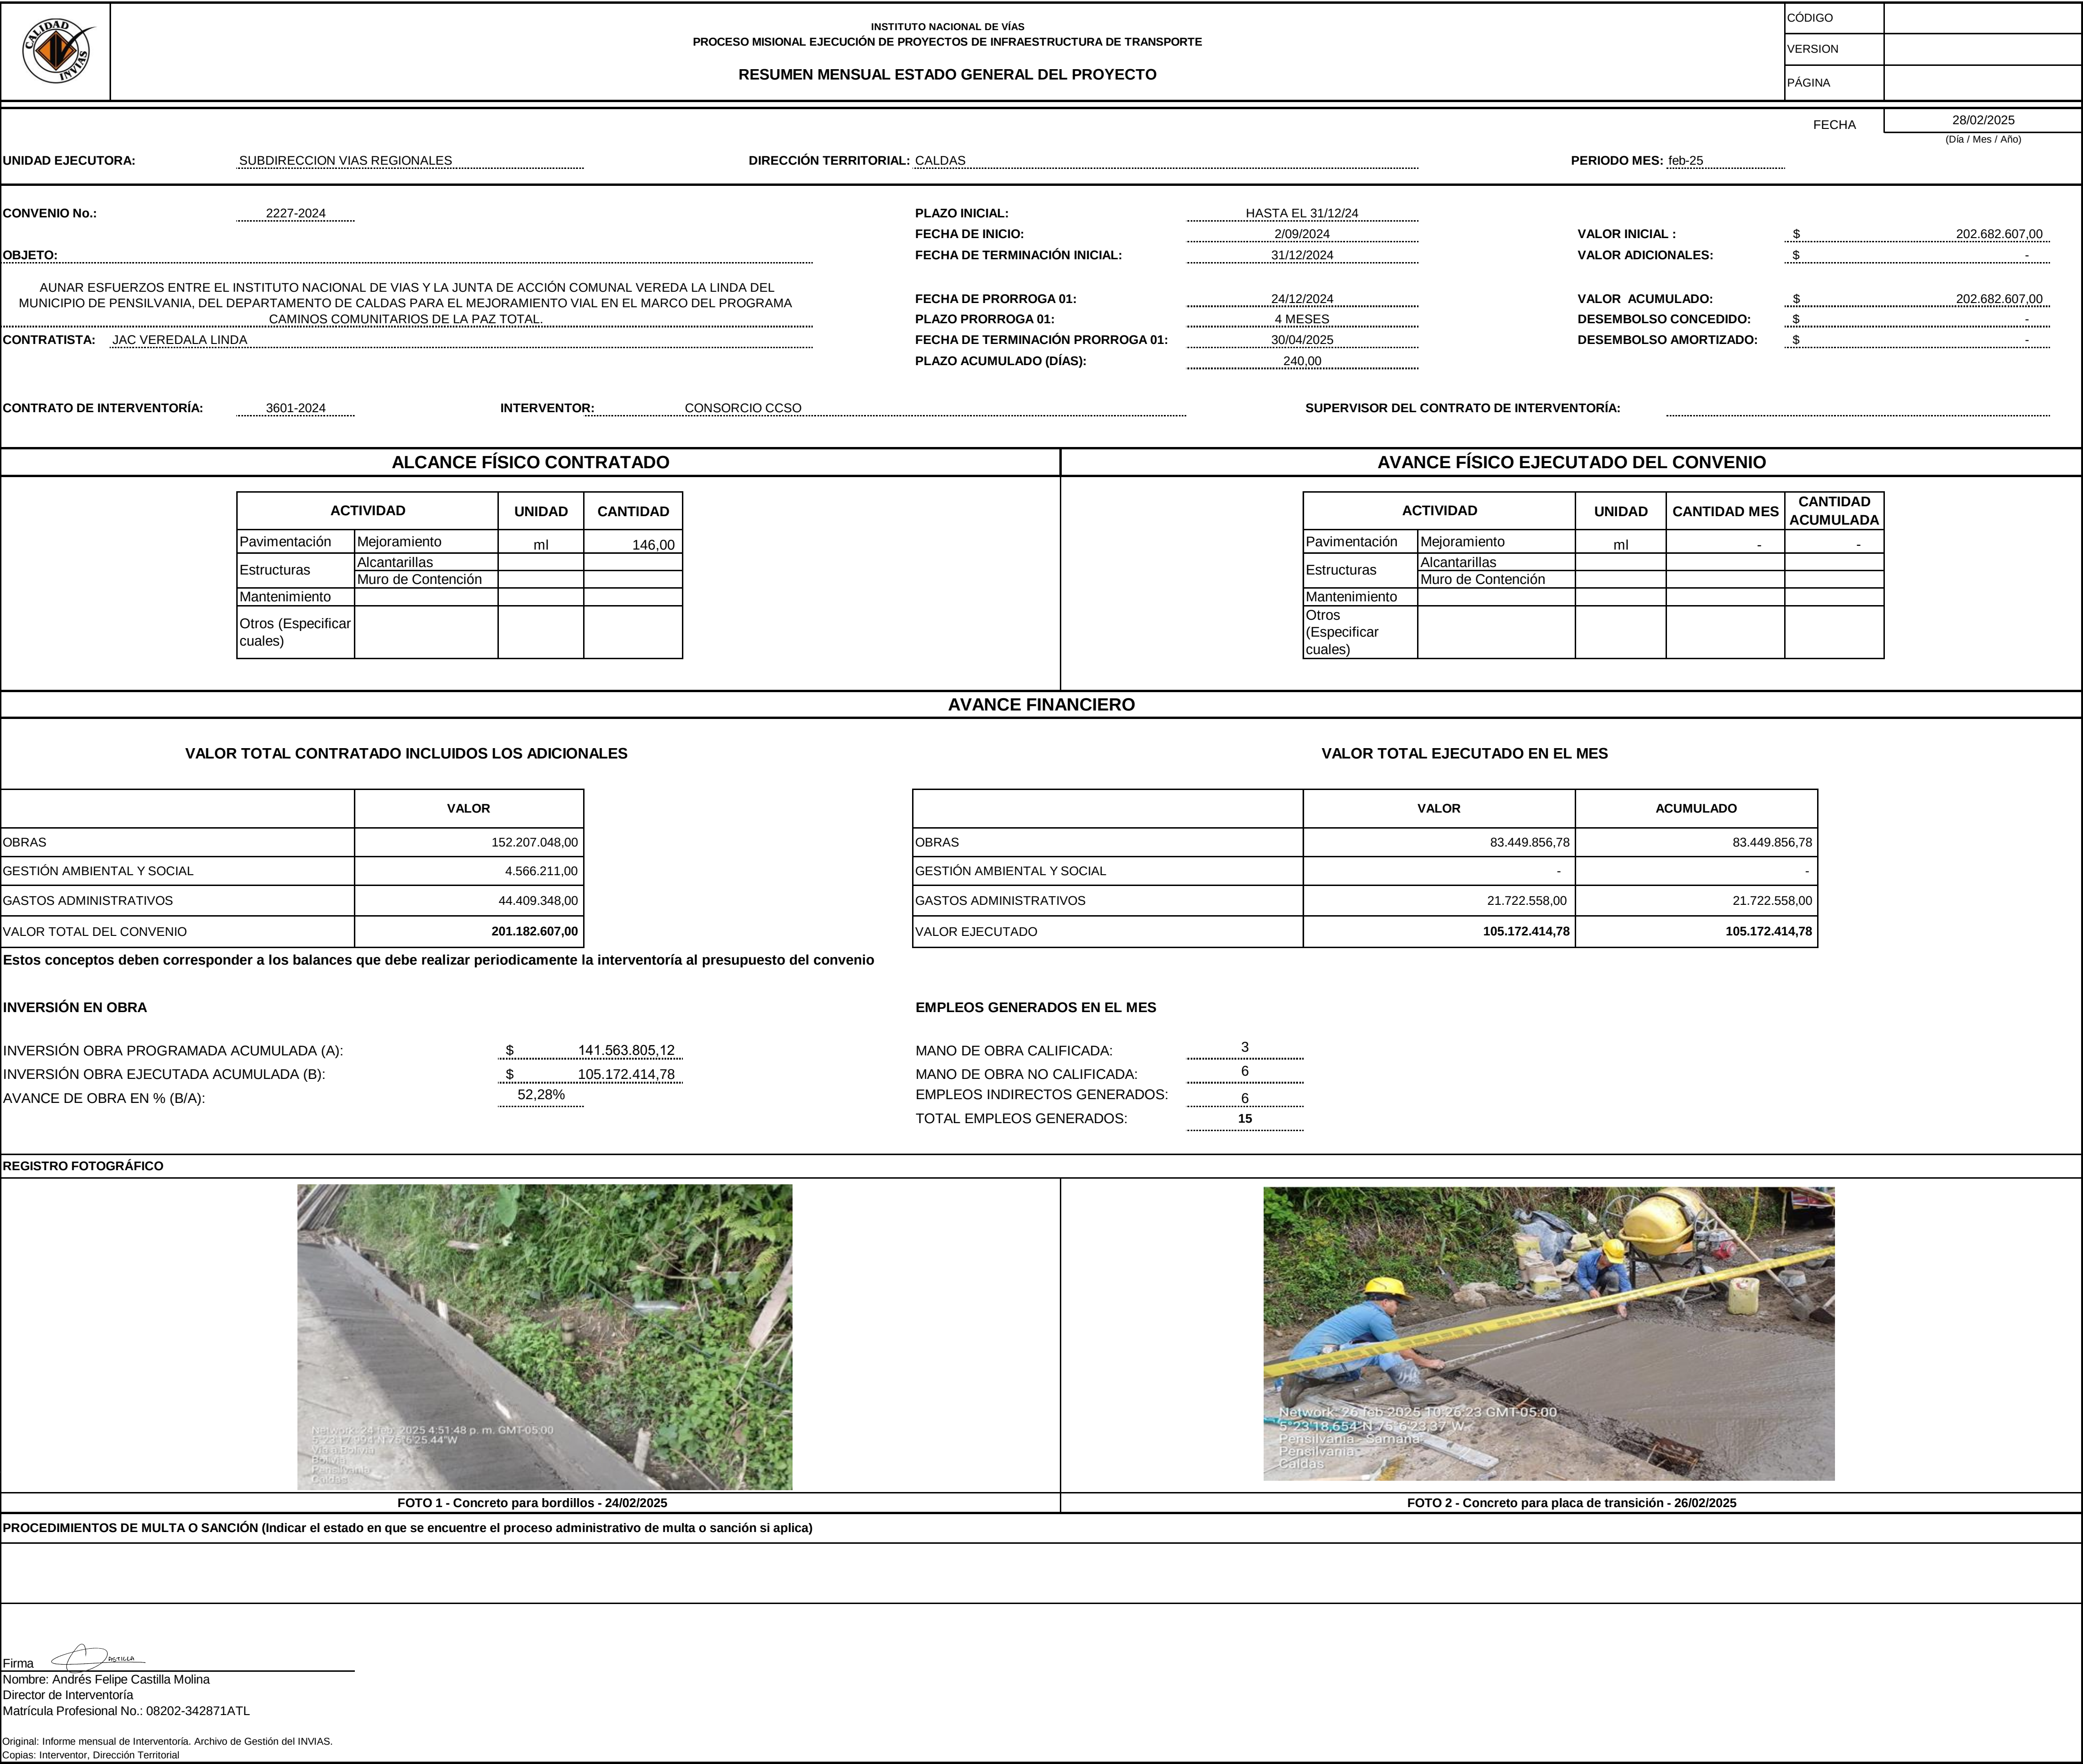

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 14 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 26 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

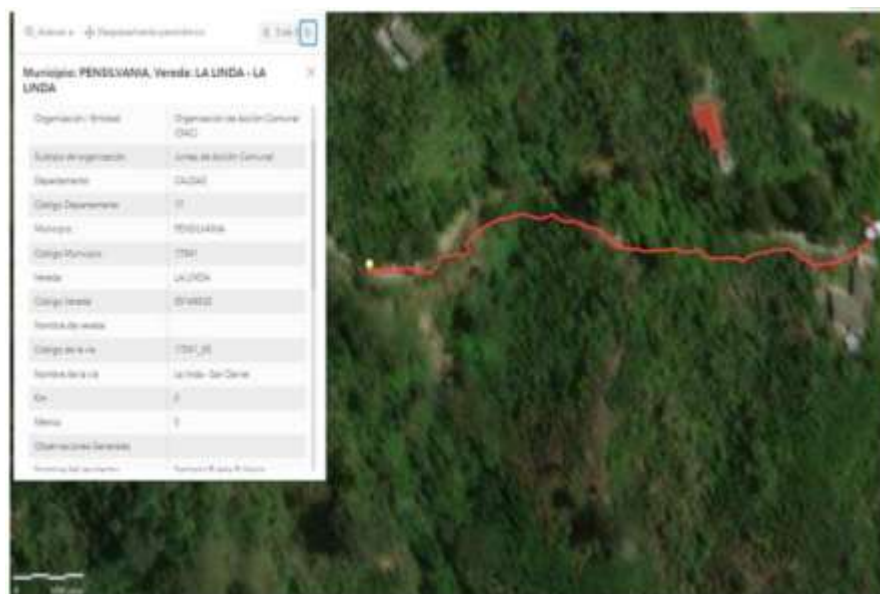


Ilustración 27 Localización vía a Intervenido – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel, del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Entre la vía que comunica la vereda La Linda y corregimiento de San Daniel tiene una longitud de 0,26 Km de corredor asignado. el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 en la casa de la señora Fabiola Restrepo en el sector La Peña, y el punto final de referencia es el PR 0+260 de la vía terciaria que conduce al corregimiento de San Daniel. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 28. Estado inicial de la vía

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$202.682.607,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$202.682.607,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.268.261,00	05/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.134.131,00	05/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.536.522,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	05/07/2024	30/05/2025

Tabla 21 Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/2/25, remitió el plan de compras correspondiente al tercer desembolso.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la prórroga de los contratos de los profesionales.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 11/2/25 y 12/2/25, remitió los documentos para el desembolso No. 4.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/2/25, remitió la aprobación en SECOP de las pólizas actualizadas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, remitió los soportes de rendimientos financieros periodo 2024.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/2/25, remitió el quinto desembolso para revisión de la Interventoría.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 7 de fecha 25/2/25.

75.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades en el periodo ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 46 ml, cantidad ejecutada: 1,36 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 43,99 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 15,04 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2.174,76.

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 43,99 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 15,04 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2.174,76.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	75%	70,59%	141.563.805,12
Ejecutado	62%	52,44%	105.172.414,78
Avance / Retraso	-13%	-18,15%	-36.391.390,34

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	55%	111,69	61,20
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	50%	55%	40,15	43,99
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	77%	55%	21,14	15,04
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	72%	55%	2.857,77	2.174,86

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 11.1.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 11.3.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Laura María Botero Betancurt
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 22 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 11.4.

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$29.029.874,99 de fecha 10/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$31.373.234,48 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$12.678.188,00 de fecha 12/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$9.718.455,00 de fecha 13/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 144.600 de fecha 15/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$83.135.621,27 correspondiente al 41% del valor del convenio.

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 11.5.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 11.6

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2227 de 2024. Se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1		CONVENIO 2227 -2024	64 días	jun 201925	dom 16/03/25	75%	62 %
2		ETAPA REVISION	5 días	jun 201925	mar 201925	100%	100%
3		Permisos	5 días	jun 201925	mar 201925	100%	100%
4		CONSTRUCCIÓN PLACA BUELLA	53 días	mar 201925	dom 16/03/25	74%	68 %
5		Ejecuciones viales a la Cién Eggar	12 días	mar 201925	mar 21/01/25	100%	100%
6		Subbase Gravelier Clase C	15 días	mar 14/01/25	vie 31/01/25	100%	66%
7		Obra de concreto de la base 21 MPA (D) - en obra en obra	30 días	dom 04/02/25	dom 16/03/25	60%	66%
8		Obra de concreto de la base 14MPa (G)	30 días	vie 31/01/25	jun 06/03/25	77%	66%
9		Acero de refuerzo de FY=4.200 Kg/cm ² (50.000 PSI)	25 días	jun 06/03/25	jun 06/03/25	72%	66%

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 141.563.805,12; la Inversión Ejecutada fue de 105.172.414,78. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 36.391.390,34.

76.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

76.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-303-0494, solicitó documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-314-0505, solicitó los extractos bancarios y rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-344-0563 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC las pólizas actualizadas y los soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-371-0610 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-405-0689 de fecha 18/2/25, programó una reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-426-0728 de fecha 19/2/25, solicitó documentos ambientales.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 7 de fecha 25/2/25.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-456-0906 de fecha 28/2/25, solicitó presencia del ingeniero residente en la obra.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-457-0907 de fecha 28/2/25, solicitó información sobre la situación de los materiales en obra.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-460-0916 de fecha 28/2/25, envía los formatos ambientales para la revisión y firma de la JAC.

77.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 05 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del Plan de Compras aprobado. 02. Programación de ensayos de densidades para la subbase.

El día 6 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del desembolso para el plan de compras aprobado.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 43,99 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 15,04 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2.174,76.

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, el extracto bancario del mes de Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibió los extractos bancarios del periodo 2024, ni los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 62% e Inversión de 52% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml y Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 80 ml; Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 80 ml.; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 80 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$83.135.621,27 correspondiente al 41% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 11.7.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 11.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	225
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	226
1	INTRODUCCIÓN		228
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		229
2.1	Localización		230
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		230
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		231
2.4	Características técnicas del proyecto		231
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		231
3.1	Información general del contrato		232
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		234
3.3	Seguimiento Items no previstos		234
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		234
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		234
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	854
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	870
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	872
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	873
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	874
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	876
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	863
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		236
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		236
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	236
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		236
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		238
7	Conclusiones y recomendaciones		238
8	Anexos		239
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		878
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		880

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION	
			PÁGINA	

FECHA			28/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS	PERIODO MES: feb-25

CONVENIO No.:	2140-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR INICIAL :	\$ 201.393.774,00
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES:	\$ -
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA SANTA RITA	FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 201.393.774,00
		PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240.00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3601-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																										
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>137,00</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento	ml	137,00	Estructuras	Alcantarillas				Muro de Contención			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-	Estructuras	Alcantarillas					Muro de Contención				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																											
Pavimentación	Mejoramiento	ml	137,00																																																											
Estructuras	Alcantarillas																																																													
	Muro de Contención																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																														
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																										
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-																																																										
Estructuras	Alcantarillas																																																													
	Muro de Contención																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																														

AVANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES	
	VALOR
OBRAS	150.727.480,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.521.824,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.644.470,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.893.774,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES		
	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	40.809.173,88	40.809.173,88
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	19.142.496,00	19.142.496,00
VALOR EJECUTADO	59.951.669,88	59.951.669,88

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA	EMPLEOS GENERADOS EN EL MES		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 126.991.767,50	MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 59.951.669,88	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29,99%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 25 feb 2025 1:51:08 p. m. 5°23'12.77927" N 75°7'41.75699" W 364 Calle 7 Pensilvania Caldas	 25 feb 2025 1:52:07 p. m. 5°23'12.58742" N 75°7'42.02101" W Pensilvania - Samana Pensilvania Caldas
FOTO 1 - Concreto de huellas - 25/02/25	FOTO 2 - Ubicación de formaleta - 25/02/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	

Firma

Nombre: Andrés Felipe Castilla Molina
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 15 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.



Ilustración 29 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

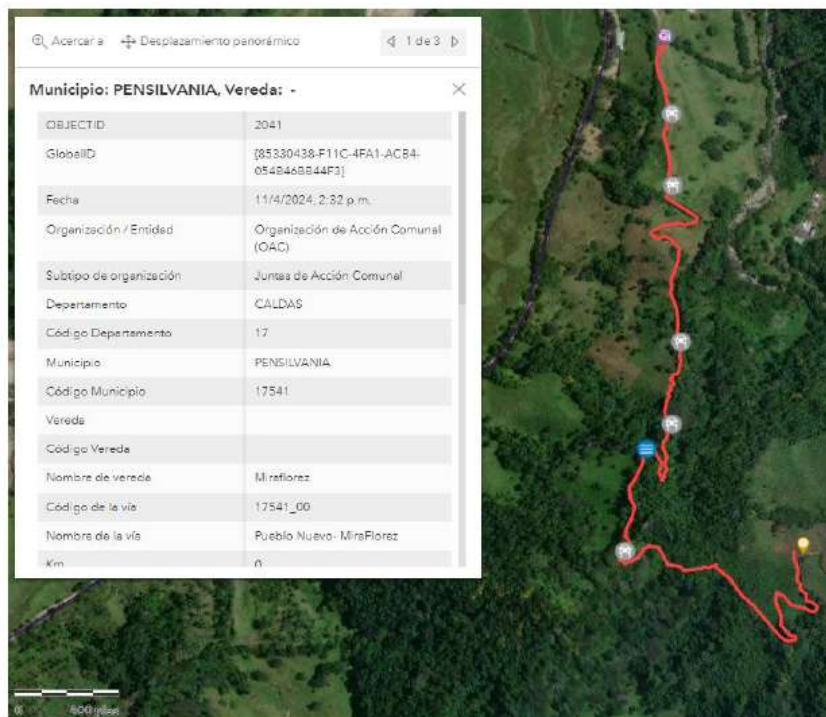


Ilustración 30 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El corredor vial denominado Santa Rita Baja tiene una longitud de 0,69 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 es ramal derecho hacia la Vereda Santa Rita, y el punto final de referencia el PR 0 +690 de la vía departamental que conduce al municipio de Samaná. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 31. Estado inicial de la vía

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.393.774,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.393.774,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.139.378,00	02/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.069.689,00	02/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.278.755,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	02/07/2024	30/04/2025

Tabla 23 Información general del Convenio 2140-2024 Municipio Pensilvania.

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/2/25, remitió el plan de compras No. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió las prórrogas de los contratos de los profesionales.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió el plan de compras y pago de nómina.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió el desembolso No. 3 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, remitió las aprobaciones de pólizas y otrosí de la prórroga No. 1.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 22/2/25 y 25/2/25, remitió la solicitud del cuarto desembolso y subsanación de cuentas de nómina para revisión de la Interventoría.

82.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades en el periodo ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 35 ml, cantidad ejecutada: 0,61 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 20 ml, cantidad ejecutada: 15,30 m³.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 36 ml, cantidad ejecutada: 12,69 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 36 ml, cantidad ejecutada: 584,39 kg.

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 135 ml, cantidad ejecutada: 3,95 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 76,50 m³.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 36 ml, cantidad ejecutada: 12,69 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 36 ml, cantidad ejecutada: 584,39 kg.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	61%	63,06%	126.991.767,50
Ejecutado	36%	29,77%	59.951.669,88
Avance / Retraso	-25%	-33,29%	-67.040.097,62

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,95	3,95
2	Subbase Granular Clase C	M3	88%	74%	90,89	76,50
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	32%	16%	25,39	12,69
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	55%	0%	13,78	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	46%	16%	1.680,13	584,39

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 12.1.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 12.3.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Alberto Navarro Aristizábal
Contador	Laura María Botero Betancurt
Maestro de Obra	Jesús Alirio Ramírez

Tabla 24 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 12.4

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$51.834.454,83 de fecha 22/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$15.278.370,00 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$8.520.504,00 de fecha 11/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$75.748.128,83 correspondiente al 38% del valor del convenio.

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 12.5.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 12.6.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 12.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2140 de 2024 y su aprobación en SECOP.

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de Tram	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1		CONVENIO 21-48 -2024	53 días	mar 14/01/25	abr 22/03/25	61%	35%
2		ESPA MEMORIA	5 días	mar 14/01/25	lun 28/01/25	100%	100%
3		Primer informe	5 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
4		CONSTRUCCIÓN PLACA MUELLA	53 días	lun 28/01/25	abr 22/03/25	57%	33%
5		Estimación de costos a la Clasificación	10 días	lun 20/01/25	abr 10/02/25	100%	100%
6		Subhasta Granular Clase C	30 días	lun 27/01/25	abr 20/03/25	89%	74%
7		Control de calidad de la mezcla 2-1 MPa (D) - mezcla in situ	30 días	abr 15/02/25	abr 22/03/25	32%	18%
8		Control de Calidad de la mezcla 14 MPa (C)	30 días	abr 15/02/25	abr 14/03/25	66%	0%
9		Acabo de relleno de Fy=4.200 Kg/cm ² (80.000 PSI)	25 días	jun 13/02/25	abr 14/03/25	48%	18%

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero 2025, la Inversión Programada fue de 126.991.767,50; la Inversión Ejecutada fue de 59.951.669,88. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 67.040.097,62.

83.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

83.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CINP-555-352-0586, CINP-555-388-0661, CINP-555-439-0810 y CINP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-299-0490 de fecha 4/2/25, solicitó documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-315-0506 de fecha 4/2/25, solicitó extractos bancarios y rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-352-0586 de fecha 7/2/25, remitió al INVÍAS los informes semanales No. 14.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-345-0564 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC pólizas actualizadas y soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-369-0608 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-408-0692 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-424-0726 de fecha 19/2/25, solicitó documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-446-0827 de fecha 24/2/25, solicitó al INVÍAS el inicio de procedimiento de multa por el no giro de los rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-458-0908 de fecha 28/2/25, presenta el retraso en obra del proyecto.

84.1.2 Actividades Técnicas

El día 3 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 03 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del plan de compras aprobado por correo electrónico. 2. Programación de ensayos de densidades.

El día 11 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del orden de desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 135 ml, cantidad ejecutada: 3,95 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 100 ml, cantidad ejecutada: 76,50 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 36 ml, cantidad ejecutada: 12,69 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 36 ml, cantidad ejecutada: 584,39 kg.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto a diciembre de 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibimos los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 25% e Inversión de 29% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 135 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 100 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 36 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 36 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$75.748.128,83 correspondiente al 38% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

86 ANEXO

86.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

86.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta registro fotográfico. Ver anexo 12.7.

86.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

86.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora de obra. Ver Anexo 12.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No.2077-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No.3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	242
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	243
1	INTRODUCCIÓN		245
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		246
2.1	Localización		246
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		247
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		247
2.4	Características técnicas del proyecto		248
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		248
3.1	Información general del contrato		248
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		249
3.3	Seguimiento Items no previstos		250
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		250
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		251
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	902
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	917
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	919
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	920
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	921
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	923
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	911
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		252
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		252
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	253
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		253
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		254
7	Conclusiones y recomendaciones		255
8	Anexos		256
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		925
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		927

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																															
			VERSION	1																																																															
			PÁGINA																																																																
				FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: feb-25																																																															
CONVENIO No.: 2077-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 1.500.000,00																																																															
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO: 3/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																															
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 1.500.000,00																																																															
		FECHA DE PRORROGA 01: 26/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																															
		PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																															
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025																																																																	
OAC: JAC VEREDA EL VERDAL		FECHA DE PRORROGA 02: N/A																																																																	
		PLAZO PRORROGA 02: N/A																																																																	
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: N/A																																																																	
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 178,00																																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-			-	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																	
Pavimentación	Construcción	ml																																																																	
	Mejoramiento																																																																		
	Rehabilitación																																																																		
Estructuras	Túneles																																																																		
	Puentes																																																																		
	Pontones																																																																		
Mantenimiento																																																																			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																																	
		-																																																																	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																																
	Mejoramiento																																																																		
	Rehabilitación																																																																		
Estructuras	Túneles																																																																		
	Puentes																																																																		
	Pontones																																																																		
Mantenimiento																																																																			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																
		-	-																																																																
AVANCE FINANCIERO																																																																			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>151.143.902,85</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.534.317,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.477.361,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.155.580,85</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	151.143.902,85	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.317,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.477.361,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.155.580,85	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>44.945.540</td><td>44.945.539,82</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>13.555.837,00</td><td>13.555.837,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>58.501.376,82</td><td>58.501.376,82</td></tr></tbody></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	44.945.540	44.945.539,82	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.555.837,00	13.555.837,00	VALOR EJECUTADO	58.501.376,82	58.501.376,82																																					
	VALOR																																																																		
OBRAS	151.143.902,85																																																																		
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.317,00																																																																		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.477.361,00																																																																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.155.580,85																																																																		
	VALOR	ACUMULADO																																																																	
OBRAS	44.945.540	44.945.539,82																																																																	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-																																																																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.555.837,00	13.555.837,00																																																																	
VALOR EJECUTADO	58.501.376,82	58.501.376,82																																																																	
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																			
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 77.848.505,60			MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 58.501.376,82			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6																																																																
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29,37%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1																																																																
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9																																																																
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																			
VEREDA EL VERDAL FOTO 1 - Acero de refuerzo 24/02/2025			VEREDA EL VERDAL FOTO 2 - Concreto para huellas 25/02/2025																																																																
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																			
Firma:																																																																			
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA																																																																			
Director de Interventoría																																																																			
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL																																																																			
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.																																																																			
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																			

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

87 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 04 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

88 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

88.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.



Ilustración 32 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

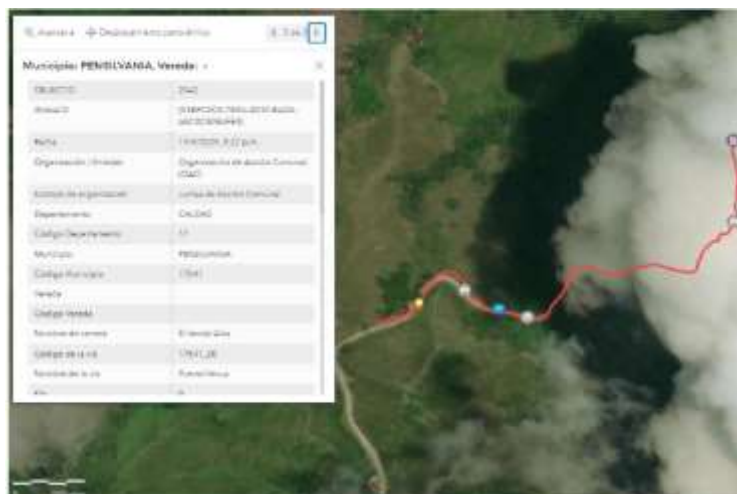


Ilustración 33 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

88.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

88.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus con una longitud de 0,51 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 000 paradero veredal y el punto final de referencia es PR 0 + 510 Sector la Virgen. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.



Ilustración 34. Estado inicial de la vía

88.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

89 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$200.655.581,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.065.559,00	27/06/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.032.781,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.131.117,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Tabla 25 Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

89.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

89.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/2/25, solicita a la Alcaldía información sobre el cierre de la vía Pensilvania - Arboleda.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió los soportes para realizar el giro de los rendimientos financieros.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió información sobre tránsito de volquetas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, remitió los documentos correspondientes al segundo desembolso.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, remitió los rendimientos financieros del mes de enero.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió los documentos pendientes de las pólizas, solicitados por la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 20/2/25, remitió los documentos correspondientes al plan de compras 2 y su corrección para revisión de la Interventoría.
- - La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió la relación de desembolsos.

89.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2,33 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 33 ml, cantidad ejecutada: 12,09 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 8,87 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 33 ml, cantidad ejecutada: 930,80 kg.

89.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

89.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita de fecha 4/2/25 para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	44%	38,80%	77.848.505,60
Ejecutado	37%	29,16%	58.501.376,82
Avance / Retraso	-7%	-9,64%	-19.347.128,78

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	63%	3,67	2,33
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	63%	96,39	61,20
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	16%	-	12,09
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	24%	38%	5,59	8,87
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	57%	26%	2.025,76	930,80

90 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

90.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 13.1.

90.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 13.3.

90.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-049-4905 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Miguel Eduardo Jaramillo Villa
Contador	Jhon Fredy Rivas
Maestro de Obra	Hernando De Los Ríos Franco

Tabla 26 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 14.4.

90.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$52.452.837,15 de fecha 6/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$52.452.837,15 correspondiente al 26% del valor del convenio.

90.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 13.5.

90.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 13.6

90.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 13.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2077 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

90.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

90.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

90.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

90.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1		CONVENIO 2877 -2878	73,53 días	mar 288/25	mar 288/25	44%	54%
2		ERUPA REMISION	5 días	mar 288/25	dom 288/25	100%	100%
3		Preremision	5 días	mar 288/25	dom 288/25	100%	100%
4		CONSTRUCCIÓN PLACA BUELLA	74,53 días	lun 278/25	mar 288/25	42%	52%
5		Exoneración vial a la Clasificación	12 días	lun 278/25	dom 288/25	100%	100%
6		Subhasta Granular Clase C	20 días	dom 288/25	mar 288/25	100%	100%
7		Control de tránsito de circulación 21 MPa (C) - anillo de agua	40 días	lun 288/25	jun 188/25	0%	7%
8		Control de tránsito de circulación 14 MPa (C)	20 días	jun 288/25	mar 288/25	24%	38%
9		Acta de reunión de FI - 4.200 Kg/m² 2 (80.000 PSI)	25 días	lun 288/25	mar 288/25	67%	87%

90.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 77.848.505,60; la Inversión Ejecutada fue de 58.501.376,82. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 19.347.128,78.

90.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

90.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

91 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

91.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

91.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-304-0495, solicitó documentos ambientales a la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-3316-0507, solicitó los extractos bancarios y rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-403-0687 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-418-0706 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 5 de fecha 21/2/25.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-454-0904 de fecha 28/2/25, solicitó presencia del ingeniero residente en la obra.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-467-0924 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

91.1.2 Actividades Técnicas

El día 6 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 04 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de carta a la Alcaldía sobre el cierre de la vía.

El día 21 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 05 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso. 2. La JAC menciona que se va a realizar una reunión con la alcaldía y la comunidad para tratar el cierre de la vía.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 2,33 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 61,20 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 33 ml, cantidad ejecutada: 12,09 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella, longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 8,87 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 33 ml, cantidad ejecutada: 930,80 kg.

91.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio a Diciembre 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar

los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

92 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 37% e Inversión de 29% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 80 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 33 ml; Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 48 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 33 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$52.452.837,15 correspondiente al 26% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

93 ANEXO

93.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

93.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 13.7.

93.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

93.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 13.8.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	258
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	259
1	INTRODUCCIÓN		261
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		262
2.1	Localización		262
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		263
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		263
2.4	Características técnicas del proyecto		264
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		264
3.1	Información general del contrato		264
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		266
3.3	Seguimiento Items no previstos		267
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		267
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		267
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	948
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	963
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	965
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	966
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	967
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	969
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	957
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		269
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		269
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	269
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		270
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		271
7	Conclusiones y recomendaciones		272
8	Anexos		273
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		971
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		973

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	

FECHA

28/02/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS	PERIODO MES:	feb-25
-------------------	------------------------------	------------------------	--------	--------------	--------

CONVENIO No.:

2169-2024

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31/12/24

FECHA DE INICIO:

3/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

HASTA EL 31/12/24

FECHA DE PRORROGA 01:

26/12/2024

PLAZO PRORROGA 01:

4 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:

30/04/2025

FECHA DE PRORROGA 02:

N/A

PLAZO PRORROGA 02:

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:

N/A

PLAZO ACUMULADO (DÍAS):

178,00

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 201.154.007,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ 201.154.007,00

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC:

JAC VEREDA MIRAFLORES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

3601-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CCSO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																													
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																															
Pavimentación	Construcción	ml																																																															
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																															
		-																																																															
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																														
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																														
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																														

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.039.601,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.083.218,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.654.007,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	6.142.574	6.142.574,30
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.099.658,00	18.099.658,00
VALOR EJECUTADO	0,00	24.242.232,30

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 40.975.791,99

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 24.242.232,30

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 12,14%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRAFICO	
VEREDA MIRAFLORES FOTO 1 - Compactación de subbase - 27/02/24	VEREDA MIRAFLORES FOTO 2 - Compactación de subbase - 26/02/24

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

94 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 10 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

95 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

95.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 35 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

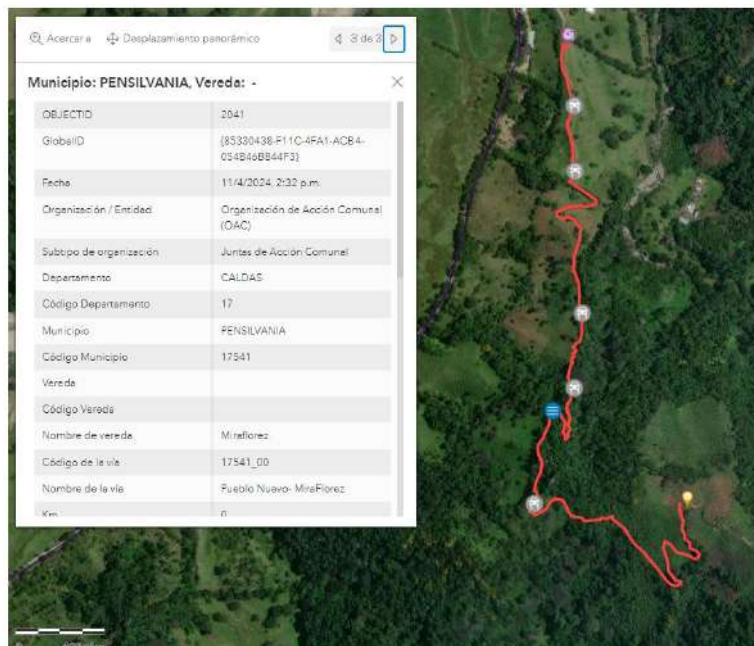


Ilustración 36 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

95.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

95.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda Miraflores, en el corredor vial veredal de Miraflores (Pueblo Nuevo – Miraflores) entre la vereda Miraflores y el corregimiento de Pueblo Nuevo con una longitud de 1,40 km, el punto de inicio de referencia PR 0+000 estación de policía Pueblo Nuevo y el punto final de referencia PR 1 + 400 desde la estación de policía hacia la vía que conduce a la Vereda Miraflores. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con terreno natural.



Ilustración 37. Estado inicial de la vía

95.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

96 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

	PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.154.007,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.154.007,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	03/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 26/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.115.401,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.057.701,00	03/7/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.230.802,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 27 Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

96.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

96.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 4/2/25 y 6/2/25, remitió documentos compromiso de los comités operativos (Plan de compras, cotizaciones, registro fotográfico, etc.).
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió los documentos para realizar el giro de los rendimientos financieros.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió los documentos del primer desembolso.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/1/25, remitió los rendimientos del mes de enero.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/1/25, remitió la documentación pendiente de las pólizas, solicitado por la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 17/2/25 y 18/2/25, remitió los documentos de nómina y corrección.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/2/25, remitió el plan de compras No. 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió la corrección del segundo desembolso.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió el plan de compras No. 3.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/2/25, remitió la solicitud para el pago de nómina del 28 de febrero.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 28/2/25, remitió los documentos correspondientes a la solicitud de desembolso de nómina.

96.2.2 Actividades Técnicas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35 ml, cantidad ejecutada: 26,78 m3.

96.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

96.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	23%	20,37%	40.975.791,99
Ejecutado	17%	12,05%	24.242.232,30
Avance / Retraso	-6%	-8,32%	-16.733.559,69

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41
2	Subbase Granular Clase C	M3	30%	23%	34,66	26,78
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	6%	0%	5,50	-
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	-	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	16%	0%	675,78	-

97 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

97.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 14.1.

97.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 14.3.

97.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-045-4901 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Alfonso Agudelo
Contador	Jhon Fredy Rivas Ortiz
Maestro de Obra	José Uriel Bernal Gutiérrez

Tabla 28 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 14.4.

97.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 34.864.170,34 de fecha 13/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 32.615.493,50 de fecha 18/02/2015.

Desembolso Total por valor de \$67.484.382,64 correspondiente al 33% del valor del convenio.

97.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 14.5.

97.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 14.6

97.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 14.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2169 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

97.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

97.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

97.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

97.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1		CONVENIO 2169 - 2024	46 días	jun 18/2025	jun 30/2025	23%	17%
2		ETAPA REVISION	6 días	jun 18/2025	jun 19/2025	100%	100%
3		Próximamente	6 días	jun 19/2025	jun 19/2025	100%	100%
4		CONSTRUCCIÓN PLACA BUELLA	46 días	jun 19/2025	jun 30/2025	28%	14%
5		Entrevista verbal a la Comunidad	10 días	jun 22/2025	jun 30/2025	100%	100%
6		Subsección Granular Clase C	30 días	jun 19/2025	jun 23/2025	30%	25%
7		Controlo reforzado de inversión 21 MPa (D) - anclaje a la	30 días	jun 24/2025	jun 31/2025	0%	0%
8		Controlo Ciclópeo Reinversión 14MPa (G)	30 días	jun 24/2025	jun 30/2025	0%	0%
9		Aforo de inversión de FY= 4.200 Kg/cm 2 (\$0.000 P30)	25 días	jun 24/2025	jun 23/2025	10%	0%

97.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero de 2025, la Inversión Programada fue de 40.975.791,99; la Inversión Ejecutada fue de 24.242.232,30. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 16.733.559,69.

97.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

97.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

98 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

98.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

98.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-300-0508 de fecha 4/2/25, solicitó documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-317-0508 de fecha 4/2/25, solicitó los extractos bancarios y rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-352-0586 de fecha 7/2/25, remitió al INVIAS los informes semanales No. 14.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-333-0548 de fecha 7/2/25, remitió a la JAC el Acta de inicio de ejecución.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-347-0566 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC las pólizas actualizadas y soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-388-0661 de fecha 14/2/25, remitió al INVIAS los informes semanales No. 15.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-409-0707 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-419-0707 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-425-0727 de fecha 19/2/25, solicitó documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-429-0731 de fecha 19/2/25, remitió los formatos de gestión social para revisión y firma.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-434-0785 de fecha 20/2/25, remitió respuesta a comunicado con asunto "labores realizadas" de la JAC.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 6 de fecha 25/2/25.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-468-0925 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

98.1.2 Actividades Técnicas

El día 6 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 05 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance de la etapa de alistamiento. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Plan de inversiones actualizado y el Plan de trabajo.

El día 18 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de cotizaciones y plan de compras firmado. 2. Documentos soporte para el desembolso.

El día 6 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 05 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Documentos soporte para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35 ml, cantidad ejecutada: 26,78 m3.

98.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio a Diciembre 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

99 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 17% e Inversión de 12% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$67.484.382,64 correspondiente al 33% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

100 ANEXO

100.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

100.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver Anexo 14.7.

100.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

100.4 BITÁCORA

Se anexa bitácora. Ver Anexo 14.8.

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	275
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	276
1	INTRODUCCIÓN		278
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		279
2.1	Localización		279
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		280
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		280
2.4	Características técnicas del proyecto		281
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		281
3.1	Información general del contrato		281
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		283
3.3	Seguimiento Items no previstos		284
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		284
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		285
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	983
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	999
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1002
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1003
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1004
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1006
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	992
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		286
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		286
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	287
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		287
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		289
7	Conclusiones y recomendaciones		289
8	Anexos		290
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1008
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1010

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION	
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: feb-25	
CONVENIO No.: 2200-2024			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL : \$ 200.555.145,00	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONALES: \$ -	
			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024			
CONTRATISTA: JAC VEREDA LA HABANA			FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200.555.145,00	
			PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -	
			FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -	
			PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240.00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ	

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																										
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>174,00</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento	ml	174,00	Estructuras	Alcantarillas				Muro de Contención			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-	Estructuras	Alcantarillas					Muro de Contención				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																											
Pavimentación	Mejoramiento	ml	174,00																																																											
Estructuras	Alcantarillas																																																													
	Muro de Contención																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																														
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																										
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-																																																										
Estructuras	Alcantarillas																																																													
	Muro de Contención																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																														

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																								
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>150.982.674,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.529.480,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.542.991,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>199.055.145,00</td></tr></table>		VALOR	OBRAS	150.982.674,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.055.145,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>45.815.903,30</td><td>45.815.903,30</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>21.961.428,50</td><td>21.961.428,50</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>67.777.331,80</td><td>67.777.331,80</td></tr></table>		VALOR	ACUMULADO	OBRAS	45.815.903,30	45.815.903,30	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.961.428,50	21.961.428,50	VALOR EJECUTADO	67.777.331,80	67.777.331,80
	VALOR																									
OBRAS	150.982.674,00																									
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00																									
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00																									
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.055.145,00																									
	VALOR	ACUMULADO																								
OBRAS	45.815.903,30	45.815.903,30																								
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.961.428,50	21.961.428,50																								
VALOR EJECUTADO	67.777.331,80	67.777.331,80																								
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																										
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 110.879.629,05		MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 67.777.331,80		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4																								
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 34,05%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																								
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12																								

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO 1 - Armado de acero cunetas - 26/02/25	FOTO 2 - Ubicación de formaleta bordillo - 26/02/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
<div><div>Firma</div><div>Nombre: Andrés Felipe Castilla Molina Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>	

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

101 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

102 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

102.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 38 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).

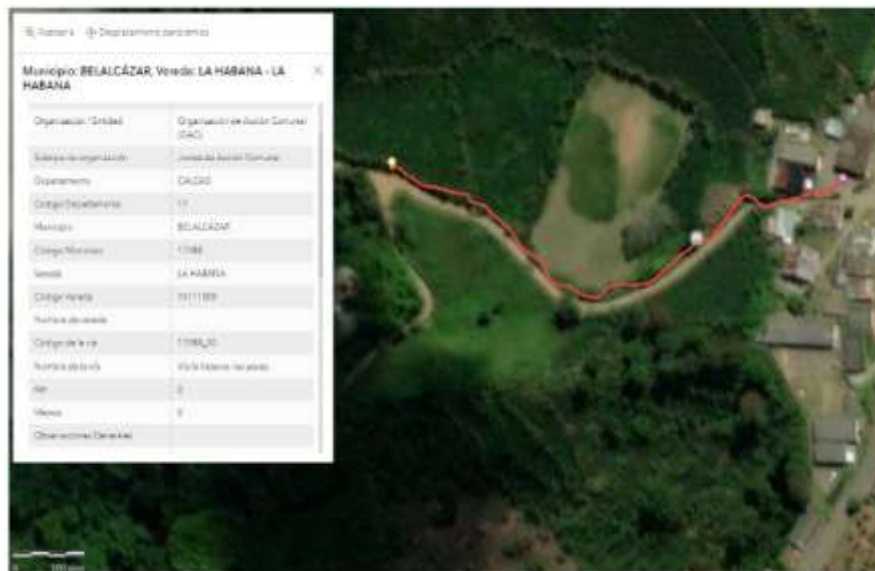


Ilustración 39 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

102.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

102.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Belalcázar del departamento de Caldas en la vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas con una longitud de 0,24 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 en la Bodega de plátano, y el punto final de referencia es PR 0+240 entrada a la Vereda Las Pavas Alta. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 40. Estado inicial de la vía

102.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

103 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA
NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.555.145,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$200.555.145,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.055.515,00	04/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.027.758,00	04/7/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.111.029,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	04/07/2024	30/04/2025

103.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

103.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/2/25, remitió documentos para la solicitud pagos seguridad social enero y retención en la fuente enero 2025.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 5/2/25, remitió documento de auxiliar detallado solicitado.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 5/2/25, remitió respuesta a solicitud oficio CINP 555-318-0509.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 7/2/25 y 10/2/25, remitió del plan de compras 3 para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió autorización de pago a proveedores.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, remitió los documentos ambientales solicitados por la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/2/25, remitió la documentación de las pólizas y soportes.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 22/2/25 y 24/2/25, remitió la solicitud de pago de la nómina del 28 de febrero.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió el plan de compras aprobado en el comité operativo No. 7.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/2/25, remitió la actualización de los documentos de la nómina.

103.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades en el periodo ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 42,08 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 16,80 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 773,81 kg.

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml, cantidad ejecutada: 5,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 42,08 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 16,80 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 773,81 kg.

103.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

103.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	47%	55,29%	110.879.629,05
Ejecutado	39%	34,05%	67.777.331,80
Avance / Retraso	-8%	-21,24%	-43.102.297,25

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	0%	5,05	-
2	Subbase Granular Clase C	M3	54%	32%	71,88	42,08
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	33%	17%	33,50	16,80
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	-	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	33%	17%	1.558,38	773,81

104 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

104.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 15.1.

104.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 15.3

104.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Juan Camilo Corral Álzate
Contador	Bresman Rivera Gutiérrez
Maestro de Obra	Juan Fernando Castaño Agudelo

Tabla 30 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 15.4.

104.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$41.691.969,94 de fecha 15/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$4.148.621,06 de fecha 28/01/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$2.163.019,33 de fecha 28/01/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$198.000,00 de fecha 28/01/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de \$1.279.400,00 de fecha 7/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de \$10.477.003,00 de fecha 13/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$59.928.012,83 correspondiente al 30% del valor del convenio.

104.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 15.5.

104.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 15.6.

104.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 15.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2200 de 2024. Se encuentra pendiente la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

104.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

104.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

104.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

104.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Descripción	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1		Proyecto Píscar Muñiz en concreto	73 días	jun 16/01/25	mar 15/04/25	47%	33 %
2		INICIO	0 días	jun 16/01/25	jun 16/01/25	100%	100%
3		ETAPA 1	38 días	jun 16/01/25	vie 21/03/25	100%	35 %
4		Fase 1	14 días	jun 16/01/25	sáb 18/02/25	100%	100%
5		Extracción de tierras a la Classifier	6 días	jun 16/01/25	jun 23/01/25	100%	100%
6		Subir a Grader Clase C (PARA 68.6m o 40%)	5 días	jun 23/01/25	sáb 16/02/25	100%	100%
7		Fase 2	11 días	sáb 18/02/25	mar 11/03/25	100%	38 %
8		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/m ² (80.000 PSI) (PARA 68.6m o 40%)	5 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	100%	60%
9		Fase 3	11 días	sáb 12/02/25	vie 21/03/25	100%	38 %
10		Concreto reforzado en la sección 2+1 MPA (Clase D) - revestido en alta para plaza buelta (PARA 68.6m o 40%)	5 días	sáb 12/02/25	vie 21/03/25	100%	60%

11		ETAPA 2	23 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	20%	0%
12		Fase 4	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	64%	0%
13		Subtrazo Gravelier Clase C (PARA 60.0m o 40%)	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	64%	0%
14		Fase 5	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	0%	0%
15		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/m² (80.000 PSI) (PARA 60.0m o 40%)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	0%	0%
16		Fase 6	8 días	sáb 12/03/25	vie 21/03/25	0%	0%
17		Concreto reforzado en la losa 21 MPa (Clase D) - anclaje en las patas planas huelle (PARA 60.0m o 40%)	8 días	sáb 12/03/25	vie 21/03/25	0%	0%
18		ETAPA 3	20 días	vie 21/03/25	mar 15/04/25	0%	0%
19		Fase 7	20 días	vie 21/03/25	mar 15/04/25	0%	0%
20		Subtrazo Gravelier Clase C (PARA 34.0m o 20%)	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	0%	0%
21		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/m² (80.000 PSI) (PARA 34.0m o 20%)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	0%	0%
22		Concreto reforzado en la losa 21 MPa (Clase D) - anclaje en las patas planas huelle (PARA 34.0m o 20%)	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	0%	0%
23		Concreto Ciclópico Revestimiento 14 MPa (F) 80% concreto - 40% Piedra para patas huelle	11 días	mar 1/04/25	mar 15/04/25	0%	0%
24		FIN	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	0%	0%

104.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero 2025, la Inversión Programada fue de 110.879.629,05; la Inversión Ejecutada fue de 47.759.248,01. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 63.120.381,04.

104.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

104.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

105 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

105.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

105.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-297-0465 de fecha 3/2/25, solicitó documentación ambiental a la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-318-0509 de fecha 4/2/25, solicitó extractos bancarios y rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-352-0586 de fecha 7/2/25, remitió al INVIAS los informes semanales No. 14.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-348-0567 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC las pólizas actualizadas y soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-367-0606 de fecha 11/2/25, solicitó documentación ambiental a la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-388-0661 de fecha 14/2/25, remitió al INVIAS los informes semanales No. 15.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-385-0652 de fecha 14/2/25, solicitó documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-407-0691 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 6 de fecha 25/2/25.

105.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

El día 25 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml, cantidad ejecutada: 5,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml, cantidad ejecutada: 42,08 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 16,80 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 48 ml, cantidad ejecutada: 773,81 kg.

105.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría re del OAC, los extractos bancarios de los meses de Agosto a Diciembre 2024 y Enero 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

106 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 39% e Inversión de 24% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 174 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 55 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 48 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 48 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$59.928.012,83 correspondiente al 30% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

107 ANEXO

107.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

107.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta registro fotográfico. Ver Anexo 15.7.

107.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

107.4BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 15.8.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No.2094-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No.3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	293
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	294
1	INTRODUCCIÓN		296
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		297
2.1	Localización		297
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		298
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		298
2.4	Características técnicas del proyecto		299
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		299
3.1	Información general del contrato		299
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		301
3.3	Seguimiento Items no previstos		302
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		302
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		303
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1039
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1062
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1064
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	1065
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1066
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1068
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1048
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		304
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		304
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	305
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		305
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		307
7	Conclusiones y recomendaciones		307
8	Anexos		308
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1070
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1072

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO	
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		VERSION	
			PÁGINA	

			FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS	PERIODO MES: feb-25

CONVENIO No.:	2094-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR INICIAL :	\$ 203.292.352,00
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES:	\$ -
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA NARANJAL	FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 203.292.352,00
		PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	240,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3601-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																										
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>152,00</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento	ml	152,00	Estructuras	Alcantarillas				Muro de Contención			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-	Estructuras	Alcantarillas					Muro de Contención				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																											
Pavimentación	Mejoramiento	ml	152,00																																																											
Estructuras	Alcantarillas																																																													
	Muro de Contención																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																														
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																										
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-																																																										
Estructuras	Alcantarillas																																																													
	Muro de Contención																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																														

AVANCE FINANCIERO													
<table><tr><th colspan="2">VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</th></tr><tr><td></td><td>VALOR</td></tr><tr><td>OBRAS</td><td>153.122.101,17</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.593.663,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>44.076.588,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>201.792.352,17</td></tr></table>		VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR	OBRAS	153.122.101,17	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	201.792.352,17
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES													
	VALOR												
OBRAS	153.122.101,17												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00												
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	201.792.352,17												
<p>Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio</p> <p>INVERSIÓN EN OBRA</p> <table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</td><td>\$ 114.375.240,20</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 47.650.081,53</td></tr><tr><td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td><td>23,61%</td></tr></table>		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 114.375.240,20	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 47.650.081,53	AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	23,61%						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 114.375.240,20												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 47.650.081,53												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	23,61%												
<p>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</p> <table><tr><td>MANO DE OBRA CALIFICADA:</td><td>2</td></tr><tr><td>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:</td><td>6</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>5</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>13</td></tr></table>		MANO DE OBRA CALIFICADA:	2	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13				
MANO DE OBRA CALIFICADA:	2												
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13												

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
FOTO 1 - Compactación de subbase - 26/02/25	FOTO 2 - Concreto ciclopeo - 26/02/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	

Firma



Nombre: Andrés Felipe Castilla Molina
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

108 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025. Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 21 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

109 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

109.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.



Ilustración 41 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

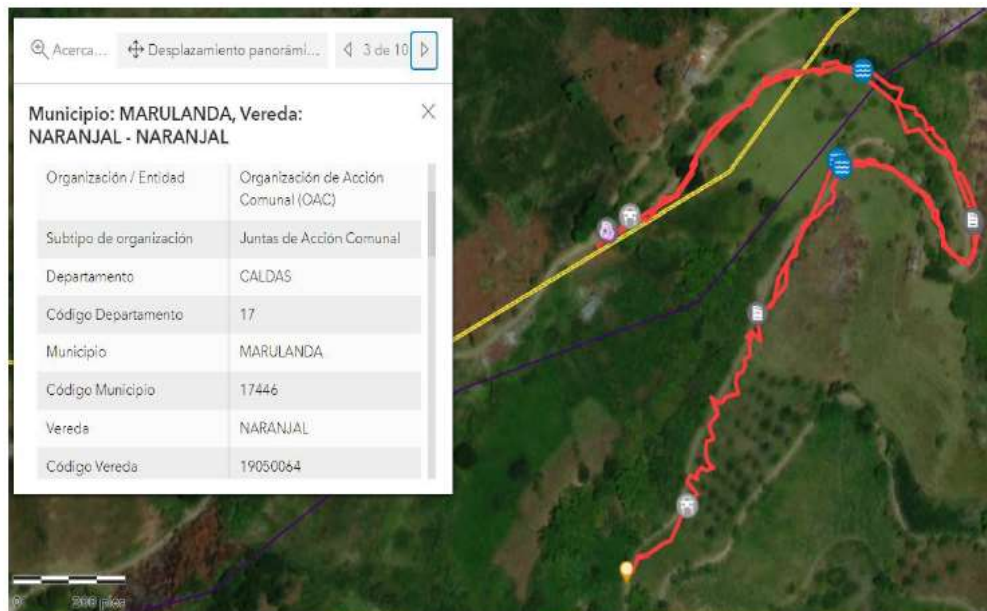


Ilustración 42 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

109.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

109.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Marulanda del departamento de Caldas en la vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal-Montebonito que tiene una longitud de 0.71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruz de la Y, y el punto final de referencia es PR 0+710 empalme con placa huella existente.

Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 43. Estado inicial de la vía

109.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

110 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL
NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$203.292.353,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$203.292.353,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	\$20.329.236,00	02/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.164.618,00	02/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.658.471,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$284.700.000,00	28/06/2024	30/04/2025

Tabla 31 Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.

110.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

110.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 5/2/25 y 6/2/25, remitió documentos de nómina de obreros.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/2/25, remitió hoja de vida de ingeniero residente de obra.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/2/25, remitió ensayo de abrasión de los agregados.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/2/25, aclaró la situación de la participante del comité ciudadano.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió el otrosí de la prórroga No. 1 del convenio.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 10/2/25 y 11/2/25, remitió planillas de nómina y solicitud de pago.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió el formato de auxiliar detallado.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/2/25, remitió la licencia ambiental de material subbase.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 13/2/25, remitió el plan de compras No. 2.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 18/2/25 y 19/2/25, remitió documentos de solicitud de pago.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/2/25, remitió el plan de compras No. 3.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/2/25, remitió documento de concesión minera.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/2/25, remitió la propuesta de inversión social para revisión de la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/2/25, remitió el desembolso No. 3 para revisión de la Interventoría.

110.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades en el periodo ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 6 ml, cantidad ejecutada: 0,15 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 21 ml, cantidad ejecutada: 13,49 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 10,54 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella, longitud ejecutada: 39 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 520,69 kg.

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 3,93 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 71 ml, cantidad ejecutada: 45,69 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 10,54 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella, longitud ejecutada: 39 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 520,69 kg.

110.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

110.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	34%	56,26%	114.375.240,20
Ejecutado	23%	23,44%	47.650.081,53
Avance / Retraso	-11%	-32,82%	-66.725.158,67

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	87%	4,50	3,93
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	39%	116,28	45,61
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	22%	13%	18,41	10,54
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	22%	22%	6,30	6,17
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	22%	13%	909,37	520,69

111 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

111.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 16.1.

111.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 16.3.

111.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Yeison Rivera
Contador	Daniela Hurtado Duque
Maestro de Obra	Alpio Gallego

Tabla 32 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 16.4.

111.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$40.021.600,43 de fecha 31/01/2025.
- Desembolso 02 aprobado por valor de \$1.750.000,00 de fecha 5/02/2025.

3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$3.913.907,00 de fecha 7/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$5.780.860,00 de fecha 7/02/2025.5.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de \$1.975.800,00 de fecha 13/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$53.532.167,43 correspondiente al 27% del valor del convenio.

111.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 16.5.

111.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 16.6.

111.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 16.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2094 de 2024.

111.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

111.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

111.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

111.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1		CONVENIO 2094 DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL		0	65 días	jue 16/01/25	mié 16/04/25	34%	23%
2		INICIO		0	65 días	jue 16/01/25	mié 16/04/25	34%	23%
3		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,41	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	100%	87%
4		Subbase Granular Clase C	M3	113,99	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	100%	39%
5		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,04	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	22%	13%
6		Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,05	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	22%	22%
7		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4125,38	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	22%	13%
8		FINAL		0	0 días	mié 16/04/25	mié 16/04/25	0%	0%

111.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero 2025, la Inversión Programada fue de 114.375.240,20; la Inversión Ejecutada fue de 47.650.081,53. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 66.725.158,67.

111.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

111.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

112 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

112.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

112.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 5/2/25 y 6/2/25, remitió documentos de nómina de obreros.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 6/2/25, remitió hoja de vida de ingeniero residente de obra.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/2/25, remitió ensayo de abrasión de los agregados.

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-334-0549 de fecha 7/2/25, remitió aprobación de hoja de vida del Ingeniero residente remitida por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-336-0555 de fecha 7/2/25, realizó una solicitud al comité de participación ciudadana de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-349-0568 de fecha 7/2/25, solicitó las pólizas actualizadas y soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-361-0596 de fecha 10/2/25, remitió formatos ambientales para la firma de la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-388-0661 de fecha 14/2/25, remitió al INVIAE los informes semanales No. 15.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-401-0685 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-455-0905 de fecha 28/2/25, solicitó presencia del ingeniero residente en la obra.

112.1.2 Actividades Técnicas

El día 12 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

El día 20 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml, cantidad ejecutada: 3,93 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 71 ml, cantidad ejecutada: 45,69 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 10,54 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella, longitud ejecutada: 39 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 38 ml, cantidad ejecutada: 520,69 kg.

112.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto a Diciembre de 2024 y Enero de 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría recibió el soporte del giro de los rendimientos d agosto a diciembre 2024 al Tesoro Nacional, nos encontramos a la espera del soporte del giro del mes de enero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

113 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 23% e Inversión de 23% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 158 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 71 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 38 ml; Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 39 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 38 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$53.532.167,43 correspondiente al 27% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

7.3.2. Un (1) profesional social

7.3.3. Un (1) profesional jurídico

(...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

114 ANEXO

114.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

114.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se anexa registro fotográfico. Ver anexo No. 16.7.

114.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

114.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora de obra. Ver Anexo 16.8.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	310
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	311
1	INTRODUCCIÓN		313
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		314
2.1	Localización		314
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		315
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		315
2.4	Características técnicas del proyecto		315
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		315
3.1	Información general del contrato		315
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		317
3.3	Seguimiento Items no previstos		317
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		317
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		318
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1096
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		319
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		319
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	319
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		319
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		320
7	Conclusiones y recomendaciones		320
8	Anexos		320
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																								
					VERSION	1																																																								
					PÁGINA																																																									
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																														
CONVENIO No.: 2176-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 203.689.907,00																																																										
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																										
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 203.689.907,00																																																										
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																										
		PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																										
		FECHA REINICIO 01: 11/02/2025																																																												
OAC: JAC VEREDA SARICIRI		FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																												
		PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/4/25																																																												
		FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025																																																												
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml 151,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und 1,00</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml 151,00	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und 1,00	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml -</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml -	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																												
Pavimentación	Construcción	ml 151,00																																																												
	Mejoramiento																																																													
	Rehabilitación																																																													
Estructuras	Túneles																																																													
	Puentes																																																													
	Pontones																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und 1,00																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																											
Pavimentación	Construcción	ml -	-																																																											
	Mejoramiento																																																													
	Rehabilitación																																																													
Estructuras	Túneles																																																													
	Puentes																																																													
	Pontones																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-																																																											
AVANCE FINANCIERO																																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>154.212.580,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.626.377,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>43.350.950,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>202.189.907,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			154.212.580,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																											
OBRAS			154.212.580,00																																																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00																																																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00																																																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																										
OBRAS				0,00																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																										
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																														
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																										
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																														
N.A.																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																														
Firma:																																																														
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA																																																														
Director de Interventoría																																																														
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL																																																														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																														
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

115 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

116 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

116.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 44 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

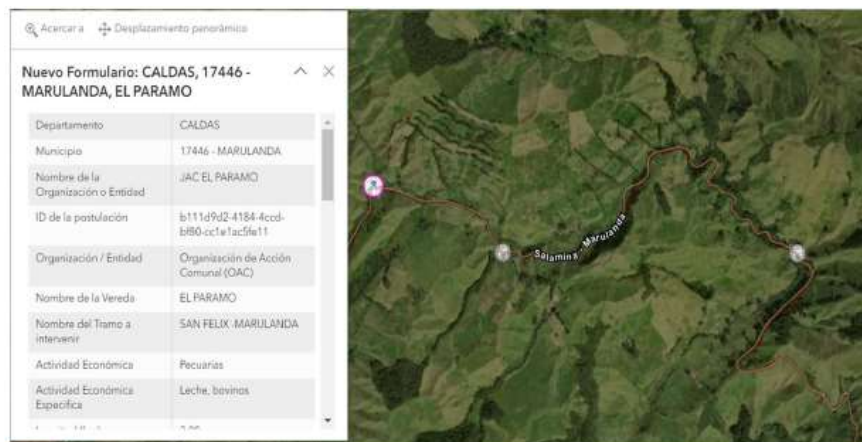


Ilustración 45 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

116.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

116.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

116.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

117 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2

TELÉFONO:	3126652893		
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$\$203.033.492,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$\$203.033.492,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 03 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.303.349,20	06/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.151.675,00	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.606.698,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	06/09/2024	31/12/2024
--	------------------	------------	------------

Tabla 33 Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

117.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

117.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

117.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 12/12/24.

117.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

117.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,7	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,63	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,73	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	35,89	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4188,10	0

118 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

118.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

118.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

118.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

118.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

118.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 17.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3551 de 2024

118.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

118.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

118.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

118.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra No aplica para el periodo.

118.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo.

118.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

118.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

119 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

119.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

119.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

119.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

119.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 24/2/25.

120 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del desembolso de los recursos para iniciar la etapa de alistamiento, solicitud, revisión y aprobación de las hojas de vida, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

121 ANEXO

121.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

121.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

121.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

121.4BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4		MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	323
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	324
1	INTRODUCCIÓN		326
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		327
2.1	Localización		327
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		328
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		328
2.4	Características técnicas del proyecto		328
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		328
3.1	Información general del contrato		328
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		339
3.3	Seguimiento Items no previstos		330
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		330
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		332
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1103
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		332
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		332
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	333
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		333
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		333
7	Conclusiones y recomendaciones		333
8	Anexos		334
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																	
					VERSION	1																																																																																	
					PÁGINA																																																																																		
FECHA28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																																							
<div>CONVENIO No.: 2176-2024</div> <div>OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>OAC: JAC VEREDA SARCIRI</div> <div>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24</div> <div>FECHA DE INICIO: 17/09/2024</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24</div> <div>FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024</div> <div>PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES</div> <div>FECHA REINICIO 01: 11/02/2025</div> <div>FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025</div> <div>PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 10/4/25</div> <div>FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025</div> <div>PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 203.689.907,00</div> <div>VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -</div> <div>VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 203.689.907,00</div> <div>ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -</div> <div>ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LILIANA TIBATÁ</div>																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																			
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>151,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>1,00</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	151,00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	-	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros					Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																				
Pavimentación	Construcción	ml	151,00																																																																																				
	Mejoramiento																																																																																						
	Rehabilitación																																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																																						
	Puentes																																																																																						
	Pontones																																																																																						
Mantenimiento																																																																																							
Otros																																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00																																																																																				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																																			
Pavimentación	Construcción	ml	-	-																																																																																			
	Mejoramiento																																																																																						
	Rehabilitación																																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																																						
	Puentes																																																																																						
	Pontones																																																																																						
Mantenimiento																																																																																							
Otros																																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-																																																																																			
AVANCE FINANCIERO																																																																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																			
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>154.212.580,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.626.377,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>43.350.950,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>202.189.907,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			154.212.580,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																				
OBRAS			154.212.580,00																																																																																				
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.626.377,00																																																																																				
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.350.950,00																																																																																				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			202.189.907,00																																																																																				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																			
OBRAS				0,00																																																																																			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																							
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																							
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																																																			
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																			
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																							
<div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%</div> <div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA: 0</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0</div>																																																																																							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																							
N.A.																																																																																							
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																							
Firma:  Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																																																																							

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

122 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

123 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

123.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 46 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

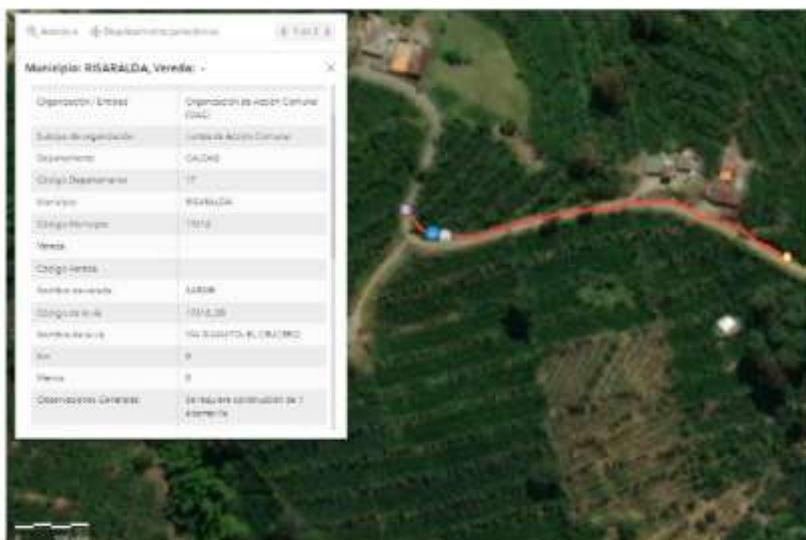


Ilustración 47 Localización vía a Intervénir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

123.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarciri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

123.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

123.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

124 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562				
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI				
NIT.	810.001.938- 6				
TELÉFONO:	3126310011				
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024				
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$203.689.907,00 M/CTE				
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE				
VALOR TOTAL:	\$202.034.766,00 M/CTE				
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE				
ESTADO:	SUSPENDIDO				
FECHA DE INICIO:	17/09/2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024				
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24				
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25				
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MAYO DE 2025				
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ				
GARANTÍAS					
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424					
Amparos		Valor Asegurado		Vigencias	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0					
Cumplimiento		\$20.368.991,00	03/07/2024	31/12/2025	
Prestaciones sociales		\$10.184.496,00	03/07/2024	31/12/2027	

Estabilidad de la obra	\$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 34 Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

124.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

124.2.1 Actividades Administrativas

La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

124.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

124.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

124.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETTA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	115,52	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	88,56	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,05	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4075,54	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	18,30	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	29,39	0

125 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

125.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

125.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

125.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

125.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

125.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 18.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2176 de 2024

125.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

125.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

125.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

125.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo.

125.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica para el periodo.

125.9.3 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

125.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

126 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

126.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

126.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

126.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

126.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 28/2/25.

127 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.

- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

128 ANEXO

128.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

128.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

128.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

128.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4		MES O PERIODO:	feb-25
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	336
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	337
1	INTRODUCCIÓN		339
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		340
2.1	Localización		340
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		341
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		341
2.4	Características técnicas del proyecto		342
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		342
3.1	Información general del contrato		342
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		344
3.3	Seguimiento Items no previstos		345
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		345
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		346
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	1110
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	1126
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	1128
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	1130
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1132
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1119
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		347
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		347
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	348
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		348
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		349
7	Conclusiones y recomendaciones		350
8	Anexos		351
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1134
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1136

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

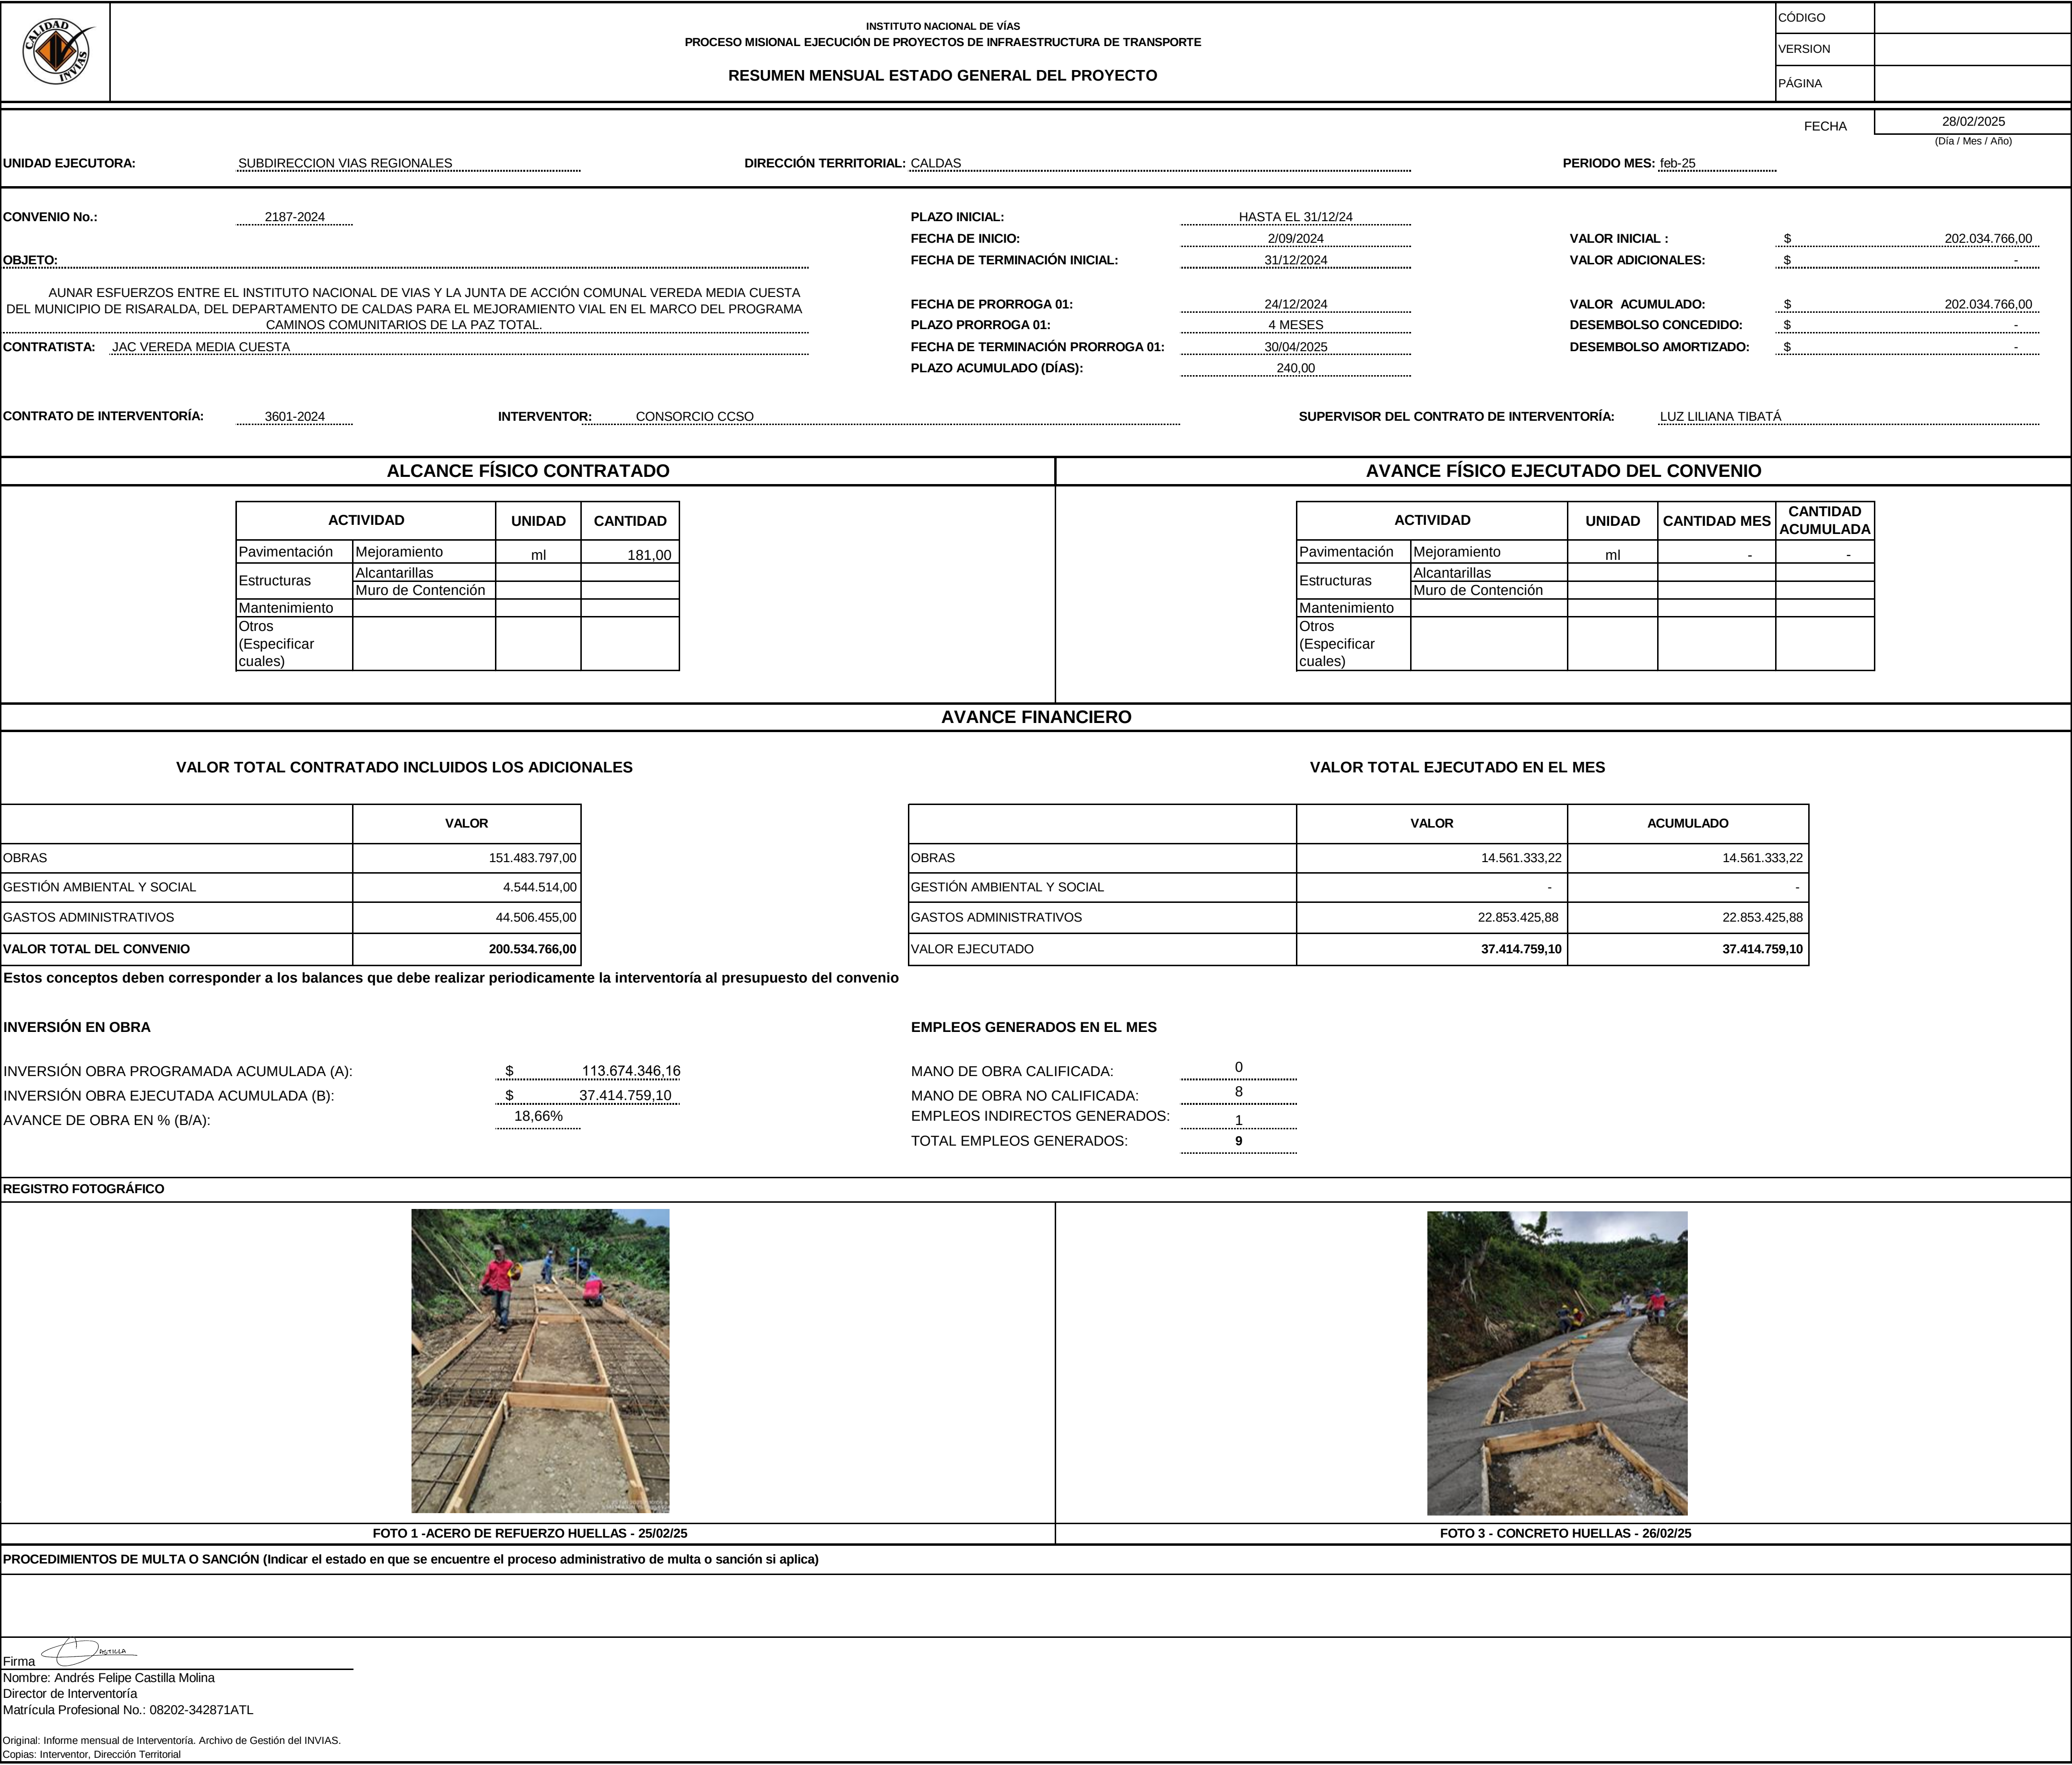

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

129 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCI" N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

130 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

130.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.



Ilustración 48 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

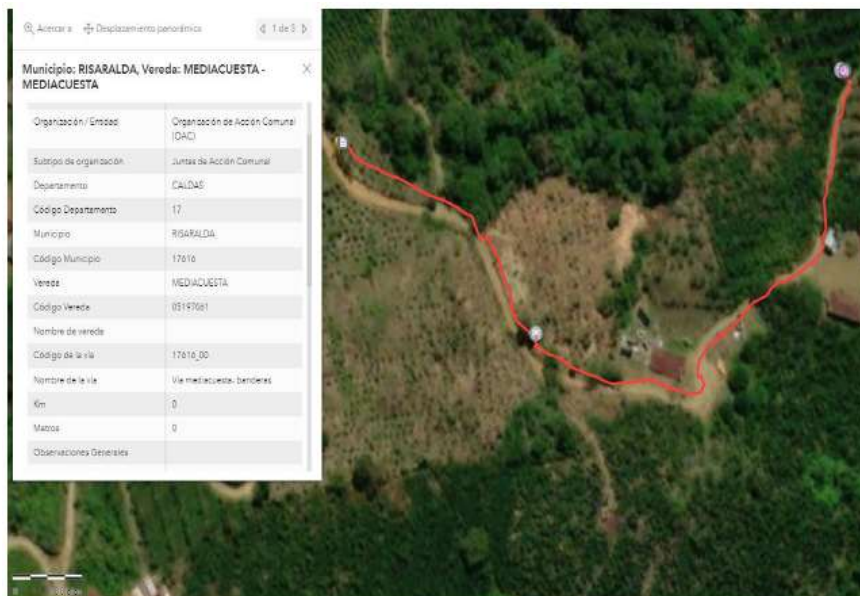


Ilustración 49 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

130.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

130.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Risaralda del departamento de Caldas en la vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas en la vía veredal de Media Cuesta con una longitud de 0,64 km, el punto de inicio de referencia PR 0 +000 es el sector La Puerta en la finca La Suiza y el punto final de referencia PR 0+ 640 es antes de las placas huellas del sector El Arrieral. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 50 Estado inicial del sector

130.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

131 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9

TELÉFONO:	3147931894		
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$202.034.766,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$202.034.766,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA NO. 1	4 MESES 24/12/24		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/4/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.203.477,00	04/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.101.739,00	04/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.406.954,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000,00	04/07/2024	31/12/2024

Vehículos propios y no propios Patronal			
--	--	--	--

Tabla 35 Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

131.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

131.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/2/25, remitió el Excel de los impuestos.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 4/2/25, remitió los documentos para el desembolso 2.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, solicitó a la Interventoría el pago de nóminas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió el plan de compras No. 6.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 12/2/25, remitió los documentos para el desembolso 3.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/2/25, remitió documento del plan de compras.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 19/2/25, remitió solicitud de reunión presencial en obra.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 20/2/25, remitió nómina para pago.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/2/25, remitió el plan de compras para revisión de la Interventoría

131.2.2 Actividades Técnicas

Las actividades en el periodo ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 59,98 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 4,99 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 246,12 kg.

Las actividades acumuladas ejecutadas por la JAC corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml, cantidad ejecutada: 5,20 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 59,98 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 4,99 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 246,12 kg.

131.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

131.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	49%	56,26%	113.674.346,16
Ejecutado	12%	18,52%	37.414.759,10
Avance / Retraso	-37%	-37,75%	-76.259.587,06

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJE.	CANT. PROG.	CANT. EJE.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,20	5,20
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	44%	135,70	59,98
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	41%	5%	41,14	4,99
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	41%	0%	12,88	-
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	41%	5%	2.029,37	246,12

132 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

132.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 19.1.

132.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 19.3.

132.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Felipe Arcila Valencia
Contador	Jorge Humberto Cepeda Salgado
Maestro de Obra	Guillermo Velázquez Blandón

Tabla 36 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relacionará en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 19.4.

132.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$42.756.820,13 de fecha 28/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$1.026.666,00 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$7.408.213,00 de fecha 6/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$5.843.620,00 de fecha 14/02/2025.

Desembolso Total por valor de \$57.064.019,13 correspondiente al 29% del valor del convenio.

132.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 19.5.

132.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se relaciona el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 con los ensayos realizados en el periodo. Ver Anexo 19.6.

132.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 19.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2187 de 2024. Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

132.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

132.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

132.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

132.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1		MEJORAMIENTO VIAL VEREDA MEDIA CUESTA	61 días	lun 20/01/25	lun 14/04/25	49%	12%
2		CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS	61 días	lun 20/01/25	lun 14/04/25	49%	12%
3		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	100%	100%
4		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	100%	100%
5		Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	mar 18/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
6		Subbase Granular Clase C	15 días	lun 20/01/25	vie 7/02/25	100%	44%
7		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	41%	5%
8		Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	41%	0%
9		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	41%	5%

132.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Para el periodo de febrero 2025, la Inversión Programada fue de 113.674.346,16; la Inversión Ejecutada fue de 37.414.759,10. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 76.259.587,06.

132.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

132.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

133 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

133.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

133.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría remitió los Informes Semanales 14, 15, 16 y 17 por medio de los oficios CIMP-555-352-0586, CIMP-555-388-0661, CIMP-555-439-0810 y CIMP-555-451-0898.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-319-0510 de fecha 4/2/25, solicitó los extractos bancarios y rendimientos financieros.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-350-0569 de fecha 7/2/25, solicitó a la JAC las pólizas actualizadas y soportes.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-370-0609 de fecha 11/2/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-406-0690 de fecha 18/2/25, programó reunión social virtual con la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-420-0708 de fecha 18/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por la no presentación de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-444-0825 de fecha 24/2/25, solicitó al INVIAS el inicio de procedimiento de multa por el no giro de los rendimientos financieros.
- Se realizó la reunión del comité operativo No. 8 de fecha 25/2/25.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-469-0926 de fecha 28/2/25, solicitó las pólizas de la novedad contractual y soportes de la misma.

133.1.2 Actividades Técnicas

El día 11 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 06 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 18 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 07 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 25 de febrero de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso y presentación de la nómina.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml, cantidad ejecutada: 5,20 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 59,98 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 4,99 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 15 ml, cantidad ejecutada: 246,12 kg.

133.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto a Diciembre de 2024 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría solicitó a EL INSTITUTO iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 para la imposición de multa por este presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

134 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico de la obra es del 12% e Inversión de 18% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 181 ml; Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml; Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 15 ml; Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) longitud ejecutada: 15 ml.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$57.064.019,13 correspondiente al 29% del valor del convenio.
- El plazo restante es de 58 días para el vencimiento del plazo del convenio. Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.
- Del seguimiento y control que realiza la Interventoría a los convenios solidarios que son objetos de la misma, hemos evidenciado que no se está dando cabal cumplimiento con lo estipulado en:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

(...)

IV. Disponer de personal técnico, administrativo y jurídico para apoyar a los OAC en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.

(...)

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

7.3. Personal de apoyo técnico y administrativo - contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad Estatal se obliga a prestar apoyo técnico, social y jurídico, a través de los siguientes profesionales:

7.3.1. Un (1) Ingeniero Civil o de Transportes y Vías.

- 7.3.2. *Un (1) profesional social*
- 7.3.3. *Un (1) profesional jurídico*
- (...)

A la fecha de corte de este informe aún no se han vuelto a vincular al proyecto estos profesionales.

135 ANEXO

135.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

135.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Se adjunta el registro fotográfico. Ver Anexo 19.7.

135.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

135.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 19.8.

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	353
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	354
1	INTRODUCCIÓN		356
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		357
2.1	Localización		357
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		358
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		359
2.4	Características técnicas del proyecto		359
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		359
3.1	Información general del contrato		359
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		360
3.3	Seguimiento Items no previstos		360
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		361
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		361
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1155
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		362
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		362
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	362
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		363
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		363
7	Conclusiones y recomendaciones		363
8	Anexos		364
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																		
					VERSION	1																																																																																		
					PÁGINA																																																																																			
FECHA						28/02/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: feb-25																																																																																		
CONVENIO No.:		3169-2024		PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31/12/24																																																																																		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		OAC: JAC VEREDA LOS LOBOS		FECHA DE INICIO:		17/09/2024																																																																																		
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		HASTA EL 31/12/24																																																																																		
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01:		12/12/2024																																																																																		
				PLAZO SUSPENSIÓN 01:		2 MESES																																																																																		
				FECHA DE TERMINACIÓN:		2/03/2025																																																																																		
				FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:		11/02/2025																																																																																		
				PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:		HASTA EL 10/4/25																																																																																		
				FECHA DE TERMINACIÓN:		3/05/2025																																																																																		
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS):		85.00																																																																																		
				CONTRATO DE INTERVENTORIA:		3601-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																				
<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>170.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	170.00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	-	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros					Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																					
Pavimentación	Construcción	ml	170.00																																																																																					
	Mejoramiento																																																																																							
	Rehabilitación																																																																																							
Estructuras	Túneles																																																																																							
	Puentes																																																																																							
	Pontones																																																																																							
Mantenimiento																																																																																								
Otros																																																																																								
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																																					
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																																				
Pavimentación	Construcción	ml	-	-																																																																																				
	Mejoramiento																																																																																							
	Rehabilitación																																																																																							
Estructuras	Túneles																																																																																							
	Puentes																																																																																							
	Pontones																																																																																							
Mantenimiento																																																																																								
Otros																																																																																								
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-																																																																																				
AVANCE FINANCIERO																																																																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>151.477.350,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.544.321,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>43.526.429,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>199.548.100,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			151.477.350,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.544.321,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.526.429,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.548.100,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																					
OBRAS			151.477.350,00																																																																																					
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.544.321,00																																																																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.526.429,00																																																																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.548.100,00																																																																																					
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																				
OBRAS				0,00																																																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																																																				
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																								
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																																				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																																				
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																																				
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																								
N.A.																																																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																								
Firma:  Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																																																																								

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”



MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

136 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

137 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

137.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.



Ilustración 51 Localización del municipio de Palestina (Caldas).

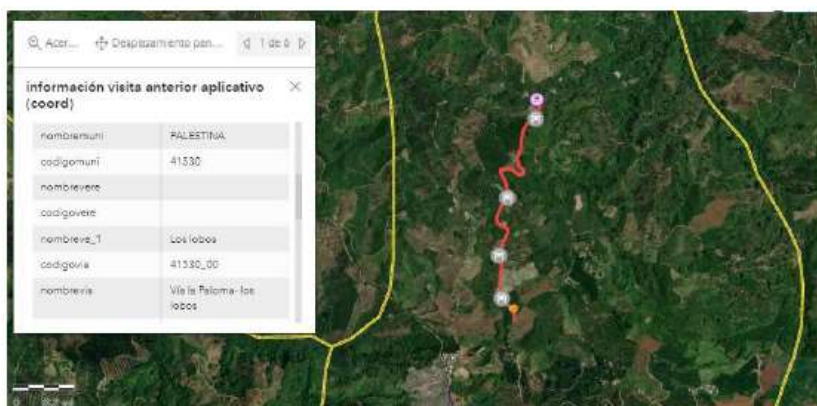


Ilustración 52 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

137.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

137.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

137.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

138 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS
NIT.	901.836.107-6
TELÉFONO:	3176072076
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.048.100,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$201.048.100,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	03/05/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 03 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.104.810,00	14/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.052.405,00	14/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024

Tabla 37 Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

138.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

138.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

138.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

138.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

138.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,85	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	127,45	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,76	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,2	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4782,63	0

139 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

139.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

139.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

139.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

139.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

139.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 20.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3169 de 2024

139.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

139.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

139.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

139.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

139.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

139.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

139.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

140 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

140.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

140.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

140.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El Convenio Solidario no cuenta con el desembolso de recursos, por lo que, no ha cumplido con los requisitos previos para dar inicio a la obra.

140.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

No aplica para este periodo.

141 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

142 ANEXO

142.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

142.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

142.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

142.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	366
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	367
1	INTRODUCCIÓN		369
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		370
2.1	Localización		370
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		371
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		371
2.4	Características técnicas del proyecto		371
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		371
3.1	Información general del contrato		371
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		373
3.3	Seguimiento Items no previstos		373
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		373
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		374
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1162
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		375
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		375
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	375
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		375
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		376
7	Conclusiones y recomendaciones		376
8	Anexos		376
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																								
					VERSION	1																																																								
					PÁGINA																																																									
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																														
CONVENIO No.: 3530-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 201.472.544,00																																																								
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 30/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.472.544,00																																																								
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																								
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025																																																										
				FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																										
OAC: JAC VEREDA SAN LUIS				PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 10/4/25																																																										
				FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025																																																										
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72,00																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml 158,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml 158,00	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml -</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml -	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																												
Pavimentación	Construcción	ml 158,00																																																												
	Mejoramiento																																																													
	Rehabilitación																																																													
Estructuras	Túneles																																																													
	Puentes																																																													
	Pontones																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -																																																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																											
Pavimentación	Construcción	ml -	-																																																											
	Mejoramiento																																																													
	Rehabilitación																																																													
Estructuras	Túneles																																																													
	Puentes																																																													
	Pontones																																																													
Mantenimiento																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-																																																											
AVANCE FINANCIERO																																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>152.646.058,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.579.382,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>42.747.104,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>199.972.544,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			152.646.058,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.579.382,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.747.104,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.972.544,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																											
OBRAS			152.646.058,00																																																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.579.382,00																																																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.747.104,00																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.972.544,00																																																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																										
OBRAS				0,00																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																										
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																														
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																										
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																														
N.A.																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																														
Firma: Nombre: ANDRÉS CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

143 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

144 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

144.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.



Ilustración 53 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

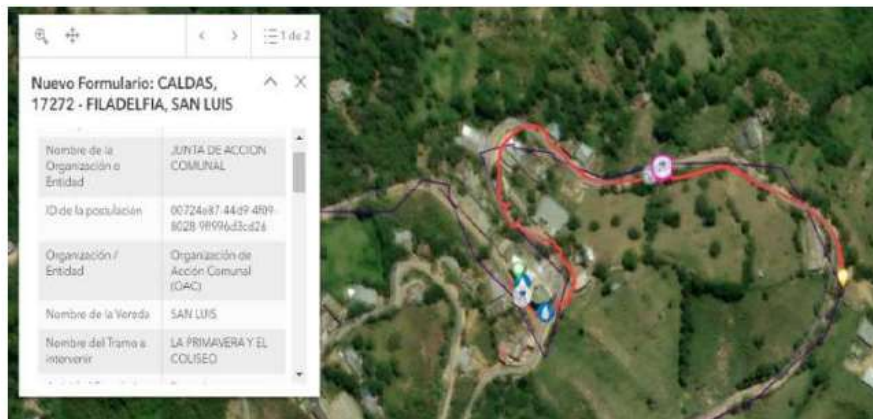


Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

144.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

144.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

144.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

145 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8

TELÉFONO:	3176072076		
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.472.544,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.472.544,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.147.254,00	05/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.073.627,00	05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024
--	------------------	------------	------------

Tabla 38 . Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

145.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

145.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

145.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

145.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

145.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

146 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

146.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

146.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

146.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

146.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

146.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 21.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3530 de 2024

146.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

146.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

146.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

146.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

146.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

146.9.3.1 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

146.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

147 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

147.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

147.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

147.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

147.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

No aplica para este periodo.

148 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

149 ANEXO

149.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

149.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

149.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

149.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	378
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	379
1	INTRODUCCIÓN		381
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		382
2.1	Localización		382
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		383
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		383
2.4	Características técnicas del proyecto		383
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		383
3.1	Información general del contrato		383
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		385
3.3	Seguimiento Items no previstos		385
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		385
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		387
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1169
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		387
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		387
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	388
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		388
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		388
7	Conclusiones y recomendaciones		388
8	Anexos		389
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																								
					VERSION	1																																																																								
					PÁGINA																																																																									
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																														
CONVENIO No.: 3652-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 201.949.712,00																																																																								
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 2/10/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.949.712,00																																																																								
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																								
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025																																																																										
OAC: JAC VEREDA EL VERSO				FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																																										
				PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025																																																																										
				FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025																																																																										
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00																																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>141,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>2,00</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	141,00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	-	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																												
Pavimentación	Construcción	ml	141,00																																																																											
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	2,00																																																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																											
Pavimentación	Construcción	ml	-	-																																																																										
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-																																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>153.349.316,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.600.479,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>42.499.917,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>200.449.712,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			153.349.316,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.600.479,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.499.917,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.449.712,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																											
OBRAS			153.349.316,00																																																																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.600.479,00																																																																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.499.917,00																																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			200.449.712,00																																																																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																										
OBRAS				0,00																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																																										
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																														
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																										
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																														
N.A.																																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																														
Firma: Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-51737 ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

150 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

151 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

151.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 55 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

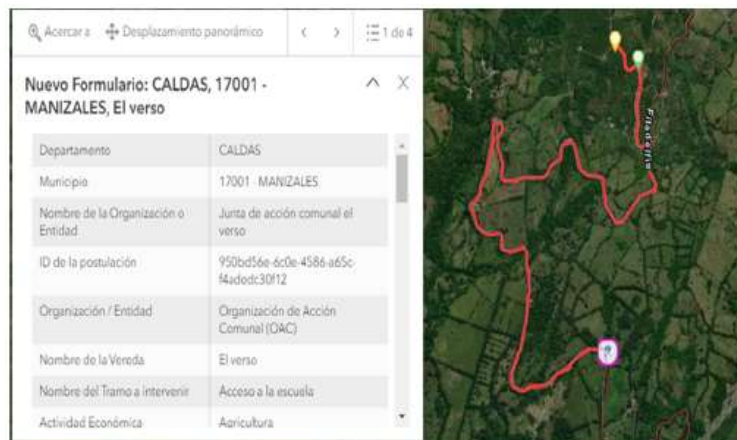


Ilustración 56 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

151.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

151.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

151.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

152 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1

TELÉFONO:	3193164956		
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.949.712,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$ 201.949.712,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	2/10/24		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIAIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 03 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.194.971,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.097.486,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.389.942,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024
--	------------------	------------	------------

Tabla 39 Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia.

152.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

152.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

152.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

152.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

152.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,21	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	86,59	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	70,17	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	18,18	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3721,25	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	104,80	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	11,60	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,90	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	19,10	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	1157,80	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	55,80	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	14,00	0

153 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

153.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

153.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

153.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

153.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

153.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 22.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3652 de 2024

153.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

153.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

153.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

153.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

153.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

153.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

153.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

154 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

154.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

154.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

154.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

154.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 25/2/25.

155 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad.

Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

156 ANEXO

156.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

156.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

156.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

156.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	391
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	392
1	INTRODUCCIÓN		394
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		395
2.1	Localización		395
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		396
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		396
2.4	Características técnicas del proyecto		396
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		396
3.1	Información general del contrato		396
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		398
3.3	Seguimiento Items no previstos		398
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		398
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		389
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1176
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		400
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		400
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	400
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		400
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		401
7	Conclusiones y recomendaciones		401
8	Anexos		401
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																											
					VERSION	1																																																											
					PÁGINA																																																												
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																	
CONVENIO No.: 3622-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 201.471.038,00																																																											
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPIÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 2/10/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																											
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.471.038,00																																																											
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																											
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																											
				FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025																																																													
OAC: JAC VEREDA ALTO CABUYAL				FECHA DE PRORROGA 01: N.A																																																													
				PLAZO PRORROGA 01: N.A																																																													
				FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A																																																													
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																													
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																															
Pavimentación	Construcción	ml																																																															
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																															
		-																																																															
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																														
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																														
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																														
AVANCE FINANCIERO																																																																	
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																													
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>152.089.476,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.562.684,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>43.318.878,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>199.971.038,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			152.089.476,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.562.684,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.318.878,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.971.038,00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00			
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																														
OBRAS			152.089.476,00																																																														
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.562.684,00																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.318.878,00																																																														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.971.038,00																																																														
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																													
OBRAS				0,00																																																													
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																													
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																													
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																	
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																													
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																	
N.A.																																																																	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																	
Firma:  Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																																																	

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

157 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

158 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

158.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.



Ilustración 57 Localización del municipio de Supía (Caldas).

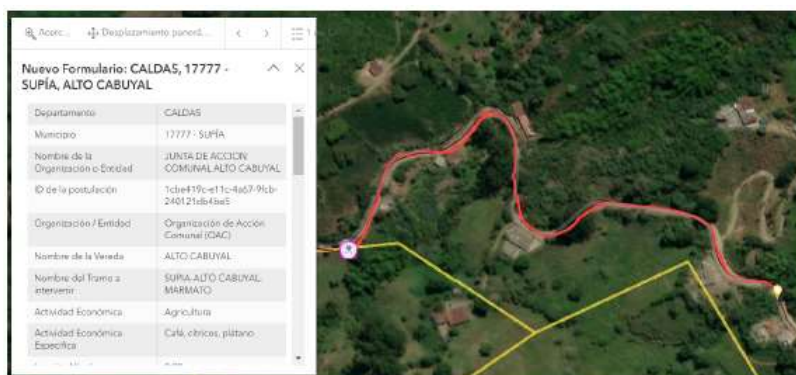


Ilustración 58 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

158.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

158.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

158.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

159 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119

CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.471.038,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.471.038,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	2/10/24		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 20/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087618			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			
--	--	--	--

Tabla 40 Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

159.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

159.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

159.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

159.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

159.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,09	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	132,18	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	37,46	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4463,13	0

160 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

160.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

160.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

160.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

160.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

160.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 23.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024

160.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

160.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

160.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

160.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

160.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

160.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

160.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

161 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

161.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

161.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

161.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

161.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25.

162 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Que, a pesar de NO haberse superado la causal de la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024, para el 19 de febrero de 2025 cuando se completaron los dos (2) meses de suspensión, el OAC no presentó ninguna solicitud de ampliación de dicha suspensión, por lo que el Convenio se reinició, quedando como nueva fecha de terminación el 2 de marzo de 2025. A la fecha del presente informe, la OAC no presentó solicitud de prórroga para la ejecución del proyecto.

163 ANEXO

163.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

163.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

163.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

163.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	404
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	405
1	INTRODUCCIÓN		407
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		408
2.1	Localización		408
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		409
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		409
2.4	Características técnicas del proyecto		409
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		409
3.1	Información general del contrato		409
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		411
3.3	Seguimiento Items no previstos		411
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		411
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		412
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1183
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		413
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		413
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	413
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		413
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		414
7	Conclusiones y recomendaciones		414
8	Anexos		414
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																											
					VERSION	1																																																											
					PÁGINA																																																												
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																	
CONVENIO No.: 3983-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 201.464.740,00																																																											
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 31/10/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																											
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.464.740,00																																																											
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																											
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																											
				FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025																																																													
OAC: JAC VEREDA BAJO CABUYAL				FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																													
				PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025																																																													
				FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025																																																													
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 41,00																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																													
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																															
Pavimentación	Construcción	ml																																																															
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																															
		-																																																															
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																														
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																														
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																														
AVANCE FINANCIERO																																																																	
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																													
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>152.402.534,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.572.076,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>42.990.130,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>199.964.740,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			152.402.534,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.572.076,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.990.130,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.964.740,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00			
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																														
OBRAS			152.402.534,00																																																														
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.572.076,00																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.990.130,00																																																														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.964.740,00																																																														
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																													
OBRAS				0,00																																																													
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																																																																	
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																																																																	
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																																																																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																													
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																													
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																	
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																													
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																	
N.A.																																																																	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																	
Firma:  Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																																																	

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

164 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

165 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

165.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 59 Localización del municipio de Supía(Caldas).

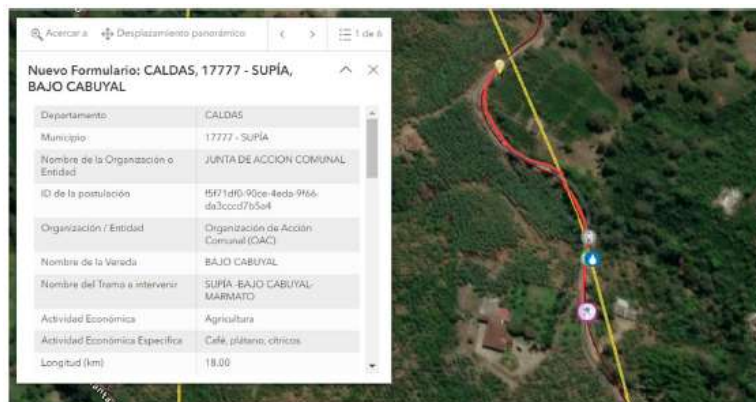


Ilustración 60 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

165.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

165.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

165.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

166 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.464.740,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.464.740,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	31/10/24		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.146.474,00	01/10/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.073.237,00	01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.292.948,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	01/10/2024	31/12/2024

Patronal			
----------	--	--	--

Tabla 41 Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

166.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

166.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

166.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

166.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

166.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,20	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	134,64	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,36	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	41,31	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4418,26	0

167 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

167.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

167.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

167.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

167.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

167.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 24.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3983 de 2024

167.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

167.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

167.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

167.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

167.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

167.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

167.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

168 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

168.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

168.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

168.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

168.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

No aplica para este periodo.

169 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

170 ANEXO

170.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

170.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

170.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

170.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024

Contratista: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	416
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	417
1	INTRODUCCIÓN		419
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		420
2.1	Localización		420
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		421
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		422
2.4	Características técnicas del proyecto		422
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		422
3.1	Información general del contrato		422
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		423
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		424
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		424
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		425
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1190
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		425
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A. N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		425
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	426 N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		426
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A. N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		426
7	Conclusiones y recomendaciones		426
8	Anexos		427
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

					FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS	PERIODO MES:	feb-25	
-------------------	------------------------------	------------------------	--------	--------------	--------	--

CONVENIO No.:	3646-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$	200.460.667.00
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO:	31/10/2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$	-
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	200.460.667.00
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	12/12/2024	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$	-
		PLAZO SUSPENSIÓN 01:	2 MESES	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$	-
		FECHA DE TERMINACIÓN :	2/03/2025			
OAC:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA	FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	11/02/2025			
		PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01:	10/04/2025			
		FECHA DE TERMINACIÓN:	3/05/2025			
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	41.00			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3601-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUZ LILIANA TIBATÁ	
----------------------------	-----------	--------------	----------------	---	--------------------	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																			
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>132.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	132.00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																					
Pavimentación	Construcción	ml	132.00																																																																				
	Mejoramiento																																																																						
	Rehabilitación																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																						
	Puentes																																																																						
	Pontones																																																																						
Mantenimiento																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																				
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																																				
	Mejoramiento																																																																						
	Rehabilitación																																																																						
Estructuras	Túneles																																																																						
	Puentes																																																																						
	Pontones																																																																						
Mantenimiento																																																																							
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																				

AVANCE FINANCIERO			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			
	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			152.263.198,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.567.896,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.129.573,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.960.667,00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.			
INVERSIÓN EN OBRA			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES			
MANO DE OBRA CALIFICADA: 0			
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
N.A.			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
Firma:  Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>			

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

171 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, por un valor de \$200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

172 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

172.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 61 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

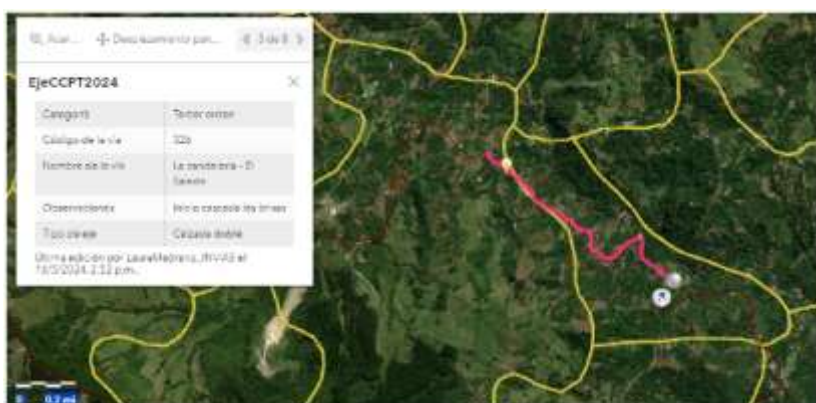


Ilustración 62 Localización vía a intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

172.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

172.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

172.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

173 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.046.067,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.023.033,35	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.092.133,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 42 . Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

173.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

173.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

173.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

173.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

173.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	6,00	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	151,47	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,42	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	71,52	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4040,14	0

174 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

174.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

174.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

174.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

174.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

174.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 25.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3646 de 2024

174.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

174.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

174.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

174.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

174.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

174.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

174.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

175 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

175.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

175.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

175.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

175.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

176 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos

ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

177 ANEXO

177.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

177.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

177.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

177.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	429
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	430
1	INTRODUCCIÓN		432
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		433
2.1	Localización		433
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		434
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		435
2.4	Características técnicas del proyecto		435
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		435
3.1	Información general del contrato		435
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		436
3.3	Seguimiento Items no previstos		436
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		436
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		437
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1197
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		438
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		438
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	438
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		438
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		439
7	Conclusiones y recomendaciones		439
8	Anexos		440
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																								
					VERSION	1																																																																								
					PÁGINA																																																																									
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																														
CONVENIO No.: 2569-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 200.487.839,00																																																																								
OBJETO: AJUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.487.839,00																																																																								
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																								
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025																																																																										
OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II				FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																																										
				PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025																																																																										
				FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025																																																																										
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00																																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>152,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>1,00</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	152,00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	-	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																												
Pavimentación	Construcción	ml	152,00																																																																											
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00																																																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																											
Pavimentación	Construcción	ml	-	-																																																																										
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-																																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>151.145.376,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.534.361,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>43.308.102,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>198.987.839,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			151.145.376,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.534.361,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.308.102,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.987.839,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																											
OBRAS			151.145.376,00																																																																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.534.361,00																																																																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS			43.308.102,00																																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.987.839,00																																																																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																										
OBRAS				0,00																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																																										
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																														
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																										
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																														
N.A.																																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																														
Firma: Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

178 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

179 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

179.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 63 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps

Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

179.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

179.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

179.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

180 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656

CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 200.487.839,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$200.487.839,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	17/09/24		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.048.784,00	23/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.024.392,00	23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			

Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024
--	------------------	------------	------------

Tabla 43 Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

180.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

180.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

180.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

180.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

180.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,5	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	116,28	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	90,30	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	28,64	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4133,51	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	29,10	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0

181 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

181.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

181.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

181.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

181.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

181.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 26.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 2569 de 2024

181.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

181.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

181.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

181.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

181.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

181.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

181.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

182 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

182.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

182.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

182.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

182.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

183 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

184 ANEXO

184.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

184.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

184.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

184.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO- LOMAPRIETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024

Contratista: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	442
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	443
1	INTRODUCCIÓN		445
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		446
2.1	Localización		446
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		447
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		448
2.4	Características técnicas del proyecto		448
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		448
3.1	Información general del contrato		448
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		449
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		450
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		450
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		451
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1204
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		452
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A. N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		452
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	452 N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		452
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A. N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		453
7	Conclusiones y recomendaciones		453
8	Anexos		453
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																								
					VERSION	1																																																																								
					PÁGINA																																																																									
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																														
CONVENIO No.: 3286-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 199.533.766,00																																																																								
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 199.533.766,00																																																																								
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																								
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																								
				FECHA DE TERMINACIÓN : 2/03/2025																																																																										
				FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																																										
				PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025																																																																										
OAC: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA				FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025																																																																										
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00																																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>140,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>1,00</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	140,00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	-	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																												
Pavimentación	Construcción	ml	140,00																																																																											
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	1,00																																																																											
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																																											
Pavimentación	Construcción	ml	-	-																																																																										
	Mejoramiento																																																																													
	Rehabilitación																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																													
	Puentes																																																																													
	Pontones																																																																													
Mantenimiento																																																																														
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	-																																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>151.238.149,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.537.144,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>42.258.473,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>198.033.766,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			151.238.149,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.537.144,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.258.473,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.033.766,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																											
OBRAS			151.238.149,00																																																																											
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.537.144,00																																																																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS			42.258.473,00																																																																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			198.033.766,00																																																																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																										
OBRAS				0,00																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																																																																														
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																																																																														
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																																										
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																														
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																										
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																														
N.A.																																																																														
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																														
Firma:																																																																														
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA																																																																														
Director de Interventoría																																																																														
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL																																																																														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																																														
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																														

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

185 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomapieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

186 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

186.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.



Ilustración 64 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

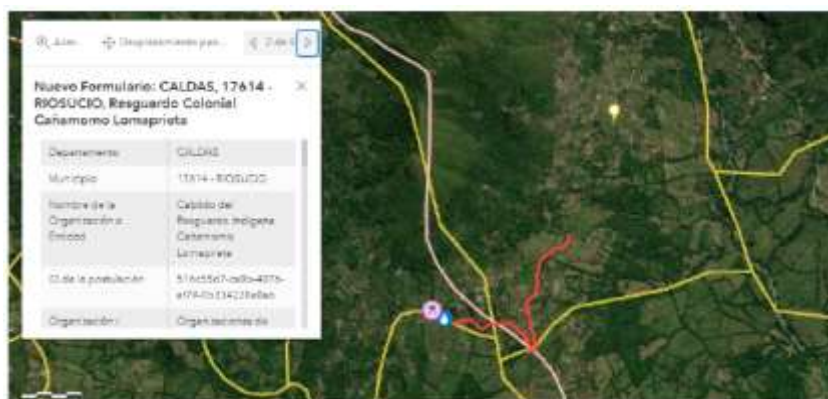


Ilustración 65 Localización vía a Intervénir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVÍAS

186.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomapieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

186.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

186.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

187 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04
TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	17/09/24

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$19.953.377,00	21/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$9.976.689,00	21/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$39.906.753,20	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	21/08/2024	31/12/2024

Tabla 44 . Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

187.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

187.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

187.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

187.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

187.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	117,81	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,10	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	36,35	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3889,56	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	7,5	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	29,10	0

188 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

188.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

188.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

188.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

188.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

188.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 27.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3286 de 2024

188.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

188.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

188.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

188.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

188.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

188.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

188.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

189 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

189.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

189.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

189.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

189.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

190 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

191 ANEXO

191.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

191.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

191.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

191.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024

Contratista: RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4	MES O PERIODO:	1 AL 28 DE FEBRERO
-----------------------	----------------	--------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	456
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	457
1	INTRODUCCIÓN		459
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		460
2.1	Localización		460
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		461
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		462
2.4	Características técnicas del proyecto		462
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		462
3.1	Información general del contrato		462
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		467
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		464
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		464
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		465
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	1211
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		466
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A. N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		466
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	467 N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1248
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1614
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		466
5.3	Informes especialistas y profesionales		1336
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		50
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1625
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1218
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1623
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1221
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A. N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1630
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		466
7	Conclusiones y recomendaciones		466
8	Anexos		466
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1236
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																											
					VERSION	1																																																											
					PÁGINA																																																												
						FECHA	28/02/2025 (Día / Mes / Año)																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: feb-25																																																																	
CONVENIO No.: 3595-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 201.348.439,00																																																											
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				FECHA DE INICIO: 7/10/2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -																																																											
				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.348.439,00																																																											
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																											
				PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																											
				FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025																																																													
				FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 11/02/2025																																																													
OAC: RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA				PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025																																																													
				FECHA DE TERMINACIÓN: 3/05/2025																																																													
				PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 65,00																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																													
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD	Pavimentación	Construcción	ml	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																															
Pavimentación	Construcción	ml																																																															
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																															
		-																																																															
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD																																																														
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																														
	Mejoramiento																																																																
	Rehabilitación																																																																
Estructuras	Túneles																																																																
	Puentes																																																																
	Pontones																																																																
Mantenimiento																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																														
AVANCE FINANCIERO																																																																	
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																													
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>153.411.914,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td></td><td></td><td>4.602.357,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td>41.834.168,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>199.848.439,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			153.411.914,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.602.357,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS			41.834.168,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.848.439,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)					GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00	VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00			
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																														
OBRAS			153.411.914,00																																																														
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			4.602.357,00																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS			41.834.168,00																																																														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199.848.439,00																																																														
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																													
OBRAS				0,00																																																													
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																																																																	
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																																																																	
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																																																																	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				0,00																																																													
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00																																																													
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																	
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):				MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																													
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																	
N.A.																																																																	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																	
Firma:																																																																	
Nombre: ANDRES CASTILLA MOLINA																																																																	
Director de Interventoría																																																																	
Matrícula Profesional No.: 08202-342871 ATL																																																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																																	
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																	

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

192 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 04, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

193 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

193.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Fútbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.



Ilustración 66 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 67 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

193.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Fútbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

193.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

193.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

194 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8
DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena
TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	07/10/24

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	2 MESES 11/2/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/5/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE MAYO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.134.844,00	09/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.067.422,00	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.269.688,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	09/09/2024	31/12/2024

Tabla 45 Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

194.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

194.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/2/25, remitió la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del convenio.

194.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

194.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

194.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,41	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	138,85	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	100,61	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	42,96	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4648,36	0

195 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

195.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

195.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

195.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

195.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

195.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 28.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3595 de 2024

195.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

195.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

195.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

195.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

195.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

195.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

195.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

196 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

196.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

196.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio de correo electrónico de fecha 11/2/25, remitió acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 debidamente firmada.

196.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

196.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

No aplica para este periodo.

197 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del giro de los recursos, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- Debido a que las JAC no cuentan con la experticia necesaria para la ejecución del proyecto, se hace necesario surtir la etapa de contratación de los profesionales que se le exige a cada Convenio Solidario, para que estos una vez vinculados puedan aportar su conocimiento en el estudio de la información del convenio y la elaboración o consecución de los documentos que allí se mencionan.
- De los veintiocho (28) convenios que son objeto de esta Interventoría, sólo diecisiete (17) de ellos cuentan con recursos, de los cuales tres (3) se encuentran suspendidos ya que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad.

Los otros once (11) de los veintiocho (28) están suspendidos y supeditados a que la entidad cuente con disponibilidad del PAC.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

198 ANEXO

198.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

198.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

198.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

198.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.
