

CONTRATO No. : 3601 DE 2022



ENTIDAD CONTRATANTE: INVIAS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7

TIPO DE INFORME: INFORME MENSUAL 08

CODIGO: IM-555-08

CONTROL DE REVISIONES

No. De Revisiones		0	1	2	3
Responsables					
Responsable de Elaboración	Nombre:	CARLOS MARTINEZ			
	Firma:				
	Fecha:	ago-24			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma:				
	Fecha:	ago-24			
Vo. Bo. Director del Proyecto/Gerente de Proyectos	Nombre:	BIBIANA PATERNINA ESPITIA			
	Firma:				
	Fecha:	ago-24			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	INVIAS	1 Copia magnetica
2	CONSORCIO CCSO	1 Copia magnetica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



CONTRATO No. 3601 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7



SAMANÁ



PENSILVANIA



BELALCÁZAR



MARULANDA



RISARALDA



PALESTINA



FILADELFIA



SUPÍA



RIOSUCIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 08
PERIODO: DEL 2 AL 31 DE JULIO DE 2025

IM – 555 – 08



JULIO 2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 08	
CONTRATO No. 3601 DE 2024	
REALIZADO POR:	
	Carlos Martínez Ingeniero Residente
REVISADO POR:	
	Luz Liliana Tibatá Supervisor del Contrato de Interventoría

CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ	2073 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL SILENCIO</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: EL SILENCIO LONG. CORR.: 1,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 150 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: EL SILENCIO LONG. CORR.: 1,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 150 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2172 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO</u> , MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	VÍA: TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) LONG. CORR.: 0,35 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 158 ML OBRAS DE ARTE: 0	VÍA: TARROPINTADO (SAN DIEGO – TARROPINTADO – GAVIOTA – ALEJANDRÍA – TESORO Y ESMERALDA) LONG. CORR.: 0,35 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 144 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2435 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA PATIO BONITO</u> , CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 130 ML OBRAS DE ARTE: 1	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 155 ML OBRAS DE ARTE: 1
	2159 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL CIRPIAL</u> , MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1	VÍA: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS –LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
	2124 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA <u>VEREDA EL DORADO</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: SARDINAS LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: SARDINAS LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 148,51 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2058 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL <u>VEREDA CALIFORNIA ALTA</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: CALIFORNIA ALTA LONG. CORR.: 6,2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 155 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: CALIFORNIA ALTA LONG. CORR.: 6,2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 139,5 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2119 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA CARACOLI</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: CARACOLI LONG. CORR.: 2,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 156 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: CARACOLI LONG. CORR.: 2,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 179 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2173 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA MONTEBELLO</u> DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	SECTOR: MONTEBELLO LONG. CORR.: 2,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 149 ML	SECTOR: MONTEBELLO LONG. CORR.: 2,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 142,8 ML

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
SAMANÁ		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OBRAS DE ARTE: 0	OBRAS DE ARTE: 0
	2524-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE <u>ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO</u> MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: SANTA BÁRBARA – LOS POMOS – LA QUINTA – LA PALMA – EL CODO LONG. CORR.: 2 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 127 ML OBRAS DE ARTE: 1
	2175 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL <u>VEREDA EL NARANJAL</u> DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: EL NARANJAL LONG. CORR.: 1,8 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: EL NARANJAL LONG. CORR.: 1,8 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 147 ML OBRAS DE ARTE: 0
PENSILVANIA	2227 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA LA LINDA</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: LA LINDA – SAN DANIEL LONG. CORR.: 0,26 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: LA LINDA – SAN DANIEL LONG. CORR.: 0,26 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 148 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2140 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA SANTA RITA</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	SECTOR: SANTA RITA BAJA LONG. CORR.: 0,69 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 135 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: SANTA RITA BAJA LONG. CORR.: 0,69 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PENSILVANIA		EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	2077 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA EL VERDAL</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN LONG. CORR.: 0,51 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 126 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PUERTO VENUS - ARBOLEDA SECTOR LA VIRGEN LONG. CORR.: 0,51 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 130 ML OBRAS DE ARTE: 0
	2169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA MIRAFLORES</u> DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES LONG. CORR.: 1,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PUEBLO NUEVO - MIRA FLORES LONG. CORR.: 1,4 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 141 ML OBRAS DE ARTE: 0
BELALCÁZAR	2200 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA LA HABANA</u> DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: LA HABANA – LAS PAVAS LONG. CORR.: 0,24 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 174 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: LA HABANA – LAS PAVAS LONG. CORR.: 0,24 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 183 ML OBRAS DE ARTE: 0
MARULANDA	2094 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA NARANJAL</u> DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	SECTOR: NARANJAL - MONTEBONITO LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA	SECTOR: NARANJAL - MONTEBONITO LONG. CORR.: 0,71 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
MARULANDA		PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	LONG. PLACA HUELLA.: 152 ML OBRAS DE ARTE: 0	LONG. PLACA HUELLA.: 155 ML OBRAS DE ARTE: 0
	3551 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL PARAMO</u> DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX LONG. CORR.: 3,38 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL PÁRAMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y CON EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX LONG. CORR.: 3,38 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 146 ML OBRAS DE ARTE: 0
RISARALDA	2176 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA SARCIRI</u> DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: GUAMITO – EL CRUCERO LONG. CORR.: 0,17 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: GUAMITO – EL CRUCERO LONG. CORR.: 0,17 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 151 ML OBRAS DE ARTE: 1
	2187 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA MEDIA CUESTA</u> DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: MEDIA CUESTA - BANDERAS LONG. CORR.: 0,64 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 181 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: MEDIA CUESTA - BANDERAS LONG. CORR.: 0,64 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 156 ML OBRAS DE ARTE: 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
PALESTINA	3169 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA LOS LOBOS</u> DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS LONG. CORR.: 1,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 170 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: CORREDOR VIAL QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA EL REPOSO, SECTOR FINCA EL BARRANCO HASTA LA VEREDA LOS LOBOS LONG. CORR.: 1,6 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 170 ML OBRAS DE ARTE: 0
FILADEFIA	3530 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA <u>VEREDA SAN LUIS</u> DEL MUNICIPIO DE FILADEFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA LONG. CORR.: 0,532 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 158 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: SAN LUIS - EL CARIBE Y SAN LUIS - LA PRIMAVERA LONG. CORR.: 0,532 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 158 ML OBRAS DE ARTE: 0
	3652 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA EL VERSO</u> DEL MUNICIPIO DE FILADEFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) LONG. CORR.: 0,322 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 141 ML OBRAS DE ARTE: 2	SECTOR: CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO EL VERSO, POBLADO EL VERSO – ESCUELA EL VERSO (ACCESO A LA ESCUELA) LONG. CORR.: 0,322 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 141 ML OBRAS DE ARTE: 2
SUPÍA	3622 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>ALTO CABUYAL</u> DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,533 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 163 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,533 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 163 ML OBRAS DE ARTE: 0

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
	3983 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>VEREDA BAJO CABUYAL</u> DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,221 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 160 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: PARTIDAS – SAN JUAN – EL CRUCE LONG. CORR.: 0,221 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 160 ML OBRAS DE ARTE: 0
	3646 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y <u>EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) LONG. CORR.: 1,55 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 132 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: RIOSUCIO-EL SALADO SECTOR LAS BRISAS (LA CANDELARIA - EL SALADO) LONG. CORR.: 1,55 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 132 ML OBRAS DE ARTE: 0
RIOSUCIO	2569 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS <u>PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	SECTOR: CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO LONG. CORR.: 0,175 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 152 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: CORREDOR VIAL HACIA LA VEREDA SAN ANTONIO LONG. CORR.: 0,175 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 152 ML OBRAS DE ARTE: 1
	3286 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y <u>EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE	SECTOR: CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) LONG. CORR.: 4,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 140 ML OBRAS DE ARTE: 1	SECTOR: CENTRO (PORTACHUELO - CENTRO PANESSO) LONG. CORR.: 4,5 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 140 ML OBRAS DE ARTE: 1

MUNICIPIO	NO. CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	ALCANCE INICIAL	ALCANCE ACTUAL
RIOSUCIO		LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
	3595 DE 2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y <u>EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA</u> DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	SECTOR: ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ- CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) LONG. CORR.: 1,193 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 185 ML OBRAS DE ARTE: 0	SECTOR: ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO-EL OLVIDO-SAN JOSÉ- CANCHA DE FUTBOL EL CARMELO (VÍA COMUNIDAD SAN ANTONIO – SAN JOSÉ) LONG. CORR.: 1,193 KM TIPO PAV.: PLACA HUELLA LONG. PLACA HUELLA.: 185 ML OBRAS DE ARTE: 0

Tabla 1 Convenios Solidarios a Intervenir

TABLA DE CONTENIDO

1 Contenido

1.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	46
1.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	46
1.2	INFORME DE LOS ESPECIALISTAS	47
1.3	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	47
1.4	INFORME MATRIZ DE RIESGOS	47
1.5	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS	47
2	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	47
2.1	EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA.....	47
2.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	47
2.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	49

2.4	SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	49
2.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	49
2.6	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	49
2.6.1	Seguimiento a la inversión del anticipo.	49
2.6.2	Seguimiento al plan de carga	49
3	INTRODUCCIÓN.....	52
4	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	54
4.1	LOCALIZACIÓN	54
4.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	55
4.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	55
4.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	55
5	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	55
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	55
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	57
5.2.1	Actividades Administrativas	57
5.2.2	Actividades Técnicas	57
5.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	58
5.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..	58
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	59
6.1	INFORME SEMANAL.....	59
6.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	59
6.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	59
6.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	60
6.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	60
6.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	60
6.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	60
6.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	60
6.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	60
6.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	60
6.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	60
6.9.3	Actas de Comités.....	61
6.9.4	Actas de Reunión	61
7	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	61
7.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	61
7.1.1	Actividades Administrativas	61
7.1.2	Actividades Técnicas	62
7.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	63
8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	63
9	ANEXO	63

9.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	63
9.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	64
9.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	64
9.4	BITÁCORA	64
10	INTRODUCCIÓN.....	67
11	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	69
11.1	LOCALIZACIÓN	69
11.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	70
11.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	70
11.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	71
12	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	71
12.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	71
12.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	72
12.2.1	Actividades Administrativas	72
12.2.2	Actividades Técnicas	73
12.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	73
12.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..	73
13	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	74
13.1	INFORME SEMANAL.....	74
13.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	74
13.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	74
13.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	75
13.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	75
13.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	75
13.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	75
13.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	76
13.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	76
13.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	76
13.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	76
13.9.3	Actas de Comités.....	76
13.9.4	Actas de Reunión	76
14	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	76
14.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	76
14.1.1	Actividades Administrativas	77
14.1.2	Actividades Técnicas	77
14.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	77
15	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	78
16	ANEXO	78
16.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	78

16.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	78
16.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	78
16.4	BITÁCORA.....	78
17	INTRODUCCIÓN.....	81
18	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	83
18.1	LOCALIZACIÓN	83
18.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	84
18.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	84
18.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	84
19	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	85
19.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	85
19.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	86
19.2.1	Actividades Administrativas	86
19.2.2	Actividades Técnicas	87
19.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	87
19.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..	87
20	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	89
20.1	INFORME SEMANAL.....	89
20.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	89
20.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	89
20.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	89
20.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	90
20.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	90
20.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	90
20.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	90
20.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	90
20.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	90
20.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	90
20.9.3	Actas de Comités.....	91
20.9.4	Actas de Reunión	91
21	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	91
21.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	91
21.1.1	Actividades Administrativas	91
21.1.2	Actividades Técnicas	91
21.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	92
22	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	92
23	ANEXO	93
23.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	93
23.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	93

23.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	93
23.4	BITÁCORA	93
24	INTRODUCCIÓN	96
25	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	98
25.1	LOCALIZACIÓN	98
25.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	99
25.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	99
25.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	99
26	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	99
26.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	99
26.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	101
26.2.1	Actividades Administrativas	101
26.2.2	Actividades Técnicas	101
26.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	101
26.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	101
27	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	103
27.1	INFORME SEMANAL	103
27.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	103
27.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	103
27.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	103
27.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	103
27.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	103
27.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	103
27.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	103
27.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	104
27.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo	104
27.9.2	Seguimiento al Programa de Obra	104
27.9.3	Seguimiento al Programa de Inversiones	104
27.9.4	Actas de Comités	104
27.9.5	Actas de Reunión	104
28	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	104
28.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	104
28.1.1	Actividades Administrativas	104
28.1.2	Actividades Técnicas	104
28.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ	105
29	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	105
30	ANEXO	105
30.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	105
30.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	105

30.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	105
30.4	BITÁCORA	105
31	INTRODUCCIÓN	108
32	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	110
32.1	LOCALIZACIÓN	110
32.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	111
32.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	111
32.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	111
33	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	112
33.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	112
33.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	113
33.2.1	Actividades Administrativas	113
33.2.2	Actividades Técnicas	114
33.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	114
33.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	114
34	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	115
34.1	INFORME SEMANAL	115
34.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	115
34.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	115
34.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	116
34.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	116
34.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	116
34.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	116
34.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	117
34.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	117
34.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo	117
34.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	117
34.9.3	Actas de Comités	117
34.9.4	Actas de Reunión	117
35	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	118
35.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	118
35.1.1	Actividades Administrativas	118
35.1.2	Actividades Técnicas	118
35.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ	119
36	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	119
37	ANEXO	120
37.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	120
37.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	120
37.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	120

37.4	BITÁCORA	120
38	INTRODUCCIÓN.....	123
39	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	125
39.1	LOCALIZACIÓN	125
39.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	126
39.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	126
39.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	126
40	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	126
40.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	126
40.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	128
40.2.1	Actividades Administrativas	128
40.2.2	Actividades Técnicas	128
40.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	129
40.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	129
41	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	130
41.1	INFORME SEMANAL	130
41.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	130
41.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	130
41.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	131
41.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	131
41.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	131
41.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	131
41.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	131
41.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	131
41.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	131
41.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	132
41.9.3	Actas de Comités.....	132
41.9.4	Actas de Reunión	132
42	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	132
42.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	132
42.1.1	Actividades Administrativas	132
42.1.2	Actividades Técnicas	133
42.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	134
43	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	134
44	ANEXO	135
44.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	135
44.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	135
44.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	135
44.4	BITÁCORA	135

45	INTRODUCCIÓN.....	138
46	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	140
46.1	LOCALIZACIÓN	140
46.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	141
46.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	141
46.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	142
47	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	142
47.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	142
47.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	144
47.2.1	Actividades Administrativas	144
47.2.2	Actividades Técnicas	144
47.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	145
47.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	145
48	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	145
48.1	INFORME SEMANAL	145
48.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	146
48.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	146
48.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	146
48.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	146
48.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	146
48.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	147
48.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	147
48.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	147
48.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	147
48.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	147
48.9.3	Actas de Comités.....	147
48.9.4	Actas de Reunión	148
49	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	148
49.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	148
49.1.1	Actividades Administrativas	148
49.1.2	Actividades Técnicas	148
49.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	148
50	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	149
51	ANEXO	149
51.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	149
51.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	149
51.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	149
51.4	BITÁCORA	149
52	INTRODUCCIÓN.....	152

53	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	154
53.1	LOCALIZACIÓN	154
53.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	155
53.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	155
53.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	155
54	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	155
54.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	155
54.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	157
54.2.1	Actividades Administrativas	157
54.2.2	Actividades Técnicas	157
54.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	158
54.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	158
55	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	159
55.1	INFORME SEMANAL.....	159
55.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	159
55.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	159
55.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	159
55.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	159
55.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	160
55.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	160
55.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	160
55.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	160
55.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	160
55.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	160
55.9.3	Actas de Comités.....	161
55.9.4	Actas de Reunión	161
56	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	161
56.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	161
56.1.1	Actividades Administrativas	161
56.1.2	Actividades Técnicas	161
56.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	162
57	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	163
58	ANEXO	163
58.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	163
58.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	163
58.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	163
58.4	BITÁCORA	163
59	INTRODUCCIÓN.....	166
60	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	168

60.1	LOCALIZACIÓN	168
60.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	169
60.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	169
60.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	169
61	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	169
61.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	169
61.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	171
61.2.1	Actividades Administrativas	171
61.2.2	Actividades Técnicas	172
61.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	172
61.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	172
62	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	174
62.1	INFORME SEMANAL	174
62.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	174
62.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	174
62.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	174
62.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	175
62.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	175
62.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	175
62.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	175
62.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	175
62.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	175
62.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	175
62.9.3	Actas de Comités.....	176
62.9.4	Actas de Reunión	176
63	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	176
63.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	176
63.1.1	Actividades Administrativas	176
63.1.2	Actividades Técnicas	176
63.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	177
64	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	178
65	ANEXO	178
65.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	178
65.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	178
65.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	178
65.4	BITÁCORA	178
66	INTRODUCCIÓN.....	181
67	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	182
67.1	LOCALIZACIÓN	182

67.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	183
67.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	184
67.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	184
68	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	184
68.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	184
68.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	186
68.2.1	Actividades Administrativas	186
68.2.2	Actividades Técnicas	186
68.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	187
68.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	187
69	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	188
69.1	INFORME SEMANAL	188
69.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	188
69.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	188
69.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	188
69.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	189
69.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	189
69.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	189
69.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	189
69.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	189
69.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	189
69.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	189
69.9.3	Actas de Comités.....	190
69.9.4	Actas de Reunión	190
70	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	190
70.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	190
70.1.1	Actividades Administrativas	190
70.1.2	Actividades Técnicas	190
70.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ.....	192
71	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	192
72	ANEXO	193
72.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	193
72.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	193
72.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	193
72.4	BITÁCORA	193
73	INTRODUCCIÓN.....	196
74	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	198
74.1	LOCALIZACIÓN	198

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	199
74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	199
74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	200
75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	200
75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	200
75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	202
75.2.1 Actividades Administrativas	202
75.2.2 Actividades Técnicas	202
75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	202
75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	202
76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	203
76.1 INFORME SEMANAL	203
76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	203
76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	203
76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	203
76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	204
76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	204
76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	204
76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	204
76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	204
76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	204
76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	204
76.9.3 Actas de Comités.....	205
76.9.4 Actas de Reunión	205
77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	205
77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	205
77.1.1 Actividades Administrativas	205
77.1.2 Actividades Técnicas	205
77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	206
78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	206
79 ANEXO	207
79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	207
79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	207
79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	207
79.4 BITÁCORA	207
80 INTRODUCCIÓN.....	210
81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	212
81.1 LOCALIZACIÓN	212

81.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	213
81.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	213
81.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	214
82	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	214
82.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	214
82.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	216
82.2.1	Actividades Administrativas	216
82.2.2	Actividades Técnicas	216
82.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	216
82.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	216
83	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	217
83.1	INFORME SEMANAL	217
83.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	217
83.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	217
83.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	218
83.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	218
83.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	218
83.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	218
83.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	218
83.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	218
83.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo	218
83.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	219
83.9.3	Actas de Comités	219
83.9.4	Actas de Reunión	219
84	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	219
84.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	219
84.1.1	Actividades Administrativas	219
84.1.2	Actividades Técnicas	220
84.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	220
85	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	220
85.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	221
85.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	221
85.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	221
85.4	BITÁCORA	221
86	INTRODUCCIÓN.....	224
87	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	226
87.1	LOCALIZACIÓN	226
87.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	227
87.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	227

87.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	228
88	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	228
88.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	228
88.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	229
88.2.1	Actividades Administrativas	229
88.2.2	Actividades Técnicas	230
88.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	230
88.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	230
89	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	231
89.1	INFORME SEMANAL	231
89.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	231
89.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	231
89.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	231
89.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	232
89.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	232
89.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	232
89.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	232
89.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	232
89.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo	232
89.9.2	Seguimiento al Programa de Obra	232
89.9.3	Actas de Comités	233
89.9.4	Actas de Reunión	233
90	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	233
90.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	233
90.1.1	Actividades Administrativas	233
90.1.2	Actividades Técnicas	234
90.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	234
91	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	235
92	ANEXO	235
92.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	235
92.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	235
92.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	235
92.4	BITÁCORA	235
93	INTRODUCCIÓN	238
94	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	240
94.1	LOCALIZACIÓN	240
94.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	241
94.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	241
94.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	242

95	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	242
95.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	242
95.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	244
95.2.1	Actividades Administrativas	244
95.2.2	Actividades Técnicas	244
95.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	245
95.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	245
96	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	246
96.1	INFORME SEMANAL	246
96.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	246
96.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	246
96.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	246
96.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	247
96.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	247
96.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	247
96.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	247
96.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	247
96.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo	247
96.9.2	Seguimiento al Programa de Obra	247
96.9.3	Actas de Comités	248
96.9.4	Actas de Reunión	248
97	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	248
97.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	248
97.1.1	Actividades Administrativas	248
97.1.2	Actividades Técnicas	249
97.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA	250
98	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	250
99	ANEXO	251
99.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	251
99.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	251
99.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	251
99.4	BITÁCORA	251

100 INTRODUCCIÓN.....	254
101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	256
101.1 LOCALIZACIÓN	256
101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	257
101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	257
101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	258
102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	258
102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	258
102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	260
102.2.1 Actividades Administrativas	260
102.2.2 Actividades Técnicas	260
102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	261
102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	261
103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	262
103.1 INFORME SEMANAL	262
103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	262
103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	262
103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	262
103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	263
103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	263
103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	263
103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	263
103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	263
103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	263
103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	263
103.9.3 Actas de Comités.....	265
103.9.4 Actas de Reunión	265
104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	265
104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	265
104.1.1 Actividades Administrativas	265
104.1.2 Actividades Técnicas	265
104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR	266
105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	267
106 ANEXO	267
106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	267
106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	267
106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	267
106.4 BITÁCORA	267
107 INTRODUCCIÓN.....	270

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	272
108.1 LOCALIZACIÓN	272
108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	273
108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	273
108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	274
109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	274
109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	274
109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	276
109.2.1 Actividades Administrativas	276
109.2.2 Actividades Técnicas	276
109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	277
109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	277
110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	278
110.1 INFORME SEMANAL.....	278
110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	278
110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	278
110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	278
110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	279
110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	279
110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	279
110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	279
110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	279
110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	279
110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	279
110.9.3 Actas de Comités.....	280
110.9.4 Actas de Reunión	280
111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	280
111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	280
111.1.1 Actividades Administrativas	280
111.1.2 Actividades Técnicas	280
111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA	282
112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	282
113 ANEXO	283
113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	283
113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	283
113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	283
113.4 BITÁCORA	283
114 INTRODUCCIÓN.....	286
115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	288

115.1 LOCALIZACIÓN	288
115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	289
115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	289
115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	289
116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	289
116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	289
116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	291
116.2.1 Actividades Administrativas	291
116.2.2 Actividades Técnicas	291
116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	291
116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	292
117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	292
117.1 INFORME SEMANAL	292
117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	292
117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	293
117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	293
117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	293
117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	293
117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	293
117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	293
117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	293
117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	293
117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	293
117.9.3 Actas de Comités.....	294
117.9.4 Actas de Reunión	294
118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	294
118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	294
118.1.1 Actividades Administrativas	294
118.1.2 Actividades Técnicas	295
118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA	295
119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	295
120 ANEXO	295
120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	295
120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	295
120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	295
120.4 BITÁCORA	295
121 INTRODUCCIÓN.....	298
122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	300
122.1 LOCALIZACIÓN	300

122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	301
122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	301
122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	301
123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	301
123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	301
123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	303
123.2.1 Actividades Administrativas	303
123.2.2 Actividades Técnicas	304
123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	304
123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	304
124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	306
124.1 INFORME SEMANAL	306
124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	306
124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	306
124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	306
124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	307
124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	307
124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	307
124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	307
124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	307
124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	307
124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra	307
124.9.3 Actas de Comités	308
124.9.4 Actas de Reunión	308
125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	308
125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	308
125.1.1 Actividades Administrativas	308
125.1.2 Actividades Técnicas	308
125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA	309
126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	309
127 ANEXO	310
127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	310
127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	310
127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	310
127.4 BITÁCORA	310
128 INTRODUCCIÓN.....	313
129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	315
129.1 LOCALIZACIÓN	315

129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	316
129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	316
129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	317
130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	317
130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	317
130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	319
130.2.1 Actividades Administrativas	319
130.2.2 Actividades Técnicas	319
130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	320
130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	320
131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	321
131.1 INFORME SEMANAL	321
131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	321
131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	321
131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	321
131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	322
131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	322
131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	322
131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	322
131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	322
131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	322
131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra	323
131.9.3 Actas de Comités	323
131.9.4 Actas de Reunión	323
132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	323
132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	323
132.1.1 Actividades Administrativas	323
132.1.2 Actividades Técnicas	324
132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA	326
133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	326
134 ANEXO	327
134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	327
134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	327
134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	327
134.4 BITÁCORA	327
135 INTRODUCCIÓN	330
136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	332
136.1 LOCALIZACIÓN	332

136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	333
136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	333
136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	333
137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	333
137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	333
137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	335
137.2.1 Actividades Administrativas	335
137.2.2 Actividades Técnicas	335
137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	336
137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	336
138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	336
138.1 INFORME SEMANAL	336
138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	337
138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	337
138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	337
138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	337
138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	337
138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	337
138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	337
138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	337
138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	337
138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	338
138.9.3 Actas de Reunión	338
139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	338
139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	338
139.1.1 Actividades Administrativas	338
139.1.2 Actividades Técnicas	339
139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA	339
140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	339
141 ANEXO	339
141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	339
141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	339
141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	339
141.4 BITÁCORA	340
142 INTRODUCCIÓN.....	343
143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	345
143.1 LOCALIZACIÓN	345
143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	346

143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	346
143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	346
144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	346
144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	346
144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	348
144.2.1 Actividades Administrativas	348
144.2.2 Actividades Técnicas	348
144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	348
144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	348
145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	349
145.1 INFORME SEMANAL	349
145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	349
145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	349
145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	349
145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	350
145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	350
145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	350
145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	350
145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	350
145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	350
145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	350
145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones	350
145.9.4 Actas de Reunión	351
146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	351
146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	351
146.1.1 Actividades Administrativas	351
146.1.2 Actividades Técnicas	351
146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA	351
147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	351
148 ANEXO	352
148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	352
148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	352
148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	352
148.4 BITÁCORA	352
149 INTRODUCCIÓN	355
150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	357
150.1 LOCALIZACIÓN	357
150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	358
150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	358

150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	358
151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	358
151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	358
151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	360
151.2.1 Actividades Administrativas	360
151.2.2 Actividades Técnicas	360
151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	360
151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	360
152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	362
152.1 INFORME SEMANAL	362
152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	362
152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	362
152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	362
152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	362
152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	362
152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	363
152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	363
152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	363
152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	363
152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra	363
152.9.3 Actas de Reunión	363
153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	363
153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	363
153.1.1 Actividades Administrativas	363
153.1.2 Actividades Técnicas	364
153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA	364
154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	364
155 ANEXO	364
155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	364
155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	364
155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	364
155.4 BITÁCORA	365
156 INTRODUCCIÓN	368
157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	369
157.1 LOCALIZACIÓN	369
157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	370
157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	370
157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	371
158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	371

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	371
158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	372
158.2.1 Actividades Administrativas	372
158.2.2 Actividades Técnicas	372
158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	372
158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	372
159 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	373
159.1 INFORME SEMANAL	373
159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	373
159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	373
159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	374
159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	374
159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	374
159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	374
159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	374
159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	374
159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	374
159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra	374
159.9.3 Actas de Reunión	374
160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	375
160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	375
160.1.1 Actividades Administrativas	375
160.1.2 Actividades Técnicas	375
160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA	375
161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	375
162 ANEXO	376
162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	376
162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	376
162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	376
162.4 BITÁCORA	376
163 INTRODUCCIÓN	379
164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	381
164.1 LOCALIZACIÓN	381
164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	382
164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	382
164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	382
165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	382
165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	382
165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	384

165.2.1 Actividades Administrativas	384
165.2.2 Actividades Técnicas	384
165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	384
165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	384
166 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	385
166.1 INFORME SEMANAL	385
166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	385
166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	385
166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	385
166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	386
166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	386
166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	386
166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	386
166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	386
166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	386
166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	386
166.9.3 Actas de Reunión	386
167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	387
167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	387
167.1.1 Actividades Administrativas	387
167.1.2 Actividades Técnicas	387
167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA	387
168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	387
169 ANEXO	388
169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	388
169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	388
169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	388
169.4 BITÁCORA	388
170 INTRODUCCIÓN	391
171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	393
171.1 LOCALIZACIÓN	393
171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	394
171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	394
171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	395
172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	395
172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	395
172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	396
172.2.1 Actividades Administrativas	396
172.2.2 Actividades Técnicas	397

172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	397
172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	397
173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	398
173.1 INFORME SEMANAL	398
173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO	398
173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	398
173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	398
173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	398
173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	398
173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	398
173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	398
173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	399
173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	399
173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra	399
173.9.3 Actas de Reunión	399
174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	399
174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	399
174.1.1 Actividades Administrativas	399
174.1.2 Actividades Técnicas	400
174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	400
175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	400
176 ANEXO	400
176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	400
176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	400
176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	400
176.4 BITÁCORA	400
177 INTRODUCCIÓN	403
178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	405
178.1 LOCALIZACIÓN	405
178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	406
178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	406
178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	406
179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	407
179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	407
179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	408
179.2.1 Actividades Administrativas	408
179.2.2 Actividades Técnicas	408
179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	408
179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	409

180	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	410
180.1	INFORME SEMANAL	410
180.2	MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	410
180.3	PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	410
180.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	410
180.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	410
180.6	ENSAYOS DE LABORATORIO	411
180.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	411
180.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	411
180.9	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	411
180.9.1	Seguimiento a la Inversión del Anticipo.....	411
180.9.2	Seguimiento al Programa de Obra.	411
180.9.3	Actas de Reunión	412
181	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	412
181.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	412
181.1.1	Actividades Administrativas	412
181.1.2	Actividades Técnicas	412
181.1.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	412
182	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	413
183	ANEXO	413
183.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	413
183.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA.....	413
183.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES.....	413
183.4	BITÁCORA	413
184	INTRODUCCIÓN.....	416
185	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	418
185.1	LOCALIZACIÓN	418
185.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	419
185.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	419
185.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	419
186	INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	419
186.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.....	419
186.2	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	421
186.2.1	Actividades Administrativas	421
186.2.2	Actividades Técnicas	421
186.3	SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	422
186.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	422
187	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	423
187.1	INFORME SEMANAL	423

187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	423
187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	423
187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	423
187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	424
187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	424
187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	424
187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	424
187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	424
187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	424
187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.	424
187.9.3 Actas de Reunión	424
188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	424
188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	424
188.1.1 Actividades Administrativas	425
188.1.2 Actividades Técnicas	425
188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	425
189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	425
190 ANEXO	425
190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	425
190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	425
190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	426
190.4 BITÁCORA	426
191 INTRODUCCIÓN.....	428
192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	430
192.1 LOCALIZACIÓN	430
192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	431
192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR	431
192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	431
193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO	431
193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	431
193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	433
193.2.1 Actividades Administrativas	433
193.2.2 Actividades Técnicas	433
193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS	434
193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	434
194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO	434
194.1 INFORME SEMANAL	434
194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO.....	435

194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO	435
194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	435
194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	435
194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO	435
194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO	435
194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO	435
194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	436
194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo	436
194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra	436
194.9.3 Actas de Reunión	436
195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	437
195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	437
195.1.1 Actividades Administrativas	437
195.1.2 Actividades Técnicas	437
195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO	437
196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE	437
197 ANEXO	437
197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	437
197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA	437
197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES	438
197.4 BITÁCORA	438

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	54
ILUSTRACIÓN 2 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS	54
ILUSTRACIÓN 3 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	69
ILUSTRACIÓN 4 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS	69
ILUSTRACIÓN 5 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL	70
ILUSTRACIÓN 6 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	83
ILUSTRACIÓN 7 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS	83
ILUSTRACIÓN 8 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL JAC PATIO BONITO	84
ILUSTRACIÓN 9 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	98
ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS	99
ILUSTRACIÓN 11 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	110
ILUSTRACIÓN 12 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS	110
ILUSTRACIÓN 13 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL	111
ILUSTRACIÓN 14 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	125
ILUSTRACIÓN 15 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS	125
ILUSTRACIÓN 16 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	140
ILUSTRACIÓN 17 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS	141
ILUSTRACIÓN 18 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL	142
ILUSTRACIÓN 19 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS)	154

ILUSTRACIÓN 20 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	154
ILUSTRACIÓN 21 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS).....	168
ILUSTRACIÓN 22 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	169
ILUSTRACIÓN 23 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ (CALDAS).....	183
ILUSTRACIÓN 24 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	183
ILUSTRACIÓN 25. ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	184
ILUSTRACIÓN 26 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	198
ILUSTRACIÓN 27 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	199
ILUSTRACIÓN 28. ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	200
ILUSTRACIÓN 29 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	212
ILUSTRACIÓN 30 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	213
ILUSTRACIÓN 31. ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	214
ILUSTRACIÓN 32 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	226
ILUSTRACIÓN 33 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	227
ILUSTRACIÓN 34. ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	227
ILUSTRACIÓN 35 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA (CALDAS).	240
ILUSTRACIÓN 36 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	241
ILUSTRACIÓN 37. ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	242
ILUSTRACIÓN 38 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR (CALDAS).	256
ILUSTRACIÓN 39 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	257
ILUSTRACIÓN 40. ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	258
ILUSTRACIÓN 41 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS).	272
ILUSTRACIÓN 42 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	273
ILUSTRACIÓN 43. ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	274
ILUSTRACIÓN 44 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARULANDA (CALDAS).	288
ILUSTRACIÓN 45 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	289
ILUSTRACIÓN 46 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS).	300
ILUSTRACIÓN 47 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	301
ILUSTRACIÓN 48 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS).	315
ILUSTRACIÓN 49 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	316
ILUSTRACIÓN 50 ESTADO INICIAL DEL SECTOR.....	317
ILUSTRACIÓN 51 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA (CALDAS).....	332
ILUSTRACIÓN 52 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	333
ILUSTRACIÓN 53 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS).	345
ILUSTRACIÓN 54 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	346
ILUSTRACIÓN 55 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA (CALDAS).	357
ILUSTRACIÓN 56 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	358
ILUSTRACIÓN 57 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA (CALDAS).....	370
ILUSTRACIÓN 58 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	370
ILUSTRACIÓN 59 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA(CALDAS).....	381
ILUSTRACIÓN 60 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	382
ILUSTRACIÓN 61 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).	393
ILUSTRACIÓN 62 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	394
ILUSTRACIÓN 63 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).	405
ILUSTRACIÓN 64 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).	418
ILUSTRACIÓN 65 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	419

ILUSTRACIÓN 66 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CALDAS).....	430
ILUSTRACIÓN 67 LOCALIZACIÓN VÍA A INTERVENIR – ARCGIS – FILEDMAPS.....	431

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 CONVENIOS SOLIDARIOS A INTERVENIR	9
TABLA 2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	47
TABLA 3 PERSONAL ASIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	48
TABLA 4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2073-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	57
TABLA 5 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	59
TABLA 6 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	75
TABLA 7 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2435-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	86
TABLA 8 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	89
TABLA 9 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2159-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	101
TABLA 10 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2124-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	113
TABLA 11 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	116
TABLA 12 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2058-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	127
TABLA 13 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	130
TABLA 14 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2119-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	143
TABLA 15 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	146
TABLA 16 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2173-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	156
TABLA 17 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	159
TABLA 18 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2524-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	171
TABLA 19 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2175-2024 MUNICIPIO SAMANÁ.	186
TABLA 20 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	188
TABLA 21 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2227-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.	202
TABLA 22 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	203
TABLA 23 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2140-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.	215
TABLA 24 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	218
TABLA 25 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2077-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.	229
TABLA 26 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	231
TABLA 27 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2169-2024 MUNICIPIO PENSILVANIA.	244
TABLA 28 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	246
TABLA 29 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2200-2024 MUNICIPIO BELALCÁZAR.	260
TABLA 30 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	262
TABLA 31 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2094-2024 MUNICIPIO MARULANDA.	276
TABLA 32 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	278
TABLA 33 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3551-2024 MUNICIPIO MARULANDA.	291
TABLA 34 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2176-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA.	303
TABLA 35 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2187-2024 MUNICIPIO DE RISARALDA.	319
TABLA 36 PERSONAL CONVENIO SOLIDARIO	321
TABLA 37 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3169-2024 MUNICIPIO PALESTINA.	335
TABLA 38 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3530-2024 MUNICIPIO FILADELFIA.	348
TABLA 39 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3652-2024 MUNICIPIO FILADELFIA.	360
TABLA 40 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3622-2024 MUNICIPIO SUPÍA.....	372

TABLA 41 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3983-2024 MUNICIPIO SUPÍA.....	384
TABLA 42 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3646-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.	396
TABLA 43 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2569-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.....	408
TABLA 44 . INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3286-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.	421
TABLA 45 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3595-2024 MUNICIPIO RIOSUCIO.....	433

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL SILENCIO
ANEXO 1.1	Informe Semanal
ANEXO 1.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 1.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 1.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 1.5	Informe financiero
ANEXO 1.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 1.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 1.8	Registro Fotográfico
ANEXO 1.9	Bitácora de obra
ANEXO 2	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
ANEXO 2.1	Informe Semanal
ANEXO 2.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 2.3	Informe financiero
ANEXO 3	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA PATIO BONITO
ANEXO 3.1	Informe Semanal
ANEXO 3.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 3.3	Informe financiero
ANEXO 4	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL CIRPIAL

ANEXO 4.1	Informe Semanal
ANEXO 4.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL DORADO
ANEXO 5.1	Informe Semanal
ANEXO 5.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 5.3	Informe financiero
ANEXO 6	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CALIFORNIA ALTA
ANEXO 6.1	Informe Semanal
ANEXO 6.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 6.3	Informe financiero
ANEXO 7	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA CARACOLÍ
ANEXO 7.1	Informe Semanal
ANEXO 7.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 7.3	Informe financiero
ANEXO 8	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA MONTEBELLO
ANEXO 8.1	Informe Semanal
ANEXO 8.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 8.3	Informe financiero
ANEXO 9	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA TARROPINTADO
ANEXO 9.1	Informe Semanal
ANEXO 9.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 9.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 9.4	Personal control Aportes y Seguridad Social

ANEXO 9.5	Informe financiero
ANEXO 9.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 9.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 9.8	Registro Fotográfico
ANEXO 9.9	Bitácora de obra
ANEXO 10	FORMATOS MUNICIPIO SAMANÁ, VEREDA EL NARANJAL
ANEXO 10.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 10.2	Informe financiero
ANEXO 11	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA LA LINDA
ANEXO 11.1	Informe Semanal
ANEXO 11.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 11.3	Informe financiero
ANEXO 12	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA SANTA RITA
ANEXO 12.1	Informe Semanal
ANEXO 12.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 12.3	Informe financiero
ANEXO 13	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA EL VERDAL
ANEXO 13.1	Informe Semanal
ANEXO 13.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 13.3	Informe financiero
ANEXO 14	FORMATOS MUNICIPIO PENSILVANIA, VEREDA MIRAFLORES
ANEXO 14.1	Informe Semanal

ANEXO 14.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 14.3	Informe financiero
ANEXO 15	FORMATOS MUNICIPIO BELALCÁZAR, VEREDA LA HABANA
ANEXO 15.1	Informe Semanal
ANEXO 15.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 15.3	Informe financiero
ANEXO 16	FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL NARANJAL
ANEXO 16.1	Informe Semanal
ANEXO 16.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 16.3	Informe financiero
ANEXO 17	FORMATOS MUNICIPIO MARULANDA, EL PÁRAMO
ANEXO 17.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 18	FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, SARCIRI
ANEXO 18.1	Informe Semanal
ANEXO 18.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 18.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 18.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 18.5	Informe financiero
ANEXO 18.6	Estado General del Tiempo
ANEXO 18.7	Ensayos de laboratorio
ANEXO 18.8	Registro Fotográfico
ANEXO 18.9	Bitácora de obra
ANEXO 19	FORMATOS MUNICIPIO RISARALDA, MEDIA CUESTA

ANEXO 19.1	Informe Semanal
ANEXO 19.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 19.3	Informe financiero
ANEXO 20	FORMATOS MUNICIPIO PALESTINA, LOS LOBOS
ANEXO 20.1	Informe Semanal
ANEXO 20.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 20.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 20.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 20.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 20.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 20.7	Registro Fotográfico
ANEXO 20.8	Bitácora de obra
ANEXO 21	FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, SAN LUIS
ANEXO 21.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 22	FORMATOS MUNICIPIO FILADELFIA, EL VERSO
ANEXO 22.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 23	FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, ALTO CABUYAL
ANEXO 23.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 24	FORMATOS MUNICIPIO SUPÍA, BAJO CABUYAL
ANEXO 24.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 25	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA
ANEXO 25.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario

ANEXO 26	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, PRIMERO DE MAYO Y ROTATORIO II
ANEXO 26.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 27	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
ANEXO 27.1	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 28	FORMATOS MUNICIPIO RIOSUCIO, RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
ANEXO 28.1	Informe Semanal
ANEXO 28.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 28.3	Maquinaria y equipos
ANEXO 28.4	Personal control Aportes y Seguridad Social
ANEXO 28.5	Estado General del Tiempo
ANEXO 28.6	Ensayos de laboratorio
ANEXO 28.7	Registro Fotográfico
ANEXO 28.8	Bitácora de obra
ANEXO 29	FORMATOS INTERVENTORÍA
ANEXO 29.1	Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría
ANEXO 29.2	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario
ANEXO 29.3	Relación de correspondencia
ANEXO 29.4	Actas de comité
ANEXO 29.5	Informe de los especialistas
ANEXO 29.6	Actas de reunión
ANEXO 29.7	Informe financiero y presupuestal
ANEXO 29.8	Equipos de la Interventoría

ANEXO 29.9 Plan de Cargas

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CCSO
NIT.	901.866.328-5
DIRECCIÓN:	CALLE 77B # 57 – 103 GREEN TOWERS OF 907
TELÉFONO:	3686111
No PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024
ID SECOP:	CO1.SLCNTR.13465764
CONTRATO No.:	3601 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/09/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.167.015.102 M/CTE INCLUIDO IVA
ADICIÓN No. 1	\$532.999.145 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.700.014.247 M/CTE INCLUIDO IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR TRAMITADO ANTICIPO:	\$ 0,00 M/CTE
DURACIÓN O PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO:	30/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/04/25
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30/05/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/05/25 HASTA EL 18/06/25
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 3/10/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3 DE OCTUBRE DE 2025		
SUPERVISOR:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
G A R A N T I A S			
Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL ANEXO 9 - Póliza de Cumplimiento No. BQ-100091021			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$170.001.424,70	11/09/2024	3/04/2026
Buen manejo del anticipo	\$196.136.992,00	11/09/2024	3/04/2026
Prestaciones sociales	\$340.002.849,40	11/09/2024	3/10/2028
Calidad del servicio	\$510.004.274,10	3/10/2025	3/10/2030

1.2 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

Se adjunta Informes de los especialistas. Ver Anexo 29.5.

1.3 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para este periodo.

1.4 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para este periodo.

1.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

No aplica para el periodo.

2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Ver Anexo 29.8.

Tabla 2 Información general del Contrato de Interventoría

2.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El día 17 de septiembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CIMP-555-003-4134 con la solicitud de revisión y aprobación del personal evaluable. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el Subdirector de vías regionales remitió el comunicado 2024S-

VBOG-076249 con la aprobación del personal. El día 27 de diciembre de 2024, la Interventoría remitió el oficio CIMP-555-116-5318 solicitando el cambio de algunos profesionales ya aprobados, solicitud que fue respondida por la Entidad a través del comunicado No. 2024S-VCAL-100329 de fecha 31 de diciembre de 2024. Los días 19 de marzo de 2025, la Interventoría remitió el oficio CIMP-555-533-1197 con la hoja de vida del Residente, aprobada mediante comunicado 2025S-VCAL-017188 de fecha 21 de marzo de 2025. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficio CIMP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, para revisión y aprobación. El 27 de marzo de 2025, la Interventoría remitió oficio CIMP-555-574-1298, con la hoja de vida del Director de Interventoría, para revisión y aprobación. El 13 de julio de 2025, la Interventoría remitió oficio CIMP-555-978-2752, con la hoja de vida del Ingeniero Residente, para revisión y aprobación.

Para este corte de periodo, la Interventoría realizó el control técnico, administrativo, financiero y ambiental a los Contratos de Obra con el personal relacionado:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BIBIANA PATERNINA ESPITIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARLOS MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN VÍAS Y/O PAVIMENTOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA Y ALISTAMIENTO	JUAN SEBASTIAN ROMERO
PROFESIONAL FINANCIERO	DELCY BARCASNEGRA
PROFESIONAL SOCIAL	MARIELA VILORIA MARTÍNEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	ARMANDO OTERO DIAZ
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ESPECIALISTA AMBIENTAL	LILIANA GALLARDO PEREZ
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAIME CURVELO GARCIA-MAYORCA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	JOSÉ EUSEBIO DE LA HOZ
INSPECTOR SST	STEFANNY REY RUEDA
APOYO SOCIAL	VALENTINA PÉREZ ISAZA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DAYANA TORRES JIMÉNEZ

Tabla 3 Personal asignado del Contrato de Interventoría.

Mediante el formato MEPI- MN1-IN-15-FR-7 se reporta la información mencionada. Ver anexo 29.1.

2.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Acta Parcial de Costos No. 9 correspondiente al periodo del informe se remite a la Supervisión de forma paralela con dicho informe y en este informe se anexa el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Ver anexo 29.7.

Hasta la fecha de corte de este informe después de haber transcurrido ocho (8) meses del plazo contractual, EL INSTITUTO ha cancelado al Consorcio CCSO el valor correspondiente a las Actas de Costos No. 2, 3, 4 y 6 de los periodos noviembre y diciembre de 2024 y enero y marzo de 2025, haciendo que la Interventoría termine financiando la ejecución del Contrato No. 3601 de 2024.

Al finalizar el mes de julio de 2025, EL INSTITUTO solo ha cancelado \$49 millones de los \$946 millones que se llevan ejecutado, donde se puede ver claramente que el Consorcio se ha visto afectado en el flujo de caja y teniendo que pagar el impuesto IVA de cada factura presentada sin recibir el valor de dichas facturas.

2.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjuntan las pólizas del Contrato de Interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS. Ver anexo 29.2

2.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El CONSORCIO CCSO, consciente de la importancia de asegurar la calidad del servicio de Interventoría con INVIAS se encuentra ajustando el Sistema de Gestión de Calidad acorde con la Norma Técnica Colombiana ISO 9001. Por lo anterior, en cada informe mensual se registrarán los aspectos más significativos de la Gestión de Calidad ocurridos en el desarrollo de las obras.

2.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

2.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo.

No aplica para el Contrato No. 3601 de 2024.

2.6.2 Seguimiento al plan de carga

La Interventoría en este periodo presentó el seguimiento del Plan de Cargas (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. Ver Anexo 29.9.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2073-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	53
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	54
1	INTRODUCCIÓN		56
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		58
2.1	Localización		58
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		59
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		59
2.4	Características técnicas del proyecto		59
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		60
3.1	Información general del contrato		60
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		62
3.3	Seguimiento Items no previstos		62
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		62
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		63
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	498
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	513
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	515
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	517
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	519
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	521
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	507
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		64
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		65
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		67
7	Conclusiones y recomendaciones		67
8	Anexos		67
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		523
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		525

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<div>CÓDIGO MEP-MIN-IV-16-FR-2</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA</div>																																																																						
		<div>FECHA 30/07/2025 <small>(Día/Mes/Año)</small></div>																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	PERIODO MES: Jul-25																																																																						
<div>CONVENIO No.: 2072-2024</div> <div>OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</div> <div>OAC: JAC VEREDA EL SILENCIO</div> <div>PLAZO INICIAL: HASTA EL 30/12/25 FECHA DE INICIO: 20/02/25 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 30/12/25 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES FECHA DE TERMINACIÓN: 20/02/25 FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/02/25 FECHA DE REINICIO: 19/02/25 PLAZO DE PRÓRROGA N 01: HASTA EL 30/02/25 FECHA DE TERMINACIÓN: 20/02/25 FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 20/02/2024 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS FECHA DE REINICIO: 19/02/2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 21/02/2024 PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 107.00</div> <div>VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$. 201.837.389.00. VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): \$. VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$. 201.837.389.00. ANTICIPO CONCEDIDO: \$. ANTICIPO AMORTIZADO: \$.</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024</div> <div>INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LEIANA TIBATA</div>																																																																								
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>150.00</td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Vigiles</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Parlonos</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml		Mejoramiento	150.00		Rehabilitación		Estructuras	Vigiles			Puentes			Parlonos		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und			-	<div>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Vigiles</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Parlonos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	ml	-		Mejoramiento		-		Rehabilitación			Estructuras	Vigiles				Puentes				Parlonos			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-				-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																						
Pavimentación	Construcción	ml																																																																						
	Mejoramiento	150.00																																																																						
	Rehabilitación																																																																							
Estructuras	Vigiles																																																																							
	Puentes																																																																							
	Parlonos																																																																							
Mantenimiento																																																																								
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und																																																																						
		-																																																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																					
Pavimentación	Construcción	ml	-																																																																					
	Mejoramiento		-																																																																					
	Rehabilitación																																																																							
Estructuras	Vigiles																																																																							
	Puentes																																																																							
	Parlonos																																																																							
Mantenimiento																																																																								
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-																																																																					
			-																																																																					
<div>AVANCE FINANCIERO</div> <div>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</div> <table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>152.164.517.00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.564.935.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.607.718.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>200.337.170.00</td></tr></tbody></table> <div>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 15.604.321.00.</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 18.102.790.20.</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.000%.</div> <div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA: 0</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0</div>			VALOR	OBRAS	152.164.517.00	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.564.935.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.607.718.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.337.170.00	<div>VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>11.818.215</td><td>11.818.215.20</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>6.284.575</td><td>6.284.575.00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>18.102.790.20</td><td>18.102.790.20</td></tr></tbody></table>		VALOR	ACUMULADO	OBRAS	11.818.215	11.818.215.20	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.284.575	6.284.575.00	VALOR EJECUTADO	18.102.790.20	18.102.790.20																																													
	VALOR																																																																							
OBRAS	152.164.517.00																																																																							
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.564.935.00																																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.607.718.00																																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.337.170.00																																																																							
	VALOR	ACUMULADO																																																																						
OBRAS	11.818.215	11.818.215.20																																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.284.575	6.284.575.00																																																																						
VALOR EJECUTADO	18.102.790.20	18.102.790.20																																																																						
																																																																								
Foto 1. Armado de parilla	Foto 2. Instalación de formaleta																																																																							
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en qué se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																								
<div>Firma</div> <div>Nombre: BIBIANA PATERNINA</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del IVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																																								

CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 - 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL SILENCIO

3 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Silencio, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.837.169,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Silencio con longitud total de 1,50 km, de los cuales se intervendrán 150 ml de placa huella.

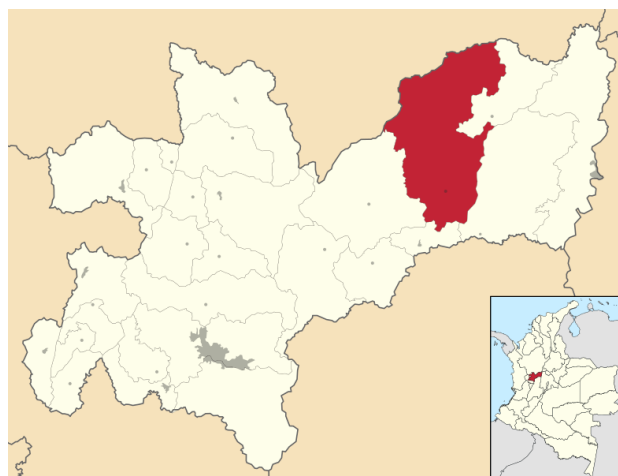


Ilustración 1 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

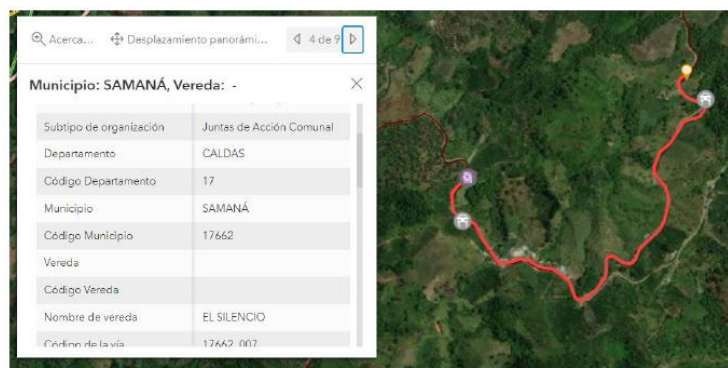


Ilustración 2 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps

Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

4.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Silencio, en el corredor vial denominado El Silencio, del Municipio de Samaná.

4.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR



Ilustración 3 Inventario y estado inicial

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 150 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473743
---------------------------	--------------------

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO
NIT.	810.003.120-8
TELÉFONO:	3107225125
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2073-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.837.169,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$201.837.169,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	DOS (2) MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/2025
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/05/25 HASTA EL 18/06/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/07/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/2025
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza	

de Cumplimiento No. NB-100329840 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083010			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento del Contrato	\$20.183.717,00	27/06/2024	31/10/2025
Pago de salarios-prestaciones sociales-indemnizaciones laborales	\$10.091.859,00	27/06/2024	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	\$40.367.343,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	27/06/2024	31/12/2024

Tabla 4 Información general del Convenio 2073-2024 Municipio Samaná.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

5.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 9/07/25, remitió el plan de compras No. 1 corregido para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/07/25, remitió la dosificación del concreto.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 23/07/25, remitió la documentación técnica y SST, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, remitió En plan de compras 2, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 28/7/25, remitió la solicitud de desembolso.
- Se realizó comité operativo No. 6 y 7, los días 21/7/25 y 24/7/25.

5.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 49,2 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 49,2 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

5.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

5.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario presenta el siguiente avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	7%	7,8%	15604321,03
Ejecutado	10%	9,05%	18102790,2
Avance / Retraso	3%	1,25%	2498469,17

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,85	3,85
2	Subbase Granular Clase C	M3	16%	25%	31,32	49,2
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

6.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 1.1

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 1.3.

6.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-683-1776 de fecha 2 de mayo de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	John Jairo González Torres

Tabla 5 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 1.4.

6.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 4.882.075 de fecha 17/07/2025
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 48.565.648 de fecha 28/07/2025
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 32.316.719,12 de fecha 1/08/2025

Desembolso total por valor de \$ 85.764.441,73 correspondiente al 42,81% del valor del convenio. Ver anexo 1.5

6.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 1.6

6.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 1.7

6.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 1.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales que se han dado del Convenio No. 2073 de 2024, esto a pesar de los requerimientos de la Interventoría.

6.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

6.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

6.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado	% completado
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	59 días	vie 25/07/25	mar 30/09/25	7%	10%
Excavaciones varias sin Clasificar	7 días	vie 25/07/25	vie 1/08/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	20 días	dom 27/07/25	mar 19/08/25	16%	32%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	44 días	lun 11/08/25	mar 30/09/25	0%	0%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	35 días	jue 31/07/25	mar 9/09/25	0%	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	35 días	mié 6/08/25	lun 15/09/25	0%	0%

6.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de julio de 2025, la Inversión Programada fue de \$15.604.321,03; la Inversión Ejecutada fue de \$18.102.790,2. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$2.498.469,17

6.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

6.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

7 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

7.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-914-2621 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-970-2743 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-983-2776 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-1002-2799 de fecha 16/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-1062-2977 de fecha 28/7/25, remitió a la JAC el acta de inicio de obra.

- La Interventoría por medio de oficio CINEP-555-1067-2991 de fecha 29/7/25, remitió al INVIAE el plan ambiental.
- Se realizó comité operativo No.6 y 7, los días 21/7/25 y 24/7/25.

7.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de julio de 2025, se realizó la reunión informativa con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, a fin de conocer el estado de disponibilidad de los profesionales aprobados (residente y Contador) y el personal de Obra (maestro y obreros). Se programó fecha de inicio de Obra para el 14 de julio de 2025, ya que el Plan de Compras No 1, había sido aprobado el 26 de mayo durante Comité Operativo No 4..

El día 22 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 5 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que el Presidente, solicitó aplazar el inicio de obra para el 21 de julio, debido a un accidente que sufrió el maestro de Obra.

El día 24 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se aprobó el Plan de Compras No 2. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo, para su envío a pago

A la fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 49,2 m³.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

7.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2073 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio a Diciembre de 2024 y enero a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 21 de julio de 2025.
- Que el Convenio Solidario No. 2073 de 2024 presenta una situación, relacionado con el C.B.R. de la subrasante por debajo del 3% requerido por el INSTITUTO . A la fecha de corte de este informe. INVIAS propuso un mejoramiento de la subrasante con una capa de afirmado de 10 cm de espesor, lo que permite cumplir con el CBR mínimo requerido,
- El avance físico de la obra es del 10% e Inversión de 9.05% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 150 ml, cantidad ejecutada: 3,85 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 80 ml, cantidad ejecutada: 49,2 m3. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$18102790,2 correspondiente al 9,05% del valor del convenio.

9 ANEXO

9.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 1.8

9.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

9.4 BITÁCORA

Ver anexo 1.9

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO, CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No.2172-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

Contrato de Interventoría No.3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.8

MES O PERIODO:

1 AL 31 DE JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	70
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	71
1	INTRODUCCIÓN		74
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		75
2.1	Localización		75
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		76
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		76
2.4	Características técnicas del proyecto		77
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		77
3.1	Información general del contrato		77
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		79
3.3	Seguimiento ítems no previstos		79
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		79
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		80
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	535
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	550
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	544
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		82
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A. N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		82
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	82 82
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		82
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A. N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		83
	Conclusiones y recomendaciones		83
8	Anexos		83
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP-MINVA-16-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/07/2025
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAJALÍ	PERIODO MES:	JULIO
CONVENIO No.:	272-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/07/2024	VALOR INICIAL (incluido IVA):	200.000.268,00
OBJETO:	ALIANZA ESPERANZAS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAJALÍ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	FECHA DE INICIO:	HASTA EL 31/07/2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	0
OAC:	JAC VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/07/2024	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	200.000.268,00
		FECHA DE PRORROGA 01:	31/07/2024	ANTICIPO CONCEDIDO:	0
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/09/2025	ANTICIPO AMORTIZADO:	0
		FECHA DE PRORROGA 02:	30/09/2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/09/2025		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	31/07/2024		
		PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21/08/2024		
		FECHA DE RENICIO:	10/07/2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN:	10/07/2025		
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	331,00		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN:	2801-2024	INTERVENCIÓN:	CONCRECIÓN CEMENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN:	JULIANA TRATA

331,00


ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m ²	158,00	Pavimentación	Construcción	m ²	
	Mejoramiento				Mejoramiento		
	Rehabilitación				Rehabilitación		
Estructuras	Puentes			Estructuras	Puentes		
	Puentes				Puentes		
Mantenimiento	Distintos			Mantenimiento	Distintos		
Obras	Obras de Drenaje	und	-	Obras	Obras de Drenaje	und	-
(Especificar Cuáles)				(Especificar Cuáles)			

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES	
	VALOR		VALOR
OBRAS	151.845.017,00	OBRAS	132.880.125,86
OGRA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.855.361,00	OGRA (GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.787.900,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.588.927,49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.188.268,00	VALOR EJECUTADO	5.643.173,22
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.		VALOR ACUMULADO	
		180.489.953,36	

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	200.000.268,00	MIMO DE OBRA CALIFICADA:	2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	180.489.953,36	MIMO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	89,99%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA	VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO FOTO 2 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en el que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: 

Nombre: BIBIANA PATERININI
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0600253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIMMS
Código: Interventoría, Dirección, Fecha: 30/07/2025

CONVENIO SOLIDARIO No. 2172-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO

10 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2172 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.688.268,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de Suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que, de ser aceptada, las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025..

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

11 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a la vía denominada Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), con longitud total de 0,35 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.

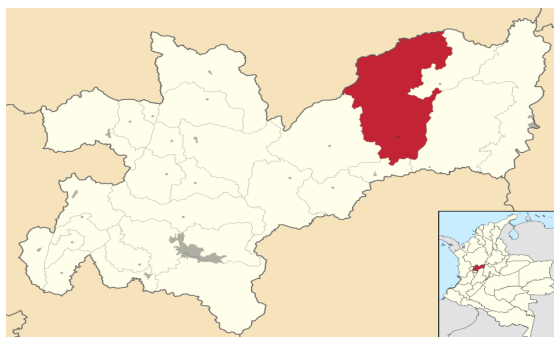


Ilustración 4 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

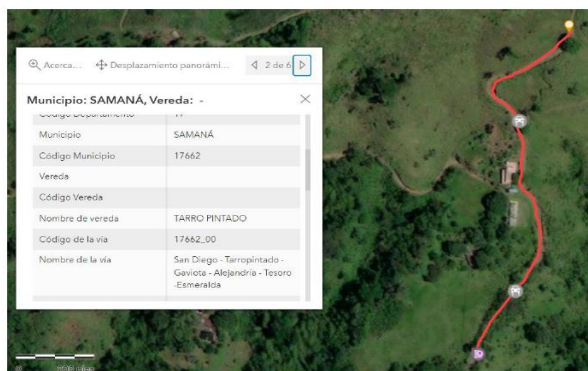


Ilustración 5 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

11.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro Y Esmeralda), del Municipio de Samaná.

11.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Tarropintado Corregimiento de San Diego, en el corredor vial denominado vía Tarropintado (San Diego – Tarropintado – Gaviota – Alejandría – Tesoro y Esmeralda) que tiene una longitud de 0,35 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 en la casa de la señora Nora Grisela, y el punto final de referencia es PR00+350 El Crucero.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 6 Inventario y estado inicial

11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros. De igual manera, se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

12 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495244
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO
NIT.	901.130.760-5
TELÉFONO:	3145933199
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2172-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.688.268,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$200.688.268,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2025

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/07/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MESES HASTA EL 1/08/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARROPINTADO CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330850 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083383			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.068.827,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.034.414,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.137.654,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 6. Información general del Convenio 2172-2024 Municipio Samaná.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

12.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/07/25, remitió el auxiliar detallado, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/07/25, remitió documentación socioambiental, para revisión y aprobación.

- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 24/07/25, remitió planes de compras con pendientes, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, remitió plan de compras de la OPC, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correos electrónicos de fechas 29/7/25 y 31/7/25, remitió la solicitud de desembolso de la OPC.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió las liquidaciones de los empleados.
- Se realizó comité operativo No.14, el día 15/7/25.

12.2.2 Actividades Técnicas

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior, la JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

12.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

12.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	200.688.268,00

Ejecutado	100%	89,93%	180.469.053,34
Avance / Retraso	0%	-10,07%	-20.219.214,66

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	120,87	110,16
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	93,84	85,53
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	23,35
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4326,09	3.942,77

13 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

13.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 2.1.

13.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

13.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-053-4923 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Carlos Moreno Moncaleano
Contador	Andrés Felipe Quiceno López

Tabla 6 Personal Convenio Solidario

13.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 58.947.919 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 4.587.660 de fecha 07/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de \$ 8.109.428 de fecha 07/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 15.007.160 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 8.204.580 de fecha 09/03/2025.
6. Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 34.000 de fecha 09/03/2025.
7. Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 5.262.919 de fecha 13/03/2025
8. Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 22.974.515,00 de fecha 19/03/2025
9. Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 16.679.081,00 de fecha 26/03/2025
10. Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 23.491.818,35 de fecha 10/04/2025
11. Desembolso 17 aprobado por valor de \$ 13.430.506,00 de fecha 14/05/2025

11. Desembolso 19 aprobado por valor de \$ 1.247.999,43 de fecha 27/05/2025

Desembolso Total por valor de \$177.986.023,61 correspondiente al 89% del valor del convenio. Ver Anexo 2.5

13.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

13.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

13.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 2.2.

El OAC al corte del periodo continuó sin presentar la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO de las nuevas novedades contractuales.

Al finalizar el periodo de este informe la OAC se encontraba en el trámite para pagar el costo de la modificación de las pólizas, para así recibir de la aseguradora la respectiva actualización de las pólizas.

13.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

13.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

13.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

13.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
1	✓	Placa Huella San Diego	60 días	lun 13/01/25	lun 7/04/25	100%	100%
2	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
3	✓	Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
4	✓	Acero de refuerzo de FY = 4 200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	20 días	lun 17/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
5	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%
6	✓	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	15 días	lun 17/03/25	lun 7/04/25	100%	100%

13.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 200.688.268,00; la Inversión Ejecutada fue de \$180.469.053,34. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$20.219.214,66

13.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

13.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

14 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

14.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-922-2629 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-996-2789 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- Se realizó comité operativo No.14, el día 15/7/25.

14.1.2 Actividades Técnicas

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda Tarropintado San Diego, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el balance final por las partes JAC e Interventoría, para definir si se tenían inconsistencias en el cierre contable final y las cantidades de Obra ejecutadas e insumos utilizados a lo largo del todo el proyecto. El cierre se dio a satisfacción.

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior. La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m³.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.

14.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2172 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de giro de rendimientos al Tesoro Nacional correspondiente al mes de enero 2025.

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 89.93% hasta el corte del presente periodo, teniendo en cuenta que se realizaron 144ml de placa huella con la estructura completa, con los recursos disponibles para la obra física. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 4,18 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 110,16 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 85,53 m3. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 23,35 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 144 ml, cantidad ejecutada: 3.942,77 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$180.469.053,34 correspondiente al 89,93% del valor del convenio.
- Que desde el 10 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

16 ANEXO

16.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

No aplica para este periodo.

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

16.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

16.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2435-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	86
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	87
1	INTRODUCCIÓN		89
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		91
2.1	Localización		91
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		92
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		92
2.4	Características técnicas del proyecto		92
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		93
3.1	Información general del contrato		93
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		94
3.3	Seguimiento Items no previstos		95
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		95
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		97
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	553
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	568
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	562
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		98
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		98
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		99
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		100
7	Conclusiones y recomendaciones		100
8	Anexos		101
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP/INV-15-PR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 2435-2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/09/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21.01.05
FECHA DE RENICIO: 30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 372.05

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 203.482.844,00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 203.482.844,00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

OAC: JAC VEREDA EL CIRPIAL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CISO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JULIANA TIBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación		
Construcción	m ²	130,00
Mejoramiento		
Rehabilitación		
Estructuras		
Puentes		
Pantones		
Mantenimiento		
Obras (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und 1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación			
Construcción	m ²	-	-
Mejoramiento			
Rehabilitación			
Estructuras			
Puentes			
Pantones			
Mantenimiento			
Obras (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	154.249.308,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.627.479,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.106.057,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.982.844,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		154.249.308,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.922.146,88	43.142.203,42
VALOR EJECUTADO	8.922.146,88	197.391.511,42

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 203.482.844,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 197.391.511,42
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,30%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

FOTO 1 - 30/04/2025 - OBRA FINALIZADA

Firma
Nombre: GIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202542871 ATL

Original: Informe Mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2435-2024

**OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO,
CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA PATIOBONITO

17 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Patio bonito, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2435 de 2024 de fecha 17 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$203.482.844,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

18 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

18.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al sector denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 130 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

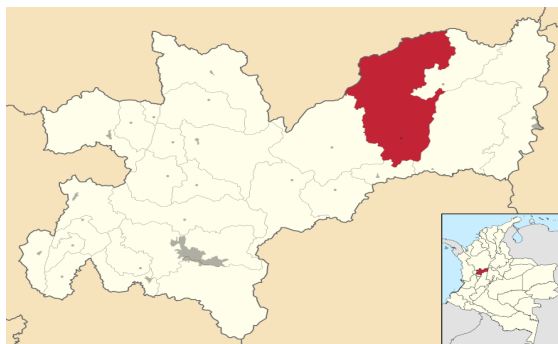


Ilustración 7 Localización del municipio de Samaná (Caldas).




Ilustración 8 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

18.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Patio Bonito, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

18.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Patio Bonito, corregimiento de Florencia, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo con una longitud de 2,40 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Patio Bonito y el punto final de referencia es PR02+400 a 2,40 km de Patio Bonito.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 9 Inventario y estado inicial JAC Patio Bonito

18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 138 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

19 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

19.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6537701
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO
NIT.	900.622.439-3
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2435-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO, CORREGIMIENTO DE FLORENCIA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$203.482.844,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$203.482.844,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/5/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25

PRÓRROGA NO. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/08/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100333354 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084226			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.348.285,00	17/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.174.143,00	17/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.696.569,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	17/07/2024	31/12/2024

Tabla 7 Información general del Convenio 2435-2024 Municipio Samaná.

19.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

19.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/07/25, remitió la solicitud de desembolso de la OPC, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 18/07/25, remitió formatos de paz y salvo de proveedores y ferretería, bodega y agua.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/07/25, remitió el plan de compras final, para revisión y aprobación.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/07/25, remitió la solicitud de desembolso 11, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 28/7/25, remitió la solicitud de giro de rendimientos financieros.

19.2.2 Actividades Técnicas

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior. La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4,60 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118, 58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155, cantidad ejecutada: 92,28 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

19.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

19.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	203.482.844,00
Ejecutado	100%	97,3%	197.991.511,42
Avance / Retraso	0%	-2,7%	- 5.491.332,58

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,86	4,6
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	99,45	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	77,4	92,28
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	24,47	29,18
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.546,03	4.227,96
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	-	-
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	-	-
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	-	-
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	-	-
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	-	-
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	-	-
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	-	-
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	-	-

20 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

20.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 3.1.

20.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

20.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida del personal remitida por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-182-0106 de fecha 08 de enero de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero residente de obra	Daniel Alejandro Guerra
Contador	Alejandro García

Tabla 8 Personal Convenio Solidario

20.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 45.709.003 de fecha 20/02/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 1.219.378 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 2.313.650 de fecha 06/03/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$ 23.212.472 de fecha 09/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de \$ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de \$ 5.157.000,00 de fecha 19/03/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 34.850.708,00 de fecha 25/03/2025.
8. Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 24.079.661,00 de fecha 25/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 419.368,00 de fecha 25/03/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 23.566.760,21 de fecha 15/04/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 13.896.760,00 de fecha 24/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de \$ 18.100.594,73 de fecha 25/04/2025.
13. Desembolso 16 aprobado por valor de \$ 8.533.916,00 de fecha 27/05/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de \$ 532.533,00 de fecha 27/05/2025.

Ver Anexo 3.5

20.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

20.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

20.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 3.2.

El OAC al corte del periodo no ha presentado las pólizas de las nuevas novedades contractuales, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

20.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

20.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

20.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

20.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
1	✓	CONVENIO 2119 - 2024	53 días	lun 17/02/25	vie 18/04/25	100%	100%
2	✓	ETAPA REVISION	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
3	✓	Preliminares	5 días	lun 17/02/25	sáb 22/02/25	100%	100%
4	✓	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	48 días	sáb 22/02/25	vie 18/04/25	100%	100%
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	sáb 22/02/25	sáb 8/03/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	15 días	vie 28/02/25	lun 17/03/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	sáb 15/03/25	vie 18/04/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	jue 6/03/25	mié 9/04/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mar 11/03/25	mié 9/04/25	100%	100%

20.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada acumulada fue de \$ 203.482.844,00; la Inversión Ejecutada fue de \$ 197.991.511,42. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que ejecutada por valor de \$ 5.491.332,58.

20.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

20.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

21 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

21.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

21.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-929-2636 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1020-2840 de fecha 17/7/25, remitió a la JAC los formatos de cierre ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1032-2876 de fecha 22/7/25, remitió a Corpocaldas solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1037-2909 de fecha 23/7/25, remitió al INVÍAS el cierre ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1056-2943 de fecha 25/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra
- Se realizó comité operativo No.18, el días 18/7/25.

21.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda Patio Bonito, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el balance final por las partes JAC e Interventoría, para definir si se tenían inconsistencias en el cierre contable final y las cantidades de Obra ejecutadas e insumos utilizados a lo largo del todo el proyecto. El cierre se dio a satisfacción.

Toda vez que la ejecución de las actividades físicas previstas en el convenio terminó el periodo anterior. La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.

21.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2435 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, se encuentran pendiente los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de julio 2024 a febrero 2025.

22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 30/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 97,3% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada 100 ml, cantidad ejecutada: 4,6 m³. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m³. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 92,28 m³. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 29,18 m³. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada 155 ml, cantidad ejecutada: 4.227,96 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 197.991.511,42 correspondiente al 97,3% del valor del convenio.
- Que desde el 06 de mayo de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la

ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

23 ANEXO

23.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

23.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

23.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

23.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2159-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 JULIO
-----------------------	----------------	---------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	103
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	104
1	INTRODUCCIÓN		106
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		108
2.1	Localización		108
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		109
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		109
2.4	Características técnicas del proyecto		109
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		109
3.1	Información general del contrato		109
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		111
3.3	Seguimiento Items no previstos		111
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		111
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		113
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	571
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	580
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		114
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		114
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		114
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		115
7	Conclusiones y recomendaciones		115
8	Anexos		115
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP/INV-N-15-PR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 1150-2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA EL CORDON VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 201.898.462,00

FECHA DE INICIO: 30/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1: 19/02/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1: 30/04/2025
FECHA AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1: 28/05/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1: 26/06/2025
FECHA AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1: 27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1: 21/06/2025
FECHA AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1: 19/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1: 4/07/2025
FECHA AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 1: 2/07/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 1: 1/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 111,86

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 201.898.462,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.898.462,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$
ANTICIPO AMORTIZADO: \$

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LILIANA TIBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	ml	135,00
Mejoramiento		
Rehabilitación		
Estructuras		
Túneles		
Puentes		
Portiones		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuantos)	Obras de Drenaje	und 1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	ml	-	-
Mejoramiento			
Rehabilitación			
Estructuras			
Túneles			
Puentes			
Portiones			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuantos)	Obras de Drenaje	und -	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.711.788,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.581.354,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.105.320,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.398.462,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATERINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0620550204-ATL
Original Informe Mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias Interventoría Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2159-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL CIRPIAL

24 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Cirpial, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2159 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL CIRPIAL**, MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$201.898.462,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 3 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 4 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 13 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 5 a la suspensión No. 1 del Convenio, que iría hasta el 22 de septiembre de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos

Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

25 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

25.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2,4 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de drenaje tipo alcantarilla.

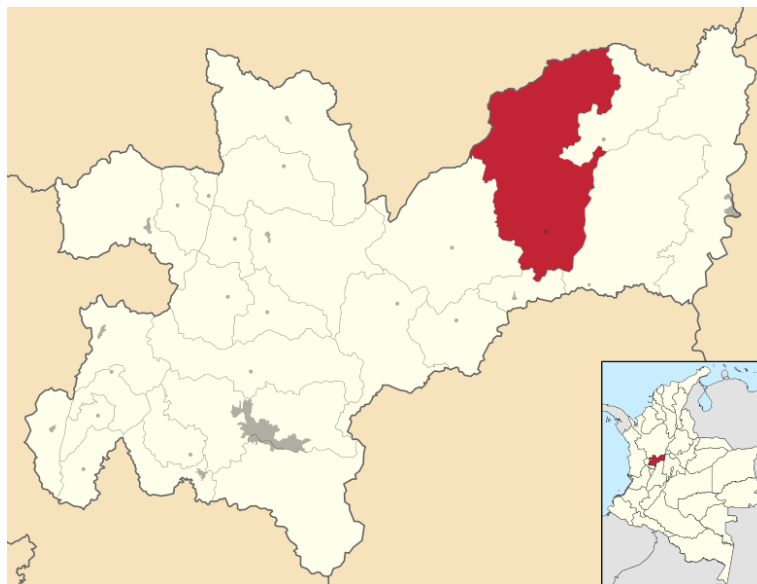


Ilustración 10 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

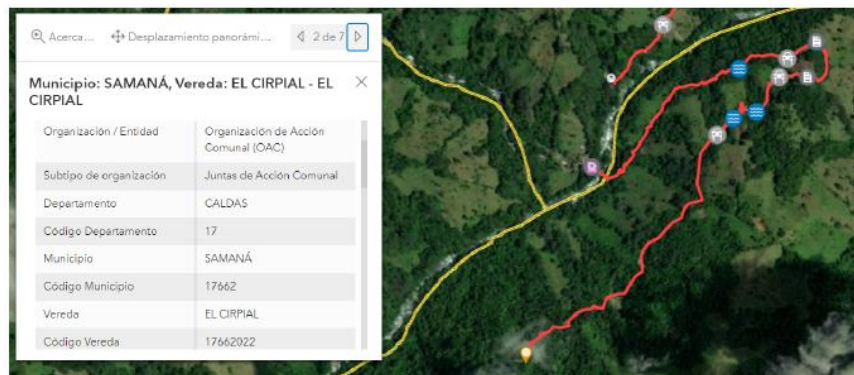


Ilustración 11 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

25.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Cirpial, en el corredor vial Santa Bárbara – Los Pomos –La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

25.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

25.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

26 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

26.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6494046
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL
NIT.	900.797.299-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2159-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CIRPIAL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.898.462,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.898.462,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	SUSPENDIDO		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/4/25		
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/5/25		
AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/07/25		
AMPLIACIÓN No. 5 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 21/09/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CIRPIAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330635 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083294			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			

Cumplimiento	\$20.189.847,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.094.924,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.379.693,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 9 Información general del Convenio 2159-2024 Municipio Samaná.

26.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

26.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

26.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

26.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

26.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,76	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	97,16	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	75,57	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	23,87	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3546,84	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	51,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	9,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,50	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,90	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	11,00	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	7,50	0
13	Relleno para Estructuras con	M3	0%	0%	7,30	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJE.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJE.
	material producto de la excavación					

27 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

27.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

27.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

27.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

27.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

27.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 4.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento la última novedad contractual del Convenio No. 2159 de 2024

27.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

27.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

27.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

27.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones. No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

27.9.4 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

27.9.5 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

28 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

28.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

28.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-920-2627 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.

28.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El proyecto se encuentra en un mismo corredor vial, por lo que su construcción no puede realizarse en paralelo por afectación a la comunidad. El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.

28.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2159 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, así como tampoco los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se encuentra suspendido desde el 20/12/24.
- La Interventoría realizará la reunión de socialización a la JAC del proyecto, en conjunto con la profesional social de la Interventoría e INVIAS, una vez se reinicie el proyecto.
- La Interventoría realizará la reunión de conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

30 ANEXO

30.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

No aplica para este periodo.

30.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

30.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

30.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2124-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DORADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	117
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	118
1	INTRODUCCIÓN		120
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		122
2.1	Localización		122
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		123
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		123
2.4	Características técnicas del proyecto		123
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		124
3.1	Información general del contrato		124
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		125
3.3	Seguimiento Items no previstos		126
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		126
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		127
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	587
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	603
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	596
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		129
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		129
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	129
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		130
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		131
7	Conclusiones y recomendaciones		131
8	Anexos		132
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP/INV-15-PR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.:	2104-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR INICIAL (incluido IVA):	200.874.007,00
OBJETO:	ALIANZA ESPUEZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDONAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	FECHA DE INICIO:	30/09/2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	0
OAC:	JAC VEREDA EL DORADO	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	200.874.007,00
		FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2025	ANTICIPO CONCEDIDO:	0
		PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES	ANTICIPO AMORTIZADO:	0
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2026		
		FECHA DE PRORROGA 02:	30/09/2025		
		PLAZO PRORROGA 02:	30/09/2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02:	30/09/2025		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/09/2025		
		PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS		
		FECHA DE RENICIO:	09/10/2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN:	21/09/2025		
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	273,05		

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSI SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JULIANA TIBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m ²	151,00	Pavimentación	Construcción	m ²	-
	Mejoramiento				Mejoramiento		
	Rehabilitación				Rehabilitación		
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles		
	Puentes				Puentes		
	Portones				Portones		
Mantenimiento				Mantenimiento			
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und	-	Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und	-

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES	
	VALOR		VALOR
OBRAS	151.039.601,00	OBRAS	59.755.110
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.531.188,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.603.218,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.930.966,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.174.007,00	VALOR EJECUTADO	77.686.076,37

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	200.874.007,00	MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	199.210.351,37	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	97,93%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO 1 - 19/05/2025 - OBRA FINALIZADA	FOTO 2 - 19/05/2025 - OBRA FINALIZADA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PAREDES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2124-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL DORADO

31 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Dorado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2124 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA **VEREDA EL DORADO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de \$200.674.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

32 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

32.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sardinas – El Dorado, con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 12 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

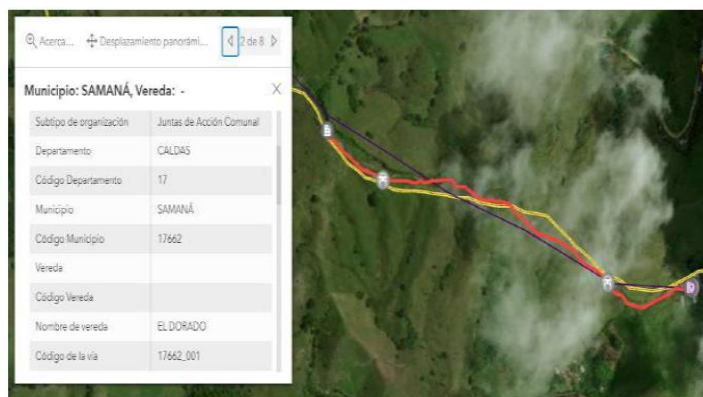


Ilustración 13 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

32.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas, del Municipio de Samaná.

32.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda El Dorado, en el corredor vial denominado Sardinas – El Dorado con una longitud de 0,71 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 La Punta de la Inmaculada al frente de los potreros de Don Gonzalo y el punto final de referencia es PR 0+710 salida hacia la arenera al frente de Eliseo Villarraga.

El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo. La zona cuenta con pendientes mayores al 7% siendo un terreno montañoso. Se observan cárcavas por efecto de la escorrentía superficial.



Ilustración 14 Inventario y estado inicial

32.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

33 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

33.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490533
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO
NIT.	901.661.673-0
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2124-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL SECTOR SARDINAS DE LA VEREDA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.674.007,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$200.674.007,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	30/08/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA NO. 3	UN (1) MES

	HASTA EL 1/08/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/08/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330614 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083286			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.067.401,00	23/12/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.033.701,00	23/12/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.134.802,00	30/04/2030	30/04/2020
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$284.700.000,00	02/07/2024	30/04/2025

Tabla 10 Información general del Convenio 2124-2024 Municipio Samaná.

33.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

33.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/7/25, remitió el auxiliar detallado para revisión.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/7/25, remitió los documentos solicitados por la Interventoría.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/7/25, remitió el plan de compras de pendientes por ejecutar.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió la solicitud de desembolso de la OPC.

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió la solicitud de desembolso de los pendientes.

33.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 16 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35,73 ml, cantidad ejecutada: 58,68.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 30,73 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 58,4 ml, cantidad ejecutada: 10,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 1415,34,77 kg.

Las actividades acumuladas corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

33.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

33.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	200.674.007,00
Ejecutado	100%	97,02%	194.710.151,34
Avance / Retraso	0%	2.98%	5.963.855,66

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,41
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	113,76
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	91,7	81,56
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	27,62
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3.756,53

34 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

34.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 5.1.

34.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

34.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-054-4924 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Albeiro López Clavijo
Contador	Andrés Antonio Quiceno López
Maestro de Obra	Jhon Fredy Sánchez

Tabla 11 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 5.4.

34.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$55.537.787 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$4.587.660 de fecha 10/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$3.221.014 de fecha 14/02/2025.
4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$13.815.559 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de \$5.595.532 de fecha 06/03/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de \$60.000 de fecha 10/03/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de \$3.636.675 de fecha 13/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 10.304.766,00 de fecha 19/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 21.103.169,41 de fecha 04/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 47.001.876,72 de fecha 14/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 22.662.110,71 de fecha 02/05/2025.
12. Desembolso 17 aprobado por valor de \$ 9.534.555 de fecha 30/05/2025.

Ver Anexo 5.5

34.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

34.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

34.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 5.2.

El OAC no ha presentado las respectivas pólizas que evidencie que las nuevas novedades contractuales están debidamente legalizadas, esto a pesar del requerimiento que en su momento realizó la Interventoría.

34.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

34.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

34.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

34.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Cantidad	Unidad	D. Calenda	Comienzo	Fin	% prog	% completado
⇒ AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARDINAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			91	lun 13/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
⇒ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA			91	lun 13/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4,41	M3	32	lun 13/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	115,52	M3	22	vie 17/01/25	sáb 8/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	91,70	M3	64	vie 7/02/25	sáb 12/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	28,05	M3	53	jue 20/02/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	4.223,65	KG	65	lun 3/02/25	mié 9/04/25	100%	100%

34.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de \$200.674.007,00; la Inversión Ejecutada fue de \$ 194.710.151,34. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$5.963.855,66

34.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

34.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

35 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

35.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

35.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-918-2625 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1017-2833 de fecha 17/7/25, remitió a la JAC los formatos de cierre ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-959-2732 de fecha 11/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1034-2878 de fecha 22/7/25, remitió a Corpocaldas solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1030-2868 de fecha 23/7/25, remitió al INVIAS el cierre ambiental.

35.1.2 Actividades Técnicas

El día 20 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda El Dorado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Actualizar plan de compras 2. Envío de soportes

El día 23 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda El Dorado, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Actualizar plan de compras 2. Envío de soportes

Desde el 1 al 16 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 35,73 ml, cantidad ejecutada: 58,68.

- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 30,73 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 58,4 ml, cantidad ejecutada: 10,85 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37,4 ml, cantidad ejecutada: 1415,34,77 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

35.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2124 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de Julio 2024 a Junio 2025.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 88,81% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148,7 ml, cantidad ejecutada: 4,41 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 113,76 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa

huella, longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 81,56 m³. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 27,62 m³. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 148,7, cantidad ejecutada: 3.756,53 kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 194.710.151,34 correspondiente al 97,02% del valor del convenio.
- Que desde el 07 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

37 ANEXO

37.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

37.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

37.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

37.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2058-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	134
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	135
1	INTRODUCCIÓN		137
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		139
2.1	Localización		139
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		140
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		140
2.4	Características técnicas del proyecto		140
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		140
3.1	Información general del contrato		140
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		144
3.3	Seguimiento Items no previstos		143
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		143
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		144
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	606
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	622
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	615
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		145
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		146
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	146
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		146
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		148
7	Conclusiones y recomendaciones		148
8	Anexos		149
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP/INV-15-PR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 31/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 0008-2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS
FECHA DE RENICIO: 18/06/2025
PLAZO PRORROGA 03: 18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 10/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 335.00

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.533.857,00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.533.857,00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

OAC: JAC VEREDA CALIFORNIA ALTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JULIANA IBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m2
	Mejoramiento	156.00
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und
		-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m2	-
	Mejoramiento		-
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
			-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.871.177,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.556.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.606.545,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.033.857,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	18.648.795	151.871.177,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		42.444.423,32
VALOR EJECUTADO	18.648.795,45	194.315.600,32

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 201.533.857,00.
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 194.315.600,32.
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 96,42%.

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 19/05/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820255024 ATL

Original: Informes mensuales de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAE
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2058-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CALIFORNIA ALTA

38 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda California Alta, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2058 de 2024 de fecha 26 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA CALIFORNIA ALTA** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$201.533.857,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

39 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

39.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado California Alta, con longitud total de 6,2 km, de los cuales se intervendrán 155 ml de placa huella.

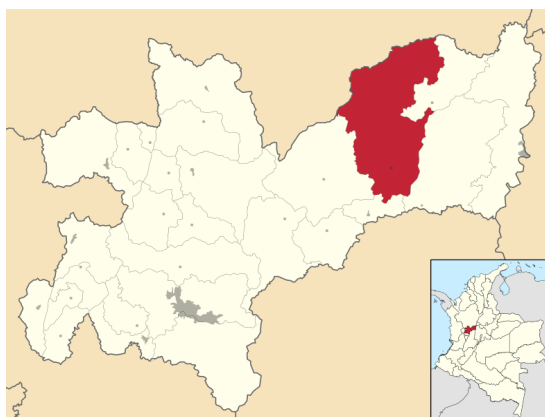


Ilustración 15 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

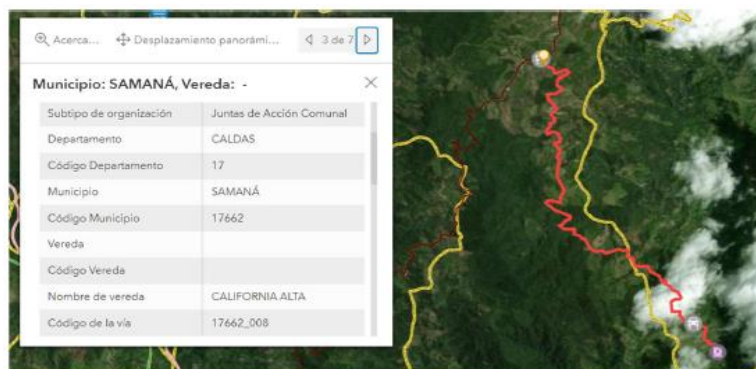


Ilustración 16 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

39.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta, del Municipio de Samaná.

39.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda California Alta, en el corredor vial denominado California Alta con una longitud de 6,20 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 puente quebrada La Vega y el punto final de referencia es PR 6+200 La Y California Alta. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

39.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 155 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

40 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

40.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6468342
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA
NIT.	810.003.756-1
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2058-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.533.857,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$201.533.857,00 M/CTE

VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24		
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25		
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALIFORNIA ALTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329803 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100082999			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.153.386,00	30/08/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.076.693,00	30/08/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.306.772,00	30/4/2025	30/04/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	26/06/2024	30/04/2025

Tabla 12 Información general del Convenio 2058-2024 Municipio Samaná.

40.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

40.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 11/07/25, remitió el auxiliar detallado, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/07/25, remitió el plan de compras de la OPC, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos financieros, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió la documentación Modificación de propuesta OPC.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, remitió la documentación socioambiental solicitada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, el plan de compras de los pendientes por ejecutar.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió las liquidaciones de los empleados.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió la solicitud de desembolso de la OPC.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió la solicitud de desembolso de los pendientes.
- Se realizó comité operativo no. 12 y 13, los días 14/7/25 y 15/7/25, para tratar el tema de la OPC.

40.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 17 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 32 ml, cantidad ejecutada: 24,48.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 24,58 m3.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 51,5 ml, cantidad ejecutada: 10,71 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 1133,53 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

40.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

40.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	201.533.857,00
Ejecutado	100%	96,42%	194.315.600,32
Avance / Retraso	0%	3,58%	7.218.256,68

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,05
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	118,58	106,72
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	92,01	88,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	25,78
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.243,89	3.819,5

41 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

41.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 6.1.

41.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 6.3.

41.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-096-5088 de fecha 03 de diciembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francisco Madera Madrid
Contador	Eneriet Gómez Cuellar
Maestro de Obra	Willian Casbuenas Vásquez

Tabla 13 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 6.4.

41.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 58.936.944 de fecha 23/01/2025.
2. Desembolso 03 probado por valor de \$ 4.587.660 de fecha 14/02/2025.
3. Desembolso 04 aprobado por valor de \$ 1.275.000,00 de fecha 17/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 8.553.302 de fecha 25/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de \$ 27.000 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 5.647.805 de fecha 13/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 24.531.906 de fecha 20/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de \$1.489.715 de fecha 28/03/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de \$182.000 de fecha 09/04/2025.
10. Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 42.507.598,07 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 14 aprobado por valor de \$ 16.167.261,73 de fecha 29/04/2025.
12. Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 9.933.473,17 de fecha 22/05/2025.
13. Desembolso 17 aprobado por valor de \$ 5.411.484,67 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 179.251.149,91 correspondiente al 89% del valor del convenio. Ver Anexo 6.5.

41.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

41.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

41.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 6.2.

El OAC al corte del periodo no ha remitido las pólizas de la Prórroga No. 2, Suspensión No. 1, ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 y Prórroga No. 3, además del respectivo paz y salvo y resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

41.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

41.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

41.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

41.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	100%	100%
INICIO	65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL	0 días	vie 11/04/25	vie 11/04/25	0%	100%

41.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de \$201.533.857,00; la Inversión Ejecutada fue de \$194.315.600,32. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$ 7.218.256,68.

41.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

41.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

42 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

42.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

42.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-913-2620 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-997-2790 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1027-2865 de fecha 21/7/25, remitió al INVIAS la OPC enviada por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1038-2910 de fecha 23/7/25, remitió al INVIAS respuesta a comunicado social.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1055-2942 de fecha 25/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.
- Se realizó comité operativo no. 12 y 13, los días 14/7/25 y 15/7/25, para tratar el tema de la OPC.

42.1.2 Actividades Técnicas

El día 5 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda California Alta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó la aprobación del plan de compras para el pago de nómina, compra de materiales de ferretería y formaleta. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso.

El día 9 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda California Alta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde Se aprueba el plan de compras por parte de los participantes del comité para pagos de nómina, alquiler de equipos, honorarios y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos soportes para el desembolso.

Desde el 1 al 17 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 32 ml, cantidad ejecutada: 24,48.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 24,58 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 51,5 ml, cantidad ejecutada: 10,71 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 61 ml, cantidad ejecutada: 1133,53 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m3.

- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.

42.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2058 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio de 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. Se encuentra pendiente el soporte giro de los rendimientos del mes de Marzo 2025 al Tesoro Nacional.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 17 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,42% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 4,05 m³. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 106,72 m³. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 82,81 m³. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 25,78 m³. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 139,5 ml, cantidad ejecutada: 3.819,5 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 194.315.600,32 correspondiente al 96,42% del valor del convenio.

44 ANEXO

44.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

44.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

44.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

44.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2119-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARACOLÍ

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	151
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	152
1	INTRODUCCIÓN		154
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		156
2.1	Localización		156
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		157
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		157
2.4	Características técnicas del proyecto		158
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		158
3.1	Información general del contrato		158
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		160
3.3	Seguimiento Items no previstos		161
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		161
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		161
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	625
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	641
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	634
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		163
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		163
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	163
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		164
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		164
7	Conclusiones y recomendaciones		165
8	Anexos		165
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPI-MV-IN-15-PR-2
VERSION: 1
PÁGINA:

FECHA: 31/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 2110-2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25

OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA CARACOLÍ

FECHA DE INICIO: 30/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/09/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS
FECHA DE RENICIO: 30/09/2025
PLAZO PRORROGA 03: 30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 1/09/2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 1/09/2026
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 335.00

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 203.002.573,00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 203.002.573,00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 8601-2024 INTERVENTOR: CONSULTORÍA CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUANITA BATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m2
	Mejoramiento	156,00
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und
		-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m2	-
	Mejoramiento	-	-
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
		-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.194.886,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.595.847,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.711.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.502.573,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		160.587.703,89
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.476.483,00	41.135.665,94
VALOR EJECUTADO	7.476.483,00	201.723.369,83

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 203.002.573,00.
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 201.723.369,83.
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 99,37%.

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA CARACOLÍ
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA 15/04/25



VEREDA CARACOLÍ
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA 15/04/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2119-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA CARACOLÍ

45 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Caracolí, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2119 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA CARACOLÍ** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de \$203.002.573,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

46 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

46.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Caracolí, con longitud total de 2,6 km, de los cuales se intervendrán 156 ml de placa huella.




Ilustración 17 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

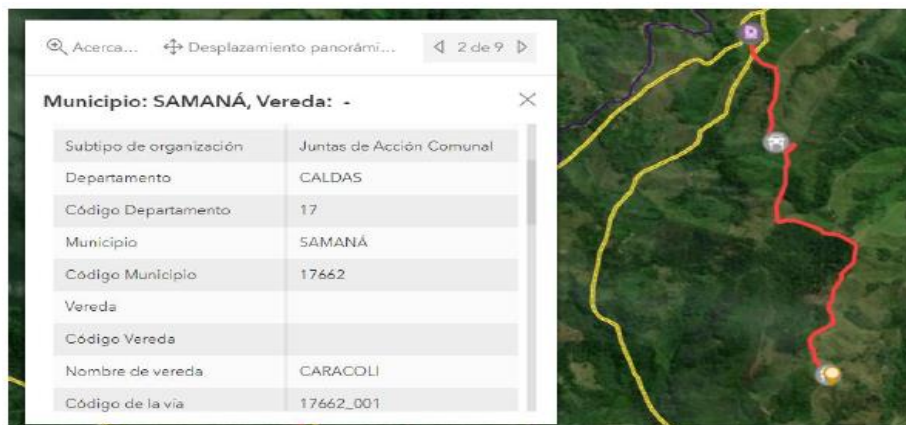


Ilustración 18 Localización vía a Intervénir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

46.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí, del Municipio de Samaná.

46.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Caracolí, en el corredor vial denominado Caracolí con una longitud de 2,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 en el desvío desde el Corregimiento de Pueblo Nuevo hacia Caracolí, y el punto final de referencia es el PR 2+600 hacia la vereda Caracolí. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado. No cuenta con alcantarillas ni otro tipo de obra a lo largo del tramo.



Ilustración 19 Inventario y estado inicial

46.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 156 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

47 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

47.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6488080
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARACOLÍ
NIT.	901.583.416-1.
TELÉFONO:	3122424450
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2119-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLI DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 203.002.573,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$ 203.002.573,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1:	4 MESES 24/12/24		
PRÓRROGA No. 2:	1 MES 28/04/25		
SUSPENSIÓN No. 1:	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARACOLÍ toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330602 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083280			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.300.258,00	02/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.150.129,00	02/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.600.515,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	02/07/2024	31/12/2024

47.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

47.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 9/07/25, remitió el plan de compras relacionado con la OPC, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/07/25, remitió auxiliar detallado, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/07/25, remitió el desembolso no. 9, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/07/25, remitió el acta de cambio de tramos.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/07/25, remitió el plan de compras final, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/07/25, remitió la subsanación de los no conformes de obra.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 23/07/25 y 24/7/25, remitió el desembolso no. 10, para revisión y aprobación.
- Se realizó comité operativo no. 11, el días 21/7/25.

47.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m³.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

47.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

47.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	203.002.573,00
Ejecutado	100%	99,36%	201.723.369,83
Avance / Retraso	0%	4,27%	1.279.203,17

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,59	5,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	119,34	136,94
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	95,32	109,37
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	29,24	33,55
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.375,92	5.021,09

48 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

48.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 7.1.

48.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, no se relaciona porque la Obra terminó el 15 de abril de 2025.

48.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-043-4877 de fecha 18 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Mario Cárdenas
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	José Daniel González Bedoya

Tabla 15 Personal Convenio Solidario

48.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$49.763.368 de fecha 07/02/2025.
- Desembolso 03 aprobado por valor de \$10.065.922 de fecha 21/02/2025.
- Desembolso 04 aprobado por valor de \$44.758.547 de fecha 26/02/2025.
- Desembolso 05 aprobado por valor de \$48.045.188 de fecha 13/03/2025.
- Desembolso 06 aprobado por valor de \$3.119.882 de fecha 13/03/2025.
- Desembolso 07 aprobado por valor de \$2.246.646 de fecha 15/03/2025.
- Desembolso 08 aprobado por valor de \$198.425 de fecha 19/03/2025.
- Desembolso 09 aprobado por valor de \$10.860.988 de fecha 25/03/2025.
- Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 17.875.733,66 de fecha 14/04/2025.
- Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 6.900.599,00 de fecha 25/04/2025.
- Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 866.600,00 de fecha 06/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 195.859.275,42 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 7.5

48.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

48.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

48.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 7.2.

El OAC al corte del periodo no ha remitido las pólizas de la Prórroga No. 2, Suspensión No. 1, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 y Prórroga No. 3, con los respectivos paz y salvo y la resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO.

48.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

48.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

48.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

48.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
1	✓	CONVENIO 2119 - 2024	53 días	mar 21/01/25	sáb 22/03/25	100%	100%
2	✓	ETAPA REVISION	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
3	✓	Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
4	✓	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	48 días	dom 26/01/25	sáb 22/03/25	100%	100%
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	dom 26/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	15 días	sáb 1/02/25	mar 18/02/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 7/02/25	jue 13/03/25	100%	100%
9	✓	Apero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	mié 12/02/25	jue 13/03/25	100%	100%

48.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de \$203.002.573,00; la Inversión Ejecutada fue de \$201.723.369,83. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$ 1.279.203,17

48.9.3 Actas de Comités

No aplica para el periodo.

48.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

49 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

49.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

49.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-917-2624 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1016-2832 de fecha 17/7/25, remitió a la JAC observaciones sobre la OPC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1028-2866 de fecha 21/7/25, remitió a la JAC el recibo de obra física.
- Se realizó comité operativo no. 11, el días 21/7/25.

49.1.2 Actividades Técnicas

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.

49.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2119 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Julio 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la

transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional hasta el mes de abril 2025.

50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 15/04/25
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 99.36% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 136,94 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 109,37 m3. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 35,55 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 179 ml, cantidad ejecutada: 5021,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 201.723.369,83

51 ANEXO

51.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

51.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

51.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

51.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2173-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	167
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	168
1	INTRODUCCIÓN		170
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		172
2.1	Localización		172
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		173
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		173
2.4	Características técnicas del proyecto		173
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		173
3.1	Información general del contrato		173
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		175
3.3	Seguimiento Items no previstos		176
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		176
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		177
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	644
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	659
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	653
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		178
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		178
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	179
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		179
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		180
7	Conclusiones y recomendaciones		181
8	Anexos		181
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPI-MV-IN-15-PR-2
VERSION: 1
PÁGINA:

FECHA: 31/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL25

CONVENIO No.: 0173-2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAC VEREDA MONTEBELLO VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 201.229.002,00

FECHA DE INICIO: 01/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/09/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS
FECHA DE RENICIO: 30/09/2025
PLAZO PRORROGA 03: 30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 1/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 1/06/2026
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 332,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 201.229.002,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$
ANTICIPO AMORTIZADO: \$

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0601-2024 INTERVENTOR: CONSULTORIAL CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUANALIBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m2
	Mejoramiento	149,00
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und
		-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m2	-
	Mejoramiento		-
	Rehabilitación		-
Estructuras	Túneles		-
	Puentes		-
	Pontones		-
Mantenimiento			-
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
		-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.578.686,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.577.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.572.955,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.729.002,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	27.947.080	146.229.774,46
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.581.628,90	48.600.197,90
VALOR EJECUTADO	41.528.688,94	194.829.972,26

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 201.229.002,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 194.829.972,26
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 96,82%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/06/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 15/06/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA RATERPINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2173-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA MONTEBELLO

52 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Montebello, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2173 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA MONTEBELLO** DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. por un valor de \$201.229.002,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 24 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

53 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

53.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Montebello, con longitud total de 2,5 km, de los cuales se intervendrán 149 ml de placa huella.

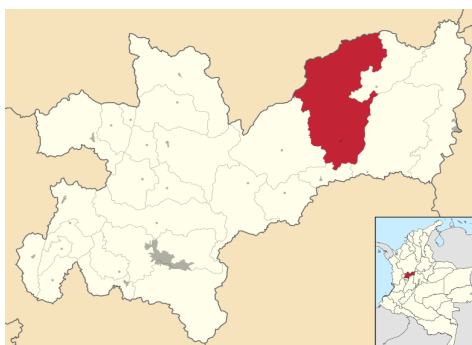


Ilustración 20 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

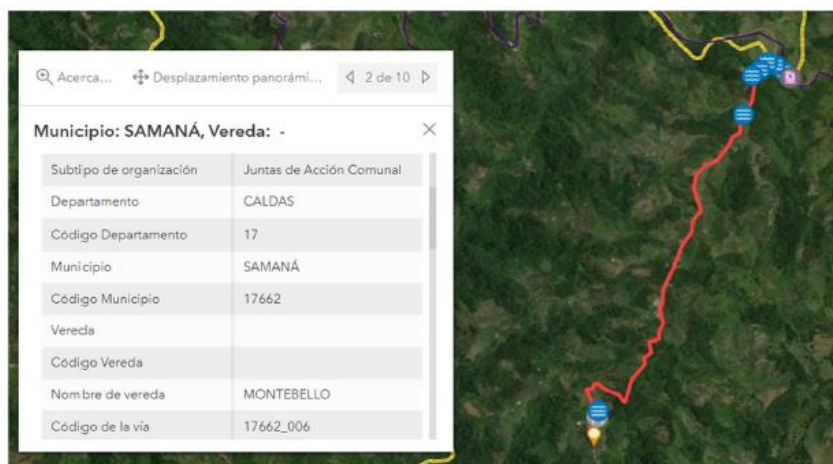


Ilustración 21 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

53.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello, del Municipio de Samaná.

53.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la vereda Montebello, en el corredor vial denominado Montebello con una longitud de 2,50 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 ramal izquierdo hacia la vereda Montebello y el punto final de referencia es PR 2+500 a 2500 metros del inicio en el ramal izquierdo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

53.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 149 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

54 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

54.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495085
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO
NIT.	900.047.290-7
TELÉFONO:	3124209265
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2173-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.229.002,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE

VALOR TOTAL:	\$ 201.229.002,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24		
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25		
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTEBELLO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330649 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083300			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.122.901,00	02/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.061.451,00	02/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.245.801,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Tabla 16 Información general del Convenio 2173-2024 Municipio Samaná.

54.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

54.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió la solicitud de desembolso de la OPC, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 28/7/25, remitió la solicitud de reintegro de rendimientos financieros.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 30/7/25, remitió el plan de compras no. 3 póliza.

54.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 21 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0,8 ml, cantidad ejecutada: 0,61 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 17,45 m³.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 4,37 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 799,61 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m³.

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m3.

54.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

54.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	201.229.002,00
Ejecutado	100%	96,82%	194.829.972,26
Avance / Retraso	0%	- 3,18%	- 6.399.029,74

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,23
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	113,99	109,25
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	90,04	82,72
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,88
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4125,38	3.789,81

55 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

55.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 8.1.

55.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

55.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-051-4921 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Williams Casasbuenas Vásquez

Tabla 17 Personal Convenio Solidario

55.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 47.162.934 de fecha 27/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 13.620.194 de fecha 05/03/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 14.638.851 de fecha 07/03/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 6.258.536 de fecha 18/03/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de \$ 23.059.752 de fecha 25/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 40.090.690,63 de fecha 25/03/2025.
7. Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 237.849,49 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 513.766,89 de fecha 25/04/2025.
9. Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 21.546.278,88 de fecha 02/05/2025.
10. Desembolso 14 aprobado por valor de \$ 375.100,00 de fecha 22/05/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 91.111,76 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 167.603.465,25 correspondiente al 84% del valor del convenio. Ver Anexo 8.5

55.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. Ver Anexo 8.6.

55.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

55.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 8.2.

El OAC al corte del periodo se encuentran pendientes las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 2, Suspensión 1, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 y Prórroga No. 3, además de los respectivos paz y salvo y la resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO del Convenio No. 2173 de 2024.

55.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

55.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

55.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

55.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
CONVENIO 2173DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEBELLO		65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	100%	100%
INICIO		65 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	10 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	15 días	lun 27/01/25	vie 14/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	45 días	lun 10/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
FINAL		0 días	vie 11/04/25	vie 11/04/25	0%	100%

55.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de \$201.229.002,00, la Inversión Ejecutada fue de \$194.829.972,26. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$6.399.029,74.

55.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

55.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

56 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

56.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

56.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-910-2605 de fecha 3/7/25, remitió a la JAC los formatos de cierre ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-923-2630 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-1036-2880 de fecha 22/7/25, remitió a Corpocaldas solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-1024-2849 de fecha 18/7/25, remitió al INVIAS el cierre ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-1057-2944 de fecha 25/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.

56.1.2 Actividades Técnicas

El día 07 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 09 con presencia de JAC vereda Montebello, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos de nómina. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del desembolso con soportes.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 10 con presencia de JAC vereda Montebello, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el

estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos de nómina, alquiler de equipos y compra de materiales de ferretería. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío del desembolso con soportes.

Desde el 1 al 21 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0,8 ml, cantidad ejecutada: 0,61 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 17,45 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 4,37 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 20,8 ml, cantidad ejecutada: 799,61 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m³.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m³.

56.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2173 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría recibió los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

57 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 21 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,82% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 4,23 m³. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 109,25 m³. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 82,72 m³. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 26,88 m³. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 142,8 ml, cantidad ejecutada: 3.789,81 m³.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 194.829.972,26 correspondiente al 96,82% del valor del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.
- Que desde el 24 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

58 ANEXO

58.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

58.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

58.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

58.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2524-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TARROPINTADO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	183
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	184
1	INTRODUCCIÓN		186
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		188
2.1	Localización		188
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		189
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		189
2.4	Características técnicas del proyecto		189
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		189
3.1	Información general del contrato		190
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		191
3.3	Seguimiento Items no previstos		192
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		192
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		194
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	662
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	677
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	679
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	681
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	683
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	685
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	671
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		195
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		195
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	196
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		196
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		197
7	Conclusiones y recomendaciones		198
8	Anexos		198
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		687
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		689

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEH-MN-RV-15-FR-2
VERSION: 1
PÁGINA:

FECHA: 30/07/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUPERVISOR VAL REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL-25

CONVENIO No.: 25012025
OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
OAC: JAG.VEREDA.TARRO.25012025
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE INICIO: 20/09/24
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/12/24
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/02/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/09/25
FECHA DE AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01: 28/04/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/09/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 27/09/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: HASTA EL 18/09/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/09/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 100,00
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 202.753.245,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 202.753.245,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 30012025 INTERVENTOR: CONSEJO COGSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: JULIANA JUBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	127,00
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und 1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	-	-
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.543.699,00
PAJIA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.606.311,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.103.235,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	201.253.245,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	13.137.345	13.137.345,18
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.249.170,00	7.249.170,00
VALOR EJECUTADO	20.386.515,18	20.386.515,18

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 38.021.033,14
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 20.396.515,18
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 10,13%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0



Foto 1, Localización y replanteo



Foto 2, Toma de densidades

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma: BIBIANA PATERNINA
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0620253024 ATL

Original: Informa mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventoría, Dirección Técnica

CONVENIO SOLIDARIO No. 2524-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA TARROPINTADO

59 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Tarro Pintado, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2524 de 2024 de fecha 19 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA TARRO PINTADO** MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$202.753.245,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 18 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 11 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

60 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

60.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, con longitud total de 2 km, de los cuales se intervendrán 127 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

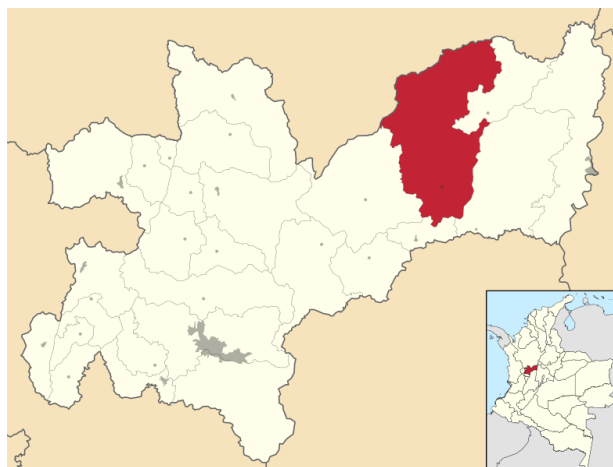


Ilustración 22 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

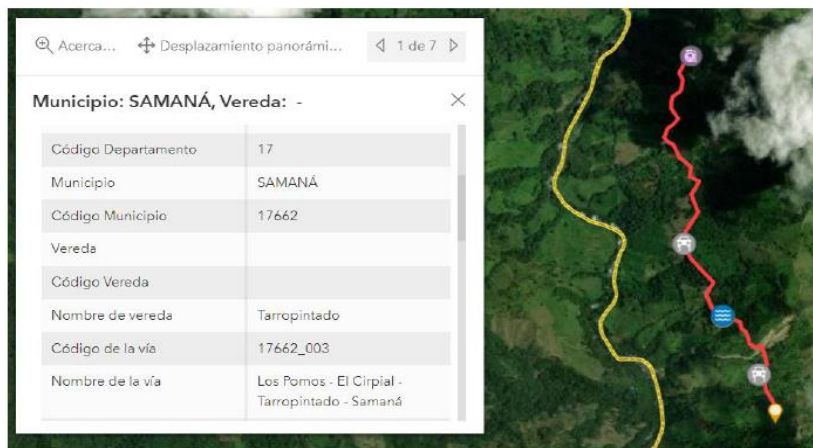


Ilustración 23 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

60.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado Santa Bárbara – Los Pomos – La Quinta – La Palma – El Codo, del Municipio de Samaná.

60.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

60.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 127 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

61 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

61.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6546066
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TARRO PINTADO

NIT.	810.003.143- 7.
TELÉFONO:	142917720
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2524-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$202.753.245,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$202.753.245,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/04/2025
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 30/05/2025
REANUDACIÓN	19/5/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA NO. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TARRO PINTADO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL	

Póliza de Cumplimiento No. NB-100334298 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084488			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.275.325,00	19/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.137.663,00	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.550.650,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	19/07/2024	31/12/2024

Tabla 18 Información general del Convenio 2524-2024 Municipio Samaná.

61.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

61.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 15/07/25 y 16/7/25, remitió documentos compromiso del comité operativo no. 1 y correcciones.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió la solicitud reintegro de rendimientos financieros, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió el plan de compras inicial, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió el plan de compras inicial, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/07/25, remitió los documentos para la primera compra, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 28/7/25, remitió la solicitud de giro de rendimientos financieros.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió subsanaciones de la solicitud de desembolso no. 1.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 31/7/25, remitió el plan de compras no. 2.
- Se realizó comités operativo no. 2, 3 y 4, los días 15/7/25, 16/7/25 y 18/7/25.

61.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 50,63 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 50,63 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

61.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

61.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El proyecto reinició el día 19/5/25, se encuentra en etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	6%	18,93%	38091033,14
Ejecutado	13%	10,13%	20386515,18

Avance / Retraso	7%	-8,8%	-17704517,97
-------------------------	-----------	--------------	---------------------

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	80%	100%	3,8	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	44%	97,2	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III,	M	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	de 900 mm de diámetro interior					
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	0	0

62 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

62.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 9.1.

62.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 9.3

62.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–772–2097 de fecha 21 de Mayo de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Adolfo Rodríguez Cas buenas
Contador	Andrés Felipe Quiceno
Maestro de Obra	Rogelio Armando Loaiza Rua

Tabla 19 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver anexo 9.4

62.4 NFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 48.970.711 de fecha 24/07/2025
- Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 185.360 de fecha 31/07/2025

Desembolso total por valor de \$ 49.156.071,00 correspondiente al 24,42% del valor del convenio. Ver anexo. Ver anexo 9.5

62.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 9.6

62.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 9.7

62.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 9.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2524 de 2024.

62.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

62.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

62.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

62.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %	% completado
☒ CONVENIO 2058 DE 2024 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALIFORNIA ALTA	55 días	lun 21/07/25	vie 3/10/25	6%	13%
☒ INICIO	55 días	lun 21/07/25	vie 3/10/25	6%	13%
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 21/07/25	vie 1/08/25	80%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 4/08/25	vie 22/08/25	0%	44%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	0%	0%
Concreto Cidlópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	0%	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	35 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	0%	0%
FINAL	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	0%	0%

62.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de julio de 2025, la Inversión Programada fue de \$38.091.033,14; la Inversión Ejecutada fue de \$20.386.515,18. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de **\$17.704.517,97**

62.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

62.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

63 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

63.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

63.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-930-2637 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-971-2744 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-984-2777 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1004-2801 de fecha 16/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1063-2978 de fecha 28/7/25, remitió a la JAC el acta de inicio de obra.
- Se realizó comités operativo no. 2, 3 y 4, los días 15/7/25, 16/7/25 y 18/7/25.

63.1.2 Actividades Técnicas

El día 15 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 2 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que la Interventoría hizo una presentación de los documentos de alistamiento requeridos para dar aprobación al Plan de Compras No 1 y así firmar el Acta de inicio de obra. Compromisos: Entregar documentos requeridos y Plan de compras No 1 .

El día 16 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 3 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se hizo una revisión de los documentos de alistamiento requeridos para dar aprobación al Plan de Compras No 1 y así firmar el Acta de inicio de obra. Compromisos: Entregar documentos requeridos y Plan de compras No 1 ajustados.

El día 18 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 4 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se dio aprobación al Plan de Compras No 1 y se proyectó firmar el Acta de inicio de obra con fecha 21 de julio de 2025. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras No 1, para su envío a pago

A la fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 50,63 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

63.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2524 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibió los soportes de solicitud del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

64 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 21 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 13% e Inversión de 10.13% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 127 ml, cantidad ejecutada: 5,62 m³. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 75 ml, cantidad ejecutada: 50,63 m³. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$20.386.515,18 correspondiente al 10,13% del valor del convenio.

65 ANEXO

65.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

65.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 9.8

65.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

65.4 BITÁCORA

Ver anexo 9.9

MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2175-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	200
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	201
1	INTRODUCCIÓN		203
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		204
2.1	Localización		204
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		205
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		206
2.4	Características técnicas del proyecto		206
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		206
3.1	Información general del contrato		207
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		208
3.3	Seguimiento Items no previstos		209
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		209
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		210
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N/A
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	709
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	703
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		211
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		211
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	211
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		212
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		214
7	Conclusiones y recomendaciones		214
8	Anexos		215
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-PR-2
VERSION: 1
PÁGINA:

FECHA: 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: 06/2025

CONVENIO No.: 0175-2024 PLAZO INICIAL: 19/07/2024 PLAZO DE INICIO: 19/07/2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19/07/2024
FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 273.00

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.355.780,00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.355.780,00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

OAC: JAC VEREDA EL NARANJAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0621-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CGSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUVANA TIBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m2
	Mejoramiento	146,00
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und
		-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m2	-
	Mejoramiento		-
	Rehabilitación		-
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und	-
			-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.688.536,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.550.968,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.605.856,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.855.760,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	110.688.346	160.773.936,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.969.746,00	33.721.331,00
VALOR EJECUTADO	0,00	194.495.267,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 201.355.780,00.
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 194.495.267,00.
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 96,59%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 13/06/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 13/06/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar si estuvo en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA PATEGAMA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0827253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2175-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

66 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de SAMANÁ, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2175 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL **VEREDA EL NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$201.355.760,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 17 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

67 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

67.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Samaná se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Argelia, al oriente con Norcasia y Victoria, al sur con Marquetalia, y al occidente con Pensilvania y Nariño. Se sitúa a 115 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta, con longitud total de 1,8 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.

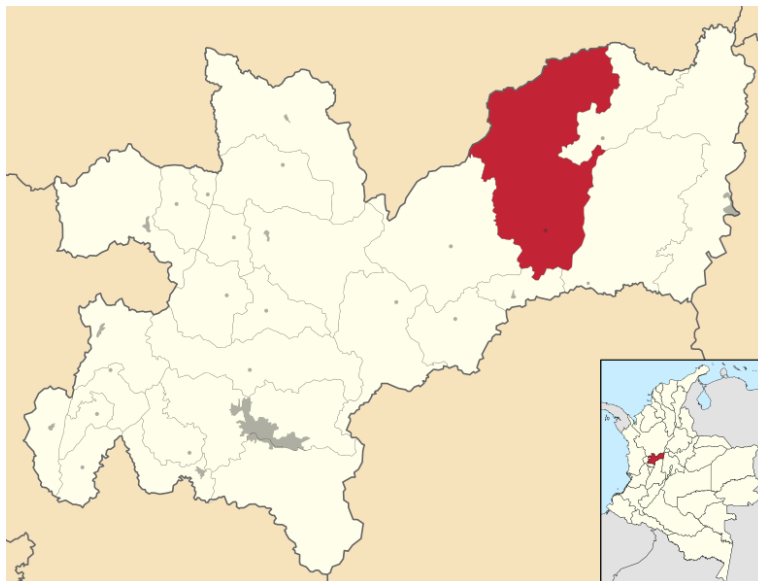


Ilustración 24 Localización del municipio de Samaná (Caldas).

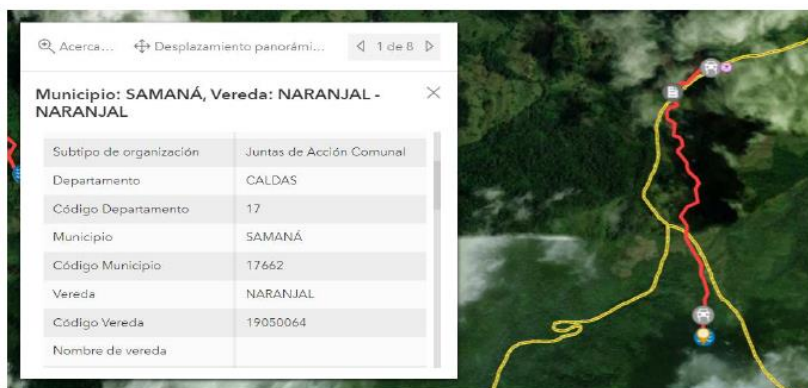


Ilustración 25 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

67.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Tarropintado, en el corredor vial denominado El Naranjal, del Municipio de Samaná.

67.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Samaná del departamento de Caldas en la El Naranjal, en el corredor vial denominado "Rancho Largo - Guadualejo - Naranjal – Media Cuesta" con una longitud de 1,80 km, el punto de inicio de referencia es PR00+000 Rancho Largo y el punto final de referencia es PR01+800 a 1,80 km de Rancho Largo. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.

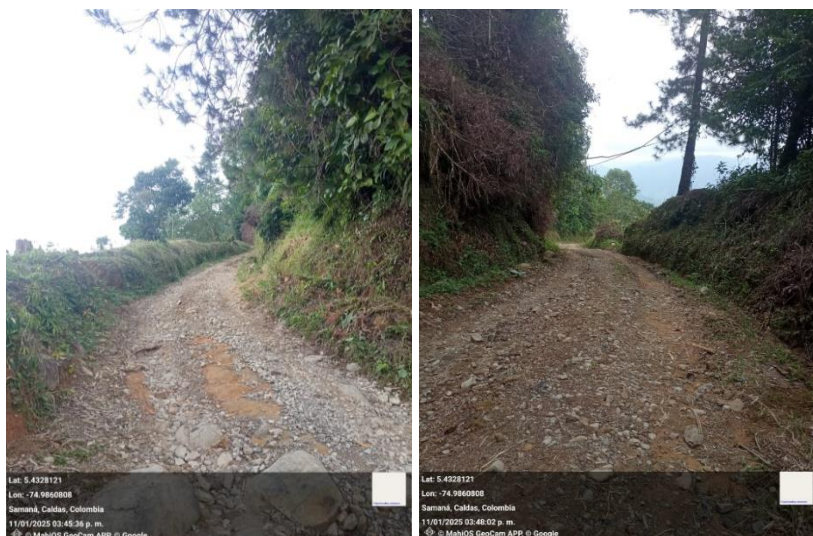


Ilustración 26. Estado inicial de la vía

67.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

68 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

68.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495606
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL
NIT.	810.003.125-4
TELÉFONO:	3145160617
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2175-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024				
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE SAMANA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.355.760,00 M/CTE				
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE				
VALOR TOTAL:	\$201.355.760,00 M/CTE				
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE				
ESTADO:	FINALIZADO				
FECHA DE INICIO:	02/09/2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024				
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24				
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/5/25				
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2025				
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ				
GARANTÍAS					
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330907 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083401					
Amparos		Valor Asegurado		Vigencias	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2					
Cumplimiento		\$20.135.576,00	02/09/2026	30/04/2026	
Prestaciones sociales		\$10.067.788,00	02/09/2026	30/04/2028	
Estabilidad de la obra		\$40.271.152,00	30/04/2025	30/04/2030	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2					
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios		\$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025	

Patronal			
----------	--	--	--

Tabla 20 . Información general del Convenio 2175-2024 Municipio Samaná.

68.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

68.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para este periodo.

68.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,03 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,77 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,38 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 282,73 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

68.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

68.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	201.355.760,00
Ejecutado	100%	96,6%	194.495.267,00
Avance / Retraso	0%	- 3.4%	- 6.860.493,00

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	86,63	81,05
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,26
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3713,57

69 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

69.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

69.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo.

69.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Francy Elena Aristizábal González
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	Diego Márquez

Tabla 21 Personal Convenio Solidario

El personal y control de aportes a seguridad social del Contrato de Obra se relaciona en el formato MEP-MN1-IN-15-FR-6. Ver Anexo 10.4.

69.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 49.011.104 de fecha 10/02/2025.
- Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 4.608.800 de fecha 25/02/2025.
- Desembolso 04 aprobado por valor de \$ 13.160.254 de fecha 06/03/2025.
- Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 6.353.724 de fecha 10/03/2025.
- Desembolso 06 aprobado por valor de \$ 5.870.860,00 de fecha 15/03/2025.
- Desembolso 07 aprobado por valor de \$ 14.360.988,00 de fecha 26/03/2025.
- Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 17.669.304,25 de fecha 28/03/2025.
- Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 3.814.199,90 de fecha 31/03/2025.
- Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 23.658.441,47 de fecha 14/04/2025.
- Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 27.406.000,26 de fecha 02/05/2025.
- Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 11.900.403,36 de fecha 27/05/2025.
- Desembolso 16 aprobado por valor de \$ 8.353.704,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 186.110.842,71 correspondiente al 93% del valor del convenio. Ver Anexo 10.3

69.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

69.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

69.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 10.1.

El OAC al corte del periodo no presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2175 de 2024.

69.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

69.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

69.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

69.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Prog.	% completado
☒ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	57 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin clasificar	1 día	lun 13/01/25	mar 14/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	mar 14/01/25	mié 5/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21MPa (Clase D) - Mezcla in situ para placa huella	35 días	jue 13/02/25	mié 9/04/25	100%	100%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% piedra para placa huella	30 días	lun 24/02/25	vie 11/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	30 días	jue 6/02/25	mar 25/03/25	100%	100%

69.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de \$201.355.760,00; la Inversión Ejecutada fue de \$194.495.267,00. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$6.860.493,00.

69.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

69.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

70 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

70.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

70.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-911-2606 de fecha 3/7/25, remitió a la JAC los formatos de cierre ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-924-2631 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-945-2605 de fecha 7/7/25, remitió a la JAC los formatos de cierre social.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-1031-2869 de fecha 21/7/25, remitió a la JAC el recibo de obra física.

70.1.2 Actividades Técnicas

El día 2 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el balance final de las partes JAC e Interventoría. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Revisar por parte de la JAC algunas inconsistencias contables.

El día 12 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se verificó el cumplimiento de los compromisos del comité 14. Se llegó a la conciliación final.

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 16 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 19 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 17 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó los documentos presentados por la JAC y se socializó el plan de compras con el pago de la nómina y de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de los documentos soporte para orden de desembolso.

El día 28 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 18 con presencia de JAC vereda Naranjal Samaná e Interventoría, donde se informó a la JAC, el estado de las ordenes de desembolsos y los pagos pendientes debidos a temas de falta de subsanación a observaciones de la Interventoría.

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,03 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 1 ml, cantidad ejecutada: 0,77 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 6,17 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,38 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 282,73 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.

70.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2175 DE 2024 MUNICIPIO DE SAMANÁ

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de julio 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría se encuentra a la espera del el soporte del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de mayo y junio 2025.

71 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,6% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 81,05 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 27,26 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 147 ml, cantidad ejecutada: 3.713,57 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 194.495.267,00 correspondiente al 96,6 % del valor del convenio.

72 ANEXO

72.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

72.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

72.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

72.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2227-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	217
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	218
1	INTRODUCCIÓN		220
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		222
2.1	Localización		222
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		223
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		223
2.4	Características técnicas del proyecto		224
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		224
3.1	Información general del contrato		225
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		226
3.3	Seguimiento Items no previstos		226
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		226
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		227
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	712
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	728
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	721
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		228
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		228
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	229
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		229
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		230
7	Conclusiones y recomendaciones		230
8	Anexos		231
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	
			VERSION	
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CALDAS	PERIODO MES:	Jul-25	FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)
-------------------	------------------------------	------------------------	--------	--------------	--------	-------	---------------------------------

CONVENIO No.:	2227-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/24	VALOR INICIAL :	\$ 202.682.607,00
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES:	\$ -
CONTRATISTA:	JAC VEREDALA LINDA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 202.682.607,00
		FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
		FECHA PRORROGA 02:	28/04/2025		
		FECHA PRORROGA 02:	30/05/2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/05/2025		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025		
		PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS		
		FECHA DE REINICIO:	19/06/2025		
		PLAZO PRORROGA 03:	18/06/2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025		
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333,00		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	3601-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CCSO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
----------------------------	-----------	--------------	----------------	---	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación Mejoramiento	ml	146,00		Pavimentación Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras Alcantarillas				Estructuras Alcantarillas			
Mantenimiento Muro de Contención				Mantenimiento Muro de Contención			
Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)			

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES	
	VALOR		VALOR
OBRAS	152.207.048,00	OBRAS	81.942.717,16
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.566.211,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.409.348,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.501.264,71
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	201.182.607,00	VALOR EJECUTADO	91.443.981,87

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 202.682.607,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 196.616.396,65
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	97,01%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025	FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 28/03/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	

Firma	
Nombre: BIBIANA PATERNINA,	
Director de Interventoría	
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.	
Copias: Interventoría, Dirección Territorial	

CONVENIO SOLIDARIO No. 2227-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA LA LINDA

73 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Linda, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2227 de 2024 de fecha 05 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA LINDA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$202.682.607,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 14 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

74 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

74.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado La Linda – San Daniel, con longitud total de 0,260 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella.



Ilustración 27 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

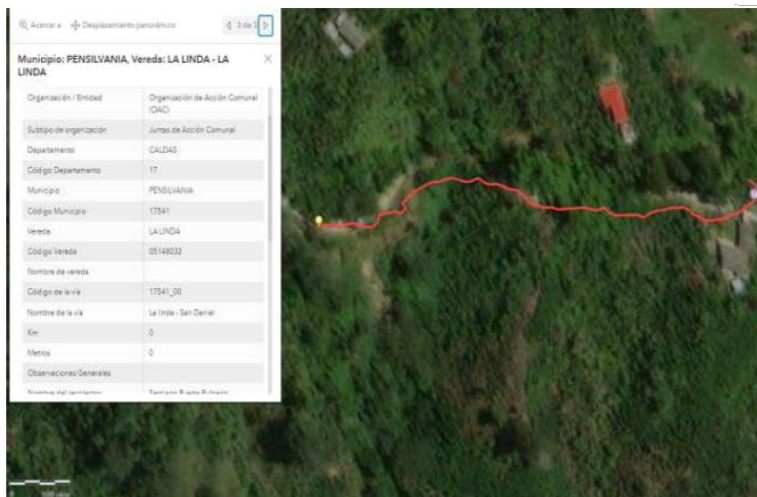


Ilustración 28 Localización vía a Intervénir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

74.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Linda, en el corredor vial denominado La Linda - San Daniel, del Municipio de Pensilvania.

74.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

Entre la vía que comunica la vereda La Linda y corregimiento de San Daniel tiene una longitud de 0,26 Km de corredor asignado. el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 en la casa de la señora Fabiola Restrepo en el sector La Peña, y el punto final de referencia es el PR 0+260 de la vía terciaria que conduce al corregimiento de San Daniel. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 29. Estado inicial de la vía

74.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

75 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

75.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6503181
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA
NIT.	901.012.910-8
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2227-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$202.682.607,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$202.682.607,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24		
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25		
SUSPENSIÓN NO. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LINDA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331373 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083569			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.268.261,00	05/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.134.131,00	05/07/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.536.522,00	31/12/2024	30/04/2030

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	05/07/2024	30/05/2025

Tabla 22 Información general del Convenio 2227-2024 Municipio Pensilvania.

75.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

75.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/07/25, solicitó el plan de compras 8 aprobado.
- Se realizó comité operativo no. 9, el días 18/7/25.

75.2.2 Actividades Técnicas

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

75.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

75.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	202.682.607,00
Ejecutado	100%	97,01%	196.616.396,65
Avance / Retraso	0%	-2,99%	- 6.066.210,35

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETTA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,31	4,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	111,69	111,69
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	80,29	80,29
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	27,45	27,45
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.969,12	3.969,12

76 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

76.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 11.1.

76.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Erick Fernando Colmenares Quesada
Contador	Laura María Botero Betancurt

Tabla 23 Personal Convenio Solidario

76.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 28.185.246 de fecha 10/01/2025.
- Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 30.413.058 de fecha 22/01/2025.
- Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 12.533.588 de fecha 04/02/2025.

4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$ 9.677.355 de fecha 11/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 144.600 de fecha 17/02/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de \$ 42.707.477 de fecha 26/02/2025.
7. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 8.670.450 de fecha 11/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 1.099.373,18 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 12.923.150,00 de fecha 08/04/2025.
10. Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 6.800.806,00 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 39.045.088,99 de fecha 27/05/2025.
12. Desembolso 16 aprobado por valor de \$ 4.555.500,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 196.755.691,57 correspondiente al 97% del valor del convenio. Ver Anexo 11.4

76.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

76.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 11.2.

Se encuentra pendiente las pólizas y respectivas resoluciones de aprobación por parte EL INSTITUTO de las últimas novedades contractuales.

76.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

76.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

76.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

76.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA LINDA			ACTIVIDADES ACUMULADAS				
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETÁ			LONG. EJEC	CANT. PROG.	CANT. EJEC.	% PROG.	% EJEC.
1	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	146,00	4,31	4,31	100%	100%
2	320.3	Subbase Granular Clase C	146,00	111,69	111,69	100%	100%
3	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	146,00	80,29	80,29	100%	100%
4	630.1.7	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	146,00	27,45	27,45	100%	100%
5	640.10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	146,00	3.969,12	3.969,12	100%	100%

76.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

No aplica, obra finalizada el 28/03/25.

76.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

76.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

77 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

77.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

77.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-928-2635 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1001-2794 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1035-2879 de fecha 22/7/25, remitió a Corpocaldas solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1023-2848 de fecha 18/7/25, solicitó a la JAC documentos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1054-2941 de fecha 25/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.
- Se realizó comité operativo no. 9, el días 18/7/25.

77.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el

estado de avance y se expuso el plan de compras que requiere aprobación, relacionado con el pago de la nómina de los trabajadores, seguridad social y alquiler de la rana, el cual fue aprobado. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de soportes plan de compras OPC.

77.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2227 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios del periodo de Julio 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos del mes de enero 2025 al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

78 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 28/03/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 97,01% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 4,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 111,69 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 80,29 m3. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 27,45 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) longitud ejecutada: 148 ml, cantidad ejecutada: 3.969,12.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 196.616.396,65 correspondiente al 97,01% del valor del convenio.
- A pesar de haberse obtenido la No Objeción de la OPC por parte del Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, el OAC se demoró en presentar los documentos en debida forma y con la completitud necesaria que permitiera a esta Interventoría aprobar el desembolso para ejecutar la OPC.

79 ANEXO

79.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

79.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

79.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

79.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2140-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	233
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	234
1	INTRODUCCIÓN		236
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		238
2.1	Localización		238
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		239
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		239
2.4	Características técnicas del proyecto		240
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		240
3.1	Información general del contrato		240
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		242
3.3	Seguimiento Items no previstos		242
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		242
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		243
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	732
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	748
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	741
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		244
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		245
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	245
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		245
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		246
7	Conclusiones y recomendaciones		246
8	Anexos		247
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO																																				
				VERSION																																				
				PAGINA																																				
					FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: Jul-25																																				
CONVENIO No.: 2140-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL : \$ 201.393.774,00																																				
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONALES: \$ -																																				
CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA RITA		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 201.393.774,00																																				
		FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																				
		PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																				
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025																																						
		FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025																																						
		PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025																																						
		FECHA DE TERMINACIÓN : 30/05/2025																																						
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025																																						
		PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS																																						
		FECHA DE REINICIO: 19/06/2025																																						
		PLAZO PRORROGA 03: 18/06/2025																																						
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 18/06/2025																																						
		FECHA DE TERMINACIÓN: 1/08/2025																																						
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 333,00																																						
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LILIANA TIBATA																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																				
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación Mejoramiento</td><td>ml</td><td>137,00</td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Mejoramiento	ml	137,00	Estructuras Alcantarillas			Mantenimiento Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación Mejoramiento</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Muro de Contención</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Mejoramiento	ml	-	-	Estructuras Alcantarillas				Mantenimiento Muro de Contención				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																						
Pavimentación Mejoramiento	ml	137,00																																						
Estructuras Alcantarillas																																								
Mantenimiento Muro de Contención																																								
Otros (Especificar cuales)																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																					
Pavimentación Mejoramiento	ml	-	-																																					
Estructuras Alcantarillas																																								
Mantenimiento Muro de Contención																																								
Otros (Especificar cuales)																																								
AVANCE FINANCIERO																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																						
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>150.727.480,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.521.824,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>44.644.470,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>199.893.774,00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	150.727.480,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.521.824,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.644.470,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.893.774,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>408.277,52</td><td>157.747.697,13</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>2.223.523,00</td><td>40.076.019,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>2.631.800,52</td><td>197.823.716,13</td></tr></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	408.277,52	157.747.697,13	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.223.523,00	40.076.019,00	VALOR EJECUTADO	2.631.800,52	197.823.716,13												
	VALOR																																							
OBRAS	150.727.480,00																																							
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.521.824,00																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.644.470,00																																							
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.893.774,00																																							
	VALOR	ACUMULADO																																						
OBRAS	408.277,52	157.747.697,13																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.223.523,00	40.076.019,00																																						
VALOR EJECUTADO	2.631.800,52	197.823.716,13																																						
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																								
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 201.393.774,00		3																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 197.823.716,13		5																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98,23%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																																						
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 14																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																								
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 23/04/25		FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 23/04/25																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																								
<div><div>Firma</div><div>Nombre: BIBIANA PATERNINA</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																								

CONVENIO SOLIDARIO No. 2140-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA SANTA RITA

80 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Santa Rita, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2140 de 2024 de fecha 02 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SANTA RITA** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL por un valor de \$201.393.774,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 15 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

81 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

81.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manizales, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Santa Rita, con longitud total de 0,69 km, de los cuales se intervendrán 135 ml de placa huella.



Ilustración 30 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

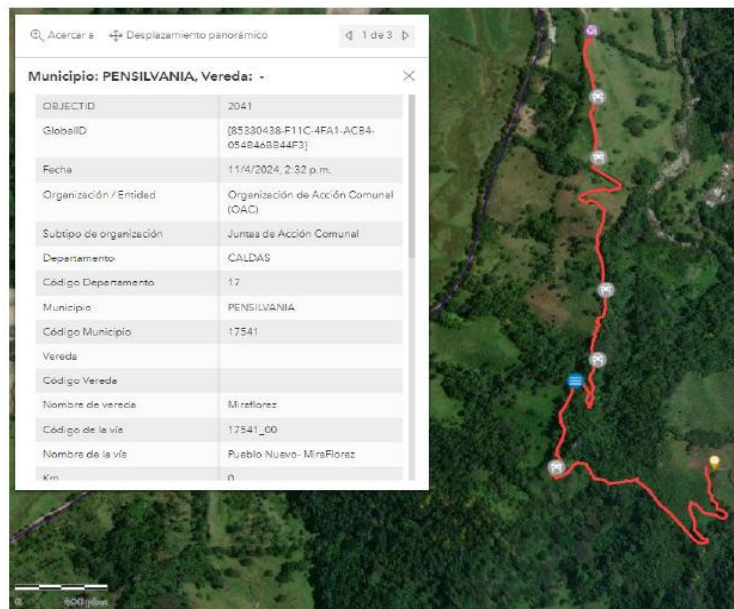


Ilustración 31 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVÍAS

81.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Santa Rita, en el corredor vial denominado Santa Rita Baja, del Municipio de Pensilvania.

81.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El corredor vial denominado Santa Rita Baja tiene una longitud de 0,69 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0+000 es ramal derecho hacia la Vereda Santa Rita, y el punto final de referencia el PR 0 +690 de la vía departamental que conduce al municipio de Samaná. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 32. Estado inicial de la vía

81.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 135 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

82 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

82.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6490694
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA
NIT.	901.013.047-0
TELÉFONO:	3116428232
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2140-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.393.774,00 M/CTE				
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE				
VALOR TOTAL:	\$201.393.774,00 M/CTE				
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE				
ESTADO:	EN EJECUCIÓN				
FECHA DE INICIO:	02/09/2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024				
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24				
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25				
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25				
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25				
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25				
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025				
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ				
GARANTÍAS					
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330666 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083305					
Amparos		Valor Asegurado		Vigencias	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2					
Cumplimiento		\$20.139.378,00	02/07/2024	30/04/2026	
Prestaciones sociales		\$10.069.689,00	02/07/2024	30/04/2028	
Estabilidad de la obra		\$40.278.755,00	31/12/2024	30/04/2030	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2					
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal		\$260.000.000,00	02/07/2024	30/04/2025	

82.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

82.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/07/25, remitió la solicitud de desembolso no. 8 (cuentas por pagar), para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correos electrónicos de fecha 29/7/25, remitió la solicitud de desembolso no 8 y 9.

82.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

82.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

82.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, sin embargo, no cuenta con Acta de Inicio Suscrita para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	201.393.774,00

Ejecutado	100%	98,23%	197.823.716,13
Avance / Retraso	0%	- 1,77%	- 3.570.057,87

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETTA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,95	4,27
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	103,28	111,7
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	79,34	81,81
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	25,06	27,1
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.652,46	3766,09

83 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

83.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 12.1.

83.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

83.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Alberto Navarro Aristizábal
Contador	Laura María Botero Betancurt

Tabla 25 Personal Convenio Solidario

83.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 50.347.996 de fecha 22/01/2025.
2. Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 11.041.270 de fecha 5/02/2025.
3. Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 8.496.904 de fecha 13/02/2025.
4. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 47.615.438 de fecha 28/02/2025.
5. Desembolso 06 aprobado por valor de \$ 12.475.326 de fecha 13/03/2025.
6. Desembolso 07 aprobado por valor de \$ 11.617.026,00 de fecha 02/04/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 16.946.782,00 de fecha 25/04/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 2.314.200,00 de fecha 06/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 160.854.941,83 correspondiente al 79% del valor del convenio. Ver Anexo 12.4

83.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

83.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

83.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 12.2.

El OAC al corte del periodo no presentó las pólizas de las últimas novedades contractuales.

83.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

83.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

83.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

83.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
1	✓	CONVENIO 2140 - 2024	59 días	mar 14/01/25	sáb 22/03/25	100%	100%
2	✓	ETAPA REVISION	6 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
3	✓	Preliminares	6 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	100%	100%
4	✓	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	53 días	lun 20/01/25	sáb 22/03/25	100%	100%
5	✓	Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	lun 20/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
6	✓	Subbase Granular Clase C	30 días	lun 27/01/25	dom 2/03/25	100%	100%
7	✓	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezola in situ	30 días	dom 16/02/25	sáb 22/03/25	100%	100%
8	✓	Concreto Cidlopeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	sáb 8/02/25	vie 14/03/25	100%	100%
9	✓	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	jue 13/02/25	vie 14/03/25	100%	100%

83.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 201.393.774,00; la Inversión Ejecutada fue de 197.823.716,13. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 3.570.057,87.

83.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

83.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

84 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

84.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

84.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-919-2626 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-956-2729 de fecha 11/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.

84.1.2 Actividades Técnicas

El día 22 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 08 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se presentó el balance final de las partes JAC e Interventoría. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Revisar por parte de la JAC algunas inconsistencias contables.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 9 con presencia de JAC vereda Santa Rita, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se verificó el cumplimiento de los compromisos del comité 8. Se llegó a la conciliación final.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 4,27 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

84.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2140 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de agosto 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no recibimos los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de agosto a diciembre 2024 y marzo 2025.

85 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 98,23% hasta el corte del presente periodo. Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 146 ml,

cantidad ejecutada: 4,27 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 111,7 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 81,81 m3. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 27,1 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 146 ml, cantidad ejecutada: 3.766,09 kg.

- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 197.823.716,13 correspondiente al 98,23% del valor del convenio.
- Que desde el 28 de marzo de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo, transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

85.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

85.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

85.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

85.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2077-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERDAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	249
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	250
1	INTRODUCCIÓN		252
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		254
2.1	Localización		254
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		255
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		255
2.4	Características técnicas del proyecto		256
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		256
3.1	Información general del contrato		256
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		257
3.3	Seguimiento Items no previstos		258
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		258
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		259
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	751
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	767
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	760
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		260
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		260
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	261
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		261
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		262
7	Conclusiones y recomendaciones		263
8	Anexos		263
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP/INV-N-15-PR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 0077-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENINSILVANA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERDAL

PLAZO INICIAL: 19957A EL 31/12/25
FECHA DE INICIO: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19957A EL 31/12/25
FECHA DE PRORROGA 01: 29/12/2024
PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 30/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 29/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS
FECHA DE RENICIO: 30/06/2025
PLAZO PRORROGA 03: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 339.00

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 1,990,000.00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 1,990,000.00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 8607-2024 INTERVENTOR: CONSULTORÍA CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUANITA BATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m2
	Mejoramiento	126.00
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und
		-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m2	-
	Mejoramiento	-	-
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
		-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.143.922.85
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.317.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.477.361.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.155.580.85

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	3.922.651	154.153.769.62
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.613.138.21	34.924.931.00
VALOR EJECUTADO	7.535.789.36	189.078.700.71

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 200.655.581.00.
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 189.078.700.71.
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 94.23%.

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA EL VERDAL
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 16/04/2025



VEREDA EL VERDAL
FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 16/04/2025

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BIBIANA PATEJENNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor/ Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2077-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”,



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA EL VERDAL

86 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verdal, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2077 de 2024 de fecha 27 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA EL VERDAL** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.655.581,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 04 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

87 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

87.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus, con longitud total de 0,51 km, de los cuales se intervendrán 126 ml de placa huella.



Ilustración 33 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

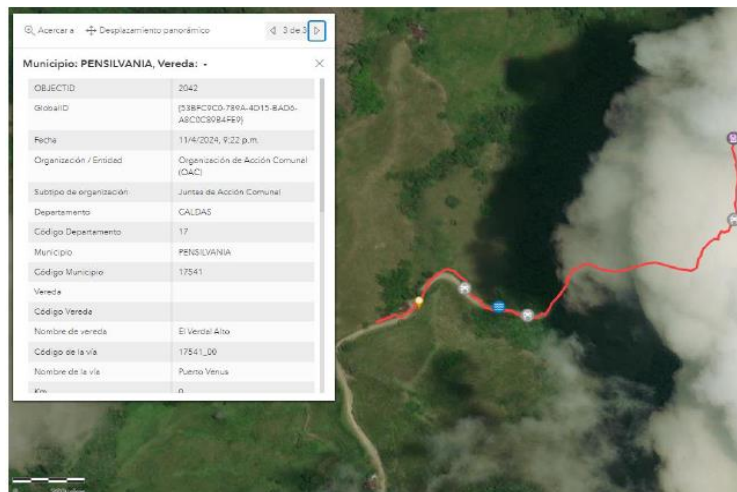


Ilustración 34 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

87.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Puerto Venus – Arboleda Sector La Virgen, del Municipio de Pensilvania.

87.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda El Verdal, en el corredor vial denominado Arboleda – Verdal – Puerto Venus con una longitud de 0,51 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 000 paradero veredal y el punto final de referencia es PR 0 + 510 Sector la Virgen. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con afirmado.



Ilustración 35. Estado inicial de la vía

87.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 126 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

88 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

88.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6473161
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VERDAL
NIT.	901.100.395.-1
TELÉFONO:	3146199020
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2077-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.655.581,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$200.655.581,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	03/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERDAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100329886 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083028			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 4			
Cumplimiento	\$20.065.559,00	23/12/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.032.781,00	23/12/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.131.117,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	27/06/2024	30/04/2025

Tabla 26 Información general del Convenio 2077-2024 Municipio Pensilvania.

88.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

88.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/07/25, remitió oficio de Corpocaldas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/07/25, remitió la solicitud de desembolso del pago de póliza, para revisión y aprobación.

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/07/25, remitió oficio de Corpocaldas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, remitió la cuenta de cobro del maestro.
- Los días 11/7/25 y 17/7/25, se realizó el comité operativo no. 14 y 15, con el fin de tratar el tema de la OPC.

88.2.2 Actividades Técnicas

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

88.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

88.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo, cuenta con Acta de Inicio Suscrita de fecha 4/2/25 para la etapa de obras. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	200.655.581,00
Ejecutado	100%	94,23%	189.078.700,71
Avance / Retraso	0%	5,77%	-11.576.880,29

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	3,67	3,79
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	96,39	99,45
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	76,96	79,40
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	23,28	20,94
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	3.553,97	3.666,79

89 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

89.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 13.1.

89.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

89.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-049-4905 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Miguel Eduardo Jaramillo Villa
Contador	Jhon Fredy Rivas

Tabla 27 Personal Convenio Solidario

89.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

1. Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 52.452.837 de fecha 6/02/2025.
2. Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 5.527.000 de fecha 26/02/2025.
3. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 10.934.800 de fecha 26/02/2025.
4. Desembolso 06 aprobado por valor de \$ 43.572.000 de fecha 26/02/2025.
5. Desembolso 07 aprobado por valor de \$ 6.890.860 de fecha 14/03/2025.
6. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 359.800,00 de fecha 28/03/2025.
7. Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 16.648.400,00 de fecha 26/03/2025.
8. Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 6.890.860,00 de fecha 14/04/2025.
9. Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 13.555.891,00 de fecha 06/05/2025.
10. Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 35.656.560,43 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 192.489.008,68 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 14.4

89.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

89.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

89.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 13.2.

El OAC al corte del periodo se encuentra pendiente la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente las últimas novedades contractuales.

89.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

89.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

89.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

89.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% prog	% completado
CONVENIO 2077 - 2024	79,63 días	mar 21/01/25	mar 22/04/25	100%	100%
ETAPA REVISION	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
Preliminares	5 días	mar 21/01/25	dom 26/01/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	74,63 días	lun 27/01/25	mar 22/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	12 días	lun 27/01/25	dom 9/02/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	20 días	dom 2/02/25	mar 25/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	40 días	lun 3/03/25	jue 17/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (G)	29 días	jue 20/03/25	mar 22/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	lun 10/02/25	mar 11/03/25	100%	100%

89.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de \$200.655.581,00; la Inversión Ejecutada fue de \$189.078.700,71. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de \$11.576.880,29.

89.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

89.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

90 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

90.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

90.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-912-2607 de fecha 3/7/25, remitió a la JAC los formatos de cierre ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-915-2622 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-957-2730 de fecha 11/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.
- Los días 11/7/25 y 17/7/25, se realizó el comité operativo no. 14 y 15, con el fin de tratar el tema de la OPC.

90.1.2 Actividades Técnicas

El día 2 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de plan de compras corregido 2. Envío de soportes

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de plan de compras corregido 2. Envío de soportes

El día 9 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda El Verdal, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de soportes

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.

90.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2077 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional del periodo de julio a diciembre 2024.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

91 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 16/04/25.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 94,23% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3,79 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 99,45 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 79,4 m3. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 20,94 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 130 ml, cantidad ejecutada: 3.666,79 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 189.078.700,71 correspondiente al 94,23% del valor del convenio.
- Que desde el 10 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

92 ANEXO

92.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

92.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

92.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

92.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2169-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLORES

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	265
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	266
1	INTRODUCCIÓN		268
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		270
2.1	Localización		270
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		271
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		271
2.4	Características técnicas del proyecto		272
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		272
3.1	Información general del contrato		272
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		274
3.3	Seguimiento Items no previstos		275
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		275
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		276
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	770
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	786
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	779
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		277
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		277
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	278
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		278
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		280
7	Conclusiones y recomendaciones		280
8	Anexos		281
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEP/AM/N-15-FR-2																																				
			VERSION	1																																				
			PAGINA																																					
			FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: 36.00																																				
CONVENIO No.: 2169-2024																																								
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENÍNSULA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2024 FECHA DE INICIO: 3/09/2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/2024 FECHA DE PRORROGA 01: 26/12/2024 PLAZO PRORROGA 01: 4/05/2025 FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025 FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025 PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025 FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 02: 29/05/2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 21/06/25 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 30/05/2025 FECHA DE RENICIO: 30/05/2025 PLAZO PRORROGA 03: 30/05/2025 FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 30/05/2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 1/09/2025 PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 311.00																																						
OAC: JAC. VEREDA MIRAFLORES		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.154.007,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$. VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.154.007,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$. ANTICIPO AMORTIZADO: \$.																																						
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3891-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ ULIANA TIBATA																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																								
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>ml</td><td>151,00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td></tr></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	ml	151,00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras			Túneles			Puentes			Mantenimiento			Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und -									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																						
Pavimentación	ml	151,00																																						
Mejoramiento																																								
Rehabilitación																																								
Estructuras																																								
Túneles																																								
Puentes																																								
Mantenimiento																																								
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und -																																						
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																								
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td><td>-</td></tr></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	ml	-	-	Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras				Túneles				Puentes				Mantenimiento				Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und -	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																					
Pavimentación	ml	-	-																																					
Mejoramiento																																								
Rehabilitación																																								
Estructuras																																								
Túneles																																								
Puentes																																								
Mantenimiento																																								
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und -	-																																					
AVANCE FINANCIERO																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																						
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>151.039.601,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.031.189,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>44.083.216,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.154.007,00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	151.039.601,00	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.031.189,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.083.216,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.154.007,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>11.150.065</td><td>141.036.979,47</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>21.336.134,29</td><td>44.014.287,43</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>32.486.199,11</td><td>165.051.266,89</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	11.150.065	141.036.979,47	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.336.134,29	44.014.287,43	VALOR EJECUTADO	32.486.199,11	165.051.266,89											
	VALOR																																							
OBRAS	151.039.601,00																																							
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.031.189,00																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.083.216,00																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.154.007,00																																							
	VALOR	ACUMULADO																																						
OBRAS	11.150.065	141.036.979,47																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.336.134,29	44.014.287,43																																						
VALOR EJECUTADO	32.486.199,11	165.051.266,89																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																								
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$. 201.154.007,00		0,00																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$. 165.051.266,89		MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 81,99%		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7																																						
		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1																																						
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10																																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																								
																																								
VEREDA MIRAFLORES FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24		VEREDA MIRAFLORES FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 15/05/24																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																								
Firma Nombre: BIBIANA PATERNINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 082053024 ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Técnica																																								

CONVENIO SOLIDARIO No. 2169-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS

VEREDA MIRAFLORES

93 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Miraflores, el municipio de PENSILVANIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2169 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA MIRAFLORES** DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.154.007,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 26 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 10 de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

94 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

94.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Pensilvania se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Sonsón y Nariño, al oriente con Samaná, al sur con Marquetalia y Manzanares, y al occidente con Aguadas, Salamina y Marulanda. Se sitúa a 145 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Miraflores, con longitud total de 1,4 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.

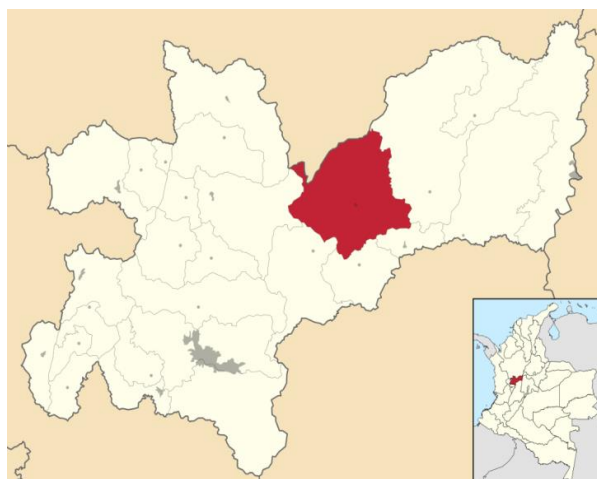


Ilustración 36 Localización del municipio de Pensilvania (Caldas).

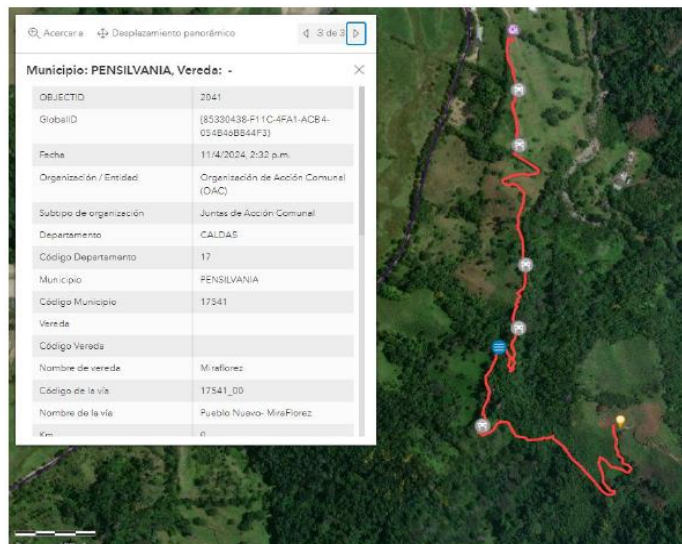


Ilustración 37 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

94.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Miraflores, en el corredor vial denominado Pueblo Nuevo – Mira Flores, del Municipio de Pensilvania.

94.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto se va a desarrollar en la zona rural del Municipio de Pensilvania del departamento de Caldas en la vereda Miraflores, en el corredor vial veredal de Miraflores (Pueblo Nuevo – Miraflores) entre la vereda Miraflores y el corregimiento de Pueblo Nuevo con una longitud de 1,40 km, el punto de inicio de referencia PR 0+000 estación de policía Pueblo Nuevo y el punto final de referencia PR 1 + 400 desde la estación de policía hacia la vía que conduce a la Vereda Miraflores. El estado regular de la vía es generalizado está en su mayoría con terreno natural.



Ilustración 38. Estado inicial de la vía

94.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

95 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

95.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495431
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MIRAFLORES
NIT.	901.013.051-0
TELÉFONO:	3219504476
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2169-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

	PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.154.007,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.154.007,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	03/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 26/12/24		
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25		
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MIRAFLORES toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330924 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083407			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.115.401,00	03/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.057.701,00	03/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.230.802,00	30/04/2025	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 3			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$260.000.000,00	03/07/2024	30/04/2025

Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal			
--	--	--	--

Tabla 28 Información general del Convenio 2169-2024 Municipio Pensilvania.

95.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

95.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 18/07/25 y 24/7/25, remitió la solicitud de desembolso de la OPC, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/07/25, remitió la solicitud de desembolso de la póliza, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 18/07/25, remitió la solicitud de desembolso del reintegro de los rendimientos financieros, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 25/7/25, remitió los paz y salvo solicitados.
- Se realizó comité operativo no. 14, el días 21/7/25.

95.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 21,26 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 978,99 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

95.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

95.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	201.154.007,00
Ejecutado	100%	91,99%	185.051.266,89
Avance / Retraso	0%	- 8,01%	- 16.102.740,11

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,41	4,12
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	115,52	107,87
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	100%	100%	91,70	85,63

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,05	26,19
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.223,65	3943,94

96 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

96.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 14.1.

96.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

96.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP-555-045-4901 de fecha 20 de noviembre de 2024.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Javier Alfonso Agudelo
Contador	Jhon Fredy Rivas Ortiz

Tabla 29 Personal Convenio Solidario

96.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 33.767.250 de fecha 14/02/2025.
- Desembolso 04 aprobado por valor de \$ 31.761.019 de fecha 18/02/2025.
- Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 1.839.500 de fecha 08/03/2025
- Desembolso 06 aprobado por valor de \$9.761.760 de fecha 08/03/2025.
- Desembolso 07 aprobado por valor de \$ 6.890.860,00 de fecha 15/03/2025.
- Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 19.624.364,33 de fecha 26/03/2025.
- Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 31.352.100,01 de fecha 09/04/2025.

10. Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 8.086.810,00 de fecha 09/04/2025.
11. Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 400.000,00 de fecha 10/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de \$ 40.720.859,24 de fecha 02/05/2025.
13. Desembolso 16 aprobado por valor de \$ 7.943.681,00 de fecha 27/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 192.148.203,56 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 14.4

96.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

96.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

96.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 14.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente a las últimas novedades contractuales.

96.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

96.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

96.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

96.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% programado	% completado
☐ CONVENIO 2169 - 2024	46 días	lun 10/02/25	jue 3/04/25	100%	100%
☐ ETAPA REVISION	6 días	lun 10/02/25	dom 16/02/25	100%	100%
Preliminares	6 días	lun 10/02/25	dom 16/02/25	100%	100%
☐ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	40 días	dom 16/02/25	jue 3/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	10 días	sáb 22/02/25	mié 5/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	30 días	dom 16/02/25	dom 23/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	30 días	lun 24/02/25	lun 31/03/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	30 días	vie 28/02/25	jue 3/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	25 días	sáb 22/02/25	dom 23/03/25	100%	100%

96.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 201.154.007,00; la Inversión Ejecutada fue de 185.051.266,89. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión de \$16.102.740,11.

96.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

96.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

97 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

97.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

97.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-921-2628 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-958-2731 de fecha 11/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-998-2791 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.

- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1058-2945 de fecha 25/7/25, remitió a la JAC los formatos ambientales.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1068-2992 de fecha 29/7/25, remitió al INVIAS el cierre ambiental.
- Se realizó comité operativo no. 14, el día 21/7/25.

97.1.2 Actividades Técnicas

El día 21 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 11 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y aprobación de plan de compras para desembolsos con los pagos de nómina. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: Envío de documentos soporte para el desembolso.

El día 23 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 12 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde las partes presentaron el balance final del Proyecto. Se establecieron los siguientes compromisos:

1. Ajustar inconsistencias contables

El día 26 de abril de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda Miraflores, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde las partes presentaron el balance final del Proyecto. Se llegó a conciliación final.

Desde el 1 al 13 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 21,26 m³.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 37 ml, cantidad ejecutada: 978,99 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m³.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.

97.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2169 DE 2024 MUNICIPIO DE PENSILVANIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Julio 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional de los meses de julio 2024 a enero 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

98 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 13 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 91,99% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 4,12 m³. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 107,87 m³. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 85,63 m³. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 26,19 m³. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 141 ml, cantidad ejecutada: 3.943, 94 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 185.051.266,89 correspondiente al 91,99% del valor del convenio.

- Que desde el 15 de abril de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

99 ANEXO

99.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

99.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

99.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

99.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2200-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	283
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	284
1	INTRODUCCIÓN		286
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		288
2.1	Localización		288
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		289
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		289
2.4	Características técnicas del proyecto		290
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		290
3.1	Información general del contrato		291
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		292
3.3	Seguimiento Items no previstos		293
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		293
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		294
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	790
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	802
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	799
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		295
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		295
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	296
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		297
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		298
7	Conclusiones y recomendaciones		299
8	Anexos		299
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																				
			VERSION																																				
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		PÁGINA																																				
			FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: jul-25																																			
CONVENIO No.: 2200-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24		VALOR INICIAL : \$ 200.555.145,00																																			
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONALES: \$ -																																			
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024																																					
CONTRATISTA: JAC VEREDA LA HABANA		FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200.555.145,00																																			
		PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																			
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																			
		FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025																																					
		PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025																																					
		FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025																																					
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025																																					
		PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS																																					
		FECHA DE REINICIO: 19/06/2025																																					
		PLAZO PRORROGA 03: 18/06/2025																																					
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 1/08/2025																																					
		FECHA DE TERMINACIÓN: 1/08/2025																																					
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 240,00																																					
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LILIANA TIBATÁ																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																					
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Muro de Contención</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Mejoramiento	ml	Estructuras	Alcantarillas		Mantenimiento	Muro de Contención		Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>-</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	Estructuras	Alcantarillas			Mantenimiento	Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																					
Pavimentación	Mejoramiento	ml																																					
Estructuras	Alcantarillas																																						
Mantenimiento	Muro de Contención																																						
Otros (Especificar cuales)																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																				
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-																																				
Estructuras	Alcantarillas																																						
Mantenimiento	Muro de Contención																																						
Otros (Especificar cuales)																																							
AVANCE FINANCIERO																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																					
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>150.982.674,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.529.480,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.542.991,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>199.055.145,00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	150.982.674,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.055.145,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td><td>150.982.674,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>5.218.232,17</td><td>42.380.178,50</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>5.218.232,17</td><td>193.362.852,50</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS		150.982.674,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.218.232,17	42.380.178,50	VALOR EJECUTADO	5.218.232,17	193.362.852,50										
	VALOR																																						
OBRAS	150.982.674,00																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.529.480,00																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.542.991,00																																						
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.055.145,00																																						
	VALOR	ACUMULADO																																					
OBRAS		150.982.674,00																																					
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.218.232,17	42.380.178,50																																					
VALOR EJECUTADO	5.218.232,17	193.362.852,50																																					
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																							
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 200.555.145,00		MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 193.362.852,50		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4																																					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 96,41%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																																					
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12																																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																							
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025		FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 10/05/2025																																					
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																							
<div><div>Firma</div><div>Nombre: BIBIANA PATERNINA</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																							

CONVENIO SOLIDARIO No. 2200-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”



MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS

VEREDA LA HABANA

100 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda La Habana, el municipio de BELALCÁZAR, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2200 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA LA HABANA** DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.555.145,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 23 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

101 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

101.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Belalcázar se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con San José y Risaralda, al oriente con Risaralda, al sur con Risaralda, y al occidente con Viterbo y San José. Se sitúa a 65 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado LA HABANA – LAS PAVAS, con longitud total de 0,24 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella.



Ilustración 39 Localización del municipio de Belalcázar (Caldas).

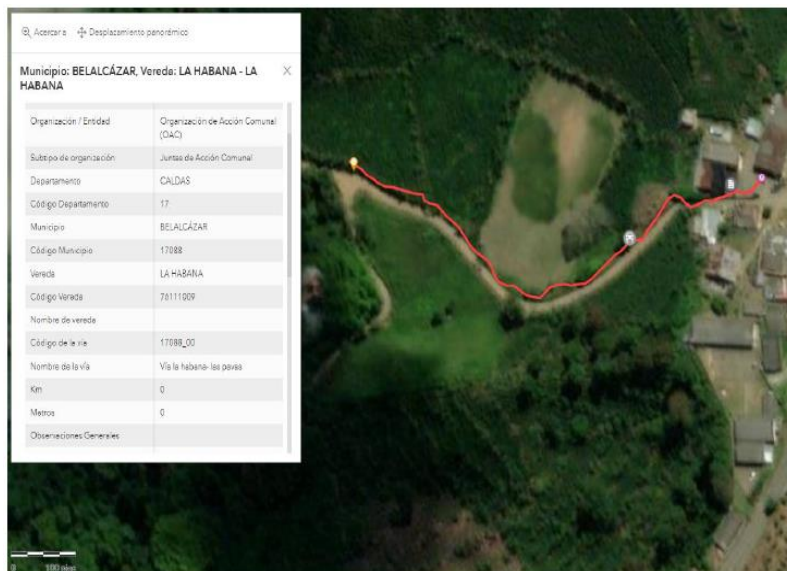


Ilustración 40 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

101.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas, del Municipio de Belalcázar.

101.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Belalcázar del departamento de Caldas en la vereda La Habana, en el corredor vial denominado La Habana – Las Pavas con una longitud de 0,24 km, el punto de inicio de referencia es PR 0+000 en la Bodega de plátano, y el punto final de referencia es PR 0+240 entrada a la Vereda Las Pavas Alta. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 41. Estado inicial de la vía

101.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 174 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

102 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

102.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	SPSC-CD-CS-105-2024
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA
NIT.	900.129.360-1
TELÉFONO:	3102318402
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2200-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$200.555.145,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$200.555.145,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24		
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25		
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331108 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083462			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 2			
Cumplimiento	\$20.055.515,00	04/07/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.027.758,00	04/7/2024	30/04/2028

Estabilidad de la obra	\$40.111.029,00	31/12/2024	30/04/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 2			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	04/07/2024	30/04/2025

Tabla 30 Información general del Convenio 2200-2024 Municipio Belalcázar.

102.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

102.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 7/07/25, remitió respuesta a comunicado CIMP-555-757-2005.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-1000-2793 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 29/7/25, remitió el plan de compras y la solicitud de desembolso de la OPC
- Se realizó comité informativo, el día 15/7/25, para tratar los temas pendientes del convenio.

102.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 10 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 7,65 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 3,5 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.

- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 161,21 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m³.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

102.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

102.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	200.555.145,00
Ejecutado	100%	96,41%	193.362.852,50
Avance / Retraso	0%	-3,59%	-7.192.292,50

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,05	5,31
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	133,11	140

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	101,5	106,75
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	32,22	33,89
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.675,13	4.916,95

103 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

103.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 15.1.

103.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 15.3

103.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Juan Camilo Corral Álzate
Contador	Bresman Rivera Gutiérrez

Tabla 31 Personal Convenio Solidario

103.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$40.872.017 de fecha 20/01/2025.
- Desembolso 02 aprobado por valor de \$4.095.148 de fecha 24/01/2025.
- Desembolso 03 aprobado por valor de \$2.163.019 de fecha 30/01/2025.
- Desembolso 04 aprobado por valor de \$198.000 de fecha 30/01/2025.
- Desembolso 05 aprobado por valor de \$1.279.400 de fecha 06/02/2025.
- Desembolso 06 aprobado por valor de \$10.676.213 de fecha 11/02/2025.
- Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 5.852.689 de fecha 24/02/2025
- Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 51.530.938 de fecha 11/03/2025.
- Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 1.178.000,00 de fecha 19/03/2025.

10. Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 6.054.330,00 de fecha 26/03/2025.
11. Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 15.401.283,83 de fecha 10/04/2025.
12. Desembolso 14 aprobado por valor de \$ 6.708.140,00 de fecha 24/04/2025.
13. Desembolso 15 aprobado por valor de \$ 11.578.473,52 de fecha 24/04/2025.
14. Desembolso 17 aprobado por valor de \$ 10.928.118,05 de fecha 06/05/2025.
15. Desembolso 18 aprobado por valor de \$ 16.185.256,00 de fecha 14/05/2025.
16. Desembolso 19 aprobado por valor de \$ 7.799.953,00 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 192.500.978,63 correspondiente al 96% del valor del convenio. Ver Anexo 15.5

103.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo..

103.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

103.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 15.2.

El OAC al corte del periodo presentó las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 1 del Convenio No. 2200 de 2024. Se encuentra pendiente la póliza y paz y salvo de la Prórroga No. 2, y la respectivas resoluciones de aprobación por parte EL INSTITUTO de la Prórroga No. 1 y 2.

103.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

103.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

103.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

103.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
Proyecto Placas Huellas en concreto	73 días	jue 16/01/25	mar 15/04/25	100%	100%
INICIO	0 días	jue 16/01/25	jue 16/01/25	100%	100%
ETAPA 1	30 días	jue 16/01/25	vie 21/02/25	100%	100%
Fase 1	14 días	jue 16/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	jue 16/01/25	jue 23/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	8 días	jue 23/01/25	sáb 1/02/25	100%	100%
Fase 2	8 días	sáb 1/02/25	mar 11/02/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/02/25	mar 11/02/25	100%	100%
Fase 3	8 días	mié 12/02/25	vie 21/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/02/25	vie 21/02/25	100%	100%
ETAPA 2	23 días	vie 21/02/25	vie 21/03/25	100%	100%
Fase 4	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C (PARA 69.6m o 40%)	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	100%	100%
Fase 5	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) (PARA 69.6m o 40%)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	100%	100%
Fase 6	8 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 69.6m o 40%)	8 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
ETAPA 3	20 días	vie 21/03/25	mar 15/04/25	100%	100%
Fase 7	20 días	vie 21/03/25	mar 15/04/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 21/03/25	mar 25/03/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)(PARA 34.8m o 20%)	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella (PARA 34.8m o 20%)	3 días	vie 28/03/25	mar 1/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para	11 días	mar 1/04/25	mar 15/04/25	100%	100%

103.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 200.555.145,00; la Inversión Ejecutada fue de 193.362.852,50. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 7.192.292,50.

103.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

103.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

104 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

104.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

104.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-927-2634 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-944-2676 de fecha 7/7/25, solicitó a la JAC subsanación al plan de inversión social solicitado por INVIAS.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1053-2940 de fecha 25/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.
- Se realizó comité informativo, el día 15/7/25, para tratar los temas pendientes del convenio.

104.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de nómina, seguridad social y compra de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

El día 14 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Corregir plan de compras.

El día 15 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 16 con presencia de JAC vereda La Habana, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: 1. Envío de documentos completos para el desembolso.

Desde el 1 al 10 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 7,65 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 3,5 m³.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 10 ml, cantidad ejecutada: 161,21 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m³.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.

104.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2200 DE 2024 MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los meses de Agosto 2024 a Junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, solo hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional del mes de marzo 2025.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

105 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 10 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,41% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 5,31 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 140 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 106,75 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 33,89 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 183 ml, cantidad ejecutada: 4.916,95 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 193.362.852,50 correspondiente al 96,41% del valor del convenio.
- Que el OAC solo vino a presentar la documentación de la OPC a finales de este periodo, lo que permitió radicar en el INVIAS para la No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad.

106 ANEXO

106.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

106.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

106.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

106.4 BITÁCORA

Se adjunta la bitácora. Ver Anexo 15.9.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2094-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	301
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	302
1	INTRODUCCIÓN		304
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		306
2.1	Localización		306
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		307
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		307
2.4	Características técnicas del proyecto		308
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		308
3.1	Información general del contrato		309
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		310
3.3	Seguimiento Items no previstos		311
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		311
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		312
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	806
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	818
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	815
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		313
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		313
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	314
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		314
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		316
7	Conclusiones y recomendaciones		316
8	Anexos		317
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA	30/07/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: jul-25

CONVENIO No.: 2094-2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24

OBJETO:

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2024
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE PRORROGA 01:	24/12/2024
PLAZO PRORROGA 01:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01:	30/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02:	28/04/2025
PLAZO PRORROGA 02:	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01:	21 DIAS
FECHA DE REINICIO:	19/06/2025
PLAZO PRORROGA 03:	19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03:	1/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/08/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS):	333.00

VALOR INICIAL :	\$	203.292.352,00
VALOR ADICIONALES:	\$	-
VALOR ACUMULADO:	\$	203.292.352,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$	-
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$	-

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA NARANJAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ml	152.00
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ml	-	-
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cada uno)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.122.101,17
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.593.663,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.076.588,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	201.792.352,17

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 203.292.353,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 196.117.102,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96,47%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	4.571.344,12	153.122.102,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.594.633,85	42.995.000,00
VALOR EJECUTADO	8.165.977,97	196.117.102,00

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25



FOTO 2 - OBRA FINALIZADA - 02/05/25

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma _____
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2094-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL NARANJAL

107 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Naranjal, el municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2094 de 2024 de fecha 28 de junio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA NARANJAL** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025. Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 21 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

108 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

108.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Naranjal-Montebonito con longitud total de 0,71 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella.

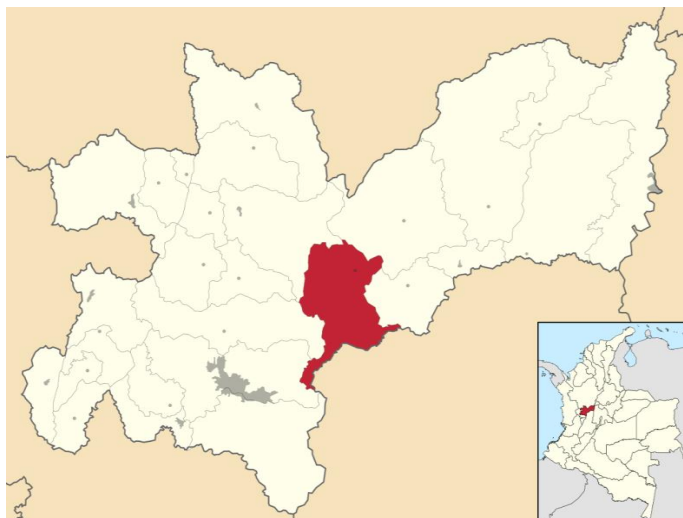


Ilustración 42 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

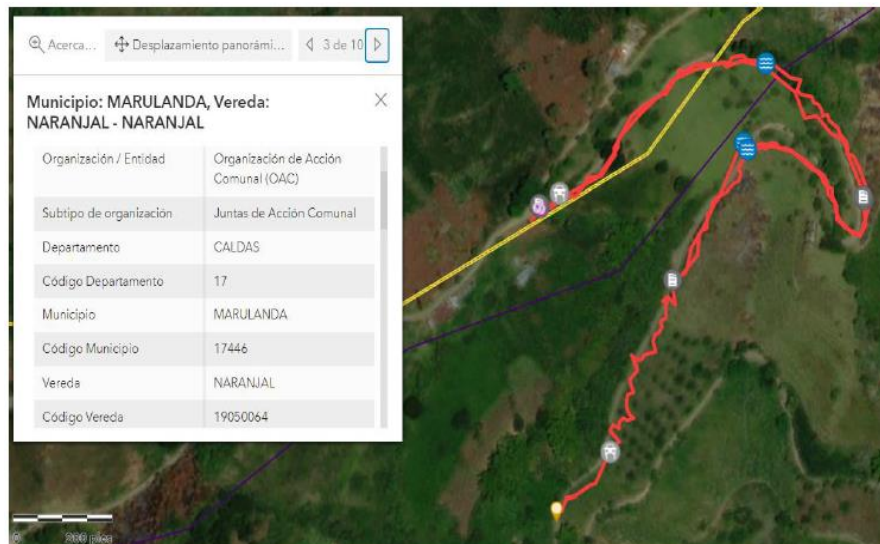


Ilustración 43 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

108.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal - Montebonito, del Municipio de Marulanda.

108.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Marulanda del departamento de Caldas en la vereda Naranjal, en el corredor vial denominado Naranjal-Montebonito que tiene una longitud de 0.71 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruz de la Y, y el punto final de referencia es PR 0+710 empalme con placa huella existente.

Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 44. Estado inicial de la vía

108.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

109 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

109.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6479115
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL NARANJAL
NIT.	901.578.319-3
TELÉFONO:	3228270056
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2094-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/06/2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$203.292.353,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$203.292.353,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24		
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/04/25		
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100330217 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083143			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 1			
Cumplimiento	\$20.329.236,00	02/09/2024	30/04/2026
Prestaciones sociales	\$10.164.618,00	02/09/2024	30/04/2028
Estabilidad de la obra	\$40.658.471,00	30/04/2025	30/04/2030

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$284.700.000,00	28/06/2024	30/04/2025

Tabla 32 Información general del Convenio 2094-2024 Municipio Marulanda.

109.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

109.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/07/25, remitió subsanaciones para el cierre.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/07/25, remitió la solicitud de desembolso no. 15, para revisión y aprobación.

109.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 2 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 1,53 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,66 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 32,63 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

109.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

109.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	203.292.353,00
Ejecutado	100%	96,47%	196.117.102,00
Avance / Retraso	0%	- 3,53%	- 7.175.251

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	4,50	4,59
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	116,28	118,58
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	83,69	85,34
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	28,64	29,21

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.133,51	4.215,09

110 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

110.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 16.1.

110.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

110.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Yeison Rivera
Contador	Daniela Hurtado Duque

Tabla 33 Personal Convenio Solidario

110.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$39.203.611 de fecha 30/01/2025.
- Desembolso 03 aprobado por valor de \$1.750.000 de fecha 19/02/2025.
- Desembolso 04 aprobado por valor de \$3.913.907 de fecha 06/02/2025.
- Desembolso 05 aprobado por valor de \$5.870.860 de fecha 12/02/2025.
- Desembolso 06 aprobado por valor de \$1.975.800 de fecha 12/02/2025.
- Desembolso 07 aprobado por valor de \$34.341.128 de fecha 28/02/2025.
- Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 14.219.143 de fecha 11/03/2025.
- Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 28.299.630,60 de fecha 26/03/2025.
- Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 25.488.017,00 de fecha 14/04/2025.
- Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 38.197.174,23 de fecha 15/04/2025.
- Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 12.584.560,00 de fecha 25/04/2025.
- Desembolso 14 aprobado por valor de \$ 7.075.014,00 de fecha 22/05/2025.

Ver Anexo 16.4

110.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

110.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

110.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 16.2.

El OAC al corte del periodo se encuentran pendientes las pólizas, paz y salvo y respectivas aprobaciones por parte del INSTITUTO correspondientes a las últimas novedades contractuales.

110.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

110.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

110.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

110.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
CONVENIO 2094 DE 2024 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL NARANJAL		0	65 días	jue 16/01/25	mié 16/04/25	100%	100%
FINAL		0	0 días	mié 16/04/25	mié 16/04/25	0%	100%
INICIO		0	65 días	jue 16/01/25	mié 16/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,41	10 días	jue 16/01/25	mié 29/01/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	M3	113,99	15 días	jue 30/01/25	mié 19/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	90,04	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	28,05	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4125,38	45 días	jue 13/02/25	mié 16/04/25	100%	100%

110.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 203.292.353,00; la Inversión Ejecutada fue de 196.117,102. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 7.175.251,6.

110.9.3 Actas de Comités

No aplica para este periodo.

110.9.4 Actas de Reunión

No aplica para este periodo.

111 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

111.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

111.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-916-2623 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-955-2728 de fecha 11/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1033-28776 de fecha 22/7/25, remitió a Corpocaldas solicitud ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1029-2867 de fecha 21/7/25, remitió a la JAC el recibo de obra física.
- Se realizó comité operativo no. 16, el día 16/7/25.

111.1.2 Actividades Técnicas

El día 7 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 13 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la seguridad social y la nómina de trabajadores. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 14 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos nómina y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 15 con presencia de JAC vereda La Linda, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de nómina y materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Remitir documentos firmados y documentos pendientes para el desembolso.

Desde el 1 al 2 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 1,53 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 0,66 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 2 ml, cantidad ejecutada: 32,63 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.

111.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2094 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a Junio de 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, la Interventoría no recibió el soporte del giro de los rendimientos de marzo a junio 2025 al Tesoro Nacional.

Ante este hecho, la Interventoría procederá a requerir nuevamente a el OAC para que se ponga al día con esta obligación establecida en el convenio.

112 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 2 de mayo de 2025
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 96,47% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4,59 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 118,58 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 85,34 m3. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 29,21 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 155 ml, cantidad ejecutada: 4.215,09 kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 196.117,102 correspondiente al 96,47% del valor del convenio.
- Que desde el 26 de marzo de 2025 estaba radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC y solo hasta el 23 de mayo de 2025. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió casi todo dicho plazo fue cuando se obtuvo la No Objeción de la OPC, por lo que al corte de este informe no fue posible su ejecución, por lo que se va a requerir más tiempo.

113 ANEXO

113.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

113.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para el periodo.

113.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

113.4 BITÁCORA

No aplica para el periodo.

MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3551-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	319
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	320
1	INTRODUCCIÓN		322
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		324
2.1	Localización		324
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		325
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		325
2.4	Características técnicas del proyecto		325
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		325
3.1	Información general del contrato		326
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		327
3.3	Seguimiento Items no previstos		327
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		328
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		328
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	822
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		329
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		330
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		331
7	Conclusiones y recomendaciones		331
8	Anexos		331
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MEP-IN-IN-15-PR-2																																																																														
		VERSION 1																																																																														
		PÁGINA																																																																														
		FECHA 30/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	PERIODO MES: JUL 25																																																																														
CONVENIO No.: 3661/2024	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24 FECHA DE INICIO: 30/04/2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30/12/2024 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES FECHA REINICIO 01: 11/02/2025 FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 30/06/25 FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025 PLAZO SUSPENSIÓN 02: HASTA EL 29/05/25 FECHA DE AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02: 27/05/2025 PLAZO AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 02: HASTA EL 19/07/25 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/09/2025 PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72.00	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 203.089.907,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$. VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 203.089.907,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$. ANTICIPO AMORTIZADO: \$.																																																																														
OBJETO: ALIAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARILANDA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																
OAC: JAC. VEREDA EL PARAMO																																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3661/2024	INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JULIANA TRAYA																																																																														
ALCANCE FISICO CONTRATADO																																																																																
AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>ml</td><td>151.00</td></tr><tr><td> Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Mezclamiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und 1.00</td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	ml	151.00	Construcción			Mezclamiento			Rehabilitación			Estructuras			Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento			Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und 1.00	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td> Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Mezclamiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	ml	-	-	Construcción				Mezclamiento				Rehabilitación				Estructuras				Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento				Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und -	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	ml	151.00																																																																														
Construcción																																																																																
Mezclamiento																																																																																
Rehabilitación																																																																																
Estructuras																																																																																
Túneles																																																																																
Puentes																																																																																
Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und 1.00																																																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	ml	-	-																																																																													
Construcción																																																																																
Mezclamiento																																																																																
Rehabilitación																																																																																
Estructuras																																																																																
Túneles																																																																																
Puentes																																																																																
Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und -	-																																																																													
AVANCE FINANCIERO																																																																																
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																														
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>154.212.590,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.626.377,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.350.950,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>202.189.907,00</td></tr></tbody></table>		VALOR	OBRAS	154.212.590,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.626.377,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.350.950,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	202.189.907,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTION AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	ACUMULADO	OBRAS			GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																																					
	VALOR																																																																															
OBRAS	154.212.590,00																																																																															
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.626.377,00																																																																															
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.350.950,00																																																																															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	202.189.907,00																																																																															
	BÁSICO	ACUMULADO																																																																														
OBRAS																																																																																
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																																																
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																																																														
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$. 0,00	MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																														
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																														
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																																														
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																
N.A.																																																																																
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																
Firma:																																																																																
Nombre: BIBIANA PATERNINA																																																																																
Director de Interventoría																																																																																
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL																																																																																
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.																																																																																
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																																

CONVENIO SOLIDARIO No. 3551-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS

VEREDA EL PÁRAMO

114 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Páramo, del municipio de MARULANDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3551 de 2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL PÁRAMO** DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$203.292.353,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio desde el 2 hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

115 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

115.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Marulanda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Salamina y Pensilvania, al oriente con Manzanares, al sur con Herveo, y al occidente con Neira y Manizales. Se sitúa a 126 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al tramo de la vía que comunica la vereda El Páramo con la cabecera municipal del municipio y con el corregimiento de San Félix (con longitud total de 3,38 km, de los cuales se intervendrán 146 ml de placa huella).

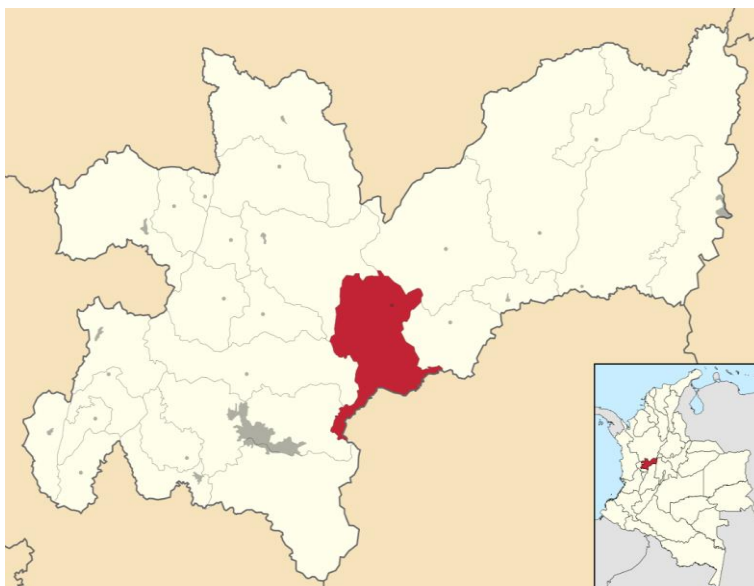


Ilustración 45 Localización del municipio de Marulanda (Caldas).

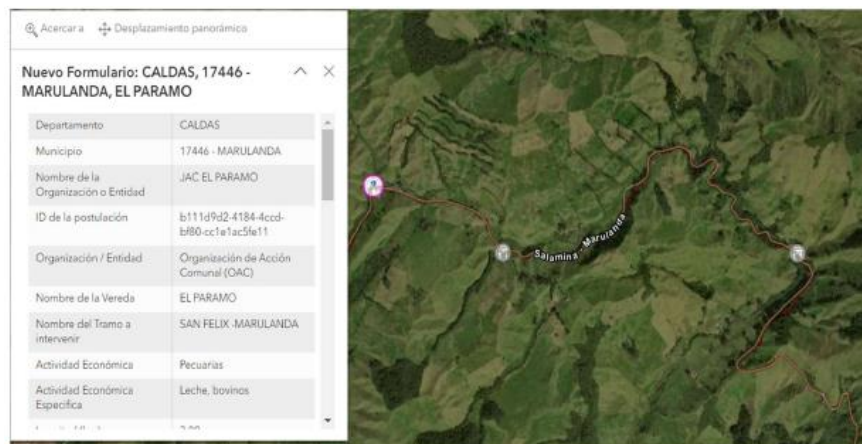


Ilustración 46 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps.
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

115.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Páramo, en el corredor vial que Comunica la Vereda El Páramo con La cabecera Municipal y con el Corregimiento de San Félix, del Municipio de Marulanda.

115.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

115.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 146 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,90 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

116 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

116.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6730151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PÁRAMO
NIT.	901.089.339-2

TELÉFONO:	3126652893	
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3551-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/09/2024	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$\$203.033.492,00 M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE	
VALOR TOTAL:	\$\$203.033.492,00 M/CTE	
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE	
ESTADO:	EN EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024	
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25	
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/5/25 28/4/25	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25	
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25	
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25	
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025	
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ	
GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PÁRAMO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343504 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087319		
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.303.349,20	06/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.151.675,00	06/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.606.698,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$260.000.000,00	06/09/2024	31/12/2024
Contratistas y Subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Patronal			

Tabla 34 Información general del Convenio 3551-2024 Municipio Marulanda.

116.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

116.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/7/25, remitió la hoja de vida del maestro de obra.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/7/25, remitió la documentación inicial compromiso de los comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/7/25, remitió la hoja de vida del contador.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/7/25, remitió la hojas de vida del contador.
- Se realizó comité operativo no. 1, 2 y 3, el día 15/7/25, 21/7/25 y 23/7/25.

116.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El acta de inicio de Obra tiene fecha de 30 de julio/25

116.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este convenio.

116.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 30 de julio de 2025. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	0	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0

117 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

117.1 INFORME SEMANAL

No aplica para este periodo.

117.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1041–2922 de fecha 24 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Julián Sánchez
Contador	Andrés Felipe Quinceno
Maestro de Obra	Dorian Mauricio García Arenas

Tabla 35 Personal Convenio Solidario

117.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

117.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

117.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

117.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 17.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3551 de 2024

117.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

117.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

117.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

117.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se tienen un seguimiento a las actividades ejecutadas por que el acta de inicio tiene fecha de 30 de julio de 2025.

A continuación, se muestra el programa de obra:

☐ AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PÁRAMO DEL MUNICIPIO DE MARULANDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	53 días	mié 30/07/25	vie 3/10/25	3%
☐ Capítulo 1. Construcción Placas Huellas	53 días	mié 30/07/25	vie 3/10/25	3%
Excavaciones varias sin Clasificar	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	100%
Subbase Granular Clase C	12,67 días	vie 1/08/25	sáb 16/08/25	22%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	43,89 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	0%
Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (G)	40,89 días	jue 14/08/25	vie 3/10/25	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	43,89 días	lun 11/08/25	vie 3/10/25	0%

117.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 30 de julio de 2025.

117.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

117.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

118 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

118.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

118.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-934-2641 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-954-2727 de fecha 11/7/25, remitió observaciones sobre las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-975-2748 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-995-2787 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-1009-2806 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-995-2806 de fecha 15/7/25, remitió observaciones sobre las hojas de vida enviadas por la JAC.
- Se realizó comité operativo no. 1, 2 y 3, el día 15/7/25, 21/7/25 y 23/7/25.

118.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

118.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3551 DE 2024 MUNICIPIO DE MARULANDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 24/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero a junio 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

119 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 30 de julio de 2025.

120 ANEXO

120.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

120.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

120.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

120.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2176-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARICIRI

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	333
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	334
1	INTRODUCCIÓN		336
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		338
2.1	Localización		338
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		339
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		339
2.4	Características técnicas del proyecto		339
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		339
3.1	Información general del contrato		340
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		341
3.3	Seguimiento Items no previstos		342
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		342
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		344
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	829
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	844
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	846
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	848
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	850
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	852
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	838
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		345
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		345
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	346
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		346
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		347
7	Conclusiones y recomendaciones		347
8	Anexos		348
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		854
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		856

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPAMN-15-FR-2
VERSION: 1
PÁGINA:

FECHA: 30/07/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 20

CONVENIO No.: 20762024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCORI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JAS:3595DA3595CRL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 10/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA REINICIO 01: 11/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 10/02/25
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 28/04/2025
FECHA DE PRORROGA 02: 30/05/2025
PLAZO PRORROGA 02: 30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS
FECHA DE REINICIO: 18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85.00

VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 203.086.907.00
VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): \$
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 203.086.907.00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$
ANTICIPO AMORTIZADO: \$

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LILIANA TRATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	mil	151.00	Pavimentación	Construcción	mil	-
	Mejoramiento				Mejoramiento		
	Rehabilitación				Rehabilitación		
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles		
	Puentes				Puentes		
	Portones				Portones		
Mantenimiento				Mantenimiento			
Otros (Especificar costos)	Obras de Drenaje	und	1,00	Otros (Especificar costos)	Obras de Drenaje	und	-

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES	
	VALOR	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	154.212.580,00	5.650.234	5.650.234,40
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.626.377,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.350.950,00	7.525.842	7.525.842,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	202.189.907,00	13.176.076,40	13.176.076,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 30.343.220,18	MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 13.175.076,40	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	5,66%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 Armado viga riostra




Foto 2 Compactación de terreno

VEREDA EL SILENCIO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar si está en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

VEREDA EL SILENCIO

Firma: 
Nombre: BIBIANA PATERNINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820243024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIA
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2176-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA SARCIRI

121 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Sarciri el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2176 de 2024 de fecha 03 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA SARCIRI** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$203.689.907,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

122 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

122.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Guamito – El Crucero con longitud total de 0,17 km, de los cuales se intervendrán 151 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

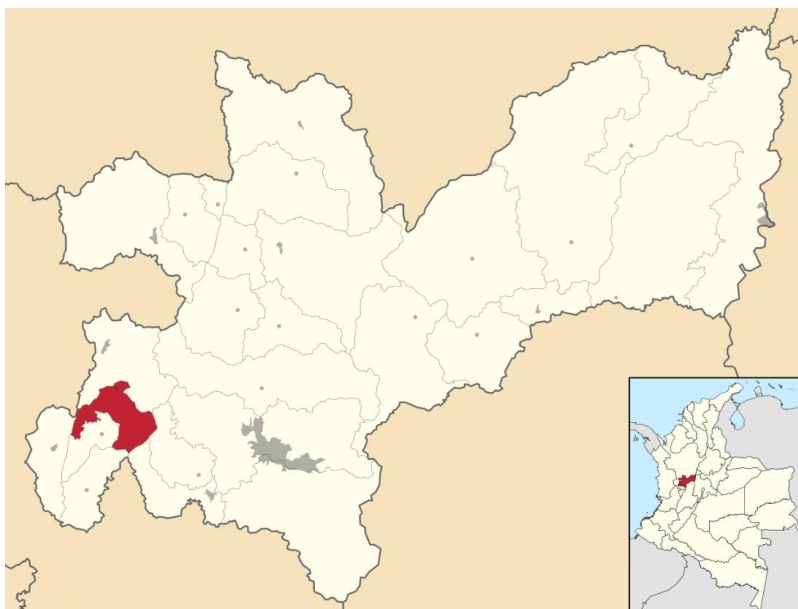


Ilustración 47 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

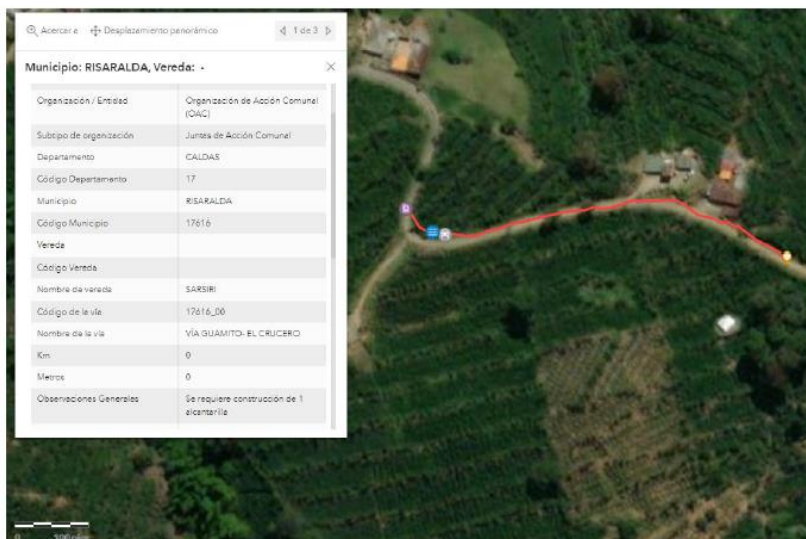


Ilustración 48 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

122.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Sarsiri, en el corredor vial denominado Guamito – El Crucero, del Municipio de Risaralda.

122.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

122.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 151 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y una obra de arte tipo alcantarilla. De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

123 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

123.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6495562
---------------------------	--------------------

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SARCIRI
NIT.	810.001.938- 6
TELÉFONO:	3126310011
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2176-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SARCIRI DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$203.689.907,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$202.034.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	1 MES 28/4/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SARCIRI toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de	

Cumplimiento No. NB-100330965 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083424			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.368.991,00	03/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.184.496,00	03/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.737.982,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	03/07/2024	31/12/2024

Tabla 36 Información general del Convenio 2176-2024 Municipio de Risaralda.

123.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

123.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 3/07/25, remitió la solicitud el desembolso no. 1 corregido para revisión y aprobación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-925-2632 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 9/07/25, remitió hoja de vida del maestro para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/07/25, remitió el plan de compras no. 2 corregido para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió la solicitud de desembolso no. 1 para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/07/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente a la segunda nómina de julio, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/07/25, remitió la solicitud de desembolso correspondiente a la segunda nómina de julio, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/07/25, remitió la documentación técnica solicitada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/07/25, remitió la documentación ambiental solicitada.

- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 31/7/25, remitió el plan de compras no. 4.
- Se realizó comité operativo no. 6, el día 16/7/25.

123.2.2 Actividades Técnicas

A fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas durante el mes:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 4,93 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 33,7 ml, cantidad ejecutada: 20,73 m3.
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

A la fecha de corte del presente periodo, se presentan las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 33,7 ml, cantidad ejecutada: 20,73 m3
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

123.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

123.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario presenta el siguiente avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	12%	19,68%	30343293,18
Ejecutado	10%	8,54%	13176076,40
Avance / Retraso	-2%	-11,14%	-17167216,78

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	37%	0%	16,63	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	22%	14%	32,43	20,73
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0
13	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	0%	0%	0	0

124 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

124.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 18.1

124.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 18.3

124.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CIMP-555-674-1760 y CIMP-555-948-2708 de fechas 2 de mayo de 2025 y 9 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Daniel Alejandro Guerra Henao
Contador	Sandra Milena Ramírez Díaz
Maestro de Obra	Carlos Adelmo Sanchez

Tabla 37 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 18.4

124.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 43.015.972,00 de fecha 17/07/2025
- Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 3.084.492 de fecha 18/07/2025

Desembolso total por valor de \$ 46.100.464,00 correspondiente al 22,80% del valor del convenio. Ver anexo 18.5

124.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 18.6

124.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 18.7

124.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2176 de 2024

124.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

124.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

124.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

124.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Programado	% completado
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	60 días	lun 14/07/25	vie 3/10/25		12%	10%
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	60 días	lun 14/07/25	vie 3/10/25		12%	10%
Excavaciones varias sin Clasificar	35 días	lun 14/07/25	vie 29/08/25		37%	30%
Subbase Granular Clase C	60 días	lun 14/07/25	vie 3/10/25		22%	14%
Concreto Reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezcla in situ	47 días	jue 31/07/25	vie 3/10/25		0%	0%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	43 días	mié 6/08/25	vie 3/10/25		0%	0%
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	47 días	mar 29/07/25	mié 1/10/25		4%	9%

124.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 31 de julio de 2025, la Inversión Programada fue de \$30.343.293,18; la Inversión Ejecutada fue de \$13.176.076,40. Es decir, el proyecto presenta un avance en la inversión que se debía ejecutar por valor de **\$17.167.216,78**

124.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

124.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

125 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

125.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

125.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-948-2708 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-969-2742 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-988-2781 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-1003-2800 de fecha 16/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-1061-2976 de fecha 28/7/25, remitió a la JAC el acta de inicio de obra.
- La Interventoría por medio de oficio CIMP-555-1064-2979 de fecha 28/7/25, remitió al INVIAS los documentos de gestión social.

125.1.2 Actividades Técnicas

El día 8 de julio de 2025, se realizó reunión informativa

El día 10 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 5 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se le recordó a la JAC, la entrega de soportes del Plan de Compras 1. Se definió que la fecha

de inicio de obra sería el 14 de julio de 2025. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envío a pago

El día 17 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 6 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se presentó Plan de Compras de materiales. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envío a pago

El día 31 de julio de 2025, se realizó el Comité Operativo No 7 con presencia de JAC vereda El Silencio, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, en el que se hizo una revisión de los documentos de alistamiento requeridos para dar aprobación al Plan de Compras de Nomina del 1 al 15 de agosto. Compromisos: Entregar soporte de cada insumo del Plan de Compras, para su envío a pago

A la fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas realizadas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 33,7 ml, cantidad ejecutada: 20,73 m³ Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.

125.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2176 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 28/2/25. La Interventoría recibió los extractos de los meses de febrero a junio 2025. La Interventoría se encuentra a la espera del soporte de los extractos bancarios pendientes y del giro de los rendimientos al Tesoro Nacional

126 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 14 de julio de 2025.
- El avance físico de la obra es del 10% e Inversión de 8.54% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 151 ml, cantidad ejecutada: 44,93 m³. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 33,7 ml, cantidad ejecutada: 20,73. Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³. Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 Kg.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$13.176.076,40 correspondiente al 8,54% del valor del convenio.

127 ANEXO

127.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

127.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 18.8

127.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

127.4 BITÁCORA

Ver anexo 18.9.

MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2187-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	350
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	351
1	INTRODUCCIÓN		353
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		355
2.1	Localización		355
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		356
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		356
2.4	Características técnicas del proyecto		357
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		357
3.1	Información general del contrato		357
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		359
3.3	Seguimiento Items no previstos		360
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		360
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		361
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	872
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	888
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	881
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		362
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		363
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	363
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		363
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		366
7	Conclusiones y recomendaciones		366
8	Anexos		367
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO																																				
			VERSION																																				
			PÁGINA																																				
			FECHA	30/07/2025 (Día / Mes / Año)																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS		PERIODO MES: may-25																																			
CONVENIO No.: 2187-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24																																					
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR INICIAL : \$ 202.034.766,00																																			
CONTRATISTA: JAC VEREDA MEDIA CUESTA		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024		VALOR ADICIONALES: \$ -																																			
		FECHA DE PRORROGA 01: 24/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 202.034.766,00																																			
		PLAZO PRORROGA 01: 4 MESES		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -																																			
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: 30/04/2025		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																			
		FECHA DE PRORROGA 02: 28/04/2025																																					
		PLAZO PRORROGA 02: HASTA EL 30/5/25																																					
		FECHA DE TERMINACIÓN : 30/05/2025																																					
		FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025																																					
		PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS																																					
		FECHA DE REINICIO: 19/06/2025																																					
		PLAZO PRORROGA 03: 18/06/2025																																					
		FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 03: 1/08/2025																																					
		FECHA DE TERMINACIÓN: 1/08/2025																																					
		PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 333,00																																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3601-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																			
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación Mejoramiento</td><td>ml</td><td>181,00</td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Mejoramiento	ml	181,00	Estructuras Alcantarillas			Mantenimiento Muro de Contención			Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación Mejoramiento</td><td>ml</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Muro de Contención</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Mejoramiento	ml	-	-	Estructuras Alcantarillas				Mantenimiento Muro de Contención				Otros (Especificar cuales)			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																					
Pavimentación Mejoramiento	ml	181,00																																					
Estructuras Alcantarillas																																							
Mantenimiento Muro de Contención																																							
Otros (Especificar cuales)																																							
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																				
Pavimentación Mejoramiento	ml	-	-																																				
Estructuras Alcantarillas																																							
Mantenimiento Muro de Contención																																							
Otros (Especificar cuales)																																							
AVANCE FINANCIERO																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																					
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>151.483.797,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>4.544.514,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>44.506.455,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>200.534.766,00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	151.483.797,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.544.514,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.506.455,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.534.766,00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>32.348.943,55</td><td>130.560.620,72</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>10.154.329,48</td><td>43.985.967,08</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>42.503.273,03</td><td>174.546.587,80</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	32.348.943,55	130.560.620,72	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.154.329,48	43.985.967,08	VALOR EJECUTADO	42.503.273,03	174.546.587,80										
	VALOR																																						
OBRAS	151.483.797,00																																						
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.544.514,00																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.506.455,00																																						
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.534.766,00																																						
	VALOR	ACUMULADO																																					
OBRAS	32.348.943,55	130.560.620,72																																					
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-	-																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.154.329,48	43.985.967,08																																					
VALOR EJECUTADO	42.503.273,03	174.546.587,80																																					
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																							
INVERSIÓN EN OBRA																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 202.034.766,00		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 174.546.587,80		MANO DE OBRA CALIFICADA: 2																																					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 86,39%		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8																																					
		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1																																					
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9																																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																							
FOTO 1 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025		FOTO 3 - OBRA FINALIZADA - 23/05/2025																																					
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																							
Firma																																							
Nombre: BIBIANA PATERNINA																																							
Director de Interventoría																																							
Matrícula Profesional No.: 0620253024 ATL																																							
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																							
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																							

CONVENIO SOLIDARIO No. 2187-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

VEREDA MEDIA CUESTA

128 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Media Cuesta el municipio de RISARALDA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2187 de 2024 de fecha 04 de julio de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCI" N COMUNAL **VEREDA MEDIA CUESTA** DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$202.034.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 24 de diciembre de 2024 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio por el término de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de abril de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 22 de enero de 2025 se suscribe el Acta de Inicio de Ejecución del Convenio.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 2 del Convenio por el término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 3 del Convenio, por un término de un (1) mes, quedando como nueva fecha de vencimiento el 1 de agosto de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

129 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

129.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Risaralda se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma, al oriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Sanjosé, Chinchiná y Belalcázar, y al occidente con Vitermo y Anserma. Se sitúa a 53 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas con longitud total de 0,64 km, de los cuales se intervendrán 181 ml de placa huella.

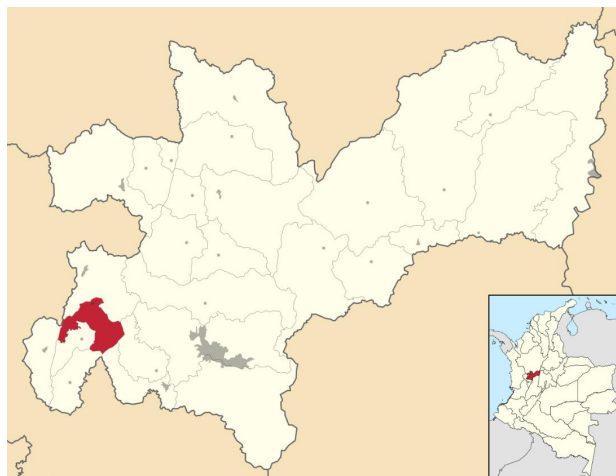


Ilustración 49 Localización del municipio de Risaralda (Caldas).

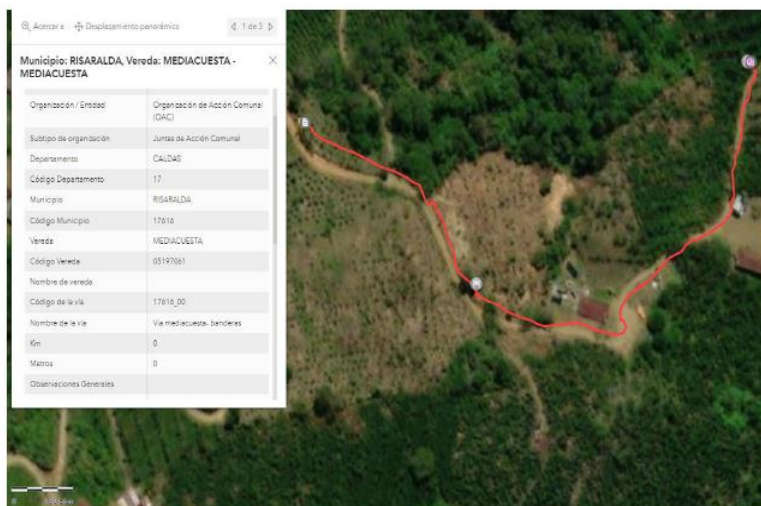


Ilustración 50 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

129.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas, del Municipio de Risaralda.

129.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Risaralda del departamento de Caldas en la vereda Media Cuesta, en el corredor vial denominado Media Cuesta – Banderas en la vía veredal de Media Cuesta con una longitud de 0,64 km, el punto de inicio de referencia PR 0 +000 es el sector La Puerta en la finca La Suiza y el punto final de referencia PR 0+ 640 es antes de las placas huellas del sector El Arrieral. Toda la vía se encuentra en terreno natural, en otros sectores está deteriorada por empozamiento producto de la ola invernal que interrumpe parcialmente el paso vehicular.



Ilustración 51 Estado inicial del sector

129.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 181 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

130 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

130.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6498208
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL MEDIA CUESTA
NIT.	800.219.964-9

TELÉFONO:	3147931894		
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2187-2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04/07/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MEDIA CUESTA DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$202.034.766,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$202.034.766,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
PRÓRROGA No. 1	4 MESES 24/12/24		
PRÓRROGA No. 2	1 MES 28/4/25		
SUSPENSIÓN No. 1	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	HSTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 3	UN (1) MES HASTA EL 1/8/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	1/8/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100331126 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083468			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			

Cumplimiento	\$20.203.477,00	04/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.101.739,00	04/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.406.954,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	04/07/2024	31/12/2024

Tabla 38 Información general del Convenio 2187-2024 Municipio de Risaralda.

130.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

130.2.1 Actividades Administrativas

La JAC durante el presente periodo ejecutó las siguientes actividades administrativas:

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/07/25, remitió el último plan de compras, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/07/25, remitió el último plan de compras, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/07/25, remitió la solicitud de desembolso de los pagos rechazados de Carlos Ramírez, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/07/25, remitió la solicitud de desembolso de la OPC, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 22/07/25, remitió el último plan de compras, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, remitió la solicitud de desembolso del último plan de compras, para revisión y aprobación.
- Se realizó comité operativo no. 26, el día 17/7/25, para tratar el tema de la OPC.
- Se realizó comité operativo no. 27, el día 21/7/25.

130.2.2 Actividades Técnicas

Desde el 1 al 23 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 5,25 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 26 ml, cantidad ejecutada: 8,65 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 4,16 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 393,79 kg.

La JAC a fecha de corte del presente periodo, presenta las siguientes actividades técnicas acumuladas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m³.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m³.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m³.
- Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m³.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m³.

130.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

130.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra activo. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	100%	100%	202.034.766,00
Ejecutado	100%	86,39%	174.546.587,80
Avance / Retraso	0%	- 13,61%	- 27.488.178,20

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	100%	100%	5,20	4,48
2	Subbase Granular Clase C	M3	100%	100%	135,70	116,96
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	100%	100%	100,35	86,49
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	100%	100%	31,41	27,07
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	100%	100%	4.949,68	4.266,02

131 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

131.1 INFORME SEMANAL

Se adjuntan los Informes Semanales. Ver Anexo 19.1.

131.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

La información de maquinaria y equipos del Contrato de Obra, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Ver Anexo 19.3.

131.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

El personal asignado por el Contratista para el proyecto es el siguiente:

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Luis Felipe Arcila Valencia
Contador	Jorge Humberto Cepeda Salgado

Tabla 39 Personal Convenio Solidario

131.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

Los desembolsos realizados hasta la fecha son:

- Desembolso 01 aprobado por valor de \$ 41.980.856 de fecha 27/01/2025.
- Desembolso 02 aprobado por valor de \$ 1.021.533 de fecha 04/02/2025.
- Desembolso 03 aprobado por valor de \$ 7.403.163 de fecha 06/02/2025.

4. Desembolso 04 aprobado por valor de \$ 609.000 de fecha 14/02/2025.
5. Desembolso 05 aprobado por valor de \$ 5.221.018 de fecha 14/02/2025.
6. Desembolso 06 aprobado por valor de \$ 5.778.860 de fecha 24/02/2025.
7. Desembolso 07 aprobado por valor de \$ 13.843.532 de fecha 12/03/2025.
8. Desembolso 08 aprobado por valor de \$ 35.512.326,96 de fecha 26/03/2025.
9. Desembolso 09 aprobado por valor de \$ 16.824.512,57 de fecha 14/04/2025.
10. Desembolso 10 aprobado por valor de \$ 13.083.737,50 de fecha 24/04/2025.
11. Desembolso 11 aprobado por valor de \$ 2.919.645,10 de fecha 06/05/2025.
12. Desembolso 12 aprobado por valor de \$ 8.650.649,00 de fecha 13/05/2025.
13. Desembolso 13 aprobado por valor de \$ 8.616.844,27 de fecha 22/05/2025.

Desembolso Total por valor de \$ 161.465.676,46 correspondiente al 80% del valor del convenio. Ver Anexo 19.5

131.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para este periodo.

131.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para este periodo.

131.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 19.2.

El OAC al corte del periodo no presentó la póliza con su respectivo paz y salvo de la Prórroga No. 1, además se encuentran pendientes las pólizas, paz y salvo, así como la respectiva resolución de aprobación por parte EL INSTITUTO correspondiente la Prórroga No. 2 del Convenio No. 2187 de 2024.

131.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

131.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

131.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

131.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

A continuación, se muestra el seguimiento al programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% PROG	% completado
MEJORAMIENTO VIAL VEREDA MEDIA CUESTA	81 días?	lun 23/12/24	lun 14/04/25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA	81 días?	lun 23/12/24	lun 14/04/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	lun 17/02/25	jue 20/02/25	100%	100%
Excavaciones varias sin Clasificar	4 días	mar 18/03/25	vie 21/03/25	100%	100%
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 20/01/25	vie 7/02/25	100%	100%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	56 días	lun 27/01/25	lun 14/04/25	100%	100%

131.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Hasta el 27 de mayo de 2025, la Inversión Programada fue de 202.034.766,00; la Inversión Ejecutada fue de 174.546.587,80. Es decir, el proyecto presenta un retraso en la inversión que se debía ejecutar por valor de 27.488.178,20.

131.9.3 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4.

131.9.4 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6.

132 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

132.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

132.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-926-2633 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-960-2733 de fecha 11/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-999-2792 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- Se realizó comité operativo no. 26, el día 17/7/25, para tratar el tema de la OPC.
- Se realizó comité operativo no. 27, el días 21/7/25.

132.1.2 Actividades Técnicas

El día 2 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 17 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras.

El día 5 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 18 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 8 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 19 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío plan de compras corregido.

El día 9 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 20 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 14 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 21 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de la nómina, alquiler de quipos, honorarios de profesionales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Corregir plan de compras.

El día 16 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 22 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

El día 21 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 23 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el estado de avance y presentación de plan de compras para desembolsos de materiales. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío plan de compras corregido.

El día 26 de mayo de 2025, se realizó el comité de operativo 24 con presencia de JAC vereda Media Cuesta, Comité de Participación Ciudadana e Interventoría, donde se revisó el plan de compras corregido. En la misma, se establecieron los siguientes compromisos: **1.** Envío de documentos para el desembolso.

Desde el 1 al 23 de mayo, fecha de finalización de las obras, la JAC ejecutó las siguientes actividades técnicas:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 0 ml, cantidad ejecutada: 0 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 7 ml, cantidad ejecutada: 5,25 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 26 ml, cantidad ejecutada: 8,65 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 4,16 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 24 ml, cantidad ejecutada: 393,79 kg.

Las actividades acumuladas que la Interventoría realizó seguimiento corresponden a:

- Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3.
- Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3.
- Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3.
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3.
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.

132.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2187 DE 2024 MUNICIPIO DE RISARALDA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de los periodos de Agosto de 2024 a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio, sin embargo, no hemos recibido los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

133 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Obra finalizada el 23 de mayo de 2025.
- El avance físico de la obra es del 100% e Inversión de 86,4% hasta el corte del presente periodo. Se ejecutaron las actividades de Excavaciones varias sin Clasificar, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4,48 m3. Subbase Granular Clase C, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 116,96 m3. Concreto reforzado de resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella, longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 86,49 m3. Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto – 40% Piedra para placa huella), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 27,07 m3. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI), longitud ejecutada: 156 ml, cantidad ejecutada: 4.266,02 m3.
- El avance financiero hasta el corte del presente periodo es de \$ 174.546.587,80 correspondiente al 86,4% del valor del convenio.
- Se encuentra pendiente la remisión de la póliza actualizada con la prórroga 01.

Que desde el 26 de marzo de 2025 está radicada en EL INSTITUTO la solicitud de No Objeción al plan de inversión social para la ejecución de la OPC, sin se haya tenido respuesta. Que la Interventoría en los conceptos técnicos emitidos en el caso de la prórroga No. 2 de los Convenios Solidarios que venían en ejecución, era que el tiempo que restaba hasta ese momento del plazo contractual no permitía la ejecución de las OPC, por lo que se requería prorrogar dicho convenio, sin embargo transcurrió dicho plazo sin que se obtuviese la No Objeción de la OPC que permitiera su ejecución.

134 ANEXO

134.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

134.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

134.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

134.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3169-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LOBOS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	369
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	370
1	INTRODUCCIÓN		372
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		374
2.1	Localización		374
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		375
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		375
2.4	Características técnicas del proyecto		375
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		375
3.1	Información general del contrato		376
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		377
3.3	Seguimiento Items no previstos		378
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		378
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		378
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	892
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	907
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	909
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	911
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	913
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	901
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		379
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		380
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		381
7	Conclusiones y recomendaciones		381
8	Anexos		381
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		915
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		917

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<div>CÓDIGO: MEPAMN-V-15-FR-2</div> <div>VERSION: 1</div> <div>PÁGINA: 1</div>																																																						
		FECHA: 30/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUPERVISOR CANTONAL VIAL DE GUAYAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 2025																																																								
CONVENIO No.: 3109-2024																																																								
<div>OBJETO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTRA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>OAC: JSA 359500 LOS LOBOS</div> <div>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2024 FECHA DE INICIO: 11/09/2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025 FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: HASTA EL 10/02/25 FECHA DE PRÓRROGA 1: 28/05/2024 PLAZO PRÓRROGA 1: HASTA EL 30/05/25 FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/05/2025 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DIAS FECHA DE REINICIO: 18/06/2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025 PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85.00</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.048.100.00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$. VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.048.100.00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$. ANTICIPO AMORTIZADO: \$.</div>																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ LUJANA TRATA																																																								
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRATADO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>m² 170.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Portones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td></tr></tbody></table> <div>AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>m² -</td><td>-</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Portones</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und -</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	m ² 170.00	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Portones			Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	m ² -	-	Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Portones			Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																						
Pavimentación	Construcción	m ² 170.00																																																						
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Portones																																																							
Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -																																																					
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																				
Pavimentación	Construcción	m ² -	-																																																					
	Mejoramiento																																																							
	Rehabilitación																																																							
Estructuras	Túneles																																																							
	Puentes																																																							
	Portones																																																							
Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -																																																					
	<div>AVANCE FINANCIERO</div> <div>VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES</div> <table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>151.477.350,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.544.321,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>43.526.429,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.548.100,00</td></tr></tbody></table> <div>Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO</div> <table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	151.477.350,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.544.321,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.526.429,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.548.100,00		VALOR	ACUMULADO	OBRAS			GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																												
	VALOR																																																							
OBRAS	151.477.350,00																																																							
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.544.321,00																																																							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.526.429,00																																																							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.548.100,00																																																							
	VALOR	ACUMULADO																																																						
OBRAS																																																								
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL																																																								
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																								
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																																						
<div>INVERSIÓN EN OBRA</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div> <div>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</div> <div>EMPLEOS GENERADOS EN EL MES</div> <div>MANO DE OBRA CALIFICADA:</div> <div>MANO DE OBRA NO CALIFICADA:</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</div> <div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</div>																																																								
<div>FOTO 1 - COMPACTACIÓN DE TERRENO</div> <div>FOTO 2 - COMPACTACIÓN DE TERRENO</div> <div>FOTO 3 - TOMA DE DENSIDADES</div>																																																								
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																								
<div>Firma</div> <div>Nombre: BIBIANA DALL'AGNINA</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL</div> <div>Original: Informa mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Técnica</div>																																																								

CONVENIO SOLIDARIO No. 3169-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”



MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS

VEREDA LOS LOBOS

135 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Los Lobos el municipio de PALESTINA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3169 de 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA **VEREDA LOS LOBOS** DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$201.048.100,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

136 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

136.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Palestina se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Anserma y Manizales, al oriente con Manizales, al sur con Chinchiná, y al occidente con Chinchiná y Risaralda. Se sitúa a 29 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial que conduce desde la vereda El Reposo, sector finca El Barranco hasta la vereda Los Lobos (La Paloma – Los Lobos), con longitud total de 1,6 km, de los cuales se intervendrán 170 ml de placa huella.



Ilustración 52 Localización del municipio de Palestina (Caldas).

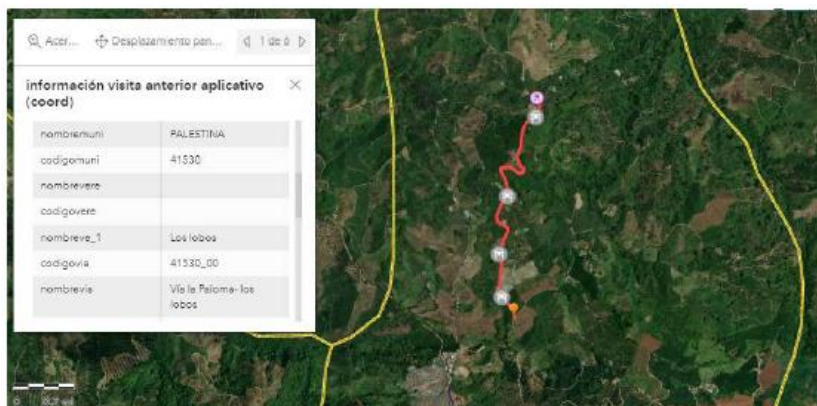


Ilustración 53 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

136.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Los lobos, en el corredor vial que conduce desde La Vereda El Reposo, Sector Finca El Barranco hasta La Vereda Los Lobos, del Municipio de Palestina.

136.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

136.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 170 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,40 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

137 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

137.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6639149
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS LOBOS
NIT.	901.836.107-6

TELÉFONO:	3176072076	
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3169-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/08/2024	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.048.100,00 M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE	
VALOR TOTAL:	\$201.048.100,00 M/CTE	
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE	
ESTADO:	EN EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024	
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25	
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25	
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25	
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25	
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025	
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ	
GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LOBOS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340107 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100086353		
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.104.810,00	14/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.052.405,00	14/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.209.620,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$260.000.000,00	14/08/2024	31/12/2024
Contratistas y Subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Patronal			

Tabla 40 Información general del Convenio 3169-2024 Municipio Palestina.

137.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

137.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/07/25, remitió la hoja de vida del maestro, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, remitió los contratos de prestación de servicios contadora e ingeniera residente.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/07/25, remitió el plan de compras para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/07/25, remitió el plan de compras para revisión y aprobación.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 21/07/25, remitió documentación compromiso de los comité operativo iniciales.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, remitió los contratos de los profesionales.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 24/07/25, remitió hoja de vida del maestro de obra, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 30/7/25, remitió la propuesta de inversión social.
- Se realizó comité operativo no. 2 3 y 4, los días 15/7/25, 16/7/25 y 18/7/25.

137.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El acta de inicio de Obra tiene fecha de 28 de julio/25

137.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

137.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 28 de julio de 2025. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	0	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0

138 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

138.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 20.1

138.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 20.3

138.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1046–2927 de fecha 24 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Claudia Ceballos
Contador	Maritza Pineda Torres
Maestro de Obra	Luis Eduardo Hincapié

Tabla 41 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 20.4

138.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

138.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 20.5

138.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 20.6

138.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 20.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3169 de 2024

138.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

138.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

138.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

138.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se tienen un seguimiento a las actividades ejecutadas por que el acta de inicio tiene fecha de 28 de julio de 2025.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
☐ CONVENIO 3169-2024	59,5 días	lun 28/07/25	vie 3/10/25	4%
☐ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	59 días	lun 28/07/25	vie 3/10/25	4%
Excavaciones varias sin Clasificar	13 días	lun 28/07/25	lun 11/08/25	27%
Subbase Granular Clase C	36 días	vie 1/08/25	jue 11/09/25	0%
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	41 días	lun 18/08/25	vie 3/10/25	0%
Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (G)	40 días	vie 8/08/25	lun 22/09/25	0%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	45 días	mar 29/07/25	jue 18/09/25	6%

138.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 28 de julio de 2025.

138.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

138.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

139 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

139.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

139.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-932-2639 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-964-2738 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-981-2760 de fecha 14/7/25, remitió la aprobación de las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-989-2782 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1006-2803 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1069-2993 de fecha 29/7/25, remitió a la JAC el acta de inicio de obra.
- Se realizó comité operativo no. 2 3 y 4, los días 15/7/25, 16/7/25 y 18/7/25.

139.1.2 Actividades Técnicas

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 28 de julio de 2025.

139.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3169 DE 2024 MUNICIPIO DE PALESTINA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

140 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 28 de julio de 2025.

141 ANEXO

141.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

141.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 20.7

141.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 08

2-31 DE JULIO DE 2025

141.4BITÁCORA

Ver anexo 20.8

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3530-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.		FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	384
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	385
1	INTRODUCCIÓN		387
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		389
2.1	Localización		389
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		390
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		390
2.4	Características técnicas del proyecto		390
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		390
3.1	Información general del contrato		391
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		392
3.3	Seguimiento Items no previstos		392
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		392
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		393
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	923
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		394
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		395
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		395
7	Conclusiones y recomendaciones		395
8	Anexos		396
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MEP-NN-RN-16-PR-2																																				
		VERSION 1																																				
		PÁGINA																																				
		FECHA 30/07/2025 (Día / Mes / Año)																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS	PERIODO MES: JUL-25																																				
CONVENIO No.: 3801-2024	PLAZO INICIAL: 10/07/2024 FECHA DE INICIO: 10/07/2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10/07/2024 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 10/12/2024 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES FECHA DE TERMINACIÓN: 26/02/2025 FECHA DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/02/2025 PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 28/04/2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025 PLAZO SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/04/2025 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 21/06/25 PLAZO SUSPENSIÓN 01: 30/06/2025 FECHA DE REINICIO: 21/06/2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025 PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 72,00	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.472.544,00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$. VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.472.544,00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$. ANTICIPO AMORTIZADO: \$.																																				
OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FIADILLA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																						
OAC: JAC VEREDA SAN LUIS																																						
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3801-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUJZ JULIANA TRATA																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>mil</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Portones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	mil		Mejoramiento			Rehabilitación		Estructuras	Túneles			Puentes			Portones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und									
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																				
Pavimentación	Construcción	mil																																				
	Mejoramiento																																					
	Rehabilitación																																					
Estructuras	Túneles																																					
	Puentes																																					
	Portones																																					
Mantenimiento																																						
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und																																				
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																						
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>mil</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Portones</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Obras de Drenaje</td><td>und</td><td>-</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	mil	-		Mejoramiento		-		Rehabilitación		-	Estructuras	Túneles		-		Puentes		-		Portones		-	Mantenimiento			-	Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und	-
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																			
Pavimentación	Construcción	mil	-																																			
	Mejoramiento		-																																			
	Rehabilitación		-																																			
Estructuras	Túneles		-																																			
	Puentes		-																																			
	Portones		-																																			
Mantenimiento			-																																			
Otros (Especificar cuáles)	Obras de Drenaje	und	-																																			
AVANCE FINANCIERO																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																				
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>152.646.098,00</td></tr><tr><td>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</td><td>4.579.382,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>42.747.104,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>199.972.544,00</td></tr></tbody></table>			VALOR	OBRAS	152.646.098,00	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.579.382,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.747.104,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.972.544,00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		VALOR	ACUMULADO	OBRAS			GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS			VALOR EJECUTADO	0,00	0,00											
	VALOR																																					
OBRAS	152.646.098,00																																					
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.579.382,00																																					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.747.104,00																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.972.544,00																																					
	VALOR	ACUMULADO																																				
OBRAS																																						
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL																																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																						
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00																																				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																						
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$.		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																				
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																				
REGISTRO FOTOGRAFICO																																						
N.A.																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar si está en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																						
Firma Nombre: BIBIANA PATERMINA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivos de Gestión del PNOIAB. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small>																																						

CONVENIO SOLIDARIO No. 3530-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA SAN LUIS

142 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda San Luis el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3530 de 2024 de fecha 05 de septiembre de 2024 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA **VEREDA SAN LUIS** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.472.544,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No.1 suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

143 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

143.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde a los corredores viales denominados San Luis - El Caribe y San Luis – La Primavera (La Primavera y El Coliseo) con longitud total de 0,532 km, de los cuales se intervendrán 158 ml de placa huella.




Ilustración 54 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

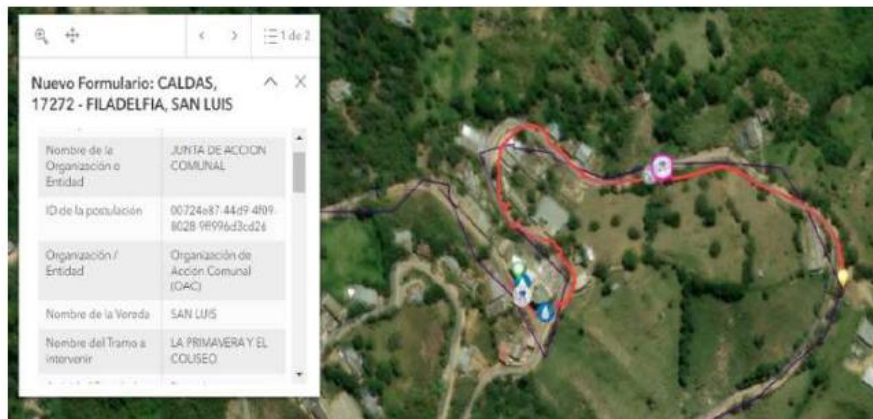


Ilustración 55 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

143.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda San Luis, en el corredor vial que comunica a San Luis - El Caribe y San Luis - La Primavera, del Municipio de Filadelfia.

143.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

143.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 158 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

144 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

144.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6729720
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN LUIS
NIT.	901.074.721-8

TELÉFONO:	3176072076	
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3530-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/09/2024	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$201.472.544,00 M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE	
VALOR TOTAL:	\$201.472.544,00 M/CTE	
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE	
ESTADO:	EN EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO:	N.A.	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024	
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25	
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25	
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25	
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25	
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025	
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ	
GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100343729 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087392		
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.147.254,00	05/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.073.627,00	05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.294.509,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	05/09/2024	31/12/2024

Tabla 42 . Información general del Convenio 3530-2024 Municipio Filadelfia.

144.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

144.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/7/25, remitió las hojas de vida solicitadas.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 17/7/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 1.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 28/7/25, remitió las hojas de vida.
- Se realizó comité operativo no. 1, el día 21/7/25.

144.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

144.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

144.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
--------	------------	---------------	----------------

Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	120,87	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	93,84	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	29,24	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4326,09	0

145 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

145.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

145.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1060–2975 de fecha 28 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Jerson Castañeda
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Javier Ramírez

Tabla 43 Personal Convenio Solidario

145.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

145.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

145.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

145.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 21.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3530 de 2024

145.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

145.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

145.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

145.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

145.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

145.9.3.1 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

145.9.4 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

146 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

146.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

146.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-933-2640 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-961-2734 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC la radicación de las hojas de vida.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-972-2745 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-985-2778 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1008-2805 de fecha 16/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1014-2811 de fecha 16/7/25, remitió observaciones sobre las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1059-2948 de fecha 28/7/25, remitió a la JAC las aprobaciones de las hojas de vida.
- Se realizó comité operativo no. 1, el días 21/7/25.

146.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

146.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3530 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

A la fecha de corte de este informe la Interventoría recibió del OAC, los extractos bancarios de febrero a junio 2025 de la cuenta corriente para validar los rendimientos financieros generados desde el momento en que EL INSTITUTO hizo la transferencia de los recursos de este convenio. La Interventoría se encuentra a la espera de los soportes del giro de dichos rendimientos al Tesoro Nacional.

147 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida,

socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.

- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Al corte de este informe EL INSTITUTO aún tiene pendiente *“realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio al OAC en la Etapa de Alistamiento”*, obligación que está dentro de los documentos que hacen parte del Convenio Solidario y que ha sido recordada por la Interventoría en cinco oportunidades a través de los oficios CINP-555-530-1155 del 18/03/2025, CINP-555-583-1405 del 04/04/2025, CINP-555-644-1666 del 25/04/2025, CINP-555760-2029 del 15/05/2025 y CINP-555-791-2138 del 23/05/2025. Sin esta información no era posible iniciar la etapa de ejecución de dicho convenio.

148 ANEXO

148.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

148.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

148.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

148.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3652-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	398
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	399
1	INTRODUCCIÓN		401
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		403
2.1	Localización		403
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		404
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		404
2.4	Características técnicas del proyecto		404
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		404
3.1	Información general del contrato		405
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		406
3.3	Seguimiento Items no previstos		406
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		406
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		408
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	930
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N.A.
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		409
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		410
7	Conclusiones y recomendaciones		410
8	Anexos		410
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



FECHA: 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 8650-2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FLADELIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

OAC: JAC VEREDA EL VERSO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE INICIO: 31/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 2/03/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 28/04/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 02: 20/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 20/05/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21 DÍAS
FECHA DE REINICIO: 18/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 75.00

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.999.712.00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.999.712.00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JULIANA IBATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m2
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und
		2.00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m2	-
	Mejoramiento		-
	Rehabilitación		-
Estructuras	Túneles		-
	Puentes		-
	Pontones		-
Mantenimiento			-
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
			-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.349.318.00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.600.479.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.499.917.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	200.449.712.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$.
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRAFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA PATERMINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3652-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS

VEREDA EL VERSO

149 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda El Verso el municipio de FILADELFIA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3652 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA EL VERSO** DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.949.712,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que irá hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 20 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que irá hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que irá hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

150 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

150.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con Riosucio y la Merced, al oriente con Aranzazu, al sur con Neira, y al occidente con Risaralda. Se sitúa a 49 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso con longitud total de 0,322 km, de los cuales se intervendrán 141 ml de placa huella y dos obras de arte tipo alcantarilla.

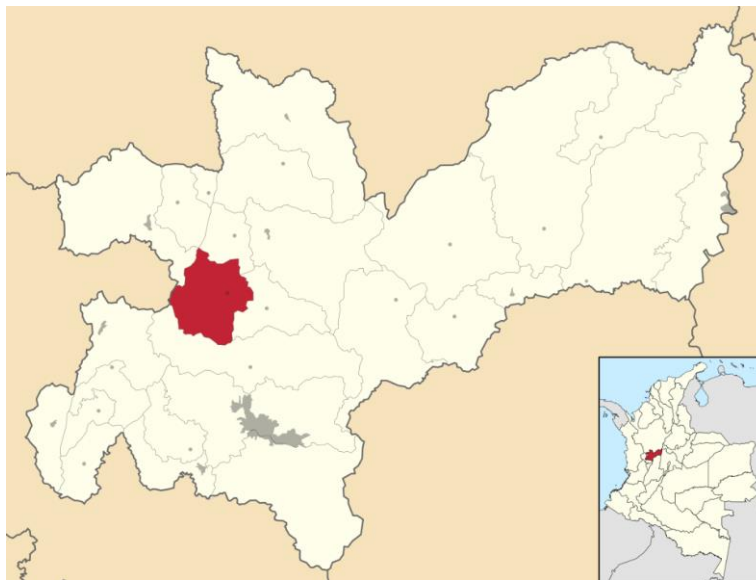


Ilustración 56 Localización del municipio de Filadelfia (Caldas).

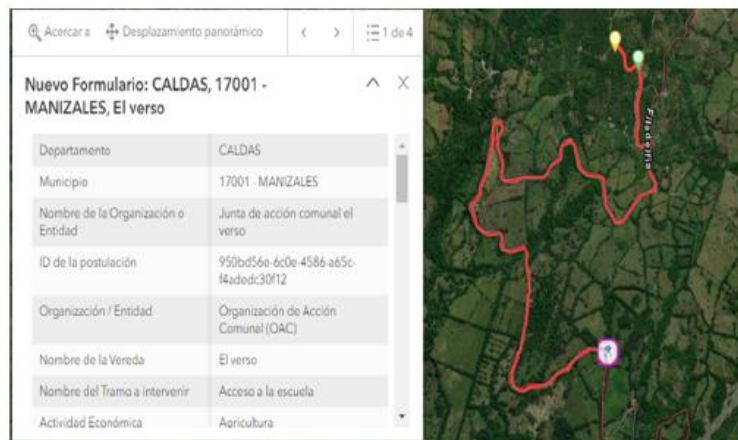


Ilustración 57 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

150.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda El Verso, en el corredor vial del Corregimiento El Verso, Poblado El Verso – Escuela El Verso (Acceso a La Escuela), del Municipio de Filadelfia.

150.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

150.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 141 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,50 metros y dos obras de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

151 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

151.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6754522
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL VERSO
NIT.	900.001.790-1

TELÉFONO:	3193164956	
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3652-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL VERSO DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.949.712,00 M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE	
VALOR TOTAL:	\$ 201.949.712,00 M/CTE	
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE	
ESTADO:	EN EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO:	2/10/24	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024	
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25	
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25	
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25	
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25	
PRÓRROGA No.1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25	
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025	
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ	
GARANTÍAS		
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERSO toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344549 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087610		
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias

		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.194.971,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.097.486,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.389.942,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024
Contratistas y Subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Patronal			

Tabla 44 Información general del Convenio 3652-2024 Municipio Filadelfia.

151.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

151.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 8/07/25 y 9/07/25, remitió las hoja de vida para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 11/7/25, 15/7/25 y 16/7/25, remitió la hojas de vida del contador.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/7/25, remitió los documentos de la OPC
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 21/7/25 y 22/7/25, remitió las hojas de vida y documentación del personal requerido en obra.
- Se realizó comité operativo no. 1 y 2, los días 17/7/25 y 24/7/25.

151.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

151.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

151.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	3,21	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	86,59	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	70,17	0
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	18,18	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3721,25	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	104,80	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	11,60	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0,90	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	19,10	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	1157,80	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	55,80	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	14,00	0

152 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

152.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

152.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1040–2921 de fecha 24 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Oxfaro Bustamante
Contador	Alejandro García
Maestro de Obra	Giraldo Rios

Tabla 45 Personal Convenio Solidario

152.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

152.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

152.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

152.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 22.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3652 de 2024

152.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

152.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

152.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

152.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

152.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

152.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

152.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

153 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

153.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

153.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-935-2642 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-957-2730 de fecha 11/7/25, remitió a la JAC las no conformidades de la obra.

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-973-2746 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-979-2758 de fecha 15/7/25, remitió observaciones sobre las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-986-2779 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1011-2808 de fecha 16/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1015-2812 de fecha 16/7/25, remitió observaciones sobre las hojas de vida enviadas por la JAC.
- Se realizó comité operativo no. 1 y 2, los días 17/7/25 y 24/7/25.

153.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

153.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3652 DE 2024 MUNICIPIO DE FILADELFIA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 25/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Junio 2025, se encuentra a la espera de los soportes del giro al Tesoro Nacional.

154 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera del reinicio del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez se reinicie el proyecto.

155 ANEXO

155.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

155.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

155.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

155.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3622-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8

MES O PERIODO:

1 AL 31 DE JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	413
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	414
1	INTRODUCCIÓN		416
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		417
2.1	Localización		417
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		418
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		418
2.4	Características técnicas del proyecto		419
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		419
3.1	Información general del contrato		419
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		420
3.3	Seguimiento Items no previstos		420
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		420
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		421
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	937
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		422
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		423
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		423
7	Conclusiones y recomendaciones		423
8	Anexos		424
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPI-MN-IN-15-PR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUN 25

CONVENIO No.: 0000-2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 30/12/25

OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

OAC: JACQUES ALDO CABUYAL

FECHA DE INICIO: 30/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025
FECHA DE PRORROGA 01: N.A.
PLAZO PRORROGA 01: N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 01: N.A.
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 70,00

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.471.038,00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.471.038,00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0000-2024 INTERVENTOR: SONOROSCO GORDO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUANA TRATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación Construcción	m ²	153,00
Pavimentación Mejoramiento		
Estructuras Rehabilitación		
Estructuras Túneles		
Estructuras Puentes		
Estructuras Pontones		
Mantenimiento Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación Construcción	m ²	-	-
Pavimentación Mejoramiento			
Estructuras Rehabilitación			
Estructuras Túneles			
Estructuras Puentes			
Estructuras Pontones			
Mantenimiento Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und -	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	152.089.476,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.562.684,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.318.878,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.971.038,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)		
GESTION SOCIAL (PREACTA)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$.
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONTRATO VENCIDO

Firma:
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082025024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3622-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA ALTO CABUYAL

156 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Alto Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3622 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **ALTO CABUYAL** DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.471.038,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 20 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 19 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

157 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

157.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Alto Cabuyal – Marmato con longitud total de 0,533 km, de los cuales se intervendrán 163 ml de placa huella.



Ilustración 58 Localización del municipio de Supía (Caldas).

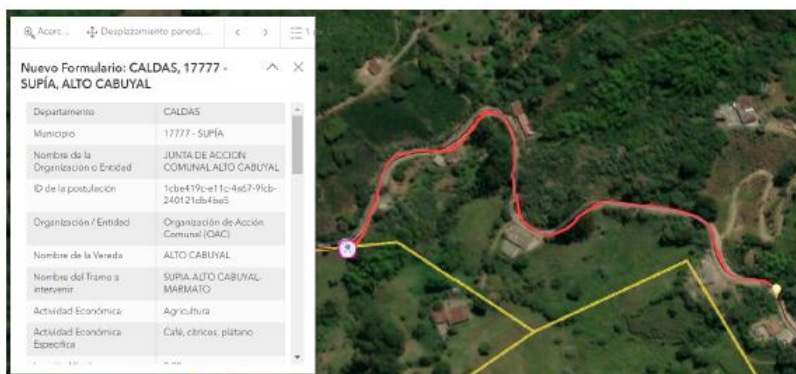


Ilustración 59 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

157.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Alto Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

157.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

157.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 163 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

158 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

158.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6749209
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO CABUYAL
NIT.	901.087.231-7
TELÉFONO:	3206230119
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3622-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.471.038,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$201.471.038,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	VENCIDO
FECHA DE INICIO:	2/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 20/12/24
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	2/3/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 2 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344551 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No NB-100087618			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.147.104,00	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.073.552,00	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.294.208,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 46 Información general del Convenio 3622-2024 Municipio Supía.

158.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

158.2.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

158.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

158.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

158.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se vencido.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
--------	------------	---------------	----------------

Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,09	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	132,18	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	96,7	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	37,46	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4463,13	0

159 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

159.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

159.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

159.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

159.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

159.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 23.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3622 de 2024

159.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

159.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

159.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

159.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

159.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

159.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

159.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

160 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

160.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

160.1.1 Actividades Administrativas

No aplica para el periodo.

160.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

160.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3622 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a Abril de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

161 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al corte del presente informe, el Convenio se encuentra vencido, la fecha de terminación conforme a la suscripción del Acta de Suspensión No. 1, fue el 02/03/25.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.
- Que, a pesar de NO haberse superado la causal de la Suspensión No. 1 del Convenio No. 3622 de 2024, para el 19 de febrero de 2025 cuando se completaron los dos (2) meses de suspensión, el OAC no presentó ninguna solicitud de ampliación de dicha suspensión, por lo que el Convenio se reinició, quedando como nueva fecha de terminación el 2 de marzo de 2025.
- Que EL INSTITUTO a pesar de saber que el OAC no tenía ningún interés en continuar con la ejecución del Convenio Solidario No. 3622 de 2024, al no prorrogar la suspensión No. 1, procedió a realizar el giro de los recursos.
- A la fecha de corte de este informe, EL INSTITUTO no ha indicado como se va a proceder con este convenio que está vencido, no hubo ejecución de las obras contempladas en dicho convenio y tiene los recursos en la cuenta corriente, solicitud que realizó la Interventoría a través del oficio CINP-555-475-0948 del 4 de marzo de 2025.

162 ANEXO

162.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

162.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

162.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

162.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3983-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	426
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	427
1	INTRODUCCIÓN		429
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		431
2.1	Localización		431
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		432
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		432
2.4	Características técnicas del proyecto		432
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		432
3.1	Información general del contrato		433
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		434
3.3	Seguimiento Items no previstos		434
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		434
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		434
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	944
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		436
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		437
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		437
7	Conclusiones y recomendaciones		437
8	Anexos		438
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

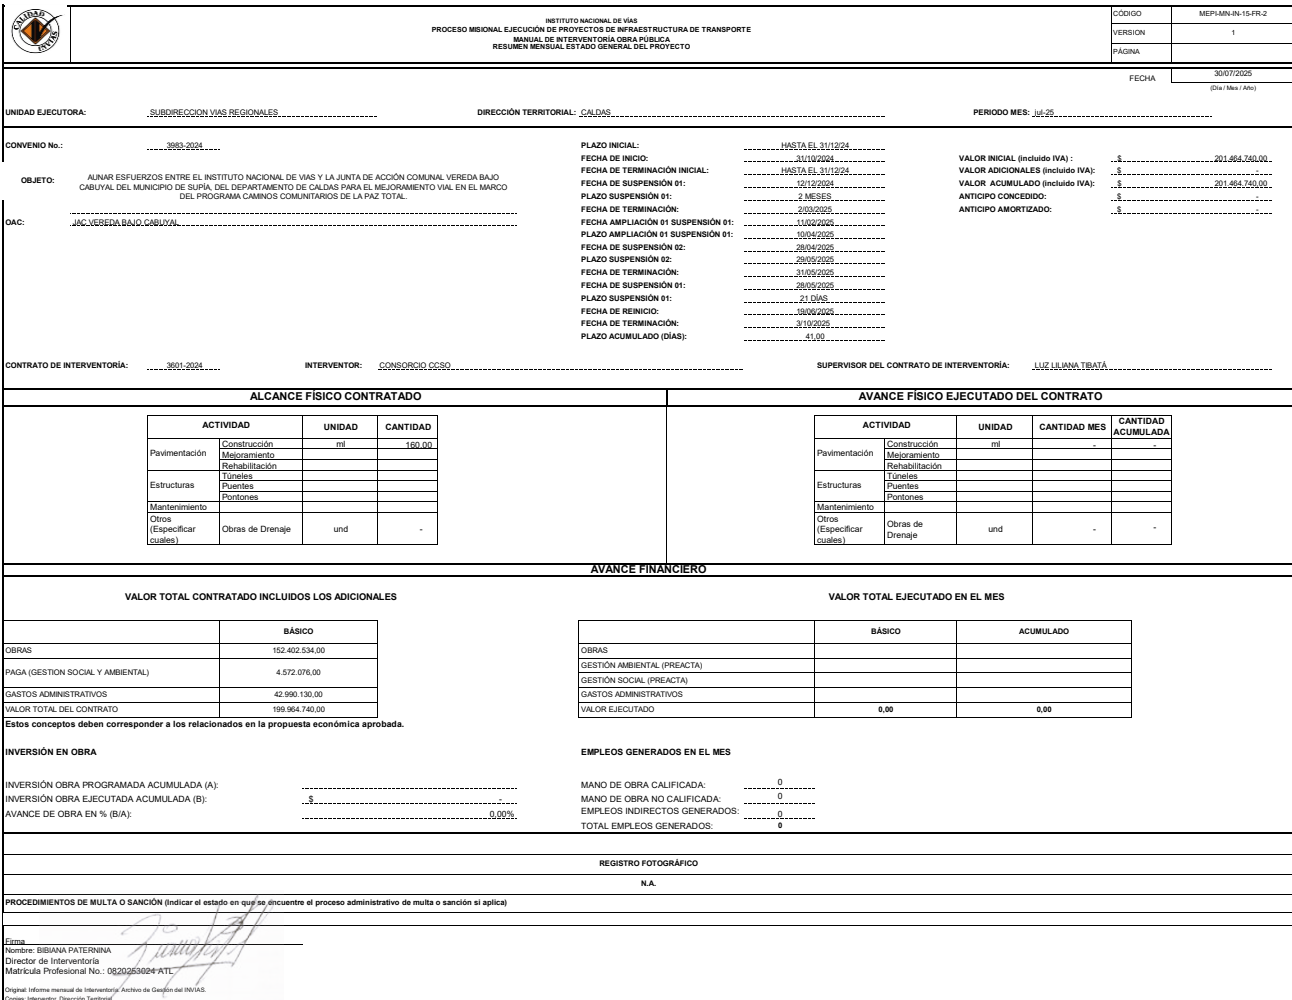

CONVENIO SOLIDARIO No. 3983-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

VEREDA BAJO CABUYAL

163 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC Vereda Bajo Cabuyal el municipio de SUPÍA, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3983 de 2024 de fecha 27 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$201.464.740,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de mayo de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación no. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que irá hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que irá hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que irá hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 1 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

164 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

164.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Supía se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con La Merced y Marmato, al sur y al occidente con Riosucio. Se sitúa a 80 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce (2508CL10) (K0+000 AL K6+100) o Supía – Bajo Cabuyal – Marmato, con longitud total de 0,221 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.



Ilustración 60 Localización del municipio de Supía(Caldas).

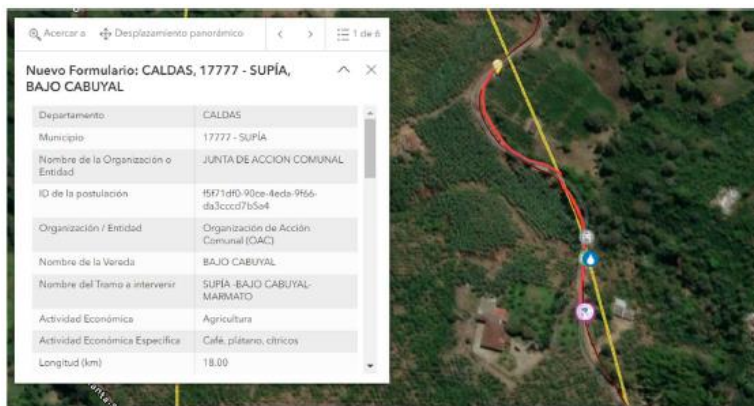


Ilustración 61 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

164.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en la Vereda Bajo Cabuyal, en el corredor vial denominado Partidas – San Juan – El Cruce, del Municipio de Supía.

164.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

164.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 160 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 4,80 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

165 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

165.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6825043
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BAJO CABUYAL
NIT.	901.087.159-4
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3983-2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO CABUYAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.464.740,00 M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE		
VALOR TOTAL:	\$201.464.740,00 M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE		
ESTADO:	EN EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO:	31/10/24		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25		
SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 30/05/25 28/04/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 18/6/25		
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO CABUYAL toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100348653 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100088928			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			

Cumplimiento	\$20.146.474,00	01/10/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.073.237,00	01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.292.948,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	01/10/2024	31/12/2024

Tabla 47 Información general del Convenio 3983-2024 Municipio Supía.

165.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

165.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 14/7/25, remitió las hojas de vida de los profesionales.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 21/7/25 y 24/7/25, remitió las hojas de vida y documentación ingeniero residente y maestro de obra.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 30/7/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 3.
- Se realizó comité operativo no. 1 y 2, los días 15/7/25 y 21/7/25.

165.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

165.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

165.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra suspendido. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	5,20	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	134,64	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	95,36	0
4	Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	41,31	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4418,26	0

166 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

166.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

166.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–1049–2930 de fecha 24 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Jaime Pardo
Contador	Elizabeth Gómez
Maestro de Obra	Guillermo Moreno

Tabla 48 Personal Convenio Solidario

166.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

166.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

166.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

166.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 24.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3983 de 2024

166.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

166.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

166.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

166.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

166.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

166.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

166.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

167 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

167.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

167.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-926-2643 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
hojas de vida.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-974-2747 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-980-2759 de fecha 14/7/25, remitió la aprobación de las hojas de vida enviadas por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-993-2786 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1012-2809 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1026-2864 de fecha 21/7/25, remitió aprobación a las hojas de vida enviadas por la JAC.
- Se realizó comité operativo no. 1 y 2, los días 15/7/25 y 21/7/25.

167.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

167.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3983 DE 2024 MUNICIPIO DE SUPÍA

La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de abril de 2025, se encuentra a la espera del resto de extractos pendientes y los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

168 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el

mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

- Al corte de este informe EL INSTITUTO aún tiene pendiente “*realizar la entrega de los informes y resultados de los ensayos de laboratorio al OAC en la Etapa de Alistamiento*”, obligación que está dentro de los documentos que hacen parte del Convenio Solidario y que ha sido recordada por la Interventoría en cinco oportunidades a través de los oficios CIMP-555-530-1155 del 18/03/2025, CIMP-555-583-1405 del 04/04/2025, CIMP-555-644-1666 del 25/04/2025, CIMP-555760-2029 del 15/05/2025 y CIMP-555-791-2138 del 23/05/2025. Sin esta información no era posible iniciar la etapa de ejecución de dicho convenio.

169 ANEXO

169.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

169.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

169.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

169.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3646-2024

Contratista: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	440
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	441
1	INTRODUCCIÓN		443
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		445
2.1	Localización		445
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		446
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		446
2.4	Características técnicas del proyecto		447
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		447
3.1	Información general del contrato		447
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		448
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		449
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		449
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		450
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N.A.
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	951
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		451
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A. N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A. N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		451
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A. N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		452
7	Conclusiones y recomendaciones		452
8	Anexos		452
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPI-MV-IN-15-PR-2
VERSION: 1
PÁGINA:

FECHA: 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 8646-2024
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
OAC: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA
PLAZO INICIAL: 1995/07/01
FECHA DE INICIO: 31/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 1995/07/31
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 30/09/2025
FECHA DE PRORROGA 01: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01: 30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30/09/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21/04/25
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 41,00
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 200.460.667,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.460.667,00
ANTICIPO CONCEDIDO: \$
ANTICIPO AMORTIZADO: \$

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 8601-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CGSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUANITA BATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m	132,00	Pavimentación	Construcción	m	-
	Mejoramiento				Mejoramiento		
	Rehabilitación				Rehabilitación		
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles		
	Puentes				Puentes		
	Pontones				Pontones		
Mantenimiento				Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	
	VALOR	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	152.263.198,00		
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.567.896,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.129.573,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.960.667,00	0,00	0,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%
MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRAFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 AT-L

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAE.
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3646-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA

170 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el Cabildo Resguardo Indígena La Montaña el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3646 de 2024 de fecha 11 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.460.667,00M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 27 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

171 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

171.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Riosucio- El Salado Sector las Brisas (La Candelaria - El Salado), con longitud total de 1,32 km, de los cuales se intervendrán 160 ml de placa huella.

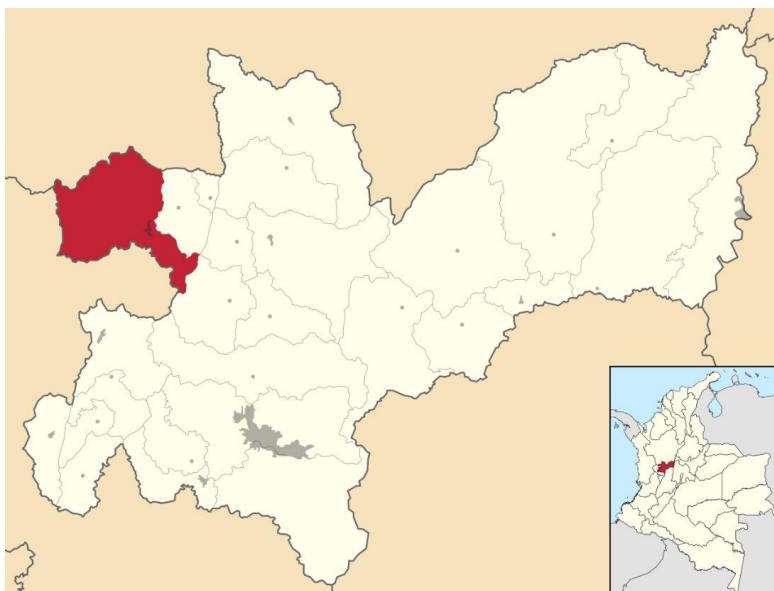


Ilustración 62 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

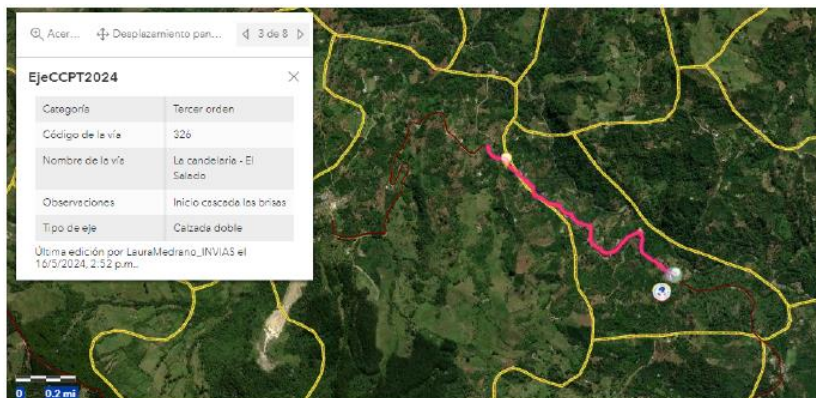


Ilustración 63 Localización vía a intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

171.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial La Montaña, en el corredor vial denominado Riosucio El Salado Sector Las Brisas (La Candelaria - El Salado), del Municipio de Riosucio.

171.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR



Ilustración 64 Estado inicial de la vía

171.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 132 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

172 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

172.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6753657
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA
NIT.	810.003.235- 6.
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3646-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 200.460.667,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$200.460.667,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	31/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25		
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25		
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 23/6/25		
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25		
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 30/10/25		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344899 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100087740			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.046.067,20	11/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.023.033,35	11/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.092.133,40	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	11/09/2024	31/12/2024

Tabla 49 . Información general del Convenio 3646-2024 Municipio Riosucio.

172.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

172.2.1 Actividades Administrativas

- Se realizó comité operativo no. 1, el días 21/7/25.

172.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

172.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

172.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra en la etapa de alistamiento.

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	6,00	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	151,47	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,42	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	71,52	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	4040,14	0

173 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

173.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

173.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del oficio CINP–555–768-2067 de fecha 20 de mayo de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Giancarlo Velásquez
Contador	Ana Bañol

Tabla 50 Personal Convenio Solidario

173.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

173.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

173.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

173.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 25.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3646 de 2024.

173.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

173.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

173.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

173.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

173.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

173.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

173.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

174 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

174.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

174.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-939-2646 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-951-2711 de fecha 9/7/25, solicitó a la JAC el contacto del Gobernador para la comunicación del proyecto.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-965-2739 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-992-2785 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CIMP-555-992-2785 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 30/7/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 2.
- Se realizó comité operativo no. 1, el día 21/7/25.

174.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

174.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3646 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario de los meses de Febrero a Junio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

175 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la etapa de alistamiento.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún ésta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

176 ANEXO

176.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

176.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

176.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

176.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2569-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	454
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	455
1	INTRODUCCIÓN		457
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		459
2.1	Localización		459
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		460
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		460
2.4	Características técnicas del proyecto		460
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		461
3.1	Información general del contrato		461
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		462
3.3	Seguimiento Items no previstos		462
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		463
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		464
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N/A
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	958
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		465
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		466
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		466
7	Conclusiones y recomendaciones		467
8	Anexos		467
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO: MEPI-MV-IN-15-PR-2
VERSION: 1
PÁGINA:

FECHA: 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL 25

CONVENIO No.: 0000-2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO I DEL MUNICIPIO DE ROSICÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 07/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 12/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 10/09/2025
FECHA DE PRORROGA 01: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01: 30/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 28/09/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21/09/25
FECHA DE REINICIO: 19/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/09/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 85,00

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 200.492.839,00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 200.492.839,00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

OAC: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO I

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0001-2024 INTERVENTOR: CONSULTORÍA CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUANITA BATA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m2
	Mejoramiento	152,00
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und
		1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m2	-
	Mejoramiento		-
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-
			-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
OBRAS	151.145.378,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.534.361,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.308.102,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.987.839,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRAFICO

N.A.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA BATEPUNHA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAE.
Gestión: Interventoría, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 2569-2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II

177 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con la JAC de los Barrios Primero De Mayo Y Rotario II el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 2569 de 2024 de fecha 23 de julio de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS **BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$200.487.839,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7" y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un

valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

178 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

178.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial hacia la vereda San Antonio, con longitud total de 0,175 km, de los cuales se intervendrán 152 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

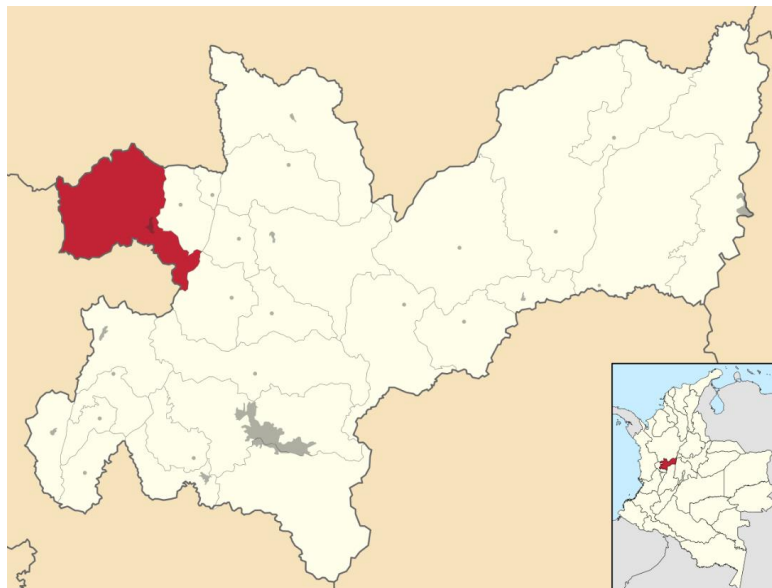


Ilustración 65 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).



Ilustración 54 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps

Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

178.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en los Barrios Primero De Mayo y Rotario II, en el corredor vial que conduce hacia la Vereda San Antonio, del Municipio de Riosucio.

178.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR



Ilustración 66 Estado inicial de la vía

178.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 152 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 7 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

179 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

179.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6550015
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II
NIT.	901.609.419- 6
DIRECCIÓN:	CL 8 12 17 BRR Rotatorio II
TELÉFONO:	3122505656
CONVENIO SOLIDARIO No.:	2569-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/07/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 200.487.839,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$200.487.839,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN NO. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25		
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025		
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ		
GARANTÍAS			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100335863 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100084975			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.048.784,00	23/07/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.024.392,00	23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.097.568,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	23/07/2024	31/12/2024

Tabla 51 Información general del Convenio 2569-2024 Municipio Riosucio.

179.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

179.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 18/07/25, 21/7/25, 22/7/25 y 24/7/25, remitió la documentación inicial compromiso de los comité operativo.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 30/7/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 6.
- Se realizó comité operativo no. 4, 5 y 6, los días 18/7/25, 21/7/25 y 24/7/25.

179.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El acta de inicio de Obra tiene fecha de 30 de julio/25

179.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

179.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 30 de julio de 2025. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETA						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	0	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	0	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (Clase F) - mezcla in situ	M3	0%	0%	0	0
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA	M3	0%	0%	0	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase D) - mezcla in situ para placa huella					
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm ² (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	0	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	0	0

180 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

180.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

180.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CIMP-555-727-1899, CIMP-555-947-2699 y CIMP-555-1042-2923 de fechas 9 de mayo de 2025, 9 y 24 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Diego Alejandro Mejía
Contador	Doris Rivera
Maestro de obra	Mario Uchima

Tabla 52 Personal Convenio Solidario

180.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

180.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

180.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

180.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 26.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 2569 de 2024

180.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

180.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

180.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

180.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se tienen un seguimiento a las actividades ejecutadas por que el acta de inicio tiene fecha de 30 de julio de 2025.

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Programado %
☐ SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	48 días	mié 30/07/25	vie 3/10/25	5%
☐ CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	48 días	mié 30/07/25	vie 3/10/25	5 %
Excavaciones varias sin Clasificar	6 días	mié 30/07/25	mié 6/08/25	83
Subbase Granular Clase C	15 días	lun 11/08/25	vie 29/08/25	0%
Concreto Reforzado resistencia 21 Mpa (D) - Mezcla in situ	28 días	mié 27/08/25	<u>vie 3/10/25</u>	0%
Concreto Ciclopeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% Concreto - 40% Piedra para placa huella	30 días	jue 14/08/25	mié 24/09/25	0%
Acero de refuerzo de Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	30 días	jue 21/08/25	mié 1/10/25	0%
OTRAS ACTIVIDADES	1 día	mié 30/07/25	mié 30/07/25	0%

180.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 30 de julio de 2025.

180.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

180.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

181 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

181.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

181.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-931-2638 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-947-2699 de fecha 9/7/25, remitió aprobación a la hoja de vida del Ingeniero enviada por la JAC.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-967-2740 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-987-2780 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1005-2802 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- Se realizó comité operativo no. 4, 5 y 6, los días 18/7/25, 21/7/25 y 24/7/25.

181.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El acta de inicio de Obra tiene fecha de 30 de julio/25

181.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 2569 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de Febrero a junio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

182 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El acta de inicio de obra, se firmó el 30 de julio de 2025.
- La Interventoría se encuentra a la espera de la reanudación del convenio, para continuar con la etapa de alistamiento, revisión y aprobación de las hojas de vida, socialización del proyecto y la conformación del comité operativo, una vez reinicie el proyecto.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

183 ANEXO

183.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

183.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

183.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

183.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO- LOMAPRIETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3286-2024

Contratista: RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	469
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	470
1	INTRODUCCIÓN		472
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		474
2.1	Localización		474
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		475
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		475
2.4	Características técnicas del proyecto		475
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		475
3.1	Información general del contrato		476
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		477
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		478
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		478
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		479
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N/A
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N.A.
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N.A.
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N.A.
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N.A.
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	965
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		480
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A. N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A. N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		480
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A. N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		481
7	Conclusiones y recomendaciones		481
8	Anexos		481
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N.A.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

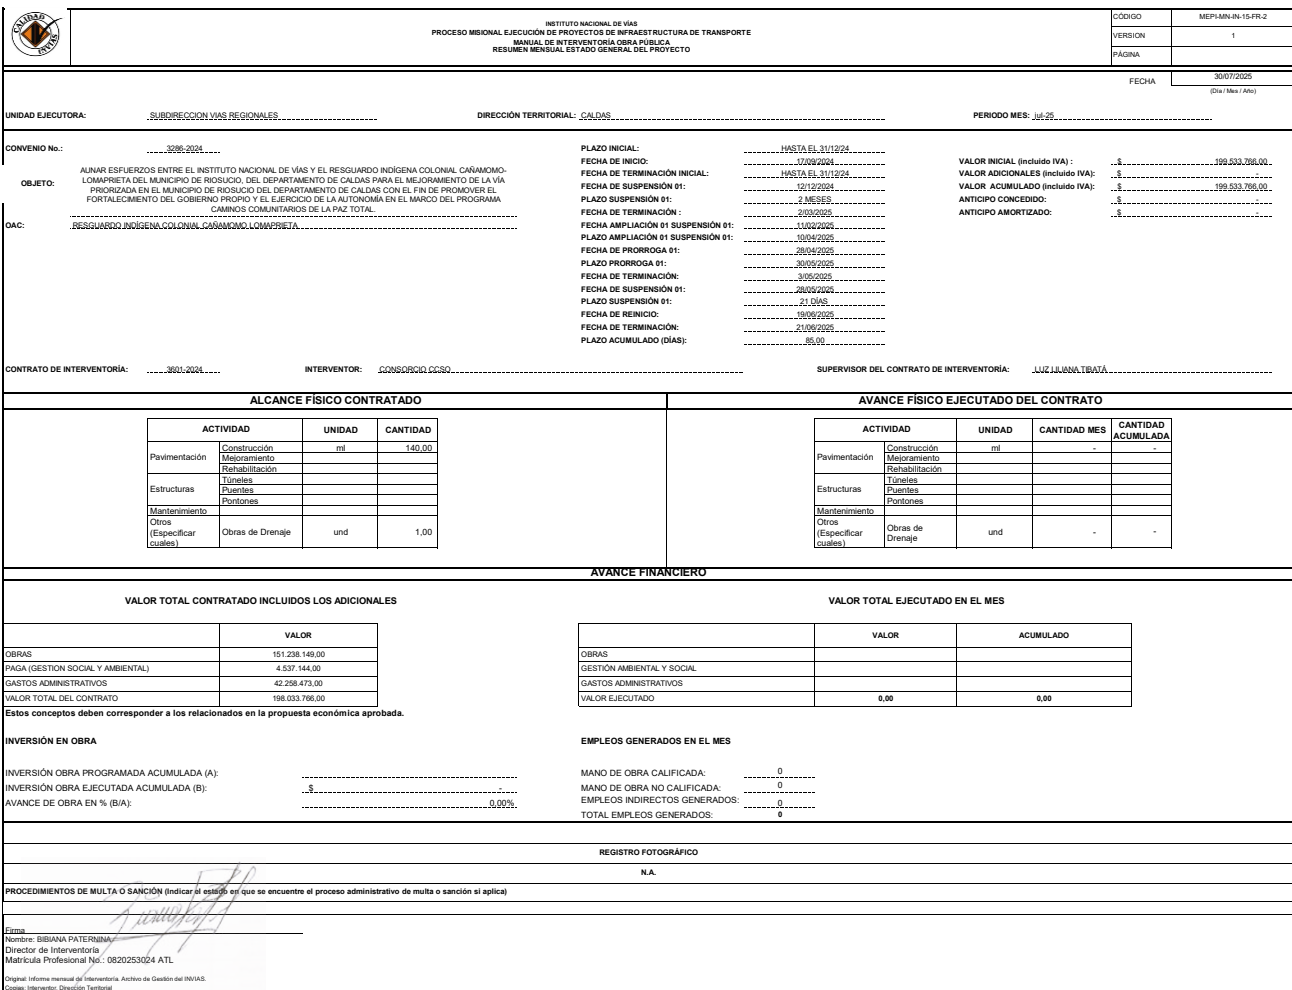

CONVENIO SOLIDARIO No. 3286-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO-LOMAPRIETA

184 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Cabildo Del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomapieta el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3286 de 2024 de fecha 21 de agosto de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL **RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA** DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., por un valor de \$199.533.766,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

185 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

185.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Sector Centro (Portachuelo - Centro Paneso), con longitud total de 4,5 km, de los cuales se intervendrán 140 ml de placa huella y una obra de arte tipo alcantarilla.

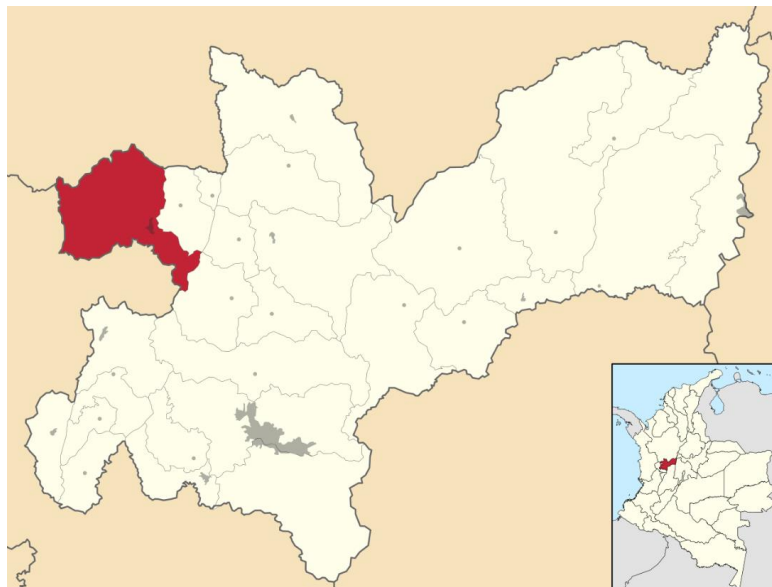


Ilustración 67 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

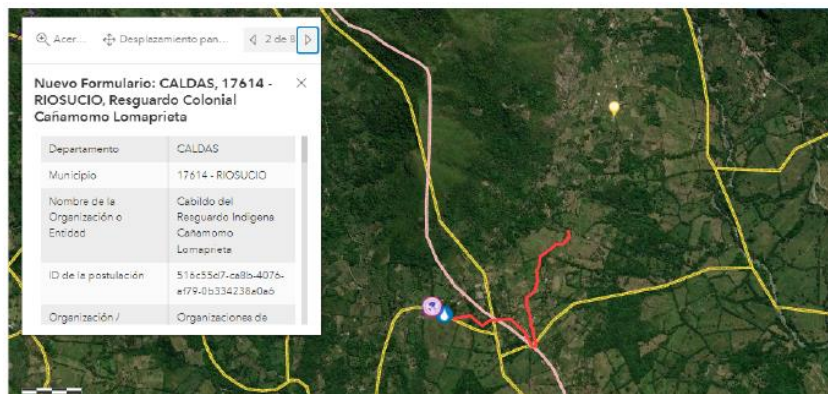


Ilustración 68 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

185.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Colonial Cañamomo-Lomapieta, en el corredor vial denominado Centro (Portachuelo - Centro Panesso), del Municipio de Riosucio.

185.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

185.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 140 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros y una obra de arte tipo alcantarilla.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

186 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

186.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6666151
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA
NIT.	810.003.358-3
DIRECCIÓN:	Calle 11 No 11 -04

TELÉFONO:	3165083545
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3286-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/08/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 199.533.766,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$199.533.766,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	17/09/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ
GARANTÍAS	

RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL CAÑAMOMO-LOMAPRIETA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100340404 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No NB-1000846463			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$19.953.377,00	21/08/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$9.976.689,00	21/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$39.906.753,20	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	21/08/2024	31/12/2024

Tabla 53 . Información general del Convenio 3286-2024 Municipio Riosucio.

186.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

186.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fechas 15/07/25 y 16/7/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 15/07/25, solicitó aplazar el comité operativo programado para el 15/7/25.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 16/07/25, remitió contratos perfeccionados de los profesionales.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 16/07/25, remitió el plan de compras y correcciones. - La JAC por medio de correo electrónico de fecha 23/07/25, remitió el plan de compras, para revisión y aprobación.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió la solicitud de desembolso no. 1.
- Se realizó comité operativo no. 3 y 4, los días 16/7/25 y 23/7/25.

186.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

186.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

186.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, el Convenio Solidario se encuentra en etapa de alistamiento. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	4,59	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	117,81	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	84,10	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	36,35	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	3889,56	0
II. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS						
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	0%	0%	54,00	0
7	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0%	0%	6,00	0
8	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa	M3	0%	0%	0,50	0

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
	(Clase F) - mezcla in situ					
9	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	9,60	0
10	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	578,9	0
11	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	0%	0%	7,5	0
12	Tubería de Concreto Reforzado clase III, de 900 mm de diámetro interior	M	0%	0%	29,10	0

187 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

187.1 INFORME SEMANAL

No aplica para el periodo.

187.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio del CINP-555-1013-2810 de fecha 16 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Sebastián Osorio
Contador	Andrea Clavijo
Maestro de obra	Jose Guerrero

Tabla 54 Personal Convenio Solidario

187.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para el periodo.

187.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No aplica para el periodo.

187.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el periodo.

187.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 27.1.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3286 de 2024

187.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

187.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

187.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

187.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Obra.

187.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

187.9.2.2 Actas de Comités

No se presentaron en el periodo.

187.9.3 Actas de Reunión

No se presentaron en el periodo.

188 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

188.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

188.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-937-2644 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-968-2741 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-990-2783 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1007-2804 de fecha 16/7/25, solicitó a la JAC documentación ambiental.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-1013-2810 de fecha 16/7/25, remitió la aprobación de las hojas de vida enviadas por la JAC.
- Se realizó comité operativo no. 3 y 4, los días 16/7/25 y 23/7/25.

188.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo.

188.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3286 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio, el día 27/2/25. La Interventoría recibió el extracto bancario del mes de junio de 2025, se encuentra a la espera del extracto bancario de Febrero 2025 y de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

189 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría se encuentra en la etapa de alistamiento.
- De los veintiocho (28) Convenios Solidarios, tres (3) tienen orden de inicio en el mes de agosto de 2024, dieciocho (18) en el mes de septiembre de 2024 y tres (3) en el mes de octubre. De los Convenios Solidarios 3646-2024, 3530-2024 y 3983-2024 aún esta Interventoría no cuenta con la orden de inicio.

190 ANEXO

190.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

190.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

No aplica para este periodo.

190.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

190.4 BITÁCORA

No aplica para este periodo.

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3595-2024

Contratista: RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

Contrato de Interventoría No. 3601-2024

Interventoría: CONSORCIO CCSO

Objeto Convenio:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8	MES O PERIODO:	1 AL 31 DE JULIO
-----------------------	----------------	------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	483
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	484
1	INTRODUCCIÓN		486
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		488
2.1	Localización		488
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		489
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		489
2.4	Características técnicas del proyecto		489
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		489
3.1	Información general del contrato		490
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		491
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		492
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		492
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		492
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	972
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	987
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	989
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N.A.
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	991
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	993
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	981
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		494
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		N.A.
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	1029
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	1313
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		48
5.1	Información general del contrato		48
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		495
5.3	Informes especialistas y profesionales		1206
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		49
5.5	Informe matriz de riesgos.		49
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		49
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		49
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1322
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1003
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1320
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1011
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1327
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
	Seguimiento de los Rendimientos Financieros de los Convenios y sus Contratos derivados		495
7	Conclusiones y recomendaciones		495
8	Anexos		495
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1018
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		995
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		997

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



FECHA: 30/07/2025
(Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS PERIODO MES: JUL25

CONVENIO No.: 0005-2024
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE ROSUJO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE ROSUJO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
OAC: RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/25
FECHA DE INICIO: 01/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31/12/24
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 02/12/2024
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 01/06/2025
FECHA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 01/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01: 01/06/2025
FECHA DE PRORROGA 01: 28/04/2025
PLAZO PRORROGA 01: 30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN 01: 21/06/25
FECHA DE REINICIO: 19/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/06/2025
PLAZO ACUMULADO (DÍAS): 65,00
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$. 201.368.439,00.
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$. 201.368.439,00.
ANTICIPO CONCEDIDO: \$.
ANTICIPO AMORTIZADO: \$.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0601-2024 INTERVENTOR: CONSULTORÍA CCSO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUZ JUVANA IBARRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m	165,00	Pavimentación	Construcción	m	-
	Mejoramiento				Mejoramiento		
	Rehabilitación				Rehabilitación		
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles		
	Puentes				Puentes		
	Pontones				Pontones		
Mantenimiento				Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-	Otros (Especificar cuales)	Obras de Drenaje	und	-

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO		
	BÁSICO			BÁSICO	ACUMULADO
OBRAS	153.411.914,00		OBRAS		
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	4.602.357,00		GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.834.168,00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	199.848.439,00		VALOR EJECUTADO	0,00	0,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS



FOTO 1 - EXCAVACIONES



FOTO 2 - COMPACTACIÓN DE TERRENO



FOTO 3 - APLICACIÓN DE SUBBASE

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: BIBIANA PATERNINA
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 6820253024 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAE
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONVENIO SOLIDARIO No. 3595-2024

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”



MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA

191 INTRODUCCIÓN

Que, con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Que, de acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con Resguardo Indígena Escopetera Pirza el municipio de RIOSUCIO, buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños, es así como se procede a suscribir el Convenio Solidario No. 3595 de 2024 de fecha 09 de septiembre de 2024 cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, por un valor de \$201.348.439,00 M/CTE, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Instituto Nacional de Vías, mediante resolución No. 3918 del 28 de agosto de 2024, aclarada mediante Resolución No.3948 del 29 de agosto de 2024, adjudica el Concurso de Méritos Abiertos No. CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, al CONSORCIO CCSO, por lo que se procedió a la suscripción del Contrato de Interventoría No. 3601 de 2024 de fecha 22 de octubre de 2024, el cual tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7” y un valor de \$1.167.015.102 M/CTE incluido IVA, con un plazo de ejecución de hasta 31 de diciembre de 2024.

La orden de Inicio del Contrato de Interventoría fue impartida el 30 de octubre de 2024.

Que, el 12 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de febrero de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 2 de marzo de 2025.

Que, el 30 de diciembre de 2024 se perfecciona la Prórroga No. 1 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. por el término de cuatro (4) meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.

Que, el 11 de febrero de 2025 se suscribe acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del Convenio por el término de dos (2) meses, hasta el 11 de abril de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de mayo de 2025.

Que, el 28 de abril de 2025 se suscribe la Prórroga No. 1 del Convenio, quedando como nueva fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2025.

Que, el 29 de abril de 2025 se perfecciona la Prórroga No. 2 del Contrato de Interventoría con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 30 de mayo de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 18 de junio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 27 de mayo de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, solicitud que de ser aceptada las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II procederán con la firma electrónica a aceptar la Suspensión No. 1 que inicia desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 21 de junio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del Convenio, suspensión que iría hasta el 1 de julio de 2025, quedando como nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 16 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, que iría hasta el 1 de julio de 2025 con nueva fecha de vencimiento el 4 de julio de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025 se emite aval por parte de la Interventoría y se suscribe la solicitud de prórroga No. 2 del Convenio, por un término de tres (3) meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025.

Que, el 26 de junio de 2025, de igual forma se remite para el trámite al interior de EL INSTITUTO la Prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría, por un término de tres (3)

meses, quedando como nueva fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2025. Además de la solicitud de Adición No. 1 por un valor de Quinientos Treinta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos (\$532.999.145), quedando por un valor total de Mil Setecientos Millones Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos (\$1.700.014.247).

En este Informe de Avance de Interventoría N.º 08, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas por la JAC y la Interventoría en el período comprendido entre el 2 al 31 de julio de 2025, el cual se presenta de acuerdo con el esquema solicitado por la Dirección Territorial.

192 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

192.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el departamento de Caldas (Colombia). Limita al norte con el Departamento de Antioquia, al oriente con Supía, al sur y al occidente con el Departamento de Risaralda. Se sitúa a 91 km de la capital departamental, la ciudad de Manizales.

La vía objeto del presente Contrato corresponde al corredor vial denominado Tramo entre Las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Fútbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), con longitud total de 1,193 km, de los cuales se intervendrán 165 ml de placa huella.

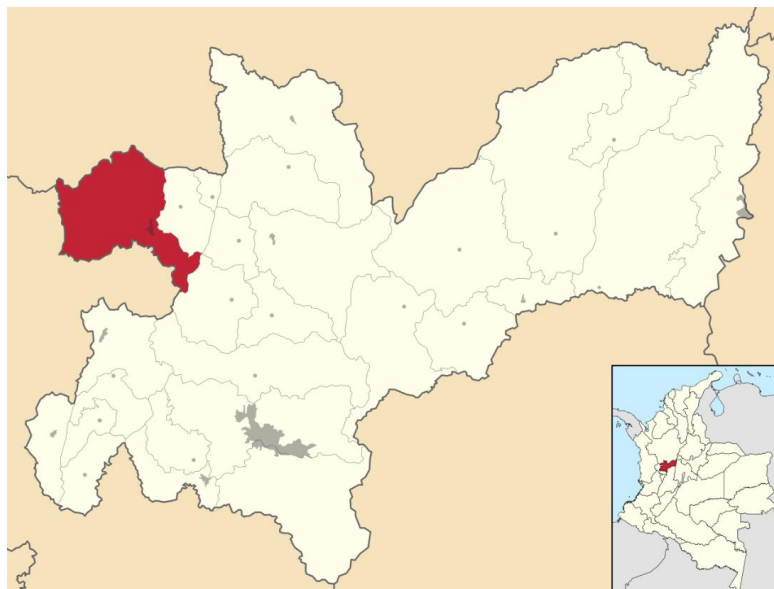


Ilustración 69 Localización del municipio de Riosucio (Caldas).

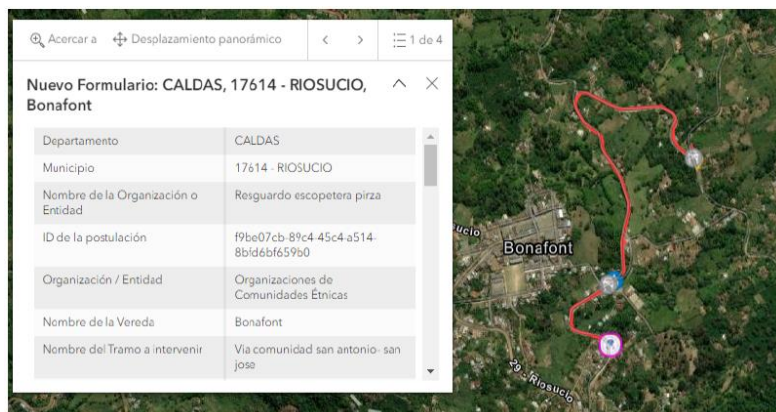


Ilustración 70 Localización vía a Intervenir – Arcgis – FiledMaps
Fuente: Anexo técnico de Obra INVIAS

192.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto busca mejorar la conectividad en el Resguardo Indígena Escopetera Pirza, en el corredor vial denominado tramo entre las Comunidades de San Antonio-El Olvido-San José-Cancha de Fútbol El Carmelo (Vía Comunidad San Antonio – San José), del Municipio de Riosucio.

192.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SECTOR

No aplica para el periodo. La Interventoría se encuentra realizando los recorridos y visitas en las zonas objeto del Contrato de Interventoría.

192.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarcan en la construcción de placa huella en una longitud de 165 ml de módulo de rotura 14 Mpa, con ancho de placa huella 5 metros.

De igual manera se ejecutarán otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

193 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO

193.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ID DEL CONTRATO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.6740274
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL:	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA
NIT.	810.003.853-8

DIRECCIÓN:	Bonafont - Calle Real - Sede Indígena
TELÉFONO:	3113739814
CONVENIO SOLIDARIO No.:	3595-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/09/2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 201.348.439,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	\$0 M/CTE
VALOR TOTAL:	\$201.348.439,00 M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$0 M/CTE
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	07/10/24
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 12/12/24
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	2 MESES 11/2/25
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30/05/25 28/04/25
SUSPENSIÓN No. 2	DESDE EL 28/5/25 HASTA EL 18/6/25
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	HASTA EL 1/7/25
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES HASTA EL 3/10/25
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	3/10/25
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL INVIAS:	LUZ LILIANA TIBATÁ

GARANTÍAS			
CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA toma la póliza Única de Seguro a favor de Instituto Nacional de Vías, con la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NB-100344003 y Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-1000846463			
Amparos	Valor Asegurado	Vigencias	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
Cumplimiento	\$20.134.844,00	09/09/2024	31/12/2025
Prestaciones sociales	\$10.067.422,00	09/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la obra	\$40.269.688,00	31/12/2024	31/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ANEXO 0			
Amparo básico – predios, labores y operaciones Contratistas y Subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal	\$260.000.000,00	09/09/2024	31/12/2024

Tabla 55 Información general del Convenio 3595-2024 Municipio Riosucio.

193.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades desarrolladas por el Contratista durante el presente periodo fueron las siguientes:

193.2.1 Actividades Administrativas

- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 14/07/25 y 17/7/25, remitió los documentos compromiso del comité operativo no. 1.
- La JAC por medio de correos electrónicos de fecha 21/7/25, remitió la documentación inicial subsanada.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 8/07/25, solicitó información contractual sobre el Convenio.
- La JAC por medio de correo electrónico de fecha 10/07/25, remitió la hoja de vida de un Ingeniero Residente para revisión y aprobación de la Interventoría.
- La JAC por medio del correo electrónico de fecha 29/7/25, remitió la solicitud de desembolso no. 1.
- Se realizó comité operativo no. 3, 4 y 5, los días 14/7/25, 17/7/25 y 18/7/25.

193.2.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El acta de inicio de Obra tiene fecha de 28 de julio/25

193.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

No aplica para este periodo.

193.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Al corte del presente informe, no se tiene avance por que el acta de inicio tiene fecha de 28 de julio de 2025. El proyecto presenta el siguiente estado según su avance:

Avance	Físico (%)	Inversión (%)	Inversión (\$)
Programado	0%	0%	0
Ejecutado	0%	0%	0
Avance / Retraso	0%	0%	0

El estado de actividades acumuladas hasta el periodo del presente informe corresponde a:

No.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	% PROG.	% EJEC.	CANT. TOTAL, PROG.	CANT. EJEC.
I. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y/O CUNETAS						
1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	0%	0%	0	0
2	Subbase Granular Clase C	M3	0%	0%	0	0
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (Clase D) - mezcla in situ para placa huella	M3	0%	0%	0	0
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa huella)	M3	0%	0%	0	0
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	0%	0%	0	0

194 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO

194.1 INFORME SEMANAL

Ver anexo 28.1

194.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Ver anexo 28.3

194.3 PERSONAL, CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

La aprobación de las hojas de vida remitidas por la JAC se dio por medio de los oficios CIMP-555-531-1156, CIMP-555-765-2054 y CIMP-555-952-2720 de fechas 18 de marzo de 2025, 19 de mayo de 2025 y 10 de julio de 2025.

CARGO	PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Obra	Rubén Zabala
Contador	Doris Rivera
Maestro de obra	Dorance Ladino

Tabla 56 Personal Convenio Solidario

Ver anexo 28.4

194.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este periodo

194.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver anexo 28.5

194.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Ver anexo 28.6

194.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONVENIO SOLIDARIO

Se adjunta las pólizas del Convenio Solidario. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. Ver Anexo 28.2.

El OAC al corte del periodo no evidenció la gestión ante la aseguradora donde pone en conocimiento las novedades contractuales del Convenio No. 3595 de 2024

194.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO

No aplica para este Convenio.

194.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

194.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo

No aplica para este Convenio.

194.9.2 Seguimiento al Programa de Obra.

No aplica para el periodo. El acta de inicio de Obra tiene fecha de 28 de julio/25

A continuación, se muestra el programa de obra:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
☒ MEJORAMIENTO DE VIA - RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA PIRZA	50 días	lun 28/07/25	vie 3/10/25	3%
Inicio	0 días	lun 28/07/25	lun 28/07/25	0%
Excavaciones varias sin calsificar	34 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	0%
Subbase clase C	16 días	lun 28/07/25	lun 18/08/25	19%
Concreto Reforzado resistencia 21 MPA (Clase D)	34 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	0%
Concreto Ciclópeo Resistencia 14 Mpa (F) 60% concreto - 40% Piedra para placa	33 días	mié 20/08/25	vie 3/10/25	0%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000)	34 días	mar 19/08/25	vie 3/10/25	0%
FIN	0 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	0%

194.9.2.1 Seguimiento al Programa de Inversiones

Al corte del presente informe, no se cuenta con el Programa de Inversiones.

194.9.2.2 Actas de Comités

Ver Anexo 29.4

194.9.3 Actas de Reunión

Ver Anexo 29.6

195 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

195.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

195.1.1 Actividades Administrativas

- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-938-2645 de fecha 3/7/25, solicitó a la JAC las pólizas pendientes.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-976-2749 de fecha 11/7/25, solicitó a la JAC documentación.
- La Interventoría por medio del oficio CINP-555-991-2784 de fecha 15/7/25, solicitó a la JAC documentación SST.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1065-2989 de fecha 28/7/25, remitió al INVIAS el plan ambiental.
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1065-2989 de fecha 29/7/25, remitió a la JAC información ambiental
- La Interventoría por medio de oficio CINP-555-1070-2994 de fecha 29/7/25, remitió a la JAC el acta de inicio de obra.
- Se realizó comité operativo no. 3, 4 y 5, los días 14/7/25, 17/7/25 y 18/7/25.

195.1.2 Actividades Técnicas

No aplica para el periodo. El acta de inicio de Obra tiene fecha de 28 de julio/25

195.1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 3595 DE 2024 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

El INVIAS realizó el giro de los recursos a la cuenta del Convenio. La Interventoría recibió los extractos bancarios de los meses de febrero a junio de 2025, se encuentra a la espera de los soportes de giro de los rendimientos al Tesoro Nacional.

196 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE

- El acta de inicio de obra, se firmó el 28 de julio de 2025.

197 ANEXO

197.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo. Ver anexo 29.3

197.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

Ver anexo 28.7

197.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

No se presenta para este periodo.

197.4 BITÁCORA

Ver anexo 28.8
