	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2330-2024, 4085-2024, 4185-2024, 2488-2024, 2427-2024, 2042-2024, 2297-2024, 4173-2024, 3238-2024, 2040-2024, 2039-2024, 4097-2024, 2090-2024, 2554-2024, 2919-2024, 3913-2024, 3943-2024, 2233-2024, 2065-2024, 4102-2024, 2038-2024, 2059-2024, 2031-2024, 2915-2024, 2858-2024, 4324-2024, 3654-2024, 3554-2024, 3977-2024, 3908-2024, 2102-2024, 2631-2024, 4314-2023, 4274-2023, 4307-2023, 4399-2024.	Contratista: JAC BARRIO NUEVO AMANECER, RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW, CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES, JAC CARRIZALES, JAC RIONEGRO-GARCIA ARRIBA, JAC LA HEROICA, JAC LA CABAÑITA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA, JAC MONTERREDONDO, JAC ULLUCOS, JAC LA ESPERANZA, RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO, JAC CORREGIMIENTO DE LA PAILA, JAC EL CHAMIZO, JAC VEREDA LA UNION, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR, JAC EL TREBOL UNO, JAC LA TOMA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS, JAC LA TURBINA, JAC ASNAZU, JAC SOTO, JAC LA PILA, JAC TACUEYO, RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA, JAC QUINTERO, JAC EL SOCORRO - VALLES HONDOS, JAC MONTERREDONDO, JAC CHAPIO Y PAGUIMBIO, JAC DE LOS ROBLES, JAC LA MARTICA, JAC MONTERREDONDO, JAC CARAQUEÑO, JAC EL HORNO, RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CORINTO.
--	---


Contrato de Interventoría No. 3649-2024	Interventoría: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
--	---

Objeto Contrato de Interventoría:
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 5	MES O PERIODO: MARZO/2025
--	--

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCION		9
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		10
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		17
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		39
2.4	Características técnicas del proyecto		40
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		42
3.1	Información general del contrato		42
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		61
3.3	Seguimiento Items no previstos		61
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		62
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		63
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	63
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	254
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	255
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	256
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	257
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	258
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	258
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	278
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		278
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	278
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	278
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		291
5.1	Información general del contrato		291
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		292
5.3	Informes especialistas y profesionales		293
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		293
5.5	Informe matriz de riesgos.		293
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		293
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		294
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	294
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	295
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	296
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	297
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	298
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		298
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	298
7	Conclusiones y recomendaciones		299
8	Anexos		301
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		301
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


 Firma:
 Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

Resumen Mensual Estado General del Proyecto, MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Una vez se de inicio a las actividades en obra, se diligenciará el respectivo formato

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR
OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL. LOTE 3**

PERIODO:

01 AL 31 DE MARZO DE 2025

**CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
INTERVENTORÍA DE CONVENIOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 GERMAN PÉREZ PINTO MP.: 68202-365002 STD	 MARCO ANTONIO SOLANO MP.: 68202-03281 STD	 MARÍA ELVIRA PINTO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	7
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	8
2.1	LOCALIZACIÓN	12
2.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	15
2.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	37
2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	38
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS	40
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS.....	40
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	59
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS	59
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	60
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	61
4.1	INFORME SEMANAL	61
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO	88
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO	89
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO	90
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	91
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	92
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	92
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....	93
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	93
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	94
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	94
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	95
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	96
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	96
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS	96
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	96
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	97
6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	97
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	98
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	99

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	100
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	101
6.6	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	101
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	102
8	ANEXOS.....	104
8.1	CORRESPONDENCIA	104

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
---	---	---	---

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS)	12
Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA.....	15
Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda.....	16
Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda.....	16
Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda.	17
Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca.	17
Figura 7. Localización del tramo a intervenir, Vereda Asnazu, Suarez.	18
Figura 8. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez.	18
Figura 9. Localización de Jambaló en el Cauca.	19
Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló.....	20
Figura 11. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló.	20
Figura 12. Localización del tramo a intervenir, vereda Monterredondo, Jambaló.	21
Figura 13. Localización de Padilla en el Cauca.	21
Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda La Paila, Padilla.	22
Figura 15. Localización vía a intervenir, vereda El Chamizo, Padilla.	22
Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda La Union, Padilla.	23
Figura 17. Localización de Timbío en el Cauca.....	23
Figura 18. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbío.....	24
Figura 19. Localización vía a intervenir, vereda La Martica, Timbio.	25
Figura 20. Localización del municipio de Puracé en el Cauca.	25
Figura 21. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace.	26
Figura 22. Localización vía a intervenir, Chapio Paguimbio, Puracé.	26
Figura 23. Localización de Guachené en el Cauca.	27
Figura 24. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené.....	28
Figura 25. Localización Nacional y Departamental de BUENOS AIRES.....	28
Figura 26. Localización vía a intervenir, vereda Munchique, Buenos Aires.	29
Figura 27. Localización de Corinto en el Cauca.	29
Figura 28. Localización vía a intervenir, vereda La Heroica, Corinto.....	30
Figura 29. . Localización vía a intervenir, vereda Rio Negro, Corinto.	30
Figura 30. Localización vía a intervenir, vereda Carrizales, Corinto.	31
Figura 31. Localización de Toribio, Cauca.....	31
Figura 32. Localización vía a intervenir, vereda Soto, Toribio.	32
Figura 33. Localización vía a intervenir, vereda Tacueyo, Toribio.	32
Figura 34. Localización vía a intervenir, vereda La Pila, Toribio.	33
Figura 35. Localización de Caloto en el Cauca.	33
Figura 36. Localización de la vía intervenir vereda El socorro, Caloto.	34
Figura 37. Localización de Páez en Cauca.	35
Figura 38. Localización del tramo a intervenir vereda Lame, Paez.	35
Figura 39. Localización de Santander de Quilichao en el Cauca.	36
Figura 40. Localización del tramo a intervenir vereda La Toma, Santander de Quilichao.	37

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVÍAS desde sus Direcciones Territoriales.

Con el programa *Caminos Comunitarios de la Paz Total*, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales en distintos municipios del Departamento del Cauca, para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En cumplimiento de las disposiciones legales y con el objetivo de asegurar el control y seguimiento de los proyectos, el INVÍAS consideró necesario adelantar un proceso de contratación para la selección de un interventor que ejerza labores de supervisión y vigilancia.

Para tal fin, bajo la modalidad de mínima cuantía, se publicó en la plataforma Secop II, el proceso con ID CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, del cual se deriva el contrato de Interventoría No. 3649-2024, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3**, celebrado con el CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR.

En este marco, y como parte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el Informe Mensual No. 5, cuyo propósito es informar al Instituto Nacional de Vías, sobre el estado actual de los contratos suscritos a esta interventoría, detallando los aspectos generales y específicos del proyecto.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos a desarrollar se encuentran ubicados en la zona rural del departamento del Cauca, dentro del alcance del contrato, la interventoría tiene a su cargo el **Lote 3**, correspondiente a la zona norte.

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Para la ejecución de este proyecto, el Instituto Nacional de Vías ha suscrito una serie de convenios solidarios y contratos con diversas Juntas de Acción Comunal y organizaciones locales, responsables de la ejecución de las obras. En la **Tabla 1** se presenta la relación de los convenios y contratos objeto de interventoría, especificando los municipios, convenios asignados y las organizaciones beneficiarias.

Tabla 1. Convenios solidarios y/o contratos sobre los cuales se ejecutará la interventoría.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO
	3908-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES
	4399-2024	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO
TORIBIO	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO
	2858-2024	JAC TACUEYO
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS
	3654-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO
PÁEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME
	3943-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR
CAJIBÍO	3977 -2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO
	4085-2024	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW
MORALES	4097-2024	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO
INZÁ	4173-2024	RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA
CALDONO	4185-2024	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES
TOTORÓ	4324-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA
	4102-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS

A la fecha, diez de estos convenios se encuentran en ejecución desde el inicio de la interventoría y durante este periodo 16 convenios adicionales recibieron el respectivo desembolso por lo que se da el inicio de actividades. **La Tabla 2** detalla los convenios,

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

incluyendo el municipio, número de convenio, nombre de la organización ejecutora y el valor asignado para su desarrollo.

Tabla 2. Convenios asignados en ejecución.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	VALOR
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	\$ 200,828,180
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	\$ 201,225,865
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	\$ 199,394,125
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	\$ 202,870,939
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	\$ 201,874,214
JAMBALÓ	2039-2024	JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	\$ 209,387,835
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 203,658,720
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	\$ 201,254,129
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA	\$ 201,035,600
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	\$ 201,052,567
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION	\$ 200,201,271
TIMBIO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	\$ 200,859,010
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	\$ 199,476,926
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO	\$ 200,551,500
	3908-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	\$ 201,158,485
GUACHENE	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 200,914,634

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	\$ 199,954,248
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	\$ 200,290,536
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA	\$ 200,223,651
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	\$ 199,333,458
	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 204,710,738
TORIBIO	2858-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TACUEYO	\$ 200,147,088
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	\$ 203,847,517
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS	\$ 206,276,926
PÁEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME	\$ 201,785,173
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	\$ 202,387,366

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
---	---	--	---	---

2.1 LOCALIZACIÓN

Se presenta la localización del Departamento del Cauca, especificando la ubicación de las obras a ejecutar y aquellas sujetas a la interventoría. A continuación, se detallan los municipios y sectores donde se desarrollarán las actividades en el marco del contrato de interventoría :

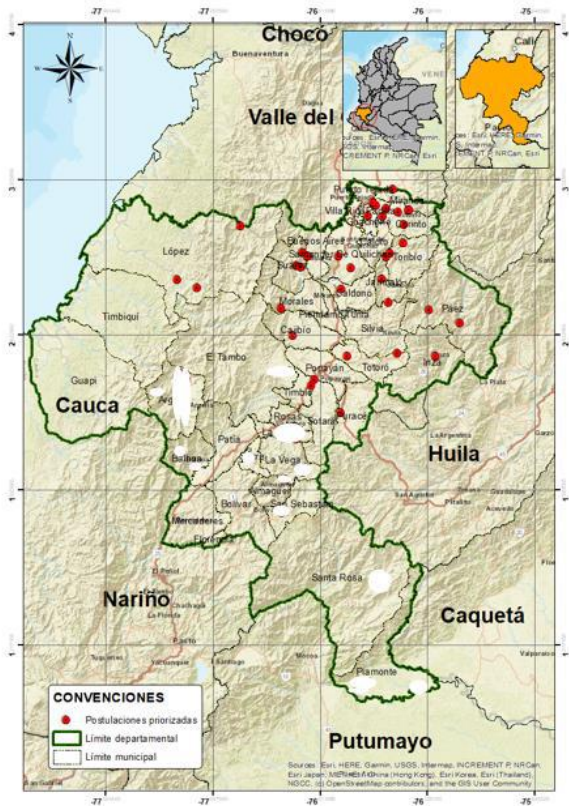


Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS)

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución los convenios solidarios que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”, LOTE 3:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Tabla 3. Localización de juntas en ejecución.

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA
MIRANDA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	18750	CARAQUEÑO-MONTERREDONDO
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	1826	VÍA A EL HORNO
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	31KA54-1-1	Las Cañas – Damnificados - Monterredondo
SUAREZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	19780_00	Vía Parque Asnazu La.bocatoma
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	19780_004	La Turbina - Miravalle
JAMBALÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	19364_00	vía al rio la esperanza
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	19364_00	17721 San Francisco-La Mina
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	N/A	vía Monte Redondo – Vereda Monte Redondo (Vía Jámbalo – Monterredondo)
PADILLA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA	19513_00	Vía Callejon La Cancha De Futbol
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	19513_00	Vía Chamizo - Obando
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN	19513_00	Vía Vereda La Unión
TIMBÍO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	25KA86	Cruce Ruta 2503 (Timbio)-El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles (Cruce Ruta 2503)
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	19807_00	Templete De La Virgen-Villa Manuel
PURACÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	19585_00	Vía Vereda El Trebol Uno
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	N/A	vía a Chapio
GUACHENE	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	19300_01	Via Cabañita - Guachene
BUENOS AIRES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	25KA24-1-6	Cruce 25cc24-1-MUNCHIQUE
CORINTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	31KA03-2	CRUCE 31CC03 RIO NEGRO-QUEBRADITAS(MEDIA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

			NARANJA-LA HEROICA)
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	19212_00	Cruce Ruta 3105 - Gualanday - Rionegro
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	19212_00	Caserio Carrizales
TORIBIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	19821_00	Vía Los Tanques
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TACUEYO	N/A	Vía vereda San Diego
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	19821_00	Vía La Pila Limites Con Jambalo
CALOTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS	31KA01-6	31KA01-6 Cruce La Placa-El Socorro
PÁEZ	CABILDO INDÍGENA DE LAME	26CC04-1	TUMBICHUCUE-LAME-LA TROJA
SANTANDER DE QUILICHAO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	19698_00	Via La Toma - El Palmar

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 MIRANDA

Miranda es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento del Cauca. Limita al norte con Florida, al oriente con Rioblanco y Planadas, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Dista 122 km de la capital del Cauca. Tiene una economía campesina de autoconsumo y subsistencia; en la llanura predomina el monocultivo de la caña de azúcar (79.29% del terreno), y pequeños cultivos tradicionales y con bajo nivel tecnológico, como hortalizas, habichuela, tomates y maracuyá; así mismo hay zonas con cultivo de café. Cuenta con una extensión de 189 Km cuadrados.



Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA.

La intervención que se realizará en el municipio de Miranda es para las vías que corresponden a las veredas de Caraqueño, El Horno y Monterredondo. A continuación, se describe la localización de cada uno de ellos conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Caraqueño, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21073 y longitud: -76,20724 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21238 y longitud: -76,20709, de la vía Caraqueño-Monterredondo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIÁS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

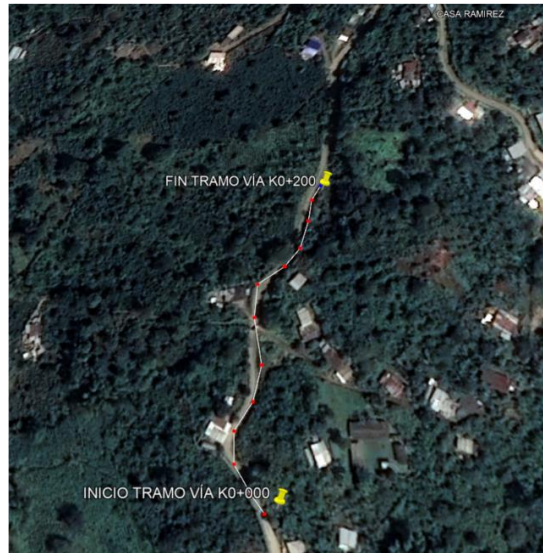


Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda.

- Vereda El Horno, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21931 y longitud: -76,19585 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21858 y longitud: -76,19671 de la vía al Horno.



Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda.

- Vereda Monterredondo, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,2161 y longitud: -76,2034 y punto de referencia final el PR 00+200 con coordenadas latitud: 3,2173 y longitud: -76,2046, de la vía Las Cañas – Damnificados - Monterredondo.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

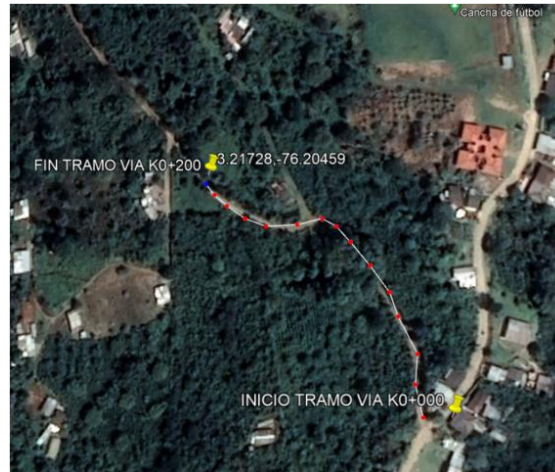


Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda.

2.2.2 SUAREZ

Se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur con el municipio de Morales y al occidente con López de Micay; su altura sobre el nivel del mar es de 1050 m, y temperatura media de 27 °C. Está separado de Popayán por 107 km. Su extensión total es de 389,87 km², de los cuales 3,57 km² corresponden a la parte urbana. Sus sectores económicos fundamentales son la minería la cual se realiza en la zona suroriental del municipio, la agricultura con productos como el café, caña de azúcar, el frijol, el maíz, la piscicultura, la avicultura, y la ganadería.



Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

La intervención que se realizará en el municipio de Suarez corresponde a la vereda Asnazú y La Turbina. A continuación, se describe la localización conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Asnazú, el proyecto se desarrollará en el corredor vial denominado Sector El Sapo - Bocatoma, con una longitud de 1,01 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Cruce Y a la Bocatoma, y el punto final de referencia es PR 1+010 Puente Vehicular.

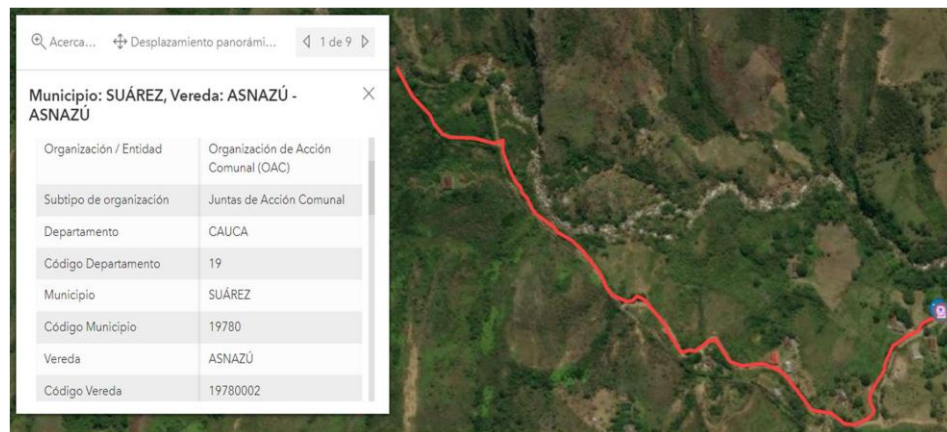


Figura 7. Localización del tramo a intervenir, Vereda Asnazu, Suarez.

- Vereda La Turbina, se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Suárez, en el corredor vial denominado vía Escuela Turbina - Miravalle, con una longitud de 1,22 km tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruce a la Vereda La Turbina y el punto final de referencia es PR 1+220 antes del cruce que dirige hacia la Vereda Miravalle.

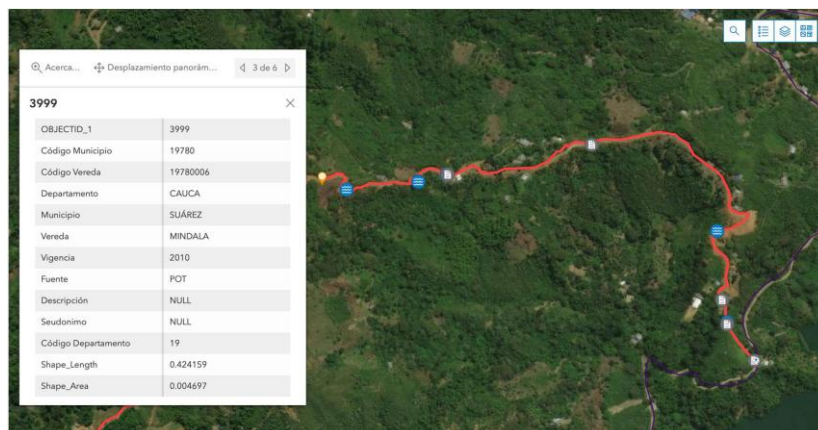


Figura 8. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

2.2.3 JAMBALÓ

Está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a 80 kilómetros de la ciudad de Popayán, limita por el norte con los municipios de Caloto y Toribío, por el oriente con el municipio de Páez, por el sur con el municipio de Silvia y por el occidente con los municipios de Caldonio y Santander de Quilichao. La economía de Jambaló está basada en la agricultura, cultivos como son: café, frijol, fique, papa y caña panelera, en lo pecuario la Ganadería doble propósito y en especie menores :aves de corral, cuyes, ovinos, porcinos y caprinos.



Figura 9. Localización de Jambaló en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Jambaló corresponde a las veredas La Esperanza , Ullucos Picacho y Monterredondo. A continuación, se describe la localización conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda La Esperanza, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado La Esperanza-Río Jambaló que tiene una longitud de 1,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce vía al río Jambaló, y el punto final de referencia es PR01+300 sitio crítico río Jambaló.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	



Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló.

- Vereda Ullucos, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado Ullucos Picacho-Tablón que tiene una longitud de 4,50 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 jurisdicción Junta Ullucos Picacho, y el punto final de referencia es PR 4+500 límite Jambaló-Toribio.

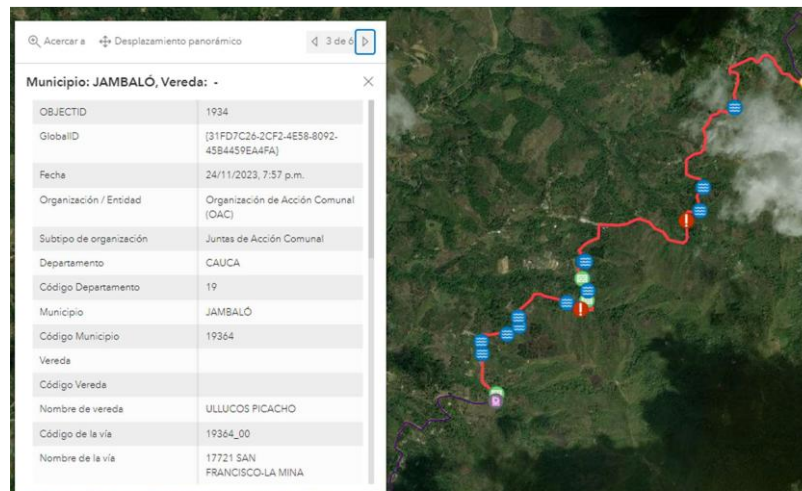


Figura 11. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló.

- Vereda Monterredondo, el proyecto se realizará en el corredor vial denominado vía Monte Redondo – Vereda Monterredondo (Vía Jámbalo – Monterredondo) que tiene una longitud de 0.8 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Antena de Wom, y el punto final de referencia es PR 0 + 800 Predio Héctor Ullune.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

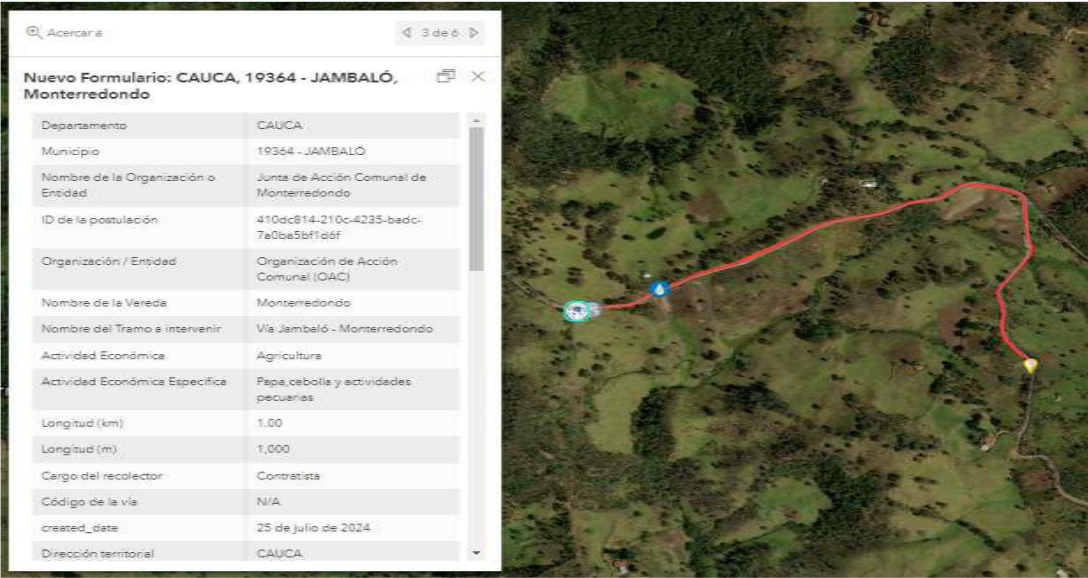


Figura 12. Localización del tramo a intervenir, vereda Monterredondo, Jambaló.

2.2.4 PADILLA

El municipio de Padilla se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cauca, limita al norte con Miranda, al sur con Guachené, al oriente con Corinto y al occidente con Puerto Tejada. Su extensión territorial es de aproximadamente 100 km², con una altitud promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre los 23°C y 28°C, y su topografía es predominantemente plana, lo que favorece actividades agrícolas, especialmente el cultivo de caña de azúcar, gracias a la presencia de diversos afluentes y ríos en la región.



Figura 13. Localización de Padilla en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Como parte del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial, se intervendrán las siguientes veredas en el municipio de Padilla:

- Corregimiento de La Paila: Se trabajará en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31CC02 La Paila - Sector Las Cuarenta - Cancha de Fútbol (Callejón la Cancha de Fútbol), con una longitud de 0,78 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000 cruce La Paila - Sector Las Cuarenta – Cancha de Fútbol y finaliza en el PR00+780 cruce alternativo a La Paila, según la información levantada en campo por el equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

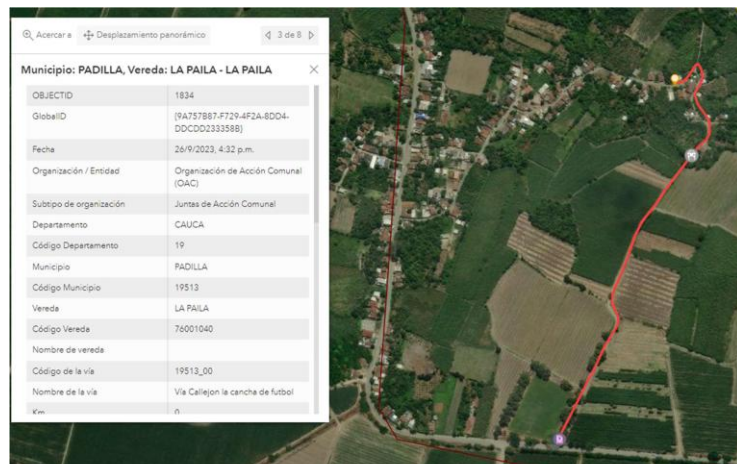


Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda La Paila, Padilla.

- Vereda El Chamizo: La intervención se realizará en el corredor vial 31KA02-53 cruce 31CC02 (El Chamizo), denominado Sector Yarumales Carretera – El Chamizo – Betania (Límite Guachené), también conocido como vía Chamizo-Obando, con una longitud de 2,0 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR0+000, en la casa de Mónica Ambuila o terminación de la placa huella existente, y finaliza en el PR2+000, en el límite territorial entre Padilla y Guachené.



Figura 15. Localización vía a intervenir, vereda El Chamizo, Padilla.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

- Vereda La Unión: Se intervendrá el tramo 31KA02-50 cruce 31CC02 (La Unión) – sector Placita – Yarumales (Cruce 31CC02), con una longitud de 1,50 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce a La Unión, y finaliza en el PR01+500, en el sitio crítico del puente, según la información levantada en campo por el equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

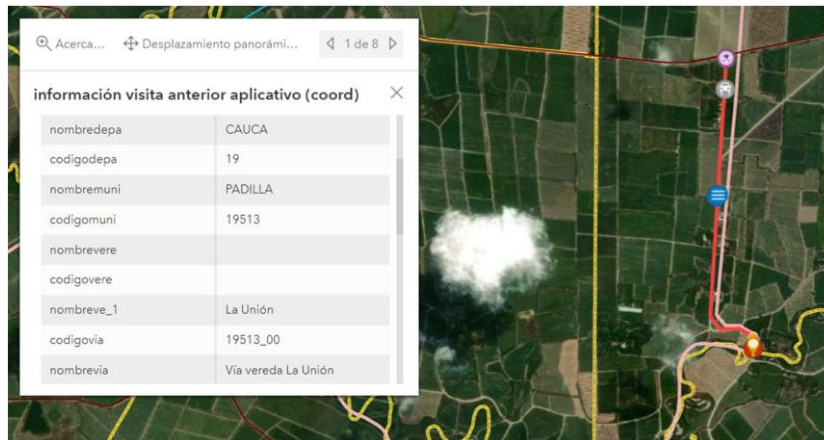


Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda La Union, Padilla.

2.2.5 TIMBIO

La población de Timbío, está situada aproximadamente a 13 Kilómetros de la capital del departamento del Cauca (Popayán). Su altitud se encuentra alrededor de los 1850 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 17 °C. Su actividad económica está orientada hacia el sector agropecuario.



Figura 17. Localización de Timbío en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

La intervención que se realizará en el municipio de Timbío corresponde a la vereda Los Robles y La Martica, las cuales se describen a continuación:

- Vereda Los Robles: Se ejecutará el proyecto en el corredor vial denominado vía El Retiro - La Avanzada - Sachacoco - Los Robles, con una longitud de 2,00 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la Ruta 2503 en la vereda Los Robles, y finaliza en el PR02+000, en la Institución Educativa Agropecuaria Los Robles . Esta vía es fundamental para la conectividad de las comunidades locales y el acceso a servicios educativos .

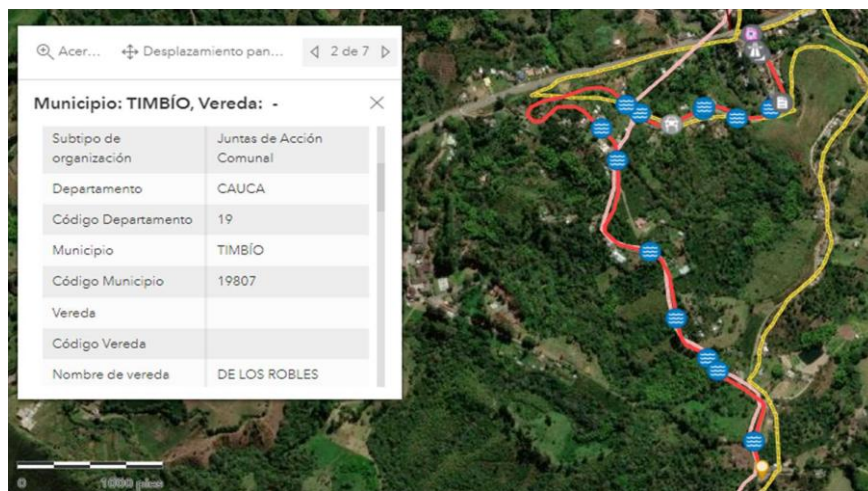


Figura 18. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbío.

- Vereda La Martica: La intervención se realizará en el corredor vial denominado vía 25KA90 - cruce vía 2503 (Mi Bohío - La Martica) o (Templete de La Virgen - Villa Manuel), con una longitud de 0,914 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR0+000, en el Templete de La Virgen, y finaliza en el PR0+914, en Villa Manuel. Esta vía es esencial para mejorar el acceso de los habitantes a las zonas urbanas y facilitar el transporte de productos agrícolas

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

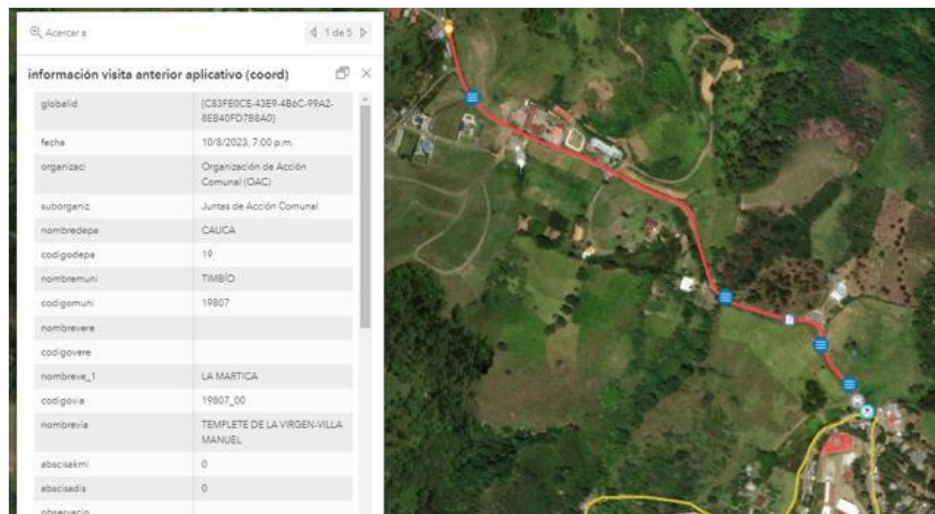


Figura 19. Localización vía a intervenir, vereda La Martica, Timbío.

2.2.6 PURACÉ

El municipio de Puracé está ubicado en la zona centro-oriental del departamento del Cauca, sobre la cordillera Central de los Andes. Limita al norte con los municipios de Popayán y Totoró, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Inzá y Páez, y al occidente con Sotará y Timbío.

La economía de Puracé se basa principalmente en la agricultura, destacándose los cultivos de maíz y frijol. En menor escala, se cultivan productos para el autoconsumo como ulluco, repollo y habas. Además, se desarrollan actividades de minería (explotación de azufre), ganadería y comercio.



Figura 20. Localización del municipio de Puracé en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

Como parte del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial, se intervendrán las siguientes veredas en el municipio de Puracé:

- Vereda El Trébol Uno: Se ejecutará el proyecto en el corredor vial denominado Popayán – Crucero – Chiribio – Piedra León – El Trébol (Cruce Ruta 2002) o Vía Vereda El Trébol Uno, con una longitud de 0,60 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la Ruta 20 (sentido Popayán – Isnos) lado derecho vereda El Trébol Uno, y finaliza en el PR00+600, a 156 m de la Y, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

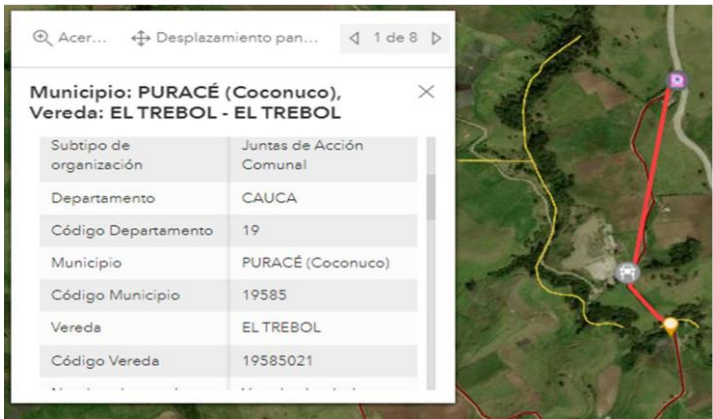


Figura 21. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace.

- Vereda Chapio Paguimbio: La intervención se realizará en el corredor vial denominado Vía a Chapio, con una longitud de 0,182 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR00+000, en la casa del señor Wilfredo Manquillo, y finaliza en el PR00+182, en la terminación de la placa huella existente, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

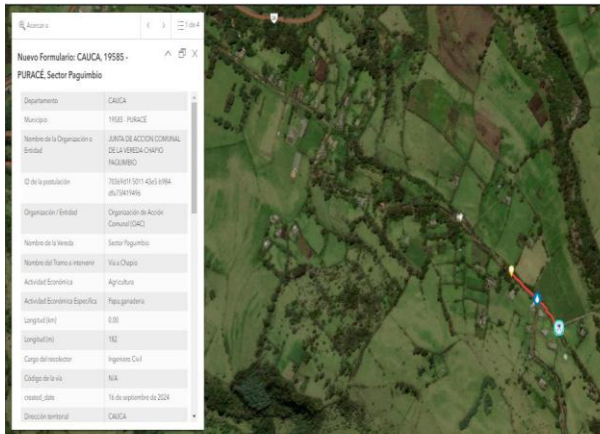


Figura 22. Localización vía a intervenir, Chapio Paguimbio, Puracé.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

2.2.7 GUACHENÉ

Guachené está ubicado en el norte del departamento del Cauca, cerca de la frontera con el Valle del Cauca. Se encuentra a aproximadamente 30 km de Cali, lo que le permite una fuerte conexión con esta ciudad. Su economía se basa principalmente en la agroindustria y la presencia de importantes zonas industriales. Destacan los cultivos de caña de azúcar, que están vinculados a los ingenios azucareros de la región.



Figura 23. Localización de Guachené en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Guachené corresponde a la vereda Cabañita. A continuación, se describe la localización de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Cabañita, corredor vial denominado desde la escuela hasta la salida de la Vereda Sabanetas (Obando- Cabañitas/Vda Cabañitas Guachené) con una longitud de 2,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 es la escuela de Cabañita, y el punto final de referencia es PR 2 + 300 es la salida de la vereda Sabanetas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

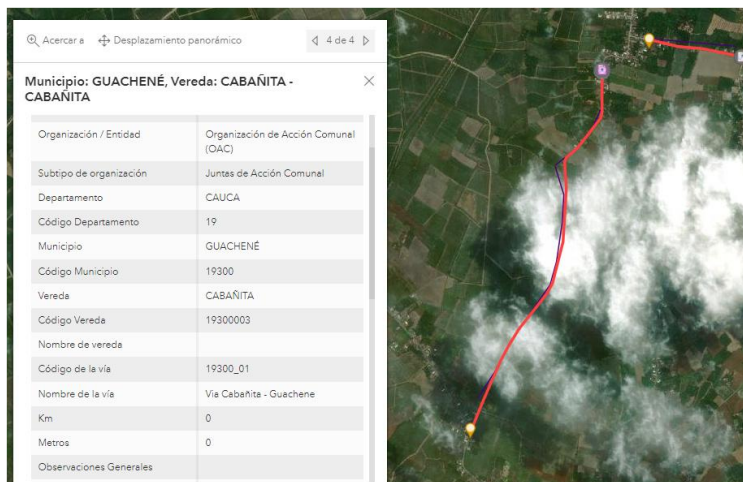


Figura 24. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené.

2.2.8 BUENOS AIRES

El municipio de Buenos Aires está ubicado en el norte del departamento del Cauca, a aproximadamente 115 kilómetros de Popayán, la capital departamental. Se encuentra a una altitud media de 2.313 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 22 °C. Su extensión territorial es de 410 km².

La economía de Buenos Aires se basa principalmente en la agricultura, destacándose cultivos como la yuca, la caña panelera, el café y el mango. Además, se desarrollan actividades de ganadería y minería.



Figura 25. Localización Nacional y Departamental de BUENOS AIRES

<p align="center">MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center">JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUSTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

Se intervendrá la vereda Munchique en el municipio de Buenos Aires. Se realizará en el corredor vial denominado Cruce 25CC24-1 Munchique, con una longitud de 0,436 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la vía 25CC24-1 LA BALSA – BUENOS AIRES – HONDURAS – ASNAZU, y finaliza en el PR00+436, en el mismo cruce, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.



Figura 26. Localización vía a intervenir, vereda Munchique, Buenos Aires.

2.2.9 CORINTO

Corinto está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en la región del valle del río Cauca. Limita con municipios como Caloto y Miranda, y se encuentra relativamente cerca de la ciudad de Cali. La economía de Corinto se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de caña de azúcar y café. También tiene una fuerte presencia de comunidades indígenas dedicadas a la producción agrícola y artesanal.



Figura 27. Localización de Corinto en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se realizarán intervenciones en las siguientes veredas:

- Vereda La Heroica:

En el corredor vial denominado Media Naranja – La Heroica, con una longitud de 0,57 km. El tramo inicia en el PR00+000, predio de Los Mosquera, y finaliza en el PR00+570, cruce con finca Los Zuleta.

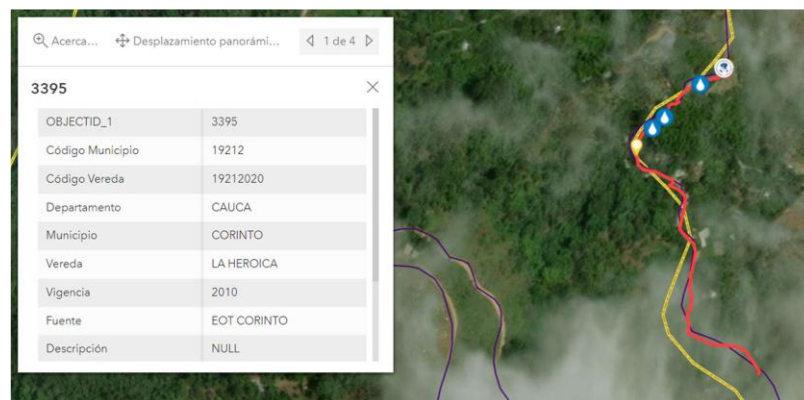


Figura 28. Localización vía a intervenir, vereda La Heroica, Corinto.

- Vereda Río Negro – García Arriba

En el corredor vial cruce Ruta 3105 – Gualanday – Río Negro, con una longitud de 0,43 km. El tramo comienza en el PR00+000, inicio de la placa huella existente, y finaliza en el PR00+430, intersección con la vía principal.

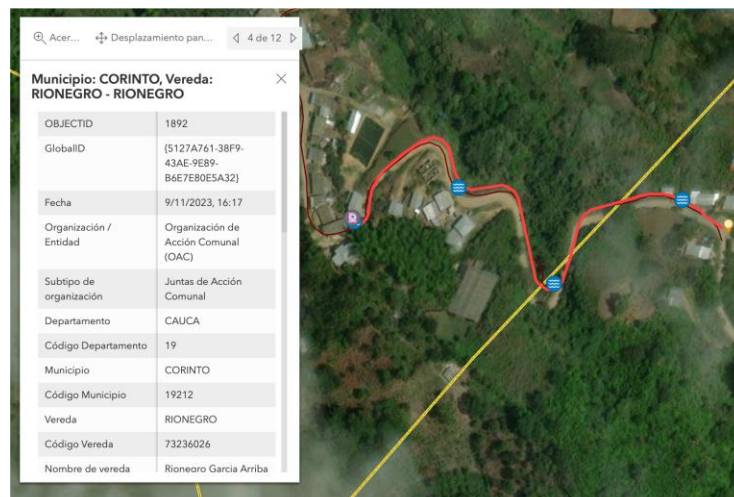


Figura 29. . Localización vía a intervenir, vereda Río Negro, Corinto.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

- Vereda Carrizales

En el corredor vial denominado Caserío Carrizales, con una longitud de 0,203 km. El tramo inicia en el PR00+000, en la entrada al caserío Carrizales, y finaliza en el PR00+203, en el retorno a la vía principal.

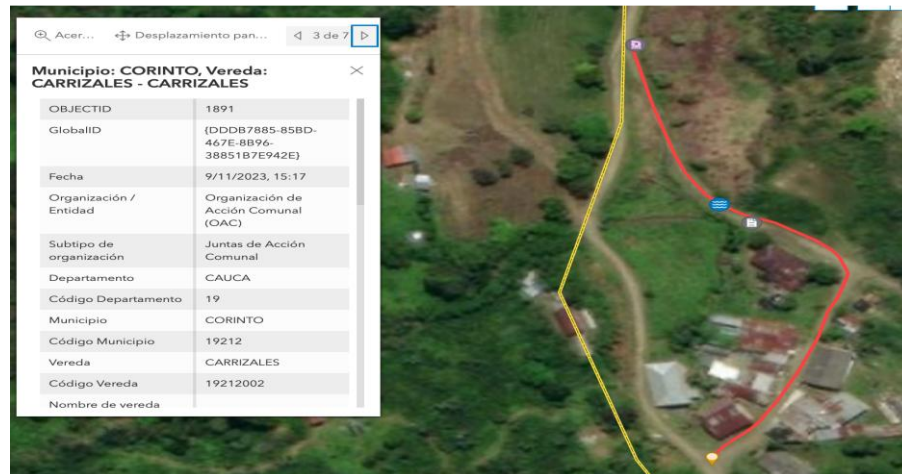


Figura 30. Localización vía a intervenir, vereda Carrizales, Corinto.

2.2.10 TORIBIO

El municipio de Toribío está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a los 02°57'29" de latitud norte y 76°16'17" de longitud oeste, a una altitud de 1.800 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 19 °C. Toribío es un lugar con una rica historia y cultura, especialmente en lo que respecta a su población indígena. Es conocido por sus paisajes naturales, su tradición cultural y su papel en la historia reciente de Colombia.



Figura 31. Localización de Toribio, Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrán las siguientes veredas:

En la vereda Soto, en el corredor vial denominado vía Centro Soto - Acueducto, con una longitud de 0,42 km. El tramo inicia en el PR00+000, cruce vía al acueducto, y finaliza en el PR00+420, cruce camino de herradura.

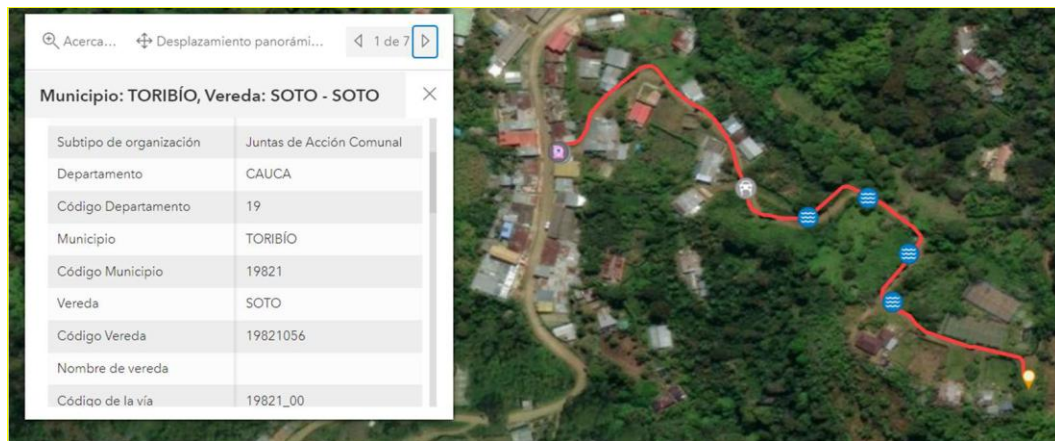


Figura 32. Localización vía a intervenir, vereda Soto, Toribio.

En la vereda Tacueyo, en el corredor vial denominado Vía Tacueyo - vereda San Diego, con una longitud de 0,481 km. El tramo inicia en el PR00+000, frente a la galería, y finaliza en el PR00+481, cruce con el colegio Quintín Lame y la vía vereda San Diego.

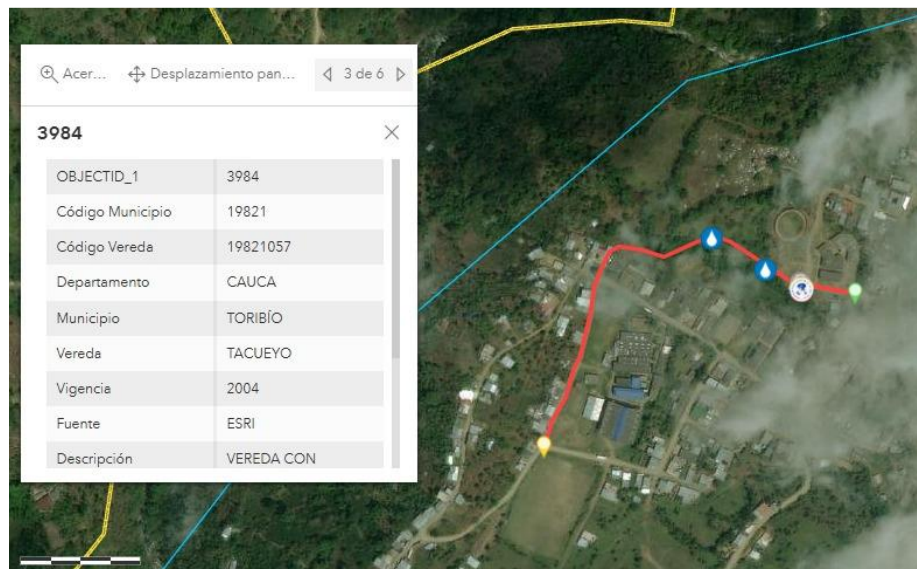


Figura 33. Localización vía a intervenir, vereda Tacueyo, Toribio.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

En la vereda La Pila, en el corredor vial con código 18060 La Despensa - La Pila - Río Jambaló, con una longitud de 3,60 km. El tramo inicia en el PR00+000, límite de las veredas La Pila y Natalá, y finaliza en el PR03+600, cruce con la Ruta 25CC25 Nuevo Día - Loma Redonda - Loma Gruesa.

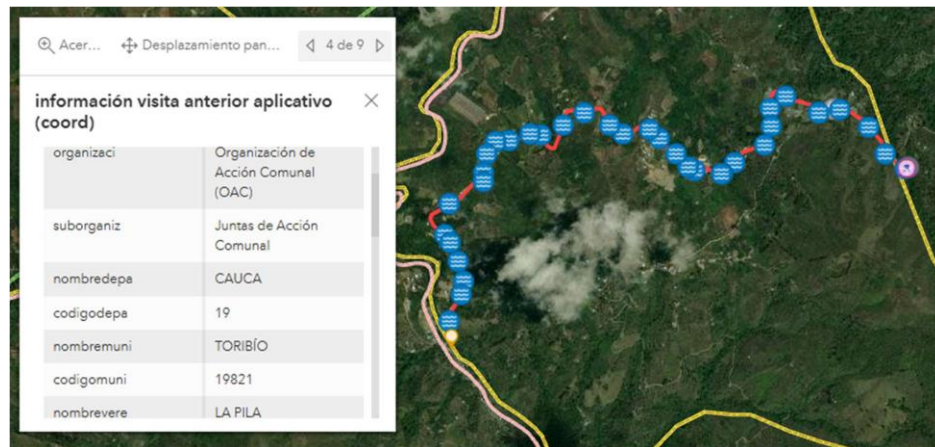


Figura 34. Localización vía a intervenir, vereda La Pila, Toribio.

2.2.11 CALOTO

El municipio de Caloto, ubicado en la provincia Norte del departamento del Cauca, Colombia, se caracteriza por una extensión territorial aproximada de 269 km² (26.931,62 hectáreas). Se encuentra a una altitud de 1.100 metros sobre el nivel del mar, con coordenadas 3°01' latitud norte y 76°25' longitud oeste. Su cabecera municipal está situada a 81 kilómetros de Popayán y a 43 kilómetros de Cali. Caloto se destaca por su diversidad geográfica y riqueza cultural, siendo uno de los municipios más antiguos del Cauca, con una economía centrada en la agricultura, la ganadería y la producción de caña de azúcar.



Figura 35. Localización de Caloto en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUSTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Abril 10 de 2025</div>	

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrá el tramo vial ubicado entre las vereda El Socorro -Valles Hondos, en el corredor denominado 31KA01-6 Cruce La Placa – El Socorro. Este tramo tiene una longitud total de 7,431 km, iniciando en el PR0+000 en el cruce con la vía Caloto – La Placa, y finalizando en el PR7+431, frente a la vivienda del señor Darío Dagua.

Esta intervención busca mejorar la transitabilidad de un corredor rural clave para la movilidad de la población campesina y la comercialización de productos agrícolas en la región norte del Cauca.

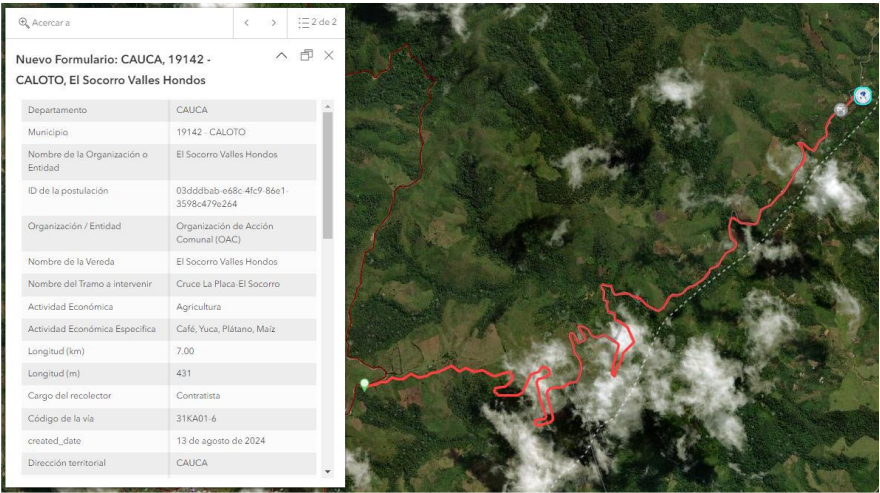


Figura 36. Localización de la vía intervenir vereda El socorro, Caloto.

2.2.12 PÁEZ

El municipio de Páez, ubicado en el oriente del departamento del Cauca, limita al norte con Ataco (Tolima), al nororiente con Teruel (Huila), al oriente con La Plata, Íquira y Nátaga (Huila), al suroccidente con Inzá (Cauca), y al occidente con Silvia, Jambaló y Toribío, también en el Cauca. Esta región, de marcada identidad cultural indígena, posee una geografía montañosa y fértil, donde la economía se basa fundamentalmente en la agricultura. Se cultivan productos como maíz blanco —tanto tradicional como tecnificado—, caña de azúcar, caña panelera, arroz, plátano, yuca y papa, entre otros.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUSTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

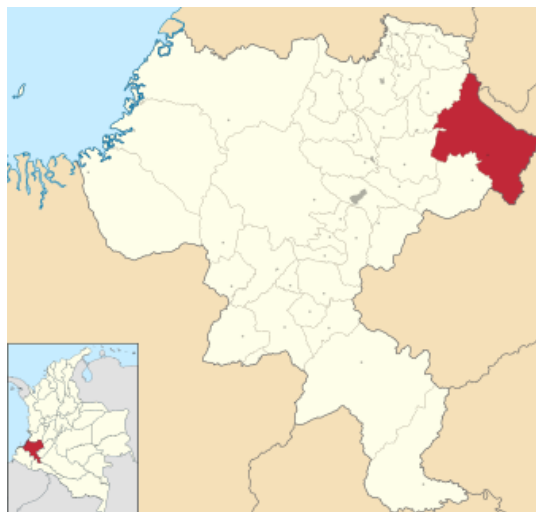


Figura 37. Localización de Páez en Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrá el tramo vial correspondiente al Cabildo Indígena de Lame, específicamente en la vereda Lame. El corredor vial a intervenir se denomina Tumbichucue – Lame – La Troja y tiene una longitud de 0,565 km. Este tramo inicia en el punto PR0+000, ubicado a 0,565 km del puente La Troja, y finaliza en el PR0+565 en el mismo puente, mejorando así el acceso vial en esta zona de importante valor cultural y agrícola.

Acercar a

1 de 2

Nuevo Formulario: CAUCA, 19517 - PAEZ, Lame

Departamento	CAUCA
Municipio	19517 - PAEZ
Nombre de la Organización o Entidad	Resguardo Indígena de Lame
ID de la postulación	e30e13ef-e931-4eea-82de-96a51fed5f0
Organización / Entidad	Organizaciones de Comunidades Étnicas
Nombre de la Vereda	Lame
Nombre del Tramo a intervenir	Puente La Troja - Boqueron
Actividad Económica	Agricultura
Actividad Económica Específica	Grenadilla,more,malz
Longitud (km)	0.57
Longitud (m)	565
Cargo del recolector	Contratista
Código de la vía	N/A
created_date	16 de mayo de 2024
Dirección territorial	CAUCA
Entidad a cargo de la vía	DEPARTAMENTO




Figura 38. Localización del tramo a intervenir vereda Lame, Paez.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

2.2.13 SANTANDER DE QUILICHAO

Santander de Quilichao es un municipio colombiano ubicado en el norte del departamento del Cauca, a 97 kilómetros de Popayán y a 45 kilómetros al sur de Cali. Esta localidad se destaca por su riqueza cultural, diversidad étnica y geográfica, y por su economía basada principalmente en la agricultura, con cultivos representativos como la caña de azúcar, el café y la yuca. Su ubicación estratégica y variedad de pisos térmicos favorecen una gran biodiversidad en flora y fauna.



Figura 39. Localización de Santander de Quilichao en el Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se desarrollará una intervención en la vereda La Toma. El tramo a intervenir corresponde al corredor vial denominado Río Quinamayo – Escuela vereda La Toma – Crucero entrada al Maraón, el cual tiene una longitud de 1,43 km. El recorrido inicia en el PR00+000, a la altura del puente vehicular, y finaliza en el PR01+430, en el cruce hacia la escuela de la vereda La Toma, fortaleciendo así la conectividad rural de esta importante zona del municipio.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

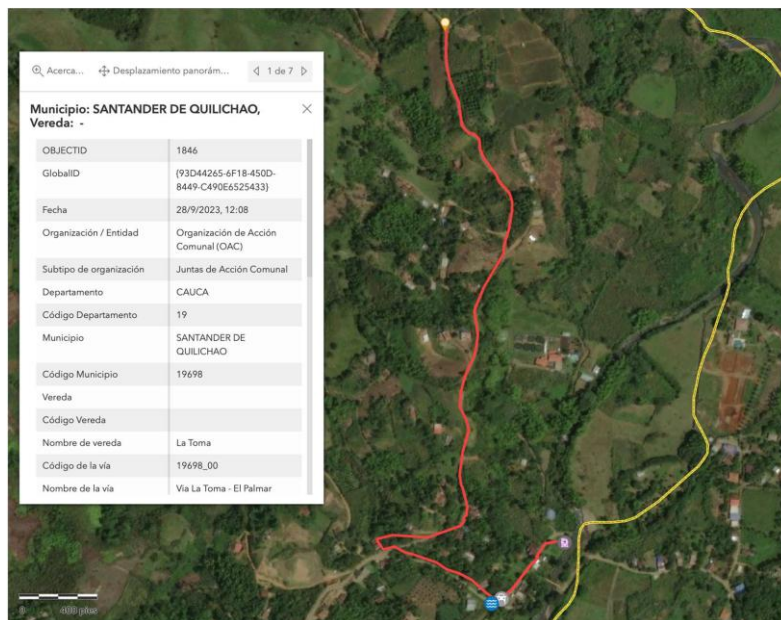


Figura 40. Localización del tramo a intervenir vereda La Toma, Santander de Quilichao.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En general, las vías incluidas en el proyecto se encuentran en un estado regular. La superficie de rodadura está en afirmado y presenta baches a lo largo de su trayecto. Además, se observa una falta de conformación en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.4.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página <http://www.invias.gov.co/>. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo y costos de materiales.

2.4.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>			
<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>			

2.4.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

2.4.1.3 Muros Gaviones

La metodología de diseños incluye parámetros geomecánicas de ángulo de fricción igual a 30° y de cohesión igual a 0kPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para el material de fundación. El ángulo de inclinación del relleno de cara al trasdós del muro se considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de tránsito asociadas al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinámico.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 MIRANDA

- CONVENIO No. 4274-2023

No. del Convenio	4274-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-780-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO
NIT	90133502-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.828.180
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FABIAN BONILLA RIVERA
Fecha suscripción Convenio	18/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 4307-2023**

No. del Convenio	4307-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-799-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO
NIT	901.012.112-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 201.225.865
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	EYDER TAQUINAS RIVERA
Fecha suscripción Convenio	10/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

• **CONVENIO No: 4314-2023**

No. del Convenio	4314-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-804-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO
NIT	891.500.779-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.394.125
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ADELA SOLARTE CASTILLO
Fecha suscripción Convenio	09/11/2023
Fecha de inicio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	Desde 27/12/2023 hasta 14/01/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 15/01/2024 hasta 13/02/2024
Reanudación No. 1	14/02/2024
Prórroga No. 1	14/02/2024 hasta 30/04/2024
Suspensión No. 2	25/04/2024 hasta 24/05/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 25/05/2024 hasta 30/06/2024
Ampliación suspensión No. 2	Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024
Reanudación No. 2	01/08/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 3	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 3	03/12/2024
Prorroga No. 4	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

3.1.2 SUAREZ

- **CONVENIO No. 2038-2024**

No. del Convenio	2038-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-006-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
NIT	901499769-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.874.214
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

- **CONVENIO No. 2059-2024**

No. del Convenio	2059-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-015-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU
NIT	901.658.851-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AZNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.870.939
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROCIO CAICEDO DIAZ

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	6 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.3 JAMBALÓ

- **CONVENIO No. 2039-2024**

No. del Convenio	2039-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-007-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA
NIT	901314905-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 209.387.835
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	BANDERLEY MEDINA PAZU
Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 2040-2024**

No. del Convenio	2040-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-008-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS
NIT	901.752.531-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.658.720
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	CARMELINA IPIA RAMOS
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

• **CONVENIO No. 3238-2024**

No. del Convenio	3238-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-815-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTERREDONDO
NIT	817.005.181-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.254.129
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE
Fecha suscripción Convenio	20 de agosto de 2024
Fecha de inicio	16 de agosto de 2024

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 23/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación vigente	31 de Mayo de 2025

3.1.4 PADILLA

- **CONVENIO No. 2090-2024**

No. del Convenio	2090-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-030-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA
NIT	817.001.505-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.035.600
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ANYELA MARIA VIAFARA CHARA
Fecha suscripción Convenio	28 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación vigente	31 de Mayo de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 2554-2024**

No. del Convenio	2554-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-382-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CHAMIZO
NIT	817.006.647-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.052.567
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MONICA YULIETH AMBUILA ARARAT
Fecha suscripción Convenio	23 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 23/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación vigente	31 de Mayo de 2025

• **CONVENIO No. 2919-2024**

No. del Convenio	2919-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-657-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION
NIT	817.004.810-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.201.271
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Fecha suscripción Convenio	02 de agosto de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.5 TIMBÍO

- **CONVENIO No. 2102-2024**

No. del Convenio	2102-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-033-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES
NIT	901.044.812-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 200.859.010
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO
Fecha suscripción Convenio	2 de julio de 2024
Fecha de inicio	02 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

- **CONVENIO No. 2631-2024**

No. del Convenio	2631-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-444-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

	MARTICA
NIT	800.211.539-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.476.926
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA
Fecha suscripción Convenio	24 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.6 PURACÉ

- **CONVENIO No. 2233-2024**

No. del Convenio	2233-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-134-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
NIT	900.277.608-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.551.500
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MANUEL BOLAÑOS
Fecha suscripción Convenio	8 de julio de 2024

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

• **CONVENIO No. 3908-2024**

No. del Convenio	3908-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-989-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO
NIT	900.245.562-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.158.485
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MILTON VLADIMIR GUAUÑA CALAPSU
Fecha suscripción Convenio	23 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	13 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.7 GUACHENÉ

• **CONVENIO No. 2297-2024**

No. del Convenio	2297-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-177-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

NIT	900.091.124-9
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.914.634
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MAIRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ
Fecha suscripción Convenio	11 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

3.1.8 BUENOS AIRES

- **CONVENIO No. 2330-2024**

No. del Convenio	2330-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-205-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER
NIT	901.077.896-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 199.954.248
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.9 CORINTO

- **CONVENIO No. 2042-2024**

No. del Convenio	2042-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-009-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA
NIT	900.323.078-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.290.536
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

- **CONVENIO No. 2427-2024**

No. del Convenio	2427-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-278-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

NIT	900.292.802-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.223.651
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

• **CONVENIO No. 2488-2024**

No. del Convenio	2488-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-325-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZALES
NIT	901.437.896-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 199.333.458
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ
Fecha suscripción Convenio	19 de julio de 2024
Fecha de inicio	6 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

3.1.10 TORIBIO

- **CONVENIO No. 2031-2024**

No. del Convenio	2031-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-002-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO
NIT	901.666.995-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 204.710.738
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	7 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

- **CONVENIO No. 2858-2024**

No. del Convenio	2858-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-614-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO
NIT	901.026.597-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

Valor del Convenio	\$ 200.147.088
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JHON ALVARO GRISALES MESA
Fecha suscripción Convenio	31 de julio de 2024
Fecha de inicio	19 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

• **CONVENIO No. 2915-2024**

No. del Convenio	2915-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-654-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA
NIT	901.019.259-2
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.847.517
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JHON FRANQUI UL MESTIZO
Fecha suscripción Convenio	02 de agosto de 2024
Fecha de inicio	18 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p align="center">MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center">JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

3.1.11 CALOTO

- **CONVENIO No. 3554-2024**

No. del Convenio	3554-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-899-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDO
NIT	901.378.354-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 206.276.926
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MARDEN CRUZ VARGAS
Fecha suscripción Convenio	9 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	11 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

3.1.12 PÁEZ

- **CONVENIO No. 3913-2024**

No. del Convenio	3913-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-034-2024
Cabildo indígena	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME
NIT	817.002.075-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.785.173
Representante legal del Cabildo indígena	JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO
Fecha suscripción Convenio	24 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	5 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

3.1.13 SANTANDER DE QUILICHAO

- **CONVENIO No. 2065-2024**

No. del Convenio	2065-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-020-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA TOMA
NIT	800.190.167-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.387.366
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FRANCY ELENA OCORO VIAFARA
Fecha suscripción Convenio	27 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el mes en curso, se avanzó en diferentes frentes según el estado de ejecución de los convenios, diferenciando dos grupos:

Grupo 2: Convenios que durante el presente periodo recibieron desembolso

- Se reanudó la ejecución de los convenios. Con el acompañamiento de la interventoría, las Organizaciones de Acción iniciaron la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.
- Se llevó a cabo el primer comité de seguimiento, espacio en el cual se brindaron orientaciones técnicas sobre las actividades preliminares necesarias para el inicio formal de la ejecución contractual.
- Se recibieron, por parte del INVIAS, los insumos técnicos fundamentales para la elaboración del diseño geométrico, tales como el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la definición de la tipología de placa huella.
- Se dio inicio al proceso de conformación del equipo técnico requerido para la ejecución del proyecto, adelantando la búsqueda de perfiles profesionales como contador(a), ingeniero(a) residente y maestro de obra.

Grupo 1: Convenios en ejecución desde el inicio de la interventoría

- Se continúa con la recopilación y entrega de la documentación requerida para la validación del equipo técnico y el inicio de actividades de obra.
- Se asistió un comité de seguimiento con el propósito de revisar los avances en la entrega de documentación. No obstante, se evidenció que persisten actividades pendientes por ejecutar.
- La interventoría brindó acompañamiento a las OAC en el proceso de recolección de cotizaciones para la adquisición de elementos contemplados en el Plan de Compras No. 1, tales como vallas y uniformes.
- En las juntas donde ya se cuenta con ingeniero(a) residente validado, se avanza en la elaboración del listado de materiales, el cronograma financiero y presupuestal. Las OAC brindan apoyo en la gestión de cotizaciones y en la preparación de los insumos requeridos para la presentación del Plan de Compras No. 1.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han suscrito ítem no previsto en ninguno de los convenios.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al presente informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas en los convenios bajo la supervisión de la interventoría. Esto se debe a que las Juntas de Acción Comunal ,beneficiarias de los convenios solidarios, se encontraban en proceso de elaboración y presentación de la documentación administrativa requerida para la ejecución de los proyectos.

Para garantizar el avance y la correcta ejecución de los convenios, se han definido las siguientes acciones a seguir:

- Revisión y aprobación de los estudios previos presentados por las OAC.
- Evaluación y validación de las hojas de vida del personal técnico y administrativo propuesto por las OAC.
- Asesoría y acompañamiento en la gestión de cotizaciones necesarias para la adquisición de insumos y materiales.
- Realización de reuniones con los profesionales contratados por las OAC, con el objetivo de establecer lineamientos de trabajo y definir los entregables tanto del ingeniero residente como de la contadora.
- Inicio de visitas técnicas para el reconocimiento del tramo y socialización del proyecto con las OAC y las comunidades beneficiarias.
- Conformación de veedurías comunitarias, con el fin de garantizar el control social y la transparencia en la ejecución de los proyectos.
- Desarrollo de comités operativos para la planificación de los planes de compras y la organización del proceso de transferencias, permitiendo la adquisición de materiales y el inicio de actividades en sitio.

Estas acciones permitirán avanzar en la fase de alistamiento y garantizar que los proyectos inicien conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo marzo de 2025, referentes a los convenios solidarios suscritos que se encuentran en ejecución, los cuales están determinados en los siguientes plazos:

- Informe Semanal 15 – 28/02/2025-06/03/2025
- Informe Semanal 16 – 07/03/2025-13/03/2025
- Informe Semanal 17 – 14/03/2025-20/03/2025
- Informe Semanal 18 – 21/03/2025-27/03/2025
- Informe Semanal 19 – 28/03/2025-03/04/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 4274-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CARAQUEÑO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XL REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO MARGAS

Matricula Profesional No.: 66202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CALIDAD

INVS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

17/03/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

FECHA

17/03/2025
(Día / Mes / Año)

L INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN [ZQUIERDA] con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709)" Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA CONVENIO No. 4274-2023 VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00 FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 10,155,588.66 0.67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%
Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIENTOS: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A
OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados. *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos. *Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico. *Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO MARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	24/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. KO: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca. se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 11,885,873.99 0.78%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad					
Placa HuellaML					
AlcantarillasUND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%					
Prog 0.000.000.000.00%					
Ejec 0.000.000.000.00%					
Prog 0.000.000.000.00%					
Ejec 0.000.000.000.00%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO INTER VAL ZONA SUR

CONSORCIO INTER VAL ZONA SUR

INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO MARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03291 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No.	4274-2023	VALOR INICIAL:	\$	200,828,180.00							
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	200,828,180.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025										
CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$	1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,828,180.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 13,483,060.91	0.89%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrin		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance de estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO MARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709)* Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca. se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15,080,247.83 0.99%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad					
Placa HuellaML					
AlcantarillasUND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%					
Prog 0.000.000.000.00					
Ejec 0.000.000.000.00					
Prog 0.000.000.000.00					
Ejec 0.000.000.000.00					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

CONVENIO No. 4307-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	10/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 4307-2023	VALOR INICIAL: \$ 201.225.865,00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00					
FECHA DE INICIO: 18/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 201.225.865,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.225.865						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.225.865						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIOINTERVENTORIA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201.225.865,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 8.425.303.33 0.55%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1.730.285.33 0.11%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1.730.285.33 0.11%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El 4 de marzo, INVÍAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad			Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %			Saltarin		
Placa Huella ML			Prog 0.00 0.00			Mezcladora de concreto		
Alcantarillas UND			Ejec 0.00 0.00 0.0%			Vibrocompactador		
			Prog 0.00 0.00			Retroexcavadora sobre llantas		
			Ejec 0.00 0.00 0.0%			vibrador de concreto		
						Motoniveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
						VERTIENTOS: SI NO N/A		
						EMISIONES: SI NO N/A		
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados. *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación *Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos. *Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
					FECHA	17/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 4307-2023		VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>201,225,865.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 10,155,588.66</td><td>0.67%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>SI NO</div><div>X</div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,225,865.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	Observaciones: N/A				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 10,155,588.66	0.67%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,225,865.00																																																																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%																																																																																				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%																																																																																				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																				
Observaciones: N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 10,155,588.66	0.67%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A	-																																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: N/A																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Salitrín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
vibrador de concreto																																																																																							
Motoniveladora																																																																																							
Total																																																																																							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																					
Ejecutado:																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																																																							
Ejecutado:																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																			
UBICACIÓN: <div>DISPONIBLE</div>				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																																			
PERMISO MINERO: SI NO				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																			
VERTIENTOS: SI NO N/A				EMISIONES: SI NO N/A																																																																																			
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																							
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)																																																																																							
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																							

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados. *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación *Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos. *Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico. *Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matricula Profesional No.: 66202-03281 STD</div></div>	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	24/03/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 4307-2023 VALOR INICIAL: \$ 201.225.865.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00									
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201.225.865.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.225.865									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.225.865									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201.225.865.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 11.885.873.99 0.78%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1.730.285.33 0.11%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1.730.285.33 0.11%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



N/A

N/A

INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
					FECHA	31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																	
I. INFORMACION GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 4307-2023		VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 201,225,865.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 13,483,060.91</td><td>0.89%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,597,186.92</td><td>0.10%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,597,186.92</td><td>0.10%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>SI NO</div><div>X</div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,225,865.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 13,483,060.91	0.89%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,225,865.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 13,483,060.91	0.89%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%																																																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A	-																																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: N/A																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Salitrín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
vibrador de concreto																																																																																							
Motoniveladora																																																																																							
Total																																																																																							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				OBSERVACIONES:																																																																																			
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)																																																																																							
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																							

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03291 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 4307-2023 VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,225,865.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones:N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 15,080,247.83	0.99%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrin		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

CONVENIO No. 4314-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **MONTERREDONDO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																										
					VERSIÓN																																																										
					PÁGINA	1 DE 2																																																									
					FECHA	10/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																															
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																															
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																															
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																											
CONVENIO No. 4314-2023		VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																															
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																												
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																															
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																															
<div>INTERVENTORÍA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 8,425,303.33 0.55%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>SI NO</div><div>X</div></div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: El 4 de marzo, INVÍAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.</div>																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																															
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																															
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																															
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: </div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																													
Placa Huella	ML																																																														
Alcantarillas	UND																																																														
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																															
<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>							Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																													
Salitrín																																																															
Mezcladora de concreto																																																															
Vibrocompactador																																																															
Retroexcavadora sobre llantas																																																															
vibrador de concreto																																																															
Motoniveladora																																																															
Total																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																															
FUENTES DE MATERIALES																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																															
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																															
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																															
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																															
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																															
VERTIENTOS: SI NO N/A																																																															
EMISIONES: SI NO N/A																																																															
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)																																																															
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																															

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se renueva el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados. *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios *Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Entir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	17/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023 VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 10,155,588.66 0.67%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados. *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios *Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico. *Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matricula Profesional No.: 66202-03281 STD</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	24/03/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023 VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 11,885,873.99 0.78%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL	
-------------------	--

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	5	
-----------------------------	---	--

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
--	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

- *Se realiza el convenio y se hace el diligenciamiento y firma del Formulario N°4 de la prorroga N°4 del convenio 4314
- *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314
- *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
- *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
- *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
- *Se solicita a la OAC el detalle de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
- *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.
- *Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios
- *Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.
- *El 24 de enero de 2023 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
- *Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.
- *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
- *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
- *Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.
- *Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.
- *Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
--	--

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
--	--

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

<p>XI. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	
--	--




INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO	N/A	N/A
------------------------------------	-----	-----

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES <small>CONTINUA DE LA FOLIO DIVERNIO DEL CONTRIBUYENTE</small>	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
---	----------------------------------

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	


Emittir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.



FIRMA: _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	

Emittir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.



FIRMA: _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
					FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																	
I. INFORMACION GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 4314-2023		VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 199,394,125.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 13,483,060.91</td><td>0.89%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,597,186.92</td><td>0.10%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,597,186.92</td><td>0.10%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>SI NO</div><div>X</div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,394,125.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 13,483,060.91	0.89%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,394,125.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 13,483,060.91	0.89%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%																																																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A	-																																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: N/A																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Saltarin</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarin			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Saltarin																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
vibrador de concreto																																																																																							
Motoniveladora																																																																																							
Total																																																																																							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				OBSERVACIONES:																																																																																			
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)																																																																																							
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																							

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios
*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.
*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.
*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03291 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15,080,247.83 0.99%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad					
Placa HuellaML					
AlcantarillasUND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%					
Prog 0.000.000.000.00					
Ejec 0.000.000.000.00					
Prog 0.000.000.000.00					
Ejec 0.000.000.000.00					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.																	
V. GESTIÓN SOCIAL																	
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>OBRA</th><th>INTER</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>				OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5															
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0															
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____																	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____																	
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____																	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																	
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314</p> <p>*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314</p> <p>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOOP.</p> <p>*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.</p> <p>*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</p> <p>*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios</p> <p>*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.</p> <p>*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.</p> <p>*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.</p> <p>*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.</p>																	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																	
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																	
N/A																	
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																	
<table border="1"><tbody><tr><td></td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>APOYO EN COTIZACIONES</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>				N/A	N/A	APOYO EN COTIZACIONES	N/A	N/A									
	N/A	N/A															
APOYO EN COTIZACIONES	N/A	N/A															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																	
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impactan el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>																	
<p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</p> <p>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</p>																	

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR  Av. 10N #16-03 PIEDECUESTA SANTANDER	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024		
	Fecha de realización: Abril 10 de 2025		

CONVENIO No. 2059-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **ASNAZU**

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

[illegible]

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.


*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INVITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ VIRTUAL



N/A


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA: _____

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD

Original: Informé mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CALIDAD
INVER

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA7/04/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

19

del

28/03/2025

al

3/04/2025

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la localidad de ASNAZU, municipio de Buenos Aires del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 1,01 km de corredor vial, que deberá ser distribuido en placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

ROCIO CAICEDO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2059-2024

VALOR INICIAL:

\$

202.870.939,00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1.522.205.504,00

FECHA DE INICIO:

6/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

202.870.939,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1.522.205.504,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202.870.939			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202.870.939			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones: N/A

Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Fisica (Programa de Obra)

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada


MAQUINARIA Y EQUIPO

Fuentes de Materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:


P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: <div></div>					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div>REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS</div>		<div>N/A</div>		<div>N/A</div>	
		<div>N/A</div>		<div>N/A</div>	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			<div>FIRMA: </div>		
			NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS		
			Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		





Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad Contractual, Interventoría y Dirección Tecnológica


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

CONVENIO No. 2038-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **TURBINA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	10/03/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,874,214.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 8,425,303.33	0.55%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El 4 de marzo, INVÍAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>		<div></div> <div>FIRMA: _____</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
				VERSIÓN							
				PÁGINA		1 DE 2					
						FECHA	17/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2038-2024		VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,874,214.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -		0.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -		0.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -		0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -		%							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -		0.00%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -		0.00%							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -		0.00%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -		0.00%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -		0.00%							
Observaciones: Se solicitan extractos bancarios para verificar si se efectuó algún descuento al valor girado por concepto de pago de pólizas.											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:				0.00%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 10,155,588.66		0.67%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33		0.11%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33		0.11%							
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI NO							
				X							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:				N/A							
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:					TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: En el periodo de marzo se asiste a la capacitación sobre el diligenciamiento de formatos y la entrega de documentos requeridos durante la ejecución del proyecto.											

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este período, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación. *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se está a la espera de la entrega de la documentación solicitada.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este período, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valio correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC , para gestionar la prórroga.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ESTADO:No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:_____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:_____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:_____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:_____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC , para gestionar la prórroga.
*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que dichas actividades aún se encuentran en trámite.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.:68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>1 DE 2</div>																																																									
					FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																									
I. INFORMACION GENERAL																																																															
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																															
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																											
CONVENIO No. 2038-2024		VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																												
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																															
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,874,214.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																															
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 14,916,433.79 0.98%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,433,372.88 0.09%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,433,372.88 0.09%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																															
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00% Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																															
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																													
Placa Huella	ML																																																														
Alcantarillas	UND																																																														
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>							Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																													
Salitrín																																																															
Mezcladora de concreto																																																															
Vibrocompactador																																																															
Retroelevadora sobre llantas																																																															
vibrador de concreto																																																															
Motoniveladora																																																															
Total																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																															
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																											
UBICACIÓN:		DISPONIBLE		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																											
		PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																											
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																											
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																											
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																											
				VERTIMIENTOS: SI NO N/A																																																											
				EMISIONES: SI NO N/A																																																											
				OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																											
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: En el periodo de marzo se asiste a la capacitación sobre el diligenciamiento de formatos y la entrega de documentos requeridos durante la ejecución del proyecto.																																																											

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC , para gestionar la próroga.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que dichas actividades aún se encuentran en trámite.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

CONVENIO No. 2039-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **ESPERANZA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
NA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	
<div>Original: Informa mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

17/03/2025

(Día / Mes / Año)

L INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES A LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ,DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

BANDERLEY MEDINA PAZU

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2039-2024

VALOR INICIAL:\$

208,387,835.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:\$

208,387,835.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2025

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:\$

1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:\$

1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$ 208,387,835.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:\$ - 0.00%

Observaciones:Se solicitan extractos bancarios para verificar si se efectuó algún descuento al valor girado por concepto de pago de pólizas.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:- 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 10,155,588.66 0.67%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 1,730,285.33 0.11%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 1,730,285.33 0.11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:N/A

PERIODO FACTURADO:N/A

VALOR FACTURA:\$ N/A-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejcc	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejcc	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de cauces: SI NO N/A

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura vial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envien nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se está a la espera de la entrega por parte de la OAC de la documentación solicitada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>1 DE 2</div>																																																									
					FECHA	24/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																									
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																															
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																															
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																											
CONVENIO No. 2039-2024 VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																											
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																												
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																															
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 208,387,835.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																															
<div>INTERVENTORÍA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 11,885,873.99 0.78%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																															
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																															
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																															
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																													
Placa Huella	ML																																																														
Alcantarillas	UND																																																														
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>							Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																													
Salitrín																																																															
Mezcladora de concreto																																																															
Vibrocompactador																																																															
Retroelevadora sobre llantas																																																															
vibrador de concreto																																																															
Motoniveladora																																																															
Total																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																															
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																											
UBICACIÓN:		DISPONIBLE		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																											
		PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																											
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																											
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																											
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																											
				VERTIMIENTOS: SI NO N/A																																																											
				EMISIONES: SI NO N/A																																																											
				OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																											
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																											

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				31/03/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2039-2024		CONTRATO No. 3649-2024						
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		VALOR ADICIONES: \$ -						
VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024						
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00						
VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025						
VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 13,616,159.32	0.89%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.
*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.
*Se envían observación sobre el personal de trabajo postulado.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A


N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
				VERSIÓN							
				PÁGINA		1 DE 2					
						FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2039-2024		VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 15,049,532.20	0.99%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO									
		X									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A									
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:					TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envien nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se envían observación sobre el personal de trabajo postulado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

CONVENIO No. 2040-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **ULLUCOS PICACHO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				10/03/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203,658,720.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 8,425,303.33	0.55%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: El 4 de marzo, INVÍAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:			DISPONIBLE			ZONAS DE DEPOSITO			SI NO		
			PERMISO MINERO: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL:			SI NO		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			APOVECHAMIENTO FORESTAL:			SI NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			CONCESIÓN DE AGUAS:			SI NO		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			OCUPACIÓN DE CAUCES:			SI NO		
						VERTIMIENTOS:			SI NO		
						EMISIONES:			SI NO		
						OTROS (Especificar cual)			SI NO		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valio correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVÍAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invías Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*el día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emilir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																											
			VERSIÓN																																																											
			PÁGINA	1 DE 2																																																										
			FECHA	17/03/2025 (Día / Mes / Año)																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																														
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																												
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																														
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																														
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																														
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																														
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																												
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																												
CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																														
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																									
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																												
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																											
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																											
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																														
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones:Se solicitan extractos bancarios para verificar si se efectuó algún descuento al valor girado por concepto de pago de pólizas.</div>																																																														
<div>INTERVENTORÍA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 10,155,588.66 0.67%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones:N/A</div>																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																														
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																														
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																														
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																												
Placa Huella	ML																																																													
Alcantarillas	UND																																																													
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																									
Prog	0.00			0.00																																																										
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																									
Prog	0.00			0.00																																																										
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																									
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																												
Salitrín																																																														
Mezcladora de concreto																																																														
Vibrocompactador																																																														
Retroelevadora sobre llantas																																																														
vibrador de concreto																																																														
Motoniveladora																																																														
Total																																																														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																														
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																											
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																											
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																																											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																											

ESTADO:

No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*el día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía aprobación de la hoja de vida del Ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

24/03/2025
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00

CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones:N/A

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 11,885,873.99 0.78%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,730,285.33 0.11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Broquetes de Infraestructura Vial

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*el día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.
*Se envía aprobación de la hoja de vida del ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO INTER VAL ZONA SUR

CONSORCIO INTER VAL ZONA SUR

INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informa mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203,658,720.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 13,616,159.32	0.89%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		DISPONIBLE		ZONAS DE DEPOSITO SI NO		N/A			
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		N/A			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO		N/A			
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO		N/A			
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO		N/A			
						VERTIMIENTOS: SI NO		N/A			
						EMISIONES: SI NO		N/A			
						OTROS (Especificar cual) SI NO		N/A			
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*El día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.
*Se envía aprobación de la hoja de vida del ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal y estudios previos para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A


N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA: 

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO																																																											
			VERSION																																																											
			PAGINA	1 DE 2																																																										
			FECHA	7/04/2025 <small>(Dia / Mes / Año)</small>																																																										
I. INFORMACION GENERAL																																																														
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																												
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																														
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																														
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																														
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																														
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																												
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																												
CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																														
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																									
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																												
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																											
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																											
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																														
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones:N/A</div>																																																														
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15,049,532.20 0.99%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,433,372.88 0.09%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,433,372.88 0.09%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones:N/A</div>																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																														
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																														
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																														
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																												
Placa Huella	ML																																																													
Alcantarillas	UND																																																													
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																									
Prog	0.00			0.00																																																										
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																									
Prog	0.00			0.00																																																										
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																									
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																												
Salitrín																																																														
Mezcladora de concreto																																																														
Vibrocompactador																																																														
Retroelevadora sobre llantas																																																														
vibrador de concreto																																																														
Motoniveladora																																																														
Total																																																														
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																														
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																											
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																											
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																																											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL	
-------------------	--

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
 El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
--	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para la OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la OAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*El día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

*Se envía aprobación de la hoja de vida del Ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
--	--

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
--	--

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO	




APOYO EN COTIZACIONES DE UNIFORMES Y VALLA

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
--	---------------------------

<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
<div style="text-align: right;"></div>	
FIRMA	_____
NOMBRE:	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.:	68202-03281 STD

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA	
NOMBRE:	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.:	68202-03281 STD

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3238-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **MONTERREDONDO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
FECHA						31/03/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	18 del 21/03/2025 al 27/03/2025	Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial, compuesto por placa huella y 2 unidades de alcantarillas.											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,254,129.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A									
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVAC.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	7/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	19 del 28/03/2025 al 3/04/2025	Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial, compuesto por placa huella y 2 unidades de alcantarillas.											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,254,129.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:					SI	NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					N/A						
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO



REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS



VALLA DEL PROYECTO



N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

CONVENIO No. 2090-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **PAILA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ <small>(Numeración consecutiva)</small>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA, en el municipio de Padilla, deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31CC02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: ANYELA MARIA VIAFARA CHARA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2090-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,035,600.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,035,600.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,035,600.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Saltarín					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
Vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A			
VERTIMENTOS:	SI NO	N/A			
EMISIONES:	SI NO	N/A			
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A			
OBSERVACIONES:					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Informe de avance de obra

El presente informe tiene como objetivo informar sobre el avance de la obra de construcción de la Vía Rápida de la Zona Sur, desde el punto de vista de la ejecución de las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 25 de marzo de 2025.

El avance de la obra se ha desarrollado de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan de Manejo Ambiental, con énfasis en la ejecución de las actividades de construcción de la infraestructura vial, así como en la implementación de las medidas de mitigación y compensación ambiental.

Se han ejecutado las siguientes actividades:

- 1. Construcción de la infraestructura vial (carretera, puentes, etc.).
- 2. Implementación de las medidas de mitigación y compensación ambiental (reforestación, conservación de áreas protegidas, etc.).
- 3. Ejecución de las actividades de monitoreo y evaluación ambiental.

Se adjunta a este informe el registro fotográfico de las actividades ejecutadas, así como el cronograma de actividades y el Plan de Manejo Ambiental.

El presente informe es el resultado de la revisión y verificación de los documentos presentados por el contratista de obra, y se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

El presente informe es el resultado de la revisión y verificación de los documentos presentados por el contratista de obra, y se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CALIDAD

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

7/04/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

19

del

28/03/2025

al

3/04/2025

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA, en el municipio de Padilla, deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31C02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

ANYELA MARIA VIAFARA CHARA

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAMES

CONVENIO No.

2090-2024

VALOR INICIAL:

\$

201,035,600.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

201,035,600.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

201,035,600.00

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones:N/A

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Placa Huella

ML

Alcantarillas

UND

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

0.00

0.00

Ejec

0.00

0.00

0.0%

Prog

0.00

0.00

Ejec

0.00

0.00

0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Saltarín

Mezcladora de concreto

Vibrocompactador

Retroexcavadora sobre llantas

Vibrador de concreto

Motoniveladora

Total

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

NO

N/A

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

REMISION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS

COTIZACIONES

VALLA DEL PROYECTO

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

CONVENIO No. 2554-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL** **CHAMIZO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	31/03/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 ml de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL CHAMIZO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2545-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
FECHA						7/04/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	19 del 28/03/2025 al 3/04/2025	Último Informe Semanal NO. 1 (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 ml de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL CHAMIZO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 2545-2024				CONTRATO No. 3649-2024		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		
VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
				VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIOINTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Observaciones: N/A						
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
OBSERVACIONES:						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XL REGISTRO FOTOGRAFICO

	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

CONVENIO No. 2919-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **VEREDA LA UNION**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	31/03/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
El corregimiento de LA UNIÓN en el departamento de CAUCA, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No.	2919-2024	VALOR INICIAL: \$ 200.201.271.00	CONTRATO No.	3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522.205.504.00							
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.271.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522.205.504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/03/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.201.271.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVAC.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	7/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El corregimiento de LA UNIÓN en el departamento de CAUCA, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2919-2024 VALOR INICIAL: \$ 200.201.271.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.271.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO INTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.201.271.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS




ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


IX. REGISTRO FOTOGRAFICO

		
REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA




FIRMA: _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>		<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
			<div>Versión No.: 001</div>	
				<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>

CONVENIO No. 2102-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS** **ROBLES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	10/03/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 8,425,303.33	0.55%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El 4 de marzo, INVÍAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valio correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA



NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				17/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 10,155,588.66	0.67%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
		X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		_____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		_____
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		_____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		_____
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La inventoria solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación. *Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
NA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>		<div> FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
Original: Informa mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	24/03/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 11,885,873.99	0.78%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
UBICACIÓN:				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A							
				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A							
				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A							
				CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							
				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A							
				VERTIMIENTOS: SI NO N/A							
				EMISIONES: SI NO N/A							
				OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.

*Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA




FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
FECHA				31/03/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2040-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,859,010.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 13,483,060.91 0.89%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.

*Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	7/04/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 14,916,433.79	0.98%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
		X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.

*Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

APOYO EN COTIZACIONES

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emilir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2631-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **MARTICA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____ 5 _____

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
REMISION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.


*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.





Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2233-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA** **VEREDA EL TRÉBOL UNO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				10/03/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribio-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía EI Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 8,425,303.33	0.55%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
		X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El 4 de marzo, INVIAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emtír conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		 FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	17/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía EI Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2233-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO INTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,551,500.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA





NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informa mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				24/03/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía EI Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 11,885,873.99	0.78%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLIDOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLIDOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLIDOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Hasta la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L. de la OAC *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra. *Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Entir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		
FIRMA: _____		MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
NOMBRE: _____		68202-03281 STD
Matrícula Profesional No.: _____		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía EI Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 13,483,060.91	0.89%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
		X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valio correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invías Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC
*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.
*Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda brindar acompañamiento técnico en este aspecto con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emilir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO			
					VERSIÓN			
					PÁGINA	1 DE 2		
					FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía EI Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2233-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO INTERVENTORÍA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,551,500.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad			Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Placa Huella ML			Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%			Saltarín		
Alcantarillas UND			Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%			Mezcladora de concreto		
			Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%			Vibrocompactador		
			Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%			Retroelevadora sobre llantas		
						vibrador de concreto		
						Motoniveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
OBSERVACIONES:								
OBSERVACIONES:								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda brindar acompañamiento técnico en este aspecto con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3908-2024 **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA** **VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	31/03/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de CHAPIO Y PAGUMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUALAÑA CALAPSU				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 3908-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 13/12/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,158,485.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				7/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de CHAPIO Y PAGUMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUALAÑA CALAPSU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3908-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,158,485.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA




*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO

		
REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 2297-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CABAÑITA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA		1 DE 2			
				FECHA	10/03/2025 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR					
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES					
CONVENIO No. 2297-2024			CONTRATO No. 3649-2024					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024			FECHA DE INICIO: 28/11/2024					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025					
VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00			VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -					
VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00			VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
			VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 8,425,303.33	0.55%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El 4 de marzo, INVIAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
				VERSIÓN							
				PÁGINA		1 DE 2					
						FECHA	17/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2297-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 10,155,588.66	0.67%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:					SI	NO					
						X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					N/A						
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$	N/A								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico			
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:					TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES				DISPONIBLE				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO		N/A	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO		N/A	
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.			

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación. *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ing residente y contadora.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
NA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div>FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03291 STD</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>		<div>1 DE 2</div>		
						FECHA		24/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3									
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA		SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.									
CONVENIO SOLIDARIO:					CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA					INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ					REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2297-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00					CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -					FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIO									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
Observaciones: N/A									
INTERVENTORÍA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 11,885,873.99	0.78%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,730,285.33	0.11%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		<div>SI NO</div> <div>X</div>							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A							
VALOR FACTURA:		\$ -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: N/A									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
Meta Física (Programa de Obra)									
Descripción de la Meta Física Contractual			Unidad	Cantidad					
Placa Huella			ML						
Alcantarillas			UND						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%				
Prog	0.00			0.00					
Ejec	0.00			0.00	0.0%				
Prog	0.00			0.00					
Ejec	0.00			0.00	0.0%				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1 :			Programado: N/A						
			Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n):			Programado:						
			Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
					APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
					CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
					OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
					VERTIMIENTOS: SI NO N/A				
					EMISIONES: SI NO N/A				
					OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manajeo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.									

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ing residente y contadora.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO



N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA




NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>		<div>1 DE 2</div>		
						FECHA		31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3									
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.									
CONVENIO SOLIDARIO:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA					INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ					REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2297-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00					CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -					FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIO									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
Observaciones: N/A									
INTERVENTORIA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 13,483,060.91	0.89%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,597,186.92	0.10%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A X							
PERIODO FACTURADO:		N/A							
VALOR FACTURA:		\$ N/A -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: N/A									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
Meta Física (Programa de Obra)									
Descripción de la Meta Física Contractual			Unidad	Cantidad					
Placa Huella			ML						
Alcantarillas			UND						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%				
Prog	0.00			0.00					
Ejec	0.00			0.00	0.0%				
Prog	0.00			0.00					
Ejec	0.00			0.00	0.0%				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1 :			Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:			
			Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n):			Programado:						
			Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: DISPONIBLE					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
PERMISO MINERO: SI NO					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manajeo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.									

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el Ing residente y contadora.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>		<div>1 DE 2</div>		
						FECHA		7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3									
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.									
CONVENIO SOLIDARIO:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA					INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ					REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2297-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00					CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -					FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIO									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
Observaciones: N/A									
INTERVENTORIA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 13,319,246.87	0.87%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		<div>SI NO</div> <div>X</div>							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A							
VALOR FACTURA:		\$ -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: N/A									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
Meta Física (Programa de Obra)									
Descripción de la Meta Física Contractual			Unidad	Cantidad					
Placa Huella			ML						
Alcantarillas			UND						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1 :			Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:			
			Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n):			Programado:						
			Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: DISPONIBLE					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
PERMISO MINERO: SI NO					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manajeo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.									

ESTADO:

No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el Ing residente y contadora.

Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matricula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	





CONVENIO No. 2330-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
FECHA						31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
El barrio NUEVO AMANECEER del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 2330-2024		VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 199,954,248.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">RÁDICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,954,248.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	RÁDICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,954,248.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
RÁDICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A	-																																																																																					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00% Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																							
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								<div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Saltarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motorveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table>		Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motorveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Saltarín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
Vibrador de concreto																																																																																							
Motorveladora																																																																																							
Total																																																																																							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).			Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																																				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO EMISIONES: SI NO OTROS (Especificar cual) SI NO																																																																																				
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																																																																				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <div></div> <div>FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	7/04/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El barrio NUEVO AMANECEER del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2330-2024	VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,954,248.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%			
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%			
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00%	Avance o Atraso Físico % 0.00%				
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Salitrin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
Vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:	DISPONIBLE				
	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	
OBSERVACIONES:					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
					
REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS		VALLA DEL PROYECTO		N/A	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emisión de conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.					
FIRMA					
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS					
Matrícula Profesional No.:				68202-03281 STD	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad Contractual, Interventoría y Dirección Tecnológica

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

CONVENIO No. 2042-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **HEROICA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

[illegible]

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
N/A


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INVITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ VIRTUAL


N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA: _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se remite a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

REMISION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Entir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

CONVENIO No. 2427-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **RIONEGRO GARCÍA ARRIBA**


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																								
			VERSIÓN																																																																								
			PÁGINA	1 DE 2																																																																							
			FECHA	10/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																							
I. INFORMACION GENERAL																																																																											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 15 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARriba DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																									
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																									
CONVENIO No. 2427-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																											
<div>CONVENIO</div> <table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200,223,661.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table> <div>INTERVENTORIA</div> <table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 8,425,303.33</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: El 4 de marzo, INVIAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.</td></tr></table>						VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,223,661.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 8,425,303.33	0.55%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>			SI	NO		X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: El 4 de marzo, INVIAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,223,661.00																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																									
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																									
Observaciones: N/A																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 8,425,303.33	0.55%																																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>			SI	NO		X																																																																					
SI	NO																																																																										
	X																																																																										
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																											
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																										
VALOR FACTURA:	\$ -																																																																										
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																											
Observaciones: El 4 de marzo, INVIAS reportó el estado de los desembolsos de los 36 convenios a cargo de esta interventoría, indicando que 16 de ellos acaban de recibir el desembolso.																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																											
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																											
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND											Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%																						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																									
Placa Huella	ML																																																																										
Alcantarillas	UND																																																																										
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																						
Prog	0.00			0.00																																																																							
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																						
Prog	0.00			0.00																																																																							
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																						
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																											
<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																																
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																									
Salitrín																																																																											
Mezcladora de concreto																																																																											
Vibrocompactador																																																																											
Retroexcavadora sobre llantas																																																																											
vibrador de concreto																																																																											
Motoniveladora																																																																											
Total																																																																											
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																											
FUENTES DE MATERIALES																																																																											
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																											
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																											
OBSERVACIONES:																																																																											
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																											
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																											
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																											
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																											
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																											
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																											
VERTIENTOS: SI NO N/A																																																																											
EMISIONES: SI NO N/A																																																																											
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																											
OBSERVACIONES:																																																																											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																											
OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																											

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																																																												
					VERSIÓN																																																																																																																												
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																																																											
					FECHA	17/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																																																											
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																																																	
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 16 del 7/03/2025 al 13/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																																																																																													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																																																															
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARriba DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																																																																	
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																	
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																																																																	
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																																																													
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																																																													
CONVENIO No. 2427-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																																																											
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																	
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																																																												
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																															
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																																																															
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																														
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="4">CONVENIO</td><td colspan="3">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>200,223,661.00</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 10,155,588.66</td><td>0.67%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td colspan="3"><table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3">PERIODO FACTURADO: N/A</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: Se solicitan extractos bancarios para verificar si se efectuó algún descuento al valor girado por concepto de pago de pólizas.</td><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">Observaciones:N/A</td></tr></table>							CONVENIO				INTERVENTORIA			VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 10,155,588.66	0.67%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>			SI	NO		X	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	PERIODO FACTURADO: N/A			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	VALOR FACTURA: \$ -			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%				Observaciones: Se solicitan extractos bancarios para verificar si se efectuó algún descuento al valor girado por concepto de pago de pólizas.				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							Observaciones:N/A																							
CONVENIO				INTERVENTORIA																																																																																																																													
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 10,155,588.66	0.67%																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>			SI	NO		X																																																																																																																							
SI	NO																																																																																																																																
	X																																																																																																																																
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	PERIODO FACTURADO: N/A																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	VALOR FACTURA: \$ -																																																																																																																													
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																																																														
Observaciones: Se solicitan extractos bancarios para verificar si se efectuó algún descuento al valor girado por concepto de pago de pólizas.				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																													
				Observaciones:N/A																																																																																																																													
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																	
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																																																																	
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>Saltarin</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> <p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <table><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR 1 :</td><td>Programado: N/A</td><td>TRAMO Y/O SECTOR 2:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ejecutado:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR (n):</td><td>Programado:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ejecutado:</td><td></td><td></td></tr></table>							Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin			Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto						Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador						Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas												vibrador de concreto												Motoniveladora												Total			TRAMO Y/O SECTOR 1 :	Programado: N/A	TRAMO Y/O SECTOR 2:			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR (n):	Programado:				Ejecutado:		
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																						
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin																																																																																																																								
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto																																																																																																																								
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador																																																																																																																								
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas																																																																																																																								
									vibrador de concreto																																																																																																																								
									Motoniveladora																																																																																																																								
									Total																																																																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR 1 :	Programado: N/A	TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																															
	Ejecutado:																																																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR (n):	Programado:																																																																																																																																
	Ejecutado:																																																																																																																																
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																																																																	
FUENTES DE MATERIALES																																																																																																																																	
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																	
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																																																	
OBSERVACIONES:																																																																																																																																	
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																	
ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A																																																																																																																																	
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																																																																	
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																																																																	
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																																																																	
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																																																																	
VERTIENTOS: SI NO N/A																																																																																																																																	
EMISIONES: SI NO N/A																																																																																																																																	
OTROS (Especificar cual): SI NO N/A																																																																																																																																	
OBSERVACIONES:																																																																																																																																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																																	
OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																																																																	

ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación. *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
NA				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emilir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03291 STD</div></div>	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																					
			VERSIÓN																																																																																					
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																				
			FECHA	24/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																				
I. INFORMACION GENERAL																																																																																								
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 17 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																																																				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A																																																																																				
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARriba DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																						
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																					
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																					
CONVENIO No.	2427-2024	VALOR INICIAL:	\$	200,223,661.00																																																																																				
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	200,223,661.00																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00																																																																																		
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																								
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>200,223,661.00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 11,885,873.99</td><td>0.78%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,730,285.33</td><td>0.11%</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>X</td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>					VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	Observaciones: N/A				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 11,885,873.99	0.78%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A		PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 11,885,873.99	0.78%																																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,730,285.33	0.11%																																																																																						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X																																																																																						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																							
VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																								
Observaciones: N/A																																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																																								
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%																																																																																					
Meta Física Ejecutada %	0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND											Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00	0.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																						
Placa Huella	ML																																																																																							
Alcantarillas	UND																																																																																							
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																			
Prog	0.00			0.00																																																																																				
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																						
Salitrín																																																																																								
Mezcladora de concreto																																																																																								
Vibrocompactador																																																																																								
Retroelevadora sobre llantas																																																																																								
vibrador de concreto																																																																																								
Motoniveladora																																																																																								
Total																																																																																								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																						
Ejecutado:																																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																																																								
Ejecutado:																																																																																								
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																								
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																						
UBICACIÓN:		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																																						
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																						
		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																						
		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																						
		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																						
		VERTIENTOS: SI NO N/A																																																																																						
		EMISIONES: SI NO N/A																																																																																						
		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																						
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																																																																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																								

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INVITACIÓN A COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																					
			VERSIÓN																																																																																					
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																				
			FECHA	31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																				
I. INFORMACION GENERAL																																																																																								
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																																																				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARriba DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																						
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																					
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																					
CONVENIO No.	2427-2024	VALOR INICIAL:	\$	200,223,661.00																																																																																				
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	200,223,661.00																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																		
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00																																																																																		
				VALOR ANTICIPO:	\$	-																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																								
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>200,223,661.00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 13,483,060.91</td><td>0.89%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,597,186.92</td><td>0.10%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,597,186.92</td><td>0.10%</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>X</td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones:N/A</td></tr></table></div></div>					VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	Observaciones: N/A				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 13,483,060.91	0.89%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A		PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones:N/A									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 13,483,060.91	0.89%																																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%																																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,597,186.92	0.10%																																																																																						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X																																																																																						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																							
VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																								
Observaciones:N/A																																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																																								
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%																																																																																					
Meta Física Ejecutada %	0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div> <div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2: </div></div>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND											Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																						
Placa Huella	ML																																																																																							
Alcantarillas	UND																																																																																							
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																			
Prog	0.00			0.00																																																																																				
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Prog	0.00			0.00																																																																																				
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																						
Salitrín																																																																																								
Mezcladora de concreto																																																																																								
Vibrocompactador																																																																																								
Retroelevadora sobre llantas																																																																																								
vibrador de concreto																																																																																								
Motoniveladora																																																																																								
Total																																																																																								
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																								
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																						
UBICACIÓN:		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																																						
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																						
		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																						
UBICACIÓN:		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																						
		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																						
		VERTIENTOS: SI NO N/A																																																																																						
		EMISIONES: SI NO N/A																																																																																						
		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																						
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																																																																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																						

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:


Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																					
			VERSIÓN																																																																																					
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																				
			FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																				
I. INFORMACION GENERAL																																																																																								
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																																																				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARriba DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																						
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																					
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																					
CONVENIO No.	2427-2024	VALOR INICIAL:	\$	200,223,661.00																																																																																				
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	200,223,661.00																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00																																																																																		
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																																						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																								
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>200,223,661.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 14,916,433.79</td><td>0.98%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,433,372.88</td><td>0.09%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 1,433,372.88</td><td>0.09%</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>X</td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>					VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	Observaciones: N/A				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 14,916,433.79	0.98%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,433,372.88	0.09%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,433,372.88	0.09%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A		PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	200,223,661.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 14,916,433.79	0.98%																																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 1,433,372.88	0.09%																																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 1,433,372.88	0.09%																																																																																						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X																																																																																						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																							
VALOR FACTURA:	\$ -																																																																																							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																								
Observaciones: N/A																																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																																								
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%																																																																																					
Meta Física Ejecutada %	0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND											Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00	0.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																						
Placa Huella	ML																																																																																							
Alcantarillas	UND																																																																																							
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																			
Prog	0.00			0.00																																																																																				
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																						
Salitrín																																																																																								
Mezcladora de concreto																																																																																								
Vibrocompactador																																																																																								
Retroelevadora sobre llantas																																																																																								
vibrador de concreto																																																																																								
Motoniveladora																																																																																								
Total																																																																																								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																						
Ejecutado:																																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																																																								
Ejecutado:																																																																																								
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																								
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																						
UBICACIÓN:		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																																						
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																						
		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																						
		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																						
		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																						
		VERTIENTOS: SI NO N/A																																																																																						
		EMISIONES: SI NO N/A																																																																																						
		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																						
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																																																																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																								

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación. *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra. *Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, Ing residente y contador. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC. *El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>		<div></div> <div>FIRMA _____</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>		

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2488-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CARRIZALES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

FECHA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

18 del 21/03/2025 al 27/03/2025

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

GERMAN ANDRES CANDIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la localidad de Carizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAMES

CONVENIO No.

2488-2024

VALOR INICIAL:

\$ 199,333,458.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 199,333,458.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

27/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:N/A

Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A

Tramo y/o Sector 2:





IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.	
ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
AVAL DE PRÓRROGA		N/A		N/A
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			 FIRMA _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

CALIDAD
INVER

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA7/04/2025(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

19

del

28/03/2025

al

3/04/2025

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

GERMAN ANDRES CANDIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2488-2024

VALOR INICIAL:

\$

199,333,458.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

199,333,458.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

199,333,458.00

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones:N/A

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Fisica (Programa de Obra)

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES:

SI

NO

N/A

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

EMISIONES:

SI

NO

N/A





OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
N/A					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS		VALLA DEL PROYECTO		N/A	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>			<div></div> <div>FIRMA: _____</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>		
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>					

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

CONVENIO No. 2031-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA** **VEREDA SOTO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

FECHA

31/03/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

18 del 21/03/2025 al 27/03/2025

Último Informe Semanal NQ

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAMES

CONVENIO No.

2031-2024

VALOR INICIAL:

\$ 204,710,738.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 204,710,738.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

27/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 204,710,738			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 204,710,738			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 204,710,738.00

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

Observaciones: A la fecha del presente informe, se recibe el desembolso, por lo que se reinicia el convenio para dar ejecución a lo contratado.

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella		
Alcantarillas		

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO

SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO N/A

Ocupación de cauces:

SI NO N/A

VERTIMIENTOS:

SI NO N/A

EMISIONES:

SI NO N/A

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

INVITACIÓN A COMITÉ

COMITÉ VIRTUAL

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ <small>(Numeración consecutiva)</small>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO, llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 204,710,738			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 204,710,738			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 204,710,738.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella					
Alcantarillas					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 NO 0.00					
Ejec 0.00 NO 0.00 0.0%					
Prog 0.00 NO 0.00					
Ejec 0.00 NO 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarín					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
Vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTION AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					

[illegible]

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

CONVENIO No. 2858-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **TACUEYO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
FECHA						31/03/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,481 km de corredor vial, realizando la construcción de 116,0 ml de placa huella y 2 alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: JHON ALVARO GRISALES MEZA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2858-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 200,147,088.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 200,147,088.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,147,088									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,147,088									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,147,088.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargos.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIMENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA:

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	7/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,481 km de corredor vial, realizando la construcción de 116,0 ml de placa huella y 2 alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JHON ALVARO GRISALES MEZA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2858-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 200,147,088.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 200,147,088.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,147,088									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,147,088									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,147,088.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS



N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD




Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR  Av. 10N #16-03 PIEDECUESTA SANTANDER	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024		
	Fecha de realización: Abril 10 de 2025		

CONVENIO No. 2915-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **VEREDA LA PILA**

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				31/03/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FRANQUI UL MESTIZO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2915-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 18/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 203,847,517.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 203,847,517.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,847,517									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,847,517									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,847,517.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVAC.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	7/04/2025 (Dia / Mes / AÑO)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FRANQUI UL MESTIZO				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2915-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 18/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 203,847,517.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 203,847,517.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,847,517									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,847,517									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,847,517.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIMENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS



N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3554-2024 **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA** **VEREDA EL SOCORRO-VALLES** **HONDOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				31/03/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de EL SOCORRO, municipio de Morales del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL SOCORRO, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 7,431 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del departamento.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARDEN CRUZ VARGAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3554-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 11/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 206,276,926.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 206,276,926.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 206,276,926.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVAC.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	7/04/2025 (Dia / Mes / AÑO)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de EL SOCORRO, municipio de Morales del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL SOCORRO, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 7,431 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del departamento.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARDEN CRUZ VARGAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3554-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 11/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 206,276,926.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 206,276,926.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 206,276,926.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

CONVENIO No. 3913-2024 **CABILDO INDÍGENA DE LAME**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				31/03/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Páez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 5/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,785,173.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: _____

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA


NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del NIVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Controlista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				7/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Páez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 5/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,785,173.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El 16 de marzo se resanuden las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XL REGISTRO FOTOGRAFICO

REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD





Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

CONVENIO No. 2065-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **TOMA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																								
			VERSIÓN																																																																																								
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																							
			FECHA	31/03/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 18 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal NQ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																											
La JUNTA DE ACCION MUNAL DE LA TOMA , municipio de Santander de Quilichao, llevará a cabo actividades de mejoramiento en la vía La Toma-el Palmar, estas incluyen la construccion de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																																																											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCI ELENA OCORO VIAFARA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																											
CONVENIO No. 2065-2024 VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00 CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																											
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/03/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																											
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																											
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 202,387,366</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 202,387,366</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr></table>					CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																			
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366																																																																																									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																								
<div><div><p>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</p><table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 202,387,366.00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ - %</td></tr><tr><td colspan="2"><small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones:N/A</td></tr></table></div><div><table><tr><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A -</td></tr><tr><td colspan="2"><small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small></td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.</td></tr></table></div></div>					CONVENIO		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 202,387,366.00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	<small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small>		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	Observaciones:N/A		INTERVENTORÍA		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>		SI	NO	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		PERIODO FACTURADO:	N/A	VALOR FACTURA:	\$ N/A -	<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>		Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.																																						
CONVENIO																																																																																											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 202,387,366.00																																																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%																																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%																																																																																										
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%																																																																																										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %																																																																																										
<small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small>																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%																																																																																										
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%																																																																																										
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%																																																																																										
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																										
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																										
Observaciones:N/A																																																																																											
INTERVENTORÍA																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%																																																																																										
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%																																																																																										
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																										
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																										
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>		SI	NO																																																																																								
SI	NO																																																																																										
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																											
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																										
VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																																																										
<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>																																																																																											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.																																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																																											
<div><div><p>Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%</p><p>Meta Física Ejecutada % 0.00%</p><table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table><p><small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small></p><div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A</div><div>Ejecutado:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:</div><div>Ejecutado:</div></div></div><div><table><tr><td colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Saltarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motorveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><p>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</p></div></div>					Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motorveladora			Total		
Meta Física (Programa de Obra)																																																																																											
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																									
Placa Huella	ML																																																																																										
Alcantarillas	UND																																																																																										
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																											
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																						
Prog	0.00			0.00																																																																																							
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																						
Prog	0.00			0.00																																																																																							
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																						
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																									
Saltarín																																																																																											
Mezcladora de concreto																																																																																											
Vibrocompactador																																																																																											
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																											
Vibrador de concreto																																																																																											
Motorveladora																																																																																											
Total																																																																																											
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																											
<div><div><p>FUENTES DE MATERIALES</p><p>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</p><p>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</p><p>OBSERVACIONES:</p></div><div><p>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</p><p>ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A</p><p>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A</p><p>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A</p><p>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A</p><p>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A</p><p>VERTIMIENTOS: SI NO N/A</p><p>EMISIONES: SI NO N/A</p><p>OTROS (Especificar cual): SI NO N/A</p><p>OBSERVACIONES:</p></div></div>																																																																																											

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
N/A		N/A		N/A	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
					
			FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
FECHA						7/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																							
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA		SEMANA No.: 19 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal NQ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A																																																																																			
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La JUNTA DE ACCION MUNAL DE LA TOMA , municipio de Santander de Quilichao, llevará a cabo actividades de mejoramiento en la vía La Toma-el Palmar, estas incluyen la construccion de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCI ELENA OCORO VIAFARA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 2065-2024		VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
<small>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</small>																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 202,387,366.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3"><small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones:N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3"><div>SI NO</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td colspan="2">\$ N/A -</td></tr><tr><td colspan="3"><small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small></td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 202,387,366.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	<small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small>			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones:N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	<div>SI NO</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A -		<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>			Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 202,387,366.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																					
<small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small>																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
Observaciones:N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
<div>SI NO</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																																																						
<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>																																																																																							
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
<div>Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%</div> <div>Meta Física Ejecutada % 0.00%</div> <div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><small>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</small></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Saltarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motorveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motorveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Saltarín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
Vibrador de concreto																																																																																							
Motorveladora																																																																																							
Total																																																																																							

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:

Ejecutado:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS					
*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.					
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
N/A					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
REMISIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS		N/A		N/A	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.					
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.					
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.					
				FIRMA _____	
				NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	
				Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad Contractual, Interventoría y Dirección Tecnológica

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
			<p>Versión No.: 001</p>	
			<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato de personal, control aportes legales y seguridad social.

[illegible]


MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo de esta interventoría se diligenciará el siguiente formato:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE				CÓDIGO	
	ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS				VERSIÓN	
					PÁGINA	

Acta ☐ No. _____ FECHA _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. _____
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: _____

VIA INTERVENIDA: _____

CONTRATISTA: _____

INTERVENTOR: _____ CONTRATO No. _____
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: _____ DE _____ DE _____ VALOR INICIAL: _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ADICIONES: \$ _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ACUMULADO: _____
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO (MESES): _____

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO \$ _____ -

VALOR IVA \$ _____ -

TOTAL PAGOS \$ _____ -

PAGOS ACUMULADOS _____

VALOR IVA ACUMULADO _____

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO _____

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: _____ No aplica

Nombre: _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Firma: _____ No aplica

Nombre: _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula Profesional No.: _____

Firma: _____ No aplica

Nombre: _____

Ingeniero residente del proyecto

Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica

Matrícula Profesional No. _____


Original: Archivo Gestión del INVÍAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Abril 10 de 2025</div>	

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</div>		<div>CÓDIGO</div>	
			<div>VERSIÓN</div>	
			<div>PÁGINA</div>	

		<div>FECHA</div>			
				<div>(Día / Mes / Año)</div>	

<div>UNIDAD EJECUTORA:</div>	<div>SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES</div>	<div>DIRECCION TERRITORIAL:</div>	<div>CAUCA</div>
------------------------------	--	-----------------------------------	------------------

<div>CONVENIO No:</div>	<div>CONTRATISTA:</div>
-------------------------	-------------------------

<div>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:</div>	<div>PROYECTO:</div>
---	----------------------

<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:</div>	<div>INTERVENTOR:</div>
--	-------------------------

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco																																	0
Lluvias moderadas																																	0
Lluvias intensas																																	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

<div>Firma</div> <div>No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>	<div>Firma</div> <div>No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>
---	--


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							PAGINA		
							FECHA	(Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA				
CONVENIO No.:		CONTRATISTA:							
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		PROYECTO:							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		INTERVENTOR:							
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificar 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultad									
Firma _____ No Aplica Nombre: Residente de Obra Matrícula Profesional No.:					Firma _____ No Aplica Nombre: Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	4 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 18/12/2023																																																											
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 200.828.180,00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 200.828.180,00 (Incluye adiciones)																																																											
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																											
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																											
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.165.636,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.041.409,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60.248.454,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00	prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			18	11	2023	31/10/2024			Día	Mes	Año				18	11	2023	31	12	2026	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																									
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00																																																									
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00																																																									
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00																																																									
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
18	11	2023	31/10/2024																																																								
Día	Mes	Año																																																									
18	11	2023	31	12	2026																																																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
31	12	2023	31	12	2028																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																											
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			18	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																					
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00																																																									
Otros																																																											
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
18	11	2023	31	12	2023																																																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459																																																											
OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																											
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1																																																											
MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																											

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	12	2023	2/03/2025		
Día	Mes	Año			
29	12	2023	30	4	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	4	2024	30/04/2025		
Día	Mes	Año			
30	4	2024	30	6	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
30	6	2024		30/06/2025		
Día	Mes	Año				
30	6	2024		31	8	2027
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
31	8	2024		31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
18	11	2023		31	8	2024
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459	OTRAS PÓLIZAS No.
---	--------------------------

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
30	8	2024		31/08/2025		
Día	Mes	Año				
30	8	2024		31	10	2027
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
31	10	2024		31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No. 4 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
18	11	2023		31	10	2024
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459	OTRAS PÓLIZAS No.
---	--------------------------

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	10	2024	4/12/2025		
Día	Mes	Año			
30	10	2024	4	12	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	4	12	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 4307-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 18/12/2023																																																											
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 201.225.865,00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 201.225.865,00 (Incluye adiciones)																																																											
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																											
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																											
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.245.174,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.061.293,50</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60.367.761,00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			10	11	2023	31/10/2024			Día	Mes	Año				10	11	2023	31	12	2026	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																									
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00																																																									
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50																																																									
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00																																																									
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
10	11	2023	31/10/2024																																																								
Día	Mes	Año																																																									
10	11	2023	31	12	2026																																																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
31	12	2023	31	12	2028																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																											
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			10	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																					
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00																																																									
Otros																																																											
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
10	11	2023	31	12	2023																																																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433		OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/12/2023																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																											
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.245.174,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.061.293,50</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">2/03/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2027</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			28	12	2023	2/03/2025			Día	Mes	Año				28	12	2023	30	4	2027															
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																									
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00																																																									
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50																																																									
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
28	12	2023	2/03/2025																																																								
Día	Mes	Año																																																									
28	12	2023	30	4	2027																																																						

Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

Día	Mes	Año
30	4	2024

Día	Mes	Año
30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	4	2024	30/04/2025		
Día	Mes	Año			
30	4	2024	30	6	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			

prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

30	6	2024
Día	Mes	Año
30	8	2024

30	8	2027
Día	Mes	Año
30	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.

3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
30	8	2024	31	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

4314-2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

4/12/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$199.394.125,00

VALOR ACUMULADO:

\$199.394.125,00

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31/10/2024		
Día	Mes	Año			
9	11	2023	31	12	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$232.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	12	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

20/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:PRÓRROGA No.:MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:1
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.:1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	12	2023	18/12/2024		
Día	Mes	Año			
27	12	2023	18	2	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
18	2	2024	18	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	18	2	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	5	2024	5/05/2025		
Día	Mes	Año			
25	5	2024	5	7	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	7	2024	5	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	5/06/2025		
Día	Mes	Año			
30	6	2024	5	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	8	2024	5	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

AMPLIACIÓN No. 2

SUSPENSIÓN No.:

2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No

2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	7	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
31	7	2024	31	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No

2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No

3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
31	8	2024	31	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		
Día	Mes	Año			
31	10	2024	4	12	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 6 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 3

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 7 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A



Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024



OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados

Firma
Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	18	12	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2038-2024		CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 02/09/2024																																																											
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 201.874.214,00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 201.874.214,00 (Incluye adiciones)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																											
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.187.421,40</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>10</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.093.710,70</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40.374.842,80</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20.187.421,40	25	6	2024	31	10	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.093.710,70	25	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.374.842,80	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento	10%	\$ 20.187.421,40	25	6	2024	31	10	2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.093.710,70	25	6	2024	31	12	2027																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.374.842,80	31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/07/2024																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																											
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMMLV</td><td>\$ 260.000.000</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000	25	6	2024	31	12	2024	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000	25	6	2024	31	12	2024																																																			
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493																																																											
OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/07/2024																																																											
OBSERVACIONES:																																																											
NOTAS:																																																											
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																											
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																											
Firma 																																																											
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																											
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	18	12	2024																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2039-2024		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
FECHA DE INICIO: 02/09/2024																																																								
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 209.387.835,00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 209.387.835,00 (Incluye adiciones)																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.938.783,50</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.469.391,75</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 41.877.567,00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20.938.783,50	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.469.391,75	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41.877.567,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>10</td><td>2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			24	6	2024	31	10	2025							24	6	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20.938.783,50																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.469.391,75																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41.877.567,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
24	6	2024	31	10	2025																																																			
24	6	2024	31	12	2027																																																			
31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031396																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/07/2024																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMMLV</td><td>\$ 260.000.000</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			24	6	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000																																																						
Otros																																																								
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
24	6	2024	31	12	2024																																																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006496		OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/07/2024																																																								
OBSERVACIONES:																																																								
NOTAS:																																																								
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																								
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																								
Firma 																																																								
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																																																								
Director de Interventoría																																																								
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD																																																								
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																								
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																								

CALIDAD
INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18

12

2024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2040-2024

CONTRATISTA:

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

02/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$

203.658.720,00

VALOR ACUMULADO:

\$

203.658.720,00

(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.365.872,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.182.936,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.731.744,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	31	10	2025
25	6	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031373

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 260.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006490

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

OBSERVACIONES:



NOTAS:



1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	18	12	2024																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2233-2024		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
FECHA DE INICIO: 02/09/2024																																																								
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 200.551.500,00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 200.551.500,00 (Incluye adiciones)																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.055.150,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.027.575,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40.110.300,00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20.055.150,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.027.575,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.110.300,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			5	7	2024	31	12	2025							5	7	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20.055.150,00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.027.575,00																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.110.300,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
5	7	2024	31	12	2025																																																			
5	7	2024	31	12	2027																																																			
31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031580																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/07/2024																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMMLV</td><td>\$ 260.000.000</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			5	7	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000																																																						
Otros																																																								
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
5	7	2024	31	12	2024																																																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006551		OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/07/2024																																																								
OBSERVACIONES:																																																								
NOTAS:																																																								
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																								
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																								
Firma 																																																								
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																																																								
Director de Interventoría																																																								
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD																																																								
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																								
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	18	12	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																								
CONVENIO No.	2297-2024		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA																																																								
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO:	02/09/2024																																																										
PLAZO INICIAL:	31/12/2024																																																										
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																										
VALOR INICIAL:	\$ 200.914.634,00																																																										
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.914.634,00 (Incluye adiciones)																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.091.463,40</td><td>11</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.045.731,70</td><td>11</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40.182.926,80</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20.091.463,40	11	7	2024	31	12	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.045.731,70	11	7	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.182.926,80	31	12	2029	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento	10%	\$ 20.091.463,40	11	7	2024	31	12	2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.045.731,70	11	7	2024	31	12	2027																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.182.926,80	31	12	2029	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031637																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/07/2024																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																											
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260.000.000</td><td>11</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000	11	7	2024	31	12	2024	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000	11	7	2024	31	12	2024																																																			
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006559 OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/07/2024																																																											
OBSERVACIONES:																																																											
NOTAS:																																																											
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																											
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																											
Firma 																																																											
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																											
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	18 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
--	-------	-------------	-------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 2427-2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 02/09/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 200.223.651,00
VALOR ACUMULADO: \$ 200.223.651,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 20.022.365,10	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			17	7	2024	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.011.182,55	17	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.044.730,20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100006595
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 01/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO


Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000	Desde			Hasta		
Otros			17	07/	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006595 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 01/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.


4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA	3/03/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3649 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNION
Seguimiento convenios 2023 y 2024 CI No. 3649-2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
REVISION DE AVANCE DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, ENFOCADO A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
SOCIALIZACION DE LOS NUEVOS DESEMBOLSOS A LOS CONVENIOS REALIZADOS POR EL INVIAS.
REVISION ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA (INFORMES SEMANALES, MENSUALES, ACTAS DE COSTOS)
PROYECCION DOCUMENTOS DE PRORROGA CONVENIOS FUTUROS A REINICIARSE
INQUIETUDES DE TEMAS ADMINISTRATIVOSY TECNICOS ELEVADOS POR LAS JUNTAS HACIA LA INTERVENTORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Informe de Estado de Convenios y Acciones Pendientes

1.Revisión de Pólizas y Recursos

Se inicia con la revisión del estado de las pólizas de los convenios, teniendo en cuenta que las comunidades expresan su preocupación respecto a los pagos para poder cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores. Los Ingenieros Jorge y Germán realizarán la consulta pertinente en el INVIAS para verificar la disponibilidad de recursos y el desembolso a las comunidades.

2.Inconsistencias en la Topografía

La interventoría ha manifestado que la topografía entregada por el INVIAS como insumo para la elaboración de los estudios y diseños presenta inconsistencias en la georreferenciación. Ante esta situación, el INVIAS, en cabeza del Ingeniero Jorge Ortega, procederá a revisar el caso y contactar al contratista para verificar y solicitar la corrección de lo mencionado.

3.Cumplimiento de Información y Avances

El INVIAS ha solicitado a la interventoría que cumpla con la presentación y carga de la información sobre los avances semanales y mensuales, así como la presentación de las actas de cobro desde el inicio del contrato. El Ingeniero Manuel se compromete a desarrollar los informes y entregarlos, así como a presentar las actas de cobro correspondientes en ceros.

4.Desembolsos y Convenios Adicionales

El Ingeniero Germán informa sobre el desembolso de 9 convenios adicionales para continuar con los trámites de verificación, reinicio y prórroga ante las juntas para continuar con la ejecución del contrato. De igual forma, solicita apoyo en la documentación de los convenios a prorrogar y en la gestión de las suspensiones mientras se reciben los desembolsos.

5.Convenios con Desembolsos Nuevos

Los convenios con desembolsos nuevos son:

2059-2024

2090-2024

2919-2024

2065-2024

2554-2024

2915-2024

2330-2024

2488-2024

3908-2024

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA	21/03/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3649 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNION
Seguimiento convenios 2023 y 2024 CI No. 3649-2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
REVISION DE AVANCE DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
REVISION ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA (INFORMES SEMANALES, MENSUALES, ACTAS DE COSTOS)
PROYECCIÓN DOCUMENTOS DE PRORROGA INTERVENTORÍA

DESARROLLO DE LA REUNION

el ingeniero German apoyo de la supervision del INVIAS, solicita informe ejecutivo para el dia 25 de marzo el cual contenga detallado el estado de ejecución y las actividades de los convenios que se vienen ejecutando y con recursos desde diciembre de 2024, así mismo se incluyan los avances realizados con las 16 juntas que se dio reinicio de convenio el 16 de marzo de 2025, las cuales recibieron desembolso en el 2025. adicionalmente solicita sea entregado el informe del especialista en cuanto a los estudios de la Junta de Accion Comunal de ULLUCOS.

El Ingeniero Jorge Ortega superviso del contrato de interventoria por parte de la territorial Invias - Cauca, a lo mencionado por el ingeniero German adiciona que la interventoria no cuenta con personal en la Region para adelantar las gestiones pertinentes y que no se han entregado los informes semanales y mensuales a la fecha, el Ingeniero Manuel Cordinador de la interventoria manifiesta que personal de la zona si se tiene contratado y que esta ejerciendo labores con la interventoria que entre otras cosas ha estado a disposicion del INVIAS para el diligenciamiento y apoyo de los formatos para prorrogar convenios y demas. por otro lado solicita sea explciado nuevamente como se va a realizar el pago de los costos indirectos teniendo en cuenta que estos son directamente proporcional al avance de obra.

se debera presentar el plan de cargas de la interventoria hoy mismo para poder ser revisado por el supervisor, por favor distribuir el alcance real de los recursos, esto con el fin de prorrargar la Interventoria toda vez que no se llevaron a comite los convenios que se reiniciaron el 16 de marzo de 2025

Se plantea reunión presencial, para el dia 31 de marzo en la territorial Cauca interventoria e Invias planta Central

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Actas de reunion a la fecha	martes, 25 de marzo de 2025	INTERVENTORIA
Informe ejecutivo detallando las 10 juntas en ejecución, incluir el estado de las 16 juntas que se dio reinicio y las juntas que continuan en suspension	martes, 25 de marzo de 2025	INTERVENTORIA
Informe del especialista referente al convenio de ULLUCOS	martes, 25 de marzo de 2025	INTERVENTORIA
Solicitar reunion de con la junta de accion comunal de Trebol Uno	martes, 25 de marzo de 2025	INTERVENTORIA
Realizar entrega de plan de cargas ajustando el tiempo real de la interventoria	viernes, 21 de marzo de 2025	INTERVENTORIA
Entrega de informes semanales y mensuales al correo del Ingeniero Jorge Alonso Ortega	viernes, 21 de marzo de 2025	INTERVENTORIA
Entrega de documentos de proroga de interventoria	martes, 25 de marzo de 2025	INTERVENTORIA

FECHA PROXIMA REUNION

27/03/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
JOHAN SUAREZ	COORDINADOR SST	INTERVENTORIA	
MANUEL PEREZ PINTO	COORDINADOR TECNICO	INTERVENTORIA	
GERMAN PEREZ PINTO	RESIDENTE	INTERVENTORIA	
VALERIA PIAMBA		INTERVENTORIA	
JORGE ALONSO ORTEGA	SUPERVISOR	INVIAS TERRITORIAL CAUCA	
GERMAN ANDRES CANDIA	GESTOR TECNICO	INVIAS PLANTA CENTRAL	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	3649-2024
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NIT	901.866.224-8
Consortio conformado por:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. con Nit. 804002667-8, con un porcentaje de participación 50% y, por ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. con NIT. 901264150-8, con un porcentaje de participación del 50%
Representante Legal	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
Valor del contrato de interventoría	\$ 1,522,205,504.00
Suscripción convenio	12/09/2024
Fecha orden de inicio	28/11/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2024
Prorroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación final	31 de mayo de 2025
Supervisor	Jorge Alonso Ortega Rojas

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el mes de marzo de 2025, la interventoría llevó a cabo diversas actividades orientadas al acompañamiento, seguimiento y supervisión técnica y administrativa de los convenios suscritos en el marco del contrato No. 3649-2024. Estas actividades se organizaron de acuerdo con el estado de ejecución de los convenios, clasificados en dos grupos:

Grupo 2: Convenios que durante el presente periodo recibieron desembolso

- Se elaboró y diligenció la documentación necesaria para gestionar el reinicio de actividades y la solicitud de Prórroga No. 1, incluyendo formatos como: solicitud de prórroga, aval de interventoría, seguimiento a garantías, MEPI de prórroga y verificación de antecedentes del representante legal, entre otros. Debido a la limitada capacidad técnica de las Juntas de Acción Comunal, estas tareas fueron asumidas directamente por el equipo de interventoría, lo que representó una carga administrativa considerable.
- Se remitieron a las OAC los insumos técnicos entregados por INVÍAS, tales como el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de placa huella, con el fin de avanzar en la elaboración del diseño geométrico.
- Se realizó un comité de seguimiento con las OAC, en el cual se explicó la ruta para el inicio de ejecución, destacando la importancia de la entrega del personal técnico y del diseño geométrico como insumos fundamentales.

Grupo 1: Convenios en ejecución desde el inicio de la interventoría

- Se solicitó a las OAC la entrega de las hojas de vida del personal técnico propuesto. Sin embargo, la mayoría de estas presentaron inconsistencias o no cumplían con los requisitos establecidos, por lo que no pudieron ser aprobadas.
- Se reiteró a las OAC la importancia de contar con un diseño geométrico aprobado para continuar con la programación y ejecución de las actividades de obra.
- Se llevaron a cabo comités con los ingenieros residentes previamente aprobados, en los cuales se brindó orientación detallada sobre los entregables técnicos requeridos, incluyendo el listado de materiales, el cronograma físico-financiero, y el formato del Plan de Compras con sus respectivos soportes documentales.
- De igual forma, se realizaron reuniones de asesoramiento con las contadoras vinculadas a los convenios, teniendo en cuenta que muchas de ellas no cuentan con experiencia en este tipo de contratos. En estas sesiones se explicó el procedimiento posterior a la aprobación del Plan de Compras, el cual incluye la facturación, la recopilación de la información de cada proveedor, el control de compras y el diligenciamiento de los formatos exigidos por la entidad bancaria:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

Solicitud de inscripción de cuentas.
Solicitud de pagos.

Actividades generales:

- Se elaboró y actualizó semanalmente la matriz de seguimiento, la cual fue remitida todos los jueves a INVÍAS conforme a los lineamientos establecidos.
- Se participó activamente en las reuniones de seguimiento convocadas por INVÍAS, con la presencia del supervisor del contrato y del equipo administrativo del consorcio interventor. En dichos espacios se socializó el estado de avance de cada convenio, así como los principales desafíos y necesidades identificadas durante la ejecución.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe por parte del Director de interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría y alistamiento, apoyo social y técnico administrativo, los cuales están anexos en el soporte del acta del presente periodo.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para el presente informe

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para el presente informe

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

No aplica para el presente informe

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---



Av. 10N #16-03
PIEDECUSTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1


Versión No.: 001

Fecha de realización:
Abril 10 de 2025



6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para este periodo, se presenta el control de aportes legales y seguridad social, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORÍA.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAS PÚBLICAS
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-7

VERSIÓN
1

PÁGINA
1

FECHA
10/04/2025
(Del 1981 al 2025)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL CABLEO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

CONVENIO No.: 2330-2024, 4085-2024, 4185-2024, 2488-2024, 2427-2024, 2042-2024, 2297-2024, 4173-2024, 3238-2024, 2045-2024, 2039-2024, 4087-2024, 2095-2024, 2554-2024, 2919-2024, 3913-2024, 3943-2024, 2233-2024, 2065-2024, 4102-2024, 2038-2024, 2059-2024, 2031-2024, 2915-2024, 2869-2024, 4324-2024, 3654-2024, 3554-2024, 3977-2024, 3908-2024, 2102-2024, 2631-2024, 4314-2024, 4274-2023, 4307-2023, 4399-2024.

CONTRATISTA: JAC BARRIO NUEVO AMANECER, RESGUARDO INDÍGENA CHAYU'E FIRM, CABLEO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES, JAC CARRIZALES, JAC HONEGRO-GARCÍA ARRIBA, JAC LA HEROICA, JAC LA CABANITA, CABLEO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAGUARIA, JAC MONTERREDONDO, JAC LILLOQUI, JAC LA ESPERANZA, RESGUARDO INDÍGENA CHIBARRAZO, JAC CORREGIMIENTO DE LA PAJA, JAC EL CHARRZO, JAC VEREDA LA UNIÓN, CABLEO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME, CABLEO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR, JAC EL TRIBUL UNO, JAC LA TOMA, CABLEO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANDA, JAC LA TURBINA, JAC ASNAZU, JAC SOTO, JAC LA PELA, JAC TACUETO, RESGUARDO INDÍGENA PANDUITA, JAC QUINTERO, JAC EL SOCORRO - VALLES HONDOS, JAC MONTERREDONDO, JAC CHAPD Y PAGUMBIO, JAC DE LOS ROBLES, JAC LA MARTICA, JAC MONTERREDONDO, JAC CARQUENÚ, JAC EL HORNO, RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CORRITO.

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Deducción por días	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	13.827.521	Director de Interventoría	\$ 3.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 4.800.000	\$ 334.100	V	SALUD TOTAL	\$ 192.000	SINAPP		\$ -	\$ 192.000	\$ -	\$ -				
2	GERMAN PÉREZ PINTO	1.140.817.484	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 5.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 3.000.000	\$ 208.800	V	SALUD MIA EPS	\$ 120.000	COLPENSIONES		\$ 480.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -				
3	ANDREA FERNANDA GÓMEZ GALVIS	1.098.777.067	Ingeniero Auxiliar de Interventoría y asistimiento	\$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 3.000.000	\$ 15.700	I	SANITAS	\$ 120.000	COLPENSIONES		\$ 480.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -				
4	MARIA ELVIRA PINTO JAMES	63.305.110	Profesional Financiero	\$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 1.900.000	\$ 10.000			\$ 76.000			\$ 304.000	\$ 76.000	\$ -	\$ -				
5	DAMARIS ANDREA ALFONSO SANCHEZ	63.537.562	Profesional Ambiental	\$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 1.900.000	\$ 10.000			\$ 76.000			\$ 304.000	\$ 76.000	\$ -	\$ -				
6	JAZMIN EUGENIA NARVAEZ CERON	25.276.458	Profesional Social	\$ 3.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 3.800.000	\$ 19.900			\$ 152.000			\$ 608.000	\$ 152.000	\$ -	\$ -				
7	JOHN ALEJANDRO SUAREZ PABON	1.121.844.714	Inspector SST	\$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 2.300.000	\$ 12.500			\$ 92.000			\$ 368.000	\$ 92.000	\$ -	\$ -				
8	DAISN LUCETH ARGOTE PICÓN	1.003.188.757	Apoyo Social	\$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 2.461.000	\$ 171.300	V	SANITAS	\$ 98.500	COLPENSIONES		\$ 393.800	\$ 98.500	\$ -	\$ -				
9	YARLEN ROCIO MURILLO QUIROGA	1.098.673.850	Técnico Administrativo	\$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	\$ 1.500.000	\$ 7.900	I	SANITAS	\$ 60.000	PORVENIR		\$ 240.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES					\$ 25.650.000																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soporte de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" los acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociado a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Contrato o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 8202-03281 STD

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15022-16412 CAJ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del R6005.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1


Versión No.: 001

Fecha de realización:
Abril 10 de 2025



6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Para este periodo, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT, con la salvedad de que este, se encuentra sujeto a modificaciones considerando que aún no se da aprobación al acta de costos del presente periodo.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-9

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
10/04/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

MES INFORME MENSUAL: MARZO/2025 PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNITARIA O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 3

CONVENIO No: 2330-2024, 4085-2024, 4185-2024, 2488-2024, 2427-2024, 2042-2024, 2297-2024, 4173-2024, 3238-2024, 2040-2024, 2039-2024, 4097-2024, 2030-2024, 2554-2024, 2919-2024, 3913-2024, 3943-2024, 2233-2024, 2065-2024, 4102-2024, 2038-2024, 2059-2024, 2031-2024, 2915-2024, 2858-2024, 4324-2024, 3654-2024, 3554-2024, 3977-2024, 3908-2024, 2102-2024, 2631-2024, 4314-2023, 4274-2023, 4307-2023, 4399-2024. CONTRATISTA: JAC BARRIO NUEVO AMANECER, RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW, CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES, JAC CARRIZALES, JAC RIONEGRO GARCÍA ARRIBA, JAC LA HEROICA, JAC LA CABAÑA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAGUIVA, JAC MONTERREDONDO, JAC LILLOES, JAC LA ESPERANZA, RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO, JAC CORREGIMIENTO DE LA PAILA, JAC EL CHAMIZO, JAC VEREDA LA UNIÓN, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAMÉ, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR, JAC EL TREBOL UNO, JAC LA TOMA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANGAS, JAC LA TURBINA, JAC ASANZU, JAC SOTO, JAC LA PILA, JAC TACUEYO, RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA, JAC QUINTERO, JAC EL SOCORRO - VALLES HONDOS, JAC MONTERREDONDO, JAC CHAPÓ Y PAGUMBIRO, JAC DE LOS ROBLES, JAC LA MARTICA, JAC MONTERREDONDO, JAC CARAQUEÑO, JAC EL HORNO, RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CORINTO.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	922024	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1,522,205,504	-
TOTAL						\$ 1,522,205,504	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1,522,205,504

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVÍAS	Observaciones
1	NOVIEMBRE/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	922024 ; 19/09/2024	\$ 1,522,205,504	\$ 1,522,205,504.00	-	-
2	DICIEMBRE/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	922024 ; 19/09/2024	\$ 1,522,205,504	\$ 1,522,205,504.00	-	-
3	ENERO/2025	\$ 29,146,000	\$ 5,537,740	\$ 34,683,740	\$ -	\$ -	\$ -	922024 ; 19/09/2024	\$ 1,487,521,764	\$ 1,487,521,764.00	-	-
4	FEBRERO/2025	\$ 35,518,000	\$ 6,748,420	\$ 42,266,420	\$ -	\$ -	\$ -	922024 ; 19/09/2024	\$ 1,445,255,344	\$ 1,445,255,344.00	-	-
5	MARZO/2025	\$ 60,534,000	\$ 11,501,460	\$ 72,035,460	\$ -	\$ -	\$ -	922024 ; 19/09/2024	\$ 1,373,219,884	\$ 1,373,219,884.00	-	-
TOTALES		\$ 125,198,000.00	\$ 23,787,620.00	\$ 148,985,620.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,373,219,884	\$ 1,373,219,884		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 125,198,000	\$ 23,787,620	\$ 148,985,620
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 125,198,000	\$ 23,787,620	\$ 148,985,620

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024


No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Abril 10 de 2025



6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPH-MN1-N-15-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

31/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3."

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/05/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 255,832,858.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20

VIGENCIA					
Desde	Hasta				
12	9	2024	1	7	2025
12	9	2024	1	7	2025
12	9	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.:

1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

1/10/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 255,832,858.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20

VIGENCIA					
Desde	Hasta				
28	11	2024	1	12	2025
28	11	2024	1	12	2025
28	11	2024	31	5	2028
18	3	2024	8	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.:

4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

1/10/2024

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

<p>OBSERVACIONES:</p>
<p>NOTAS:</p> <p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p> <p>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p> <p>Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU</p> </div> </div> <p><small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</small></p>

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica.

6.6.2 PLAN DE CARGAS

A la fecha del presente informe, el Plan de Cargas ha sido entregado al supervisor y se encuentra en proceso de revisión. Se espera su aprobación para proceder con la implementación correspondiente en el desarrollo de las actividades programadas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	
---	---	---	---

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- El avance de los convenios del Grupo 2 ha estado condicionado por la necesidad de apoyo técnico por parte de la interventoría para el diligenciamiento de los documentos administrativos requeridos para la solicitud de la Prórroga No. 1 e inicio de la ejecución, debido a la limitada capacidad operativa de algunas JAC.
- Las JAC del Grupo 1 presentan demoras significativas en la entrega de documentación clave, como las hojas de vida del personal técnico y los diseños geométricos, lo cual ha limitado el avance efectivo de las actividades constructivas.
- Se ha evidenciado una carga administrativa considerable que ha sido asumida por la interventoría, a pesar de que muchas de estas tareas deberían ser gestionadas directamente por las JAC.
- El retraso general en el desarrollo de los convenios se ha visto agravado por problemas técnicos relacionados con el levantamiento topográfico entregado por INVÍAS, el cual no incluía georreferenciación. Esta falencia impidió que el equipo profesional contratado pudiera avanzar con el diseño geométrico en los tiempos establecidos. Ante la falta de solución oportuna a esta situación, y con el objetivo de no seguir afectando el cronograma de las OAC, se tomó la decisión de iniciar el diseño geométrico aun sin contar con la georreferenciación.
- Es importante resaltar que el avance de los convenios no depende únicamente del acompañamiento de la interventoría. El desarrollo de los mismos es una responsabilidad compartida, en la cual el compromiso y cumplimiento de las OAC con la entrega oportuna de la documentación requerida es determinante para dar trámite a los procesos contractuales.
- Se espera, que para el próximo periodo se logre la aprobación de la totalidad del personal técnico requerido, así como el inicio de la elaboración y presentación de los Planes de Compra No. 1, con el fin de avanzar hacia la fase de ejecución de obra en los diferentes convenios.
- Finalmente, a la fecha, se cuenta con diez (10) convenios en estado de suspensión por falta de recursos, situación que limita el alcance general del contrato e impide la continuidad de la planificación operativa en dichos frentes.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>	

Recomendaciones

- Continuar con la realización periódica de los comités de seguimiento, con el fin de mantener informadas a las OAC, resolver dudas en tiempo real y reforzar el compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- A pesar de los desafíos administrativos identificados, esta interventoría reitera su disposición para seguir brindando acompañamiento técnico y atención oportuna a los diferentes requerimientos presentados por las OAC.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Abril 10 de 2025	

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

8.1.1 ENVIADA

<div>  <div> CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR </div> </div>										
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
035	10/3/2025	BANCO AV VILLAS	legria CeronYudy Magnolia Hoy	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Olga Ximena Alegria Ceron Yudy Magnolia Hoyos Gonzalez	11/03/2025	Solicitud información desembolso convenios	ARCHIVO DIGITAL
036	13/3/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	Jorge Alonso Ortega Castro	Marco Antonio Solano Vargas	X					ARCHIVO DIGITAL
037	22/3/2025	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y/O ORGANIZACIONES INDÍGENAS (GRUPO 2)	Representantes Juntas De Acción Comunal y/o Organizaciones Indígenas	Marco Antonio Solano Vargas	X		Representantes Juntas De Acción Comunal y/o Organizaciones Indígenas (Grupo 2)	22/3/2025	Citación a comité de seguimiento convenios de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
038	22/3/2025	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y/O ORGANIZACIONES INDÍGENAS (GRUPO 1)	Representantes Juntas De Acción Comunal y/o Organizaciones Indígenas	Marco Antonio Solano Vargas	X		Representantes Juntas De Acción Comunal y/o Organizaciones Indígenas Grupo 1)	22/3/2025	Citación a comité de seguimiento convenios de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
039	22/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TREBOL UNO	Manuel Bolaños	Marco Antonio Solano Vargas	X		Manuel Bolaños	22/3/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
040	25/3/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Maria Elmira Pinto Jaimes	X			25/3/2025	Solicitud de Prorroga No. 2 al Contrato No. 3649 de 2024.	ARCHIVO DIGITAL
041	25/3/2025	RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS	ROBINSON CAMPO	Marco Antonio Solano Vargas	X		ROBINSON CAMPO	1/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
042	25/3/2025	RESGUARDO INDIGENA YAQUIVA	MARCELINO DICUE VOLVERAS	Marco Antonio Solano Vargas	X		MARCELINO DICUE VOLVERAS	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
043	25/3/2025	RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA	HAROL OVIEDO GOLONDRINO COMETA	Marco Antonio Solano Vargas	X		HAROL OVIEDO GOLONDRINO COMETA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
044	25/3/2025	RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE CORINTO	JUAN CARLOS YATACUE ORTEGA	Marco Antonio Solano Vargas	X		JUAN CARLOS YATACUE ORTEGA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>				<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
					<p>Versión No.: 001</p>	
	<p>Fecha de realización: Abril 10 de 2025</p>					

045	25/3/2025	RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR	PEDRO JESUS CASTANO URBANO	Marco Antonio Solano Vargas	X		PEDRO JESUS CASTANO URBANO	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
046	25/3/2025	RESGUARDO INDIGENA CXAYUCE FXIW	LEIDY TATIANA PACHO CAMPO	Marco Antonio Solano Vargas	X		LEIDY TATIANA PACHO CAMPO	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
047	25/3/2025	RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO	Marco Antonio Solano Vargas	X		FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
048	25/3/2025	CABILDO INDIGENA DE LAME	JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO	Marco Antonio Solano Vargas	X		JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
049	26/3/2025	RESGUARDO INDIGENA CHIMBORAZO	MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ	Marco Antonio Solano Vargas	X		MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
050	26/3/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS	MARDEN CRUZ VARGAS	Marco Antonio Solano Vargas	X		MARDEN CRUZ VARGAS	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
051	26/3/2025	NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ	Marco Antonio Solano Vargas	X		WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
052	26/3/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PAILA	ANYELA MARIA VIAFARA CHARA	Marco Antonio Solano Vargas	X		ANYELA MARIA VIAFARA CHARA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
053	26/3/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO	JOSE NEMESIO MOSQUERA	Marco Antonio Solano Vargas	X		JOSE NEMESIO MOSQUERA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
054	26/3/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA TOMA	FRANCY ELENA OCORO VIAFARA	Marco Antonio Solano Vargas	X		FRANCY ELENA OCORO VIAFARA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
055	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA	Marco Antonio Solano Vargas	X		WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
056	26/3/2025	DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	MILTON VLADIMIR GUAUÑA	Marco Antonio Solano Vargas	X		MILTON VLADIMIR GUAUÑA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
057	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO	Marco Antonio Solano Vargas	X		MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
058	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO (Jambalo)	RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE	Marco Antonio Solano Vargas	X		RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
059	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA	Marco Antonio Solano Vargas	X		ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
060	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA	Marco Antonio Solano Vargas	X		JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
061	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	MONICA YULIETH AMBUILA ARARAT	Marco Antonio Solano Vargas	X		MONICA YULIETH AMBUILA ARARAT	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
062	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ	Marco Antonio Solano Vargas	X		PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ	2/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
063	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO	JHON ALVARO GRISALES MESA	Marco Antonio Solano Vargas	X		JHON ALVARO GRISALES MESA	3/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
064	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	JHON FRANQUI UL MESTIZO	Marco Antonio Solano Vargas	X		JHON FRANQUI UL MESTIZO	3/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
065	26/3/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO	YAIR CABRERA LARRAHONDO	Marco Antonio Solano Vargas	X		YAIR CABRERA LARRAHONDO	3/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
066	26/3/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	ROCIO CAICEDO DIAZ	Marco Antonio Solano Vargas	X		ROCIO CAICEDO DIAZ	3/4/2025	Entregables Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos	ARCHIVO DIGITAL
067	31/3/2025	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y/O ORGANIZACIONES INDÍGENAS (GRUPO 1)	Representantes Juntas De Acción Comunal y/o Organizaciones Indígenas	Marco Antonio Solano Vargas	X		Representantes Juntas De Acción Comunal y/o Organizaciones Indígenas Grupo 1)	31/3/2025	Citación a comité de seguimiento convenios de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---
