	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2330-2024, 4085-2024, 4185-2024, 2488-2024, 2427-2024, 2042-2024, 2297-2024, 4173-2024, 3238-2024, 2040-2024, 2039-2024, 4097-2024, 2090-2024, 2554-2024, 2919-2024, 3913-2024, 3943-2024, 2233-2024, 2065-2024, 4102-2024, 2038-2024, 2059-2024, 2031-2024, 2915-2024, 2858-2024, 4324-2024, 3654-2024, 3554-2024, 3977-2024, 3908-2024, 2102-2024, 2631-2024, 4314-2023, 4274-2023, 4307-2023, 4399-2024.	Contratista: JAC BARRIO NUEVO AMANECER, RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW, CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES, JAC CARRIZALES, JAC RIONEGRO-GARCIA ARRIBA, JAC LA HEROICA, JAC LA CABAÑITA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA, JAC MONTERREDONDO, JAC ULLUCOS, JAC LA ESPERANZA, RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO, JAC CORREGIMIENTO DE LA PAILA, JAC EL CHAMIZO, JAC VEREDA LA UNION, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR, JAC EL TREBOL UNO, JAC LA TOMA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS, JAC LA TURBINA, JAC ASNAZU, JAC SOTO, JAC LA PILA, JAC TACUEYO, RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA, JAC QUINTERO, JAC EL SOCORRO - VALLES HONDOS, JAC MONTERREDONDO, JAC CHAPIO Y PAGUIMBIO, JAC DE LOS ROBLES, JAC LA MARTICA, JAC MONTERREDONDO, JAC CARAQUEÑO, JAC EL HORNO, RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CORINTO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Contrato de Interventoría No. 3649-2024	Interventoría: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Objeto Contrato de Interventoría:
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 6	MES O PERIODO: ABRIL/2025
---------------------------------------------	----------------------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		9
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		10
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		17
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		39
2.4	Características técnicas del proyecto		40
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		42
3.1	Información general del contrato		42
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		61
3.3	Seguimiento Items no previstos		63
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		64
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		65
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	65
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	300
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	301
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	302
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	303
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	304
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	304
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	324
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		324
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	324
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	324
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		337
5.1	Información general del contrato		337
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		338
5.3	Informes especialistas y profesionales		340
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		340
5.5	Informe matriz de riesgos.		340
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		340
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		341
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	341
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	342
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	343
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	344
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	345
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		345
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	346
7	Conclusiones y recomendaciones		347
8	Anexos		348
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		348
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


 Firma: _____
 Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Resolución de designación No. N/A de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<table border="1"> <tr> <td>No. Copias Impresas: 1</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Versión No.: 001</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p> </td> </tr> </table>	No. Copias Impresas: 1		Versión No.: 001	<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
No. Copias Impresas: 1							
Versión No.: 001							
<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>							

Resumen Mensual Estado General del Proyecto, MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Una vez se de inicio a las actividades en obra, se diligenciará el respectivo formato

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR
OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL. LOTE 3**

PERIODO:

01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

**CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
INTERVENTORÍA DE CONVENIOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 GERMAN PÉREZ PINTO MP.: 68202-365002 STD	 MARCO ANTONIO SOLANO MP.: 68202-03281 STD	 MARÍA ELVIRA PINTO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	7
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	8
2.1	LOCALIZACIÓN	12
2.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	15
2.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	37
2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	38
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS	40
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS.....	40
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	59
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS	61
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	62
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	63
4.1	INFORME SEMANAL	63
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO	90
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO.....	91
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO	92
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	93
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	94
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO.....	94
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....	95
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	95
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	96
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	96
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	97
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	99
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	99
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS	99
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	99
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	100
6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	100
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	101
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	102

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	103
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	104
6.6	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	104
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	106
8	ANEXOS.....	107
8.1	CORRESPONDENCIA.....	107

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS) 12

Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA..... 15

Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda..... 16

Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda..... 16

Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda..... 17

Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca..... 17

Figura 7. Localización del tramo a intervenir, Vereda Asnazu, Suarez..... 18

Figura 8. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez..... 18

Figura 9. Localización de Jambaló en el Cauca..... 19

Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló..... 20

Figura 11. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló..... 20

Figura 12. Localización del tramo a intervenir, vereda Monterredondo, Jambaló..... 21

Figura 13. Localización de Padilla en el Cauca..... 21

Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda La Paila, Padilla..... 22

Figura 15. Localización vía a intervenir, vereda El Chamizo, Padilla..... 22

Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda La Union, Padilla..... 23

Figura 17. Localización de Timbío en el Cauca..... 23

Figura 18. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbío..... 24

Figura 19. Localización vía a intervenir, vereda La Martica, Timbio..... 25

Figura 20. Localización del municipio de Puracé en el Cauca..... 25

Figura 21. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace..... 26

Figura 22. Localización vía a intervenir, Chapio Paguimbio, Puracé..... 26

Figura 23. Localización de Guachené en el Cauca..... 27

Figura 24. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené..... 28

Figura 25. Localización Nacional y Departamental de BUENOS AIRES..... 28

Figura 26. Localización vía a intervenir, vereda Munchique, Buenos Aires..... 29

Figura 27. Localización de Corinto en el Cauca..... 29

Figura 28. Localización vía a intervenir, vereda La Heroica, Corinto..... 30

Figura 29. Localización vía a intervenir, vereda Rio Negro, Corinto..... 30

Figura 30. Localización vía a intervenir, vereda Carrizales, Corinto..... 31

Figura 31. Localización de Toribio, Cauca..... 31

Figura 32. Localización vía a intervenir, vereda Soto, Toribio..... 32

Figura 33. Localización vía a intervenir, vereda Tacueyo, Toribio..... 32

Figura 34. Localización vía a intervenir, vereda La Pila, Toribio..... 33

Figura 35. Localización de Caloto en el Cauca..... 33

Figura 36. Localización de la vía intervenir vereda El socorro, Caloto..... 34

Figura 37. Localización de Páez en Cauca..... 35

Figura 38. Localización del tramo a intervenir vereda Lame, Paez..... 35

Figura 39. Localización de Santander de Quilichao en el Cauca..... 36

Figura 40. Localización del tramo a intervenir vereda La Toma, Santander de Quilichao..... 37

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVÍAS desde sus Direcciones Territoriales.

Con el programa *Caminos Comunitarios de la Paz Total*, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales en distintos municipios del Departamento del Cauca, para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En cumplimiento de las disposiciones legales y con el objetivo de asegurar el control y seguimiento de los proyectos, el INVÍAS consideró necesario adelantar un proceso de contratación para la selección de un interventor que ejerza labores de supervisión y vigilancia.

Para tal fin, bajo la modalidad de mínima cuantía, se publicó en la plataforma Secop II, el proceso con ID CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, del cual se deriva el contrato de Interventoría No. 3649-2024, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3**, celebrado con el CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR.

En este marco, y como parte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el Informe Mensual No. 6, cuyo propósito es informar al Instituto Nacional de Vías, sobre el estado actual de los contratos suscritos a esta interventoría, detallando los aspectos generales y específicos del proyecto.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos a desarrollar se encuentran ubicados en la zona rural del departamento del Cauca, dentro del alcance del contrato, la interventoría tiene a su cargo el **Lote 3**, correspondiente a la zona norte.

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Para la ejecución de este proyecto, el Instituto Nacional de Vías ha suscrito treinta y seis (36) convenios solidarios con diversas Juntas de Acción Comunal, Resguardos y Cabildos Indígenas, responsables de la ejecución de las obras. En la **Tabla 1** se presenta la relación de los convenios suscritos con la interventoría, especificando el municipio, número de convenio y nombre.

Tabla 1. Convenios solidarios y/o contratos sobre los cuales se ejecutará la interventoría.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>		<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
			<div>Versión No.: 001</div>	
	<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>			

TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO
	3908-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES
	4399-2024	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO
TORIBIO	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO
	2858-2024	JAC TACUEYO
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS
	3654-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO
PÁEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME
	3943-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR
CAJIBÍO	3977 -2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO
	4085-2024	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW
MORALES	4097-2024	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO
INZÁ	4173-2024	RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA
CALDONO	4185-2024	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES
TOTORÓ	4324-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA
	4102-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS

A la fecha se cuenta con veintiséis (26) convenios en ejecución. **La Tabla 2** detalla los convenios, incluyendo el municipio, número de convenio, nombre de la organización ejecutora y el valor asignado para su desarrollo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

Tabla 2. Convenios asignados en ejecución.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	VALOR
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	\$ 200,828,180
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	\$ 201,225,865
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	\$ 199,394,125
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	\$ 202,870,939
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	\$ 201,874,214
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	\$ 209,387,835
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 203,658,720
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	\$ 201,254,129
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA	\$ 201,035,600
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	\$ 201,052,567
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN	\$ 200,201,271
TIMBIO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	\$ 200,859,010
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	\$ 199,476,926
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	\$ 200,551,500
	3908-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	\$ 201,158,485
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 200,914,634
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	\$ 199,954,248

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	\$ 200,290,536
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA	\$ 200,223,651
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	\$ 199,333,458
	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 204,710,738
TORIBIO	2858-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TACUEYO	\$ 200,147,088
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	\$ 203,847,517
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS	\$ 206,276,926
PÁEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME	\$ 201,785,173
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	\$ 202,387,366

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Tabla 3. Localización de juntas en ejecución.

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA
MIRANDA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	18750	CARAQUEÑO-MONTERREDONDO
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	1826	VÍA A EL HORNO
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	31KA54-1-1	Las Cañas – Damnificados - Monterredondo
SUAREZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	19780_00	Vía Parque Asnazu La.bocatoma
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	19780_004	La Turbina - Miravalle
JAMBALÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	19364_00	vía al rio la esperanza
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	19364_00	17721 San Francisco-La Mina
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	N/A	vía Monte Redondo – Vereda Monte Redondo (Vía Jámbalo – Monterredondo)
PADILLA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA	19513_00	Vía Callejon La Cancha De Futbol
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	19513_00	Vía Chamizo - Obando
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN	19513_00	Vía Vereda La Unión
TIMBÍO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	25KA86	Cruce Ruta 2503 (Timbio)-El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles (Cruce Ruta 2503)
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	19807_00	Templete De La Virgen-Villa Manuel
PURACÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	19585_00	Via Vereda El Trebol Uno
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	N/A	vía a Chapio
GUACHENE	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	19300_01	Via Cabañita - Guachene
BUENOS AIRES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	25KA24-1-6	Cruce 25cc24-1-MUNCHIQUE
CORINTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	31KA03-2	CRUCE 31CC03 RIO NEGRO-QUEBRADITAS(MEDIA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

			NARANJA-LA HEROICA)
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	19212_00	Cruce Ruta 3105 - Gualanday - Rionegro
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	19212_00	Caserio Carrizales
TORIBIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	19821_00	Vía Los Tanques
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TACUEYO	N/A	Vía vereda San Diego
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	19821_00	Vía La Pila Limites Con Jambalo
CALOTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS	31KA01-6	31KA01-6 Cruce La Placa-El Socorro
PÁEZ	CABILDO INDÍGENA DE LAME	26CC04-1	TUMBICHUCUE-LAME-LA TROJA
SANTANDER DE QUILICHAO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	19698_00	Via La Toma - El Palmar

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 MIRANDA

Miranda es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento del Cauca. Limita al norte con Florida, al oriente con Rioblanco y Planadas, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Dista 122 km de la capital del Cauca. Tiene una economía campesina de autoconsumo y subsistencia; en la llanura predomina el monocultivo de la caña de azúcar (79.29% del terreno), y pequeños cultivos tradicionales y con bajo nivel tecnológico, como hortalizas, habichuela, tomates y maracuyá; así mismo hay zonas con cultivo de café. Cuenta con una extensión de 189 Km cuadrados.



Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA.

La intervención que se realizará en el municipio de Miranda es para las vías que corresponden a las veredas de Caraqueño, El Horno y Monterredondo. A continuación, se describe la localización de cada uno de ellos conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Caraqueño, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21073 y longitud: -76,20724 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21238 y longitud: -76,20709, de la vía Caraqueño-Monterredondo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
			<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>

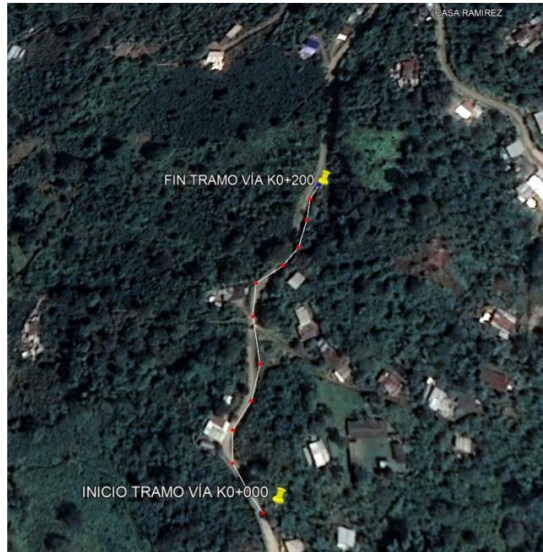


Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda.

- Vereda El Horno, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21931 y longitud: -76,19585 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21858 y longitud: -76,19671 de la vía al Horno.

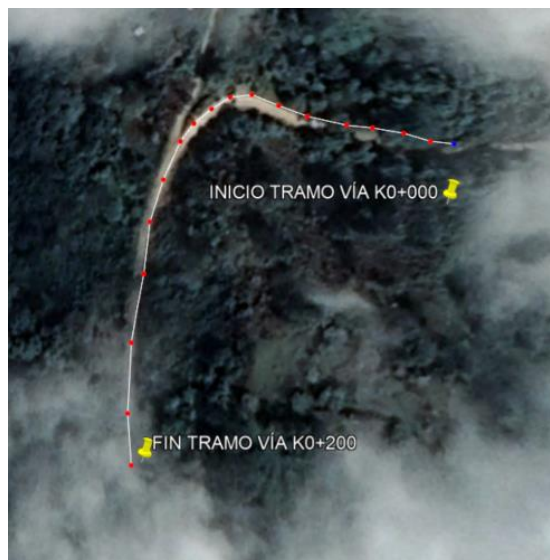


Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda.

- Vereda Monterredondo, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,2161 y longitud: -76,2034 y punto de referencia final el PR 00+200 con coordenadas latitud: 3,2173 y longitud: -76,2046, de la vía Las Cañas – Damnificados - Monterredondo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

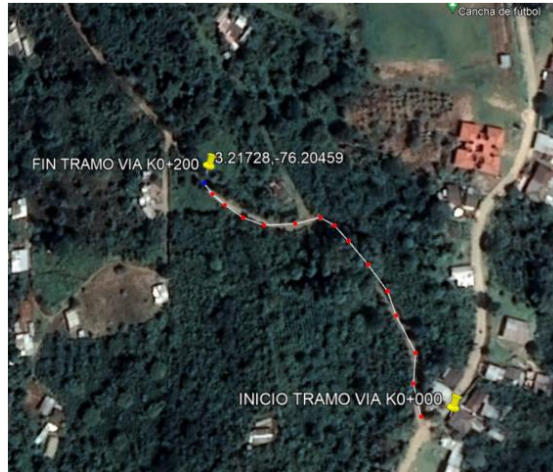


Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda.

2.2.2 SUAREZ

Se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur con el municipio de Morales y al occidente con López de Micay; su altura sobre el nivel del mar es de 1050 m, y temperatura media de 27 °C. Está separado de Popayán por 107 km. Su extensión total es de 389,87 km², de los cuales 3,57 km² corresponden a la parte urbana. Sus sectores económicos fundamentales son la minería la cual se realiza en la zona suroriental del municipio, la agricultura con productos como el café, caña de azúcar, el frijol, el maíz, la piscicultura, la avicultura, y la ganadería.



Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

La intervención que se realizará en el municipio de Suarez corresponde a la vereda Asnazú y La Turbina. A continuación, se describe la localización conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Asnazú, el proyecto se desarrollará en el corredor vial denominado Sector El Sapo - Bocatoma, con una longitud de 1,01 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Cruce Y a la Bocatoma, y el punto final de referencia es PR 1+010 Puente Vehicular.

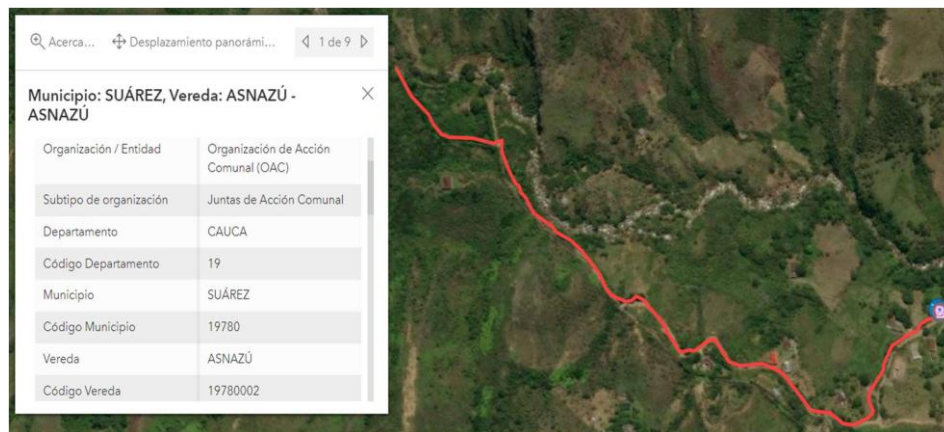


Figura 7. Localización del tramo a intervenir, Vereda Asnazu, Suarez.

- Vereda La Turbina, se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Suárez, en el corredor vial denominado vía Escuela Turbina - Miravalle, con una longitud de 1,22 km tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruce a la Vereda La Turbina y el punto final de referencia es PR 1+220 antes del cruce que dirige hacia la Vereda Miravalle.

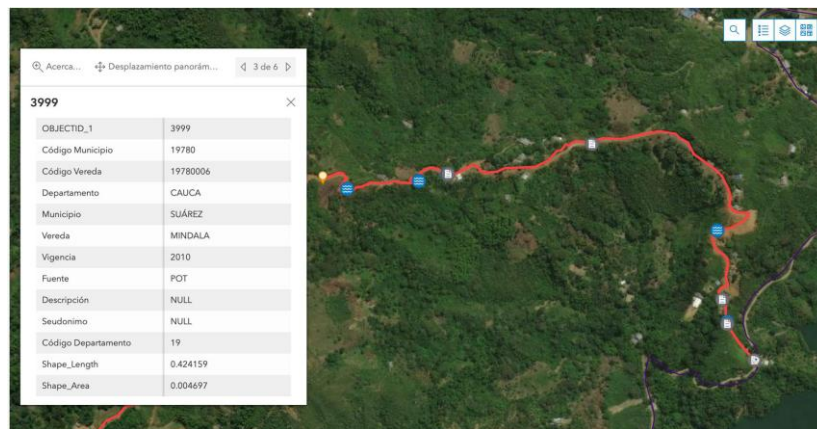


Figura 8. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS
APROBÓ

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>		

2.2.3 JAMBALÓ

Está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a 80 kilómetros de la ciudad de Popayán, limita por el norte con los municipios de Caloto y Toribío, por el oriente con el municipio de Páez, por el sur con el municipio de Silvia y por el occidente con los municipios de Caldonio y Santander de Quilichao. La economía de Jambaló está basada en la agricultura, cultivos como son: café, frijol, fique, papa y caña panelera, en lo pecuario la Ganadería doble propósito y en especie menores :aves de corral, cuyes, ovinos, porcinos y caprinos.



Figura 9. Localización de Jambaló en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Jambaló corresponde a las veredas La Esperanza , Ullucos Picacho y Monterredondo. A continuación, se describe la localización conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda La Esperanza, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado La Esperanza-Río Jambaló que tiene una longitud de 1,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce vía al río Jambaló, y el punto final de referencia es PR01+300 sitio crítico río Jambaló.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	

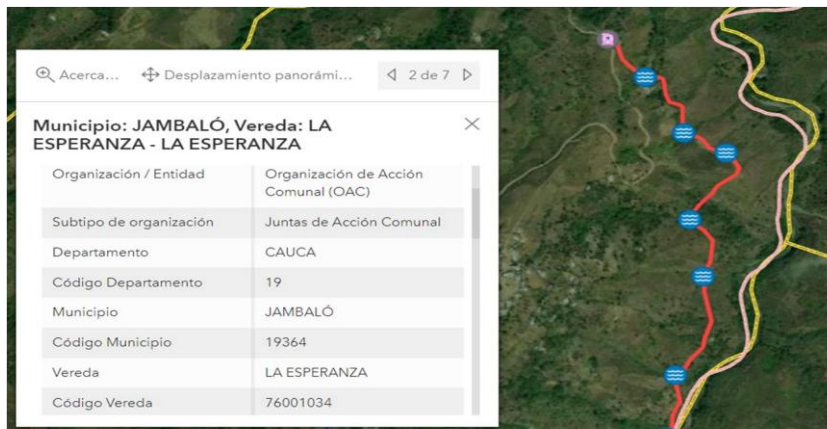


Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló.

- Vereda Ullucos, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado Ullucos Picacho-Tablón que tiene una longitud de 4,50 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 jurisdicción Junta Ullucos Picacho, y el punto final de referencia es PR 4+500 límite Jambaló-Toribio.

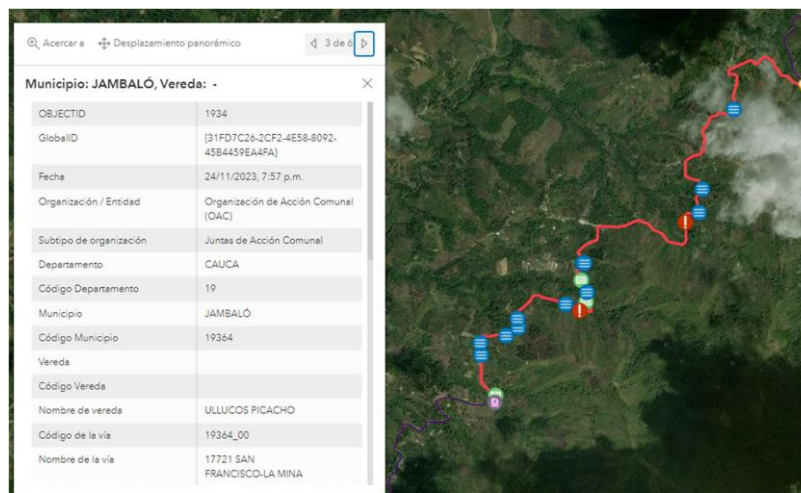


Figura 11. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló.

- Vereda Monterredondo, el proyecto se realizará en el corredor vial denominado vía Monte Redondo – Vereda Monterredondo (Vía Jámbalo – Monterredondo) que tiene una longitud de 0.8 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Antena de Wom, y el punto final de referencia es PR 0 + 800 Predio Héctor Ullune.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

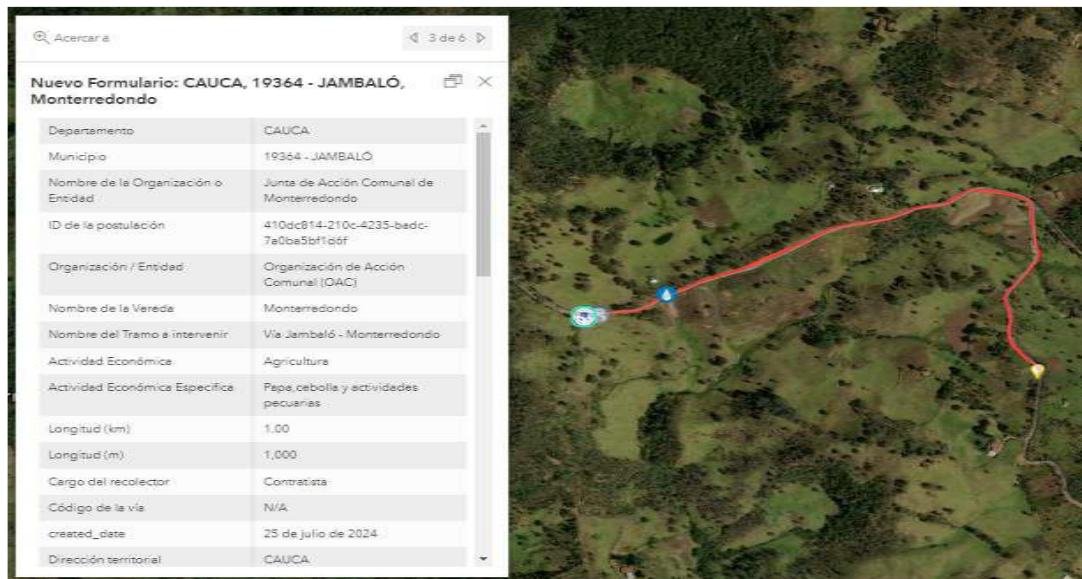


Figura 12. Localización del tramo a intervenir, vereda Monterredondo, Jambaló.

2.2.4 PADILLA

El municipio de Padilla se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cauca, limita al norte con Miranda, al sur con Guachené, al oriente con Corinto y al occidente con Puerto Tejada. Su extensión territorial es de aproximadamente 100 km², con una altitud promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre los 23°C y 28°C, y su topografía es predominantemente plana, lo que favorece actividades agrícolas, especialmente el cultivo de caña de azúcar, gracias a la presencia de diversos afluentes y ríos en la región.



Figura 13. Localización de Padilla en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Como parte del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial, se intervendrán las siguientes veredas en el municipio de Padilla:

- Corregimiento de La Paila: Se trabajará en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31CC02 La Paila - Sector Las Cuarenta - Cancha de Fútbol (Callejón la Cancha de Fútbol), con una longitud de 0,78 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000 cruce La Paila - Sector Las Cuarenta – Cancha de Fútbol y finaliza en el PR00+780 cruce alterno a La Paila, según la información levantada en campo por el equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

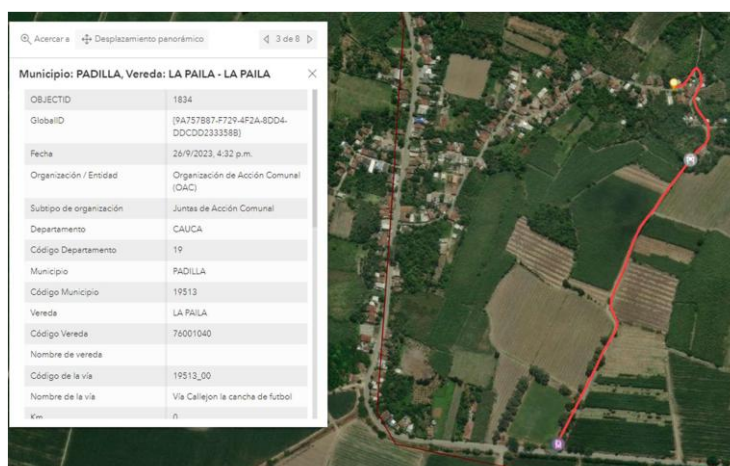


Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda La Paila, Padilla.

- Vereda El Chamizo: La intervención se realizará en el corredor vial 31KA02-53 cruce 31CC02 (El Chamizo), denominado Sector Yarumales Carretera – El Chamizo – Betania (Límite Guachené), también conocido como vía Chamizo-Obando, con una longitud de 2,0 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR0+000, en la casa de Mónica Ambuila o terminación de la placa huella existente, y finaliza en el PR2+000, en el límite territorial entre Padilla y Guachené.

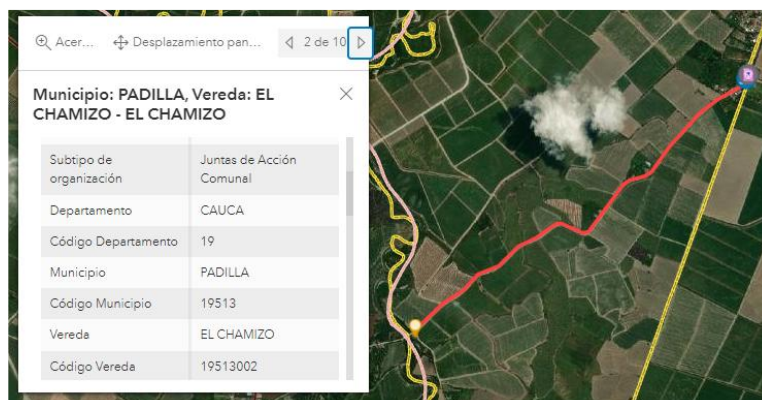


Figura 15. Localización vía a intervenir, vereda El Chamizo, Padilla.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

- Vereda La Unión: Se intervendrá el tramo 31KA02-50 cruce 31CC02 (La Unión) – sector Placita – Yarumales (Cruce 31CC02), con una longitud de 1,50 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce a La Unión, y finaliza en el PR01+500, en el sitio crítico del puente, según la información levantada en campo por el equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

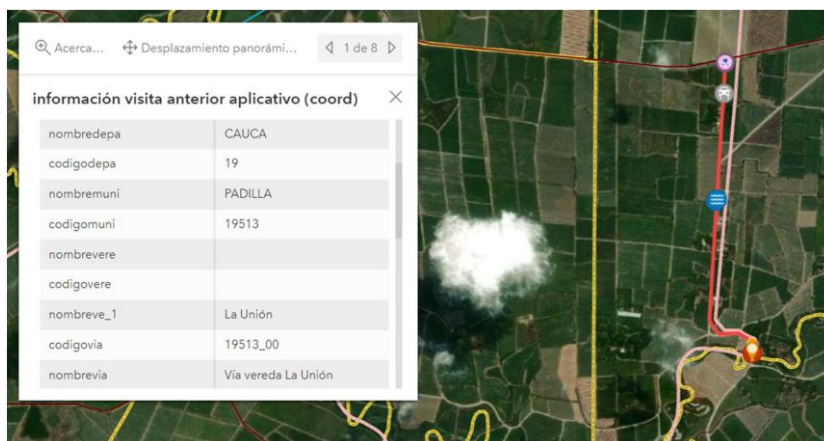


Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda La Union, Padilla.

2.2.5 TIMBIO

La población de Timbío, está situada aproximadamente a 13 Kilómetros de la capital del departamento del Cauca (Popayán). Su altitud se encuentra alrededor de los 1850 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 17 °C. Su actividad económica está orientada hacia el sector agropecuario.



Figura 17. Localización de Timbío en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

La intervención que se realizará en el municipio de Timbío corresponde a la vereda Los Robles y La Martica, las cuales se describen a continuación:

- Vereda Los Robles: Se ejecutará el proyecto en el corredor vial denominado vía El Retiro - La Avanzada - Sachacoco - Los Robles, con una longitud de 2,00 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la Ruta 2503 en la vereda Los Robles, y finaliza en el PR02+000, en la Institución Educativa Agropecuaria Los Robles . Esta vía es fundamental para la conectividad de las comunidades locales y el acceso a servicios educativos .

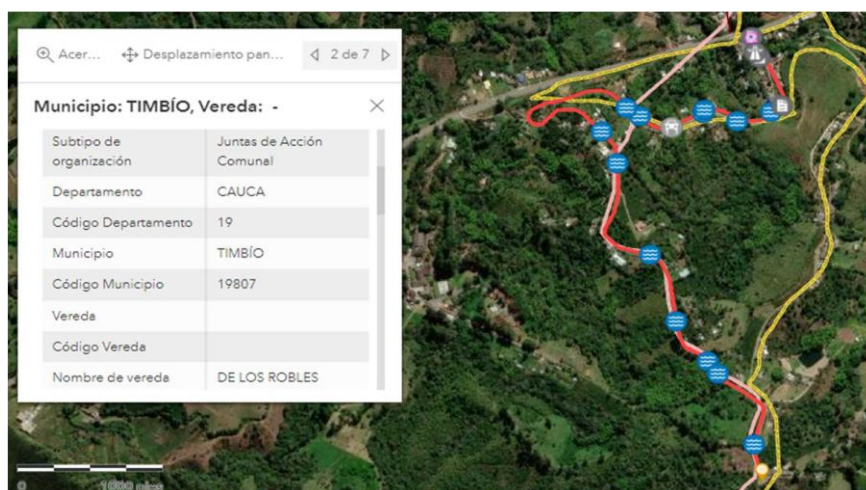


Figura 18. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbío.

- Vereda La Martica: La intervención se realizará en el corredor vial denominado vía 25KA90 - cruce vía 2503 (Mi Bohío - La Martica) o (Templete de La Virgen - Villa Manuel), con una longitud de 0,914 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR0+000, en el Templete de La Virgen, y finaliza en el PR0+914, en Villa Manuel. Esta vía es esencial para mejorar el acceso de los habitantes a las zonas urbanas y facilitar el transporte de productos agrícolas

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

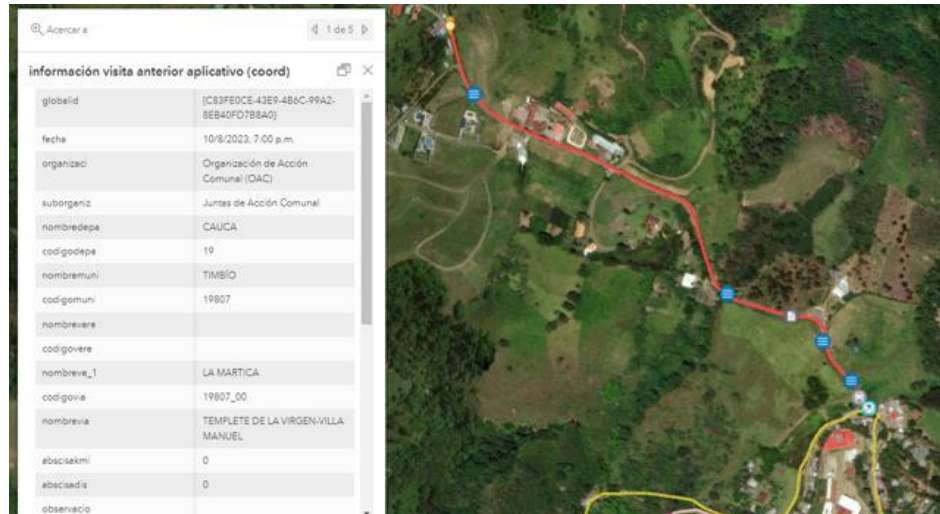


Figura 19. Localización vía a intervenir, vereda La Martica, Timbio.

2.2.6 PURACÉ

El municipio de Puracé está ubicado en la zona centro-oriental del departamento del Cauca, sobre la cordillera Central de los Andes. Limita al norte con los municipios de Popayán y Totoró, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Inzá y Páez, y al occidente con Sotará y Timbío.

La economía de Puracé se basa principalmente en la agricultura, destacándose los cultivos de maíz y frijol. En menor escala, se cultivan productos para el autoconsumo como ulluco, repollo y habas. Además, se desarrollan actividades de minería (explotación de azufre), ganadería y comercio.



Figura 20. Localización del municipio de Puracé en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Como parte del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial, se intervendrán las siguientes veredas en el municipio de Puracé:

- Vereda El Trébol Uno: Se ejecutará el proyecto en el corredor vial denominado Popayán – Crucero – Chiribio – Piedra León – El Trébol (Cruce Ruta 2002) o Vía Vereda El Trébol Uno, con una longitud de 0,60 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la Ruta 20 (sentido Popayán – Isnos) lado derecho vereda El Trébol Uno, y finaliza en el PR00+600, a 156 m de la Y, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.



Figura 21. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace.

- Vereda Chapio Paguimbio: La intervención se realizará en el corredor vial denominado Vía a Chapio, con una longitud de 0,182 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR00+000, en la casa del señor Wilfredo Manquillo, y finaliza en el PR00+182, en la terminación de la placa huella existente, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

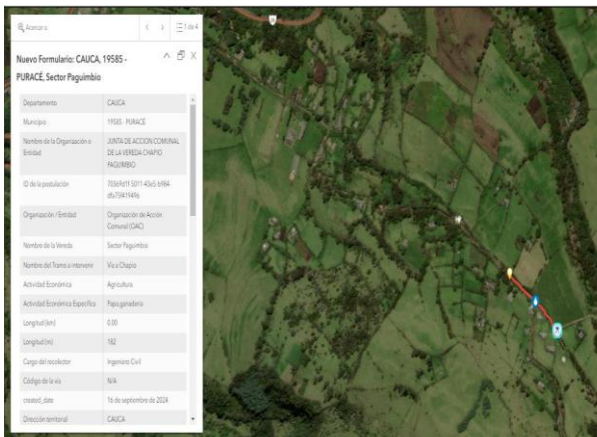


Figura 22. Localización vía a intervenir, Chapio Paguimbio, Puracé.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2.2.7 GUACHENÉ

Guachené está ubicado en el norte del departamento del Cauca, cerca de la frontera con el Valle del Cauca. Se encuentra a aproximadamente 30 km de Cali, lo que le permite una fuerte conexión con esta ciudad. Su economía se basa principalmente en la agroindustria y la presencia de importantes zonas industriales. Destacan los cultivos de caña de azúcar, que están vinculados a los ingenios azucareros de la región.



Figura 23. Localización de Guachené en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Guachené corresponde a la vereda Cabañita. A continuación, se describe la localización de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Cabañita, corredor vial denominado desde la escuela hasta la salida de la Vereda Sabanetas (Obando- Cabañitas/Vda Cabañitas Guachené) con una longitud de 2,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 es la escuela de Cabañita, y el punto final de referencia es PR 2 + 300 es la salida de la vereda Sabanetas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

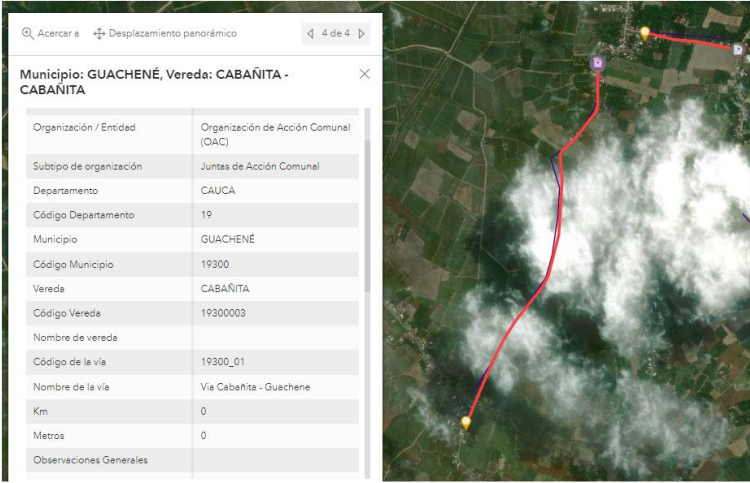


Figura 24. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené.

2.2.8 BUENOS AIRES

El municipio de Buenos Aires está ubicado en el norte del departamento del Cauca, a aproximadamente 115 kilómetros de Popayán, la capital departamental. Se encuentra a una altitud media de 2.313 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 22 °C. Su extensión territorial es de 410 km².

La economía de Buenos Aires se basa principalmente en la agricultura, destacándose cultivos como la yuca, la caña panelera, el café y el mango. Además, se desarrollan actividades de ganadería y minería.



Figura 25. Localización Nacional y Departamental de BUENOS AIRES

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Se intervendrá la vereda Munchique en el municipio de Buenos Aires. Se realizará en el corredor vial denominado Cruce 25CC24-1 Munchique, con una longitud de 0,436 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la vía 25CC24-1 LA BALSA – BUENOS AIRES – HONDURAS – ASNAZU, y finaliza en el PR00+436, en el mismo cruce, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.



Figura 26. Localización vía a intervenir, vereda Munchique, Buenos Aires.

2.2.9 CORINTO

Corinto está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en la región del valle del río Cauca. Limita con municipios como Caloto y Miranda, y se encuentra relativamente cerca de la ciudad de Cali. La economía de Corinto se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de caña de azúcar y café. También tiene una fuerte presencia de comunidades indígenas dedicadas a la producción agrícola y artesanal.



Figura 27. Localización de Corinto en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se realizarán intervenciones en las siguientes veredas:

- Vereda La Heroica:

En el corredor vial denominado Media Naranja – La Heroica, con una longitud de 0,57 km. El tramo inicia en el PR00+000, predio de Los Mosquera, y finaliza en el PR00+570, cruce con finca Los Zuleta.

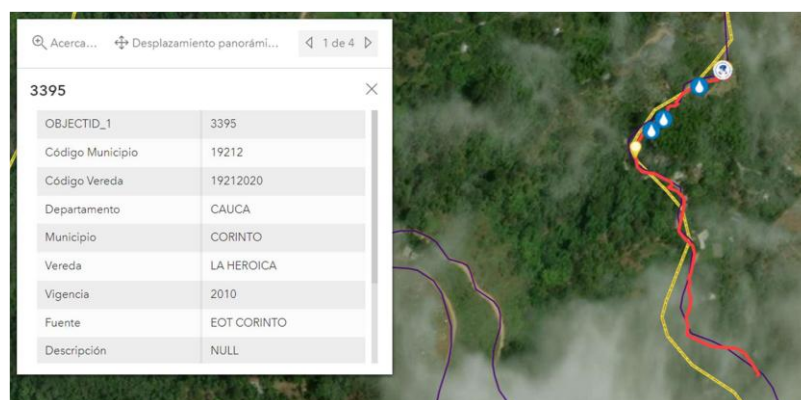


Figura 28. Localización vía a intervenir, vereda La Heroica, Corinto.

- Vereda Río Negro – García Arriba

En el corredor vial cruce Ruta 3105 – Gualanday – Río Negro, con una longitud de 0,43 km. El tramo comienza en el PR00+000, inicio de la placa huella existente, y finaliza en el PR00+430, intersección con la vía principal.

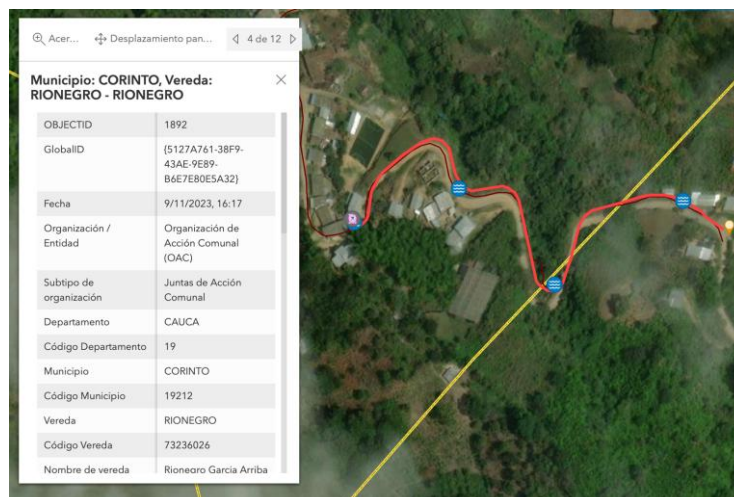


Figura 29. . Localización vía a intervenir, vereda Río Negro, Corinto.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

- Vereda Carrizales

En el corredor vial denominado Caserío Carrizales, con una longitud de 0,203 km. El tramo inicia en el PR00+000, en la entrada al caserío Carrizales, y finaliza en el PR00+203, en el retorno a la vía principal.

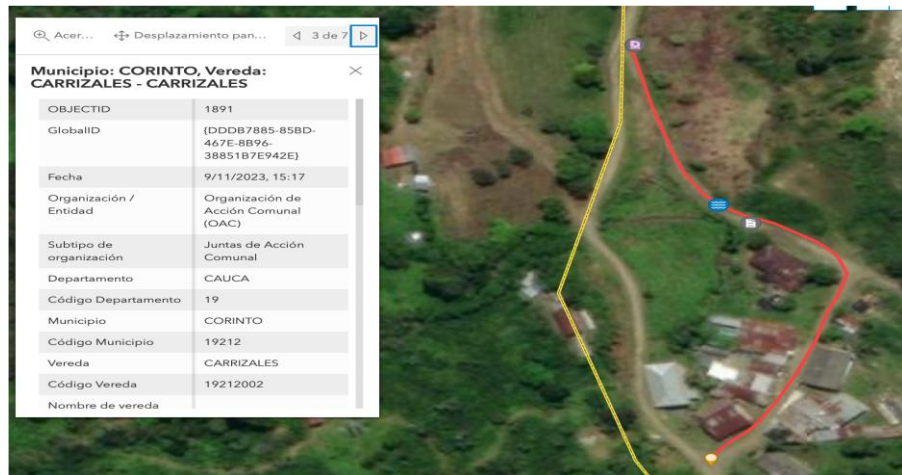


Figura 30. Localización vía a intervenir, vereda Carrizales, Corinto.

2.2.10 TORIBIO

El municipio de Toribío está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a los 02°57'29" de latitud norte y 76°16'17" de longitud oeste, a una altitud de 1.800 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 19 °C. Toribío es un lugar con una rica historia y cultura, especialmente en lo que respecta a su población indígena. Es conocido por sus paisajes naturales, su tradición cultural y su papel en la historia reciente de Colombia.



Figura 31. Localización de Toribio, Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrán las siguientes veredas:

En la vereda Soto, en el corredor vial denominado vía Centro Soto - Acueducto, con una longitud de 0,42 km. El tramo inicia en el PR00+000, cruce vía al acueducto, y finaliza en el PR00+420, cruce camino de herradura.



Figura 32. Localización vía a intervenir, vereda Soto, Toribio.

En la vereda Tacueyo, en el corredor vial denominado Vía Tacueyo - vereda San Diego, con una longitud de 0,481 km. El tramo inicia en el PR00+000, frente a la galería, y finaliza en el PR00+481, cruce con el colegio Quintín Lame y la vía vereda San Diego.

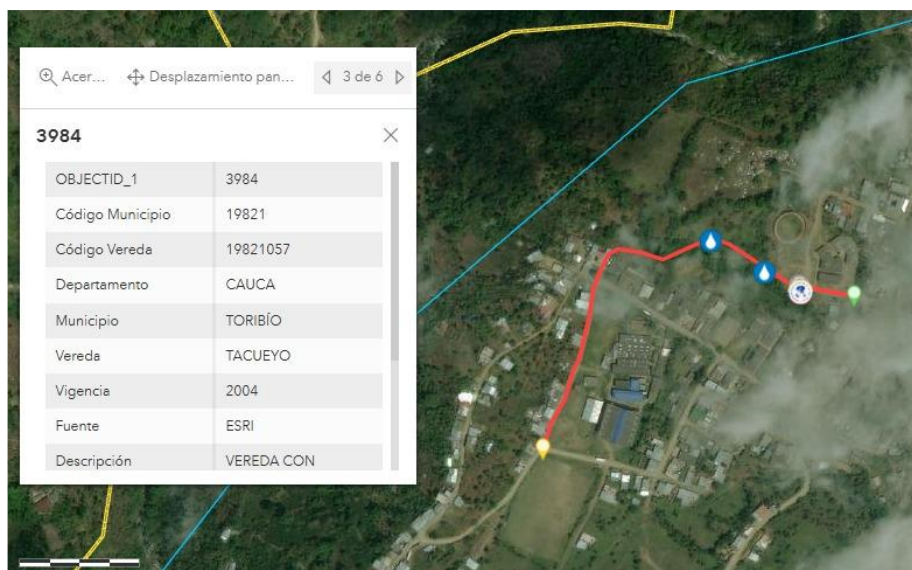


Figura 33. Localización vía a intervenir, vereda Tacueyo, Toribio.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

En la vereda La Pila, en el corredor vial con código 18060 La Despensa - La Pila - Río Jambaló, con una longitud de 3,60 km. El tramo inicia en el PR00+000, límite de las veredas La Pila y Natalá, y finaliza en el PR03+600, cruce con la Ruta 25CC25 Nuevo Día - Loma Redonda - Loma Gruesa.

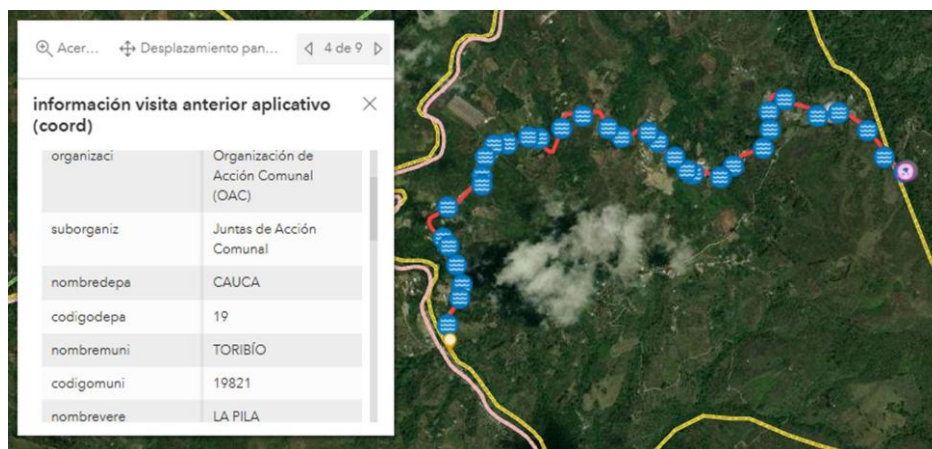


Figura 34. Localización vía a intervenir, vereda La Pila, Toribío.

2.2.11 CALOTO

El municipio de Caloto, ubicado en la provincia Norte del departamento del Cauca, Colombia, se caracteriza por una extensión territorial aproximada de 269 km² (26.931,62 hectáreas). Se encuentra a una altitud de 1.100 metros sobre el nivel del mar, con coordenadas 3°01' latitud norte y 76°25' longitud oeste. Su cabecera municipal está situada a 81 kilómetros de Popayán y a 43 kilómetros de Cali. Caloto se destaca por su diversidad geográfica y riqueza cultural, siendo uno de los municipios más antiguos del Cauca, con una economía centrada en la agricultura, la ganadería y la producción de caña de azúcar.



Figura 35. Localización de Caloto en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUSTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrá el tramo vial ubicado entre las vereda El Socorro -Valles Hondos, en el corredor denominado 31KA01-6 Cruce La Placa – El Socorro. Este tramo tiene una longitud total de 7,431 km, iniciando en el PR0+000 en el cruce con la vía Caloto – La Placa, y finalizando en el PR7+431, frente a la vivienda del señor Darío Dagua.

Esta intervención busca mejorar la transitabilidad de un corredor rural clave para la movilidad de la población campesina y la comercialización de productos agrícolas en la región norte del Cauca.

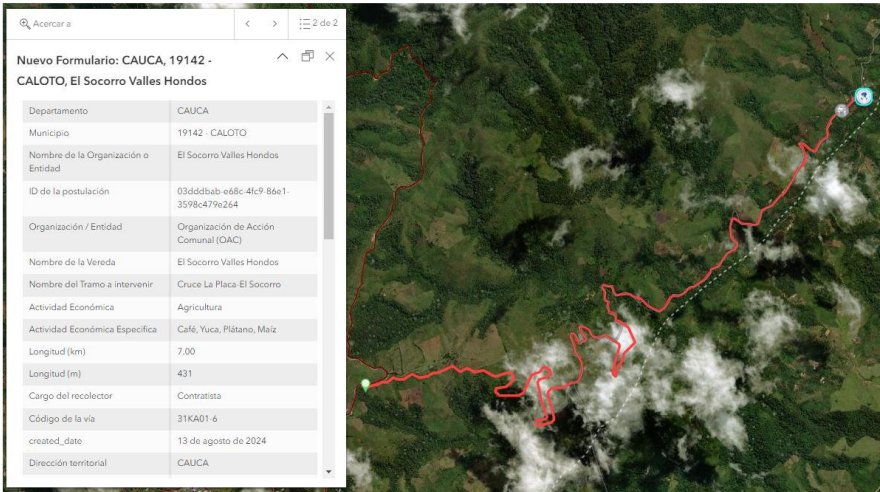


Figura 36. Localización de la vía intervenir vereda El socorro, Caloto.

2.2.12 PÁEZ

El municipio de Páez, ubicado en el oriente del departamento del Cauca, limita al norte con Ataco (Tolima), al nororiente con Teruel (Huila), al oriente con La Plata, Íquira y Nátaga (Huila), al suroccidente con Inzá (Cauca), y al occidente con Silvia, Jambaló y Toribío, también en el Cauca. Esta región, de marcada identidad cultural indígena, posee una geografía montañosa y fértil, donde la economía se basa fundamentalmente en la agricultura. Se cultivan productos como maíz blanco —tanto tradicional como tecnificado—, caña de azúcar, caña panelera, arroz, plátano, yuca y papa, entre otros.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	



Figura 37. Localización de Páez en Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrá el tramo vial correspondiente al Cabildo Indígena de Lame, específicamente en la vereda Lame. El corredor vial a intervenir se denomina Tumbichucue – Lame – La Troja y tiene una longitud de 0,565 km. Este tramo inicia en el punto PR0+000, ubicado a 0,565 km del puente La Troja, y finaliza en el PR0+565 en el mismo puente, mejorando así el acceso vial en esta zona de importante valor cultural y agrícola.

Acercar a

1 de 2

Nuevo Formulario: CAUCA, 19517 - PAEZ, Lame

Departamento	CAUCA
Municipio	19517 - PAEZ
Nombre de la Organización o Entidad	Resguardo Indígena de Lame
ID de la postulación	e30e13efa931-4eea-82da-90a51fefd5f0
Organización / Entidad	Organizaciones de Comunidades Étnicas
Nombre de la Vereda	Lame
Nombre del Tramo a intervenir	Puente La Troja - Boqueron
Actividad Económica	Agricultura
Actividad Económica Específica	Grenadilla, mora, maíz
Longitud (km)	0.57
Longitud (m)	565
Cargo del recolector	Contratista
Código de la vía	N/A
created_date	16 de mayo de 2024
Dirección territorial	CAUCA
Entidad a cargo de la vía	DEPARTAMENTO




Figura 38. Localización del tramo a intervenir vereda Lame, Páez.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

2.2.13 SANTANDER DE QUILICHAO

Santander de Quilichao es un municipio colombiano ubicado en el norte del departamento del Cauca, a 97 kilómetros de Popayán y a 45 kilómetros al sur de Cali. Esta localidad se destaca por su riqueza cultural, diversidad étnica y geográfica, y por su economía basada principalmente en la agricultura, con cultivos representativos como la caña de azúcar, el café y la yuca. Su ubicación estratégica y variedad de pisos térmicos favorecen una gran biodiversidad en flora y fauna.



Figura 39. Localización de Santander de Quilichao en el Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se desarrollará una intervención en la vereda La Toma. El tramo a intervenir corresponde al corredor vial denominado Río Quinamayo – Escuela vereda La Toma – Crucero entrada al Marañón, el cual tiene una longitud de 1,43 km. El recorrido inicia en el PR00+000, a la altura del puente vehicular, y finaliza en el PR01+430, en el cruce hacia la escuela de la vereda La Toma, fortaleciendo así la conectividad rural de esta importante zona del municipio.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	

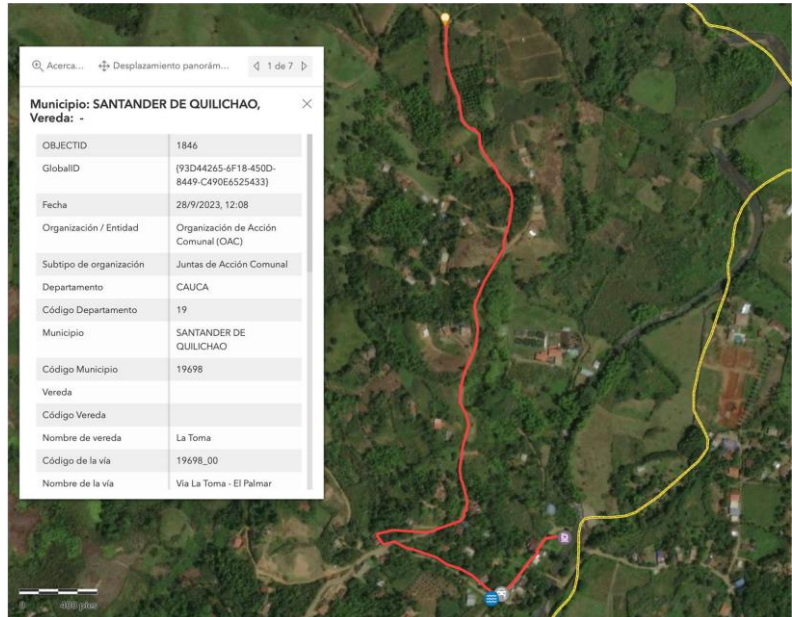


Figura 40. Localización del tramo a intervenir vereda La Toma, Santander de Quilichao.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En general, las vías incluidas en el proyecto se encuentran en un estado regular. La superficie de rodadura está en afirmado y presenta baches a lo largo de su trayecto. Además, se observa una falta de conformación en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.4.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página <http://www.invias.gov.co/>. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo y costos de materiales.

2.4.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

2.4.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

2.4.1.3 Muros Gaviones

La metodología de diseños incluye parámetros geomecánicas de ángulo de fricción igual a 30° y de cohesión igual a 0kPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para el material de fundación. El ángulo de inclinación del relleno de cara al trasdós del muro se considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de tránsito asociadas al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinámico.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 MIRANDA

- **CONVENIO No. 4274-2023**

No. del Convenio	4274-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-780-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO
NIT	90133502-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.828.180
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FABIAN BONILLA RIVERA
Fecha suscripción Convenio	18/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Prórroga No. 6	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 4307-2023**

No. del Convenio	4307-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-799-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO
NIT	901.012.112-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 201.225.865
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	EYDER TAQUINAS RIVERA
Fecha suscripción Convenio	10/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Prórroga No. 6	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

• **CONVENIO No: 4314-2023**

No. del Convenio	4314-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-804-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO
NIT	891.500.779-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.394.125
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ADELA SOLARTE CASTILLO
Fecha suscripción Convenio	09/11/2023
Fecha de inicio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	Desde 27/12/2023 hasta 14/01/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 15/01/2024 hasta 13/02/2024
Reanudación No. 1	14/02/2024
Prórroga No. 1	14/02/2024 hasta 30/04/2024
Suspensión No. 2	25/04/2024 hasta 24/05/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 25/05/2024 hasta 30/06/2024
Ampliación suspensión No. 2	Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024
Reanudación No. 2	01/08/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 3	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 3	03/12/2024
Prórroga No. 4	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Prórroga No. 5	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

3.1.2 SUAREZ

- **CONVENIO No. 2038-2024**

No. del Convenio	2038-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-006-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
NIT	901499769-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.874.214
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

- **CONVENIO No. 2059-2024**

No. del Convenio	2059-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-015-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU
NIT	901.658.851-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AZNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.870.939

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROCIO CAICEDO DIAZ
Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	6 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No. 1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.3 JAMBALÓ

- **CONVENIO No. 2039-2024**

No. del Convenio	2039-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-007-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA
NIT	901314905-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 209.387.835
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	BANDERLEY MEDINA PAZU
Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 2040-2024**

No. del Convenio	2040-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-008-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS
NIT	901.752.531-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.658.720
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	CARMELINA IPIA RAMOS
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

• **CONVENIO No. 3238-2024**

No. del Convenio	3238-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-815-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTERREDONDO
NIT	817.005.181-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.254.129
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE
Fecha suscripción Convenio	20 de agosto de 2024

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Fecha de inicio	16 de agosto de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 23/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación vigente	31 de Mayo de 2025

3.1.4 PADILLA

- **CONVENIO No. 2090-2024**

No. del Convenio	2090-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-030-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA
NIT	817.001.505-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.035.600
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ANYELA MARIA VIAFARA CHARA
Fecha suscripción Convenio	28 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación vigente	31 de Mayo de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 2554-2024**

No. del Convenio	2554-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-382-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CHAMIZO
NIT	817.006.647-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.052.567
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MONICA YULIETH AMBUILA ARARAT
Fecha suscripción Convenio	23 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 23/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación vigente	31 de Mayo de 2025

• **CONVENIO No. 2919-2024**

No. del Convenio	2919-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-657-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION
NIT	817.004.810-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.201.271
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Fecha suscripción Convenio	02 de agosto de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.5 TIMBÍO

- **CONVENIO No. 2102-2024**

No. del Convenio	2102-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-033-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES
NIT	901.044.812-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 200.859.010
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO
Fecha suscripción Convenio	2 de julio de 2024
Fecha de inicio	02 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 2631-2024**

No. del Convenio	2631-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-444-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA
NIT	800.211.539-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.476.926
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA
Fecha suscripción Convenio	24 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.6 PURACÉ

• **CONVENIO No. 2233-2024**

No. del Convenio	2233-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-134-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
NIT	900.277.608-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.551.500
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MANUEL BOLAÑOS
Fecha suscripción Convenio	8 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

• **CONVENIO No. 3908-2024**

No. del Convenio	3908-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-989-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO
NIT	900.245.562-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.158.485
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MILTON VLADIMIR GUAUÑA CALAPSU
Fecha suscripción Convenio	23 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	13 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

3.1.7 GUACHENÉ

- **CONVENIO No. 2297-2024**

No. del Convenio	2297-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-177-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA
NIT	900.091.124-9
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.914.634
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MAIRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ
Fecha suscripción Convenio	11 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

3.1.8 BUENOS AIRES

- **CONVENIO No. 2330-2024**

No. del Convenio	2330-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-205-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER
NIT	901.077.896-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

	DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 199.954.248
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.9 CORINTO

- **CONVENIO No. 2042-2024**

No. del Convenio	2042-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-009-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA
NIT	900.323.078-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.290.536
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

• **CONVENIO No. 2427-2024**

No. del Convenio	2427-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-278-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA
NIT	900.292.802-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.223.651
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

• **CONVENIO No. 2488-2024**

No. del Convenio	2488-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-325-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZALES
NIT	901.437.896-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

	TOTAL
Valor del Convenio	\$ 199.333.458
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ
Fecha suscripción Convenio	19 de julio de 2024
Fecha de inicio	6 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

• **CONVENIO No. 2031-2024**

No. del Convenio	2031-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-002-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO
NIT	901.666.995-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 204.710.738
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	7 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 2858-2024**

No. del Convenio	2858-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-614-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO
NIT	901.026.597-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.147.088
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JHON ALVARO GRISALES MESA
Fecha suscripción Convenio	31 de julio de 2024
Fecha de inicio	19 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

• **CONVENIO No. 2915-2024**

No. del Convenio	2915-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-654-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA
NIT	901.019.259-2
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.847.517
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JHON FRANQUI UL MESTIZO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

Fecha suscripción Convenio	02 de agosto de 2024
Fecha de inicio	18 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

3.1.10 CALOTO

- **CONVENIO No. 3554-2024**

No. del Convenio	3554-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-899-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDO
NIT	901.378.354-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 206.276.926
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MARDEN CRUZ VARGAS
Fecha suscripción Convenio	9 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	11 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

3.1.11 PÁEZ

- **CONVENIO No. 3913-2024**

No. del Convenio	3913-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-034-2024
Cabildo indígena	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME
NIT	817.002.075-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.785.173
Representante legal del Cabildo indígena	JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO
Fecha suscripción Convenio	24 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	5 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

3.1.12 SANTANDER DE QUILICHAO

- **CONVENIO No. 2065-2024**

No. del Convenio	2065-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-020-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA TOMA
NIT	800.190.167-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.387.366
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FRANCY ELENA OCORO VIAFARA
Fecha suscripción Convenio	27 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el mes de abril de 2025, las Juntas de Acción Comunal avanzaron en diferentes etapas del proceso contractual y operativo, en el marco de los convenios suscritos. Para efectos de seguimiento, las actividades desarrolladas se agrupan en dos categorías: Grupo 1, correspondiente a los convenios que contaban con el desembolso desde el inicio de la interventoría, y Grupo 2, incluye los convenios que recibieron el desembolso a mediados del periodo anterior. A continuación, se presenta la descripción detallada de las acciones ejecutadas por cada grupo.

Grupo 2

Las juntas pertenecientes a este grupo se encuentran en etapas preliminares, enfocadas principalmente en los procesos de alistamiento y planeación. Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Las JAC recibieron por parte de la interventoría los documentos entregados por INVIAS, incluyendo el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella correspondiente a cada proyecto.
- Elaboración de estudios previos: Durante el mes se avanzó en la elaboración de estudios previos por parte de las JAC, así como en la gestión y consecución del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.
- Algunas organizaciones remitieron las hojas de vida del personal propuesto, de las cuales varias fueron aprobadas, otras no aprobadas y algunas se encuentran en proceso de revisión.
- Se realizaron comités de seguimiento con los convenios, en los cuales se resolvieron inquietudes y se socializó la importancia de entregar de manera oportuna la documentación requerida para el inicio de las actividades en campo.

Grupo 1

Los convenios de este grupo, llevaron a cabo actividades de consolidación documental y técnica. Entre las principales se encuentran:

- Se realizó la recopilación de la documentación para la solicitud de la Prórroga No. 2 ,con corte al 16 de julio de 2025. La Prórroga No. 1 había sido gestionada con fecha de vencimiento al 30 de abril de 2025. Los convenios prorrogados son los siguientes:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

GRUPO 1				
MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	PRORROGA 1	PRORROGA 2
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	30/04/2025	16/07/2025
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	30/04/2025	16/07/2025
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	30/04/2025	16/07/2025
SUAREZ	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	30/04/2025	16/07/2025
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	30/04/2025	16/07/2025
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	30/04/2025	16/07/2025
TIMBIO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	30/04/2025	16/07/2025
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	30/04/2025	16/07/2025
GUACHENE	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	30/04/2025	16/07/2025
CORINTO	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARriba	30/04/2025	16/07/2025

- Al igual que en el grupo 2, algunas JAC remitieron hojas de vida para aprobación de sus profesionales, encontrándose en diferentes estados de evaluación (aprobadas, no aprobadas o en revisión).
- Se llevó a cabo el primer comité operativo con participación de las JAC, profesionales técnicos y la interventoría. Este tuvo un enfoque pedagógico, orientado a brindar asesoría a los profesionales recién vinculados, quienes en su mayoría no contaban con experiencia previa en la ejecución de este tipo de convenios. No se abordaron temas de compras en esta sesión, sino lineamientos documentales. Se acordó realizar un segundo comité para dar continuidad al proceso.

Actividades generales del mes (grupos 1 y 2)

Además de las acciones particulares por grupo, se adelantaron actividades generales:

- Se reiteró a las JAC la necesidad de entregar las hojas de vida del personal técnico pendiente, así como el plan de compras. Adicionalmente, se envió la pieza comunicativa oficial de socialización inicial del proyecto.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

- Se llevaron a cabo jornadas de socialización de los proyectos con las comunidades, abordando aspectos técnicos, sociales y ambientales. A continuación, se relacionan los convenios en los que se realizó la socialización inicial:

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	SOCIALIZACIÓN INICIAL
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	14/04/2025
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	14/04/2025
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	14/04/2025
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	24/04/2025
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	24/04/2025
TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	10/04/2025
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	10/04/2025
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	24/04/2025
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	23/04/2025
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	23/04/2025
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	15/04/2025

- Durante los comités de seguimiento realizados con los convenios de ambos grupos, se resolvieron inquietudes técnicas y administrativas, y se insistió en la importancia del cumplimiento de los compromisos documentales para garantizar el desarrollo eficiente del proyecto.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han suscrito ítem no previsto en ninguno de los convenios.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Mayo 10 de 2025</div>	

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al presente informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas en los convenios bajo la supervisión de la interventoría. Esto se debe a que las Juntas de Acción Comunal ,beneficiarias de los convenios solidarios, se encontraban en proceso de elaboración y presentación de la documentación administrativa requerida para la ejecución de los proyectos.

Para garantizar el avance y la correcta ejecución de los convenios, se han definido las siguientes acciones a seguir:

- Evaluación y validación de las hojas de vida del personal técnico y administrativo propuesto por las OAC.
- Asesoría y acompañamiento en la gestión de cotizaciones necesarias para la adquisición de insumos y materiales.
- Realización de reuniones con los profesionales contratados por las OAC, con el objetivo de establecer lineamientos de trabajo y definir los entregables tanto del ingeniero residente como de la contadora.
- Inicio de visitas técnicas para el reconocimiento del tramo y socialización del proyecto con las OAC y las comunidades beneficiarias.
- Conformación de veedurías comunitarias, con el fin de garantizar el control social y la transparencia en la ejecución de los proyectos.
- Desarrollo de comités operativos para la planificación de los planes de compras y la organización del proceso de transferencias, permitiendo la adquisición de materiales y el inicio de actividades en sitio.

Estas acciones permitirán avanzar en la fase de alistamiento y garantizar que los proyectos inicien conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<table border="1"> <tr> <td>No. Copias Impresas: 1</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Versión No.: 001</td> </tr> </table>	No. Copias Impresas: 1		Versión No.: 001
No. Copias Impresas: 1					
Versión No.: 001					
		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>			

4 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo abril de 2025, referentes a los convenios solidarios suscritos que se encuentran en ejecución, los cuales están determinados en los siguientes plazos:

- Informe Semanal 20- 04/04/2025-10/04/2025
- Informe Semanal 21- 11/04/2025-17/04/2025
- Informe Semanal 22- 18/04/2025-24/04/2025
- Informe Semanal 23- 25/04/2025-01/05/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 4274-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CARAQUEÑO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO:	No aplica.
---------	------------

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorruga N°5 del convenio 4274

Recopilación de los documentos requeridos para la prorruga N°5 del convenio 4274

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

Se retera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

El 24 de enero de 2025 se da inicio al comité de la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A	
-----	--

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
------------------------------------------------------------------------------------	--

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

El esquema grafico sera definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

**PIEZA COMUNICATIVA, VEREDA CARAQUEÑO**

N/A

N/A

	N/A
--	-----


N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</p>		<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------

<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La intervención se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
---------------------------	--

FIRMA: 
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VÍA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que algunos convenios han recibido desembolso, se encuentra en trámite el plan de cargas, una vez aprobado se diligenciará.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec				0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: N/A Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL , VEREDA CARAQUEÑO



SOCIALIZACIÓN INICIAL , VEREDA CARAQUEÑO



CONFORMACIÓN DE LA VEE DURIA, VEREDA CARAQUEÑO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO MARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	28/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VÍA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 4274-2023 VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que algunos convenios han recibido desembolso, se encuentra en trámite el plan de cargas, una vez aprobado se diligenciará.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec				0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES:				

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



MEPI DE PRÓRROGA No. 6

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO MARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03261 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

FECHA

5/06/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

L INFORMACION GENERAL

CONTRATO de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 7 (Numeración consecutiva) N/A

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3.21073,-76.20724) y coordenadas finales (3.21238,-76.20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca. se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No. 4274-2023 VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00

CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Debido a que algunos convenios han recibido desembolso, se encuentra en trámite el plan de cargas, una vez aprobado se diligenciará.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

Aprovechamiento Forestal: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de cauces: SI NO N/A

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.

Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA En el QAC se han generado evidencias no presentadas de documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los comandamientos. Realizar matemáticas basadas en habilidades de una operación para adaptar a las informaciones que debe ser entendida.

¹⁰Se llevó a cabo el comité operativo; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
------------------------------------------------------------------------------------	--

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Three empty rectangular boxes are shown, each labeled "N/A" in the center and below it.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

FIRMA: 
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<table border="1"> <tr> <td>No. Copias Impresas: 1</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Versión No.: 001</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p> </td> </tr> </table>	No. Copias Impresas: 1		Versión No.: 001	<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
No. Copias Impresas: 1							
Versión No.: 001							
<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>							

CONVENIO No. 4307-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL** **HORNO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>1 DE 2</div>																																																														
		FECHA	14/04/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																														
L INFORMACION GENERAL																																																																	
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																															
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																	
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																	
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo Las Dantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																	
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																															
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																															
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELYVIRA PINTO JAIMES																																																															
CONVENIO No. 4307-2023	VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																														
FECHA DE INICIO: 18/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -																																																														
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																														
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																														
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																	
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																												
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																															
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																															
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																														
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																														
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																	
<div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>Observaciones:N/A</div></div> <div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15,080,247.83 0.99%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:N/A</div></div>						SI	NO		X																																																								
SI	NO																																																																
	X																																																																
III. AVANCE FÍSICO																																																																	
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																	
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																	
<div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>* Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>* Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td></tr></table><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div></div> <div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	* Placa Huella	ML		* Alcantarillas	UND		*			Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00	0.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																															
* Placa Huella	ML																																																																
* Alcantarillas	UND																																																																
*																																																																	
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																												
Prog	0.00			0.00	0.0%																																																												
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																												
Prog	0.00			0.00																																																													
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																												
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																	
<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Sallarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Sallarín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																						
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																															
Sallarín																																																																	
Mezcladora de concreto																																																																	
Vibrocompactador																																																																	
Retroexcavadora sobre llantas																																																																	
vibrador de concreto																																																																	
Motoniveladora																																																																	
Total																																																																	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																	
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																														
UBICACIÓN:	DISPONIBLE		ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A																																																											
	PERMISO MINERO:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A																																																											
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	Aprovechamiento Forestal:	SI	NO	N/A																																																											
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	Concesión de Aguas:	SI	NO	N/A																																																											
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	Ocupación de Cauces:	SI	NO	N/A																																																											
			Vertimientos:	SI	NO	N/A																																																											
			Emisiones:	SI	NO	N/A																																																											
			OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																											
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																																														
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																														

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	5
-----------------------------	---

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECCOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente a los estudios previos por la OAC para su revisión.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.


*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
------------------------------------------------------------------------------------	--

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO	
--------------------------	--

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



PIEZA COMUNICATIVA, VEREDA EL HORNO	N/A	N/A
-------------------------------------	-----	-----

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA										EMPRESA DE INTERVENIENTOS									

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

	100 to
--	--------

FIRMA

NOMBRE:	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
---------	-----------------------------

Matrícula Profesional No.:		68202-03281 STD
----------------------------	--	-----------------

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.						
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAJUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4307-2023 VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15,080,247.83 0.99%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,597,186.92 0.10%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: N/A						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad						
Placa Huella ML						
Alcantarillas UND						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL , VEREDA EL HORNO



SOCIALIZACIÓN INICIAL , VEREDA EL HORNO



CONFORMACIÓN DE LA VEEDURIA, VEREDA EL HORNO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación
*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.
*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.
*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.
*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.
*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.
*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

MEPI PRORROGA No. 6

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAJUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 4307-2023 VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que algunos convenios han recibido desembolso, se encuentra en trámite el plan de cargas, una vez aprobado se diligenciará.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec				0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO:No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo el comité operativo; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03261 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<table border="1"> <tr> <td>No. Copias</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Impresas: 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Versión No.: 001</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</td> </tr> </table>	No. Copias		Impresas: 1	Versión No.: 001		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	
No. Copias									
Impresas: 1									
Versión No.: 001									
Fecha de realización: Mayo 10 de 2025									

CONVENIO No. 4314-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **MONTERREDONDO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	14/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 4314-2023 VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Está en trámite el plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec				0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO:No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N/A

N/A

PIEZA COMUNICATIVA, VEREDA MONTERREDONDO

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO			
					VERSIÓN			
					PÁGINA	1 DE 2		
					FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 4314-2023 VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: Está en trámite el plan de cargas.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad			Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Placa Huella ML			Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%			Saltarín		
Alcantarillas UND			Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%			Mezcladora de concreto		
						Vibrocompactador		
						Retroexcavadora sobre llantas		
						vibrador de concreto		
						Motor niveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
OBSERVACIONES:								
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL								
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A								
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A								
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A								
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A								
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A								
VERTIENTOS: SI NO N/A								
EMISIONES: SI NO N/A								
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A								
OBSERVACIONES:								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



PIEZA COMUNICATIVA, VEREDA MONTERREDONDO



PIEZA COMUNICATIVA, VEREDA MONTERREDONDO



CONFORMACIÓN DE LA VEEDURIA, VEREDA MONTERREDONDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	28/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 4314-2023		VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO				INTERVENTORÍA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				PERIODO FACTURADO: N/A							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				VALOR FACTURA: \$ N/A -							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				Observaciones: Está en trámite el plan de cargas.							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00%		Avance o Atraso Físico % 0.00%		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec				0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:									
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 5, con corte al 16 de julio de 2025.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

MEPI PRÓRROGA No. 5

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO			
					VERSIÓN			
					PÁGINA	1 DE 2		
					FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 4314-2023 VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: Está en trámite el plan de cargas.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad			Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Placa Huella ML			Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%			Saltarín		
Alcantarillas UND			Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%			Mezcladora de concreto		
						Vibrocompactador		
						Retroexcavadora sobre llantas		
						vibrador de concreto		
						Motorveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
OBSERVACIONES:								
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL								
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A								
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A								
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A								
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A								
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A								
VERTIENTOS: SI NO N/A								
EMISIONES: SI NO N/A								
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A								
OBSERVACIONES:								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 5, con corte al 16 de julio de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE ASESORAMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03261 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<table border="1"> <tr> <td>No. Copias</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Impresas: 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Versión No.: 001</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</td> </tr> </table>	No. Copias		Impresas: 1	Versión No.: 001		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	
No. Copias									
Impresas: 1									
Versión No.: 001									
Fecha de realización: Mayo 10 de 2025									

CONVENIO No. 2059-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **ASNAZU**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la localidad de ASNAZU, municipio de Suarez del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 1,01 km de corredor vial, que deberá ser distribuido en placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ROCIO CAICEDO DIAZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2059-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 6/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 202,870,939.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 202,870,939.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,870,939									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,870,939									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,870,939.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: _____

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de diseño geométrico y personal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA


NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la localidad de ASNAZU, municipio de Suarez del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 1,01 km de corredor vial, que deberá ser distribuido en placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ROCIO CAICEDO DIAZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2059-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 6/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 202,870,939.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 202,870,939.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,870,939									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,870,939									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,870,939.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se recibe por parte de la OAC el personal postulado, y se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de diseño geométrico y personal.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL. VEREDA ASNAZU

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA




FIRMA: _____

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	28/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la localidad de ASNAZU, municipio de Suarez del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 1,01 km de corredor vial, que deberá ser distribuido en placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: ROCIO CAICEDO DIAZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2059-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 6/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 202,870,939.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 202,870,939.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,870,939									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,870,939									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,870,939.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.

*Se recibe por parte de la OAC el personal postulado, y se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se realiza la socialización inicial, en la cual se explican temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Aprobación de diseño geométrico y personal.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA ASNAZU



SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA ASNAZU



RECONOCIMIENTO DEL TRAMO A INTERVENIR

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la localidad de ASNAZU, municipio de Suarez del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 1,01 km de corredor vial, que deberá ser distribuido en placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ROCIO CAICEDO DIAZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2059-2024 VALOR INICIAL: \$ 202,870,939.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
FECHA DE INICIO: 6/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 202,870,939.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,870,939									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,870,939									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,870,939.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.

*Se recibe por parte de la OAC el personal postulado, y se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se realiza la socialización inicial, en la cual se explican temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza la aprobación del personal, y se solicita la entrega del cronograma físico y financiero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de diseño geométrico y personal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2038-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **TURBINA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC , para gestionar la prórroga.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que dichas actividades aún se encuentran en trámite.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La JAC se encuentra en la búsqueda de personal, dado que por la zona ser tan retirada no se consigue.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

FECHA

21/04/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

L INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

21 del 11/04/2025 al 17/04/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

N/A

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huecos, cunetas y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAMES

CONVENIO No.

2038-2024

VALOR INICIAL:

\$ 201,874,214.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 201,874,214.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

\$ 201,874,214.00
\$ - 0.00%
\$ - 0.00%
\$ - 0.00%
\$ - %

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - 0.00%
\$ - 0.00%
\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%
\$ - 0.00%

Observaciones: N/A

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

0.00%
N/A
N/A
N/A

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

SI NO

X

N/A

N/A

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de cauces: SI NO N/A

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
En el periodo de marzo se asiste a la capacitación sobre el diligenciamiento de formatos y la entrega de documentos requeridos durante la ejecución del proyecto.

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL


OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

[illegible]

N/A

N/A

FIRMA: 
 NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
 Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	28/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,874,214.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		N/A									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		N/A									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		N/A									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
				X							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniiveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:			Ejecutado:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: En el periodo de marzo se asiste a la capacitación sobre el diligenciamiento de formatos y la entrega de documentos requeridos durante la ejecución del proyecto.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC , para gestionar la prórroga.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que dichas actividades aún se encuentran en trámite.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*La JAC se encuentra en la búsqueda de personal, dado que por la zona ser tan retirada no se consigue.

*Se remite la aprobación del personal técnico y envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

MEPI PRÓRROGA

SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA LA TURBINA

SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA LA TURBINA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

FECHA

5/06/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

L INFORMACION GENERAL

CONTRATO de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva) N/A

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ
CONVENIO No. 2038-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,874.214.00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,874.214.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES
CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874.214			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874.214			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,874.214.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: N/A

INTERVENTORÍA
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: N/A
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA N/A
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA N/A

SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIENTOS: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A
OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
En el evento de no asistir a la capacitación se asiste a la capacitación de formato vial la entrega de documentos requeridos durante la ejecución del proyecto.

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC , para gestionar la prórroga.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que dichas actividades aún se encuentran en trámite.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*La JAC se encuentra en la búsqueda de personal, dado que por la zona ser tan retirada no se consigue.

*Se remite la aprobación del personal técnico y envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2039-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **ESPERANZA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se envían observacion sobre el personal de trabajo postulado.

*Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO □ (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2039-2024		VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ - 0.00%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ - 0.00%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ - %									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ - 0.00%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ - 0.00%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ - 0.00%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ - 0.00%									
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: El plan de cargas se encuentra en proceso de aprobación.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
 El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
 El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

"Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024.

"Revisión del estado de las edificaciones, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

"Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

"Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.

"Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para la OAC.

"Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVÍAS.

"Contacto y notificación a los prestes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

"Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

"El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

"El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

"El 12 de febrero, se remiten con la OAC comités de seguimiento al avance de estudios y diseños.

"La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

"Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

"Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

"Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

"El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

"Se envían observación sobre el personal de trabajo postulado.


"Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.

"La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría

*Se ha aprobado el ingeniero residente y actualmente se está a la espera del envío de las hojas de vida de los demás profesionales. Adicionalmente, se ha remitido la pieza comunicativa correspondiente para la socialización inicial del proyecto

N/A


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio




N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La inventoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
	FIRMA _____
	NOMBRE: _____ MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
	Matrícula Profesional No.: _____ 68202-03281 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	28/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2039-2024	VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:			0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA			0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$	N/A								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: El plan de cargas se encuentra en proceso de aprobación.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se envían observacion sobre el personal de trabajo postulado.

*Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.

*La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría

*Se ha aprobado el ingeniero residente y actualmente se está a la espera del envío de las hojas de vida de los demás profesionales. Adicionalmente, se ha remitido la pieza comunicativa correspondiente para la socialización inicial del proyecto

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



MEPI DE PRÓRROGA No.2

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación. *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC. *El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo. *Se envían observacion sobre el personal de trabajo postulado. *Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1. *La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría *Se ha aprobado el ingeniero residente y actualmente se está a la espera del envío de las hojas de vida de los demás profesionales. Adicionalmente, se ha remitido la pieza comunicativa correspondiente para la socialización inicial del proyecto *Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se llevó a cabo un comité operativo con el ingeniero residente, durante el cual se le brindó asesoría sobre la forma adecuada de presentar el plan de compras y los elementos que este debe contener		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2040-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **ULLUCOS PICACHO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																												
			VERSIÓN																																																																																												
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																											
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																											
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																															
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)																																																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																													
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																													
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 203,658,720.00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>N/A 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - 0.00%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2"><div>SI NO</div><div><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></div></td></tr><tr><td colspan="2">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO: N/A</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ N/A -</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones: N/A</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Observaciones: Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.</td></tr></table>						CONVENIO		INTERVENTORÍA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 203,658,720.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N/A 0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	<div>SI NO</div> <div><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></div>		(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	PERIODO FACTURADO: N/A		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	VALOR FACTURA: \$ N/A -		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%			Observaciones: N/A		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.																																			
CONVENIO		INTERVENTORÍA																																																																																													
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 203,658,720.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N/A 0.00%																																																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	0.00%																																																																																												
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0.00%																																																																																												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	<div>SI NO</div> <div><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></div>																																																																																													
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	PERIODO FACTURADO: N/A																																																																																													
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	VALOR FACTURA: \$ N/A -																																																																																													
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																														
Observaciones: N/A		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																													
		Observaciones: Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.																																																																																													
III. AVANCE FÍSICO																																																																																															
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																															
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																															
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																															
<table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>* Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>* Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	* Placa Huella	ML		* Alcantarillas	UND								<table><tr><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Saltarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table>		Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Meta Física (Programa de Obra)																																																																																															
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																													
* Placa Huella	ML																																																																																														
* Alcantarillas	UND																																																																																														
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																															
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																										
Prog	0.00			0.00																																																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																										
Prog	0.00			0.00																																																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																										
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																													
Saltarín																																																																																															
Mezcladora de concreto																																																																																															
Vibrocompactador																																																																																															
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																															
Vibrador de concreto																																																																																															
Motoniveladora																																																																																															
Total																																																																																															
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																													
Ejecutado:																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																																																															
Ejecutado:																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																															
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																													
UBICACIÓN:		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																																													
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																													
		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																													
		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																													
		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																													
		VERTIMIENTOS: SI NO N/A																																																																																													
		EMISIONES: SI NO N/A																																																																																													
		OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																													
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																																																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																													

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

"Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

"Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

"Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

"Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

"Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

"Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

"Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

"El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

"El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

"La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

"el día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

"Se envía aprobación de la hoja de vida del ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

"Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

"El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

"Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																								
			VERSIÓN																																																								
			PÁGINA	1 DE 2																																																							
FECHA				21/04/2025 (Día / Mes / Año)																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)																																																							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720																																																									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																											
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 203,658,720.00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>N/A 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - 0.00%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ - %</td><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO X</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A -</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">Observaciones:Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Observaciones:N/A</td><td colspan="5"></td></tr></table>						CONVENIO		INTERVENTORÍA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 203,658,720.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N/A 0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	PERIODO FACTURADO:	N/A	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	VALOR FACTURA:	\$ N/A -	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	Observaciones:Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%			Observaciones:N/A					
CONVENIO		INTERVENTORÍA																																																									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 203,658,720.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	N/A 0.00%																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	0.00%																																																								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	0.00%																																																								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO X																																																								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	PERIODO FACTURADO:	N/A																																																								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	Observaciones:Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																										
Observaciones:N/A																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																											
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																											
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO																																																							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín																																																		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto																																																		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador																																																		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas																																																		
									vibrador de concreto																																																		
									Motoniveladora																																																		
									Total																																																		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2:		Ejecutado:																																																			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:																																																									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMIENTOS: SI NO N/A																																																					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:																																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*el día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

*Se envía aprobación de la hoja de vida del ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1

*El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*No ha sido posible establecer comunicación con la OAC, a pesar de los reiterados intentos realizados a través de mensajes por WhatsApp y correo electrónico, con el fin de hacer seguimiento a las actividades pendientes. Hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

FECHA

28/04/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

22 del 18/04/2025 al 24/04/2025

Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONVENIO No.
FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
CARMELINA IPIA RAMOS
2040-2024
2/09/2024
31/12/2024
16/07/2025

INTERVENTOR:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATO No.
FECHA DE INICIO:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
MARIA ELVIRA PINTO JAIMES
3649-2024
28/11/2024
31/12/2024
31/05/2025

\$ 203,658,720.00
\$ -
\$ 203,658,720.00
\$ 1,522,205,504.00
\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

\$ 203,658,720.00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

0.00%
0.00%
0.00%
%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -
\$ -
\$ -

0.00%
0.00%
0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -
\$ -

0.00%
0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

SI NO
X
N/A
N/A
\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

0.00%
0.00%

Avance o Atraso Físico %
0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motor niveladora		
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :
Programado: N/A
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO:
LICENCIA AMBIENTAL:
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
CONCESIÓN DE AGUAS:
OCUPACIÓN DE CAUCES:
VERTIMENTOS:
EMISIONES:
OTROS (Especificar cual)

SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*el día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

*Se envía aprobación de la hoja de vida del ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1

*El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.

*No ha sido posible establecer comunicación con la OAC, a pesar de los reiterados intentos realizados a través de mensajes por WhatsApp y correo electrónico, con el fin de hacer seguimiento a las actividades pendientes. Hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, fue posible establecer comunicación con la OAC, se recibe hoja de vida de la contadora y se aprueba, quedando pendiente ing. residente y maestro.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



MEPI PRÓRROGA No. 2

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPÍA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>Observaciones:N/A</div></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: N/A 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>SI NO</div><div></div><div>X</div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:Debido a que las OAC, van recibiendo desembolso, se actualiza plan de cargas el cual se encuentra en revisión por parte del supervisor.</div></div></div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
 El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia establecimiento comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

“Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

“Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

“Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

“Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

“El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.

“Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para la OAC.

“Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVÍAS.

“Contacto y notificación a los prestadores de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

“Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

“El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

“El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

“El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

“La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

“El día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

“Se envía aprobación de la hoja de vida del ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

“Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

“El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

“Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1

“El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.

“No ha sido posible establecer comunicación con la OAC, a pesar de los reiterados intentos realizados a través de mensajes de WhatsApp y correo electrónico, con el fin de hacer seguimiento a las actividades pendientes. Hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.

“Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, fue posible establecer comunicación con la OAC, se recibe hoja de vida de la contadora y se aprueba, quedando pendiente ing. residente y maestro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*No se recibe información sobre las hojas de vida solicitada. Se envía invitación a la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
----------------------------------------------------	--

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
------------------------------------------------------------------------------------	--

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**PIEZA COMUNICATIVA-SOCIALIZACIÓN INICIAL**

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 3238-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **MONTERREDONDO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSION						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	14/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial, compuesto por placa huella y 2 unidades de alcantarillas.											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,254,129.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargos.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 16 de marzo se resume el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correpndiente del proyecto.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
N/A				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
<div><div><p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p><p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p><p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p></div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div></div>				
<div><div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div></div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	21 del 11/04/2025 al 17/04/2025	Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial, compuesto por placa huella y 2 unidades de alcantarillas.											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,254,129.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: _____						ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____					
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____					
VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____						EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____					
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____						OBSERVACIONES: _____					
OBSERVACIONES: _____											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se resume el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA:

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSION						
					PÁGINA	1 DE 2					
FECHA						28/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	22 del 18/04/2025 al 24/04/2025	Último Informe Semanal NO 1					
				(Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial, compuesto por placa huella y 2 unidades de alcantarillas.											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,254,129.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A									
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: _____						ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____					
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____					
VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____						EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____					
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____						OBSERVACIONES: _____					
OBSERVACIONES: _____											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se resume el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA:

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																														
					VERSION																																																																																														
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																													
					FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																													
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																			
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)																																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																																			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																																			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																			
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial, compuesto por placa huella y 2 unidades de alcantarillas.																																																																																																			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																			
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 201,254,129</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 201,254,129</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr></table>							CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																														
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129																																																																																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129																																																																																																	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																																
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																
<div><div><p>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</p><table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 201,254,129.00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ - %</td></tr><tr><td colspan="2">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><table><tr><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A -</td></tr><tr><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.</td></tr></table></div></div>							CONVENIO		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,254,129.00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	Observaciones: N/A		INTERVENTORIA		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>		SI	NO	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		PERIODO FACTURADO:	N/A	VALOR FACTURA:	\$ N/A -	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.																																												
CONVENIO																																																																																																			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,254,129.00																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%																																																																																																		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%																																																																																																		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %																																																																																																		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%																																																																																																		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%																																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																																		
Observaciones: N/A																																																																																																			
INTERVENTORIA																																																																																																			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%																																																																																																		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																																		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>		SI	NO																																																																																																
SI	NO																																																																																																		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																																			
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																																		
VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																																																																		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																			
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.																																																																																																			
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																			
<div>Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%</div> <div>Meta Física Ejecutada % 0.00%</div> <div><table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Saltarin</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motorveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p><div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2: </div></div>							Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00	0.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00	0.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%													MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarin			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motorveladora			Total		
Meta Física (Programa de Obra)																																																																																																			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																																	
Placa Huella	ML																																																																																																		
Alcantarillas	UND																																																																																																		
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																			
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																														
Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																																														
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																														
Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																																														
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																														
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																	
Saltarin																																																																																																			
Mezcladora de concreto																																																																																																			
Vibrocompactador																																																																																																			
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																																			
vibrador de concreto																																																																																																			
Motorveladora																																																																																																			
Total																																																																																																			
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																																			
<div><div><p>FUENTES DE MATERIALES</p><p>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</p><p>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</p><p>OBSERVACIONES:</p></div><div><p>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</p><p>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A</p><p>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A</p><p>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A</p><p>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A</p><p>Ocupación de CAUCES: SI NO N/A</p><p>VERTIENTOS: SI NO N/A</p><p>EMISIONES: SI NO N/A</p><p>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A</p><p>OBSERVACIONES:</p></div></div>																																																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.</div>																																																																																																			

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*La OAC remitió las hojas de vida del personal y se aprobó al ingeniero residente. Se encuentra pendiente la entrega de las hojas de vida del contador y del maestro de obra. Asimismo, se envió la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2090-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **PAILA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	14/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA, en el municipio de Padilla, deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31CC02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ANYELA MARIA VIAFARA CHARA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2090-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,035,600.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,035,600.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,035,600.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeitada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:


Matrícula Profesional No.:





MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA, en el municipio de Padilla, deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31CC02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ANYELA MARIA VIAFARA CHARA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2090-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,035,600.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,035,600.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,035,600.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: _____		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS. *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
N/A	N/A	N/A
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div></div> <div>FIRMA _____</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.</p>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				28/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA, en el municipio de Padilla, deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31CC02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ANYELA MARIA VIAFARA CHARA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2090-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,035,600.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,035,600.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,035,600.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de pagos.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

ESTADO:

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

INVITACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2554-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL** **CHAMIZO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	14/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA						
			SEMANA No.:		20 del	4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1					
			(Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 ml de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL CHAMIZO			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR								
REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES								
CONVENIO No. 2545-2024			VALOR INICIAL: \$		201,052,567.00						
FECHA DE INICIO: 17/09/2024			VALOR ADICIONES: \$		-						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			VALOR ACUMULADO: \$		201,052,567.00						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -						
			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00						
			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeitada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	21/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	21 del 11/04/2025 al 17/04/2025	Último Informe Semanal NO 1					
				(Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 ml de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL CHAMIZO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL:	MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT			REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No.	2545-2024	VALOR INICIAL:	\$ 201,052,567.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 201,052,567.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO				INTERVENTORIA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				PERIODO FACTURADO: N/A							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				VALOR FACTURA: \$ -							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO:	No aplica.
---------	------------

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	<p>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</p> <p>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</p> <p>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</p> <p>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</p>	<p>OBSERVACIONES:</p>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0		

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.


"Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la búsqueda del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
----------------------------------------------------	--

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS	
------------------------------------------------------------------------------------	--

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO	
--------------------------	--



N/A

N/A

<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	
*Envío de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	

*El inventario se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

68202-03281 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	28/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 ml de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL CHAMIZO		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL:	MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No.	2545-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00	CONTRATO No.	3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto. *Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS. *La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la búsqueda del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
N/A	N/A	N/A
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>	<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO	
					VERSION	
					PAGINA	1 DE 2
					FECHA	5/05/2025 (Dia / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA	
			SEMANA No.:		23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 11	
			(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 ml de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.						
CONVENIO SOLIDARIO:						
CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA:			JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL CHAMIZO			
REPRESENTANTE LEGAL:			MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT			
CONVENIO No.			2545-2024			
FECHA DE INICIO:			17/09/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:			31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			31/05/2025			
VALOR INICIAL:			\$ 201,052,567.00			
VALOR ADICIONES:			\$ -			
VALOR ACUMULADO:			\$ 201,052,567.00			
CONTRATO No.			3649-2024			
FECHA DE INICIO:			28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:			31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			31/05/2025			
VALOR INICIAL:			\$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES:			\$ -			
VALOR ACUMULADO:			\$ 1,522,205,504.00			
VALOR ANTICIPO:			\$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Fuentes de Materiales						
Permisos Ambientales y/o Licenciamiento Ambiental						
Observaciones:						
Observaciones:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
Observaciones: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la búsqueda del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2919-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **VEREDA LA UNION**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El corregimiento de LA UNIÓN en el departamento de CAUCA, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2919-2024	VALOR INICIAL: \$ 200.201.271.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00								
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.271.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.201.271.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:


OBSERVACIONES:


[illegible]

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS



<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	<div data-bbox="1174 1126 1476 1153"></div> <div data-bbox="1023 1153 1476 1169"><p>FIRMA _____</p><p>NOMBRE: <u>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</u></p><p>Matrícula Profesional No.: <u>68202-03281 STD</u></p></div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A							
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
El corregimiento de LA UNIÓN en el departamento de CAUCA, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No.	2919-2024	VALOR INICIAL: \$ 200.201.271.00	CONTRATO No.	3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00							
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.271.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.201.271.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Saltarin		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:


DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:	

[illegible]

"Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
 "El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
 "Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
 "Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.



Wentz

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	28/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El corregimiento de LA UNIÓN en el departamento de CAUCA, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2919-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 200.201.271.00		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.271.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.201.271.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A


N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA: 

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El corregimiento de LA UNIÓN en el departamento de CAUCA, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No.	2919-2024	VALOR INICIAL: \$ 200.201.271.00	CONTRATO No.	3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00							
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.271.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.201.271.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER				OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		5
-----------------------------	--	---

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto


*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la gestión del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 05-10-2011 BY 60322 UCBAW/SJS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
N/A	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

--

[illegible]

INVITACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN INICIAL	N/A	N/A
---------------------------------------	-----	-----

[illegible]

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--


*La intervectoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

NOMBRE:		MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.:		68202-03281 STD

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2102-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS** **ROBLES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciólopes de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,859,010.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>											
<div>INTERVENTORÍA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div><div>X</div></div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: N/A</div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
UBICACIÓN:			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A			VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
UBICACIÓN:			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			EMISIONES: SI NO N/A			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.

*Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.


*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 0 (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciólopes de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2040-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO INTERVENTORÍA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,859,010.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrin		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO										
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL	
-------------------	--

[illegible]

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

.....

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.


Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
 "Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
 "Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
 "Se brinda apoyo a la OAC en la recepción de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
 "El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.
 "Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
 "Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVÍAS.
 "Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
 "Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
 "El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invías Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
 "El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
 "El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
 "La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
 "Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.
 "Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.
 "Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.
 "Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC
 "El 25 de marzo se llevó a cabo un comité en el que se evaluó el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.
 "Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apostando en la elaboración del plan de compras No. 1.
 "Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto.

*Se aprueban las hojas de vida del ingeniero residente y de la contadora; sin embargo, se solicita la modificación de la hoja de vida del maestro de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
N/A	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO	

[illegible]

N/A

N/A


N/A

<p>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto	

*La interveroría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

	ms to
--	-------

FIRMA: 
 NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
 Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	5
-----------------------------	---

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

<p>*Durante la semana se realiza la actualización de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, realización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</p> <p>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</p> <p>*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para la OAC.</p> <p>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</p> <p>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</p> <p>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.</p> <p>*Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.</p> <p>*Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.</p> <p>*Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia avance en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto.</p> <p>*Se aprueban las hojas de vida del ingeniero residente y de la contadora; sin embargo, se solicita la modificación de la hoja de vida del maestro de obra.</p>

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta semana se llevo a cabo la recopilacion de la documentacion necesaria para la Prorroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025

N/A	
<p>THE FOLLOWING OFFERS AVAILABLE HEREIN ARE PROPORTIONATE TO THE FUND'S ASSETS</p>	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
------------------------------------------------------------------------------------	--


<p align="center">XI. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	


N/A

MEPI PRÓRROGA No. 2	N/A	N/A
---------------------	-----	-----

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
-----------------------------------------	---------------------------

<p>Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>Enviar conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	<div style="text-align: right;"></div> <div>FIRMA _____</div> <div>NOMBRE: <u>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</u></div> <div>Matrícula Profesional No.: <u>68202-03281 STD</u></div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>Enviar conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	<div></div> <div>FIRMA _____</div> <div>NOMBRE: <u>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</u></div> <div>Matrícula Profesional No.: <u>68202-03281 STD</u></div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto.

*Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto.

*Se aprueban las hojas de vida del ingeniero residente y de la contadora; sin embargo, se solicita la modificación de la hoja de vida del maestro de obra.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2631-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **MARTICA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	14/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la Vereda LA MARTICA, que está ubicada en el municipio de Timbío del departamento de Cauca, deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Templete De La Virgen-Villa Manuel; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2631-2024 VALOR INICIAL: \$ 199,476,926.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199,476,926.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,476,926.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: DISPONIBLE							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
PERMISO MINERO: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A							EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: _____

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

PIEZA COMUNICATIVA- SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																																																												
					VERSIÓN																																																																																																																												
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																																																											
					FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																											
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																																																	
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)																																																																																																																													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																																																															
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																																																																	
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la Vereda LA MARTICA, que está ubicada en el municipio de Timbío del departamento de Cauca, deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Templete De La Virgen-Villa Manuel; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																																																																	
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																																																													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																																																													
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																																																													
CONVENIO No. 2631-2024		VALOR INICIAL: \$ 199,476,926.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																																																											
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 199,476,926.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																	
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																																																												
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																															
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																																																															
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																														
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="4">CONVENIO</td><td colspan="3">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 199,476,926.00</td><td></td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td><td colspan="3"><div>SI NO</div></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="7">Observaciones: N/A</td></tr></table>							CONVENIO				INTERVENTORIA			VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,476,926.00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%		<div>SI NO</div>			(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)							TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%					TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%					AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%					INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%					INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%					Observaciones: N/A																																						
CONVENIO				INTERVENTORIA																																																																																																																													
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,476,926.00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%		<div>SI NO</div>																																																																																																																													
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																																																															
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																																																															
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																																																															
Observaciones: N/A																																																																																																																																	
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																	
<table><tr><td>Meta Física Programada %</td><td>0.00%</td><td>Avance o Atraso Físico %</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Meta Física Ejecutada %</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></table>							Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%	Meta Física Ejecutada %	0.00%																																																																																																																					
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%																																																																																																																														
Meta Física Ejecutada %	0.00%																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>* Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Saltarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>* Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Motorveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> <p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <table><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR 1 :</td><td>Programado: N/A</td><td>TRAMO Y/O SECTOR 2:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ejecutado:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR (n):</td><td>Programado:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ejecutado:</td><td></td><td></td></tr></table>							Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Saltarín			* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto						Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador						Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas												vibrador de concreto												Motorveladora												Total			TRAMO Y/O SECTOR 1 :	Programado: N/A	TRAMO Y/O SECTOR 2:			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR (n):	Programado:				Ejecutado:		
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																						
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Saltarín																																																																																																																								
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto																																																																																																																								
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador																																																																																																																								
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas																																																																																																																								
									vibrador de concreto																																																																																																																								
									Motorveladora																																																																																																																								
									Total																																																																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR 1 :	Programado: N/A	TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																															
	Ejecutado:																																																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR (n):	Programado:																																																																																																																																
	Ejecutado:																																																																																																																																
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																																																																	
<table><tr><td>FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="2">DISPONIBLE</td><td colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ocupación de CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>VERTIMENTOS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td></tr></table> <div>Observaciones:</div> <div>Observaciones:</div>							FUENTES DE MATERIALES	DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A				Ocupación de CAUCES:	SI	NO	N/A				VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A				EMISIONES:	SI	NO	N/A				OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																												
FUENTES DE MATERIALES	DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																														
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A																																																																																																																											
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A																																																																																																																											
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A																																																																																																																											
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A																																																																																																																											
			Ocupación de CAUCES:	SI	NO	N/A																																																																																																																											
			VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A																																																																																																																											
			EMISIONES:	SI	NO	N/A																																																																																																																											
			OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A																																																																																																																											
<table><tr><td>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</td><td>Observaciones: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.</td></tr></table>							P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	Observaciones: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																																																									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	Observaciones: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																																																																

ESTADO: _____

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
FECHA				28/04/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la Vereda LA MARTICA, que está ubicada en el municipio de Timbío del departamento de Cauca, deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Template De La Virgen-Villa Manuel; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2631-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 199,476,926.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199,476,926.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,476,926.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Unidad					
Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Salterín					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

V. GESTIÓN SOCIAL

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial.
*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO



N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																																																					
					VERSIÓN																																																																																																																					
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																																																				
					FECHA	5/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																				
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																										
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)																																																																																																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																																																								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																																																										
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la Vereda LA MARTICA, que está ubicada en el municipio de Timbío del departamento de Cauca, deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Template De La Virgen-Villa Manuel; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																																																										
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																																																						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																																																						
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																																																						
CONVENIO No. 2631-2024		VALOR INICIAL: \$ 199,476,926.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																																																				
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 199,476,926.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																										
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																																																					
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																																																								
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																							
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="3">CONVENIO</td><td colspan="4">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>199,476,926.00</td><td colspan="4">TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4">TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4">INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4">INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4">PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4">VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4"></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4"></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="4"></td><td></td></tr><tr><td>Observaciones: N/A</td><td colspan="6"></td><td></td></tr></table>							CONVENIO			INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199,476,926.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:				0.00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:				\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA				\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA				\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI NO	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	PERIODO FACTURADO:				N/A	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	VALOR FACTURA:				\$ -	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%						INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%						INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%						Observaciones: N/A							
CONVENIO			INTERVENTORIA																																																																																																																							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199,476,926.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:				0.00%																																																																																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:				\$ -	0.00%																																																																																																																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA				\$ -	0.00%																																																																																																																	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA				\$ -	0.00%																																																																																																																	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI NO																																																																																																																		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	PERIODO FACTURADO:				N/A																																																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	VALOR FACTURA:				\$ -																																																																																																																		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																																																							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																																																							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																																																							
Observaciones: N/A																																																																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																										
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																																																										
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Salterín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Motorveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table>							Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín			Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto						Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador						Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas												vibrador de concreto												Motorveladora												Total										
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																															
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín																																																																																																																	
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto																																																																																																																	
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador																																																																																																																	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas																																																																																																																	
									vibrador de concreto																																																																																																																	
									Motorveladora																																																																																																																	
									Total																																																																																																																	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																										
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																																																										
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="4">FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>DISPONIBLE</td><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td>PERMISO MINERO: SI NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td colspan="3"></td><td>PERMISO MINERO: SI NO</td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</td><td>Ocupación de CAUCES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>VERTIMENTOS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>EMISIONES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI NO</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">OBSERVACIONES:</td><td colspan="4">OBSERVACIONES:</td></tr></table>							FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:				DISPONIBLE	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A					PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	UBICACIÓN:				PERMISO MINERO: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	Ocupación de CAUCES:	SI NO	N/A						VERTIMENTOS:	SI NO	N/A						EMISIONES:	SI NO	N/A						OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																						
UBICACIÓN:				DISPONIBLE	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A																																																																																																																			
				PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A																																																																																																																			
				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A																																																																																																																			
UBICACIÓN:				PERMISO MINERO: SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A																																																																																																																			
				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	Ocupación de CAUCES:	SI NO	N/A																																																																																																																			
					VERTIMENTOS:	SI NO	N/A																																																																																																																			
					EMISIONES:	SI NO	N/A																																																																																																																			
					OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A																																																																																																																			
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																																										
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																																																										

ESTADO: _____			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial. *Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente. *Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *La JAC presenta hojas de vida del personal y se aprueba a la ing. Residente.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	
N/A	N/A	N/A	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2233-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA** **VEREDA EL TRÉBOL UNO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-El Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,551,500.00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>Observaciones: N/A</div></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 14,916,433.79 0.98%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 1,433,372.88 0.09%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 1,433,372.88 0.09%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div></div> <div>X</div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: N/A</div></div></div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2:		Ejecutado:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
 El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
 El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		5
-----------------------------	--	---

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024.
 "Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
 "Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
 "Se brinda apoyo a la OAC en la recepción de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
 "El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.
 "Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
 "Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVÍAS.
 "Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
 "Se envía a la JAC el correo solicitado para la notificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicados.
 "El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invías Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
 "El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
 "El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
 "La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
 "Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L. de la OAC.
 "Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.
 "Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.
 "Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.
 "El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda trabajar con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio.
 "Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio.




*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

UNIVERSITÄT WÜRZBURG

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
N/A	

--

<p align="center">XI. REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	
-------------------------------------------------------	--



XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECTOR DE INTERVENORIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------


CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

max to

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.	

Emittir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.



FIRMA _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda brindar acompañamiento técnico en este aspecto con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio.

*Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



MEPI PRÓRROGA



N/A



N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				28/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-El Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 14,916,433.79	0.98%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:			Ejecutado:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

"Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

"Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

"Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

"Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

"Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

"Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

"Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

"El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

"El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

"La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

"Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC

"Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

"Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.

"Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

"El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda brindar acompañamiento técnico en este aspecto con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio.

"Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio.

"Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				5/05/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-El Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 14,916,433.79	0.98%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 1,433,372.88	0.09%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ N/A -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO			N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			N/A		
						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO			N/A		
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO			N/A		
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO			N/A		
						VERTIMIENTOS: SI NO			N/A		
						EMISIONES: SI NO			N/A		
						OTROS (Especificar cual) SI NO			N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:.....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:.....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:.....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:.....

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda brindar acompañamiento técnico en este aspecto con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio.

*Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1, además, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INVITACION A SOCIALIZACIÓN INICIAL

NA

NA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 3908-2024 **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA** **VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de CHAPIO Y PAGUMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUALAÑA CALAPSU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3908-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,158,485.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeitada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	21/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de CHAPIO Y PAGUMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUALAÑA CALAPSU				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 3908-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 13/12/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,158,485.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: DISPONIBLE							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
PERMISO MINERO: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A							EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				28/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de CHAPIO Y PAGUIMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUALAÑA CALAPSU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3908-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,158,485.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				5/05/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de CHAPIO Y PAGUMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUMBIO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUALAÑA CALAPSU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3908-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,158,485.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2297-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CABAÑITA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el Ing residente y contadora.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el Ing residente y contadora.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se recibe una nueva hoja de vida y se encuentra en revisión por parte de la interventoría

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03261 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
 Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
 El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024.

*Revisión del estado de las pólizas actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Se solicita a los representantes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ing residente y contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo el comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.

*Se recibe una nueva hoja de vida y se encuentra en revisión por parte de la interventoría


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se remite aprobación de hojas de vida y se lleva a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<p>Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>	
	
FIRMA	_____
NOMBRE:	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.:	68202-03281 STD

ESTADO:No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ling residente y contadora.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.

*Se recibe una nueva hoja de vida y se encuentra en revisión por parte de la interventoría

*Se remite aprobación de hojas de vida y se lleva a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité con el personal vinculado, en el cual se explican los entregables requeridos para la aprobación de los pagos. Asimismo, se remite pieza comunicativa para la socialización inicial.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



REUNIÓN PERSONAL TÉCNICO OAC



PIEZA COMUNICATIVA- JAC CABAÑITA



N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2330-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANE CER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
El barrio NUEVO AMANE CER del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANE CER		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2330-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,954,248.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
*aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
El barrio NUEVO AMANECEER del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2330-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,954,248.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	28/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANE CER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
El barrio NUEVO AMANE CER del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANE CER				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2330-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,954,248.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supe ditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan deogas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIMENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza la socialización inicial del proyecto, en la que se exponen temas técnicos, ambientales y sociales.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*aprobación de personal.


VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				5/05/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANE CER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
El barrio NUEVO AMANE CER del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANE CER		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2330-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,954,248.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supe ditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan deogas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			


ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

El 23 de marzo se lleva a cabo el primer Comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIA, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa muestra.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecucion del personal tecnico necesario para la ejecucion de la obra.

*Se realiza la socialización inicial del proyecto, en la que se exponen temas técnicos, ambientales y sociales.



N/A

N/A

N/A

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA


NOMBRE:	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.:	68202-03281 STD

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2042-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **HEROICA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La vereda LA HEROICA ubicada en el municipio de CORINTO que tiene una extensión de 302 km² en el departamento del Cauca, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA HEROICA, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,52 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida.											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.290.536									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.290.536									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.290.536.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se remite a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La vereda LA HEROICA ubicada en el municipio de CORINTO que tiene una extensión de 302 km² en el departamento del Cauca, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA HEROICA, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,52 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2042-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 200,290,536.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 200,290,536.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,290,536									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,290,536									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,290,536.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se remite a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial y se reitera en el envío de las hojas de vida

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO
<div><div><div>PIEZA COMUNICATIVA</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div></div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>	<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				28/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La vereda LA HEROICA ubicada en el municipio de CORINTO que tiene una extensión de 302 km² en el departamento del Cauca, LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA HEROICA, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,52 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2042-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 200.290.536.00		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 200.290.536.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.290.536									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.290.536									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.290.536.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se remite a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial y se reitera en el envío de las hojas de vida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza socialización inicial y se reciben las hojas de vida postuladas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XL REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



CONFORMACION DE LA VEEDURÍA

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se remite a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.

"Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial y se reitera en el envío de las hojas de vida

"Se realiza socialización inicial y se reciben las hojas de vida postuladas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


"Aprobación del ingeniero residente, contador y maestro no aprobado porque no cumplen con los requisitos establecidos, por otra parte, se realiza asesoramiento al ing. Residente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XL REGISTRO FOTOGRAFICO



N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2427-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **RIONEGRO GARCÍA ARRIBA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO: No aplica.

Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la plaza huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se aprueben las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03261 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:No aplica.

Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.
*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.
*Se aprueben las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.
*Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se lleva a cabo el primer comité operativo; sin embargo, los profesionales contratados no cuentan con experiencia en este tipo de convenios. Por tal motivo, durante la reunión se brindó orientación sobre los requisitos necesarios para la aprobación de los documentos y la correcta realización del proceso de compras.
*Se envía pieza comunicativa, para la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
PIEZA COMUNICATIVA, SOCIALIZACIÓN INICIAL	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA



NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO					
			VERSION					
			PAGINA	1 DE 2				
FECHA				28/04/2025 (Dia / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 -- Gualanday -- Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópes de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2427-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIOINTERVENTORIA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,223,661.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: Se encuentra en proceso de aprobación el plan de cargas.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad			Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%			DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible		
Placa HuellaML			Prog 0.000.000.00			Saltarin		
AlcantarillasUND			Ejec 0.000.000.00%			Mezcladora de concreto		
			Prog 0.000.000.00%			Vibrocompactador		
			Ejec 0.000.000.00%			Retroexcavadora sobre llantas		
						vibrador de concreto		
						Motoniveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A						TRAMO Y/O SECTOR 2:		
Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTION AMBIENTAL						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
						EMISIONES: SI NO N/A		
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo		

ESTADO: No aplica.

Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se aprueben las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado.

*Se lleva a cabo el primer comité operativo; sin embargo, los profesionales contratados no cuentan con experiencia en este tipo de convenios. Por tal motivo, durante la reunión se brindó orientación sobre los requisitos necesarios para la aprobación de los documentos y la correcta realización del proceso de compras.

*Se envía pieza comunicativa, para la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 23 de abril, se realiza la socialización inicial.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA RIONEGRO



SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA RIONEGRO

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:No aplica.

Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se aprueben las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado.

*Se lleva a cabo el primer comité operativo; sin embargo, los profesionales contratados no cuentan con experiencia en este tipo de convenios. Por tal motivo, durante la reunión se brindó orientación sobre los requisitos necesarios para la aprobación de los documentos y la correcta realización del proceso de compras.

*Se envía pieza comunicativa, para la socialización inicial.

*El día 23 de abril, se realiza la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2488-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CARRIZALES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2488-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,333,458.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2488-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,333,458.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
N/A	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	28/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2488-2024 VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 199,333,458.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00%		Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
UBICACIÓN: DISPONIBLE				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A							
PERMISO MINERO: SI NO				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A							
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A							
VERTIMENTOS: SI NO N/A				EMISIONES: SI NO N/A							
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				OBSERVACIONES:							
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.


*Se envía pieza comunicativa de la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO



PIEZA COMUNICATIVA, SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Comités, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
FECHA						5/05/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	23 del 25/04/2025 al 1/05/2025	Último Informe Semanal NO. 1
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:				JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	
OBJETO CONVENIO:				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 2488-2024				CONTRATO No. 3649-2024		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		
VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
				VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIOINTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,333,458.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Observaciones: N/A						
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
OBSERVACIONES:						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"Se envía pieza comunicativa de la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


"Se llevó a cabo la socialización inicial en la vereda Carrizales, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XL REGISTRO FOTOGRAFICO



RECONOCIMIENTO DEL TRAMO A INTERVENIR



SOCIALIZACIÓN, VEREDA CARRIZALES



CONFORMACIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2031-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA** **VEREDA SOTO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2031-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 204,710,738									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 204,710,738									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 204,710,738.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			5	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2031-2024	VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 204,710,738									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 204,710,738									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 204,710,738.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:	No aplica.
---------	------------

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	<p>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</p> <p>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</p> <p>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</p> <p>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</p>	<p>OBSERVACIONES:</p>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0		

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
----------------------------------------------------	--

NA	
THE ACCOUNT OF THE NUMBER OF THE OBJECTS OF THE COLLECTION IS NOT IN THE ACCOUNT	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

FIRMA 

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				28/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2031-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 204,710,738									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 204,710,738									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 204,710,738.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se reunió el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	5/05/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2031-2024 VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 204,710,738									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 204,710,738									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 204,710,738.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIMENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 16 de marzo se resume el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2858-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **TACUEYO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	14/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,481 km de corredor vial, realizando la construcción de 116,0 ml de placa huella y 2 alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: JHON ALVARO GRISALES MEZA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2858-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 200,147,088.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 200,147,088.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,147,088									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,147,088									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,147,088.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: DISPONIBLE							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
PERMISO MINERO: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A							EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			5	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
FECHA						21/04/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,481 km de corredor vial, realizando la construcción de 116,0 ml de placa huella y 2 alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: JHON ALVARO GRISALES MEZA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2858-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 200,147,088.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 200,147,088.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,147,088									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,147,088									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,147,088.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: DISPONIBLE							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
PERMISO MINERO: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A							EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
N/A	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	28/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,481 km de corredor vial, realizando la construcción de 116,0 ml de placa huella y 2 alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: JHON ALVARO GRISALES MEZA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2858-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 200,147,088.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 200,147,088.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,147,088									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,147,088									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,147,088.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargos.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A


N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA: 

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO	
					VERSION	
					PAGINA	1 DE 2
					FECHA	5/05/2025 (Dia / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	23 del 25/04/2025 al 1/05/2025	Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,481 km de corredor vial, realizando la construcción de 116,0 ml de placa huella y 2 alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON ALVARO GRISALES MEZA			REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	
CONVENIO No.	2858-2024	VALOR INICIAL:	\$ 200,147,088.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 200,147,088.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,147,088				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,147,088				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIOINTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,147,088.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Fuentes de Materiales						
Permisos Ambientales y/o Licenciamiento Ambiental						
Observaciones:						
Observaciones:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
Observaciones: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

"Se remite pieza comunicativa de la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

PIEZA COMUNICATIVA

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2915-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **VEREDA LA PILA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FRANQUI UL MESTIZO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2915-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 18/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 203,847,517.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 203,847,517.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,847,517									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,847,517									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,847,517.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA


NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	21/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.											
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.847.517									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.847.517									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203.847.517.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:			DISPONIBLE				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
			PERMISO MINERO: SI NO				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO				CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIMENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.				
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				
<div><div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div></div>				
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				28/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FRANQUI UL MESTIZO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2915-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 18/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 203,847,517.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 203,847,517.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,847,517									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,847,517									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,847,517.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargos.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:





MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	5/05/2025 (Dia / Mes / AÑO)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	23 del 25/04/2025 al 1/05/2025	Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.											
CONVENIO SOLIDARIO:											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FRANQUI UL MESTIZO			REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No.	2915-2024	VALOR INICIAL:	\$ 203,847,517.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO:	18/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 203,847,517.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,847,517									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,847,517									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO				INTERVENTORIA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,847,517.00				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				PERIODO FACTURADO: N/A							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				VALOR FACTURA: \$ -							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de obras.							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%	MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física Ejecutada %	0.00%										
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 :		Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:							
		Ejecutado:									
TRAMO Y/O SECTOR (n):		Programado:									
		Ejecutado:									
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
UBICACIÓN:						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
			PERMISO MINERO:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
OBSERVACIONES:						VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A		
						EMISIONES:	SI	NO	N/A		
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		
						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. *Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *La OAC remite las hojas de vida y se aprueba al ingeniero residente. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div>FIRMA: </div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.</div>			

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<table border="1"> <tr> <td>No. Copias Impresas: 1</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Versión No.: 001</td> </tr> </table>	No. Copias Impresas: 1		Versión No.: 001
No. Copias Impresas: 1					
Versión No.: 001					
<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>					

CONVENIO No. 3554-2024 **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA** **VEREDA EL SOCORRO-VALLES** **HONDOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de EL SOCORRO, municipio de Morales del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL SOCORRO, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 7,431 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del departamento.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARDEN CRUZ VARGAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3554-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 11/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 206,276,926.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 206,276,926.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 206,276,926.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de EL SOCORRO, municipio de Morales del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL SOCORRO, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 7,431 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del departamento.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARDEN CRUZ VARGAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3554-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 11/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 206,276,926.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 206,276,926.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 206,276,926.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	28/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de EL SOCORRO, municipio de Morales del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL SOCORRO, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 7,431 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del departamento.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARDEN CRUZ VARGAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3554-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 11/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 206,276,926.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 206,276,926.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 206,276,926.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				5/05/2025 (Dia / Mes / AÑO)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En la vereda de EL SOCORRO, municipio de Morales del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL SOCORRO, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 7,431 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes del departamento.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MARDEN CRUZ VARGAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3554-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 11/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 206,276,926.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 206,276,926.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 206,276,926.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La Junta de Acción Comunal manifiesta que no ha sido posible encontrar el personal requerido para trabajar en la zona debido a situaciones relacionadas con el orden público. En consecuencia, se realiza acompañamiento y se inicia el apoyo por parte de la interventoría en el proceso de búsqueda.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 3913-2024 **CABILDO INDÍGENA DE LAME**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				14/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Páez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 5/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,785,173.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: _____

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Páez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 5/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,785,173.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: _____

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El 16 de marzo se reinician las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				28/04/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 22 del 18/04/2025 al 24/04/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Páez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 5/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,785,173.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

El 16 de marzo se resanuden las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO



N/A



N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				5/05/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 11 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Páez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 5/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,785,173.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Una vez aprobado el plan de cargas, se registrarán los valores.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El 16 de marzo se resanden las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Pese a las solicitudes realizadas para la entrega de hojas de vida y estudios previos, la Junta de Acción Comunal no ha emitido respuesta. Del mismo modo, se compartieron la propuesta de valla y diferentes cotizaciones, sin obtener pronunciamiento alguno.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO No. 2065-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **TOMA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
					FECHA	14/04/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 20 del 4/04/2025 al 10/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION MUNAL DE LA TOMA , municipio de Santander de Quilichao, llevará a cabo actividades de mejoramiento en la vía La Toma-el Palmar, estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: FRANSI ELENA OCORO VIAFARA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2085-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,387,366.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIMENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

El 16 de marzo se resanden las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INVITACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión de conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
FECHA				21/04/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 21 del 11/04/2025 al 17/04/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION MUNAL DE LA TOMA , municipio de Santander de Quilichao, llevará a cabo actividades de mejoramiento en la vía La Toma-el Palmar, estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: FRANSI ELENA OCORO VIAFARA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2085-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,387,366.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se resanuden las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECONOCIMIENTO DEL TRAMO A INTERVENIR



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO	
					VERSION	
					PAGINA	1 DE 2
FECHA						28/04/2025 (Dia / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.:	22 del 18/04/2025 al 24/04/2025	Último Informe Semanal NO 1
				(Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La JUNTA DE ACCION MUNAL DE LA TOMA , municipio de Santander de Quilichao, llevará a cabo actividades de mejoramiento en la vía La Toma-el Palmar, estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: FRANSI ELENA OCORO VIAFARA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 2085-2024				CONTRATO No. 3649-2024		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		
VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
				VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIOINTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,387,366.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad						
Placa HuellaML						
AlcantarillasUND						
Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%						
Prog 0.000.000.000.0%						
Ejec 0.000.000.000.0%						
Prog 0.000.000.000.0%						
Ejec 0.000.000.000.0%						
DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible						
Salterín						
Mezcladora de concreto						
Vibrocompactador						
Retroexcavadora sobre llantas						
vibrador de concreto						
Motoniveladora						
Total						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR 2:						
IV. GESTION AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
DISPONIBLE						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIMENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			5	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El 16 de marzo se resanuden las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

"Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


"Se realiza un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ DE SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.


"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO						
					VERSION						
					PAGINA	1 DE 2					
FECHA						5/05/2025 (Dia / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 23 del 25/04/2025 al 1/05/2025 Último Informe Semanal NO 1 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION MUNAL DE LA TOMA , municipio de Santander de Quilichao, llevará a cabo actividades de mejoramiento en la vía La Toma-el Palmar, estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: FRANSI ELENA OCORO VIAFARA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2085-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIOINTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,387,366.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Debido a que la ejecución de los convenios está supeditada al desembolso de recursos, se encuentra en trámite la aprobación del plan de cargas.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salterín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactor		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

El 16 de marzo se resanden las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratos, Interventor y Dirección Territorial.

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo de esta interventoría se diligenciará el siguiente formato:

<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS		PÁGINA	

Acta ☐ No. _____

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. _____
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: _____

VÍA INTERVENIDA: _____

CONTRATISTA: _____

INTERVENTOR: _____

CONTRATO No. _____
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: _____ DE _____ DE _____ VALOR INICIAL: _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ADICIONES: \$ _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ACUMULADO: _____
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO (MESES): _____

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO \$ _____

PAGOS ACUMULADOS _____

VALOR IVA \$ _____

VALOR IVA ACUMULADO _____

TOTAL PAGOS \$ _____

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO _____

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: No aplica

Nombre: _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Firma: No aplica

Nombre: _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula Profesional No.: _____

Firma: No aplica

Nombre: _____

Ingeniero residente del proyecto

Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica

Matrícula Profesional No. _____

Original: Archivo Gestión del RVIAS.


Copias: Unidad Ejecución, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</div>	

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</div>		<div>CÓDIGO</div>	
			<div>VERSIÓN</div>	
			<div>PÁGINA</div>	

		<div>FECHA</div>			
				<div>(Día / Mes / Año)</div>	

<div>UNIDAD EJECUTORA:</div>	<div>SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES</div>	<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div>	<div>CAUCA</div>
------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------	------------------

<div>CONVENIO No:</div>	<div>CONTRATISTA:</div>
-------------------------	-------------------------

<div>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:</div>	<div>PROYECTO:</div>
-------------------------------------------	----------------------

<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:</div>	<div>INTERVENTOR:</div>
------------------------------------------	-------------------------

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco																																	0
Lluvias moderadas																																	0
Lluvias intensas																																	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

<div>Firma</div> <div>No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>	<div>Firma</div> <div>No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	No. Copias Impresas: 1	<div></div>
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							PAGINA		
FECHA								(Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA									
CONVENIO No.: CONTRATISTA:									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBSERVACIONES:									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencian la 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certific 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultad									
Firma No Aplica					Firma No Aplica				
Nombre:					Nombre:				
Residente de Obra					Director de Interventoría				
Matrícula Profesional No.:					Matrícula Profesional No.:				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	4	12	2024																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 4274-2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																												
FECHA DE INICIO: 18/12/2023																																																												
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 200.828.180,00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 200.828.180,00 (Incluye adiciones)																																																												
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																												
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																												
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.165.636,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.041.409,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60.248.454,00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00	prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			18	11	2023	31/10/2024			Día	Mes	Año				18	11	2023	31	12	2026	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																										
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00																																																										
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00																																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00																																																										
VIGENCIA																																																												
Desde			Hasta																																																									
18	11	2023	31/10/2024																																																									
Día	Mes	Año																																																										
18	11	2023	31	12	2026																																																							
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
31	12	2023	31	12	2028																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																												
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			18	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																					
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																										
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00																																																										
Otros																																																												
VIGENCIA																																																												
Desde			Hasta																																																									
18	11	2023	31	12	2023																																																							
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																												

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	12	2023	2/03/2025		
Día	Mes	Año			
29	12	2023	30	4	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	4	2024	30/04/2025		
Día	Mes	Año			
30	4	2024	30	6	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
30	6	2024		30/06/2025		
Día	Mes	Año				
30	6	2024		31	8	2027
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
31	8	2024		31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.	3	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	--------------	---	-------------------	-----------------

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
18	11	2023		31	8	2024
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459	OTRAS PÓLIZAS No.
-----------------------------------------------	--------------------------

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.	4	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	--------------	---	-------------------	-----------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
30	8	2024		31/08/2025		
Día	Mes	Año				
30	8	2024		31	10	2027
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
31	10	2024		31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.	4	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	--------------	---	-------------------	-----------------

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
18	11	2023		31	10	2024
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	10	2024	4/12/2025		
Día	Mes	Año			
30	10	2024	4	12	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	4	12	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 4307-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO																																																									
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 18/12/2023																																																											
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 201.225.865,00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 201.225.865,00 (Incluye adiciones)																																																											
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																											
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																											
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.245.174,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.061.293,50</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60.367.761,00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			10	11	2023	31/10/2024			Día	Mes	Año				10	11	2023	31	12	2026	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																									
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00																																																									
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50																																																									
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00																																																									
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
10	11	2023	31/10/2024																																																								
Día	Mes	Año																																																									
10	11	2023	31	12	2026																																																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
31	12	2023	31	12	2028																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																											
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			10	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																					
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00																																																									
Otros																																																											
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
10	11	2023	31	12	2023																																																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																						
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433		OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/12/2023																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																											
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:																																																							
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.245.174,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.061.293,50</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">2/03/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2027</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			28	12	2023	2/03/2025			Día	Mes	Año				28	12	2023	30	4	2027															
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																									
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00																																																									
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50																																																									
VIGENCIA																																																											
Desde			Hasta																																																								
28	12	2023	2/03/2025																																																								
Día	Mes	Año																																																									
28	12	2023	30	4	2027																																																						

			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	4	2024	30/04/2025		
Día	Mes	Año			
30	4	2024	30	6	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			

prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

30	6	2024
Día	Mes	Año
30	8	2024

30	8	2027
Día	Mes	Año
30	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.

3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
30	8	2024	31	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		

prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

Día	Mes	Año
31	10	2024
Día	Mes	Año
4	12	2024

4	12	2027
Día	Mes	Año
4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma
Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		

FECHA				4	12	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4314-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO
--------------	-----------	--------------	------------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:						
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						

FECHA DE INICIO:	21/12/2023		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 199.394.125,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ 199.394.125,00 (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N/A		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																															
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 39.878.826,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 9.969.706,50</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 59.818.239,00</td></tr></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00	prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>9</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>9</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			9	11	2023	31/10/2024			Día	Mes	Año				9	11	2023	31	12	2026	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																													
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00																																																													
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																																																													
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
9	11	2023	31/10/2024																																																												
Día	Mes	Año																																																													
9	11	2023	31	12	2026																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
31	12	2023	31	12	2028																																																										

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100025592
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																										
<table><tr><th>Seguro</th><th>Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>			Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	Otros			<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>9</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			9	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																								
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00																																								
Otros																																										
VIGENCIA																																										
Desde			Hasta																																							
9	11	2023	31	12	2023																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																					

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100005395	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	20/12/2023		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																															
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:		1																																																							
						AMPLIACIÓN No. 1		SUSPENSIÓN No.: 1																																																							
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 39.878.826,00</td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 9.969.706,50</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 59.818.239,00</td></tr></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00	prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>27</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">18/12/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>27</td><td>12</td><td>2023</td><td>18</td><td>2</td><td>2027</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>18</td><td>2</td><td>2024</td><td>18</td><td>2</td><td>2029</td></tr></table>							VIGENCIA						Desde			Hasta			27	12	2023	18/12/2024			Día	Mes	Año				27	12	2023	18	2	2027	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	18	2	2024	18	2	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																													
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00																																																													
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																																																													
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
27	12	2023	18/12/2024																																																												
Día	Mes	Año																																																													
27	12	2023	18	2	2027																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
18	2	2024	18	2	2029																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		CCS-100025592																																																													

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	18	2	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	5	2024	5/05/2025		
Día	Mes	Año			
25	5	2024	5	7	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	7	2024	5	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	5/06/2025		
Día	Mes	Año			
30	6	2024	5	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	8	2024	5	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

AMPLIACIÓN No. 2

SUSPENSIÓN No.:

2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No

2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	7	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
31	7	2024	31	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No

2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No

3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
31	8	2024	31	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		
Día	Mes	Año			
31	10	2024	4	12	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 6 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 3

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 7 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A



Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados

Firma
Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	18	12	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2038-2024		CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 02/09/2024																																																											
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 201.874.214,00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 201.874.214,00 (Incluye adiciones)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																											
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.187.421,40</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>10</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.093.710,70</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40.374.842,80</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20.187.421,40	25	6	2024	31	10	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.093.710,70	25	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.374.842,80	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento	10%	\$ 20.187.421,40	25	6	2024	31	10	2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.093.710,70	25	6	2024	31	12	2027																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.374.842,80	31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/07/2024																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																											
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMVLV</td><td>\$ 260.000.000</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 260.000.000	25	6	2024	31	12	2024	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 260.000.000	25	6	2024	31	12	2024																																																			
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493																																																											
OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/07/2024																																																											
OBSERVACIONES:																																																											
NOTAS:																																																											
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																											
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																											
Firma 																																																											
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																											
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	18	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 2039-2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 02/09/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 209.387.835,00
VALOR ACUMULADO: \$ 209.387.835,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 20.938.783,50	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			24	6	2024	31	10	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.469.391,75	24	6	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41.877.567,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031396
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO


Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000	Desde			Hasta		
Otros			24	6	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006496 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:



- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).




Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	18	12	2024																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2040-2024		CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
FECHA DE INICIO: 02/09/2024																																																								
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 203.658.720,00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 203.658.720,00 (Incluye adiciones)																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.365.872,00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.182.936,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40.731.744,00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20.365.872,00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.182.936,00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.731.744,00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>10</td><td>2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			25	6	2024	31	10	2025							25	6	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20.365.872,00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.182.936,00																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.731.744,00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
25	6	2024	31	10	2025																																																			
25	6	2024	31	12	2027																																																			
31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031373																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/07/2024																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMVLV</td><td>\$ 260.000.000</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 260.000.000	Otros			<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			25	6	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 260.000.000																																																						
Otros																																																								
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
25	6	2024	31	12	2024																																																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006490		OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/07/2024																																																								
OBSERVACIONES:																																																								
NOTAS:																																																								
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																								
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																								
Firma 																																																								
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																																																								
Director de Interventoría																																																								
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD																																																								
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																								
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				18	12	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2233-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
--------------	-----------	--------------	----------------------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200.551.500,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.551.500,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO									
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20.055.150,00	5	7	2024	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.027.575,00	5	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.110.300,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100031580
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	29/07/2024


SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	\$ 260.000.000	5	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006551	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	29/07/2024		

OBSERVACIONES:			

NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			

Firma	
Nombre:	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:	6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			

	FECHA	18 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)
--	-------	-------------	-------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 2297-2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 02/09/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 200.914.634,00
VALOR ACUMULADO: \$ 200.914.634,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 20.091.463,40	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			11	7	2024	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.045.731,70	11	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.182.926,80	31	12	2029	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031637
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO


Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260.000.000	Desde			Hasta		
Otros			11	7	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006559 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/07/2024

OBSERVACIONES:



NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma: 

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																									
		VERSIÓN																																																									
		PÁGINA																																																									
		FECHA	18	12	2024																																																						
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2427-2024		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																											
FECHA DE INICIO: 02/09/2024																																																											
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																											
VALOR INICIAL: \$ 200.223.651,00																																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 200.223.651,00 (Incluye adiciones)																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																											
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																											
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.022.365,10</td><td>17</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.011.182,55</td><td>17</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40.044.730,20</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20.022.365,10	17	7	2024	31	12	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.011.182,55	17	7	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.044.730,20	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Cumplimiento	10%	\$ 20.022.365,10	17	7	2024	31	12	2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.011.182,55	17	7	2024	31	12	2027																																																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.044.730,20	31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100006595																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 01/08/2024																																																											
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																											
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMVLV</td><td>\$ 260.000.000</td><td>17</td><td>07/</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 260.000.000	17	07/	2024	31	12	2024	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																								
			Desde			Hasta																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 260.000.000	17	07/	2024	31	12	2024																																																			
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006595																																																											
OTRAS PÓLIZAS No.																																																											
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS																																																											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 01/08/2024																																																											
OBSERVACIONES:																																																											
NOTAS:																																																											
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																											
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																											
Firma 																																																											
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																																																											
Director de Interventoría																																																											
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD																																																											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																											
Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																											

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA		4/04/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	--------------------------------

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNION
Seguimiento convenios 2023 y 2024 CI No. 3649-2024

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Estado actual de los convenios y definir pasos a seguir en el desarrollo de los mismos.

DESARROLLO DE LA REUNION
Se da inicio a la reunión con la presentación de los participantes del INVIAS y de la interventoría.
Inicialmente se habla de hacer una corrección a la valla del resguardo indígena de Yaquiva ya que presenta un error en el municipio. Al respecto la interventoría se compromete a enviar correo al ingeniero Germán candia de planta central para que trámite lo correspondiente con el área de Comunicaciones del invias.
En cuanto a la JAC El Trébol 1 del municipio de Puracé, donde el representante legal se encuentra imposibilitado para hacer las gestiones respectivas, el ingeniero Manuel Pérez de interventoría, expresa que la profesional social Jazmine Narváez ya ha tenido acercamientos con el vicepresidente de La organización y se tiene programada una reunión para el día lunes 7 de abril con el fin de continuar direccionando el desarrollo de este convenio.
El ingeniero Manuel Pérez de la Interventoría expresa que a las organizaciones se les ha compartido un modelo de contrato de personal y se está realizando la revisión y aprobación de las hojas de vida de Ingeniero Residente, Contador y Maestro de obra. Lo anterior de acuerdo al avance en la entrega de información por parte de las organizaciones.
El ingeniero Manuel Pérez de la Interventoría expresa que ya se tiene la programación de las reuniones iniciales con las organizaciones, las cuales estarán lideradas por un ingeniero civil y la profesional social de la interventoría.
Ingeniero Germán Candia de planta central INVIAS manifiesta que en los MEPI de solicitud de prórroga, se debe indicar que la etapa de alistamiento está concluida y que no se ha dado inicio a la etapa 2 de ejecución de obra por razones de orden público. Tal es el caso, del Representante legal de la Vereda La Unión del municipio de Padilla quien tuvo que salir de la vereda. El ingeniero Alonso Ortega de la Dirección Territorial Cauca del invias comenta que Es importante hacer un informe donde se muestre la trazabilidad y el estado de orden público y anexar a los documentos de la prórroga.
La interventoría realiza consulta en cuanto a la posibilidad de dejar un solo ingeniero Residente para las 3 JAC del municipio de Miranda debido a que estas son muy cercanas y por razones de orden público. La profesional social de la interventoría manifiesta que la Representante Legal de la junta de acción comunal de Asnazu, solicita que sea el mismo ingeniero Residente para su organización y para la junta de acción comunal de la Turbina en el municipio de Suárez. Al respecto se dieron justificaciones para dejar el mismo Ingeniero residente en las juntas mencionadas y se aclararon algunos aspectos a tener en cuenta. El ingeniero Germán Candia de planta central realiza consulta sobre este tema y manifiesta que dicha solicitudes son viables: un solo Ingeniero Residente puede hacerse cargo de dos o tres juntas

teniendo en cuenta que se celebran contratos de prestación de servicios pero con el compromiso de cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

El ingeniero Germán Candia de planta central solicita a la interventoría la entrega oportuna de los documentos diligenciados para el trámite de prórrogas. Igualmente manifiesta solicita a la interventoría la elaboración y entrega del soporte de las situaciones de orden público que se presentan y que las prórrogas deben hacerse hasta el día 16 de julio de 2025. Reitera la necesidad de que en el MEPI de solicitud de prórroga quede consignada que la etapa 1 de alistamiento ya se terminó y que la etapa 2 no se ha podido realizar por temas de orden público.

El Ingeniero Germán Candia manifiesta que creó una carpeta donde se deben colocar todas las actas de reinicio de convenios. Igualmente manifiesta que se debe diligenciar los documentos para la ampliación a la suspensión de los convenios correspondientes.

El ingeniero Germán Candia brinda orientación a la interventoría en cuanto a las actas de costo de interventoría, los MEPIs, etc con el fin de evitar reprocesos en los tramites. solicita que la Interventoría le dé oportuna respuesta al correo donde se le hizo requerimiento de información sobre las pólizas. La Interventoría responde que la respuesta a este correo se ha venido adelantando mediante la solicitud a la empresa de seguros de Javier Paz de la ciudad de Popayán. Esta empresa manifiesta que entre los días 7 y 8 de abril enviarán esta información actualizada. El ingeniero Manuel Pérez de la interventoría comentó que se solicitó a la aseguradora la información de las deudas por pólizas a cargo de los convenios e igualmente solicitó al banco información sobre las deducciones de los valores de las pólizas para realizar el trámite correspondiente y/o devolución a que haya lugar.

La interventoría pone a consideración el tema del resguardo indígena Ullucos-Picachos, en relación a la posibilidad del cambio de obras. El ingeniero Germán Candia manifiesta que va a realizar la consulta y luego, si es posible realizar un comité técnico para mirar el alcance de las obras en esta organización.

La interventoría se compromete a la entrega de los documentos requeridos para la prórroga el día lunes 7 de abril del presente año.


El ingeniero Germán candia manifiesta que los antecedentes de las organizaciones y de los representantes legales se deben tramitar oportunamente e indica La forma en que se debe tramitar el documento en la página de la Procuraduría y la Contraloría.

El ingeniero Alonso Ortega informa sobre la solicitud del ingeniero Luis Eduardo Ledezma en relación a que la interventoría presente un cuadro resumen donde se consigne la fecha de terminación de cada uno de los convenios a cargo.

El ingeniero Germán Candia resaltó que hay 33 convenios con desembolsos y 3 convenios pendientes: resguardo indígena de Monterredondo de Cajibío, resguardo indígena Páez de Corinto y resguardo indígena de Canoas en Santander de Quilichao.

El ingeniero Germán Candia solicita a la interventoría apoyo en la gestión y trámite con las juntas u organizaciones para la firma de documentos digitales en la plataforma Secop 2.

El ingeniero Germán Candia recuerda la obligación en la entrega oportuna de las actas de costos, informes semanales e informes mensuales por

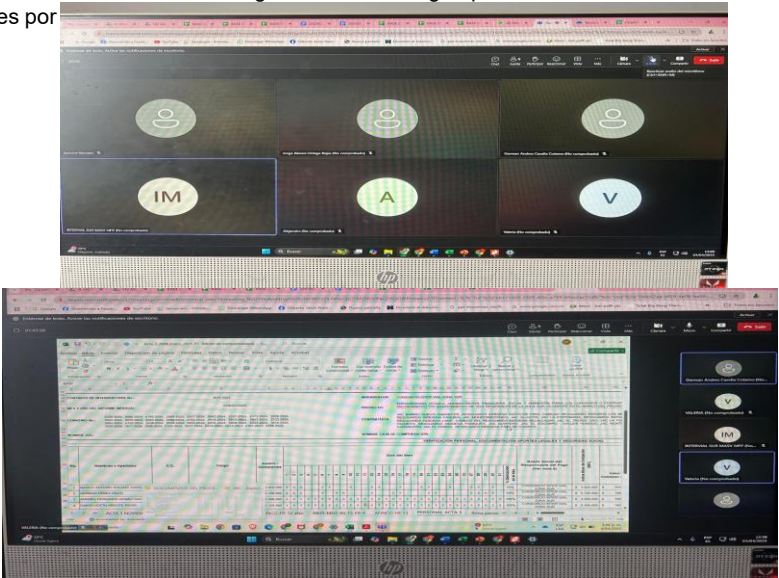

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
MEPI Porrogas, Reanudación	lunes, 7 de abril de 2025	INTERVENTORIA
.....
.....
.....
.....

FECHA PROXIMA REUNION




11/04/2025

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	DIRECTOR	INTERVENTORIA	
JOHAN SUAREZ	COORDINADOR SST	INTERVENTORIA	
MANUEL PEREZ PINTO	COORDINADOR TECNICO	INTERVENTORIA	
GERMAN PEREZ PINTO	RESIDENTE	INTERVENTORIA	
VALERIA PIAMBA	INGENIERA APOYO	INTERVENTORIA	
JAZMINE NARVAEZ	SOCIAL	INTERVENTORIA	
JORGE ALONSO ORTEGA	SUPERVISOR	INVIAS TERRITORIAL CAUCA	
GERMAN ANDRES CANDIA	GESTOR TECNICO	INVIAS TERRITORIAL CAUCA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

FECHA 22/04/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNION


Revisar el avance de: Desarrollo de la obra, Planes de compra, Presupuesto, Programaciones y varios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Desarrollo de la obra
Planes de compra
Presupuesto
Programaciones
Hojas de vida Profesionales: Residentes, Contadores y Maestros de Obra.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión con la participación de los RL de las JAC y/o Resguardos del Grupo 1 y de la interventoría, se hace llamado a lista y se captura la imagen de los participantes de la reunión.

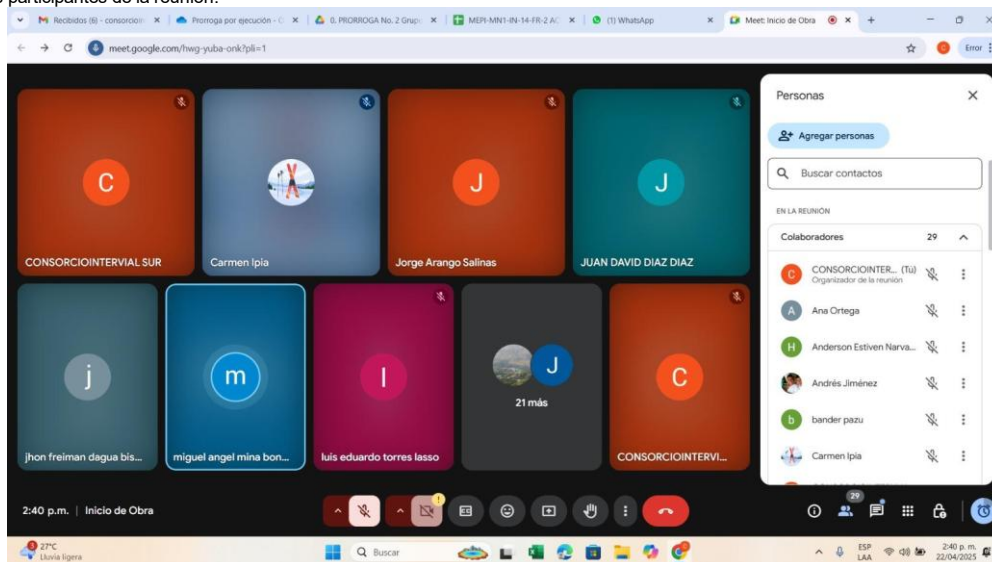

El ingeniero Manuel Pérez de la Interventoría expresa que a el objetivo de la reunión es dar inicio a las labores de todos los trabajos, puesto que ya tiene diseños y parte del personal ya aprobado; hay una demora con la carta final de los diseños aprobados, porque el INVIAS hasta el momento no ha podido entregar el ajuste de Topografía pendiente por parte de ellos, más sin embargo este impase no es impedimento para que ustedes JAC y Resguardos saquen las cantidades, soliciten cotizaciones y nos envíen la proyecciones para hacer los planes de compra; lo anterior se debe a que ese plan de compras que debe hacer ustedes es diligenciar unos formatos bancarios para lo concerniente a Pólizas, es decir que nos deben enviar la factura de las

Compras que debe hacer, todos los documentos antes formados bancarios para el consentimiento a Juntas, lo cual que nos deben enviar la resolución de las Pólizas, Certificación bancaria, el RUTy llenar los dos formatos; estos dos últimos se diligencian digitalmente, se imprimen y se firman por los RL de cada JAC y/o RESGUARDO, posteriormente se debe escanear y remitir al correo de la Interventoría para a su vez recolectar firma y remitir al BANCO con el fin de que se realice el pago correspondiente a dicha Póliza.

Si alguna JAC y/o Resguardos ya realizó dicho pago, enviar por correo electrónico el documento del pago, cuenta de cobro y la certificación bancaria para remitir al Banco y realizar la respectiva devolución, sin los soportes de pago difícilmente esta transacción se puede realizar.

Adicionalmente, se han venido realizando unas visitas iniciales en algunos municipios, solicitamos de manera muy especial de su colaboración con el personal de Interventoría que estará presente la Dra. Jazmín y el Ing. Julián para socializar de primera mano, resolver inquietudes y temas pendientes, asimismo el INVIAS contrató personal que se comunicará con ustedes para apoyarlos en lo que se requiere propiamente del proyecto, aspectos técnicos, administrativos, social y otros, esto con el fin de mejorar la falencia en tiempos y oportunidad en la respuesta.

Cabe mencionar que es importante que cada JAC y/o Resguardos agilicen el envío de las hojas de vida y soportes de experiencia del personal mínimo requerido para el proyecto como lo son Ingeniero Residente, Contador y Maestro, esto con el objetivo de de validar aprobación o desaprobación, esto a más tardar para el día jueves 24/04/2025.

Solicitar asimismo al Residente los balances de los diseños completos y que se remitan a Interventoría.

Interviene Loren gisel Lasso - Contadora JAC Cabañita, su pregunta es: Si adelanta los gravámenes financieros? Pues es un tema que no tiene claridad ya que no se ha conversado sobre el mismo, el Ing. Manuel le responde qué efectivamente se debe hacer y radicar en el Banco y reenviar a interventoría para su posterior devolución, pero ese proceso de devolución en tiempos es directriz del Banco, esto se hace directamente o desde el correo oficial de la Junta. Otra pregunta; Para soportar las cuentas de cobro se deberealizar documento soporte?, el Ing. Manuel afirma, sugiere que para compras busquen un proveedor que genere factura electrónica, al igual que centralicen las compras para no llenarse de facturas con diversas compras, igualmente solicitar a proveedor que garantice el stock de materiales para que en el momento del desembolso el proveedor pueda cumplimos inmediatamente con lo solicitado.

Interviene el Ing. Juan David - Residente JAC Cabañita y su pregunta es si Interventoría recibió el correo sobre sobre los documentos de la primera Orden de compra (Pólizas, Valla y Subsidio de transporte al dignatario); el Ing. Manuel responde que, efectivamente se recibió y que tratará de enviar aprobación lo más pronto posible ya que son temas administrativos y obligatorios, no aplica para la firma del comité creado para la aprobación de pagos sino que se puede decidir desde la misma RL e Interventoría. Otra pregunta; respecto a dotación, hay una parte de Uniformes, nos facilitaron el número de un proveedor certificado como INVIAS lo pide, se podrían comprar en esas empresas de dotación?; el Ing. manuel responde, que es un número que se les facilitó con el fin de hacerles mas facil esta gestión, pero pueden escoger cualquier otro proveedor con el compromiso que sea tal cual lo exigido por el INVIAS, logos, colores entre otras exigencias así mismo que su valor cumpla con el ya validado.

JAC Ullucos Picacho, quien solicita le definan si se autorizó para esa vereda Placa huellas o Muro de Contención, el ing. Manuel responde que

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Enviar ajustes de proyectos es decir el nuevo alcance si se requiere con sus respectiva justificación, en especial JAC Ullucos ya que el muro de contención no fue aprobado

viernes, 25 de abril de 2025

RL Juntas de Acción Comunal

Remitir mediante correo las HV del personal mínimo requerido para validar experiencia y darle trámite de aprobación /No aprobación.

viernes, 25 de abril de 2025

RL Juntas de Acción Comunal

Crear grupo de WhastApp para Contadores y Residentes, con el fin de solventar dudas e inquietdes frente al proyecto y programar reunión con los mismos.

viernes, 25 de abril de 2025

Interventoría







FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIAN BONILLA RIVERA	REPRESENTANTE	JAC CARAQUEÑO	
EYDER TAQUINAS RIVERA	REPRESENTANTE	JAC EL HORNO	
EDISON CASAMACHIN FLOREZ	REPRESENTANTE	JAC MONTERREDONDO, MIRANDA	
YENSIN CONSUELO RAMOS	REPRESENTANTE	JAC LA TURBINA	
BANDERLEY MEDINA PAZU	REPRESENTANTE	JAC LA ESPERANZA	
CARMELINA IPIA RAMOS	REPRESENTANTE	JAC ULLUCOS PICACHO	

RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO	REPRESENTANTE	JAC LOS ROBLES	
MANUEL BOLAÑOS	REPRESENTANTE	JAC VDA EL TREBOL UNO	
MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ	REPRESENTANTE	JAC CABAÑITA	
ROSMIRA ZULETA TROCHEZ	REPRESENTANTE	JAC RIONEGRO GARCIA ARRIBA	
MANUEL PEREZ PINTO	COORDINADOR TECNICO	INTERVENTORIA	
GERMAN PEREZ PINTO	RESIDENTE	INTERVENTORIA	
JOHAN SUAREZ	COORDINADOR SST	INTERVENTORIA	
JAZMINE NARVAEZ	SOCIAL	INTERVENTORIA	
VALERIA PIAMBA	INGENIERA APOYO	INTERVENTORIA	
MARIA BAUTISTA	TÉCNICO AUXILIAR	INTERVENTORIA	
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial</p>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA

24/04/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNION

Revisar el avance de: Desarrollo de la obra, Planes de compra, Presupuesto, Programaciones y varios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Desarrollo de la obra

Planes de compra

Presupuesto

Programaciones

Hojas de vida Profesionales: Residentes, Contadores y Maestros de Obra.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión con la participación de los RL de las JAC y/o Resguardos del Grupo 2 y de la interventoría, se hace llamado a lista y se captura la imagen de los participantes de la reunión.

Es importante conocer e identificar los actores comunitarios involucrados del área de influencia del proyecto y el personal contratista encargado de la realización del mismo y la entrega de avances realizados en los estudios definitivos en compañía del Ingeniero designado por parte de la comunidad para establecer los alcances finales con el presupuesto y diseño final y proceder con los planes de compra.

Se realiza presentación por parte del apoyo de la interventoría, donde comenta los objetivos de la reunión y los pasos a desarrollar en la misma; se confirma la recepción de las hojas de vida de los actores comunitarios de las diferentes veredas del área de influencia del proyecto, por parte de la interventoría y se establece compromiso de revisión de las mismas con el apoyo de la Ing. María con el fin de dar paso a la vinculación de quienes cumplan el perfil y las recomendaciones y sugerencias a quienes no.

Se confirma por parte de la interventoría el envío a todas las JAC, los entregables compartidos por INVIAS como el estudio de suelo y topografía; en base a ellos se espera que las JAC debieron haber realizado la gestión de contratación para dichos estudios definitivos y poder dar el visto de aprobación o las

El Sr. Jhon Edinson Calambazo, quien manifiesta que no ha podido realizar la gestión de contratación para dichos saldos definitivos y poder dar el visto de aprobación a las observaciones que deberán ser base para las cantidades definitivas en el presupuesto final y el alcance definitivo del proyecto y proceder a realizar el plan de compras inicial. Del mismo modo se recordó el listado de proveedores que los actores comunitarios deben ya tener adelantado con posibles cotizaciones para tener clara la base de precios del mercado. Se recuerda que se contaba con 15 días para la elaboración final de los diseños por parte de los actores comunitarios y su posterior entrega a la interventoría para su revisión.

Wilmer, consulta si al contar ya con un prediseño, el INVIAS puede llegar solicitar, un diseño adicional donde el diseñador cumpla con requisitos de especialidad, pues aumentaría el tiempo en la elaboración de los mismos. Igualmente sugiere que se empleen, los prediseños y se ajusten a las dimensiones reales (anchos) en campo de la carretera terciaria que presenta alto grado de dificultad para el desplazamiento de vehículo y que permita calcular el alcance real, dado el tiempo que implicaría el volver a realizar los diseños con el especialista. La interventoría comenta que el INVIAS requiere la implementación de las cartillas menores y que los diseños sean realizados por personal especializado y que soporte los diseños con su respectiva firma para poder aprobar los diseños finales. Comenta la vereda el Socorro, en el caso de los tramos de la vereda, con pendientes y curvas, se debe incluir y ajustar los sobreanchos en los diseños y se solicita sea tenido en cuenta por los sobrecostos.

El Sr Juan Carlos Taiman Vereda Chapio manifiesta inquietudes con la póliza inicial y el plan de pagos, si el contratista se debitará automáticamente el pago o si por el contrario, los dineros serán consignados a cada JAC y serán las Juntas, quienes realicen los aportes de la póliza. Igualmente consulta el valor total con los intereses de mora que se encuentran ya en vigencia. El Ing. Interventoría aclara que la mayoría de las JAC autorizaron, por medio de oficios, directamente a INVIAS para que realicen directamente el descuento sobre el primer desembolso para cubrir esa póliza inicial; se aclara que, en algunos casos, donde ya se realizaron estas retenciones, la interventoría ya se encuentra en contacto con las aseguradoras para conocer los saldos y cruzar con el INVIAS. Se aclara que los dineros de pólizas, no se consignan nunca a las JAC, se realizan directamente al banco con destino final proveedores de las pólizas. A la fecha, la interventoría se encuentra a la espera que INVIAS radique la información del estado actual de saldos.

El representante de la JAC de la vereda Carrizales, el Sr Pedro Muñoz consulta información de aprobación de las hojas de vida enviadas previamente y los ajustes solicitados. Ante la solicitud la interventoría de manera general comenta el proceso que se ha realizado, desde la recepción de las hojas de vida hasta la respuesta de las mismas que serán enviadas en el transcurso de día o más tardar el día siguiente. Puntualmente a la vereda Carrizales, se le comenta que las únicas hojas de vida aprobadas fueron la del Contador David Moncayo y la del maestro de obra Marcelino Montoya, sin embargo, el Sr. Pedro aclara que los soportes fueron enviados nuevamente en un correo diferente, dejando como compromiso por parte de la interventoría la revisión del mismo y poder realizar revalidación. La interventoría de manera extraoficial, manifiesta que en la medida de lo posibles, los diferentes convenios o JAC, realicen las vinculaciones con el personal que cumplan requisitos por pliegos, sin embargo y dadas las condiciones de las zonas, no se puede contar con el personal que cumpla la experiencia citada, manifestar de manera escrita, dicha situación y solicitar cooperación para generar esas vinculaciones al ser profesionales que han trabajado con cada JAC anteriormente y/o respaldar al profesional para poder dar visto bueno a sus vinculaciones.

Interviene el fiscal de la JAC de la vereda Monterredondo, quien manifiesta dificultades con la contratación de los diseños, debido al bajo costo del rubro basado en \$2'000.000, el cual, manifiesta el Sr Jhon, no hay profesionales que se comprometan a realizar visitas a campo para la verificación. Igualmente comenta que las cotizaciones de EPPS, han sido de alta dificultad pues en la zona no se cuenta con proveedores, manifiesta solo contar con dos. Paralelamente manifiesta que las temporadas de invierno en la zona, es de tener en cuenta para el traslado de materiales a puntos de obra. Ante el aporte del sr Jhon Edinson Calambazo, la Ing. Valeria Piamba, apoyo de interventoría, aclara que los diseños de la placa huella no requiere de visita en campo para toma de levantamiento topográfico y estudio de suelos, pues los convenios 2024 ya cuentan con esos insumos. El rubro correspondiente a \$2'000.000 equivale exclusivamente al diseño geométrico y por tal no requiere visita. Del mismo modo comenta que en otros puntos donde ya se han realizado los mismos trabajos, los costos de los diseños geométricos, han oscilado entre \$800.000 y \$1'000.000 mtc. El Sr. Jhon consulta si al ser diseño geométrico, es necesario que el personal encargado del diseño, sea un especialista en vías o estructural, a lo cual la Ing. Valeria responde que debe ser un especialista estructural de vías y que solo debe generar el dibujo, pues ya tiene los levantamientos topográficos y los estudios de suelos, lo único que se debe aportar son las curvas de la superficie.

El representante de la JAC vereda El Chapio, el sr. presidente Milton manifiestan muy seriamente que no es participe de las reuniones en modalidad virtual ya que la comunicación se genera de manera intermitente y la comprensión de los temas se generan de manera intermitente. Igualmente, manifiesta, que han pasado 15 días desde el envío de las hojas de vida, del contador, Ing. residente y maestro de obra, de los cuales, a la fecha, no han recibido información de las mismas, y aclara igual, que dicho personal, son las personas con las que siempre han trabajado y de confianza que han demostrado afinidad a ellos, como integrantes de la comunidad indígena que representa. Solicita que la persona encargada de las hojas de vida, mantenga comunicación más personalizada para poder estar al tanto de las respuestas de las mismas Por otro lado solicita sea clara la fecha total del contrato para poder realizar las vinculaciones laborales y dar orden a los recursos, requiere conocer las actas de inicio del contrato ya que en la plataforma Secop no las pudo visualizar. Reitera necesidad de reunión presencial para debatir los planes de obra. La Ing. Valeria realiza respuesta al sr. Milton con respecto a los tiempos de obra los cuales, de ser necesario, se realizarían prórrogas. Las vinculaciones del personal, se le aclara deben ser contrataciones bajo la modalidad de obra labor específicamente para el Residente quien debe estar desde el inicio hasta el cierre, o terminación de obra, con unos recursos para tres meses y medio (3,5 meses). Y los pasos a seguir es, tener aprobación de diseño, aprobación de hojas de vida, inicio de actividades de planes de compra, sólo ahí se le realiza la vinculación contractual al Ing Residente, no antes; ante la insistencia del sr Miltón, sobre la proyección del tiempo de obra, la Ing. Valeria responde que aproximadamente tres meses y medio comprendido en dos (2) meses de obra y mes y medio dividido en parte de inicio y parte de cierre de obra.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día /Mes / Año)

RESPONSABLES

Enviar oficio de respuesta con aprobados a las hojas de vidas enviadas y las recomendaciones para aquellos perfiles que no cumplen los requisitos establecidos en pliegos.
Revisar puntualmente las solicitudes de reposición de la vereda Carrizales con los soportes del Contador, el Sr. David Moncayo y realizar nuevamente validación, terminada la reunión e informar de manera informal vía WhatsApp

lunes, 28 de abril de 2025

Maria Bautista

Revisar puntualmente el avance de revisión de los diseños enviados por parte del sr Luis González y dar a conocer si se tienen observaciones o si por el contrario de da aprobación definitiva

Establecer nueva reunión con los contadores de las diferentes juntas y el contador de la interventoría para establecer procesos de pagos

Se evaluará las fechas de las visitas por parte de INVIAS para programar reuniones con las veredas interesadas



FECHA PROXIMA REUNION

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO	REPRESENTANTE	JAC VEREDA SOTO	Marly Leslie Noscue Campo
ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA	REPRESENTANTE	JAC LA HEROICA	
ROCIO CAICEDO DIAZ	REPRESENTANTE	JAC ASNAZU	Rocio Caicedo Diaz
FRANCY ELENA OCORO VIAFARA	REPRESENTANTE	JAC LA TOMA	Francy El Ocoro
ANYELA MARIA VIAFARA CHARA	REPRESENTANTE	JAC LA PAILA	Anyela Maria Viafara Chara
WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE	JAC NUEVO AMANECER	Wilver Eduardo Luna Rodriguez
PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ	REPRESENTANTE	JAC CARRIZALES	Pedro F. Munoz
MONICA YULIETH AMBUILA ARARAT	REPRESENTANTE	JAC EL CHAMIZO	
WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA	REPRESENTANTE	JAC LA MARTICA	Wilson Danilo Mosquera Bonilla
JHON ALVARO GRISALES MESA	REPRESENTANTE	JAC TACUEYO	
JHON FRANQUI UL MESTIZO	REPRESENTANTE	JAC VDA LA PILA	Jhon Franqui Ul Mestizo
JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA	REPRESENTANTE	JAC VDA LA UNIÓN	Juan Ulabarry Mina
RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE	REPRESENTANTE	JAC MONTERREDONDO - JAMBALÓ	
MARDEN CRUZ VARGAS	REPRESENTANTE	JAC VDA EL SOCORRO - VALLE HONDOS	Marden Cruz Vargas
MILTON VLADIMIR GUAUÑA	REPRESENTANTE	JAC VDA CHAPIO PAGUIMBIO	
JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO	REPRESENTANTE	RI DE LAME	
MANUEL PEREZ PINTO	COORDINADOR TECNICO	INTERVENTORIA	
GERMAN PEREZ PINTO	RESIDENTE	INTERVENTORIA	
JOHAN SUAREZ	COORDINADOR SST	INTERVENTORIA	
JAZMINE NARVAEZ	SOCIAL	INTERVENTORIA	
VALERIA PIAMBA	INGENIERA APOYO	INTERVENTORIA	Valeria Piamba
MARIA BAUTISTA	TÉCNICO AUXILIAR	INTERVENTORIA	Maria A. Bautista

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

FECHA 24/04/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNION


Revisar el avance de: Desarrollo de la obra, Planes de compra, Presupuesto, Programaciones y varios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Desarrollo de la obra
Planes de compra
Presupuesto
Programaciones
Hojas de vida Profesionales: Residentes, Contadores y Maestros de Obra.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión con la participación de los RL de las JAC y/o Resguardos del Grupo 2 y de la interventoría, se hace llamado a lista y se captura la imagen de los participantes de la reunión.

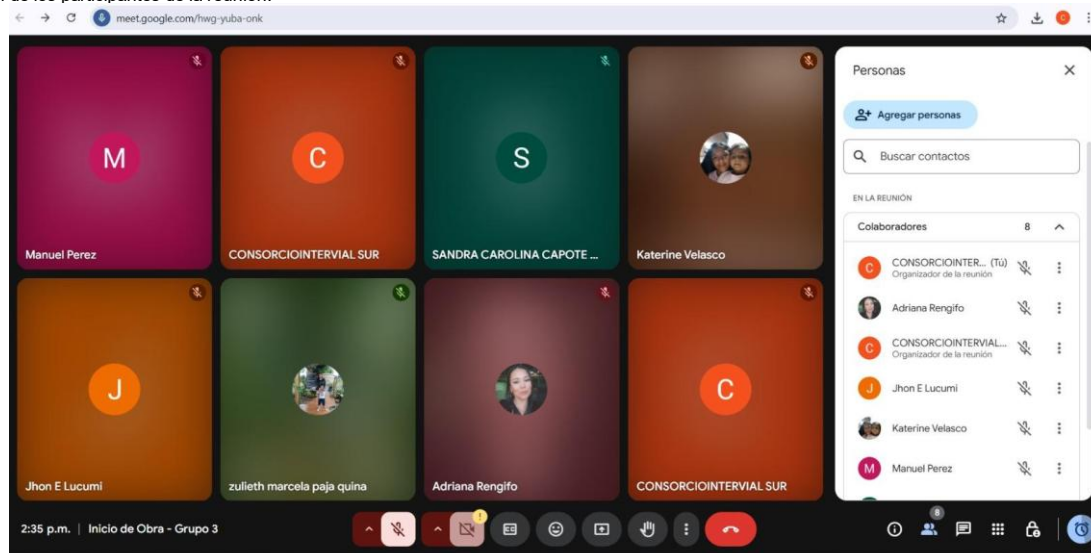

Es importante conocer e identificar los actores comunitarios involucrados del área de influencia del proyecto y el personal contratista encargado de la realización del mismo y la entrega de avances realizados en los estudios definitivos en compañía del Ingeniero designado por parte de la comunidad para establecer los alcances finales con el presupuesto y diseño final y proceder con los planes de compra, asimismo agradecemos confirmación de la entrega de los diseños geométricos y la elaboración de los documentos para el pago de las pólizas.

Se confirma el resguardo de Yanuiva se conecta en compañía del contador. La interventoría resalta la importancia en el envío de las hojas de vida sea

Se continúa en resguardo de Yaquiva se conecta en compañía del contador. La interventoría resalta la importancia en el envío de los pagos de JAC, sea realizado a través de los correos oficiales de las JAC y no por correos personales pues no se puede tener control del personal que las JAC hayan designado y no podrán ser tenido en cuenta.

La interventoría resalta la importancia en el envío de los diseños geométricos para el desembolso y pago de las pólizas. En caso que las JAC hayan realizado estos pagos, se solicita el envío de los comprobantes para hacer el reembolso de los valores. Toma la palabra la representante del resguardo de Yaquiva, comenta que dichos diseños fueron enviados en el año 2024 y la interventoría a la fecha no ha dado respuesta de los mismos. Al resguardo fueron allegados los estudios y diseños para placa huella y en esta comunidad se va a ejecutar son las alcantarillas, por tal reporta que se ha solicitado continuamente estudios y diseños para alcantarilla sin tener información al respecto, la interventoría aclara que dicha topografía fue entregada por INVIAS, en donde se demarcan las alcantarillas y el trabajo que deben mandar a diseñar el resguardo, es el diseño hidráulico y el plante de obra para tener claras las cantidades finales de obra.

La representante del resguardo consulta si del dinero del diseño se va a descontar de los APU's o es un dinero aparte. La interventoría responde que ese dinero efectivamente está establecido en los APU's del convenio, es decir \$2'000.000 mtc (dos millones de pesos). La Representante del Resguardo entiende que de esa cantidad se ejecutará los estudios y diseños en el componente hidráulico y para planos de obra. Igualmente comenta que el Resguardo ya realizó el pago de la póliza, en donde se les fue enviado dos formatos para diligenciar; sin embargo, se tiene inquietud, si para el reembolso del pago, solo se debe realizar una cuenta de cobro y no tomar en cuenta los formatos anteriormente mencionados. La interventoría aclara que es importante que se adjunten los formatos, ya que se de deben realizar radicación en le banco como soporte de pago, solicita que los diligencien a computador, se firmen a mano, se scaneen y alleguen a la administración de la interventoría, junto con el RUT, cuenta de cobro, la cédula de la persona y la certificación bancaria donde se debe realizar el reembolso y soporte de pago realizado. Pregunta nuevamente qué hacia quien va dirigida la cuenta de cobro, teniendo en cuenta que el resguardo fue el que realizó el pago. La interventoría aclara que el representante legal del resguardo debe dirigir al mismo resguardo el cobro, anexando el RUT, la cámara de representante. Los dos formatos y la cuenta bancaria del resguardo y no la del convenio. Se aclara que a los profesionales se les debe realizar vinculación como ODS Orden De Servicio, pero al personal de mano de Obra, se les debe realizar vinculación laboral como Obra Labor (por nómina), se recalca la importancia de solicitar al personal de obra certificado bancario, aplica, Daviplata, Nequi que esté a nombre de ellos. En el caso de no contar con cuenta a nombre propio, deben realizar un documento autenticado, donde autoricen el pago del salario a otra persona.

En una segunda intervención, solicitan información sobre las fechas de entrega de los reportes financieros. La interventoría manifiesta que los datos en caso de duda pueden dirigirse al grupo de WhatsApp o a los teléfonos de la Ing. María. Es importante agilizar la vinculación del Residente de obra para establecer las cantidades de obra y generar aprobación y posterior vinculación del personal de obra. Se recuerda que en cada correo de los convenios se encuentra la información de los valores máximos permitidos para los pagos de los honorarios y salarios.

La interventoría manifiesta la necesidad de la siguiente semana iniciar ya con actividades de obra, personal aprobado, cotizaciones etre otros. Asimismo se indica que ya fue enviado a cada correo de las juntas información sobre los valores maximos para los pagos de trabajadores, material y/o publicidad.

Interviene la representante del resguardo indígena de canoas, solicitando correo del área financiera para precisar ciertos procedimientos; la interventoría responde que es el mismo canal consorciointervalsur@gmail.com siendo el único correo oficial de la interventoría. Se recalca la importancia de la vinculación del residente de obra para iniciar las aprobaciones de los planes de obra, si no se cuenta con el personal, el día 05 de mayo se enviará oficio manifiesto del primer incumplimiento. Se recuerda que tres (3) incumplimientos dará cabalidad a cancelación por parte de INVIAS.

La representante del resguardo Yaquiva, solicita ampliación de tiempo para los diseños ya que en el encuentro anterior, los temas se trataron de manera muy general y hubo mala comunicación respecto a la responsabilidad de la entrega en los mismos, el resguardo estaba seguro que dichos diseños los enviaba la Interventoría. La interventoría da plazo máximo del viernes 25 de abril con el compromiso de entregar las hojas de vida del personal a vincular, el adelanto de las cotizaciones de materiales e insumos.

Se recuerda el número de contacto de la Ing. María para inquietudes, igualmente se recalca que en el grupo WhatsApp se pueden dar gestiones a inquietudes administrativas, se consulta si una contadora puede apoyar tres veredas dadas las cercanías y la ausencia de profesionales en la zona. Se da finalizada la reunión

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día /Mes / Año)

RESPONSABLES

El resguardo Yaquiva se compromete a enviar las hojas de vida de Residente, Contador y Maestro. Igualmente para la siguiente semana se enviaría estudio, diseño y cotizaciones.

viernes, 25 de abril de 2025

RI YAQUIVA















FECHA PRÓXIMA REUNION

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YAIR CABRERA LARRAHONDO	REPRESENTANTE	JAC QUINTERO	
PEDRO JESUS CASTAÑO URBANO	REPRESENTANTE	JAC BELALCAZAR	
JOSE NEMESIO MOSQUERA	REPRESENTANTE	JAC VDA MONTERREDONDO - CAJIBIO	
LEIDY TATIANA PACHO CAMPO	REPRESENTANTE	RI CXAYU'CE FXIW	
MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ	REPRESENTANTE	RI CHIMBORAZO	
ROBINSON CAMPO	REPRESENTANTE	RI CANOAS	
MARCELINO DICUE VOLVERAS	REPRESENTANTE	RI YAQUIVA	
FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO	REPRESENTANTE	RI LAS MERCEDES	
HAROL OVIEDO GOLONDRINO	REPRESENTANTE	RI PANIQUITA	
JUAN CARLOS YATACUE ORTEGA	REPRESENTANTE	RI PAEZ DE CORINTO	
MANUEL PEREZ PINTO	COORDINADOR TECNICO	INTERVENTORIA	
GERMAN PEREZ PINTO	RESIDENTE	INTERVENTORIA	
JOHAN SUAREZ	COORDINADOR SST	INTERVENTORIA	
JAZMINE NARVAEZ	SOCIAL	INTERVENTORIA	
VALERIA PIAMBA	INGENIERA APOYO	INTERVENTORIA	
MARIA BAUTISTA	TÉCNICO AUXILIAR	INTERVENTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	3649-2024
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NIT	901.866.224-8
Consortio conformado por:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. con Nit. 804002667-8, con un porcentaje de participación 50% y, por ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. con NIT. 901264150-8, con un porcentaje de participación del 50%
Representante Legal	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
Valor del contrato de interventoría	\$ 1,522,205,504.00
Suscripción convenio	12/09/2024
Fecha orden de inicio	28/11/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2024
Prorroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 31/05/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/06/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación final	16 de julio de 2025
Supervisor	Jorge Alonso Ortega Rojas

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el mes de abril, el equipo de interventoría realizó un acompañamiento técnico, administrativo y social a las Juntas de Acción Comunal. A continuación, se describen las actividades adelantadas, clasificadas según el estado de los convenios.

Grupo 2

En esta etapa, la interventoría centró sus esfuerzos en la asesoría y orientación a las juntas que apenas inician el proceso contractual. Las principales acciones ejecutadas fueron:

- Revisión técnica de los estudios previos elaborados por las JAC y emisión de observaciones y recomendaciones.
- Acompañamiento en la búsqueda y validación de personal técnico, especialmente en veredas de difícil acceso donde las JAC manifestaron dificultades para conseguir profesionales disponibles.
- Revisión de hojas de vida remitidas y elaboración de oficios de observaciones. Algunas hojas de vida se encuentran aún en proceso de validación, mientras que otras fueron aprobadas y notificadas a las JAC.
- Se remitió la pieza comunicativa oficial para facilitar la realización de las socializaciones iniciales en las comunidades.
- Se realizaron comités de seguimiento individuales con cada OAC, resolviendo inquietudes y haciendo énfasis en los documentos necesarios para avanzar hacia la fase de ejecución.
- En varios convenios de este grupo no se recibió información sobre personal técnico; en estos casos se reiteró vía oficio la solicitud de las hojas de vida.

Grupo 1

Dada la complejidad de las gestiones requeridas para estos convenios y el bajo nivel de experiencia de las JAC, la interventoría asumió un rol operativo fundamental en diversos procesos:

- Elaboración completa de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2 de los convenios con vencimiento inicial al 30 de abril de 2025. Donde se realizó la recopilación de antecedentes disciplinarios y fiscales de las JAC y de sus representantes legales, la elaboración de los respectivos MEPI y aval de la interventoría.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
Versión No.: 001			
Fecha de realización: Mayo 10 de 2025			

- Evaluación técnica y aprobación de hojas de vida del personal profesional propuesto. En algunos casos, se observó duplicidad de profesionales, como ingenieros residentes designados para más de un convenio, situación incompatible con la dedicación exclusiva que exige el programa. En estos casos, se elaboraron oficios a cada OAC indicando la necesidad de designar personal distinto.
- En otros casos, se identificó la postulación de varios profesionales para un mismo cargo, por lo que se solicitó a las JAC definir a quién seleccionarán finalmente. Mientras tanto, se suspendió el trámite de aprobación.
- Se llevó a cabo el primer comité operativo con participación del personal técnico de las JAC. Este espacio se enfocó en brindar asesoría a los profesionales, quienes en su mayoría no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. Se explicó el contenido requerido en el plan de compras, el procedimiento para su presentación y se resolvieron inquietudes sobre ejecución y reporte documental. No se tomaron decisiones sobre compras en esta sesión.
- Se programó un segundo comité operativo, como continuidad del proceso, para iniciar con el plan de compras No. 1 y poder dar inicio a la obra.

Actividades generales del mes (grupos 1 y 2)

- Se elaboró y actualizó semanalmente la matriz de seguimiento, incluyendo el estado de avance de cada convenio, la aprobación de personal técnico y las fechas clave del cronograma. Esta matriz fue enviada todos los jueves al equipo del INVIAS, cumpliendo con los lineamientos del contrato.
- Se participó en todas las reuniones de seguimiento convocadas por INVIAS, presentando un informe detallado del estado de los convenios, así como los principales retos encontrados en la gestión de las JAC.
- Se brindó acompañamiento permanente vía WhatsApp y correo electrónico al supervisor del contrato y al equipo del INVIAS, especialmente en lo relacionado con la actualización del SECOP II y entrega de documentos contractuales.
- Se elaboró y entregó un informe ejecutivo a INVIAS, que sintetiza el estado de avance de cada convenio con corte al mes de abril.
- Se realizaron las socializaciones iniciales, en las cuales se explicó a la comunidad el componente técnico del proyecto, incluyendo el alcance de la obra, el presupuesto detallado, así como los aspectos sociales y ambientales.
- Se mantiene comunicación constante con la entidad financiera con el fin de monitorear el estado de los convenios que se encontraban suspendidos por falta de desembolso. Como resultado de esta gestión, al cierre del presente periodo se informa que siete

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		No. Copias Impresas: 1	
			Versión No.: 001	
	Fecha de realización: Mayo 10 de 2025			

convenios han recibido los recursos correspondientes, lo cual permitirá avanzar en los trámites para su reanudación y prorroga.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	VALOR
CALOTO	3654-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO	\$ 201,092,636
PÁEZ	3943-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR	\$ 202,263,678
CAJIBÍO	4085-2024	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW	\$ 202,079,995
MORALES	4097-2024	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO	\$ 202,904,727
INZÁ	4173-2024	RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA	\$ 216,310,784
CALDONO	4185-2024	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES	\$ 201,091,017
TOTORÓ	4324-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA	\$ 207,441,988

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe por parte del Director de interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría y alistamiento, profesional financiero, profesional social y técnico administrativo, los cuales están anexos en el soporte del acta del presente periodo.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para el presente informe

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para el presente informe

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA


No aplica para el presente informe

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

 Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	30/04/2025 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3649-2024		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																				
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.																																																								
FECHA DE INICIO: 28/11/2024																																																								
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 152,220,550.40</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>\$ 255,832,858.00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 304,441,100.80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 456,661,651.20</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			12	9	2024	1	7	2025	12	9	2024	1	7	2025	12	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
12	9	2024	1	7	2025																																																			
12	9	2024	1	7	2025																																																			
12	9	2024	31	12	2027																																																			
31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/10/2024																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 152,220,550.40</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>\$ 255,832,858.00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 304,441,100.80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 456,661,651.20</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>28</td><td>11</td><td>2024</td><td>16</td><td>9</td><td>2025</td></tr><tr><td>28</td><td>11</td><td>2024</td><td>16</td><td>9</td><td>2025</td></tr><tr><td>28</td><td>11</td><td>2024</td><td>17</td><td>3</td><td>2028</td></tr><tr><td>18</td><td>3</td><td>2025</td><td>18</td><td>3</td><td>2030</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			28	11	2024	16	9	2025	28	11	2024	16	9	2025	28	11	2024	17	3	2028	18	3	2025	18	3	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
28	11	2024	16	9	2025																																																			
28	11	2024	16	9	2025																																																			
28	11	2024	17	3	2028																																																			
18	3	2025	18	3	2030																																																			
MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ			JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ																																																					

 Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 31/12/2025

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	9	2024	16	1	2026
12	9	2024	16	1	2026
12	9	2024	16	7	2028
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: pendiente por aprobar

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Firma 

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica.

6.6.2 PLAN DE CARGAS

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

[illegible]

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Mayo 10 de 2025</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes de abril, la interventoría ha mantenido un acompañamiento constante y técnico a cada una de las OAC, brindando orientación personalizada sobre los procedimientos administrativos, contractuales y técnicos, con el objetivo de facilitar el avance de los convenios.
- A pesar del acompañamiento brindado, es importante resaltar que el avance de los convenios no depende únicamente del trabajo realizado por la interventoría. El desarrollo efectivo de los mismos es una responsabilidad compartida, en la cual el compromiso, diligencia y cumplimiento de las OAC frente a la entrega oportuna de la documentación requerida resulta determinante para dar continuidad a los procesos establecidos.
- Se han adelantado socializaciones iniciales, revisión y aprobación del personal técnico, orientación en la elaboración de los estudios previos y asesorías permanentes sobre la presentación de los Planes de Compra, evidenciando el esfuerzo de la interventoría por mitigar las limitaciones técnicas o de experiencia que presentan algunas organizaciones comunales.
- Se identifican dificultades asociadas a la disponibilidad de personal técnico en zonas rurales apartadas, así como demoras en la entrega de documentación completa por parte de algunas OAC. No obstante, se ha actuado de manera proactiva para resolver estos inconvenientes mediante oficios, reuniones virtuales y seguimiento constante.
- Se espera que en el próximo periodo se logre la aprobación del 100% del personal técnico requerido para cada convenio, lo cual permitirá avanzar hacia la presentación y validación de los Planes de Compra No. 1, y de esta manera, dar inicio a la fase de ejecución de obra.
- Finalmente, la interventoría continuará promoviendo espacios de diálogo, asistencia técnica y seguimiento, con el fin de fortalecer las capacidades de las Juntas de Acción Comunal, garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y contribuir al desarrollo efectivo de las obras proyectadas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

8.1.1 ENVIADA

 CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR										
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
069	7/4/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Marco Antonio Solano Vargas	X			7/4/2024	Solicitud de retiro del amparo del buen manejo del anticipo de la póliza No. 96-44-101191911.	ARCHIVO DIGITAL
071	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	Maira Yuliana Ortiz Gonzalez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Maira Yuliana Ortiz Gonzalez	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
072	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	Rocio Caicedo Díaz	Marco Antonio Solano Vargas	X		Rocio Caicedo Díaz	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
073	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	Pedro Ferney Muñoz Perez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Pedro Ferney Muñoz Perez	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
074	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	Eyder Taquinas Rivera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Eyder Taquinas Rivera	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
075	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA	Banderley Medina Pazu	Marco Antonio Solano Vargas	X		Banderley Medina Pazu	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
076	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	Wilson Danilo Mosquera Bonilla	Marco Antonio Solano Vargas	X		Wilson Danilo Mosquera Bonilla	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

077	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	Francy Elena Ocoro Viafara	Marco Antonio Solano Vargas	X		Francy Elena Ocoro Viafara	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
078	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TURBINA	Yensin Consuelo Ramos	Marco Antonio Solano Vargas	X		Yensin Consuelo Ramos	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
079	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES	Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	Marco Antonio Solano Vargas	X		Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
080	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO (Jambalo)	Ruben Elias Pechene	Marco Antonio Solano Vargas	X		Ruben Elias Pechene	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
081	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECEER	Wilver Eduardo Luna Rodriguez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Wilver Eduardo Luna Rodriguez	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
082	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIO NEGRO – GARCÍA ARRIBA	Rosmira Zuleta Trochez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Rosmira Zuleta Trochez	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
083	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TREBOL UNO	Manuel Bolaños	Marco Antonio Solano Vargas	X		Manuel Bolaños	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
084	28/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS	Carmelina Ipia Ramos	Marco Antonio Solano Vargas	X		Carmelina Ipia Ramos	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
085	28/4/2025	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW	Leidy Tatiana Pacho Campo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Leidy Tatiana Pacho Campo	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
086	28/4/2025	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES	Flora Aydee Chocue Gueño	Marco Antonio Solano Vargas	X		Flora Aydee Chocue Gueño	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
087	28/4/2025	RESGUARDO INDIGENA YAQUIVA	Marcelino Dicue	Marco Antonio Solano Vargas	X		Marcelino Dicue	28/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
088	29/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	Rocio Caicedo Díaz	Marco Antonio Solano Vargas	X		Rocio Caicedo Díaz	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
089	29/4/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CARAQUEÑO	Fabian Bonilla Rivera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Fabian Bonilla Rivera	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
090	29/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	Pedro Ferney Muñoz Perez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Pedro Ferney Muñoz Perez	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Mayo 10 de 2025	

091	29/4/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	Milton Vladimir Guauña Calapsu	Marco Antonio Solano Vargas	X		Milton Vladimir Guauña Calapsu	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
092	29/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	Eliasib Quiguapumbo Guejia	Marco Antonio Solano Vargas	X		Eliasib Quiguapumbo Guejia	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
093	29/4/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO (Jambalo)	Ruben Elias Pechene	Marco Antonio Solano Vargas	X		Ruben Elias Pechene	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
094	29/4/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL TACUEYO	Ruben Elias Pechene	Marco Antonio Solano Vargas	X		Ruben Elias Pechene	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
095	29/4/2025	RESGUARDO INDIGENA DE CHIMBORAZO	Maria Ruth Cruces Sanchez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Maria Ruth Cruces Sanchez	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
096	29/4/2025	RESGUARDO INDIGENA CANOAS	Robinson Campo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Robinson Campo	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
097	29/4/2025	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW	Leidy Tatiana Pacho Campo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Leidy Tatiana Pacho Campo	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
098	29/4/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO – VALLES HONDOS	Marden Cruz Vargas	Marco Antonio Solano Vargas	X		Marden Cruz Vargas	29/4/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------
