



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

Código: F-GDC-28

Versión: 02

Fecha: 03/11/2023


No. CONTRATO:		No. CONVENIO:	1016 de 2021	No. INFORME:	38
OBJETO DEL CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.				
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANETA				
NIT O CEDULA:		SUPERVISOR:	SANTIAGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		
VALOR:	\$ 60.850.969.859	VALOR ADICIONAL:	\$28.764.298.457	PERIODO EVALUADO	
PLAZO:	24 MESES	PLAZO ADICIONAL:	24 meses	DE:	HASTA:
FECHA DE INICIO:	2025-12-30	FECHA REINICIO:	N/A	01 DE ENERO	31 DE ENERO
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	DEPENDENCIA INTERESADA:	SUBDIRECION DE PROYECTOS		

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

- Se participa de los comités programados por obra e interventoría.
- Se realiza revisión a la ejecución y seguimiento a la programación de actividades presentada.
- Se realiza control de ejecución de obra y control a el acta de pago.

Nombre de tarea	% de fisico ejecutado incluyendo adición	Inversion Financiera por ITEM
PRELIMINARES	5,62%	\$ 3.508.448.065,81
RETIROS Y DEMOLICIONES	1,62%	\$ 1.014.107.072,27
MOVIMIENTOS DE TIERRA	12,49%	\$ 7.803.563.293,65
ELEMENTOS EN CONCRETO	2,59%	\$ 1.615.198.263,60
ACERO DE REFUERZO	3,13%	\$ 1.957.607.798,78
SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL	0,44%	\$ 271.803.189,43
URBANISMO	2,32%	\$ 1.450.241.845,19
VÍAS	7,40%	\$ 4.622.528.724,99
PAISAJISMO	1,37%	\$ 852.899.663,37
SEMAFORIZACIÓN	2,72%	\$ 1.697.676.472,80
MUROS DE CONTENCIÓN	1,53%	\$ 952.873.250,29
PUENTES	6,68%	\$ 4.176.396.593,38
ARQUEOLOGÍA	3,16%	\$ 1.972.603.836,82
REDES HIDRÁULICAS	8,92%	\$ 5.575.401.975,28
REDES DE GAS	0,60%	\$ 373.026.446,18
INSTALACIONES ELETRICAS	11,88%	\$ 7.420.539.488,78
AMPLIACIÓN URBANA PARQUE	0,84%	\$ 526.111.001,14
DEMOLICIONES Y FACHADAS	3,44%	\$ 2.149.432.118,68
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO	0,01%	\$ 6.248.349,18
OBRAS EXTRAS	2,27%	\$ 1.419.000.099,28
	79,01%	
VALOR EJECUTADO		\$ 49.358.714.298
VALOR EJECUTADO DIRECTO + PMT		\$ 65.959.053.639

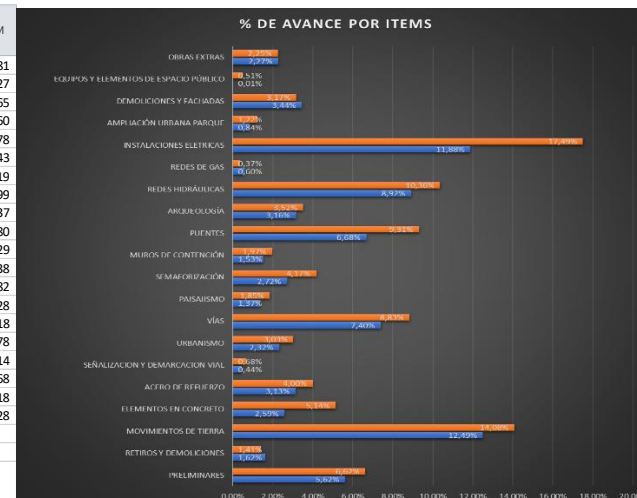

VIGILANT

DIRECCIÓN PRINCIPAL: CALLE 12 Nº 84-38 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ: 011-2600 0000 Y EN LOS DEMÁS CELULAR 312 2600 0000. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS VIA TELEFÓNICA, POR E-MAIL: contacto@telepasa.gov.co, SUPLENTE@telepasa.gov.co O EN LA OFICINA DE FIDELITY DE CONTACTO DEL CONSUMIDOR FRANCISCO TELLEZ (3) 8488 11 8768
atencion.cliente@telepasa.gov.co

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 5 DE NO. 847, BOGOTÁ, LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: ENERGÍA SÍMBOL, A NUESTRO SERVIDOR SÍMBOL Y NUESTRO SERVIDOR CELULAR Y NOS PRESENTA SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS VIA TELEFÓNICA, PERSONA WEB, COMANDOS@energiasimbol.com.co, SUPPORT@energiasimbol.com.co o ENVÍANOS EL DIFUNDIDO DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELÉFONO: (01) 49991111 / EMAIL: informacion@energiasimbol.com.co

2. ASPECTOS JURIDICOS.

GESTIÓN DE PREDIOS:

AVANCE FASE II:

Sigue pendiente la entrega del siguiente predio por parte de la entidad contratante y el Municipio de Sabaneta:
PREDIO ID 30 I: Continúa proceso de expropiación y/o jurídicos.

AVANCE FASE III:

La entidad contratante y la secretaria de Infraestructura continúan con la gestión de negociación, compra y legalización del resto de los predios que se requieren para la construcción de la ampliación de la vía carrera 43ª. A la fecha se hace entrega por parte de la secretaria de Infraestructura a la interventoría y a su vez al contratista de obra los siguientes predios

ID	UBICACIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
14H	Edificio Cristal 401	16/06/2025	Carrera 43A # 54S-74	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
20B	Edificio Carnes 2000 201	16/06/2025	Carrera 43A 56S-18	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
14G	Edificio Cristal 302	27/06/2025	Carrera 43A # 54S-74	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
14J	Edificio Cristal 501	27/06/2025	Carrera 43A # 54S-74	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
1	Local 1 frente CES	1/07/2025	Carrera 43A 53C S-12	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
1	Local 3 frente CES	1/07/2025	Carrera 43A 53C S-12	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
15	Panadería	1/07/2025	Carrera 43A # 54S-84	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria

ID	UBICACIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
19	Edificio Chachas local 101, 201, 202, 401 y 502	11/07/2025	Carrera 43A 56S-04	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
13	Licorera	22/07/2025	Carrera 43A 54S-74	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
11	Edificio Fachada ladrillo catalán	31/07/2025	Carrera 43A 54S-68	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
12	Edificio Fachada ladrillo catalán - fondo	31/07/2025	Carrera 43A 54S-68	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
6	Restaurante Sancocho en leña	6/09/2025	Carrera 43A 54S-30 Carrera 43A 54S-24	Entregado por EDU - Abogado
	Caseta Filam	22/09/2025	Carrera 43A 57S-41	Entregado por EDU a Interventoria
20A	Edificio Carnes 2000 LOCAL PRIMER PISO	25/09/2025	Carrera 43A 56S-12	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
21	Edificio administrativo CARNES 2000	25/09/2025	Carrera 43A 56S-14	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria (Demolición total de la edificación, compra parcial del predio)
23	Vivienda (Floristeria)	14/11/2025	Carrera 43A 56S-60 / Carrera 43A 56S-58	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria
22	Vivienda	10/12/2025	Carrera 43A 56S-54 / Carrera 43A 56S-46	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria (Demolición parcial del predio)
10	Bodega canecas	17/12/2025	Carrera 43A 54S-66	Entregado por Secretaria de Infraestructura a Interventoria (Demolición total del predio)

3. ASPECTOS TECNICOS.

Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la propuesta presentada, se hace bajo el estricto cumplimiento de las Normas y parámetros de ley.

- Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NTC, (Norma técnica colombiana).
- Normas para la intervención de infraestructura vial.
- Todas las normas citadas en los diseños y en el presupuesto.
- Especificaciones técnicas de construcción de EPM.
- Manual de Espacio Público de Medellín.

RELACION DE RETIROS POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO DE SABANETA PARA PAGOS DE ACTAS DE OBRA E INTERVENTORIA CONVENIO 1016 DE 2021(Ampliación Cra 43 A).			
VALOR INICIAL	\$ 57.850.969.859		
VALOR ADICION	\$ 28.764.298.457		
TOTAL VALOR CONVENIO	\$ 86.615.268.316		
	FECHA	VALOR	SALDO POR EJECUTAR
ANTICIPO 01 EGRESO No.23820	26/12/2022	\$ 8.046.327.614	\$ 49.804.642.245
ANTICIPO 02 EGRESO No.9615	6/06/2023	\$ 8.046.327.614	\$ 41.758.314.631
RETIRO 01 EGRESO No.12182	10/07/2023	\$ 2.539.287.478	\$ 39.219.027.153
RETIRO 02 EGRESO No.14702	15/08/2023	\$ 3.120.446.671	\$ 36.098.580.482
RETIRO 03 EGRESO No.26634	27/12/2023	\$ 4.232.688.761	\$ 31.865.891.721
RETIRO 04 EGRESO No.4004	18/04/2024	\$ 6.657.450.235	\$ 25.208.441.486
RETIRO 05 EGRESO No.8126	27/06/2024	\$ 4.196.389.384	\$ 21.012.052.102
RETIRO 06 EGRESO No.10943	23/08/2024	\$ 4.100.600.673	\$ 16.911.451.429
RETIRO 07 EGRESO No.13794	3/10/2024	\$ 4.300.855.311	12.610.596.118,00
RETIRO 08 EGRESO No.17442	5/12/2024	\$ 4.287.794.401	8.322.801.717,00
OTRO SI NRO 1 (ADICION N°01)			28.764.298.457,00
RETIRO 07 EGRESO No.6146	6/05/2025	\$ 5.345.750.336	31.741.349.838,00
RETIRO 08 EGRESO No.9307	3/07/2025	\$ 2.193.379.303	29.547.970.535,00
RETIRO 09 EGRESOS No 13918-13919-13920	12/09/2025	\$ 2.478.103.625	27.069.866.910,00
RETIRO 10 EGRESO No 17836	6/11/2025	\$ 2.937.857.920	24.132.008.990,00
RETIRO 11 INTERVENTORIA NRO 18124	20/11/2025	\$ 231.260.680	23.900.748.310,00
RETIRO 12 INTERVENTORIA NRO 20360	11/12/2025	\$ 502.130.227	23.398.618.083,00
RETIRO 13 DE DEOBRA NRO E NRO 20361	11/12/2025	\$ 3.023.257.782	20.375.360.301,00
SALDO EN EL IDEA A 03/MARZO/2026			
CONV 1016 AMPLIACION CRA 43A N° de Cuenta: 00000000010012107 Cuenta con Supervisión Disponible: \$ 20,307,130,371			

5. AVANCES FISICOS DEL PERIODO CONTRATO.

GESTIÓN TÉCNICA:

Actividades de obra que fueron ejecutadas en el período entre el el 18 de diciembre al 17 de enero de 2026:

- Excavación mecánica, suministro, transporte y colocación de base granular para conformar la estructura de vía en la calzada sentido sur - norte, sobre la Cra. 43ª abscisas k0+640 - k0+655 entre Cl. 58 sur y Predio ID 22 casa fiscal.
- Excavación mecánica, suministro, transporte y colocación de base granular para conformar la estructura de vía en la calzada sentido sur – norte, abscisas k0+520 - k0+565 entre la Cl. 55 sur y la Cl. 56 sur.
- Conformación de estructura para andén, construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual en el muro de contención de Villas del Carmen.
- Instalación de marcas viales con material plástico en frío sobre la Cra. 43ª con Cl. 60 sur. Sector de espacio optimo y MIC.
- Construcción de ajuste en muro de contención, en el costado oriental de la Cra. 43ª en el sector de Villas del Carmen.
- Construcción de muro de contención en separador central – Retorno, de la calzada sentido sur – norte, entre la Cl. 55 sur y la Cl. 56 sur.
- Reconstrucción de fachada de los predios existentes sobre la Cl. 56 sur, con la demolición de los predios ID 14, ID 15, ID 16 e ID 18 sobre la Cra. 43ª.
- Se continua con la demolición de los predios ID 10, ID 19, ID 20 e ID 21, en el costado oriental de la Cra. 43ª entre la Calle 55 sur y la Calle 58 sur. Retiro de perfilería metálica, puertas, ventanas y todos los elementos recuperables para ser entregados a la entidad contratante o donde los indique la interventoría.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS:

- Construcción de cajas e instalación de tubería para la red de media tensión y telecomunicación en el costado oriental de la Cra. 43ª entre la Cl. 55 sur y la Cl. 56 sur.
- Construcción de cámara para la red de telecomunicación en el costado oriental de la Cra. 43ª con Cl. 56 sur.

Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a al ajuste programación de obra basado en el nuevo plazo contractual y a la adición presupuestal, el Contratista para el período comprendido entre el 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 99.39 % y a la fecha lleva el 89.5% de ejecutado, presentando un atraso.



6. Socio ambiental.

Ambiental:

- Traslado de los contenedores, tubería de grandes dimensiones y acopios de sustancias químicas y peligrosas, que se ubicaban al costado sur de la iglesia del sector Villa del Carmen, es de anotar que la reubicación de estos elementos se dispondrá en el lote donde se encontraba el restaurante mar y luna.
- Mantenimiento de la jardinera que se ubica en el separador central de la fase I del proyecto, y las actividades consistieron en el retiro de malezas y la poda de las plantas que allí se encuentran sembradas.

- Verificación del cumplimiento del programa control de emisiones atmosféricas, para lo cual se le solicito al contratista continuar con la humectación de las estructuras de los predios que serán demolidos, al igual que realizar mitigación con agua al momento de realizar cortes de cordones y bordillos.
- Seguimiento a la limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana.
- Limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de vía que actualmente se están interviniendo con obra civil.
- Limpieza de las vías, en especial del tramo que comprende entre la calle 60 y 55, también se constató que se efectuara de manera diaria el retiro de los residuos no aprovechables

6.1. Arqueología

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS SECTOR IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN URBANIZACION VILLAS DEL CARMEN

Monitoreo arqueológico a cajeo para ampliación de la carrera 43 A con la calle 60 sur.

Monitoreo a excavación de apiques para montaje de estructura de parada de buses sector Urbanización Balcones del Campo.

Monitoreo arqueológico a cajeo para ampliación de la carrera 43A sector supermercado D1

Monitoreo a excavación de brecha para instalación de red de telecomunicaciones calle 58 sur

Monitoreo a excavación de caja de media tensión calle 58 sur-Campamento

Monitoreo a brecha para instalación de sumidero calle 58 sur sector Urbanización Villas del Carmen

Monitoreo arqueológico a brecha para empalme de tubería de aguas residuales a MH en la calle 58 sur

Monitoreo a excavación de caja de media tensión calle 58 sur-Campamento

Monitoreo a brecha para instalación de sumidero calle 58 sur sector Urbanización Villas del Carmen

Monitoreo arqueológico a brecha para empalme de tubería de aguas residuales a MH en la calle 58 sur

Monitoreo a excavación del área faltante en la zona verde de la urbanización villas del Carmen para construir muro de contención.

Monitoreo a excavación de brecha de red de tubería de gas en predio ID 23

Monitoreo a excavación de brecha para la construcción del muro de contención en predios demolidos entre la calle 56 sur y Xochimilco.

Monitoreo a excavación de brecha para instalación de red de telecomunicaciones farmacia Pronto Pharma y panadería Sal y dulce

Monitoreo a excavación de brecha para instalación de red de luminarias-sector Panadería Buñuelos Sabaneta

Actividades realizadas en la segunda parte de estructura en adobe macizo (arco)- CES.

En este momento se está terminando de elaborar un documento para ser enviado al ICANH, el cual va a contener la información de la estructura hidráulica completa (primera y segunda fase de excavación), sobre cómo se encuentra en estos momentos, cuáles han sido las afectaciones que presenta, y cuáles son las intervenciones programadas por el Proyecto de la ampliación de la doble calzada

6.2. Social

- El 19 de diciembre de 2025, se realizó notificación a la unidad Serrana, sobre los cambios viales que se tuvieron en la calle 61 sur, por motivo de unas pruebas piloto de la semaforización definitiva en la zona. calificada.
- El 30 de diciembre de 2025, se realizó visita en conjunto con el contratista para definir la ubicación de los bolardos que irían en la zona exterior a la parroquia nuestra señora del Carmen, con el fin de evitar que los carros se suban al andén.
- El 5 de enero, en conjunto con el área técnica y contratista cerrajería, se realizó visita al predio ID 22, para revisar las dificultades que se han tenido con la ejecución de las mismas, y poder buscar entre las partes alternativas de solución.
- El 09 de enero de 2026, en conjunto con área técnica del contratista, se realizó reunión en sitio con uno de los propietarios del predio ID 22 con el objetivo de aclarar el tema de las puertas instaladas en el predio y definir como se realizaría la obra eléctrica en cada uno de los pisos de la vivienda.

- El 15 de enero de 2026, se envió vía correo electrónico, la propuesta de los pasacalles previos al PMT de la calle 57, para la respectiva revisión y corrección por parte de la interventoría del proyecto.
- El consorcio informa que desde el inicio del contrato han sido contratados un total de 24 personas residentes en el municipio de Sabaneta, de las cuales este periodo se cuenta con 11; 4 personas corresponden a mano de obra calificada y 7 personas corresponden a mano de obra no calificada.

Para el periodo evaluado del 18 de diciembre de 2025 al 17 de enero de 2026 de 2025, la residente social del contratista allega registro de una capacitación al personal sobre:

El respeto y cuidado por las pertenencias del otro.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

			
Foto 5: Instalación de Base granular para conformación de vía en sector nitoma	Foto 6: Instalación de Pintura fachadas sector nitoma	Foto 11: Aplicación de pintura plástica en frío en sector nitoma	Foto 12: Adecuación de tubería eléctrica para sistema semafórico
			
Foto 7: Masaje de MH a nivel de reventa distribuye en calle 60 Sur	Foto 8: Masaje de MH a nivel de reventa distribuye en calle 60 Sur	Foto 13: Parcheo en calle 51 sur frente a sector nitoma	Foto 14: Demarcación Horizontal en plásticos en frío en sector nitoma
			
Foto 9: Ajuste de tapas vitrolas en calle 60 sur	Foto 10: Parcheo en calle 51 sur frente a sector nitoma	Foto 15: Demolición de edificio E319	Foto 16: Demolición de edificio E319

			
Foto 17: Señalización Horizontal en acrílico	Foto 18: Señalización Horizontal en acrílico	FOTO 23: Adecuación de zona para peaje de buses sector Avenida	FOTO 24: Demarcación horizontal con pintura acrílica en calle 60 sur
			
FOTO 19: Pintura peaje en sector iglesia	FOTO 20: Demolición de edificio ID 19,20,21	FOTO 25: Instalación de postes sistema semáforo definitivo	FOTO 26: Puesta de bolsa y tapas entre calles 60 y 51 sur
			
FOTO 21: Parcheo con mezcla asfáltica en calle 61 sur	FOTO 22: Demarcación horizontal plástico en tpo en ciclopeda	FOTO 27: Demarcación horizontal con pintura acrílica en calle 60 sur	FOTO 28: Adecuación de sumidero en calle 60 sur

			
FOTO 35. Demolición id 19,20,21	FOTO 36. Demarcación horizontal plástica en fin CHOLULLA	FOTO 41. Instalación de señalización Vertical	FOTO 42. Excavación muro de contención sector Villas del Carmen
			
FOTO 37. Demarcación horizontal plástica en fin CHOLULLA	FOTO 38. Adecuación de acceso en bodega H2O	FOTO 43. Instalación de bacterias	FOTO 44. Canalización red eléctrica sector retorno
			
FOTO 39. Adecuación de acceso en bodega H2O	FOTO 40. Instalación de malla metálica en CHOLULLA sector calle 57 sur	FOTO 45. Construcción de cajas eléctricas sector retorno	FOTO 46. Anclajes para muro de limpieza sector fachadas retorno

			
FOTO 47. Adecuación fachadas sector retorno	FOTO 48. Instalación de señal vertical	FOTO 67. Adecuación de vía para retorno sector calle 55 sur	FOTO 68. Instalación de base granular sector retorno
			
FOTO 49. Adecuación para instalación de panderas	FOTO 50. Ruido de cámaras en sector Uno	FOTO 69. Instalación de base granular sector retorno	FOTO 70. Demolición de losa existente en predio ID 10
			
FOTO 51. Construcción de escalas acceso ID 22	FOTO 52. Construcción muro de contención sector Villas del Carmen	FOTO 71. Demolición de losa existente en predio ID 10	FOTO 72. Adecuación de fachadas sector retorno
			
FOTO 73. Instalación bordes sector retorno	FOTO 74. Adecuación de fachadas sector retorno	FOTO 73. Instalación bordes sector retorno	FOTO 74. Adecuación de fachadas sector retorno



FOTO 53. Instalación de válvula para acueducto ~~apropiado~~ en desvío de tubo villas del Carmen	FOTO 54. Excavación para construcción de cajas eléctricas en sector villas del Carmen
	
FOTO 55. Pintura bolardos sector parroquia Nuestra Señora del Carmen	FOTO 56. Construcción de bolardos sector parroquia Nuestra Señora del Carmen
	
FOTO 57. Construcción de bolardos sector parroquia Nuestra Señora del Carmen	FOTO 58. Instalación de canchales de basura sector calle 60 sur
	
FOTO 59. Instalación de señal vertical sector	FOTO 60. Excavación para instalación de poste acústico en calle 60 sur
	

	
FOTO 61. Instalación de hormigón en cajas eléctricas sector villas del Carmen	FOTO 62. Demolición de edificio ID19.20.21
	
FOTO 63. Demoliciones temporales en sector calles 2000	FOTO 64. Instalación de paradero de buses sector Al Sur
	
FOTO 65. Vacado de losa para paradero de buses sector al sur	FOTO 66. Instalación de paradero de buses sector Al Sur

Nombre del supervisor: **Isabel Cristina Díaz Correa**
Secretaría de Infraestructura Física

Firma supervisor: _____

Profesional contratista Ambiental de apoyo Firma: No aplica para el periodo de presentación del informe Nombre:	Profesional contratista de apoyo gestión social y comunicacional Firma: No aplica para el periodo de presentación del informe Nombre:
---	---

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Convenio No. _____
