

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga - Santander	INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER
--	---

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL No 7

CONTRATO DE OBRA	087-2023 ✓
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE AGOSTO DE 2023 ✓
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$64.028.082.699,20)
ANTICIPO 40%	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA (\$25.611.233.079,68)
VALOR ADICIONAL	SEIS-CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE (\$ 665.389.158,15)
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA N.I.T 900.067.169-9 R.L. CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA C.C. 7.169.545
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSÉ ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 ✓

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** como contratista y avalada por **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** como interventoría, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:



ACTIVIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
1,0	PRELIMINARES		
1,08	DEMOLICIÓN DE MUROS TABIQUE TOLETE COMÚN 10 - 15 CM, INCLUYE RETIRO	M2	18,27
1,11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	53,07
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES		
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO EN TIERRA DURA H=1M, INCLUYE RETIRO	M3	12,92
3,0	ELEMENTOS EN CONCRETO		
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	500,54
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	26,55
4,0	ESTRUCTURA METALICA		
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	29210,71
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	15035,15
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	542,29
5,0	CUBIERTA		
5,01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	619,13
6,0	MAMPOSTERIA		
6,01	MURO EN BLOQUE NO 5	M2	188,76
6-NP65	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	423,98
7,0	INSTALACIONES SANITARIAS		
7,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 2"	ML	53,78
7,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 6"	ML	37,27
7,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVC-L 2"	ML	170,68
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 4"	ML	153,64
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVCS 6"	ML	10,20
7,38	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDAS SANITARIA INODORO PVC 4", INCLUYE BRIDA	UN	18,00
7,39	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC 2"	UN	15,00
7,40	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDAS SANITARIA LAVAPLATOS PVC 2"	UN	1,00
7,42	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA ORINAL PVC 3"	UN	1,00



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
7,51	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA POCETA DE ASEO PVC 2"	UN	1,00
7,52	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN DE 2"	UN	35,00
7,56	CAJA DE INSPECCIÓN 100*100*100CM, LADRILLO TOLETE	UN	3,00
7,59	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*60CM, LADRILLO TOLETE	UN	5,00
8,0	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
8,47	RED DE SUMINISTRO PVC RDE 21 2"	ML	4,95
8,48	RED DE SUMINISTRO PVC RDE 21 1 1/2"	ML	30,25
8,50	RED DE SUMINISTRO PVC 1"	ML	50,75
8,51	RED DE SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	11,00
8,52	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	190,59
8,54	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1/2"	UN	26,00
8,65	RED DE SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	83,33
8,72	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1/2"	UN	8,00
8,93	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS	UN	15,00
8,95	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	7,00
8,96	PUNTO DE AGUA CALIENTE LAVAPLATOS	UN	7,00
8,97	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	18,00
9,0	RED CONTRA INCENDIO		
9,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	37,20
9,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UN	2,00
9,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	4,28
9,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	59,30
9,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	41,10
9,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HG DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	243,92
9,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COUPLING ACERO NEGRO DE 2-1/2"	UN	6,00
9,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COUPLING ACERO NEGRO DE 2"	UN	17,00
9,32	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM, INCLUYE ESCUDO	UN	78,00
9,33	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO DE 1/2"	UN	78,00
9,41	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TEE REDUCCIÓN MECANICA DE 2" X 1-1/2"	UN	1,00
10,0	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		
10,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 24 PUESTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE PROTECCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00
10,69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 5 METROS.	UND	269,00
10,70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3#12, TUBERÍA EMT 3/4" Y CAJAS RADWELT CUADRADA. DISTANCIA PROMEDIO 6	UND	23,00



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
	METROS.		
10,84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE CABLE CU 4#12, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE NARANJA DOBLE CON POLO A TIERRA. . DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS.	UND	55,00
10,87	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE CRITICA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+2#12T, TUBERIA EMT 3/4" Y CAJAS RECTANGULAR METALICA Y TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO DOBLE CON POLO A TIERRA.. DISTANCIA PROMEDIO 10 METROS.	UND	8,00
10,90	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES SELLADA (DUCTO CERRADO CON TAPA) 54/500 PARA RED ELECTRICA. INCLUYE SOPORTE DE SUJECCIÓN, VARILLAS ROSCADAS, TORNILLOS DE UNIÓN.	ML	67,20
10,91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES SELLADA (DUCTO CERRADO CON TAPA) 54/300 PARA COMUNICACIONES. INCLUYE SOPORTE DE SUJECCIÓN, VARILLAS ROSCADAS, TORNILLOS DE UNIÓN.	ML	33,60
10,100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO. INCLUYE: TUBERIA DE EMT 3/4", CABLES UTP CAT 6, FACE PLATE DE 2 SALIDAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	54,00
11,0	PISOS-BASES		
11,01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISO 4CM	M2	148,03
11,02	ALISTADO PISO 4CM	M2	909,26
11,06	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	187,10
13,0	PAÑETES		
13,01	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	M2	2496,38
13,02	PAÑETE LISO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4	ML	413,48
13,03	PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	1520,83
13,04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	ML	11,62
14,0	ACABADOS MUROS		
14,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PARED BLANCO RECTIFICADA TIPO HOSPITALARIO JUNTA PERDIDA 30X60CM, TIPO - CORONA O SIMILAR	M2	584,94
15,0	ACABADOS PISOS		
15,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO 30X30CM (BH 2 COLEGIOS), INCLUYE INSTALACIÓN -DESTRONQUE - PULIDA - BRILLADA DE PISO - TIPO ALFA O SIMILAR	M2	857,00
15,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE BALDOSA EN CERAMICA PARA BAÑO	M2	85,77
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
16,05	SUMINISTRO, TRASNPORTE Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL O SIMILAR (INLCUYE ACOPLS Y SIFON PARA SU CORRECTA INSTALACION)	UN	9,00
17	PINTURA		
17,01	ESTUCO PREPARADO	M2	4057,30
17,02	ESTUCO PREPARADO (METRO LINEAL)	ML	107,77



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
17,03	FILOS Y DILATACIONES	ML	435,88
17,04	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	3002,81
17,05	VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS (METRO LINEAL)	ML	65,77
17,06	PINTURA VINILO TIPO KORAZA	M2	950,00
NP67	ESTUCO PREPARADO PARA EXTERIOR	M2	1248,45
18,0	CIELOS RASOS		
18,01	CIELO RASO SUSPENDIDO EN DRY WALL (LAMINA DE YESO), INCLUYE PINTURA	M2	800,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

PRELIMINARES



EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga - Santander

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER

ELEMENTOS EN CONCRETO



ESTRUCTURA METÁLICA



CUBIERTA





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER

MAMPOSTERÍA



INSTALACIONES SANITARIAS




INSTALACIONES HIDRÁULICAS







RED CONTRA INCENDIO

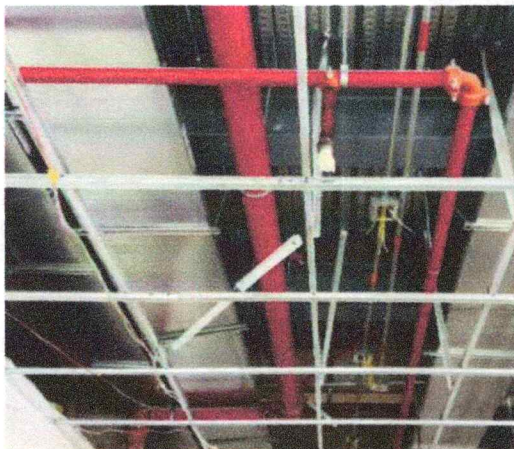

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

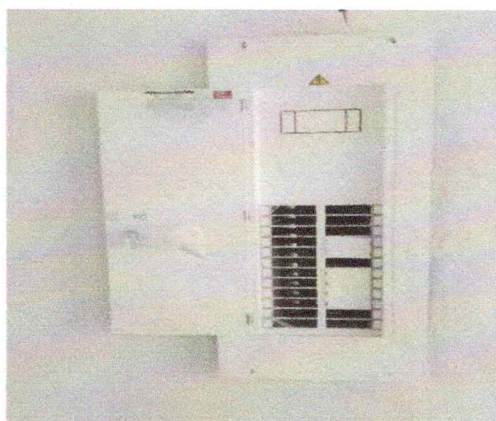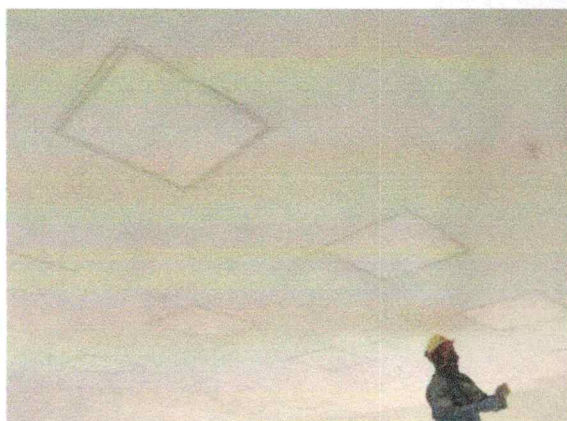

PISOS BASES






EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga - Santander

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER


PAÑETES

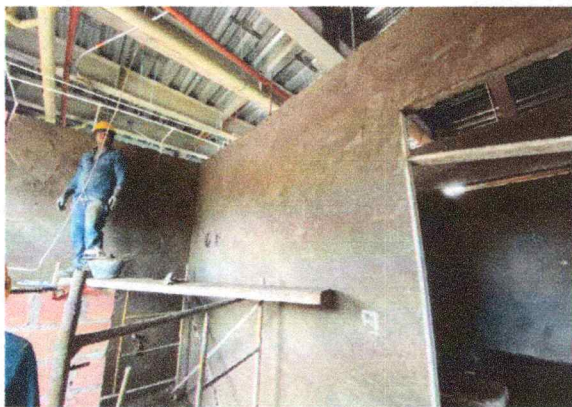

ACABADOS DE MUROS



ACABADOS PISOS

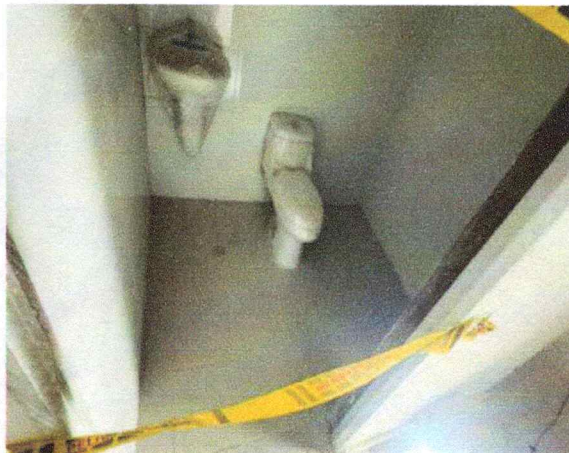





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

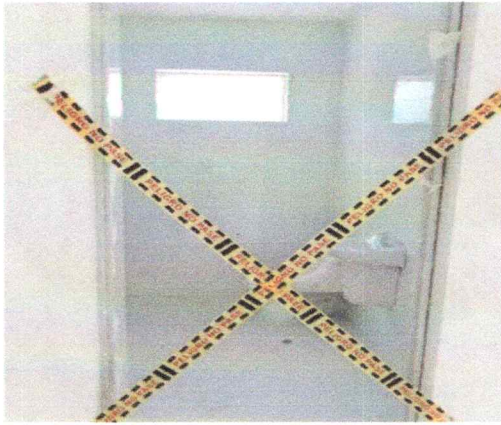

PINTURA

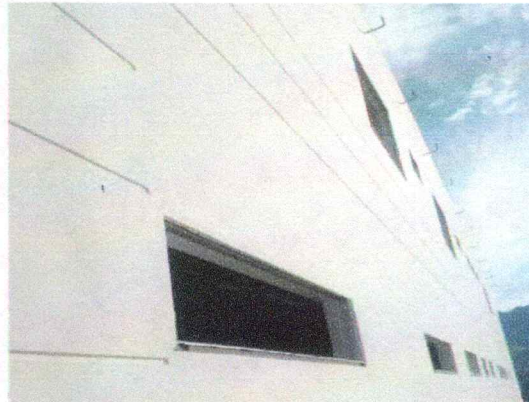

CIELO RASOS



BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO	
Anticipo 40%:	\$ 25.611.233.080,00
Acta parcial 1:	\$ 10.681.193.566,88
Acta parcial 2:	\$ 3.054.273.511,53
Acta parcial 3:	\$ 4.448.460.052,02
Acta parcial 4:	\$ 1.403.466.358,77
Acta parcial 5:	\$ 3.180.168.623,59
Acta parcial 6:	\$ 4.305.543.655,45
Acta parcial 7:	\$ 3.754.076.678,63
Total amortizado	\$ 12.330.872.978,75
Total pagado:	\$ 30.827.182.446,87
Valor Total del Contrato	\$ 64.693.471.857,35
Saldo restante:	\$ 33.866.289.410,48

Avance financiero		47,66%
Avance Físico		48,81%

Una vez revisadas las cantidades de obra ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato No 087-23 cuyo objeto es "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER", en conjunto con el contratista **CONSORCIO DE GARCÍA ROVIRA** y la interventoría al contrato **UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL** se considera conveniente realizar el pago correspondiente al acta parcial No 7 de la siguiente forma:

Periodo de ejecución: del 01/08/2025 al 17/12/2025

Valor acta parcial No 7: \$ 3.754.076.678,63

Amortización anticipo 40%: \$ 1.501.630.671,45

Valor a pagar en la presenta acta: \$ 2.252.446.007,18

Se expide en Málaga, al día treinta y uno (31) del mes de diciembre del 2025.



Ing. JOSÉ ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander	ACTA PARCIAL DE OBRA No 7 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA – SANTANDER.
---	---

ACTA PARCIAL DE OBRA Nº7

CONTRATO No.:		087 DE 2023						
OBJETO:		ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER						
VALOR INICIAL:		SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$64.028.082.699,20)						
VALOR ADICIONAL:		SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE (\$ 665.389.158,15)						
PLAZO INICIAL:		TREINTA Y SEIS (36) MESES						
PLAZO ADICIONAL:		N/A						
CONTRATISTA:		CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201						
SUPERVISOR:		MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA						
APOYO A LA SUPERVISION:		JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA						
INTERVENTOR CONTRATO:		UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501						
ANTICIPO (40%)		VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA (\$25.611.233.079,68)						
FECHA DE INICIACION:		04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
ACTA DE SUSPENSION	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACION:		03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
MUNICIPIO:		MALAGA, SANTANDER						

En Málaga Santander, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, **MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA**, en calidad de Supervisor y el señor **CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO** Representante Legal de **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA**, como Contratista, el señor **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES**,



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander

ACTA PARCIAL DE OBRA No 7
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA – SANTANDER.


Representante Legal de **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL**, como Interventor, el Ingeniero **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA** como Apoyo a la supervisión, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial No. 7 correspondiente al periodo **(01 de Agosto del 2025) al (17 de diciembre del 2025)** del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 07	\$ 3.754.076.678,63
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 40%	\$ 1.501.630.671,45
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 2.252.446.007,18
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$2.252.446.007,18)	



Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO
CONTRATISTA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
INTERVENTOR


MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA
SUPERVISOR


JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectó:	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA Apoyo a la Supervisión	
Revisó:	KAREN ANDREA MÉNDEZ ESPINOSA Asesora jurídica E.S.E HRGR	

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	1 de 23

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA No. 087-2023




1. INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	Febrero 10 de 2026
Informe de Supervisión:	007
Periodo de Seguimiento:	Del 01 de Agosto de 2025 al 17 de Diciembre de 2025
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT	901.740.580 - 3
Representante legal:	Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto
C.C:	Cc # 91.273.201
Fecha de inicio:	04 de Septiembre de 2023
Fecha de finalización:	03 de Septiembre de 2026
Valor del Contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor de adición:	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 // 28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.



2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas:	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del Anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	2 de 23

Responsabilidad Civil Extracontractual		B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial
Pago de seguridad social: Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de Paz y Salvo de aportes parafiscales, de fecha 31 de julio de 2025; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondiente al período del 01 de agosto de 2025 al 17 de diciembre de 2025, así:		
PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO
9490381520	Pensión, ARL y CC - julio de 2025 Salud – agosto de 2025 	22/08/2025
9491880499	Pensión, ARL y CC - Agosto de 2025 Salud – Septiembre de 2025 	18/09/2025
9493217555	Pensión, ARL y CC - Septiembre de 2025 Salud – Octubre de 2025 	13/11/2025

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	3 de 23

9494714510	Pensión, ARL y CC - Octubre de 2025 Salud – Noviembre de 2025 	24/11/2025
9496709026	Pensión, ARL y CC - Noviembre de 2025 Salud – Diciembre de 2025 	23/12/2025

3. REVISION TECNICA:

Descripción del alcance del contrato:	
Obligación: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación: a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud) b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU'S (Según proyecto radicado ante Minsalud) c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra	Dentro de las Actividades Ejecutadas en el Periodo de esta supervisión están: Del 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025. Porcentaje Programado: 43.08% Porcentaje Ejecutado: 33.77% Se desarrolló la instalación de tubería metálica para soporte de la teja castellana con sus respectivos accesorios, instalación de canal metálico en cubierta, pañete en muros interiores en mortero 1:4; fabricación de puertas principales y secundarias, en la Central de Gases Medicinales. En el Módulo D se avanzó en las siguientes actividades: instalación de bloque de fachada perimetral, aplicación de friso impermeabilizado para

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	4 de 23

d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud)
e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos
f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales
g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos
h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios
i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios
j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases
k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado

fachada en mortero, aplicación de estuco tipo exterior y dilataciones en fachada, aplicación de pañete y estuco interior en la primera planta. Además, instalación de enchape en baños en la primera planta, y colocación de baldosín en la segunda planta.

En el Módulo A se avanzó en la colocación de mampostería interior y exterior sobre ejes, aplicación de pañete interior en la placa de primer piso del modulo

Del 26 de agosto de 2025 al 25 de septiembre de 2025.

Porcentaje Programado: 43.83%

Porcentaje Ejecutado: 37.76%

En la Central de Gases Medicinales se aplicó estuco interior y exterior y dilataciones según diseño arquitectónico; y aplicación de mortero requemado en piso de este módulo.

En el Módulo D se realizó la instalación baldosin en granito pulido, aplicación de estuco en fachada 1 y 2 mano. Aplicación de 2 mano de estuco interior primera y segunda planta. Instalación de red contraincendios y eléctrica.

En el Módulo A se realizó colocación de mampostería, pañete y estuco interior y exterior sobre el eje 4. Instalación de elementos en estructura metálica sobre el eje E y F.

Del 26 de septiembre de 2025 al 25 de octubre de 2025.

Porcentaje Programado: 44.70%

Porcentaje Ejecutado: 42.13%

En el Módulo A se avanzó en la actividad de mampostería de la primera placa, colocación de acero para la fundida en concreto de las columnetas y viguetas. Se continuó con el corte de lámina para la fabricación de columnetas e instalación de perfiles, vigas, malla electrosoldada.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	5 de 23

En el Módulo D se avanzó en la instalación de red contraincendios y red sanitaria; e instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Colocación de enchape en muro e instalación de aparatos sanitarios (inodoro), tubería hidráulica y puntos de agua fría y caliente en lavaplatos. Instalación de piso cerámica antideslizante para baños; e instalación de marcos para ventanas, destronque de piso en baldosín en granito y primera mano de pintura en fachada.

Del 26 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025.

Porcentaje Programado: 47.26%

Porcentaje Ejecutado: 46.93%

En el Módulo D se aplicaron 2 capas de pintura interior en muros y cielo raso; además se hacen las perforaciones para las luminarias de las diferentes medidas. Aplicación de estuco tipo exterior y acabado con 2 capas de pintura tipo exterior sobre las fachadas del módulo. Instalación de enchape en muro tipo hospitalario.

En el Módulo A se continua con la instalación de columnas combinadas, instalación de malla electrosoldada y fundida en concreto ejes D – G y 3 – 4; D – E y 2 – 3, con sus respectivos arranques de columnetas.

Fabricación de columnas del eje J, pañete de muros internos con sus respectivas columnas de confinamiento e inicio de instalación de tubería eléctrica y de comunicaciones en muros de mampostería. Armado de canastas de zapatas de cimentación del punto fijo. Y figurado de acero de zapatas para armado de cimentación.

Del 26 de noviembre de 2025 al 17 de diciembre de 2025.

Porcentaje Programado: 48.93%

Porcentaje Ejecutado: 48.81%

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	6 de 23

	En el Módulo D se aplicaron de 2 a 3 manos de pinturas de acabado final en muros y cielo raso dejando totalmente terminado. Montaje de todos los marcos de las puertas de acceso de los baños, oficinas y consultorios. Montaje de los marcos, vidrios y alfaja de ventanería en aluminio. Se continuo con instalación de enchape en muro tipo hospitalario. En el Módulo A se avanzó con el trabajo de instalación de estructura metálica, vigas principales en el nivel de la cubierta y segunda planta. Además, se avanzó en actividades de mampostería perimetral del módulo. Se realizó actividad de impermeabilización de pasarela de cubierta en el módulo.
Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:	
Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 01 de agosto de 2025 a 17 de diciembre de 2025; soportadas por el Apoyo de la Supervisión Ingeniero José Alejandro Sandoval Medina con Informe Técnico de fecha 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con el plazo de ejecución contractual el avance de las actividades ejecutadas fue del 48.81%, siendo este avance fisico del proyecto, y el avance financiero del 47.66%, a 17 de diciembre de 2025 respectivamente. Además, se realizan seguimientos semanales al avance fisico del proyecto, y se realizan comité de Obra tal cual como el del 11 de diciembre del 2025.	
Observaciones Adicionales:	
Durante el periodo de está supervisión se realizaron Comités de Seguimiento y ejecución de obra donde intervinieron el delegado del Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaria de Salud Departamental, Supervisión del Contrato, Apoyo a la Supervisión, Contratista de Obra e Interventoría.	



PÁG	7 de 23
-----	---------

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hogares Rurales de Generación
 México - Santiago
 Tel: 01 55 56 22 10 00
 Fax: 01 55 56 22 10 01

FORMATO ACTA DE REUNIÓN
 CDECO
 INEHRG
 FICHR
 18/04/2010
 06/02/2010



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

A-GJ-FTO-08

VERSIÓN

1

FECHA

06/02/2025

PÁG

8 de 23

Registro Fotográfico:

MODULO D



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	9 de 23



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander


COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	10 de 23



MODULO A

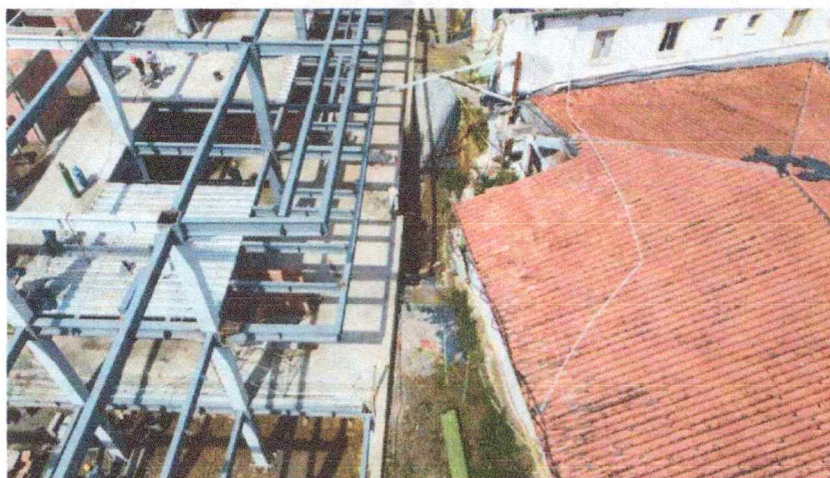



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	11 de 23





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	12 de 23

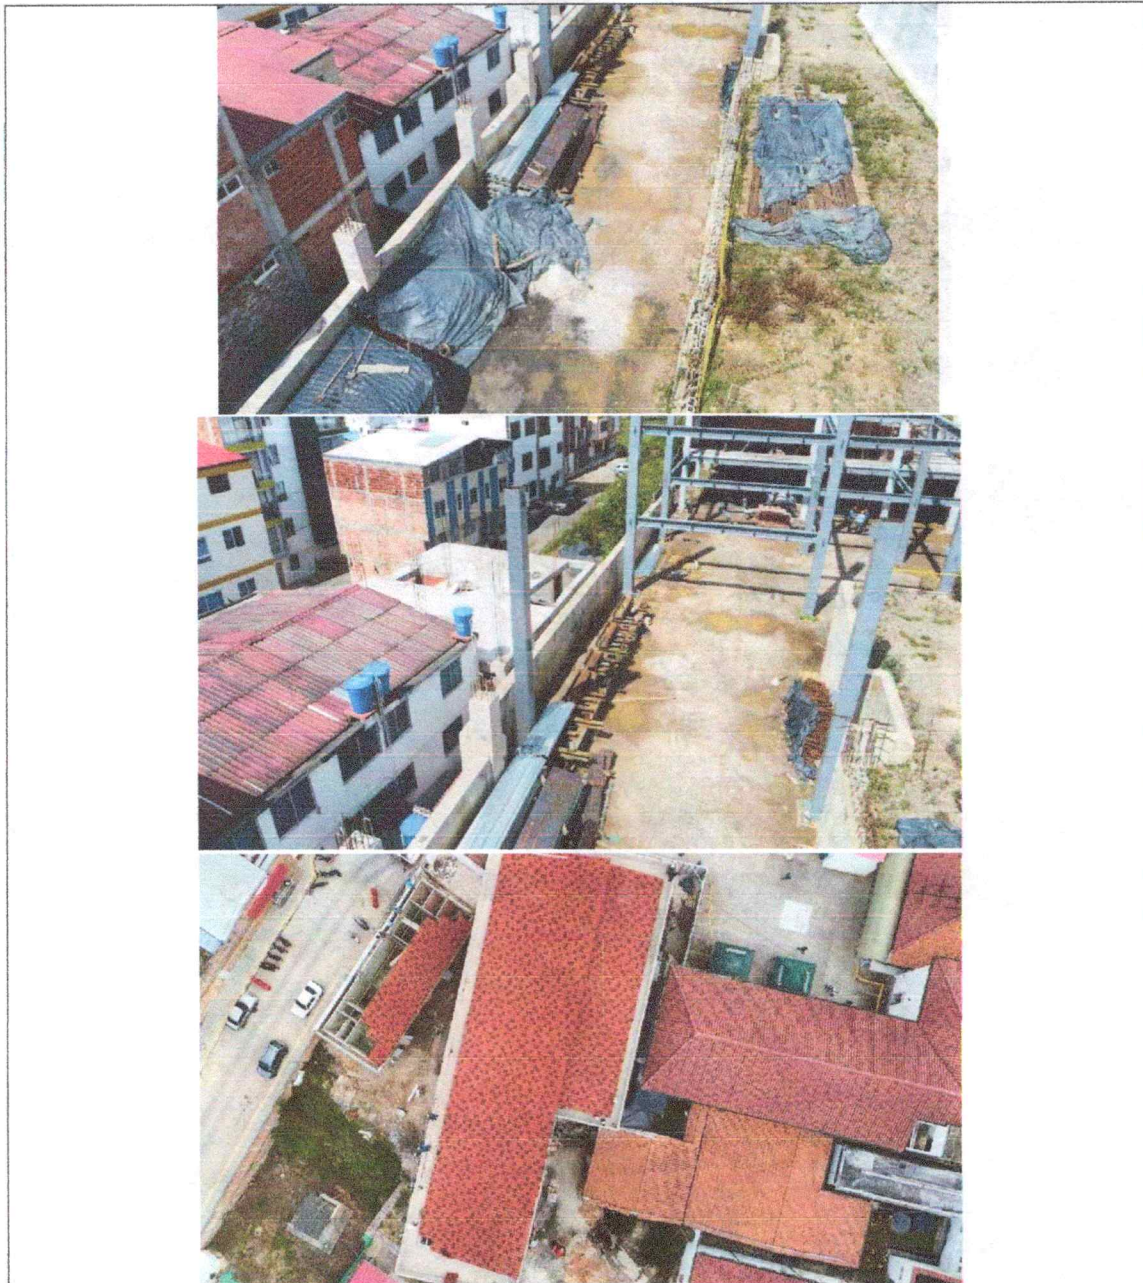



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	13 de 23

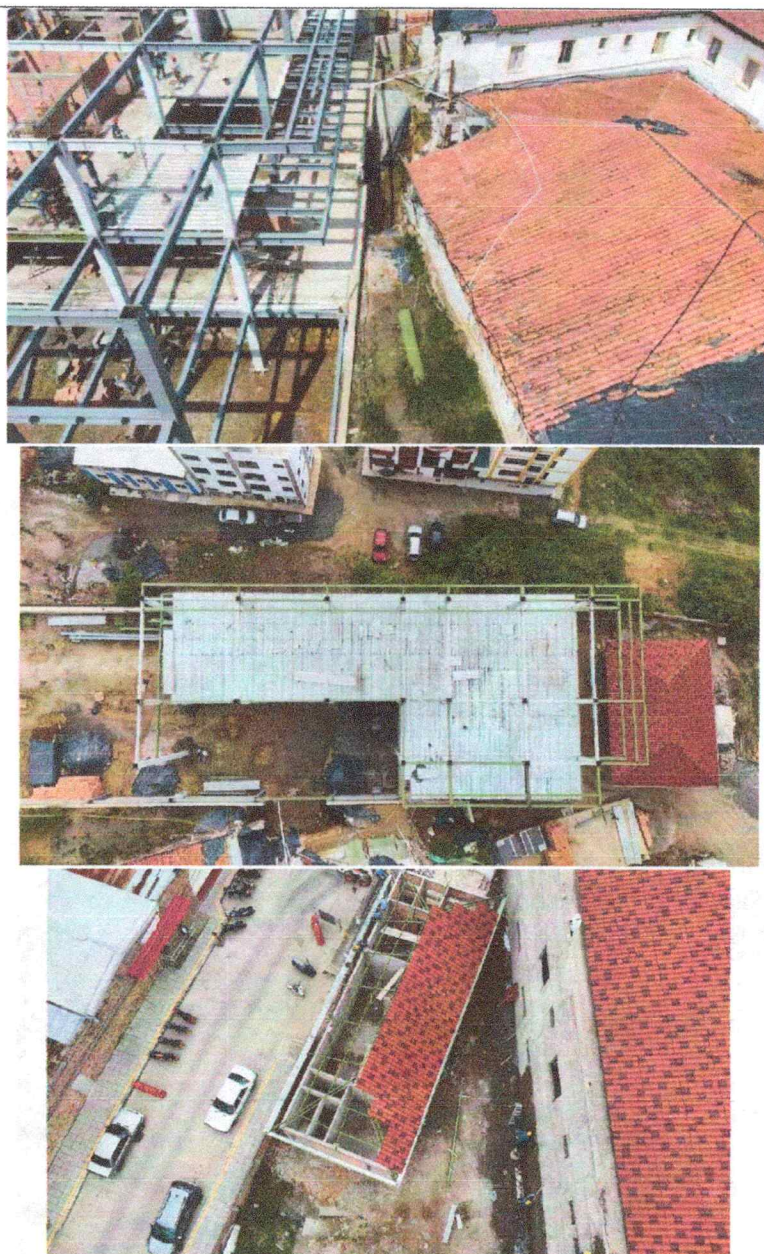

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

A-GJ-FTO-08

VERSIÓN

1

FECHA

06/02/2025

PÁG

14 de 23



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 15 de 23

CENTRAL DE GASES



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

A-GJ-FTO-08

VERSIÓN

1

FECHA

06/02/2025

PÁG

16 de 23





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9


FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 17 de 23

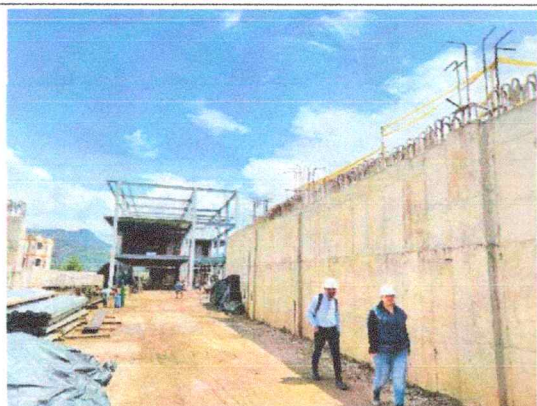



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

A-GJ-FTO-08

VERSIÓN

1

FECHA

06/02/2025

PÁG

18 de 23





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO

A-GJ-FTO-08

VERSIÓN

1

FECHA

06/02/2025

PÁG

19 de 23



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	20 de 23

Documentos verificados para el pago:

- Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos:
 - Del 01 de agosto de 2025 al 25 de agosto de 2025.
 - Del 26 de agosto de 2025 al 25 de septiembre de 2025.
 - Del 26 de septiembre de 2025 al 25 de octubre de 2025.
 - Del 26 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025.
 - Del 26 de noviembre de 2025 al 17 de diciembre de 2025.
- Factura Electrónica No. CGR 10.
- Planillas de pago de Seguridad Social No. 9490381520, 9491880499, 9493217555, 9494714510, 9496709026, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 01 de agosto de 2025 a 17 de diciembre de 2025 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 y 3 del presente informe.
- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales.
- Informe escrito de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.
- Se deben realizar los siguientes descuentos:

Concepto	Valor
Amortización Factura CRG 09	\$ 1.722.217.462,18
Amortización Factura CRG 10	\$ 1.501.630.671,45
Valor Total por Amortizar en la presente factura:	\$ 3.223.848.133,63

Nota: Esta información reposa en la Oficina de contratación de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira

4. REVISION FINANCIERA:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
Anticipo inicial:	\$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	\$ 4.272.477.426,75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	\$ 1.221.709.404,61
Amortización anticipo en Pago No. 003:	\$ 1.779.384.020,81

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	21 de 23

Amortización anticipo en Pago No. 004:	\$ 561.386.543,51
Amortización anticipo en Pago No. 005:	\$ 1.272.067.449,44
Amortización anticipo en Pago No. 006:	\$ 1.722.217.462,18
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 10 (40%):	\$ 1.501.630.671,45
Total Amortizado a 18 de diciembre de 2025:	\$ 12.330.872.978,75

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	\$ 3.754.076.678,63
TOTAL GENERAL	\$ 3.754.076.678,63

Valor del contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	\$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores desde al Acta No. 001 al Acta No. 005	\$ 9.107.024.845,12
Valor anticipo pendiente de amortizar Acta No. 006 (Factura CGR 9)	\$ 1.722.217.462,18
Valor anticipo ha amortizar en la presente Acta No. 007 (Factura CGR 10)	\$ 1.501.630.671,45
Valor Total Amortizado del Acta No. 001 al Acta No. 007	\$ 12.330.872.978,75
Saldo anticipo después de amortizaciones	\$ 13.280.360.100,93
Valor Pagado en Actas	
Valor Pagado Acta No. 001	\$ 10.681.193.566,88
Valor Pagado Acta No. 002	\$ 3.054.273.511,53
Valor Pagado Acta No. 003	\$ 4.448.460.052,02
Valor Pagado Acta No. 004	\$ 1.403.466.358,77
Valor Pagado Acta No. 005	\$ 3.180.168.623,59
Valor Pagado Acta No. 006	\$ 4.305.543.655,45
Valor de la presente factura Acta No. 007	\$ 3.754.076.678,63
Valor pagado a la fecha:	\$ 27.073.105.768,24

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	22 de 23

Descuentos a realizar	\$ 3.223.848.133,63
Amortización Factura CRG 09	\$ 1.722.217.462,18
Amortización Factura CRG 10	\$ 1.501.630.671,45
Valor a Pagar después de descuentos	\$ 530.228.545,00
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 33.866.289.410,48


5. RADICACION PARA PAGO


FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
10 de febrero de 2026	- Informe Técnico de Apoyo a la supervisión - Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes periodos: Del 01 de agosto de 2025 al 25 de agosto de 2025. Del 26 de agosto de 2025 al 25 de septiembre de 2025. Del 26 de septiembre de 2025 al 25 de octubre de 2025. Del 26 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025. Del 26 de noviembre de 2025 al 17 de diciembre de 2025. - Factura Electrónica No. CGR 10. - Planillas de pago de Seguridad Social No No. 9490381520, 9491880499, 9493217555, 9494714510, 9496709026, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 01 de agosto de 2025 a 17 de diciembre de 2025 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 y 3 del presente informe.

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	23 de 23

	• Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira. • Informes escritos con las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión. • Se realiza descuento por amortización del anticipo equivalente al 40% del valor total de la Factura No. CGR 9 y la Factura No. CGR 10, por valor \$ 3.223.848.133,63
--	---

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	Martha Liliana Duarte Rueda	
Cargo:	Supervisora	
Firma:		

Elaborado por: Martha Liliana Duarte Rueda – Subgerente Administrativo	Fecha: 10-02-2026	Firma: 
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 10-02-2026	Firma: 
