

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán Paradiso Histórico
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 17 de abril del 2026

1090-0629

Doctora:

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON

Secretaría de contratación

Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 2 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaria de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 2 en el periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN

Recibido por: Karen P

Fecha: 20 ABR 2026

Hora: 9:43 am

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES

Secretario de Infraestructura

Elaboró: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025

Revisó: Christian Julián Fernández Reyes - Secretario de Infraestructura

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán Paralelo Natural
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 02 de marzo del 2026


1090-0446

Doctora:

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON

Secretaría de contratación

Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta



Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 2 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaría de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 2 en el periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES

Secretario de Infraestructura

Elaboró: Jesús Andrés Devia Tarache— Profesional de Apoyo CPS 1087 de 2025 *Jesús A.*

Revisó: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025 *Hanlly*

CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025



C-008.25

Villavicencio (Meta), 14 noviembre de 2025

Ingeniero:

Ing JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Calle 10 No. 10-90 Barrio Centro – Palacio Municipal

e-mail: infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co

Puerto Gaitán – Meta:

Radicado: 2257-11-0018983
Fecha: 18/11/25
Dependencia: Infraestructura
Radicator: Karol Urbina

Ref.: Contrato de Interventoría No. 1004 de 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEIMPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META.


Asunto: Entrega de informes mensuales No.2. Contrato de obra 0821 de 2025.

Cordial Saludo:

A continuación, una vez revisados y ajustados los informes mensuales de las actividades de obra e interventoría, correspondientes al asunto de la referencia, nos permitimos hacer entrega; así:

- ✓ Original informe mensual No.02 correspondiente al contrato de obra 0821 de 2025, junto con sus anexos. Periodo del (01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025). # de carpetas:1.

Cordialmente,


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDIGENAS 2025

Anexo. lo enunciado en 1 carpeta

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	COMUNICACIONES EXTERNAS	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: junio 2025

CE-020-2025

Villavicencio, 05 de noviembre de 2025

Ingeniero:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
Calle 41B #30 – 11
e-mail: interventoria.acindigenas@gmail.com
Ciudad

Ref.: Contrato de Obra No. 0821 de 2025 “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”

Asunto: Entrega informe mensual No. 2

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito entregar el informe mensual No.2 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025, para su respectiva revisión, aprobación y tramite.

Agradeciendo la atención prestada y a la espera de sus indicaciones.


Atentamente,



LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
Contratista

Anexo: lo enunciado en 1 carpeta

		FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA				
		Infraestructura				
		Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025		
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN 14/11/2025						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
Radicado No:			Fecha:			
Periodo del informe: Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025						
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
1,01	Generalidades del contrato, localización específica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	INFORMACION DEL CONTRATO					
2,01	Cuadro de trazabilidad: 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial, 3) Objeto del contrato, 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato, 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorroga, reinitios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
4	INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO					
4,01	Plan de inversión de anticipo	X	X			
4,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.	X	X			
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra.	X	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			
4,07	Ordenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)	X	X			
5	INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO					
5,01	Gráfico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			
5,02	Cuadro de avance con acumulado mes a mes	X	X			
5,03	Control del estado del tiempo resumen (día a día mes reportado en el informe)	X	X			
6	INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matrícula y antecedentes de la Junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)	X	X			
7	CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO				X	
8	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)	X	X			
9	INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).				X	
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales				X	
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales				X	
10	ANEXOS					
10,01	Actas de socialización (informes inicial)	X	X			
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)	X	X			
10,03	Relación de comités de obra. (según orden cronológico y debidamente numeradas)				X	
10,04	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexo de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)	X	X			

		FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA				
		Infraestructura				
		Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025		
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN 14/11/2025						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
Radicado No.:			Fecha:			
Periodo del informe: Desde: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025						
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,07	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente	X	X			
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)	X	X			
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)	X	X			
10,13	Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)	X	X			
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoría, así como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico), firmado por el profesional (si aplica).				X	
11	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			
NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaría de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.						
Revisó y aprobó: 						
R/L JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIENAS 2025						
Nota: se debe paginar los informes						



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

INFORME DE OBRA



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 821 DE 2025
“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS
RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y
ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”

INFORME MENSUAL No. 2
PERIODO DEL INFORME
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1
R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
NIT. 901.972.868 – 4
R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo	5
2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba.....	5
2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas	6
2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome.....	7
2.1.5 Comunidad beneficiada.....	8
3. ALCANCE DEL PROYECTO	8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	9
5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO	10
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS	11
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	12
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	12
6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	13
6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	14
6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	15
6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	15
6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.	15
6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS	16
7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO	16
7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES	16
7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO.....	17
7.1.2 GRAFICO DE AVANCE PERIODO POR RESGUARDO	178
7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.	198
7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.....	19
7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	19
7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO.....	19

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

8	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.....	21
8.1	RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)	21
8.2	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	22
8.3	ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	23
8.4	PAZ Y SALVO PERSONAL.....	23
9	CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	24
10	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	24
12	CONCLUSIONES.....	25
13	ANEXOS	26



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las leyes y normas, principalmente del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que *“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las actividades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y de agua potable”*, el municipio de Puerto Gaitán en enmarcado en el cumplimiento de las metas de su Plan de Desarrollo **“JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027”** PDM 0344- Construcción, ampliación, optimización, y adecuación de redes de acueducto y plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Atendiendo a la política pública de VIVIENDA, establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.

Algunas comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, presentan vulneración en el servicio de agua potable ya que no cuentan con sistemas de acueductos, se han visto afectadas por la carencia de agua potable, llevando a realizar malas prácticas de la captación del agua, tomando como forma de abastecimiento los pozos profundos rudimentarios en algunas de sus viviendas, que con el tiempo por el desconocimiento sobre las consecuencias que se podrían presentar, algunas familias construyeron pozos sépticos o letrinas a corta distancia de la fuente, lo cual ocasiona la contaminación inmediata de los mismos; evidenciándose condiciones incorrectas para el acceso al agua potable.

Surtidos los tramites de planeación del proyecto, mediante resolución No. 0014 del 10 de junio de 2025 *“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIP-005-2025”* se inició el proceso de contratación el cual culmino con la adjudicación y suscripción del Contrato de Obra Pública No. 821 del 17 de julio de 2025 cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”**.

Así las cosas, con la presentación del presente informe damos cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 821 – 2025 en su cláusula OCTAVA. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** numeral 6. *Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecución, según el avance de la obra (secuencias de actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.*



Así mismo, el presente informe cumple con los requerimientos exigidos en el *FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA (INF-FR-72 V05 vigente desde el 10/01/2025)* establecido por la entidad para tal fin.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza y beneficia a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas de la zona rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta, así:

2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo

RESGUARDO WACOYO										
CODIGO	COMUNIDAD/POZO	COMUNIDADES BENEFICIARIAS	TOTAL COMUNIDADES	EST	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	D. GAITÁN	
WAC01	POZO KALIWIRNAE	ACACIOS	2		898322.2694m	973031.6969m	204.700m	W71° 59' 36.52"	N4° 21' 06.35"	14,00 KM
WAC02	POZO ESMERALDA WALABO	LAS BRISAS, MANANTIAL Y WALABO	4		900418.0667m	972896.7131m	226.400m	W71° 58' 28.56"	N4° 21' 02.04"	16,00 KM
WAC03	POZO PALOGRANDE WALABO	PALOMERO, PARAISO Y CAIMANA 2	4		900588.5666m	972654.4974m	226.400m	W71° 58' 23.03"	N4° 21' 00.67"	16,00 KM
WAC04	POZO LA UNION		1		902309.6873m	973188.3818m	218.100m	W71° 57' 27.23"	N4° 21' 11.61"	16,00 KM
WAC05	POZO PUNTO GRILLO	CAROCARO, LA BALSA, LLANO ALTO, ACETICO	5		903640.5670m	974478.3613m	221.500m	W71° 56' 44.12"	N4° 21' 53.05"	18,00 KM
WAC06	POZO ALGARROBO	SANTAINES, VILLANUEVA	3		904014.1047m	975025.1358m	221.100m	W71° 56' 32.02"	N4° 22' 11.46"	19,00 KM
WAC07	POZO MATAPALITO	LAS PIEDRAS	2		906626.4761m	979804.6633m	209.800m	W71° 55' 07.48"	N4° 24' 47.14"	27,00 KM
WAC08	POZO LA PORFIA	LA HERMOSA	2		907524.2409m	981153.8279m	191.200m	W71° 54' 38.41"	N4° 25' 31.09"	29,00 KM
WAC09	POZO LA CAIMANA	VERGEL	2		900487.6918m	971329.8396m	202.200m	W71° 58' 26.24"	N4° 20' 11.04"	18,00 KM

Tabla 1. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

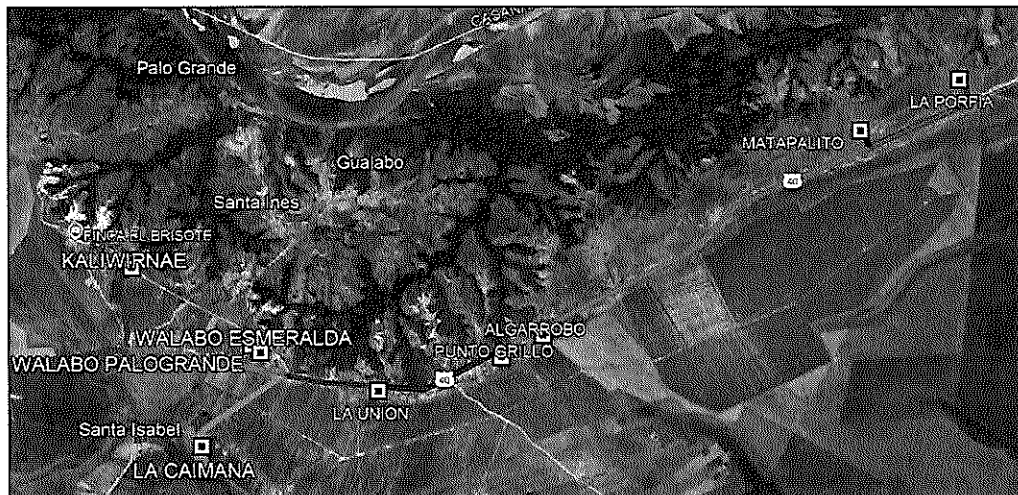


Figura 1. Localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba



RESGUARDO AWALIBA									
CÓDIGO	COMUNIDAD	LOCALIDAD	HECTÁREAS	ELEVACIÓN (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	COORDENADAS	DISTANCIA (KM)	OTROS
AWA01	POZO MAKAPAY	LA VEREMOS	2	927966.5314m	948604.7669m	234.100m	W71° 43' 34.52"	N4° 07' 52.17"	81,00 KM
AWA02	POZO COMUNITARIO AWALIBA CENTRAL	CEREQUITO, LA BRISA, LA PISTA, CHAVALLALI, LA ENVIDIA, DESEO	7	932219.8422m	949522.6407m	240.200m	W71° 41' 16.65"	N4° 08' 22.16"	85,00 KM
AWA03	POZO PUERTO LOPEZ		1	933332.3132m	944145.5908m	206.500m	W71° 40' 40.45"	N4° 05' 27.15"	90,00 KM
AWA04	POZO PUNTO GRILLO		1	932907.1761m	942400.7501m	187.200m	W71° 40' 54.19"	N4° 04' 30.33"	93,00 KM
AWA05	POZO SAN GIL	TAPIVA, BELLAVISTA	3	942563.2402m	947574.8922m	203.600m	W71° 35' 41.26"	N4° 07' 18.59"	96,00 KM
AWA06	POZO FACUNAE		1	935423.3607m	942265.4095m	194.400m	W71° 39' 32.61"	N4° 04' 25.99"	93,00 KM

Tabla 2. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

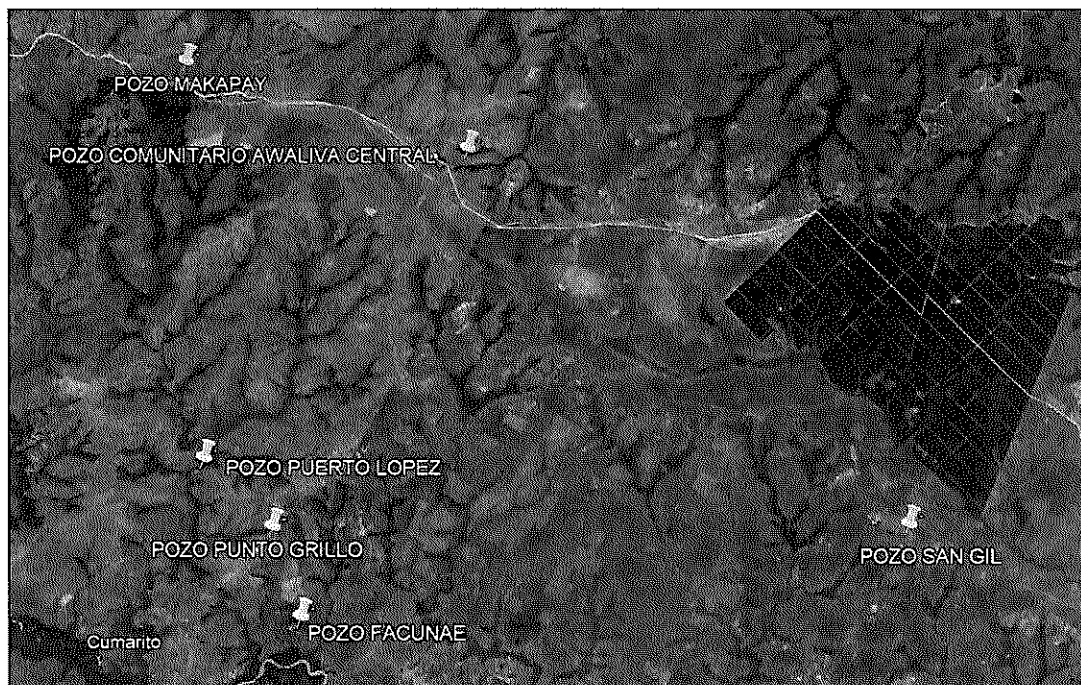


Figura 2. Localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas

RESGUARDO DOMOPLANAS									
CÓDIGO	COMUNIDAD	LOCALIDAD	HECTÁREAS	ELEVACIÓN (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	COORDENADAS	DISTANCIA (KM)	
DOM01	POZO OLIVOS	WARROJO	2	979779.5881m	963044.8119m	185.800m	W71° 15' 34.74"	N4° 15' 45.15"	132,00 KM
DOM02	POZO PARAISO	VISTA HERMOSA	2	970139.3966m	962795.7268m	201.100m	W71° 20' 47.35"	N4° 15' 34.95"	125,00 KM
DOM03	POZO BUENAVISTA		1	968668.4144m	953173.8691m	232.350m	W71° 21' 34.94"	N4° 10' 21.70"	112,00 KM
DOM04	POZO VILLAMARCIA	DILUVIO	2	976124.0172m	945937.1109m	194.500m	W71° 17' 33.14"	N4° 06' 26.18"	124,00 KM
DOM05	POZO LAS BRISAS		1	977507.6932m	947082.8612m	200.550m	W71° 16' 48.28"	N4° 07' 03.47"	124,00 KM
DOM06	POZO CUMARALITO		1	977551.1217m	944929.9396m	197.550m	W71° 16' 46.85"	N4° 05' 53.40"	126,00 KM
DOM07	POZO YATORROBO		1	976876.8066m	943115.3330m	194.300m	W71° 17' 08.70"	N4° 04' 54.32"	129,00 KM
DOM08	POZO CERRITO		1	980241.7249m	947468.0325m	183.500m	W71° 15' 19.64"	N4° 07' 15.89"	126,00 KM
DOM09	POZO PUERTO GAVILAN	SOLEDAD	2	983468.1415m	944328.3256m	203.100m	W71° 13' 35.02"	N4° 05' 33.86"	132,00 KM
DOM10	POZO LAS DEUCIAS		1	985468.1246m	941561.4449m	180.200m	W71° 12' 30.16"	N4° 04' 03.79"	137,00 KM
DOM11	POZO CACHAMITAS		1	979870.7300m	939807.9630m	186.933m	W71° 15' 31.62"	N4° 03' 06.67"	134,00 KM

Tabla 3. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

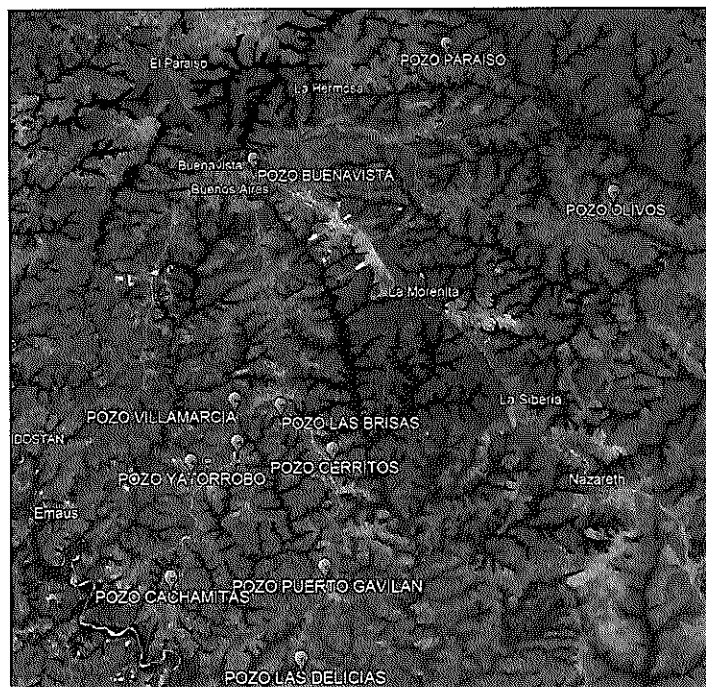


Figura 3. Localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome

RESGUARDO ASEINPOME									
UNIO01	KEKO		1	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92.00 KM
UNU01	SIETE RODRIGUEZ	SAN FERNANDO	2	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92.00 KM

Tabla 4. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



Figura 4. Localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



2.1.5 COMUNIDAD BENEFICIADA

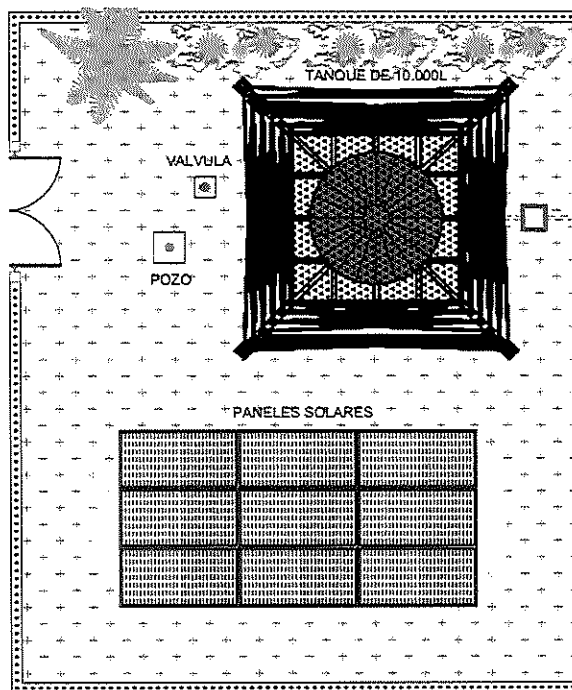
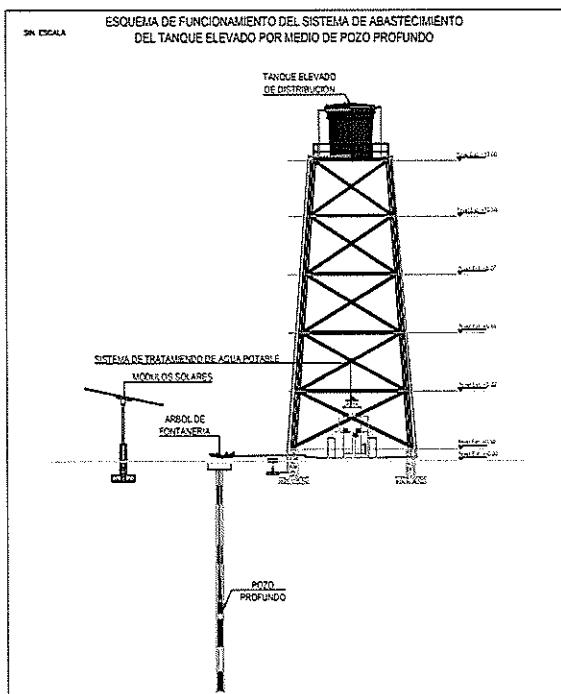
El número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto es de 3.246 habitantes como se muestra a continuación:

GRUPOS ÉTNICOS:		Población Indígena	
ETARIA:	Edad:	0 a 14 años	1.087
		15 a 19 años	390
		20 a 59 años	1.617
		Mayor de 60 años	152
GÉNERO:	Masculino:	1.737	
	Femenino:	1.509	

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto como se mencionó anteriormente beneficiara a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas distribuidos en toda la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, cada sistema está concebido que sea igual para todas las comunidades, que requieran de la menor operación y que brinde agua potable para el beneficio de las comunidades.

El sistema consta de manera general de los siguientes componentes:




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

- **Pozo profundo:** Se contemplan profundidades de perforación desde 90 metros hasta los 153 metros, en tubería PVC de 6" al igual que los filtros.
- **Equipo de bombeo y sistema de energía solar:** bombas sumergibles solares de potencias entre 1.500, 3.000 y 16.000 wattios. Controladores de carga, sensores de nivel para tanque y pozo, y sistema de protección de malla a tierra.
Paneles solares monocristalinos de 570 wattios, distribuidos en módulos de 5, 9 y 22 paneles según las características de cada sistema.
- **Sistema de tratamiento de agua:** compuestos por una unidad presurizada en acero inoxidable que filtra, clarifica y purifica; diseñados para tratar caudales de 0.5 lts/seg, 1 lts/seg y 2 lts/seg según el requerimiento de cada sistema.
- **Redes de acueducto:** 56.682.22 metros de tubería de pvc 2" RDE 21 – 941 acometidas domiciliarias y sus respectivos accesorios (válvulas, uniones, tapones, codos, tees).
- **Tanque elevado de distribución:** tanques plásticos de 6.000 lts, 10.000 lts, y 20.000 lts, soportados en estructuras de acero estructural ASTM de 13.7 metros de altura cimentados en zapatas y pedestales en concreto de 3.000 psi.
- **Cerramiento perimetral:** en tubo galvanizado de 2" soportados en viga de cimentación y concreto ciclópeo con portón de acceso.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DEL PROCESO		LP-SIP-005-2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	NÚMERO:	821 DE 2025
	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
CONTRATISTA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT. 901.965.630 – 1 R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 - 1

VALOR DEL CONTRATO	EN LETRAS	CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
	EN NUMEROS	\$42.408.897.278,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		QUINCE (15) MESES
INTERVENTOR DEL CONTRATO:		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 NIT. 901.972.868 - 4 R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO C.C. 79.134.525 DE FONTIBÓN interventoria.acindigenas@gmail.com
SUPERVISOR		CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE INICIO		29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL		28 DE NOVIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		6,56%
COSTO EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$2.781.062.177,00
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		6.29%
COSTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$ 2.666.821.903.00
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO		64 días
DIAS PENDIENTES DE EJECUCION		392 días
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO		14,04%

5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen las pólizas expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. que amparan la ejecución del contrato desde su suscripción y las correspondientes modificaciones que se han realizado a la fecha del presente informe y que aplican para actualización de pólizas.

- Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 93833.

Calle 15 No. 40 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio - Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

- Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 27002.

5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS

PÓLIZAS INICIALES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 DE JULIO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00
DERIVADA CIVIL DE							

PÓLIZAS INICIALES CORRECCIÓN NIT. DEL CONTRATISTA.

Póliza No. 93833				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO CIVIL	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	01	04	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	01	12	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29	08	2025	01	04	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29	08	2025	28	11	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	29	08	2025	01	12	2026	\$2.120.444.864,00

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato de obra No. 821 de 2025 cuenta con un anticipo del 50% del valor del contrato correspondiente a la suma de \$21.204.448.639,00; por concepto de FONSET la entidad retiene el 5% de este valor que son \$1.060.222.431,95 es decir que el valor neto entregado del anticipo corresponde a \$20.144.226.207,05.

En cumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato, el contratista suscribió con la FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS denominado **PATRIMONIO AUTONOMO ANTICIPO CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, con el fin de manejar y girar los recursos del anticipo del contrato.

De igual manera se registra la cuenta de ahorros No. 500807651648 del Banco Popular correspondiente al fideicomiso donde se deben abonar los recursos objeto del contrato fiduciario.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo aprobado inicialmente y que se encuentra vigente a la fecha.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	% PORCENTAJE PROGRAMADO DE INVERSION EN EL TIEMPO EN MESES				
				1	2	3	4	5
1	MANO DE OBRA, PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS DEL PERSONAL OFERTADO Y OPERATIVO (SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DOTACIONES)	\$2.417.307.144,85	12%	2%	3%	3%	3%	1%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	\$13.496.631.558,72	67%	15%	20%	20%	5%	7%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	\$4.230.287.503,48	21%	3%	5%	5%	5%	3%
TOTALES		\$20.144.226.207,05	100%					

6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

A continuación, se mencionan y describen cada uno de las ordenes de giro a la fiducia durante el periodo del informe

CONSECUTIVO	ITEM	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	SALDO ANTICIPO
ORDEN GIRO No. 3	1	AGOFER S.A.S	\$ 319.855.900,00	6/10/2025	\$ 15.197.514.219,89
ORDEN GIRO No. 4	1	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	\$ 32.717.860,00	6/10/2025	\$ 15.164.796.359,89
ORDEN GIRO No. 5	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN	\$ 25.131.613,00	7/10/2025	\$ 15.139.664.746,89
ORDEN GIRO No. 6	1	EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	\$ 4.588.112,00	7/10/2025	\$ 15.135.076.634,89
ORDEN GIRO No. 7	1	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	\$ 34.630.723,00	9/10/2025	\$ 15.100.445.911,89
ORDEN GIRO No. 8	1	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	\$ 53.240.000,00	14/10/2025	\$ 15.047.205.911,89
ORDEN GIRO No. 9	1	AGOFER S.A.S	\$ 9.973.240,00	14/10/2025	\$ 15.037.232.671,89
ORDEN GIRO No. 10	1	ARCOE S.A.S	\$ 164.934.000,00	14/10/2025	\$ 14.872.298.671,89
ORDEN GIRO No. 11	1	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	\$ 125.285.927,68	15/10/2025	\$ 14.747.012.744,21
	2	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	\$ 30.000.000,00	15/10/2025	\$ 14.717.012.744,21
ORDEN GIRO No. 12	1	GEODELTA S.A.S	\$ 47.950.000,00	21/10/2025	\$ 14.669.062.744,21

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

ORDEN GIRO No. 13	1	OVITA S.A.S.	\$ 115.463.356,00	29/10/2025	\$ 14.553.599.388,21
ORDEN GIRO No. 14	1	M&G INGENIERIA S.A.S	\$ 19.006.188,30	29/10/2025	\$ 14.534.593.199,91
	2	GEODELTA S.A.S	\$ 39.900.000,00		\$ 14.494.693.199,91

6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES		VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	\$ 1.132.883.754,00	\$ 1.132.883.754,00	\$ 1.165.283.191,00	\$ 1.165.283.191,00
2	01-10-25 a 31- 10-25	\$ 1.533.938.149,00	\$ 2.666.821.903,00	\$ 1.615.778.986,00	\$ 2.781.062.177,00
3	01-11-25 a 30- 11-25	\$ 2.752.982.664,00	\$ 5.419.804.567,00		
4	01-12-25 a 31- 12-25	\$ 3.182.797.359,00	\$ 8.602.601.926,00		
5	01-01-26 a 31- 01-26	\$ 3.054.586.452,00	\$ 11.657.188.378,00		
6	01-02-26 a 28- 02-26	\$ 1.361.475.374,00	\$ 13.018.663.752,00		
7	01-03-26 a 31- 03-06	\$ 1.707.014.984,00	\$ 14.725.678.736,00		
8	01-04-26 a 30- 04-26	\$ 2.122.894.222,00	\$ 16.848.572.958,00		
9	01-05-26 a 31- 05-26	\$ 3.538.600.653,00	\$ 20.387.173.611,00		
10	01-06-26 a 30- 06-26	\$ 5.196.889.486,00	\$ 25.584.063.097,00		
11	01-07-26 a 31- 07-26	\$ 6.886.687.533,00	\$ 32.470.750.630,00		
12	01-08-26 a 31- 08-26	\$ 4.957.368.139,00	\$ 37.428.118.769,00		
13	01-09-26 a 30- 09-26	\$ 3.283.638.775,00	\$ 40.711.757.544,00		
14	01-10-26 a 31- 10-26	\$ 1.494.587.472,00	\$ 42.206.345.016,00		
15	01-11-26 a 28- 11-26	\$ 202.576.537,00	\$ 42.408.921.553,00		


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$42.408.897.278,00
VALOR ADICIONES	\$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	\$42.408.897.278,00
VALOR ANTICIPO	\$20.144.226.207,05
ACTAS PARCIALES	\$0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$20.144.226.207,05

6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NÚMERO	DIS.2025000172
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-05-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
CONCEPTO	SPGR CDP 13325 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.921.552,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.921.552,00

6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.

REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO	RS1.2025000156
FECHA DEL REGISTRO	23-07-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
DESCRIPCIÓN	CTO-821 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

FUENTE O RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.897.278,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.897.278,00

6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO 50,00%	2025090008	\$ 20.144.266.208,00	17/09/2025

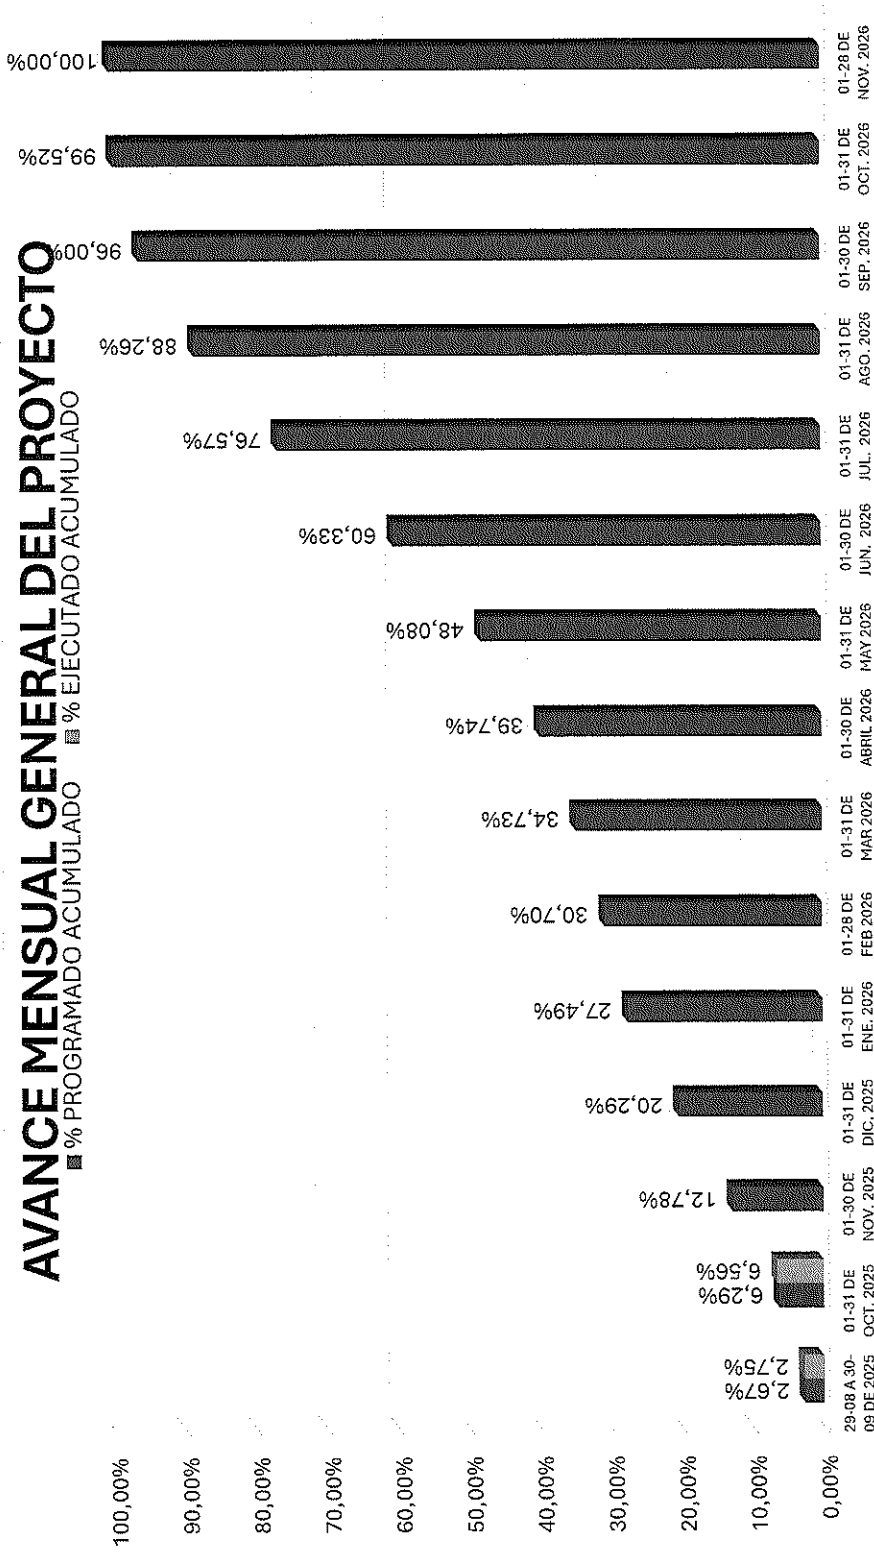
7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES

MES		% PROGRAMADO		% EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	2,67%	2,67%	2,75%	2,75%
2	01-10-25 a 31-10-25	3,62%	6,29%	3,81%	6,56%
3	01-11-25 a 30-11-25	6,49%	12,78%		
4	01-12-25 a 31-12-25	7,51%	20,29%		
5	01-01-26 a 31-01-26	7,20%	27,49%		
6	01-02-26 a 28-02-26	3,21%	30,70%		
7	01-03-26 a 31-03-06	4,03%	34,73%		
8	01-04-26 a 30-04-26	5,01%	39,74%		
9	01-05-26 a 31-05-26	8,34%	48,08%		
10	01-06-26 a 30-06-26	12,25%	60,33%		
11	01-07-26 a 31-07-26	16,24%	76,57%		
12	01-08-26 a 31-08-26	11,69%	88,26%		
13	01-09-26 a 30-09-26	7,74%	96,00%		
14	01-10-26 a 31-10-26	3,52%	99,52%		
15	01-11-26 a 28-11-26	0,48%	100,00%		

Ver anexo No. 1 Cuadro de avance actividades ejecutadas.

7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO



Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

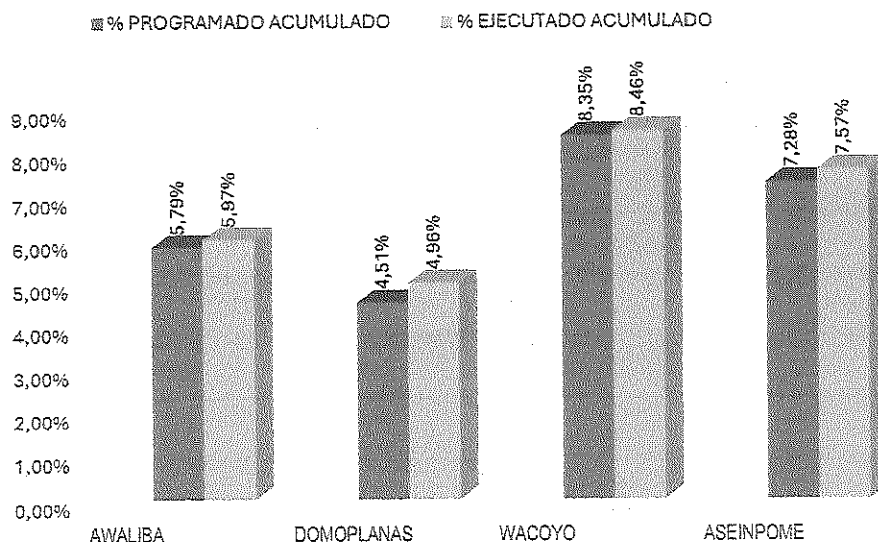
Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



7.1.2 GRAFICO AVANCE PERIODO POR RESGUARDO

AVANCE POR RESGUARDO PERIODO N°. 2 (01/10/25-31/10/25)



7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relaciona las actividades de obra ejecutadas en el presente corte:

POZO PROFUNDO

Durante este periodo se inició con la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar con la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa en las comunidades la Caimana y Keko de los resguardos Wacoyo y Aseinpome respectivamente, comunidades beneficiadas por el proyecto a cargo del Consorcio Aguas Gaitán 2025.

REDES DE ACUEDUCTO

Durante el periodo de este informe se iniciaron las actividades de excavación mecánica, suministro y transporte de material granular e instalación de la cama de arena de río como base para la instalación de la tubería de 2" en las comunidades



Kaliwirnae y Makapay de los resguardos Wacoyo y Awaliba respectivamente, comunidades beneficiadas por el proyecto a cargo del Consorcio Aguas Gaitán 2025.

SUMINISTROS

En el periodo de ejecución del presente informe se continuo con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de las redes de acueducto en las comunidades beneficiadas de los 4 resguardos Domoplanas, Wacoyo, Awaliba y Aseinpome, que están dentro del proyecto a cargo del Consorcio Aguas Gaitán 2025.

Las cantidades ejecutadas y mencionadas anteriormente para el periodo referenciado en este informe se pueden verificar en el **Anexo N°1**.

7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

En el **Anexo No. 2** se encontrarán los certificados de calidad de los materiales usados al corte del presente informe, junto con los certificados de calibración de los equipos usados si aplica.

7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se anexa el informe emitido por parte del profesional SISO, entrega de asistencia de charlas de seguridad, salud en el trabajo y las entregas de dotación.

Ver Anexo No. 3 Informe seguridad y salud en el trabajo (SISO)

7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

RESGUARDO WACOYO OCTUBRE 2025																															
DIA	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	X					X
LLUVIAS MODERADAS AM	X	X																				X	X	X					X	X	
LLUVIAS INTENSAS AM							X	X							X	X											X	X			
SECO PM			X	X	X	X				X	X	X	X		X		X	X	X	X	X				X	X		X	X		X



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

TEL. 961.965.680 - 1

LLUVIAS MODERADAS PM	X	X						X					X	X						X	X			X			X	
LLUVIAS INTENSAS PM							X	X												X								

RESGUARDO AWALIBA OCTUBRE 2025

DIA	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X			X			X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X		X	X	X		X	X
LLUVIAS MODERADAS AM			X	X			X					X					X	X											X		
LLUVIAS INTENSAS AM						X														X					X						
SECO PM	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X		
LLUVIAS MODERADAS PM			X		X		X							X					X					X	X						
LLUVIAS INTENSAS PM						X																							X	X	

RESGUARDO DOMOPLANAS OCTUBRE 2025

DIA	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X			X			X	X			X		X	X			X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		
LLUVIAS MODERADAS AM			X	X			X			X			X			X	X										X			X	
LLUVIAS INTENSAS AM						X					X											X									X
SECO PM	X	X			X		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS PM			X	X				X					X					X				X		X					X	X	
LLUVIAS INTENSAS PM						X																									X

RESGUARDO ASEINPOME OCTUBRE 2025

DIA	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X						X	X	X	X					X	X	X	X	X			X				X	X
LLUVIAS MODERADAS AM						X	X	X		X					X	X		X						X	X				X		
LLUVIAS INTENSAS AM									X								X										X	X			

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.680 – 1

SECO PM		X	X	X	X			X			X	X		X	X	X	X		X		X	X					X
LLUVIAS MODERADAS PM	X					X			X	X									X			X	X			X	X
LLUVIAS INTENSAS PM						X					X						X										X

8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)

De acuerdo con las necesidades del proyecto, las actividades ejecutadas durante el presente periodo y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO: OCTUBRE 2025

PERSONAL PROFESIONAL							
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO	FECHA INGRESO Y/O RETIRO
LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	R/L Consorcio	86.051.533	PORVENIR	SANITAS	SURA	9494411431	
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN	Director de Obra	40.326.478	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9494411431	
WENDY VANESA GARZON GARCIA	Residente de Obra 1	1.121.902.403	PROTECCION	SANITAS	SURA	9494411431	
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	Residente de Obra 2	1.121.834.340	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9494411431	
EDWIN GUZMAN PASTRANA	Profesional en Salud Ocupacional	86.040.134	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA	9492155718 9494246827	RETIRO 28-10-2025
GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.869.998	PORVENIR	SANITAS	SURA	9494411431	INGRESO 29-10-2025
DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	Contadora	40.395.435	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	949441244	
LINA MARCELA GOMEZ LEAL	Auxiliar Contable	40.328.285	PORVENIR	SANITAS	SURA	949441244	

Por medio del oficio 1090-1142 de la alcaldía de Puerto Gaitán con fecha del 29 de octubre de 2025, se aprobó el cambio del profesional de salud ocupacional.

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ	Secretaria	1.092.394.700	PORVENIR	SANITAS	SURA	949441244
JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	Conductor 1	80.013.513	PORVENIR	SANITAS	SURA	949441244
ROSEMBERG MURCIA JOJOA	Conductor 2	1.003.359.252	PORVENIR	SANITAS	SURA	9494411431
OBER ASMED PEREZ PEREZ	Almacenista	96.193.788	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	949441244
MIGUEL DIOSID CORREA	Oficial de obra	1.103.470.729	PORVENIR	CAJACOPI	SURA	9494411431
YEFERSON ENRIQUE GALVAN	Operador de maquinaria	78.646.546	COLFONDOS	NUEVA EPS	SURA	9494411431
JOSE JAVIER MONACO	Oficial de tubería	1.093.921.945	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9494411431
BRISLEY RAMIREZ	Oficial de obra	1.122.236.284	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9494411431
DUVAN ARLEY ROMERO	Oficial de tubería	1.004.819.005	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9494411431

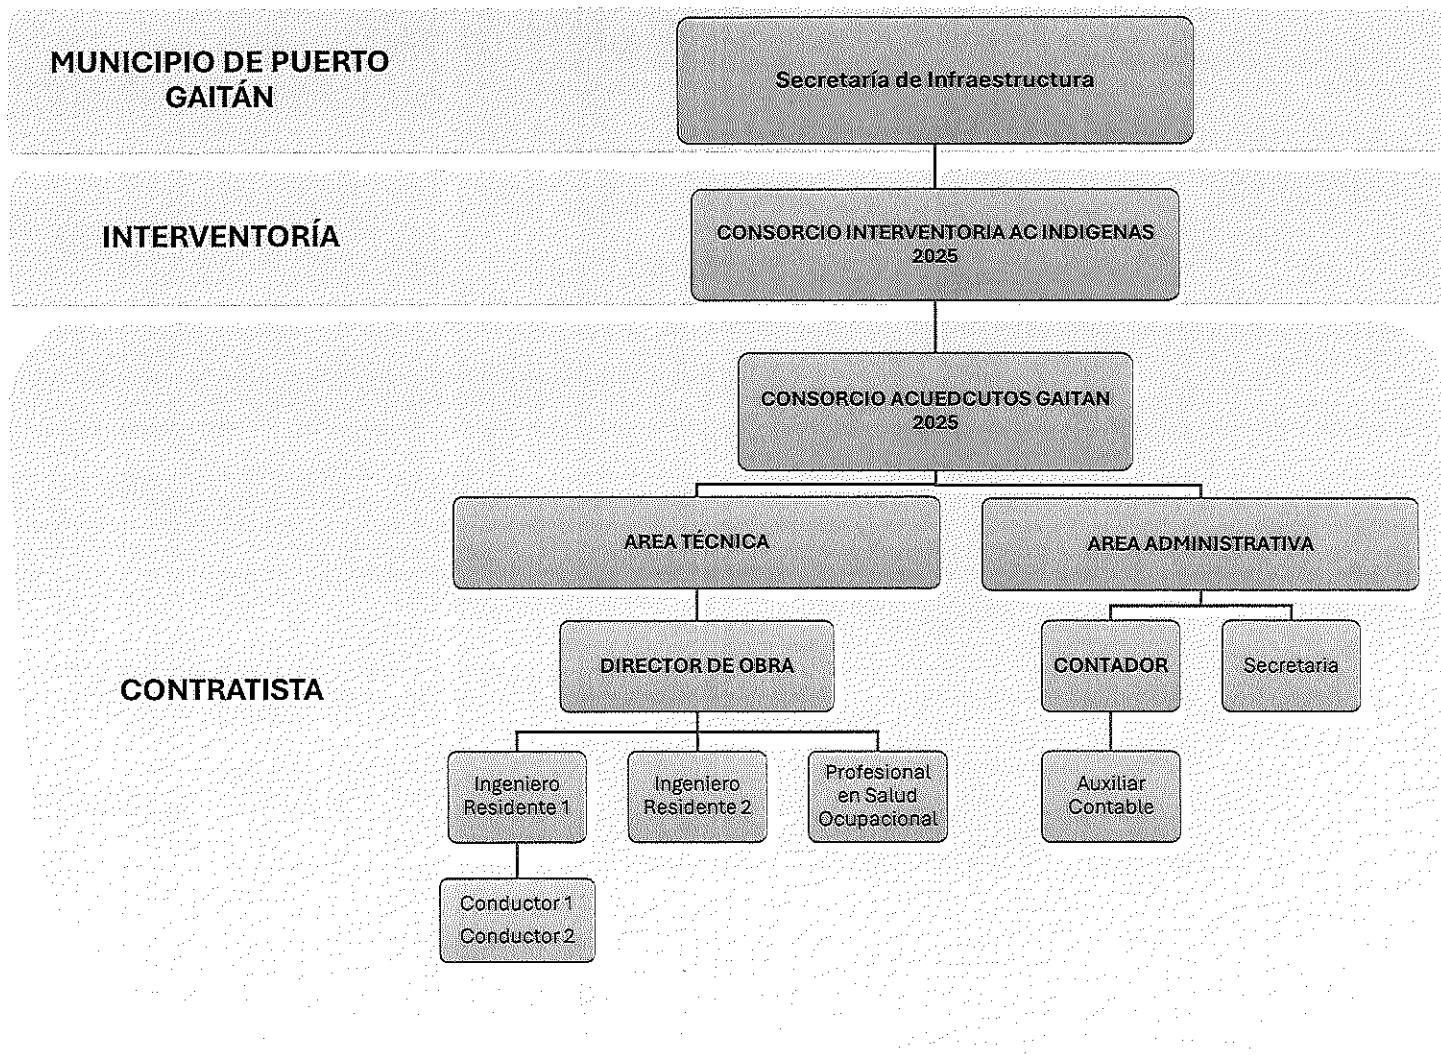
8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

Ver Anexo No. 4. Planillas de pago seguridad social y Certificación contador.



8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO



8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL.

Se anexa paz y salvo de los trabajadores retirados durante el periodo comprendido a la fecha de corte del presente informe.

Ver Anexo No. 5. Paz y salvo personal retirado



9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Para el periodo reportado en este informe no se presentan ensayos de laboratorio, debido a las actividades realizadas solamente de localización y excavación.

10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
NIVEL DE PRECISIÓN	NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM	1
ESTACIÓN TOTAL	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOPCOM	1
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	1
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	1

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.

En lo corrido del presente mes las actividades ejecutadas no causaron afectación ambiental en la zona de trabajo, ya que se ejecutaron actividades de excavación para redes y ya finalizando el mes, se inicio la perforación de dos pozos.

A la fecha el contrato cuenta con los permisos de prospección y exploración en de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales a continuación se relacionan:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA



EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

12 CONCLUSIONES

- Se presenta el siguiente informe con el fin de mantener informadas a las partes involucradas del estado y avance del contrato en el periodo correspondiente al informe mensual No. 2 con corte del (01-10-2025 al 31-10-2025), actividades que se desarrollaron con normalidad.
- Una vez recibidos los recursos de anticipo en la fiducia constituida para el manejo de este, se continua la inversión de tal forma que se logre el cumplimiento del cronograma, priorizando las actividades que más tiempo requieren en su ejecución.
- En el presente periodo se suministró aproximadamente el 34,17% de la tubería en los cuatro resguardos, dejando un acumulado del 53,96% de suministro.
- Se continua la ejecución de la actividad de localización y replanteo de las redes de acueducto en las comunidades beneficiarias donde se viene evidenciando la existencia de nuevos usuarios, así como el desplazamiento de algunos usuarios dentro de la misma comunidad, situación que genera mayor cantidad de actividades de obra por lo que se cuantificara junto con interventoría para realizar el balance del contrato.
- Para efectos de precisión, se deja claridad en que el porcentaje acumulado consignado en el cuadro de avance está redondeado a dos decimales.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.680 – 1

13 ANEXOS

- **ANEXO No. 1.** CUADRO DE AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- **ANEXO No. 2.** CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.
- **ANEXO No. 3.** INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISO).
- **ANEXO No. 4.** PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.
- **ANEXO No. 5.** PAZ Y SALVO TRABAJADORES RETIRADOS
- **ANEXO No. 6.** REGISTRO FOTOGRAFICO.
- **ANEXO No. 7.** COPIA DE LA BITACORA.
- **ANEXO No. 8.** NOMINAS DEL PERSONAL.
- **ANEXO No. 9.** ACTAS DE VECINDAD.
- **ANEXO No. 10.** ORDENES DE OPERACIÓN DE INVERSION DEL ANTICIPO.
- **ANEXO No. 11.** APROBACION DEL CONTRATO FIDUCIARIO.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS AGUAS 2025
Contratista



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1


ANEXO 1. CUADRO DE CANTIDADES AVANCE DE OBRA.

CONDICIONES INICIALES										ACTAS ANTERIORES			RESERVA ACTA 2024 AL 31-10-2024			AVANCE ACUMULADO			CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR	
N° ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
COMUNIDAD ANALLABA CENTRAL (10.000 - 1L) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -			
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO ANALLABA				\$ 139.220,00		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00			\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	-	\$ -			
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	4.140,25	\$ 17.861.039,00	\$ 17.861.039,00		\$ 17.861.039,00	4.140,25	\$ 17.861.039,00	\$ 17.861.039,00		\$ 17.861.039,00	4.140,25	\$ 17.861.039,00	-	\$ -			
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	4.140,25	\$ 17.861.039,00	\$ 17.861.039,00		\$ 17.861.039,00		\$ 17.861.039,00			\$ 17.861.039,00		\$ 17.861.039,00	-	\$ -			
4.4		CANADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	931,86	\$ 149.095,00	\$ 176.153.338,00		\$ -	58,00	\$ 10.967.510,00	\$ 10.967.510,00		\$ 10.967.510,00	58,00	\$ 10.967.510,00	873,86	\$ 165.183.628,00			
4.7		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	327.182,73	\$ 2.395,00	\$ 755.644.921,00		\$ -	12.949,00	\$ 28.899.241,00	\$ 28.899.241,00		\$ 28.899.241,00	12.949,00	\$ 28.899.241,00	#####	\$ 725.963.690,00			
4.15		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	2.334,15	\$ 62.395,00	\$ 122.294.423,00		\$ -	200,00	\$ 10.471.000,00	\$ 10.471.000,00		\$ 10.471.000,00	200,00	\$ 10.471.000,00	2.134,15	\$ 111.733.423,00			
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ANALLABA				\$ 1.397.518.280,00		\$ 17.861.039,00		\$ 37.881.039,00			\$ 37.881.039,00		\$ 37.881.039,00		\$ 1.338.339.760,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	-	\$ -			
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00		\$ 255.460,00			\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	-	\$ -			
		TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL ANALLABA				\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00			\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 1.400.584.082,00			
COMUNIDAD ANALLABA CENTRAL (10.000 - 1L) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -			
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	TOTAL POZO PROFUNDO ANALLABA		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00			\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	-	\$ -			
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	3.747,00	\$ 16.164.568,00	\$ 16.164.568,00		\$ 16.164.568,00	3.747,00	\$ 16.164.568,00	\$ 16.164.568,00		\$ 16.164.568,00	3.747,00	\$ 16.164.568,00	-	\$ -			
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	3.747,00	\$ 16.164.568,00	\$ 16.164.568,00		\$ 16.164.568,00		\$ 16.164.568,00			\$ 16.164.568,00		\$ 16.164.568,00	-	\$ -			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	-	\$ -			
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00		\$ 255.460,00			\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	-	\$ -			
		TOTAL CERRAMIENTO ANALLABA				\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00			\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 1.462.972.384,00			
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (6000 - 0.6L) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -			
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	TOTAL POZO PROFUNDO PUERTO LOPEZ		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00			\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	-	\$ -			
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	689,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	689,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	689,00	\$ 2.886.066,00	-	\$ -			
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	689,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00			\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	-	\$ -			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	-	\$ -			
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00		\$ 255.460,00			\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	-	\$ -			
		TOTAL CERRAMIENTO PUERTO LOPEZ				\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00			\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 1.548.339.782,00			
COMUNIDAD PUERTO GRILLO (6000 - 0.6L) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -			
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	TOTAL POZO PROFUNDO PUERTO GRILLO		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00			\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	-	\$ -			
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	782,00	\$ 3.373.548,00	\$ 3.373.548,00		\$ 3.373.548,00	782,00	\$ 3.373.548,00	\$ 3.373.548,00		\$ 3.373.548,00	782,00	\$ 3.373.548,00	-	\$ -			
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	782,00	\$ 3.373.548,00	\$ 3.373.548,00		\$ 3.373.548,00		\$ 3.373.548,00			\$ 3.373.548,00		\$ 3.373.548,00	-	\$ -			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	-	\$ -			
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00		\$ 255.460,00			\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	-	\$ -			
		TOTAL CERRAMIENTO PUERTO GRILLO				\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00			\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 1.610.995.154,00			
COMUNIDAD SAN GIL (10.000 - 1L) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -			
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	TOTAL POZO PROFUNDO SAN GIL		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00			\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	-	\$ -			
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	3.218,00	\$ 13.892.452,00	\$ 13.892.452,00		\$ 13.892.452,00	3.218,00	\$ 13.892.452,00	\$ 13.892.452,00		\$ 13.892.452,00	3.218,00	\$ 13.892.452,00	-	\$ -			
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	3.218,00	\$ 13.892.452,00	\$ 13.892.452,00		\$ 13.892.452,00		\$ 13.892.452,00			\$ 13.892.452,00		\$ 13.892.452,00	-	\$ -			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	-	\$ -			
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00		\$ 255.460,00			\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	-	\$ -			
		TOTAL CERRAMIENTO SAN GIL				\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00			\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 1.673.193.476,00			
COMUNIDAD FACUÑAE (6000 - 1L) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -			
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	TOTAL POZO PROFUNDO FACUÑAE		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00			\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	-	\$ -			
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	684,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	684,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	684,00	\$ 2.886.066,00	-	\$ -			
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	684,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00			\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	-	\$ -			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	-	\$ -			
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,00		\$ 255.460,00			\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	-	\$ -			
		TOTAL CERRAMIENTO FACUÑAE				\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00			\$ 62.244.322,00		\$ 62.244.322,00		\$ 1.735.318.022,00			
COMUNIDAD FACUÑAE (6000 - 1L) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -			
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	TOTAL POZO PROFUNDO FACUÑAE		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00		\$ 139.220,00			\$ 139.220,00		\$ 139.220,00	-	\$ -			
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	684,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	684,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	684,00	\$ 2.886.066,00	-	\$ -			
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	ML	684,00	\$ 2.886.066,00	\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00			\$ 2.886.066,00		\$ 2.886.066,00	-	\$ -			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 255.460,00	\$ 255.460,00		\$ 255.460,4												

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACUYO, ANVALIBA, DONOPLANAS Y ASEINPONE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META													
CONDICIONES INICIALES				ACTAS ANTERIORES			PRESBITE ACIA 2025 AL 31-06-2025		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 5.300,00	\$ 255.460,00	48,20	\$ 255.460,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL CERRAMIENTO FACURAE		\$ 255.460,00		\$ 255.460,00	\$		\$		\$ 55.989.062,00
				TOTAL COMUNIDAD FACURAE		\$ 816.604.393,00		\$ 3.248.633,00	\$		\$		\$ 812.353.027,00
				TOTAL RESGUARDO ANVALIBA		\$ 7.763.997.181,00		\$ 9.448.679,00	\$		\$		\$ 7.659.197.502,00
RESGUARDO DONOPLANAS													
1		POZO PROFUNDO											
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 140.909,00	\$ 140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL POZO PROFUNDO OLIVOS		\$ 154.397.739,00		\$ 140.909,00	\$		\$		\$ 154.256.829,00
4		REDES DE ACUEDUCTO											
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3.250,85	\$ 4.347,00	\$ 14.131.445,00	3.250,85	\$ 14.131.445,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO OLIVOS		\$ 1.165.083.429,00		\$ 14.131.445,00	\$		\$		\$ 1.160.951.984,00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL											
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 5.357,00	\$ 258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL CERRAMIENTO OLIVOS		\$ 258.207,00		\$ 258.207,00	\$		\$		\$ 67.310.167,00
				TOTAL COMUNIDAD OLIVOS		\$ 1.802.861.679,00		\$ 14.530.651,00	\$		\$		\$ 1.788.271.117,00
COMUNIDAD PARARISO (6000 - 11) (F.Z. 1.34)													
1		POZO PROFUNDO											
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 140.909,00	\$ 140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL POZO PROFUNDO PARARISO		\$ 193.906.511,00		\$ 140.909,00	\$		\$		\$ 193.765.602,00
4		REDES DE ACUEDUCTO											
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.606,01	\$ 4.347,00	\$ 11.328.325,00	2.606,01	\$ 11.328.325,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PARARISO		\$ 912.443.387,00		\$ 11.328.325,00	\$		\$		\$ 901.114.942,00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL											
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 5.357,00	\$ 258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL CERRAMIENTO PARARISO		\$ 258.207,00		\$ 258.207,00	\$		\$		\$ 57.310.167,00
				TOTAL COMUNIDAD PARARISO		\$ 1.593.599.395,00		\$ 11.727.441,00	\$		\$		\$ 1.611.641.662,00
COMUNIDAD BUENAVISTA (6000 - 041) (F.Z. 1.33)													
1		POZO PROFUNDO											
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 140.909,00	\$ 140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL POZO PROFUNDO BUENAVISTA		\$ 154.937.965,00		\$ 140.909,00	\$		\$		\$ 154.637.054,00
4		REDES DE ACUEDUCTO											
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	826,58	\$ 4.347,00	\$ 3.593.143,00	826,58	\$ 3.593.143,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BUENAVISTA		\$ 293.923.877,00		\$ 3.593.143,00	\$		\$		\$ 289.410.734,00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL											
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 5.359,00	\$ 258.910,00	48,20	\$ 258.910,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL CERRAMIENTO BUENAVISTA		\$ 258.910,00		\$ 258.910,00	\$		\$		\$ 55.649.610,00
				TOTAL COMUNIDAD BUENAVISTA		\$ 874.933.725,00		\$ 3.970.018,00	\$		\$		\$ 870.943.707,00
COMUNIDAD VILLAMARCA (6000 - 11) (F.Z. 1.34)													
1		POZO PROFUNDO											
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 140.909,00	\$ 140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL POZO PROFUNDO VILLAMARCA		\$ 209.338.132,00		\$ 140.909,00	\$		\$		\$ 209.197.223,00
4		REDES DE ACUEDUCTO											
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.225,57	\$ 4.347,00	\$ 9.674.553,00	2.225,57	\$ 9.674.553,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO VILLAMARCA		\$ 791.393.493,00		\$ 9.674.553,00	\$		\$		\$ 771.709.306,00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL											
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 5.357,00	\$ 258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL CERRAMIENTO VILLAMARCA		\$ 258.207,00		\$ 258.207,00	\$		\$		\$ 57.310.167,00
				TOTAL COMUNIDAD VILLAMARCA		\$ 1.462.539.509,00		\$ 10.973.809,00	\$		\$		\$ 1.452.465.697,00
COMUNIDAD LAS BRISAS (6000 - 041) (F.Z. 1.34)													
1		POZO PROFUNDO											
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 140.909,00	\$ 140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL POZO PROFUNDO BRISAS		\$ 205.970.223,00		\$ 140.909,00	\$		\$		\$ 205.829.314,00
4		REDES DE ACUEDUCTO											
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	716,07	\$ 4.347,00	\$ 3.108.409,00	716,07	\$ 3.108.409,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BRISAS		\$ 264.198.916,00		\$ 3.108.409,00	\$		\$		\$ 261.087.507,00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL											
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48,20	\$ 5.357,00	\$ 258.207,00	48,20	\$ 258.207,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL CERRAMIENTO BRISAS		\$ 258.207,00		\$ 258.207,00	\$		\$		\$ 57.310.167,00
				TOTAL COMUNIDAD BRISAS		\$ 922.601.144,00		\$ 3.597.625,00	\$		\$		\$ 899.358.519,00
COMUNIDAD CUARARITO (6000 - 11) (F.Z. 1.34)													
1		POZO PROFUNDO											
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 140.909,00	\$ 140.909,00	1,00	\$ 140.909,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL POZO PROFUNDO CUARARITO		\$ 213.184.201,00		\$ 140.909,00	\$		\$		\$ 213.343.292,00
4		REDES DE ACUEDUCTO											
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2.172,98	\$ 4.347,00	\$ 9.445.944,00	2.172,98	\$ 9.445.944,00	\$	-	\$	-	\$
				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUARARITO		\$ 768.637.800,00		\$ 9.445.944,00	\$		\$		\$ 759.691.255,00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL											

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS RINDEMAS WACUO, ANUALBA, DONOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, NEIA																
CONDICIONES INICIALES																
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PERIODO 2014-2015	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
COMUNIDAD YATORORRO (6000 - 0.61) (F.Z. 1.34)				TOTAL CERRAMIENTO CUMARARITO		\$ 57,558,354.00		\$ 57,558,354.00			\$ 57,558,354.00	-		\$ 57,558,354.00	-	\$ -
				TOTAL COMUNIDAD CUMARARITO		\$ 1,453,359,916.00		\$ 1,453,359,916.00			\$ 1,453,359,916.00	-		\$ 1,453,359,916.00	-	\$ -
1	POZO PROFUNDO		UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	1.00	\$ 140,909.00			\$ 140,909.00	-	1.00	\$ 140,909.00	-	\$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO		ML	1,946.90	\$ 8,026,474.00	\$ 8,026,474.00	1,946.90	\$ 8,026,474.00			\$ 8,026,474.00	-	1,946.90	\$ 8,026,474.00	-	\$ -
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	1,946.90	\$ 8,026,474.00	\$ 8,026,474.00	1,946.90	\$ 8,026,474.00			\$ 8,026,474.00	-	1,946.90	\$ 8,026,474.00	-	\$ -
5				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO YATORORRO		\$ 8,026,474.00		\$ 8,026,474.00			\$ 8,026,474.00	-		\$ 8,026,474.00	-	\$ -
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
COMUNIDAD CERRITO (6000 - 0.61) (F.Z. 1.34)				TOTAL CERRAMIENTO YATORORRO		\$ 57,558,354.00		\$ 57,558,354.00			\$ 57,558,354.00	-		\$ 57,558,354.00	-	\$ -
				TOTAL COMUNIDAD YATORORRO		\$ 1,398,816,512.00		\$ 1,398,816,512.00			\$ 1,398,816,512.00	-		\$ 1,398,816,512.00	-	\$ -
1	POZO PROFUNDO		UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	1.00	\$ 140,909.00			\$ 140,909.00	-	1.00	\$ 140,909.00	-	\$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO		ML	522.06	\$ 2,269,395.00	\$ 2,269,395.00	522.06	\$ 2,269,395.00			\$ 2,269,395.00	-	522.06	\$ 2,269,395.00	-	\$ -
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	522.06	\$ 2,269,395.00	\$ 2,269,395.00	522.06	\$ 2,269,395.00			\$ 2,269,395.00	-	522.06	\$ 2,269,395.00	-	\$ -
6				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CERRITO		\$ 2,269,395.00		\$ 2,269,395.00			\$ 2,269,395.00	-		\$ 2,269,395.00	-	\$ -
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN (10.000 - 11) (F.Z. 1.34)				TOTAL CERRAMIENTO CERRITO		\$ 57,558,354.00		\$ 57,558,354.00			\$ 57,558,354.00	-		\$ 57,558,354.00	-	\$ -
				TOTAL COMUNIDAD CERRITO		\$ 846,530,154.00		\$ 846,530,154.00			\$ 846,530,154.00	-		\$ 846,530,154.00	-	\$ -
1	POZO PROFUNDO		UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	1.00	\$ 140,909.00			\$ 140,909.00	-	1.00	\$ 140,909.00	-	\$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO		ML	3,414.74	\$ 14,843,875.00	\$ 14,843,875.00	3,414.74	\$ 14,843,875.00			\$ 14,843,875.00	-	3,414.74	\$ 14,843,875.00	-	\$ -
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	3,414.74	\$ 14,843,875.00	\$ 14,843,875.00	3,414.74	\$ 14,843,875.00			\$ 14,843,875.00	-	3,414.74	\$ 14,843,875.00	-	\$ -
6				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO GAVILAN		\$ 1,307,272,354.00		\$ 1,307,272,354.00			\$ 1,307,272,354.00	-		\$ 1,307,272,354.00	-	\$ -
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0.61) (F.Z. 1.34)				TOTAL CERRAMIENTO GAVILAN		\$ 57,558,354.00		\$ 57,558,354.00			\$ 57,558,354.00	-		\$ 57,558,354.00	-	\$ -
				TOTAL COMUNIDAD GAVILAN		\$ 1,931,372,707.00		\$ 1,931,372,707.00			\$ 1,931,372,707.00	-		\$ 1,931,372,707.00	-	\$ -
1	POZO PROFUNDO		UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	1.00	\$ 140,909.00			\$ 140,909.00	-	1.00	\$ 140,909.00	-	\$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO		ML	1,493.19	\$ 6,490,897.00	\$ 6,490,897.00	1,493.19	\$ 6,490,897.00			\$ 6,490,897.00	-	1,493.19	\$ 6,490,897.00	-	\$ -
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	1,493.19	\$ 6,490,897.00	\$ 6,490,897.00	1,493.19	\$ 6,490,897.00			\$ 6,490,897.00	-	1,493.19	\$ 6,490,897.00	-	\$ -
6				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO DELICIAS		\$ 541,649,978.00		\$ 541,649,978.00			\$ 541,649,978.00	-		\$ 541,649,978.00	-	\$ -
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
COMUNIDAD CACHAMITAS (6000 - 0.61) (F.Z. 1.34)				TOTAL CERRAMIENTO DELICIAS		\$ 57,558,354.00		\$ 57,558,354.00			\$ 57,558,354.00	-		\$ 57,558,354.00	-	\$ -
				TOTAL COMUNIDAD DELICIAS		\$ 1,195,171,322.00		\$ 1,195,171,322.00			\$ 1,195,171,322.00	-		\$ 1,195,171,322.00	-	\$ -
1	POZO PROFUNDO		UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	1.00	\$ 140,909.00			\$ 140,909.00	-	1.00	\$ 140,909.00	-	\$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO		ML	1,189.03	\$ 5,081,773.00	\$ 5,081,773.00	1,189.03	\$ 5,081,773.00			\$ 5,081,773.00	-	1,189.03	\$ 5,081,773.00	-	\$ -
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	1,189.03	\$ 5,081,773.00	\$ 5,081,773.00	1,189.03	\$ 5,081,773.00			\$ 5,081,773.00	-	1,189.03	\$ 5,081,773.00	-	\$ -
6				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CACHAMITAS		\$ 428,187,400.00		\$ 428,187,400.00			\$ 428,187,400.00	-		\$ 428,187,400.00	-	\$ -
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
COMUNIDAD CACHAMITAS (6000 - 0.61) (F.Z. 1.34)				TOTAL CERRAMIENTO CACHAMITAS		\$ 57,558,354.00		\$ 57,558,354.00			\$ 57,558,354.00	-		\$ 57,558,354.00	-	\$ -
				TOTAL COMUNIDAD CACHAMITAS		\$ 1,072,720,163.00		\$ 1,072,720,163.00			\$ 1,072,720,163.00	-		\$ 1,072,720,163.00	-	\$ -
TOTAL RESGUARDOS DONOPLANAS				TOTAL CERRAMIENTO DONOPLANAS		\$ 6,490,897.00		\$ 6,490,897.00			\$ 6,490,897.00	-		\$ 6,490,897.00	-	\$ -
1	POZO PROFUNDO		UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	1.00	\$ 140,909.00			\$ 140,909.00	-	1.00	\$ 140,909.00	-	\$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO		ML	1,189.03	\$ 5,081,773.00	\$ 5,081,773.00	1,189.03	\$ 5,081,773.00			\$ 5,081,773.00	-	1,189.03	\$ 5,081,773.00	-	\$ -
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	1,189.03	\$ 5,081,773.00	\$ 5,081,773.00	1,189.03	\$ 5,081,773.00			\$ 5,081,773.00	-	1,189.03	\$ 5,081,773.00	-	\$ -
6				TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ASENPOME		\$ 428,187,400.00		\$ 428,187,400.00			\$ 428,187,400.00	-		\$ 428,187,400.00	-	\$ -
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRAS ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00	48.20	\$ 258,207.00			\$ 258,207.00	-	48.20	\$ 258,207.00	-	\$ -
COMUNIDAD ASENPOME (10.000 - 11) (F.Z. 1.32)				TOTAL CERRAMIENTO ASENPOME		\$ 57,558,354.00		\$ 57,558,354.00			\$ 57,558,354.00	-		\$ 57,558,354.00	-	\$ -
				TOTAL COMUNIDAD ASENPOME		\$ 1,072,720,163.00		\$ 1,072,720,163.00			\$ 1,072,720,163.00	-		\$ 1,072,720,163.00	-	\$ -
TOTAL RESGUARDOS DONOPLANAS				TOTAL CERRAMIENTO DONOPLANAS		\$ 6,490,897.00		\$ 6,490,897.00			\$ 6,490,897.00	-		\$ 6,490,897.00	-	\$ -
1	POZO PROFUNDO		UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	1.00	\$ 140,909.00			\$ 140,909.00	-	1.00	\$ 140,909.00	-	\$ -
4	REDES DE ACUEDUCTO		ML	4,974.57	\$ 21,141,923.00	\$ 21,141,923.00	4,974.57	\$ 21,141,923.00			\$ 21,141,923.00	-	4,974.57	\$ 21,141,923.00	-	\$ -
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		ML	4,974.57	\$ 21,141,923.00	\$ 21,141,923.00	4,974.57	\$ 21,141,923.00			\$ 21,141,923.00	-	4,974.57	\$ 21,141,923.00	-	\$ -
4.3	ELEVACIÓN MANIL EN MATERIAL COMÚN 140 - 2.00m INCLUYE CARSE		M3	193.50	\$ 4,926,250.00	\$ 4,926,250.00	193.50	\$ 4,926,250.00			\$ 4,926,250.00	-	193.50	\$ 4,926,250.00	-	\$ -
TOTAL RESGUARDOS DONOPLANAS				TOTAL CERRAMIENTO DONOPLANAS		\$ 6,490,897.00		\$ 6,490,897.00			\$ 6,490,897.00	-		\$ 6,490,897.00	-	\$ -

[illegible]



CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACUYO, ANUALIBA, DONOPLANAS Y ASEIPOMBE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META

CONDICIONES INICIALES										ACTAS ANTERIORES			PERIODO 2019 AL 31/10/2019			AVANCE ACUMULADO			CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	
N° ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2,976.40	\$ 4,266.00	\$ 12,697,322.00	2,976.40	\$ 12,697,322.00	-	\$ -	2,976.40	\$ 12,697,322.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO MATRIPALITO				\$ 764,099,534.00		\$ 12,697,322.00		\$ -		\$ 12,697,322.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 741,402,212.00		
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,214.00	\$ 251,316.00	48.20	\$ 251,316.00	-	\$ -	48.20	\$ 251,316.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6.1		TOTAL CERRAMIENTO MATRIPALITO				\$ 64,267,743.00		\$ 251,316.00		\$ -		\$ 251,316.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 64,006,426.00		
		TOTAL COMUNIDAD MATRIPALITO				\$ 1,354,363,315.00		\$ 13,086,386.00		\$ -		\$ 13,086,386.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 1,351,198,189.00		
COMUNIDAD LA PORTEA (10.000 - 11) (F.Z. 1.24)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 136,689.00	\$ 136,689.00	1.00	\$ 136,689.00	-	\$ -	1.00	\$ 136,689.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO LA PORTEA				\$ 144,477,632.00		\$ 136,689.00		\$ -		\$ 136,689.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 144,340,971.00		
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2,649.66	\$ 4,266.00	\$ 11,309,023.00	2,649.66	\$ 11,309,023.00	-	\$ -	2,649.66	\$ 11,309,023.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA PORTEA				\$ 677,757,497.00		\$ 11,309,023.00		\$ -		\$ 11,309,023.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 684,454,074.00		
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,214.00	\$ 251,316.00	48.20	\$ 251,316.00	-	\$ -	48.20	\$ 251,316.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6.1		TOTAL CERRAMIENTO PORTEA				\$ 64,267,743.00		\$ 251,316.00		\$ -		\$ 251,316.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 64,006,426.00		
		TOTAL COMUNIDAD PORTEA				\$ 1,284,088,235.00		\$ 11,891,027.00		\$ -		\$ 11,891,027.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 1,272,387,209.00		
COMUNIDAD LA CHIMANA (10.000 - 11) (F.Z. 1.22)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 135,845.00	\$ 135,845.00	1.00	\$ 135,845.00	-	\$ -	1.00	\$ 135,845.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
1.1		PERFORACIÓN DE PROBEA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LADOS PARA ESTUDIO TOPOGRÁFICO	ML	137.00	\$ 331,099.00	\$ 45,360,593.00		\$ -	32.00	\$ 10,595,168.00	32.00	\$ 10,595,168.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 34,765,395.00		
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3,393.74	\$ 4,266.00	\$ 14,473,395.00	3,393.74	\$ 14,473,395.00	-	\$ -	3,393.74	\$ 14,473,395.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA CHIMANA				\$ 843,946,238.00		\$ 14,473,395.00		\$ -		\$ 14,473,395.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 858,419,633.00		
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,186.00	\$ 249,365.00	48.20	\$ 249,365.00	-	\$ -	48.20	\$ 249,365.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6.1		TOTAL CERRAMIENTO LA CHIMANA				\$ 53,593,831.00		\$ 249,365.00		\$ -		\$ 249,365.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 53,843,196.00		
		TOTAL COMUNIDAD LA CHIMANA				\$ 1,439,196,588.00		\$ 14,693,255.00		\$ -		\$ 14,693,255.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 1,453,949,843.00		
RESGUARDO ASEIPOMBE (6.000 - 11) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 139,220.00	\$ 139,220.00	1.00	\$ 139,220.00	-	\$ -	1.00	\$ 139,220.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
1.1		PERFORACIÓN DE PROBEA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LADOS PARA ESTUDIO TOPOGRÁFICO	ML	114.00	\$ 349,024.00	\$ 39,768,736.00		\$ -	59.00	\$ 17,451,200.00	59.00	\$ 17,451,200.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 22,317,536.00		
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	4,808.36	\$ 4,314.00	\$ 20,743,265.00	4,808.36	\$ 20,743,265.00	-	\$ -	4,808.36	\$ 20,743,265.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO NEREO A SEIPOMBE				\$ 1,651,193,530.00		\$ 20,743,265.00		\$ -		\$ 20,743,265.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 1,671,936,795.00		
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,300.00	\$ 255,460.00	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6.1		TOTAL CERRAMIENTO NEREO A SEIPOMBE				\$ 56,244,822.00		\$ 255,460.00		\$ -		\$ 255,460.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 56,500,282.00		
		TOTAL COMUNIDAD NEREO A SEIPOMBE				\$ 2,275,515,559.00		\$ 21,137,545.00		\$ -		\$ 21,137,545.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 2,296,683,104.00		
COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ (10.000 - 11) (F.Z. 1.30)																				
1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 139,220.00	\$ 139,220.00	1.00	\$ 139,220.00	-	\$ -	1.00	\$ 139,220.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO SIETE RODRIGUEZ				\$ 173,788,855.00		\$ 139,220.00		\$ -		\$ 139,220.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 173,649,635.00		
4	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1,833.86	\$ 4,314.00	\$ 7,911,272.00	1,833.86	\$ 7,911,272.00	-	\$ -	1,833.86	\$ 7,911,272.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO SIETE RODRIGUEZ				\$ 48,518,892.00		\$ 7,911,272.00		\$ -		\$ 7,911,272.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 48,607,338.00		
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,300.00	\$ 255,460.00	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6.1		TOTAL CERRAMIENTO SIETE RODRIGUEZ				\$ 56,244,822.00		\$ 255,460.00		\$ -		\$ 255,460.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 56,500,282.00		
		TOTAL COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ				\$ 1,243,138,559.00		\$ 8,205,952.00		\$ -		\$ 8,205,952.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 1,248,833,071.00		
SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE AUI)																				
		TOTAL RESGUARDO ASEIPOMBE				\$ 3,633,109,628.00		\$ 17,451,200.00		\$ -		\$ 17,451,200.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 3,650,560,828.00		
		SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE AUI)				\$ 38,012,772,515.00		\$ 295,271,267.00		\$ -		\$ 295,271,267.00		\$ -	-	\$ -	-	\$ 38,308,043,782.00		
		COSTOS DIRECTOS OBRA (BRI AUI)				\$ 28,368,485,727.61		\$ 220,351,561.79		\$ -		\$ 220,351,561.79		\$ -	-	\$ -	-	\$ 28,588,837,289.41		
TOTAL RESGUARDO ASEIPOMBE																				
SUMINISTROS	RESGUARDO ANUALIBA (6.000 - 11) (F.Z. 1.30)																			
COMUNIDAD NAKAPAY (6.000 - 11) (F.Z. 1.30)																				
4.17		TUBERÍA PVC RDE 21" SUMINISTRO	ML	3,909.25	\$ 75,548.00	\$ 295,517,357.00		\$ -	1,794.03	\$ 140,917,468.00	1,794.03	\$ 140,917,468.00		\$ -	2,098.22	\$ 154,634,825.00		\$ 65,993,082.00		
COMUNIDAD ANUALIBA CENTRAL (10.000 - 11) (F.Z. 1.30)																				
4.17		TUBERÍA PVC RDE 21" SUMINISTRO	ML	3,037.00	\$ 75,548.00	\$ 229,550,716.00		\$ -	1,408.47	\$ 110,532,503.00	1,408.47	\$ 110,532,503.00		\$ -	1,528.53	\$ 117,917,714.00		\$ 1,234,833,071.00		
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (6.000 - 3.01) (F.Z. 1.30)																				
4.17		TUBERÍA PVC RDE 21" SUMINISTRO	ML	549.00	\$ 75,548.00	\$ 41,472,862.00		\$ -	274.50	\$ 21,561,426.00	274.50	\$ 21,561,426.00		\$ -	274.50	\$ 21,561,426.00		\$ 348,666,882.00		
COMUNIDAD PUNTO ORALLO (6.000 - 0.61) (F.Z. 1.30)																				
4.17		TUBERÍA PVC RDE 21" SUMINISTRO	ML	672.00	\$ 75,548.00	\$ 50,784,256.00		\$ -	336.00	\$ 26,392,128.00	336.00	\$ 26,392,128.00		\$ -	336.00	\$ 26,392,128.00		\$ 31,853,355,255.00		
COMUNIDAD SAN GIL (10.000 - 11) (F.Z. 1.30)																				
4.17		TUBERÍA PVC RDE 21" SUMINISTRO	ML	2,908.00	\$ 75,548.00	\$ 220,417,584.00		\$ -	1,134.00	\$ 89,073,432.00	1,134.00	\$ 89,073,432.00		\$ -	1,774.00	\$ 139,344,162.00		\$ 2,046,197,030.00		



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Gerfor

Laboratorio de ensayos PVC Gerfor S.A.

Fecha: 05-sept-25
Norma: NTC-382

Consecutivo: 1535
Referencia: TUBO U.M. 2"
Lote de fabricación: 30000052516

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3578	60 - 60	60
OVALAMIENTO	mm	NTC-3578	< 1,60	0,75
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3578	1,78 - 2,45	1,97
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3578	< 12,00	8,62
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3578	8000 - 8012	8009,77

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	MINUTOS	NTC-3578	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	88	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	70% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO		NTC-382	LOGO IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE DIAMETRO PULG. - MM RDE PRESIÓN DE TRABAJO	CUMPLE

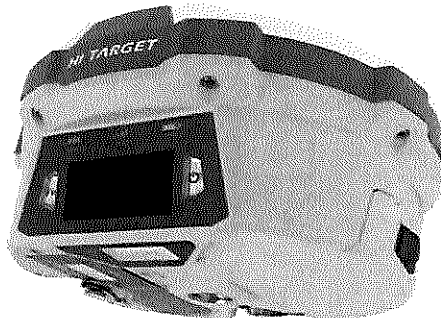
Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1 Vigente.


Dra. Yelmi Milena Franco
Directora Conformidad

Nit: 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

		INSPECCION DE EQUIPOS GNSS RESEIVER STONEX-S800		Código:	STS800-GPS-132					
		FORMATO PARA INSPECCIONES DE CALIDAD		Versión:	2.0					
Fecha Inspección:	8/4/2025	Persona que Inspecciona:	ANDRES HERNANDEZ							
LUGAR:	VILLAVICENCIO-META	Persona responsable del área:	TECNICO OPERADOR							
Sede:		VILLAVICENCIO								
CONDICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR	OBSERVACIONES	OPCIONES			VALORACIÓN			
				SI	NO	N/A	A	B	C	D
	1	RECEIVER SATELLITE (GPS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L5		X			X			
	2	RECEIVER SATELLITE (GLONASS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L3,L5		X			X			
	3	RECEIVER SATELLITE (BEIDOU)B1,B2,B3		X			X			
	4	RECEIVER SATELLITE (GALILEO)E1,E5 A/B/C,E5a,E5b,E6		X			X			
	5	RECEIVER SATELLITE (QZSS)L1 C/A,L1C,L2C,L5,L6		X			X			
	6	RECEIVER SATELLITE (SBAS)L1,L5		X			X			
	7	CHANNELS 555		X			X			
	8	HIGH PRECISION STATIC SURVEYING	Horizontal 2.5 mm + 1 ppm RMS Vertical 5.0 mm + 1 ppm RMS	X			X			
	9	REAL TIME KINEMATIC(<30Km) -NETWORK SURVEYING	Fixed RTK horizontal 8mm +1 ppm RMS Fixed RTK vertical 15mm +1 ppm RMS	X			X			
	10	INTERNAL RADIO frequency range 457-467 MHz		X			X			
	11	INTERNAL RADIO maximum range 2- Km in urban enbrionmert		X			X			
	12	INTERNAL RADIO maximum range up to 10 Km with optimal		X			X			
	13	POWER SUPPLY WORKING TIME 8-10 hours	WORKING 8.5 hours	X			X			
REGISTRO FOTOGRAFICO										
OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR		OBSERVACIONES	OPCIONES			VALORACIÓN				
			SI	NO	N/A	A	B	C	D	
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (PINTURA - TAPAS)		-	X			X				
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (HARDWARE)		-	X			X				
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE COORDENADAS (WGS84)		-	X			X				
Observaciones:										
EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS.										
Nombre: ANDRES HERNANDEZ MORENO		Cargo: TECNICO OPERADOR	Firma del responsable:							
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES										
HALLAZGO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES			NOMBRE(*)				
NINGUNA	NINGUNO	9/12/2019	-			ANDRES HERNANDEZ				
NINGUNA	NINGUNO	5/12/2020	-			ANDRES HERNANDEZ				
NINGUNA	NINGUNO	5/12/2021	-			ANDRES HERNANDEZ				
CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS										
A	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES									
B	LIGERA VARIACION CON LAS ESPECIFICACIONES									
C	VALORES FUERA DE RANGO CON ESPECIFICACIONES									
D	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES									

	EQUIPOS GNSS RESEIVER HI-TARGET V60		Código:	HTV60-GPS-146					
	FORMATO DE CALIBRACION		Versión:	2.0					
Fecha Inspección:	4/2/2025	Persona que Inspecciona: ANDRES HERNANDEZ	Sede:	VILLAVICENCIO-META					
LUGAR: VILLAVICENCIO-META		Persona responsable del área: TECNICO OPERADOR							
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR		OBSERVACIONES	OPCIONES			VALORACIÓN			
			SI	NO	N/A	A	B	C	D
CONDICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1 RECEIVER SATELLITE (GPS) (L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5		X			X			
	2 RECEIVER SATELLITE (GLONASS) (L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L3, L5		X			X			
	3 RECEIVER SATELLITE (BEIDOU) B1, B2, B3		X			X			
	4 RECEIVER SATELLITE (GALILEO) E1, E5 A/B/C, E5a, E5b, E6		X			X			
	5 RECEIVER SATELLITE (QZSS) L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6		X			X			
	6 RECEIVER SATELLITE (SBAS) L1, L5		X			X			
	7 CHANNELS 220		X			X			
	8 HIGH PRECISION STATIC SURVEYING	Horizontal 2.5 mm + 1 ppm RMS Vertical 5.0 mm + 1 ppm RMS	X			X			
	9 REAL TIME KINEMATIC (<30km) -NETWORK SURVEYING	Fixed RTK horizontal 8mm +1 ppm RMS Fixed RTK vertical 15mm +1 ppm RMS	X			X			
	10 INTERNAL RADIO frequency range 457-467 MHz		X			X			
	11 INTERNAL RADIO maximum range 2- Km in urban environment		X			X			
	12 INTERNAL RADIO maximum range up to 10 Km with optimal		X			X			
	13 POWER SUPPLY WORKING TIME 5 hours	WORKING 5 hours	X				X		
REGISTRO FOTOGRAFICO									
OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR		OBSERVACIONES	OPCIONES			VALORACION			
			SI	NO	N/A	A	B	C	D
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (PINTURA - TAPAS)		-	X			X			
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (HARDWARE)		-	X			X			
CONFIGURACION DE SISTEMA DE COORDENADAS (WGS84)		-	X			X			
Observaciones:									
EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS.									
Nombre: ANDRES HERNANDEZ MORENO		Cargo: TECNICO OPERADOR	Firma del responsable:						
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES									
HALLAZGO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES			NOMBRE(*)			
NINGUNA	NINGUNO	5/12/2021	-			ANDRES HERNANDEZ			
-	-	-	-			-			
-	-	-	-			-			
-	-	-	-			-			
-	-	-	-			-			
CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS									
A	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES								
B	LIGERA VARIACION CON LAS ESPECIFICACIONES								
C	VALORES FUERA DE RANGO CON ESPECIFICACIONES								
D	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES								



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 961.965.630 – 1.

ANEXO 3. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

FECHA DE INFORME		
MM	DD	AAAA
OCTUBRE	31	2025
MES AL QUE PERTENECE EL INFORME		
OCTUBRE		

CONTRATO N°
821

CONTRATANTE
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN

CONTRATISTA
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG)

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.

SEDE / PROYECTO
MUNICIPIO DE PUERTO GATAN

1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST										
Item	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	No. HORAS	Fecha Programada	Indicador cobertura			Indicador eficacia			Responsable O Líder
				Total asistentes a la capacitación	Numero de trabajadores programados	% de Cumplimiento	Numero trabajadores evaluados	Numero de evaluaciones eficaces	% de Cumplimiento	
1	Inducción SG-SST	2,00	24/10/2025	6	6	100%	6	6	100%	SST
2	Uso adecuado de guantes de seguridad	0,15	25/10/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST
3	Uso adecuado de gafas de seguridad	0,15	27/10/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST
4	Importancia de Estiramiento Muscular	0,15	28/10/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST
5	Pausas Activas - Hidratación	0,15	29/10/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST
6	Golpes de Calor	0,15	30/10/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST
7	Condiciones de Calor	0,15	31/10/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST

2. Programa de inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)								
Item	Inspección Realizada	Fecha	Periodicidad	Descripción del hallazgo	Plan de acción	Fecha del Cierre	% de Cumplimiento	
1	BOTIQUÍN	20/10/2025	Mensual	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
2	CAMILLA	20/10/2025	Mensual	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
3	EXTINTOR	20/10/2025	Mensual	NINGUNO	N/A	N/A	100%	


3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST			
Item	Descripción de Gestión SST y demás Actividades	Fecha	Observaciones
1	Se realizó inducción del SG-SST a todo el personal vinculado al contrato.	24/10/2025	
2	Se realizó inspección de maquinaria y equipos, se validó documentación del operador.	Diaria	
3	Se da cumplimiento a las inspecciones planeadas de los equipos de emergencias.	Mensual	
4	Se realizan charlas pre operacionales, socializando las actividades programadas para ejecutar.	Diaria	
5	Participación en simulacro nacional de refugio y evacuación.	Anual	

4. Inventario de Maquinaria y Equipos					
Item	Nombre del Equipo	Referencia	Propio o Alquilado	Nombre del Operador	Observaciones
1	EXCAVADORA	97165	ALQUILADO	YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES	NINGUNA

5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente							
Item	Descripción del hallazgo encontrado	Plan de Acción	Fecha	Se Notifico al Responsable		Fecha propuesta para el cierre	Estado
				Si	No		
1	NINGUNA	N/A	N/A			N/A	N/A


6. Seguimiento Ausentismo Laboral								
Item	Fecha	Nombre del Trabajador	Cedula	Cargo	Periodo de ausentismo		Total Dias de ausentismo	Descripción del ausentismo
					Fecha Inicial	Fecha final		
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Seguimiento a indicadores de Accidentalidad									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FATALIDAD
ACCIDENTE TRABAJO GRAVE
ACCIDENTE TRABAJO MODERADO
ACCIDENTE TRABAJO LEVE
INCIDENTES

MOVIMIENTO DE INDICADORES DE
ACCIDENTALIDAD





CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

Item	Obra / Proyecto (Empresa contratista)	Promedio Trabajadores en el Mes	Total días trabajados en el Mes	HHT	INCIDENTE	AT LEVE	AT MODERADO	AT GRAVE	FATALIDAD	TOTAL AT	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	TOTAL DÍAS CARGADOS	ÍNDICES					
													Mes	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	TASA DE AUSENTISMO	TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES
1	CAG	11	17	1098	0	0	0	0	0	0	0	0	OCTUBR E	0	0	0	0	0


8. Descripción de los Accidentes e Incidentes presentados durante la Semana

Fecha del AT	Nombre	# Cedula	Ubicación y tipo de lesión	Incapacidad	Avance incapacidad	At Investigado	Descripción del accidente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


9. Registro Fotográfico de Gestión SST




Ubicación:
OBRA
Descripción:
Inspección de botiquín y camilla.



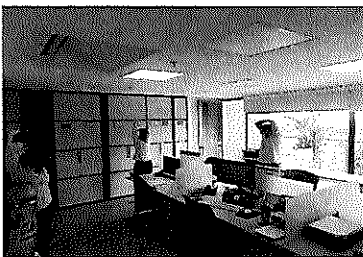
Ubicación:
OBRA
Descripción:
Inspección de extintor



Ubicación:
OBRA
Descripción:
Inspección de camilla.




Ubicación:
OFICINA
Descripción:
Charla SST: Importancia de Estiramiento Muscular



Ubicación:
OFICINA
Descripción:
Se realiza calistenia con el personal administrativo



Ubicación:
OFICINA
Descripción:
Simulacro - Refugio





CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Simulacro - Evacuación de la oficina 826



Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Simulacro - Evacuación por escaleras descendiendo los pisos del Centro Comercial Primavera.

Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Simulacro - Evacuación del piso N°8, oficina 826




Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Simulacro - Evacuación por salida de emergencia del Centro Comercial Primavera.



Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Simulacro - Evacuación hacia el punto de encuentro.



Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Simulacro - Llegada al punto de encuentro.



Ubicación:

Resguardo indígena Wacoyo

Descripción:

Se realiza Charla SST: Condiciones de calor

10. Comentarios generales SST

- Es importante destacar que se ejecutaron actividades de suministros de equipos, estructura y materiales para el desarrollo del proyecto, por lo tanto no se conto con personal operativo en el proyecto.
- De acuerdo a lo anterior se realiza el presente informe teniendo en cuenta el personal independiente, que debido al desarrollo de proyecto solo se realizaron actividades de inspección.

FIRMA

NOMBRE

CARGO

GUSTAVO MEDINA

RESPONSABLE SST



INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 15 10 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: GUSTAVO ADOFO MEOWA PARDO Documento: 1121869998
Cargo: COORDINADOR SST N° de celular: 3212196850

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplice las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha

DD

MM

AAAA

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, GUSTAVO ADOFO MEDINA PAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1121869998, desempeñando el cargo de COORDINADOR SST Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: [Firma]

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Edem Guzman

Firma: [Firma]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: GUSTAVO ADOLFO MEGUÑA PARDO

Fecha: 15-10-2025

Cedula: 1121869998

Cargo: COORDINADOR SST

Puntaje Obtenido: 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

☒ a. Verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ b. Política de alcohol y drogas.

☒ c. Política SST.

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ a. Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ a. Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión

☒ d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

☒ a. Reportar una condición de salud desfavorable.

b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
- c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
- ☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
- c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
- d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- ☒ a) SI Ubicación: CANCHA DE FÚTBOL
- b) NO

Firma del trabajador

C.C.:

1121869998

Responsable de la Inducción

Edwin Guzman
Cargo: Coordinador

!!Gracias por su participación!!



INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: OVAL ALLEN ROMERO Documento: J.004 819 005
Cargo: Oficiante N° de celular: 311 498 3293

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO


Yo, DUVAN ALEJANDRO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3004892025, desempeñando el cargo de Oficina Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: Duvan Romero

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MORA

Firma: 



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: DUVAN ADLEY

Fecha: 24-10-2025

Cedula: 1 004 819 005

Cargo: Oficial

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ Política de alcohol y drogas.

☒ Política SST.

d. Política de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

☒ Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

☒ Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
c. Verificar el área de trabajo. ☒ Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- ☒ a) SI Ubicación: PORTILLA DE LA OBRA
b) NO

Firma del trabajador

c.c.: Juvan Romero
30049219005

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!



INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: OLIVER RAMÍREZ Documento: 1.322.236.284
Cargo: Oficinista N° de celular: 3135 228336

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo) , iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (☒) RE-INDUCCIÓN (☐)

Fecha 24 / 10 / 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO


Yo, BRISELY RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1122886264, desempeñando el cargo de OFICIA Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: BRISELY RAMÍREZ

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MORA

Firma: 



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: BLESLEY RAMIREZ

Fecha: 24-10-2025

Cedula: 1522 236 284

Cargo: Oficial

Puntaje Obtenido: 100 %

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ a. Verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ b. Política de alcohol y drogas.

☒ c. Política SST.

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ a. Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ a. Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión

☒ d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

☒ b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
c. Verificar el área de trabajo. ☒ Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- a) ☒ Ubicación: PORTERA
b) NO

Firma del trabajador

c.c.: Bnder Zamilet
5522 236284

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEDINA
Cargo: COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: SOSE MONCADA Documento: J 093 923 945
Cargo: OPERA N° de celular: 3124861639

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplice las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (SI - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	SI
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	SI
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	SI
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	SI
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	SI
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	SI
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	SI



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, JOSE MONTAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 109392345, desempeñando el cargo de Operario, Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo:

[Firma]

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST:

GUSTAVO MEDINA

Firma:

[Firma]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: JOSE MONCADA

Fecha: 24-10-2025

Cedula: 1.093.921.945

Cargo: OFICIA

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ Política de alcohol y drogas.

☒ Política SST.

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión

☒ Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

☒ Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. ☐ b. Usar los elementos de protección personal.
- ☐ c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- ☐ a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
- ☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
- ☐ c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

☒ a) SI Ubicación: PORTAL

☐ b) NO

Firma del trabajador

c.c.: [Firma]
1093921345

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEDINA
Cargo: COORDINADOR SST

!!Gracias por su participación!!



INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: YEFERSON ENRIQUE GALVAN Documento: 78 846 546
Cargo: Oficioso N° de celular: 8107251884

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial			Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25


VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, YERSON RAQUE GALVAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102470729, desempeñando el cargo de OPERADOR, Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: Yerson Galvan

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: GUSTAVO MEDINA

Firma: 



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: YEFFERSON ENRIQUE GALVAN

Fecha: 24-10-2025

Cedula: 78 696 546

Cargo: OPERADOR

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ Verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ b. Política de alcohol y drogas.

☒ c. Política SST.

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión

☒ d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

☒ b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- ☒ a) SI Ubicación: POLITEMA
b) NO

Firma del trabajador

c.c.: Yeferson Boluan
78646546

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEDINA
Cargo: COORDINADOR SST

¡¡Gracias por su participación!!



INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: MIGUEL DIOSID CORREA

Documento: J-503. 470 729

Cargo: OFICIAL

N° de celular: 316 95229 44

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo) , iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 24 10 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, Miguel Diodo Correa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.108420729, desempeñando el cargo de Oficial de Obra Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: Correa Miguel

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Gustavo Medina

Firma: [Firma]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: MIGUEL DÍOSID CORREA

Fecha: 24-10-25

Cedula: 103470729

Cargo: oficial

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ Verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ Política de alcohol y drogas.

☒ Política SST.

d. Política de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión

☒ d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

☒ b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. ☐ b. Usar los elementos de protección personal.
- ☐ c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- ☐ a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
- ☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
- ☐ c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- ☒ a) SI Ubicación: PORTERA
- ☐ b) NO

Firma del trabajador

c.c.: Correa Miguel
J 103 470 729

Responsable de la Inducción

GUSTAVO MEDINA

Cargo:

COORDINADOR SST.

¡¡Gracias por su participación!!



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 25-10-25

Hora: 7:00 AM

Duración: 15 minutos



Tema: USO ADECUADO DE GUANTES DE SEGURIDAD

Lugar: AWALIBA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Duvan Romero	1004819005	Oficial	Duvan R.
2	Jose Javier Mc	1122236284	Oficial	Jose Mc
3	Brisley Ramirez	1043921945	Oficial obra	Brisley Ramirez
4	Miguel Correa	1103430729	Oficial	Correa M.
5	Yeferson Galvan	10646646	Operador	Yeferson Galvan
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA / Edwin Gozman

FIRMA:  / 



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla ☒ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 29-10-25

Hora: 7:00 Am

Duración: 15 minutos

Tema: USO ADECUADO DE GAFAS DE SEGURIDAD

Lugar: AWALIBA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Miguel Osarea Ojeda	1103470729	oficial	Miguel Correa
2	Yeferson Galvan	78646546	operador	Yeferson
3	Jose Javier Mc	1093921948	oficial	Jose mc
4	Basley Ramirez	1122236284	oficial obra	Basley R
5	Duran Romero	1004819005	oficial	Duran
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA / EDWIN GOMEZ

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 28-10-25

Hora: 7:00 AM

Duración: 15 minutos

Tema: IMPORTANCIA DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR

Lugar: AWALIBA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Jose Javier Mc	1093 921 945	Ofc	Jose Mc
2	miguel Correa	1403 440 729	Oficial	Correa Mig
3	Berley Ramirez	1122 236 284	Oficial	Berley R.
4	Yeferson Galvan	78646 646	operador	Yeferson G.
5	Duvan Romero	1004 819 005	Oficial	Duvan
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Gustavo meora / Galvan Guzman

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GATÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla x Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 29-10-25

Hora: 7:00 AM

Duración: 15 minutos

Tema: PAUSAS ACTIVAS - HIDRATACIÓN

Lugar: AVALIBA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Duvan Romero	1004879005	oficial	Duvan R
2	Brisley Ramirez	112236284	ofm	Brisley R
3	Miguel Correa	1103470729	oficial	Correa M
4	Jose Javier Mc	1093921345	ofm	Jose Mc
5	Yeferson Galvan	78646546	Opm	Yeferson
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA / Edwin Guzman

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 30-10-25

Hora: 7:00 AM

Duración: 15 minutos

Tema: GOLPES DE CALOR

Lugar: AWA/IBA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeferson Galvan	78646546	Operador	Yeferson G.
2	Duvan Romero	1004 819005	of	Duvan R
3	Miguel Osorn Correa	1103 410729	oficial	Miguel C
4	Jose Javier Me	1093 921945	oficial	Jose MC
5	Bastien LAMIREZ	1122 236284	of	Bastien L
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEONA / Edem Guzman

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla__ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 31-10-25

Hora: 7:00 AM

Duración: 15 minutos

Tema: CONDICIONES DE SALUD

Lugar: AWAUBA

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Juan Romero	1004819005	Oficial	Juan R
2	Jose Javier MC	1093921995	of	Jose MC
3	Gustavo Ramirez	1122236284	oficial	Gustavo R
4	Yeferson Galvan	79646546	operador	Yeferson G
5	Miguel Correa	1103470729	of	Miguel C.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA / Edwin Guzman

FIRMA:

/ Encargado



CONSORCIO
AGUAS GATÓN
2025

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Código: SST-F-022

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Lugar: PUERTO GATÓN

Fecha de inspección: 24 10 2025

Ubicación del botiquín OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS REGALADOS INDÍGENAS

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?

Si

X

No

Localizado en lugar visible?

Si

X

No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos?

Si

X

No

El botiquín se encuentra señalizado?

Si

X

No


Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	12	04-2029	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	NO LEGIBLE	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20 UND	09-2028	
4	TIJERAS MEDIANA PUNTA ROMA	1 unidad	1	NA	
5	TAPABOCA QUIRÚRGICO	Paquete por 5	5	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 50	40	NA	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	18-04-29	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	28-04-25	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	08-08-21	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	03-21	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	11-26	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	8-28	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	1	—	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	04-2026	
16	PARCHE OCULAR	5 unidad	4	NA	
17	APLICADORES	Paquete X 20	20	NO TENE	
18	VENDA TRIANGULAR	2 unidades	2	NA	
19	JERINGAS	1 unidad	1	—	
20	SULFAPLATA 30 g	1 unidad	1	08-28	
21	SUERO ORAL SOBRE	2 unidades	3	06-2026	
22	LINTERNA	1 unidad	1	NA	
23	MASCARILLA RCP	1 unidad	1	NA	
24	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	4 UND	NA	



Observaciones Generales:


Participantes en la inspección:

GUSTAVO MAOWA
Edwin Bozman

Firma:


Edwin Bozman

		INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA			Código: SST-F-021
					Versión: 01
					Fecha: agosto 2025
Codigo: N/A		Fecha de Inspeccion: 24 de OCTUBRE de 2025			
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA		Cargo: COORDINADOR SST			
Lugar: PUEBLO GAITÁN		Ubicación de la camilla: OTRA CONSTRUCCIÓN DE ACERQUEO.			
DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA					
Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2 Estado del soporte	X				
3 Sujetadores o Manijas de agarre	X				
4 Correas de amarre o seguridad	X				
5 Lugar visible y fácil acceso	X				
6 Rotulada / Señalización	X				
7 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				
OBSERVACIONES:					
 Firma					



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST-F-020

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 24-10-2025

FECHA INSPECCIÓN:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

LUGAR: LESQUARDOS WD 16648 PUESTO GASTAN.

CARGO: CONDAMNED BST

[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:

 COMANDO EN JEFE Fuerzas Armadas de Colombia		INSPECCIÓN DE EQUIPOS										SST-F-072 VERSIÓN: 01 FECHA: Agosto 2025							
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUAS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS																			
FECHA DE INSPECCIÓN	DÍA	MES	AÑO	VINCULACIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA				LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INSPECCIÓN									
	22	OCTUBRE	2025	PROPIOS	CONTRATISTAS					PUERTO BARRAN.									
ÍTEM	VEHÍCULO	MAQUINARIA	CÓDIGO / PLACA		EQUIPO 1			EQUIPO 2			EQUIPO 3			EQUIPO 4			EQUIPO 5		
			TIPO DE VEHÍCULO / MAQUINARIA	CONDUCTOR / OPERADOR	CEDULA	FIRMA	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
1	DOCUMENTOS DEL EQUIPO	X	LICENCIA DE TRANSITO				X												
2		X	TARJETA DE PROPIEDAD / MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN		X														
3		X	TARJETA DE OPERACIÓN (Aplica servicio público para transporte de pasajeros)				X												
4		X	SOAT VIGENTE				X												
5		X	REVISIÓN TECNO MECÁNICA VIGENTE (Aplicar: Público, >2 años / Particular, >6 años)				X												
6	X	X	PÓLIZA TODO RIESGO VIGENTE (Aplica servicio público y maquinaria)																
8	DOCUMENTOS TRABAJADOR	X	X	LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE (Según categoría del vehículo)		X													
9		X	CERTIFICADO DE OPERADOR (EXCAVADORA, RETROCARGADOR)		X														
10		X	X	SOPORTE DE PAGO DE SEG. SOCIAL (Vigencia, ARL: Clase de riesgo V)		X													
12		X	X	DOTACIÓN (Uso de camisa corporativa ó chaleco con reflectivo, pantalón, botas de seguridad)		X													
13	SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA	X	X	SISTEMA DE FRENOS		X													
14		X	X	SISTEMA DE DIRECCIÓN		X													
15		X	X	SISTEMA DE SUSPENSIÓN (Muelles, amortiguadores)		X													
16		X	X	SISTEMA HIDRÁULICO		X													
17		X	X	SISTEMA ELÉCTRICO		X													
18		X	X	ESTADO TREN DE RODAJE (Llantas, orugas)		X													
19		X	X	SUJECIÓN DE ESPARRAGOS Y TUERCAS EN RINES		X													
20		X	X	ESTADO DE GUARDAFANGOS			X												
21		X	X	VIDRIOS (Panorámico, laterales, traseros)		X													
22		X	X	ESPEJOS RETROVISORES Y DE VISIÓN ANGULAR		X													
23		X	X	ESTADO GENERAL DE LIMPIAPARABRISAS		X													
24		X	X	LUCES EN BUEN ESTADO (Altas, medias, bajas, direccionales, estacionarias, stop)		X													
25		X	X	CLAXON / PITO		X													
26		X	X	ALARMA DE REVERSA		X													
27	X	X	CINTAS REFLECTIVAS (Maquinaria: Amarillo llimón. - Vehículos: Blanco en la parte delantera / Rojo-Blanco en la parte lateral - Rojo en la parte trasera)		X														
28	SISTEMA DE SEGURIDAD PASAJEROS	X	X	CINTURONES DE SEGURIDAD (Completo y abrochados)		X													
29		X	X	ESTADO DE LA(S) SILLA(S) DEL EQUIPO		X													
30		X	REPOSACABEZAS		X														
31	OTROS COMPONENTES	X	PLACAS: Frontal, posterior y laterales (este último, para servicio público)			X													
32		X	RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN (Transporte de sustancias peligrosas)			X													
33		X	Volqueta	SISTEMA DE AUTOCARPADO			X												
34		X		ASEGURAMIENTO DE COMPUERTA DEL VOLCO			X												
37	KIT DE CARRETERA	X	CONOS y/o SEÑALES TRIANGULARES REFLECTIVAS * 2			X													
38		X	TACOS DE BLOQUEO * 2			X													
39		X	HERRAMIENTAS (Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas).			X													
40		X	GATO HIDRÁULICO (con capacidad para elevar el vehículo)			X													
41		X	LLANTA DE REPUESTO			X													
42		X	CRUCETA			X													
43		X	LINTERNA			X													
44	BOTIQUÍN	X	X	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA		X													
45		X	X	ELEMENTO DE CORTE		X													
46		X	X	ALGODÓN		X													
47		X	X	GASA ESTÉRIL		X													
48		X	X	ESPARADRAPO ó VENDAS ADHESIVAS		X													
49		X	X	VENDA ELÁSTICA		X													
50	EXTINTOR	X	X	GUANTES DE LÁTEX		X													
51		X	X	CAPACIDAD DEL EXTINTOR		30 kg													
52		X	X	RECARGA VIGENTE (Verificar color del anillo)		DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
53		X	X	PRESURIZACIÓN (Verificar manómetro)		X													
54		X	X	ESTADO DEL CILINDRO		X													
55		X	X	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		X													
56		X	X	MANIJA DE TRANSPORTE		X													
57		X	X	PALANCA DE ACTIVACIÓN		X													
58		X	X	PASADOR DE SEGURIDAD		X													
59		X	X	BOQUILLA Y/O MANGUERA DE DESCARGA		X													
60	X	X	UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO		X														

PLAN DE ACCIÓN						
EQUIPO RELACIONADO EN LA INSPECCIÓN	ÍTEM INCUMPLIDO	MEDIDAS INMEDIATAS REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA	ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	CIERRE DE HALLAZGO		FECHA DE CIERRE DE HALLAZGO
				SI	NO	

OBSERVACIONES GENERALES:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		PARTICIPACIÓN COPASST:	
NOMBRE:	ROSAURO MEDINA		FIRMA
CARGO:	COORDINADOR SST		



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES

SST-F-066

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

CONTRATISTA: CAG 2025

OBRA: CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS

FECHA: 22-OCTUBRE-2025


ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Herramientas				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturón o caja de herramientas)	X			
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar	X			
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	X			
2	Herramientas de corte				
2,1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X			
2,2	Los cinceles se encuentran afilados	X			
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X	
2,4	Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, aseguradas) y no presentan defectos	X			
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	X			
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos	X			
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X			
3	Herramientas manuales y de golpe				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos	X			
4	Herramientas de torsion-llaves				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas	X			
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas	X			
4,3	Se disponen de llaves para golpear	X			
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X			
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X	
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos	X			
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas			X	
5	Herramientas electricas				
5,1	Estan limpias y lubricadas	X			
5,2	Tiene sus guardas	X			
5,3	Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
5,4	El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico)	X			
5,5	En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes	X			
5,6	Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños	X			
5,7	Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes	X			
5,8	Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve			X	
5,9	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X			
6	Herramienta neumática				
6,1	Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)	X			
6,2	Se trabaja a las presiones indicadas	X			
6,3	La herramienta es descargada al terminar	X			
7	Herramienta por detonación				
7,1	El personal se encuentra autorizado			X	
7,2	Se descarga y es almacenada			X	
7,3	Su sistema de disparo es bajo presión			X	

ACCIONES DE MEJORA

Item	Acción	Responsable	Fecha de reinspeccion

RESPONSABLE SST

RESPONSABLE DE LA INSPECCION



INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MECANIZADAS

SST-F-073
VERSIÓN: 01
FECHA: AGOSTO 2025

FECHA DE INSPECCIÓN		DÍA	MES	AÑO	HERRAMIENTAS PROPIAS		CONTRATISTA RESPONSABLE	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS ESQUADROS MOIGENA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.															
		22	OCTUBRE	2025	☒		NO																	
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INSPECCIONADA (Nombre de la herramienta a inspeccionar)																								
ITEM																								
UNIFORMES DE SEGURIDAD - HERRAMIENTAS MECANIZADAS																								
NOTA: Marque según corresponda:																								
Los equipos poseen aislamiento dieléctrico y su clavija se encuentra en buen estado.																								
Antes de realizar el cambio de discos, brocas, puntas o cuchillas, se apaga el equipo.																								
Se hace uso de las llaves adecuadas para realizar el cambio de discos, brocas y cuchillas.																								
El almacenamiento de las herramientas eléctricas se hace en sitios adecuados, aislados de la humedad.																								
Los discos, brocas, puntas, cuchillas y piezas claves se encuentran en buen estado.																								
Las rpm (revoluciones por minuto) de la pulidora, no son superiores a la capacidad del disco empleado.																								
Los cables poseen aislamiento doble, polo a tierra y se encuentran libres de daño.																								
Las conexiones de las mangueras neumáticas, cuentan con mecanismos de seguridad como pines "V" y/o sistema anti látigo.																								
Las mangueras de los equipos neumáticos, se encuentran en buen estado y no presentan fugas de aire.																								
Cuentan con todas sus piezas bien ajustadas (guardas de seguridad, manijas de sujeción, resguardos, carcassas, etc.,).																								
Las mangueras hidráulicas se encuentran en buen estado.																								
Los equipos hidráulicos tienen instalada la manquera de retorno.																								
El equipo inspeccionado no presenta fugas (aceite, gasolina, refrigerante...).																								
El depósito de combustible, acoples y refrigerantes, están en buen estado y no permiten fugas ni derrames.																								
El tubo de escape cuenta con guarda y silenciador.																								
La motosierra cuenta con capuchones o protector para cubrir la cadena dentada.																								
La cadena dentada de la motosierra se encuentra correctamente tensada y afilada.																								
Al soltar el gatillo de aceleración de la motosierra, la cadena se detiene.																								
Los operarios hacen uso de los epp aplicables (casco, guantes, botas de seguridad, protección visual, facial, auditiva y respiratoria...).																								
Los operarios conocen las normas de seguridad para el uso seguro de herramientas accionadas por motor.																								
Se inspecciona el área y se remueven los obstáculos antes de dar inicio a la actividad.																								
ESTADO DEL HALLAZGO									RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN								FIRMA		FECHA DE VERIFICACIÓN		ABIERTO		CERRADO	
HERRAMIENTA RELACIONADA EN LA INSPECCIÓN									ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS															
ITEM INCUMPLIDO																								

[illegible]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: SST-F-023

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 21-10-2025

Lugar: OFICINA 826

Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SST

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
PELIGROS FISICOS					
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.	X			
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores)	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
PELIGROS ELÉCTRICOS					
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X			
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	X			
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	X			
16	Existe señalización de peligros.	X			
PELIGROS DE SEGURIDAD					
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.				
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.				
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
PELIGROS BIOLÓGICOS					
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
PELIGROS BIOMECANICO					
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.				
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.	X			
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.620 – 1

ANEXO 4. AFILIACIONES, SOPORTES PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.

[illegible]


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905669423	9494411431	E	2025/11/11	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$6,534,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					11	\$3,795,600	\$0	\$0	\$3,795,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$56,900	\$0	\$0	\$56,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$745,200	\$0	\$0	\$745,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$2,625,500	\$0	\$0	\$2,625,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$895,500	\$0	\$0	\$895,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	11	\$895,500	\$0	\$0	\$895,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					11	\$921,900	\$0	\$0	\$921,900
COFREX		CCF34	892,000,146	3	11	\$921,900	\$0	\$0	\$921,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					11	\$921,900	\$0	\$0	\$921,900
CAJACOMI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$14,300	\$0	\$0	\$14,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$143,700	\$0	\$0	\$143,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$721,000	\$0	\$0	\$721,000
TOTAL					11	\$6,534,900	\$0	\$0	\$6,534,900

aportes
en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación		dv		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono Exonerado SENA e ICBF													
NIT 901965630		1		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		VILLAVICENCIO		CL 15 40 01		VILLAVICENCIO-META		3142334798 SI													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																			
Pensión		Salud		2025-10		1905640261		9494246827		Y		Limite		2025/11/11		2025/11/05		BANCOLOMBIA		Dias Hora		0		Valor		\$99,100	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombre									Codigo Das	IBC	Aporte	Codigo Das	IBC	Aporte	Codigo Das	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL CAG RESGUARDOS INDIGENAS (1 Afiliados)																											
Centro de Trabajo CAG RESGUARDOS INDIGENAS (1 Afiliados)																											
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (1 Afiliados)																											
I CC	84010134	GUTIERRAZ PASTRANA EDWIN T									0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	14+11	30	\$1,423,500	6.9400	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100		
Total Afiliados(1)										\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,423,500	\$99,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$99,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación		dv		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono Exonerado SENA e ICBF													
NIT 901965630		1		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		VILLAVICENCIO		CL 15 40 01		VILLAVICENCIO-META		3142334798 SI													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																			
Pensión		Salud		2025-10		1905640261		9494246827		Y		Limite		2025/11/11		2025/11/05		BANCOLOMBIA		Dias Hora		0		Valor		\$99,100	
RESUMEN DE PAGO																											
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES-HORA INCAPACIDADES		SALDOS E VALOR A PAGAR													
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$99,100		\$0		\$0		\$99,100											
ARL SURA		14-11		890,903,790		5		1		\$99,100		\$0		\$0		\$99,100											
TOTAL								1		\$99,100		\$0		\$0		\$99,100											


2025/10/09 01:08 PM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
Cc 86040134		GUZMAN PASTRANA EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 C.N. 74 - 77	VILLAVICENCIO-META	3204992242	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	29181081	9492155718	1	2025/10/08	2025/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$619,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$320,000	\$200	\$0	\$320,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$200	\$0	\$320,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$48,800	\$100	\$0	\$48,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$48,800	\$100	\$0	\$48,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$250,000	\$200	\$0	\$250,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$250,000	\$200	\$0	\$250,200
TOTAL					1	\$618,800	\$500	\$0	\$619,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 900751966	6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-10	2025-11	1906308883	9/94/412444	2025/11/19	2025/11/05	BAUCOLOMBIA	0	\$3,263,000	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes
				Codigo Dias	Aporte	Codigo Dias	Aporte	Codigo Dias	Aporte
SUCURSALE VILLAVO (4 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)									
1	CC	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA		25-14	\$3,256,100	\$3,256,100	\$3,256,100	\$3,256,100	\$3,256,100
2	CC	GOMEZ LEAL LINA MARCELA		23030	\$1,749,000	\$1,749,000	\$1,749,000	\$1,749,000	\$1,749,000
3	CC	SACRIMCO TEJERO DRYA YANIRA		25-14	\$2,702,200	\$2,702,200	\$2,702,200	\$2,702,200	\$2,702,200
4	CC	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA		23030	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)									
5	CC	MUÑOZ MARCIA JENNY ALEJANDRO		23030	\$883,784	\$883,784	\$883,784	\$883,784	\$883,784
6	CC	MUÑOZ MARCIA ALEJANDRO		23030	\$1,155,717	\$1,155,717	\$1,155,717	\$1,155,717	\$1,155,717
7	CC	PEREZ PEREZ OBER ASHED		25-14	\$2,093,500	\$2,093,500	\$2,093,500	\$2,093,500	\$2,093,500
Total Afiliados(6)					\$12,719,101	\$12,719,101	\$12,719,101	\$12,719,101	\$12,719,101
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 900751966	6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-10	2025-11	1906308883	9/94/412444	2025/11/19	2025/11/05	BAUCOLOMBIA	0	\$3,263,000	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$2,035,500	\$0	\$0	\$2,035,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,201,300	\$0	\$0	\$1,201,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$834,200	\$0	\$0	\$834,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$209,300	\$0	\$0	\$209,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$209,300	\$0	\$0	\$209,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$509,100	\$0	\$0	\$509,100	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$509,100	\$0	\$0	\$509,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$509,100	\$0	\$0	\$509,100	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	6	\$509,100	\$0	\$0	\$509,100	
TOTAL				6	\$3,263,000	\$0	\$0	\$3,263,000	

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: junio 2025

Villavicencio, 04 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

Yo, **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**, identificada con Cédula de ciudadanía. No. 40.395.435 de Villavicencio y TP 227117 -T, designada como Contadora del **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con **NIT. 901.965.630-1**, certifico que en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025, CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" la entidad cumplió del 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, y en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicios Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, por lo tanto la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año 2025.

Cordialmente,


LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO
 R.L. CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025


DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
 C.C. 40.395.435 DE VILLAVICENCIO
 CONTADORA PUBLICA
 TP 227117-T

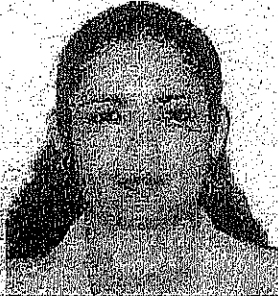
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.395.435
MACHADO TEJEIRO

APELLIDOS
DIVA YANIRA

NOMBRES

[Firma]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1972

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

24-SEP-1990-VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL BANCHEZ TORRES



A-5200100-00126010-F-0040395435-20081108

00055-2014A 1

6720006039

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

227117-T

PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMO CONTADOR DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

DIVA YANIRA
MACHADO TEJEIRO
C.C. 40395435

RES. INSCRIPCION 297 DEL 31/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231370

244584

Unión Nacional de Contadores S.A. 170140117

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 8444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 5. PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO


 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	FORMATO PAZ Y SALVO	Código: HG-F-019
		Versión: 001
		Fecha: septiembre 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

PAZ Y SALVO

Yo, **EDWIN GUZMAN PASTRANA** mayor de edad, identificado con C.C. No. 86.040.134 expedida en Villavicencio (Meta), hago constar que el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con NIT. 901.965.630-1, y domicilio en la ciudad de Villavicencio, cumplió con todas las obligaciones que por Ley y acuerdos privados que se establecieron en el desarrollo de las actividades como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL** desempeñadas desde el 29 de agosto del 2025 al 28 de octubre del 2025; en la ejecución del Contrato Obra No. **0821** de **2025** “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”. Y que en consecuencia manifiesta estar de acuerdo con todos los términos, conceptos, pagos, liquidaciones o cualquier otro concepto comercial y/o laboral creado entre las partes.

El presente documento se firma en Puerto Gaitán - Meta, el día treinta (30) de octubre del año 2.025.


FIRMA
 NOMBRE: Edwin Guzmán Pastrana
 C.C. No. 86.040.134 de Villavicencio (Meta)



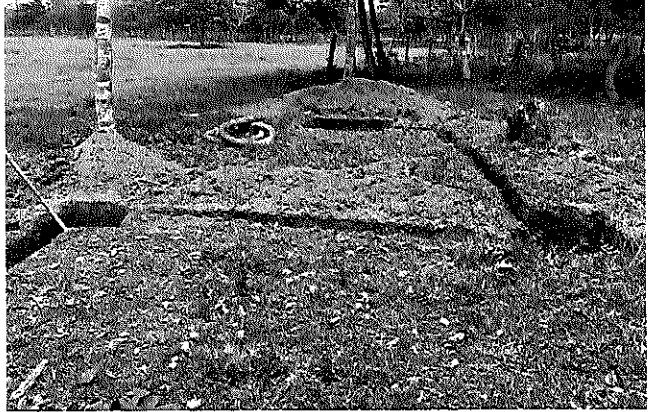
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO WACOYO

COMUNIDAD LA CAIMANA	
Ítem 1,1) LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS  <i>Localización y replanteo</i>	Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS  <i>Construcción piscina de lodos</i>
Ítem 1,3 PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.  <i>Perforación de prueba</i>	



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD KALIWIRNAE	
Ítem 4,3) EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE 	Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS 
<i>Excavación manual</i>	<i>Camada de arena</i>
Ítem 4,7) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 	Ítem 4,15) EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE 
<i>Transporte material pétreo</i>	<i>Excavación Mecánica</i>

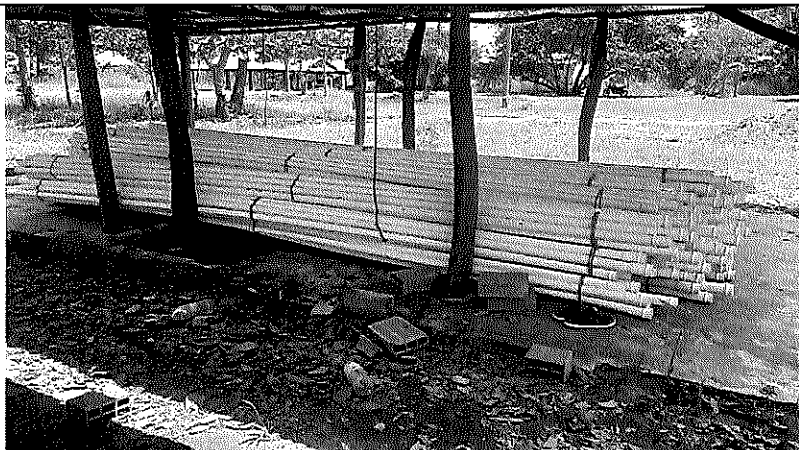


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD KALIWIRNAE

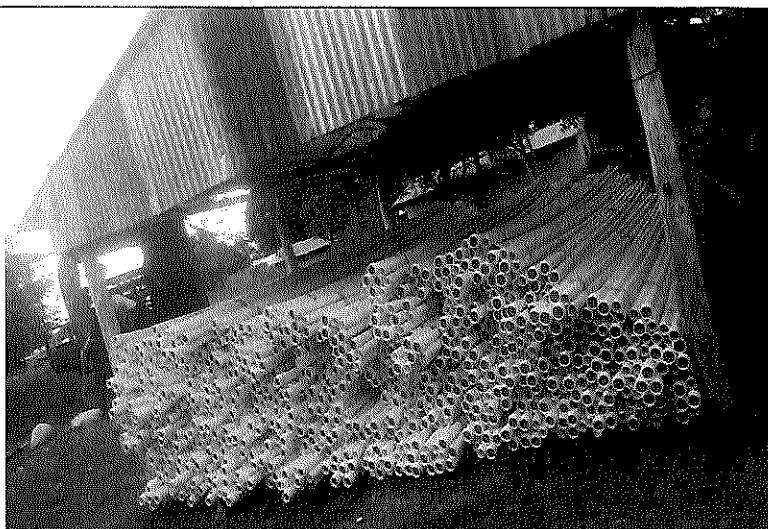
Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvc

COMUNIDAD ESMERALDA WALABO

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvc



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO AWALIBA

COMUNIDAD MAKAPAY	
Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS
	
<i>Localización y replanteo</i>	<i>Camada de arena</i>
Ítem 4,7) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	Ítem 4,15) EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE
	
<i>Transporte material pétreo</i>	<i>Excavación Mecánica</i>



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD MAKAPAY

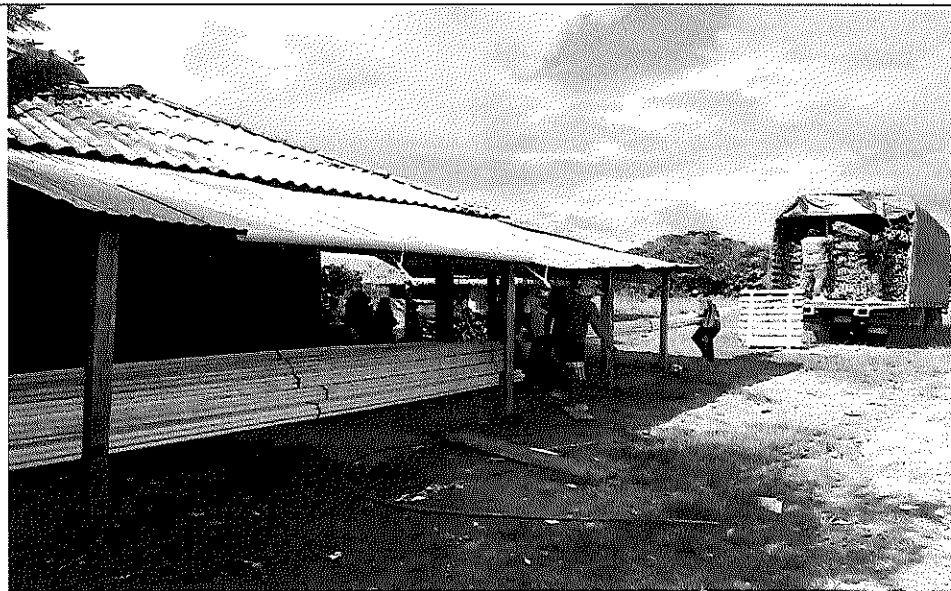
Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvc

COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvc

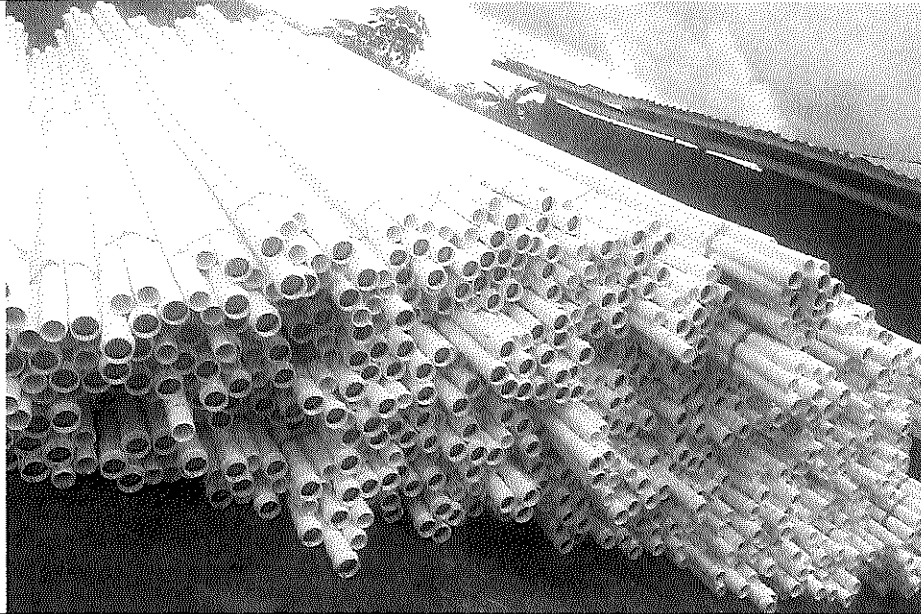


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO DOMOPLANAS

COMUNIDAD PARAISO

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvcp



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO ASEINPOME

COMUNIDAD KEKO	
Ítem 1,1) LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS 	Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS 
<i>Localización y replanteo</i>	<i>Construcción piscina de lodos</i>
Ítem 1,3 PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. 	
<i>Perforación de prueba</i>	



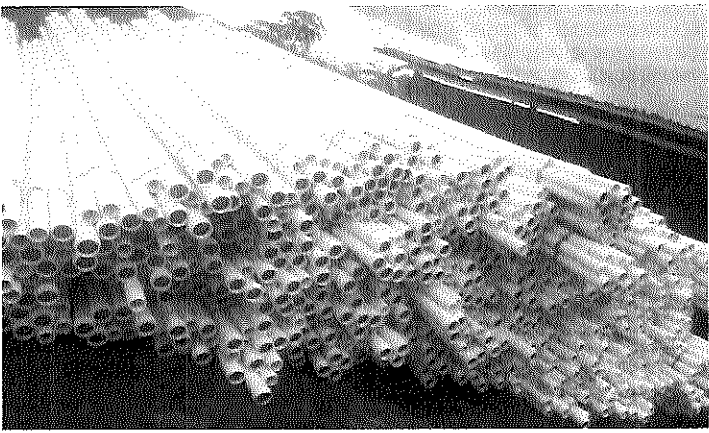
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.620 – 1

ANEXO 7. COPIA DE LA BITACORA.

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio del Meta				
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Miercoles 01 de octubre 2025	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS						
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	34	DÍAS PENDIENTES				
		422						
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO								
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUA SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"		ML	RESGUARDO WACOYO					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GARITÁN, MÉRIDA	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Garitán Mérida, Yucatán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta				
	Infraestructura							
	Código:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO						
FECHA:	Jueves 02 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	35	DÍAS PENDIENTES	421			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUA SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"		ML	RESGUARDO DOMOPLANAS					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		 RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA					
FECHA:	Viernes 03 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA					
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	36	DIAS PENDIENTES	420			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"		ML	RESGUARDO ASEINPOME					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD		TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO			
					C	NC	FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?					SI		NO	
OBSERVACIONES:								



FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12

Version:04

Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán
Municipio - Meta

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

FIRMA


RESIDENTE 2 OBRA
ING.VANESA GARZON GARCIARESIDENTE 1 INTERVENTORIA
ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara


	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Sabado 04 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	37	DÍAS PENDIENTES
				419
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
				Cascos X
				Gafas X
				Tapabocas X
				Guantes X
				Botas X
				Alcohol X
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"	ML	RESGUARDO AWALIBA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA											
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td></td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td></td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA									
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												




	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Domingo 05 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	37	DÍAS PENDIENTES				
		419						
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C		NC	
		ML						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD		TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO			
					C	NC	FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?					SI		NO	
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta, Colombia
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 RESIDENTE 2 OBRA	 RESIDENTE 1 INTERVENTORIA	
NC: No Conforme		ING. VANESA GARZON GARCIA	ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO						
FECHA:	Lunes 06 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	38	DÍAS PENDIENTES	418			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/KM	COMUNIDAD MAKAPAY					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Puerto Rico				
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Martes 07 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	39	DÍAS PENDIENTES	417			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN			CONFORMIDAD		
						C	NC	
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/KM	COMUNIDAD MAKAPAY					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA REDES		M3	COMUNIDAD MAKAPAY					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA			SI	NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS			SI	NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, MÉRIDA	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara										

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Miercoles 08 de octubre 2025	HORAS DE LLUVIA:		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	40	DÍAS PENDIENTES
		416		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Casos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL				Botas
OPERARIO				Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	COMUNIDAD MAKAPAY		
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA REDES	M3	COMUNIDAD MAKAPAY		
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD MAKAPAY		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				
	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				
	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán								
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:25%">C: Conforme</td> <td style="width:25%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:25%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:25%"></td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> <td></td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA										
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE										
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Jueves 09 de octubre 2025	HORAS DE LLUVIA:		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	41	DÍAS PENDIENTES
		415		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
				Cascos X
				Gafas X
				Tapabocas X
				Guantes X
				Botas X
				Alcohol X
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA REDES	M3	COMUNIDAD MAKAPAY		
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD MAKAPAY		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
		OBSERVACIONES		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Patria Nueva
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

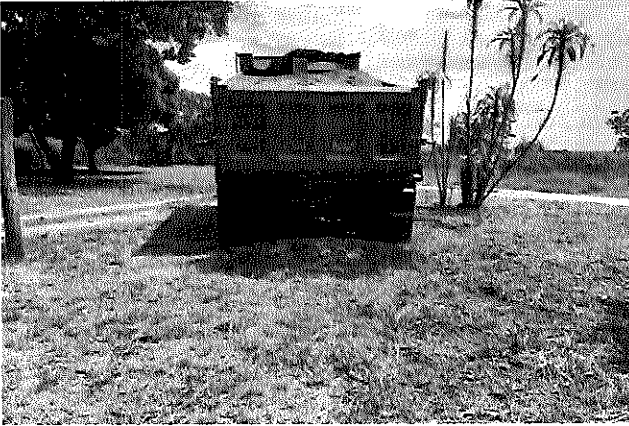

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZÓN GARCIA				
FECHA:		Viernes 10 de octubre 2025			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	42	DÍAS PENDIENTES	414				

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	COMUNIDAD KALIWIRNAE			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		


Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	




SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Sabado 11 de octubre 2025			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS		43	DIAS PENDIENTES		413		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO	
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X		
OFICIAL						Botas	X		
OPERARIO						Alcohol		X	
AYUDANTE									
TOPOGRAFO									
ALMACENISTA	1								
CONDUCTOR	2								
CONTADOR	1								
SECRETARIA	1								
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON									
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD				
					C		NC		
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/KM	COMUNIDAD KALIWIRNAE						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES							
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES							
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.									
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA									
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO							
		C	NC	FECHA					
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO						
OBSERVACIONES:									

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	 FIRMA RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NC: No Conforme				
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Domingo 12 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	44	DÍAS PENDIENTES				
		412						
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Gautes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
		ML			C	NC		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO				
				C	NC	FECHA		
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				SI		NO		
OBSERVACIONES:								

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Páramo Negro
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZÓN GARCIA		
FECHA:	Lunes 13 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	45	DÍAS PENDIENTES
411				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO Operación Mantenimiento
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Elemento SI NO			
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL				Botas
OPERARIO				Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Tercera Frontera								
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:25%">C: Conforme</td> <td style="width:25%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:25%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> <td></td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA										
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE										
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio de Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Martes 14 de octubre 2025			HORAS DE LLUVIA: 1 HORA				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	46	DIAS PENDIENTES	410				

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Gautes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	COMUNIDAD KALIWIRNAE			
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA REDES	M3	COMUNIDAD KALIWIRNAE			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

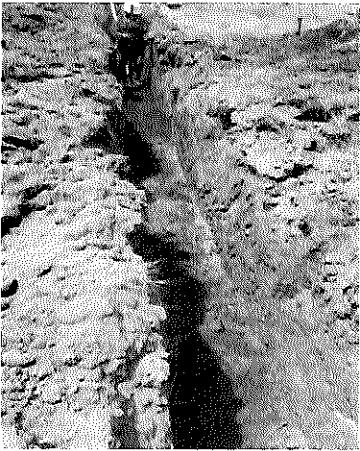
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Miercoles 15 de octubre 2025	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	47	DÍAS PENDIENTES
		409		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL				Botas
OPERARIO				Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA REDES	M3	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES			SI	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES			SI	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZÓN GARCÍA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIÁN ANDRÉS DÍAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara				

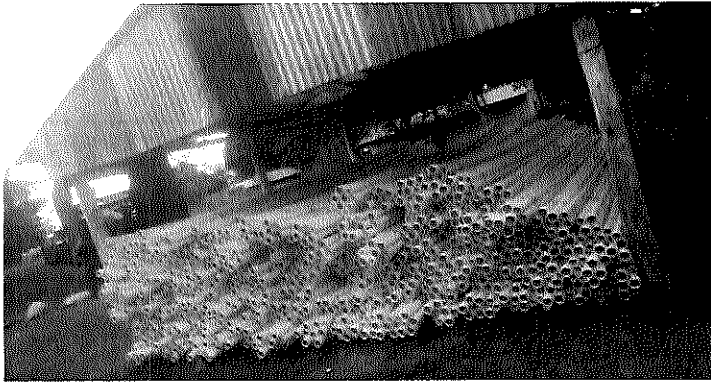



	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Jueves 16 de octubre 2025	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	48	DÍAS PENDIENTES
		408		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Gautes
OFICIAL				Botas
OPERARIO				Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA REDES	M3	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERTIAS	M3	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES				NO
OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES				NO
OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO CALTÁN, Mérida	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Caltán						
	Infraestructura									
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara										



	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Viernes 17 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	49	DÍAS PENDIENTES
				407
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL				Botas
OPERARIO				Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUA SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"	ML	RESGUARDO AWALIBA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
				NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAYÁN, MÉRIDA	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gayán MÉRIDA
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

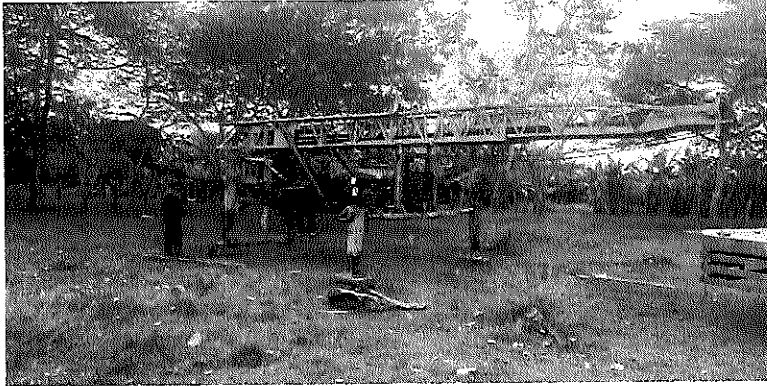

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Sabado 18 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	50	DIAS PENDIENTES
		406		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
				Cascos X
				Gafas X
				Tapabocas X
				Guantes X
				Botas X
				Alcohol X
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUA SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"	ML	RESGUARDO WACOYO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GARITÁN, Mérida	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Garitán								
	Infraestructura											
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">C: Conforme</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA </td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> <td></td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA										
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE										
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro				
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Domingo 19 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	51	DIAS PENDIENTES				
				405				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL						Botas	X	
OPERARIO						Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta - Colombia
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Lunes 20 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	52	DÍAS PENDIENTES
				404
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTÁDO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL				Botas
OPERARIO				Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD LA CAIMANA		
INICIO ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS	UND	COMUNIDAD LA CAIMANA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Piedra del Humo
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

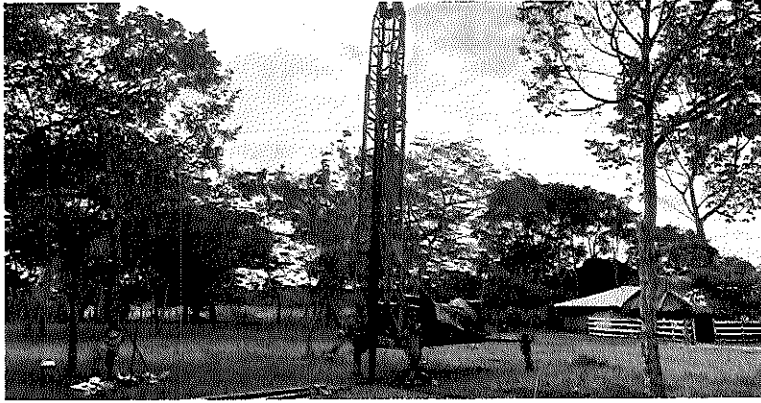
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Martes 21 de octubre 2025			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	53	DIAS PENDIENTES		403			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4					Botas	X	
OPERARIO	1					Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS	UND	COMUNIDAD LA CAIMANA			
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD LA CAIMANA			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
			SI	NO	

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

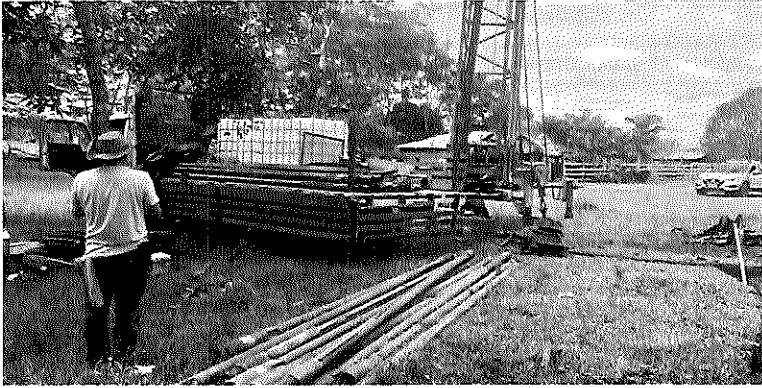

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				
		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				


	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Miercoles 22 de octubre 2025	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	54	DÍAS PENDIENTES
		402		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4			
OPERARIO	1			
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
				Cascos X
				Gafas X
				Tapabocas X
				Guantes X
				Botas X
				Alcohol X
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD LA CAIMANA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Jueves 23 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	55	DÍAS PENDIENTES
				401
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL	4			Botas
OPERARIO	1			Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD LA CAIMANA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
				NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio de Meta
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Viernes 24 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	56	DÍAS PENDIENTES
				400
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL	4			Botas
OPERARIO	1			Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD KEKO		
INICIO ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS	UND	COMUNIDAD KEKO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				


	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Sabado 25 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	57	DÍAS PENDIENTES				
				399				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4					Botas	X	
OPERARIO	1					Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C		NC	
ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS		UND	COMUNIDAD KEKO					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO				
				C	NC	FECHA		
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				SI		NO		
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Domingo 26 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	58	DÍAS PENDIENTES				
		398						
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4					Botas	X	
OPERARIO	1					Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD					
			C	NC				
	ML							
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO			
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO			
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO			
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO					
			C	NC	FECHA			
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI		NO			
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GALVÁN, MPTA	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Galván
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				


	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Lunes 27 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	59	DÍAS PENDIENTES				
				397				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4					Botas	X	
OPERARIO	1					Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO		ML	COMUNIDAD KEKO					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO				
				C	NC	FECHA		
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				SI		NO		
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DC PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán El Buen Gobierno
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara				

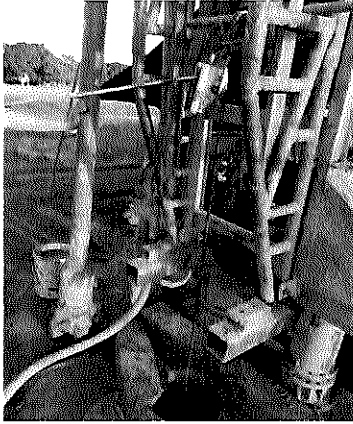

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Martes 28 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	60	DÍAS PENDIENTES				
				396				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4					Botas	X	
OPERARIO	1					Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO		ML	COMUNIDAD KEKO		C	NC		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO CASTAÑ, Mérida	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Castañ
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara				

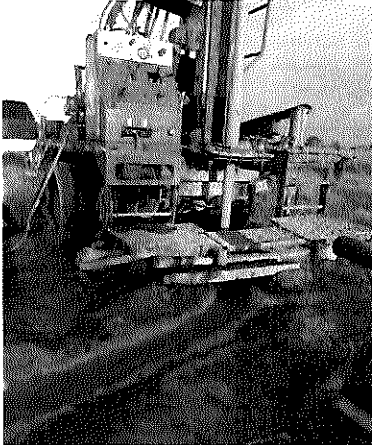

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Miercoles 29 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	61	DÍAS PENDIENTES
				395
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes
OFICIAL	4			Botas
OPERARIO	1			Alcohol
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA REDES	M3	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	COMUNIDAD KALIWIRNAE		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
				NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GALVÁN, Mérida	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Galván
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Jueves 30 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA: 1 HORA					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	62	DÍAS PENDIENTES	394			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Gautes	X	
OFICIAL	4					Botas	X	
OPERARIO	1					Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO		ML	COMUNIDAD LA CAIMANA					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				


	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Viernes 31 de octubre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	63	DIAS PENDIENTES
		393		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos X
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes X
OFICIAL	4			Botas X
OPERARIO	1			Alcohol X
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO	ML	COMUNIDAD KEKO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán "El alma de la zona"
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.620 – 1.

ANEXO 8. NOMINAS DEL PERSONAL.



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630-1

Nómina del día 01 al 15 de Octubre de 2.025

Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Riesgo	Sueldo básico	Días trabajados	Total básico	Año de transporte	Licencia remunerada	Incapacidad (en días)	Fondo No Salario	Total Demergido	Salud	Pensión	Fondo Solidario Previsión	Retención Cuentas	Total Deducciones	Neto Pagar	Observaciones
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.423.500	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ -	\$ 57.000	\$ 754.750	Se envía desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_JNGCVI@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000	Se envía desprendible de nómina al correo: Ing.wvg2@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ -	\$ 485.000	\$ 5.005.000	Se envía desprendible de nómina al correo: Inguluisfernandom@gmail.com
MURCIA JOLIOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	\$ 1.912.000	15	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.056.000	\$ 38.200	\$ 38.200	\$ -	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.600	Se envía desprendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	\$ 3.300.000	15	\$ 1.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	\$ 132.000	\$ 1.518.000	Se envía desprendible de nómina al correo: askp87@hotmail.com
TOTALES						\$ 9.867.750	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.267.750	\$ 398.700	\$ 398.700	\$ 55.000	\$ -	\$ 852.400	\$ 9.415.350	

Salario Mínimo Legal Vigente 2025
Auxilio de transporte \$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	5,98%

FECHA ENVÍO DESPRENDIBLES DE NÓMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NÓMINA

NOVEDAD INGRESO
OTRO
VACACIONES

Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2017
marque con una "X" si es así.

SI X


A cargo del empleador	
Seguridad Social	Valor
Salud	\$ 855.304
Fondo de Pensiones	\$ 102.678
ARL (régimen laboral)	\$ 855.304
ARL (régimen laboral)	\$ 415.655
Total Seguridades Sociales	\$ 2.228.940
Parafiscales	\$ 1.535.795
Caja Compensación Familiar	\$ 398.710
ICBF	\$ 0
SENA	\$ 0
Total Parafiscales	\$ 398.710
Total a cargo del empleador	\$ 4.163.445

Días de la nómina
Días trabajados en el día

30
7,33

Nombre del Empleado	No. Identificación	Salario Básico	Seg. Social	Parafiscales	Total
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	\$ 711.750	\$ 855.304	\$ 102.678	\$ 1.669.732
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	\$ 1.150.000	\$ 1.056.000	\$ 38.200	\$ 2.344.200
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 0	\$ 5.720.000
MURCIA JOLIOA ROSEMBERG	17.497.322	\$ 956.000	\$ 38.200	\$ 0	\$ 994.200
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 1.716.000
TOTALES		\$ 9.867.750	\$ 398.700	\$ 55.000	\$ 10.321.450

Dña YANIRA MACHADO TEJERO
V'B* CONTADORA



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 801.985.830-1
Nomina del día 16 al 31 de Octubre de 2.025
NOMINA QUINCENAL

DEVENGADO										DESCUENTOS										
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Edad	Salario Básico	Días Trabajados	Total Básico	Antes de Ingresos	Licencia Remanente	Incapacidad (EPS/AFU)	Pagos de Salario	Total Devengado	Salud	Pensión	Fondo Solididad Patronal	Reintegr. Licencia	Anticipos y Nómina	Total Descuentos	Saldo Pagaado	OBSERVACIONES	
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.328.478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.423.800	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ -	\$ 764.750	\$ 811.750	\$ -	\$ -	Se envia despendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGECIVIL@hotmail.com
GARZON GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000	\$ -	Se envia despendible de nómina al correo: Ing.wvg2@gmail.com
MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	98.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ 242.000	\$ 4.763.000	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	Se envia despendible de nómina al correo: Ingulstefernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.487.322	CONDUCTOR	5	\$ 1.912.000	15	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.055.000	\$ 38.200	\$ 38.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.600	\$ -	Se envia despendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Se envia despendible de nómina al correo: askp87@hotmail.com
TOTALES						\$ 9.377.750	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.617.750	\$ 332.700	\$ 332.700	\$ 55.000	\$ 242.000	\$ 6.480.150	\$ 2.137.800	\$ -	\$ -	

A cargo del empleador		A cargo del empleado	
Seguridad Social	Valor	Seguridad Social	Valor
Salud	0,330%	Cesantías	\$ 717.859
Pensión de Vejez	12%	Ingresos sobre cesantías	\$ 65.178
APL (Riesgo laboral)	0,522%	Prima	\$ 717.859
	4,355%	Vacaciones	\$ 346.850
	6,860%		\$ 1.965.115
Total Seguridades Sociales		Total prestaciones sociales	
		\$ 1.222.955	
Parafiscales		Valor	
Caja Compensación Familiar	4%	\$ 332.710	
ICBF	0%	\$ 0	
SEVA	0%	\$ 0	
Total Parafiscales		\$ 332.710	
Total a cargo del empleador		\$ 3.424.410	

SE ENCUENTRA EXONERADO DE PAGO DE APORTE DE PARAFISCAS Y SALUD LEY 1607 DE 2012?	SI	NO
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	SI	NO

SE ENCUENTRA EXONERADO DE PAGO DE APORTE DE PARAFISCAS Y SALUD LEY 1607 DE 2012?	SI	NO
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	SI	NO


DETALLADO										DESCUCCIONES									
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Edad	Salario Básico	Días Trabajados	Total Básico	Antes de Ingresos	Uso de Ingresos	Ingresos (Cálculo)	Pagos de Salario	Total Devengado	Salud	Pensión	Pagos de Salario	Antes de Ingresos	Total Devengado	Salud	Pensión	Pagos de Salario
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.328.478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.423.800	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 28.500	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ 754.750	\$ 811.750	\$ -	\$ -	\$ -
GARZON GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 46.000	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000	\$ -	\$ -
MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	98.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000	\$ 5.600.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ 4.765.000	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
MURCIA LOAIZA ROSEMBERG	17.487.322	CONDUCTOR	5	\$ 1.912.000	15	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 38.200	\$ 1.055.000	\$ 38.200	\$ 38.200	\$ -	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.800	\$ -	\$ -
TOTALES						\$ 9.377.750	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 332.700	\$ 9.617.750	\$ 332.700	\$ 332.700	\$ 55.000	\$ 242.000	\$ 9.480.150	\$ 2.137.800	\$ -	\$ -

SE ENCUENTRA EXONERADO DE PAGO DE APORTE DE PARAFISCAS Y SALUD LEY 1607 DE 2012?	SI	NO
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	SI	NO

SE ENCUENTRA EXONERADO DE PAGO DE APORTE DE PARAFISCAS Y SALUD LEY 1607 DE 2012?	SI	NO
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	SI	NO

DETALLADO										DESCUCCIONES									
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Edad	Salario Básico	Días Trabajados	Total Básico	Antes de Ingresos	Uso de Ingresos	Ingresos (Cálculo)	Pagos de Salario	Total Devengado	Salud	Pensión	Pagos de Salario	Antes de Ingresos	Total Devengado	Salud	Pensión	Pagos de Salario
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.328.478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.423.800	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 28.500	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ 754.750	\$ 811.750	\$ -	\$ -	\$ -
GARZON GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 46.000	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000	\$ -	\$ -
MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	98.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000	\$ 5.600.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ 4.765.000	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
MURCIA LOAIZA ROSEMBERG	17.487.322	CONDUCTOR	5	\$ 1.912.000	15	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 38.200	\$ 1.055.000	\$ 38.200	\$ 38.200	\$ -	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.800	\$ -	\$ -
TOTALES						\$ 9.377.750	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 332.700	\$ 9.617.750	\$ 332.700	\$ 332.700	\$ 55.000	\$ 242.000	\$ 9.480.150	\$ 2.137.800	\$ -	\$ -

SE ENCUENTRA EXONERADO DE PAGO DE APORTE DE PARAFISCAS Y SALUD LEY 1607 DE 2012?	SI	NO
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	SI	NO



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. 901.965.630-1
Nomina del día 16 al 31 de Octubre de 2.025
NOMINA QUINCENAL

RIESGO ARL		
Tipo	Yarifa	
I	0,52%	
II	1,04%	
III	2,44%	
IV	4,35%	
V	6,96%	

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA	
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	

NOVEDAD

OTROS (No. 1)


SE CUBIERA EL OTROSOL No. 1, DONDE SE ACUERDA ENTRE LAS PARTES UNA REDUCCIÓN SALARIAL, SIGUIENDO EN NUEVO ROL EL \$2,300.000 A MÁS DE TRANSPORTE DE \$200.000 A PARTIR DEL DÍA 25.09.2025 Y SE PROROGA EL CONTRATO A TENIMIENTO FLUJO E CAG-CIT -02.23 POR 6 MESES FINALIZANDO EL 24.06.2026

IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012? marque con una "X" si es así.	
SI	X

Total a cargo del empleador	\$ 711,530
Días de la semana	30
Horas trabajadas en el día	7.33
SÍ	NO
SE EMPLEA SI MERO REGULAR EXTRA PARA UNO O VARIOS TRABAJADORES	
X	

[illegible]


DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
V^oB^o CONTADORA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. 901.965.630-1
Nomina del día 01 al 31 de Octubre de 2.025
NOMINA MENSUAL

[illegible]

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
VºBº CONTADORA

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_OCTUBR
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 16-10-2025 Hora: 11:51:28 Fecha de envío del pago: 15-10-2025
Fecha de Generación: 16-10-2025 Fecha para Procesar el pago: 15-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,055,422.00	Valor Registros Procesados: \$9,055,422.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,158,072.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025
0000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	5,005,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025
84968486569	Ahorros	1121834340	GUILLERMO ALBERTO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA_16AL31OCTUBR
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 04-11-2025 Hora: 09:13:11 Fecha de envío del pago: 31-10-2025
Fecha de Generación: 04-11-2025 Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,295,672.00	Valor Registros Procesados: \$3,295,672.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,158,072.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
84968486569	Ahorros	1121834340	GUILLERMO ALBERTO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 30-10-2025
Fecha de Generación: 30-10-2025

Hora: 14:21:41
Fecha de envío del pago: 30-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$754,750.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$754,750.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000489190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR30-10-2025 OTRO BANCO	



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL31OCTUBRE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 31-10-2025 Hora: 13:26:11
Fecha de Generación: 31-10-2025
Fecha de envío del pago: 31-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,760,333.00	Valor Registros Procesados: \$3,760,333.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003183993083	Ahorros	1103470729	MIGUEL DOISID CORR	508,267.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
84959547491	Ahorros	78646546	YEFERSON ENRIQUE G	484,933.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
00000003125364066	Ahorros	1121869998	GUSTAVO ADOLFO MED	1,382,333.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
00000003124865277	Ahorros	1093921945	JOSE JAVIER MONCAD	414,933.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
28900043629	Ahorros	1122236284	BRISLEY RAMIREZ JI	508,267.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
00000003114981893	Ahorros	1004819005	DUVAN ARLEY ROMERO	461,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000066

FECHA: 31/10/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501003	1	300920	PRESTACION SERVICIOS OCTUBRE	86040134	GUZMAN PASTRANA EDWI	1,423,500.00	
110505001	1	300920	PRESTACION SERVICIOS OCTUBRE	86040134	GUZMAN PASTRANA EDWI		1,423,500.00
VALOR :			1,423,500.00	SUMAS IGUALES:		1,423,500.00	1,423,500.00

OBS: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio  Nit: 86040134



MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.966-6

Nómina del día 01 al 16 de Octubre de 2.025

NOMINA PERSONA CAG 2025

Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Nómina	DETALLE										DESCUENTOS				Rate Pajido	OBSERVACION
				Saldo banco	Saldo banco	Aux de transporte	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro		
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	\$ 1.749.000	\$ 874.500	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904.500	Se envia desprendible de nómina al correo: marce_g33@hotmail.com
MACHADO TEJERO DIVA YANIRA	40.385.435	CONTADOR	1	\$ 2.702.200	\$ 1.351.100	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.343.100	Se envia desprendible de nómina al correo: divayra_2005@hotmail.com
MUÑOZ MURCIA JENIRY ALEJANDRO (VAC)	80.019.513	CONDUCTOR	5	\$ 2.038.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Se envia desprendible de nómina al correo: alejandromunoz0221@gmail.com
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	SECRETARIA	1	\$ 1.423.500	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 754.750	Se envia desprendible de nómina al correo: parada Paola18@gmail.com
PEREZ PEREZ OBER ASIMED	96.193.788	ALMACENISTA	5	\$ 1.423.500	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764.750	Se envia desprendible de nómina al correo: oberperez1979@gmail.com
TOTALES					\$ 3.643.100	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.757.100	

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACION DE LA NOMINA

Salario Mínimo Legal Vigente 2.025	\$ 1.479.500
Auxilio de transporte	\$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,99%

IMPORTANTE!	
Se encuentra autorizado de pago de aportes de Previdencia y Salud Ley 1607 de 2012	
SI	X

Total a cargo del empleador	\$ 1.515.905
-----------------------------	--------------

Costo de la nómina	30
Costo de los beneficios en el día	7,33

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Banco	Valor hora ordinaria	Cant. hora	Valor hora extra o.	Cant. hora extra	Vi hora extra nocturna	Cant. hora extra	Valor hora extra festivo	TOTAL HORAS
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	\$ 1.749.000	7.554	0	-	0	-	0	-	-
MACHADO TEJERO DIVA YANIRA	40.385.435	\$ 2.702.200	12.268	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZ MURCIA JENIRY ALEJANDRO (VAC)	80.019.513	\$ 2.039.500	9.275	0	-	0	-	0	-	-
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	\$ 1.423.500	6.473	0	-	0	-	0	-	-
PEREZ PEREZ OBER ASIMED	96.193.788	\$ 1.423.500	6.473	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0

NOVEDAD
RECAPACITACION
LICENCIA REINTEGRADA / CALAMIDAD DOMESTICA
VACACIONES
15 DÍAS HABLES (14 AL 30 OCT) LA NOMINA SE REPORTA EN EL SOPORTE DE VACACIONES
Antitipo a Nómina



MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.259-6

Nomina del día 16 al 31 de Octubre de 2.025

NOMINA PERSONA CAG 2025

Nombre del Empleado	No. Identificable	Cargo	RIESGO	DEVENGADO				DESCUENTOS				Total Descuentos	Monto Paga	OBSERVACIÓN
				Salario Básico	Salario Básico	Ant. de Transporte	Ant. de Vacaciones	Ant. de Vacaciones	Ant. de Vacaciones	Ant. de Vacaciones	Ant. de Vacaciones			
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	ASISTENTE CONTABLE	1	\$ 1.749.000	15	\$ 874.500	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ 904.500	Se envía desprendible de nómina al correo: marce.g83@hotmail.com
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	CONTADOR	1	\$ 2.702.200	15	\$ 1.351.100	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.000	\$ 1.343.100	Se envía desprendible de nómina al correo: divaya_2005@hotmail.com
MUÑOZ MURCIA JENIRY ALEJANDRO (VAC)	80.018.513	CONDUCTOR	6	\$ 2.039.500	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Se envía desprendible de nómina al correo: alejandromunoz2021@gmail.com
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	SECRETARIA	1	\$ 1.423.500	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.000	\$ 754.750	Se envía desprendible de nómina al correo: parada Paola181@gmail.com
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	ALMACENISTA	5	\$ 1.423.500	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.000	\$ 754.750	Se envía desprendible de nómina al correo: oberperez1979@gmail.com
TOTALES				\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282.000	\$ 3.757.100	

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

Salario Mínimo Legal Vigente 2.025	\$ 1.423.500
Anticipo de transporte	\$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,95%

A cargo del empleador	
VALOR	%
Seguridad Social	0,05%
Fondo de Pensiones	12%
ARL (riesgos laborales)	0,52%
Selección de la tarifa:	IV
Total Seguridades Sociales	\$ 887.239
Parafiscas	\$ 145.864
Total Parafiscas	\$ 145.864

Total a cargo del empleador	\$ 1.615.253
-----------------------------	--------------

Salario de la corporación	\$ 30
Horas extras pagadas en el día	7,33

NOMBRE DEL EMPLEADO	No. Identificación	Básico	Valor hora Ordinaria	Cant. hora	Valor hora extra c.	Cant. hora extra	Valor hora extra nocturna	Cant. hora extra día	Valor hora extra día	Cant. hora extra	Valor hora extra nocturna	TOTAL RENDIM.
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.285	\$ 1.749.000	7.954	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MACHADO TEJEIRO DIVA YANIRA	40.395.435	\$ 2.702.200	12.208	0	-	0	-	0	-	0	-	-
MUÑOZ MURCIA JENIRY ALEJANDRO (VAC)	80.018.513	\$ 2.039.500	9.275	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	1.092.394.700	\$ 1.423.500	6.473	0	-	0	-	0	-	0	-	-
PEREZ PEREZ OBER ASMED	96.193.788	\$ 1.423.500	6.473	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TOTALES				0	-	0	-	0	-	0	-	-

NOVEDAD
INCAPACIDAD
LICENCIA REANIMACIÓN CALAMIDAD DOMESTICA
VACACIONES
MUÑOZ MURCIA JENIRY ALEJANDRO (VAC)
15 DÍAS HÁBILES (14 AL 30 OCT) LA NOMINA SE REPORTA EN EL SUPORTE DE VACACIONES
Anticipo a Nómina

Empresa: MUNOZ AREVALO

NIT: 900751966

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ANTICIPONOMINA

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 05700001408

Fecha: 22-10-2025

Fecha de Generación: 22-10-2025

Hora: 13:39:40

Fecha para Procesar el pago: 22-10-2025

Fecha de envío del pago: 22-10-2025

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,000,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-10-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNOZ AREVALO

NIT: 900751966

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_OCTUBR
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 05700001408

Fecha: 16-10-2025 Hora: 11:47:32
Fecha de Generación: 16-10-2025

Fecha de envío del pago: 15-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-10-2025

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,312,600.00	Valor Registros Procesados: \$5,312,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,555,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2025
84100000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	904,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2025
84424812683	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,343,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2025
58600019048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2025
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	754,750.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2025

Empresa: MUNOZ AREVALO

NIT: 900751966

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA16AL31_OCTUBR

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 057000001408

Fecha: 31-10-2025

Fecha de Generación: 31-10-2025

Hora: 13:20:44

Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025

Fecha de envío del pago: 31-10-2025

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,312,600.00	Valor Registros Procesados: \$4,312,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	555,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	31-10-2025
84100000320	Ahorros	40326285	LINA MARCELA GOMEZ	904,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	31-10-2025
84424812683	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,343,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	31-10-2025
58600019048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	31-10-2025
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	754,750.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	31-10-2025



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

ANEXO 09. ACTAS DE VECINDAD

FORMATO ACTA DE VECINDAD

Infraestructura

Vías

Código INF-FTR-04

Vigencia: 01-01-2025

ACTA DE VECINDAD N° 01

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS PINGENAS WACAYO, ANAHEA, DOMINILAS Y ASERPONE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAIMÁN, MÉRIDA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS UNIDAS 2013

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AGUAS UNIDAS 2013

SUPERVISOR: PAUL JONAS ALEXANDER PERDOMO MORENO

TIPO DE ACTA: PREDIO

FINCA

VIAS

SISTEMA

HOJA

DE

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DATOS

Nombre del Propietario: CLAUDIA ANOREA COLA

Tipo de Tenencia: Propiedad

Otras Cual?: 1005416049

W de Identificación: RESGUARDO WACAYO

Localización: Dirección: COMUNIDAD LA CANTANA

Teléfono: Alcabala

Long. de Identificación (m):

SERVICIO

1. Agua

2. Abastecimiento

3. Energía

4. Telefonos

5. Ecos

6. Telefonos Cable

7. Otros

DESERVICIOS

1. Agua

2. Abastecimiento

3. Energía

4. Telefonos

5. Ecos

6. Telefonos Cable

7. Otros

USO ACTUAL

1. Propia

2. Arrendo

3. Otros

4. Comercial

5. Industrial

6. Deshabitado

7. Propiedad

8. Racionalidad

9. Otros

ACCESOS VEHICULAR

1. Propia

2. Arrendo

3. Otros

4. Comercial

5. Industrial

6. Deshabitado

7. Propiedad

8. Racionalidad


9. Otros

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE FUNDAMENTOS, CRISTALES, ZONAS INUNDABLES, DEMAS ASPECTOS RELEVANTES) SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE FUNDAMENTOS, CRISTALES, ZONAS INUNDABLES, DEMAS ASPECTOS RELEVANTES) SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA.



FORMATO ACTA DE VECINDAD

Infraestructura

Código: INF-FR-04

Version: 03

Vigencia: 10-01-2025



Puerto Rico

ACTA DE VECINDAD N° 01

ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

☒

REGISTRO FILMICO

☐

OTROS

☐

FIRMA

NOMBRE

C. c. N°

PROPIETARIO O TENEDOR

Clara Cova

Andrea Cova

1006446049

FIRMA

NOMBRE

C. c. N°

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Luis Fernando Muñoz Murcia

86051533 De Villavicencio

FIRMA

NOMBRE

C. c. N°

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Jorge Adolfo Díaz Sarmento

79134525 De Fontibon

COPIAS:
COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

FORMATO ACTA DE VICINIDAD
Infraestructura
Versión 03
Vigencia: 10-01-2026

ACTA DE VICINIDAD N° 02

CONTRATO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGÜEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WAGOTO, AWAJARA, DOMOPLANAS Y ASENPOMUE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META

CONTRATISTA CONSORCIO AGUAS ORIHAN 2015
INTERVENIOR CONSORCIO INTERVENIORMA AG INDÍGENAS 2015
SUPERVISOR: ING. JHON ALEXANDER PERDOMO MORENO

TIPO DE ACTA ☐ PREDIO ☐ FINCA ☐ VÍAS ☐ SISTEMA ☒ HOJA ☐ DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

DATOS
Nombre del Propietario: _____
Tipo de Tenencia: ☐ Arrendatario ☐ Propietario
Otro, Cuál?: _____
N° de Identificación: _____
Localización: _____
Teléfono: _____
Lugar de pertenencia (m): _____

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado		X	
3. Energía			
4. Telefonía	X		
5. Gas		X	
6. Televisión Cable		X	

USO ACTUAL


	1. Propia	2. Arrendado	3. Otros
1. Agropecuario	X		
2. Residencial	X		
3. Comercial			
4. Industrial			
5. Desahogado			
6. Parquesadero			
7. Recreacional			
8. Inst. educativa			
9. Otro			

ACCESOS VEHICULAR

	1. Propia	2. Arrendado	3. Otros
1. Propia			
2. Arrendado			
3. Otros			
4. Otros			
5. Otros			
6. Otros			
7. Otros			
8. Otros			
9. Otros			

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUMEDALES, GRUETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES, SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA)

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUMEDALES, GRUETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES, SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA)

 ALCALDIA PUERTO RICO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	 Puerto Rico
	Infraestructura	Vigencia: 10-01-2025
Código: INF-FR-04	Versión: 03	
ACTA DE VECINDAD N° 02		
ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD		
REGISTRO FOTOGRAFICO ☒	REGISTRO FILMICO ☐	OTROS ☐
FIRMA:  NOMBRE: <u>Federico Ponce</u> C. e. N°: <u>125548347</u> PROPIETARIO O TENEDOR	FIRMA:  NOMBRE: <u>LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA</u> C. e. N°: <u>86051533 De Villavicencio</u> REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	FIRMA:  NOMBRE: <u>JORGE ADELMAN DÍAZ SARMIENTO</u> C. e. N°: <u>79134525 De Fontibon</u> REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
ORIGINAL: CONTRATANTE COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR COPIA N° 1: CONTRATISTA COPIA N° 2: INTERVENTORIA		

[illegible]



FORMATO ACTA DE VECINDAD

Infrastructura

Código: INF-FR-04

Version:03

Vigencia: 10-01-2025

ACTA DE VECINDAD N° 03

ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO

X

REGISTRO FILMICO



OTROS

FIRMA

6/22/72

NOMBRE

NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

NUMBER

DR. FERNANDO MUÑOZ MURCIA

NUMBER

NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO

၆၃၆

C. c. N° 79134525 Da Fontibon

PROPIETARIO O TENEDOR

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

CONFIDENTIAL CONTRACTANT


COMPLAINT: PROSECUTED BY



COSMA N° 1: CONTRASTA

COFLA N° 21 INTERVENCIÓN-A

1906/8

		FORMATO ACTA DE VICINIDAD			
Código: INF-FR-04		Versión: 03		Vigencia: 10-01-2025	
Infraestructura		Puerto Aguacatan			
ACTA DE VICINIDAD N° 04					
CONTRATO/CONVENIO No. 82 DE 2025					
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA					
OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOVY, AWALUBA, DOLOPLAYAS Y ASEINPONE DEL MUNICIPIO DE PUERTO AGUACATAN, MÉT.					
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUACATAN 2025		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORA ACÍNDGENAS 2025		SUPERVISOR: ING. JOHNI ALEXANDER PERDOMO MORENO	
TIPO DE ACTA: PREDIO		FINCA		SISTEMA	
PRECIO		FINCA		SISTEMA	
PRECIO		FINCA		SISTEMA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO:					
DATOS					
Nombre del Propietario: <u>Julio Chapiraje</u>					
Tipo de Tenencia: <u>Propiedad</u> ☐ Arrendado ☐ Perteneciente ☐					
Otro, cuál?: <u>DESCEN COMUNITARIO INDÍGENA</u>					
Identificación: <u>Resguardo ASCINPONE</u>					
Pertenencia: <u>Asociación</u>					
Longitud de la intervención (m):					
SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN					
SERVICIO					
1. Agua					
2. Alcantarillado					
3. Energía					
4. Telefonía					
5. Gas					
6. Tendido Cable					
USO ACTUAL					
1. Propia					
2. Almacén					
3. Comercial					
4. Institucional					
5. Deshabitado					
6. Paraguardo					
7. Recreacional					
8. Int. en el área					
9. Otro					
ACCESOS VEHICULAR					
1. Propia					
2. Almacén					
3. Comercial					
4. Institucional					
5. Deshabitado					
6. Paraguardo					
7. Recreacional					
8. Int. en el área					
9. Otro					
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS					
[PAGAR DETALLAR EXISTENCIA DE HUMEDADES, QUE LAS ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES] DEL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA					
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS					
[PAGAR DETALLAR EXISTENCIA DE HUMEDADES, QUE LAS ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES] DEL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA					

		FORMATO ACTA DE VECINDAD			
Alcalde Municipio de Ponce		Infraestructura		Vigencia: 10-01-2025	
Código: INF-FR-04		Versión: 03		ACTA DE VECINDAD N° 04	

ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD	
☒ REGISTRO FOTOGRAFICO	☐ REGISTRO FILMICO
☐ OTROS	☐ OTROS
FIRMA  NOMBRE <u>JOSE FELIX SANCHEZ</u> C. e. N° <u>9125.552.939</u> PROPIETARIO O TENEDOR	FIRMA  NOMBRE <u>LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA</u> C. e. N° <u>80051533 De Villavieja</u> REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
FIRMA  NOMBRE <u>JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO</u> C. e. N° <u>70134623 De Fontibon</u> REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	

ORIGINAL: GUAYAMA
 COPIA N° 1: PROYECTOS DE LEJOS
 COPIA N° 1: COPIA N° 1
 COPIA N° 1: INTERVENCIÓN

[illegible]

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO	FORMATO ACTA DE VECINDAD			 Profech
	Código INF-FR-04	Infraestructura	Vigencia: 10-01-2025	

ACTA DE VECINDAD N° 05	
ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD	
REGISTRO FOTOGRAFICO	☒
REGISTRO FILMICO	☐
OTROS	☐

FIRMA	FIRMA
NOMBRE <u>Diego Quiroz R</u>	NOMBRE <u>JORGE ADELMO DÍAZ SARRIENTO</u>
C. c. N° <u>8191153</u>	C. c. N° <u>79134525 De Fontillon</u>
PROPIETARIO O TENEDOR	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

CARNAL: COPIANTE
 COPIA N° 1: FISCALIA DEL REGISTRO
 COPIA N° 2: CONTRATISTA
 COPIA N° 3: INTERVENIDORA



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.620 – 1.

ANEXO 10. ORDENES DE OPERACIÓN DE INVERSION DEL ANTICIPO

[illegible]

ITEM	Nº. FOLIA	TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACI N CORRE	HOMINISE 1	HOMINISE 2	FECHA DE APLICACI N
1	PV17E56 2		800216199		AGOFER S.A.S.	APELUDO 1 APELUDO 2

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES		
NOMBRE CARGO	FECHA AUTORIZA	FECHA
NOMBRE CARGO	NOMBRE CARGO	

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00



<https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2021.01.001>
 © 2021 Elsevier Inc. All rights reserved.

RENTAS Y GANANCIAS		CONCEPTO DE PAGO	
Reserva Cuentas	TRF ID NOMBRE DE LA ENTRADA	NOVEMBRE 1 DE NOVIEMBRE 2 DE NOVIEMBRE 3 DE NOVIEMBRE 4 DE NOVIEMBRE 5 DE NOVIEMBRE 6 DE NOVIEMBRE 7 DE NOVIEMBRE 8 DE NOVIEMBRE 9 DE NOVIEMBRE 10 DE NOVIEMBRE 11 DE NOVIEMBRE 12 DE	COMPRA DE ACCESORIOS
101	1001 (1001)	1001 (1001)	1001 (1001)

VALOR NETO OPERACIONES	\$	319 855 908.10
---------------------------	----	----------------



OTROS EXCENTOS	VALOR RETEN A CORTA	TIPO DE PAGO	BANCO	IF CUENTA	TIPO
	319.855.900.00	ACH	Bancolomb ba	1057557415	CHK

VALOR BRUTO OPERACIONES \$ 319.855.500,00

FIGURA AUTORIZADA

HOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MARGO
CARGO SUL COMERCIO AGUAS SALTANT

APR06

¿La entidad confiere numeros de factura?	SI	IMPUESTOS				
		VALORENA	RETENCIÓN FUENTE	ACTIVA	RETEILA	RETEIGACANTIA
VALOR ENITO						
319.835.900,00						

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 10:00 10 May 2015

.....

[illegible]

ITEM	Nº. ANFOLIO	TIPO US	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO NOMBRE	CONCEPTO DE PAGO	DE COMPRA Y ACCESORIOS
1	PW1735466		802161699	ACOFER S.A.S		

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES	NOMBRE CARGO	FIRMA AUTORIZADA
	NOMBRE CARGO	FIRMA AUTORIZADA
	ELABORÓ	REV.

[illegible]

... 2000 ...

Atendiendo el contrato de Fiduia Mercantili solicitamos los siguientes

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

[illegible]

Process Optimization



Visit www.ijerph.com
to read this article

[illegible]

[illegible]

Download the App

Download the App

[illegible]

VALOR NETO	\$	34.610.723,00
OTRAS CARGAS		

FIRMA AUTOGRAFADA
 NOMBRE JORGE ADELAR GARCIA ARRIETO
 CARGO RL. COISORCOTENIENTE TORONA AC RIDGEWAYS 2025

~~SECRET~~

REVISÓ

APROBÓ

SHOJOBO



OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES	
VALOR BRUTO	\$ 53,240,000.00
VALOR NETO	\$ 53,240,000.00

[illegible]

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fidelity Mercantil solicitamos los
estudiantes a los:

3	INFORME FINANCIERO	P. A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 225		
4	CUOTAS	Región	CONGRESO DE PERÚ	OAG009
5	CUOTA FINANCIERA			Barco
6	CUOTA FINANCIERA			PAPER
7	CUOTA FINANCIERA			Esencia
8	CUOTA FINANCIERA			
9	CUOTA FINANCIERA			
10	CUOTA FINANCIERA			
11	CUOTA FINANCIERA			
12	CUOTA FINANCIERA			
13	CUOTA FINANCIERA			
14	CUOTA FINANCIERA			
15	CUOTA FINANCIERA			
16	CUOTA FINANCIERA			
17	CUOTA FINANCIERA			
18	CUOTA FINANCIERA			
19	CUOTA FINANCIERA			
20	CUOTA FINANCIERA			
21	CUOTA FINANCIERA			
22	CUOTA FINANCIERA			
23	CUOTA FINANCIERA			
24	CUOTA FINANCIERA			
25	CUOTA FINANCIERA			
26	CUOTA FINANCIERA			
27	CUOTA FINANCIERA			
28	CUOTA FINANCIERA			
29	CUOTA FINANCIERA			
30	CUOTA FINANCIERA			
31	CUOTA FINANCIERA			
32	CUOTA FINANCIERA			
33	CUOTA FINANCIERA			
34	CUOTA FINANCIERA			
35	CUOTA FINANCIERA			
36	CUOTA FINANCIERA			
37	CUOTA FINANCIERA			
38	CUOTA FINANCIERA			
39	CUOTA FINANCIERA			
40	CUOTA FINANCIERA			
41	CUOTA FINANCIERA			
42	CUOTA FINANCIERA			
43	CUOTA FINANCIERA			
44	CUOTA FINANCIERA			
45	CUOTA FINANCIERA			
46	CUOTA FINANCIERA			
47	CUOTA FINANCIERA			
48	CUOTA FINANCIERA			
49	CUOTA FINANCIERA			
50	CUOTA FINANCIERA			
51	CUOTA FINANCIERA			
52	CUOTA FINANCIERA			
53	CUOTA FINANCIERA			
54	CUOTA FINANCIERA			
55	CUOTA FINANCIERA			
56	CUOTA FINANCIERA			
57	CUOTA FINANCIERA			
58	CUOTA FINANCIERA			
59	CUOTA FINANCIERA			
60	CUOTA FINANCIERA			
61	CUOTA FINANCIERA			
62	CUOTA FINANCIERA			
63	CUOTA FINANCIERA			
64	CUOTA FINANCIERA			
65	CUOTA FINANCIERA			
66	CUOTA FINANCIERA			
67	CUOTA FINANCIERA			
68	CUOTA FINANCIERA			
69	CUOTA FINANCIERA			
70	CUOTA FINANCIERA			
71	CUOTA FINANCIERA			
72	CUOTA FINANCIERA			
73	CUOTA FINANCIERA			
74	CUOTA FINANCIERA			
75	CUOTA FINANCIERA			
76	CUOTA FINANCIERA			
77	CUOTA FINANCIERA			
78	CUOTA FINANCIERA			
79	CUOTA FINANCIERA			
80	CUOTA FINANCIERA			
81	CUOTA FINANCIERA			
82	CUOTA FINANCIERA			
83	CUOTA FINANCIERA			
84	CUOTA FINANCIERA			
85	CUOTA FINANCIERA			
86	CUOTA FINANCIERA			
87	CUOTA FINANCIERA			
88	CUOTA FINANCIERA			
89	CUOTA FINANCIERA			
90	CUOTA FINANCIERA			
91	CUOTA FINANCIERA			
92	CUOTA FINANCIERA			
93	CUOTA FINANCIERA			
94	CUOTA FINANCIERA			
95	CUOTA FINANCIERA			
96	CUOTA FINANCIERA			
97	CUOTA FINANCIERA			
98	CUOTA FINANCIERA			
99	CUOTA FINANCIERA			
100	CUOTA FINANCIERA			



Instructions Page



Appendix
Operations




IS	CONFERENCE 1970-71
----	-----------------------

[illegible]

VALOR NETO A PAGAR	TIPO DE PAGO	BANCO	R ^a CUENTA	TIPO DE CANCELACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PAGADOR	REFERENCIAL INICIAL PAGO		CONCEPTO DE PAGO
						PERÍODO CANCELACIÓN	NÚMERO 1. AVELADO 2	
9.317.240.00	ACH	Banco del Estado	2057-557415	CH	800216499	AGOSTO 2015		COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

Observaciones de las Operaciones	Valor Bruto	Valor Neto
Observaciones de las Operaciones	9,973,240.00	9,973,240.00

NOMBRE	FIRMA AUTORIZADA
CARGO	

FIRMA AUTORIZADA HOMBRE CARGO	FIRMA AUTORIZADA HOMBRE CARGO	FIRMA AUTORIZADA HOMBRE CARGO
FIRMA AUTORIZADA HOMBRE CARGO	FIRMA AUTORIZADA HOMBRE CARGO	FIRMA AUTORIZADA HOMBRE CARGO



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

ANEXO 11. APROBACION DEL CONTRATO FIDUCIARIO

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 27 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
 NIT 800.079.035-1 R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 C.C. 86.051.533 de Villavicencio
 Calle 15 No. 40-01 Centro Comercial Primavera Urbana
 Celular 3123143658
Consortioaguasgaitan2025@gmail.com
 Villavicencio Meta


Asunto: ACEPTACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TITULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 (CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025).

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que ustedes atendieron cabalmente los requerimientos que le hiciera la Administración Municipal contenidos en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 0821 de 2025, cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META** " y de conformidad al Art. 91 de la Ley 1474 de 2011, "En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista" y que, frente a nuestro deber legal de pronunciamos como entidad contratante, debemos indicar que el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) por medio la Secretaria de Contratación, responde **POSITIVAMENTE** a la aceptación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración y pagos, para la Administración de los recursos entregados como anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

La mencionada aceptación, se efectúa de conformidad con el Decreto Administrativo No. 001 del siete (07) de enero de 2025, por medio del cual se deroga el Decreto No. 0180 del tres (3) de julio de 2024, y se delegan unas facultades en materia de contratación pública y ordenación del gasto en el municipio de Puerto Gaitán - Meta

Con todo respeto,


ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
 Secretaria de Contratación

Elaboró: Herdez Fabián Burgos García	Revisó: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS SO	Cargo: Secretaria de Contratación	Cargo: Secretaria de Contratación

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-807-65164-8	Página N° 001 de 001
Nombre: PA ANT CONS AGUAS GAITAN 2025- FIDUPOPUL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: KR 18 82 72	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/09/01 Hasta 2025/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
09 22	1250	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN108L002032	0 00	9,322,653,323 75	9,322,653,323 75	
09 22	1250	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN108L002033	0 00	7,069,075,138 25	16,391,728,462 00	
09 22	1250	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN108L002038	0 00	3,752,497,746 00	20,144,226,208 00	
09 22	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,480 32	20,144,720,688 32	
09 23	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,492 46	20,145,215,180 78	
09 24	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,504 60	20,145,709,685 38	
09 25	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,516 74	20,146,204,202 12	
09 26	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,528 87	20,146,698,730 99	
09 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,541 01	20,147,193,272 00	
09 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,553 15	20,147,687,825 15	
09 29	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,565 29	20,148,182,390 44	
09 30	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	494,577 43	20,148,676,967 87	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00		0 00		20,148,676,967 87		5,848,898,005 90	0 00	20,148,676,967 87

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

SIFI

CONTABILIDAD

Período: 202509

ODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	NAPL	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL				
115		EFFECTIVO	NAPL		20,150,678,863.35		20,150,678,863.35
11505		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL		20,148,676,967.87		20,148,676,967.87
1150501		BANCOS NACIONALES	NAPL		20,148,676,967.87		20,148,676,967.87
115050101		CUENTA AHORROS	NAPL		20,148,676,967.87		20,148,676,967.87
3		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL		20,148,676,967.87		20,148,676,967.87
302		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL		2,001,895.48		2,001,895.48
30205		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	NAPL		2,001,895.48		2,001,895.48
3020501		EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL		2,001,895.48		2,001,895.48
302050105		EMISORES NACIONALES	NAPL		2,001,895.48		2,001,895.48
5		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	NAPL				
505		ORDINARIOS	NAPL				
5050501		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL		2,001,895.48		2,001,895.48
505050101		PASIVO	NAPL				
590		CUENTAS POR PAGAR	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
59095		DIVERSOS	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
5909501		OTROS	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
590950101		DIVERSOS	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
5		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL				
505		PATRIMONIO	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
5050501		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL		20,150,678,863.35		20,150,678,863.35
505050105		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
510		APORTES EN DINERO	NAPL		20,146,226,208.00		20,146,226,208.00
51010		APORTES EN DINERO	NAPL		20,146,226,208.00		20,146,226,208.00
5101000		APORTES EN DINERO	NAPL		20,146,226,208.00		20,146,226,208.00
510100095		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL		20,146,226,208.00		20,146,226,208.00
9		PAGOS A TERCEROS	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
915		OTROS	NAPL		4,562,195,637.16		4,562,195,637.16
91501		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL		4,452,655.35		4,452,655.35
9150101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL		4,452,655.35		4,452,655.35
915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL		4,452,655.35		4,452,655.35
1		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL		4,452,655.35		4,452,655.35
103		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	NAPL		4,452,655.35		4,452,655.35
10395		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL	NAPL		4,450,759.87		4,450,759.87
1039501		MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL		4,450,759.87		4,450,759.87
103950101		OTROS INTERESES	NAPL		4,450,759.87		4,450,759.87
108		OTROS INTERESES	NAPL		4,450,759.87		4,450,759.87
10805		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR	NAPL		1,895.48		1,895.48
1080501		RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL		1,895.48		1,895.48
108050101		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL		1,895.48		1,895.48
		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL				
		(CR)	NAPL		1,895.48		1,895.48
		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL				
		(CR)	NAPL		1,895.48		1,895.48
		GASTOS	NAPL		4,452,655.35		4,452,655.35

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
9		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS		.00	4,452,655.35	.00
905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS		.00	4,452,655.35	.00
90501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS		.00	4,452,655.35	.00
9050101		GANANCIAS		.00	4,452,655.35	.00
905010101		GANANCIAS		.00	4,452,655.35	.00
		Total	.00	24,717,327,155.86	24,717,327,155.86	.00

DIRECTOR CONTABLE



RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-09-2025 hasta 30-09-2025

Fidelo - Sistema de Fidelcomiso

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 316331 P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025

ic.Causac.	FPg	EF	Banco Origen Banco Cuentas	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vir Bruto	Vir Dcto	Vir Neto	Estado	Observaciones	Conceptos	Fch Aprb. GG.	Núm. Ope
19/09/2025	EF	2	500807651648	900777214 LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.	7	36432082086	462.554.100,00	0,00	462.554.100,00	PAGADA	LCS251-25-Compras	PAGOS CON IMPUESTOS	29/09/2025	1
19/09/2025	EF	2	500807651648	900874864 M&G INGENIERIA S.A.S	51	09847002201	145.631.457,22	0,00	145.631.457,22	PAGADA	CTA N° 001-Mano de obra (17.475.774.87) Materiales (97.573.076.34) Transporte (30.582.606.01)	PAGOS CON IMPUESTOS	29/09/2025	2
19/09/2025	EF	2	500807651648	900740652 CONSTRUCCIVIL M&A SAS	7	05700001847	3.954.010.079,94	0,00	3.954.010.079,94	PAGADA	CTA 002-001-Mano de obra (480.487.300.88) Materiales (2.632.670.002.59) Transporte (840.552.776.49)	PAGOS CON IMPUESTOS	29/09/2025	3

Nro. de Operaciones: 3

TOTAL

0,00

4.562.195.637,16

Formas de Pago

EF PAGO ELECTRONICO ACH
CT TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT PAGO TERCEROS POR CARTA
AC CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS
CF CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67 MIBANCO S.A.
1 BANCO DE BOGOTA
6 BANCO CORPBANCA-ITAU
9 CITIBANK
12 BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA
14 HELM BANK-ITAU
23 BANCO DE OCCIDENTE
37 ADMINISTRADORA COUNTRY
51 BANCO DAVIVIENDA
60 BANCO PICHINCHA
531 FIDUCOLOMBIA
58 BANCO CREDITFINANCIERA S.A.
63 BANCO FINANFINA S.A.
59 BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
64 BANCO MULTIBANK S.A
65 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
282 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
108 IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI
46 COLTEFINANCIERA S.A.
286 JKF COOPERATIVA FINANCIERA
25 OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
128 NU COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANCI
551 DAVIPLATA

0 BANCO DE LA REPUBLICA
2 BANCO POPULAR S.A.
7 BANCOLOMBIA
10 HSBC COLOMBIA
13 BBVA COLOMBIA
19 BANCO COLPATRIA
32 BANCO CAJA SOCIAL
40 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
52 BANCO AV VILLAS
147 BANCO ALIADAS
8 SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
61 BANCO COOMEVA S.A.
62 BANCO FALABELLA S.A.
53 BANCO WWB S.A.
56 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
121 FINANCIERA JURISCOOP S.A.
89 BANCO SERFINANZA S.A
68 BANCO MUNDO MUJER S.A.
70 LULO BANK S.A.
289 COTRAFA FINANCIERA
130 BANCO UNION S.A.
507 NEQUI
124 RAPIPAY

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025
CÓDIGO 316331
NIT. 830.053.691

INFORMA:

Que en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre **CONSORCIO AGIAS GAITAN**, y Fiduciaria Popular s.a., suscrito el día 5 de agosto de 2025, denominado **P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025** código **316331**, cuyo objeto es la administración del anticipo derivado del contrato de obra pública: *"CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META."*. Se registraron la cuenta Bancaria **No 500807651648** del Banco Popular, en el cual se administran los recursos del anticipo, los rendimientos financieros que se relacionan a continuación:

PERIODO	VALOR
Septiembre 2025	\$4.450.759,87
TOTAL	\$4.450.759,87

Conforme a lo anterior, informamos que los rendimientos enunciados fueron girados al Sistema General de Regalías-SGR de conformidad con la circular externa 021 de junio 25 de 2025, donde se establece lineamientos e implementación del recaudo PSE para la devolución de rendimientos financieros y reintegros al Sistema General de Regalías, en el cual se enuncia que, a partir del 1 de julio de 2025, se encuentra habilitado el modelo de recaudo a través de Pagos Seguros en Línea (PSE) del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia (BBVA) para la transferencia de recursos a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías.

Se expide en la ciudad de Bogotá los Siete (07) días del mes de octubre de 2025, por solicitud del Fideicomitente.

Cordialmente,

Diana Karina
Arias
Avellaneda

Firmado digitalmente
por Diana Karina Arias
Avellaneda
Fecha: 2025.10.22
141740-03907

DIANA KARINA ARIAS AVELLANEDA
Coordinador de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Leidy Michel Vergara
Anexo: Extracto bancario
Soporte de pago

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Interventoría		
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION			

CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No.: No. 821 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITÁN 202

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

FECHA DE CORTE: 31 de octubre de 2025

PERIODO EVALUADO: Del 01 al 31 de octubre de 2025

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.

1. AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION AL 31 OCT	\$ 1,533,938,149	\$ 1,615,778,986
INVERSION ACUMULADA	\$ 2,666,821,903	\$ 2,781,062,177
ADELANTO EN PROGRAMACION		\$ 114,240,274

2. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

Para la fecha de corte del presente informe, se evidencia un avance físico ejecutado por valor de \$2.781.062.177, frente a un avance programado de \$2.666.821.903. Lo anterior representa un adelanto financiero del 4,28%, equivalente a \$114.240.274. El porcentaje de ejecución mensual es del 3,81%, con un acumulado del 6,56%. Dicho avance se representa en el replanteo de las comunidades indígenas, las cuales se ejecutaron durante el segundo mes, cumpliendo con los tiempos establecidos.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2025, para los fines pertinentes.

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO

Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND

Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Audaces y solidarios	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025			INF.FR-14
					Versión: 04
		Contrato de Interventoría			1004 de 2025
		Contrato de Obra Pública			0821 de 2025
CERTIFICACION					

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1004 DE 2025**,

CERTIFICO QUE:


El **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META**”, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Punto Indígena	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
				Versión: 04
		Contrato de Interventoría		1004 de 2025
		Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION				


CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES Y PREDIALES PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y SU VIGENCIA

Teniendo en cuenta las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del Contrato de Obra No. 0821 de 2025 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”, particularmente la establecida en la **CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**, numeral 34. “EL CONTRATISTA debe realizar los trámites y atender los requerimientos que le realice la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial “La Macarena”-CORMACARENA y las entidades y/o autoridades con las que se tengan permisos, licencias o autorizaciones”; en mi calidad de Interventor del contrato mencionado, para el periodo comprendido desde el 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, me permito CERTIFICAR el cumplimiento de esta obligación en relación a los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA, los cuales se encuentran vigentes y amparan las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, conforme a la siguiente relación:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	VIGENCIA	RESGUARDO INDIGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

Así mismo, se verificó que las actividades ejecutadas en obra se desarrollan dentro del alcance de los permisos otorgados y conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2025, para los fines pertinentes,


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> (Punto de Encuentro)	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025			INF.FR-14
					Versión: 04
		Contrato de Interventoría			1004 de 2025
		Contrato de Obra Pública			0821 de 2025
CERTIFICACION					

CERTIFICACION

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de octubre de 2025, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-SIP-005-2025, el **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, identificado con NIT. 901.965.630 - 1 representado legalmente por **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.051.533, certificamos que se **CUMPLIO** con los requisitos exigidos respecto a la maquinaria y equipos establecidos durante el mes de octubre de 2025. Así las cosas, a continuación, enumeramos uno a uno la maquinaria y equipos colocados en la obra en la siguiente tabla:


Tabla 1. Maquinaria y equipo dispuesto por el Consorcio Agua Gaitán 2025.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	1
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
EQUIPO DE PERFORACION	REO, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

Fuente: Elaboración propio Consorcio Interventoría AC Indígenas 2025.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil, M.P. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Pueblos Unidos	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025	 INF.FR-14
			Versión: 04
		Contrato de Interventoría Contrato de Obra Pública	1004 de 2025 0821 de 2025
CERTIFICACION			

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito **CERTIFICAR** que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de octubre de 2025, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
Ingeniero Civil M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Interventoría		0821 de 2025
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025

CERTIFICACION CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:


Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de octubre de 2025, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconfiguración y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconfiguración de las áreas intervenidas y la prevención de impactos ambientales.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
