



FECHA (D/M/A): 9/12/2025				BITACORA DE OBRA  Alcaldía de Medellín <small>Contribuye a la</small> Ciencia, Tecnología e Innovación REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA	
1. DATOS GENERALES					
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):		Faltos			
RANGO:	4	CANTIDAD:	58.15 ton / 24.75 m ³		
ZONA:	1	FRENTE DE TRABAJO:	17		
COMUNA:	7- POPULAR				
BARRIO:	LA AVANZADA				
2. DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025				CONTRATO No. 4600105052 DE 2025	
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377				CONTRATO No. 4600105322 DE 2025	
HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:			
INICIO:	7:00 pm	Jornada Nocturna, inicio de obra y traslado de maquinaria.			
TERMINACIÓN:	4:45 AM				
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA	NOCHE DESPEJADA		
		TARDE	mañana despejada parcialmente		
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES					
1. localización del frente de trabajo y zona a intervenir.					
2. Señalización de Área de intervención según PMT.					
3. marcación de carril y abscisado a intervenir.					
4. Fresado carpeta asfáltica con patologías (Piel de cocodrilo, Grietas, Baches, Etc)					
5. Demolición de carpeta asfáltica con compresor donde no llega la fresadora					
6. limpieza de carril y Retiro de Escombras.					
7. 16A con emulsión asfáltica EN tibio					
8. Aplicación de Mezcla Asfáltica MSU-19+12ap Tibia, con Finisher.					
9. Compactación de Mezcla Asfáltica con Vibro-compactador. Mixto.					
10. Sellado de carpeta asfáltica con compactador de llantas.					
11. Retiro de señalización con PMT.					
12. Orden y Aseo en frente de Trabajo.					
Nota: se inician actividades en Barrio la Avanzada de Rango 4; se hace Recomendación Previo Para Verificación de zonas de intervención.					
5. VISITANTES					
6. FIRMAS					
NOMBRE: Kelly Jimenez		Jony Alexander Angulo Gomez			
Vo. Bo. TECNICO CONTRATISTA		Vo. Bo. TECNICO INTERVENTOR			
FIRMA: 		FIRMA: 			
NOMBRE: Luis Alejandro Castro E		NOMBRE: Cristian D. Giraldo A			
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA		Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR			

FECHA (D/M/A): 9/12/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Kelly Jiménez / Alejandra Giraldo			
2	Encargado	Fernando Franco			
3	Liguero	Albeiro Acosta			
4	Rastrillero	Juan David Jiménez			
5	Rastrillero	Hernando Aboune			
6	Ayudante	Raúl Restrepo			
7	Ayudante	Cristian Hoyos			
8	Ayudante	Silfredo Beltrán			
9	Ayudante	Jhonatan Jaramillo			
10	Ayudante	Jhon Esteban Avendaño			
11	Ayudante	Wilson Amaya			
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jesús Arlen David			
18	Operador fresadora	Juan Carlos Valencia			
19	Operador finisher	Onofre Suárez			
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Edwin Cardona			
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Albeiro Abuelo			
25	Operador Mini cargador	Sebastián de la Cruz			
26	Operador Barredora	Sebastián de la Cruz			
27	Coductor Carrotanque	Jaime Gómez			
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Atlas Copco 2A 598			
3	Fresadora	Wirtgen W 1400 CP			
4	Finisher	Ubbelohde 7603-3			
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Ingersoll Rand SD-79DA			
7	Compactador llantas	Hyster CAT CW-16			
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	LEEBOY			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador	Hyundai HSL 050			
13	Barredora	" " "			
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 07/12/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO MUECOS MED	FIGURA NO.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area (m ²)	Vol (m ³)	Ton (kg)
				L(m)	A(m)	e(m)			
3000350		7A	CR 28 CL 110 TL 110 A	32	5.31	0.1046	169.92	77.77	
3000349		7B	CR 28 CL 104 TL 110	21	3.32	0.10	69.72	6.97	
TOTALES							239.64	24.75	

MEZCLA ASFALTICA


BOTADA DE ESCOMBROS

[illegible]

FECHA (D/M/A): 9/12/2025

10. ESQUEMAS

PINAR
BELLO

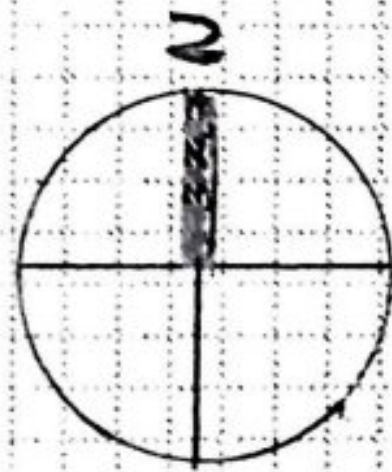

CL 108

CL 28

7A

CL 28

SEGMENTO DE VIA
3000 349

SEGMENTO DE VIA
3000 350

LA AVANZADA

SANTO DOMINGO
SAVIO

TIPO DE INTERVENCIÓN:

FALLOS

FRENTE

77

RANGO:

4

CANTIDAD:

24.75 m³

BARRIO

LA AVANZADA

DIRECCIÓN

CL 28 CL 106 CL 108

PROCTOPAL S.A. *frans J*
Ingenieros Contratista (3)

TICKETE DE BASCULA: 235462
235462

FECHA: 09/12/2025
HORA: 11:12:33 PM
CONDUCTOR: DAYRON MESA
PLACA: STE519

OBRA: 2310
NAL VIAL MED-CONS VIALMED2025
CLIENTE: 890906388
[Signature]
9/12/2025

PESO BRUTO: 31.49 Tonnes
PESO TARA: 12.43 Tonnes
PESO NETO: 19.06 Tonnes
19.06 ton

PRODUCTO: 113
MEZC .SEMI TIBIA RAP HBC19
TEMPERATURA: 141°C
VIAJE NUMERO: 3
TOTAL DESPACHADA: 58.17 Tonnes
Kelly J V.

PROCTOPAL S.A. *frans J*
Ingenieros Contratista (2)

TICKETE DE BASCULA: 235461
235461

FECHA: 09/12/2025
HORA: 11:04:15 PM
CONDUCTOR: EDGAR CORREA
PLACA: LCL816

OBRA: 2310
NAL VIAL MED-CONS VIALMED2025
CLIENTE: 890906388
[Signature]
9/12/2025

PESO BRUTO: 31.93 Tonnes
PESO TARA: 12.40 Tonnes
PESO NETO: 19.53 Tonnes
19.53 ton

PRODUCTO: 113
MEZC .SEMI TIBIA RAP HBC19
TEMPERATURA: 141°C
VIAJE NUMERO: 2
TOTAL DESPACHADA: 39.11 Tonnes
Kelly J V.

PROCTOPAL S.A. *frans J*
Ingenieros Contratista (1)

TICKETE DE BASCULA: 235460
235460

FECHA: 09/12/2025
HORA: 10:54:07 PM
CONDUCTOR: EDGAR CORDOBA
PLACA: LCL813

OBRA: 2310
NAL VIAL MED-CONS VIALMED2025
CLIENTE: 890906388
[Signature]
9/12/2025

PESO BRUTO: 31.93 Tonnes
PESO TARA: 12.35 Tonnes
PESO NETO: 19.58 Tonnes
19.58 ton

PRODUCTO: 113
MEZC .SEMI TIBIA RAP HBC19
TEMPERATURA: 142°C
VIAJE NUMERO: 1
TOTAL DESPACHADA: 19.58 Tonnes
Kelly J V.

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TRANSPORTE DE MATERIAL ③

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 9/12/2008 **Nº 237470**
OBRA: Municipio Medellin
TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo
DESTINO: Pete Potime PLACA: TN4 821

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	9m
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPOCHADO	HORA	RECIBIDO	HORA
		<u>Kelly Jimenez V.</u>	

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TRANSPORTE DE MATERIAL ①

Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 9/12/2008 **Nº 237467**
OBRA: Municipio
TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo
DESTINO: Pete Potime PLACA: TN6 811

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	14m
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPOCHADO	HORA	RECIBIDO	HORA
		<u>Kelly Jimenez V.</u>	

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TRANSPORTE DE MATERIAL ②

Código: PC F - 37
Revisión: 02
Vigencia: Marzo 2008

FECHA: 9/12/2008 **Nº 237468**
OBRA: Municipio
TRAMO O PROCEDENCIA: Santo Domingo
DESTINO: Pete Potime PLACA: TN4 821

TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD	TIPO DE MATERIAL	UND.	CANTIDAD
Material Crudo			Arena		
Sub-base Granular			Arenilla		
Base Granular			Afirmado		
Arena de Concreto			Piedra		
Triturado 3/4"			Material de Fresado	1	14m
Triturado 1 1/2"			Escombros / Tierra		
Triturado 1/2"			Otros:		

OBSERVACIONES:

DESPOCHADO	HORA	RECIBIDO	HORA
		<u>Kelly Jimenez V.</u>	
