

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán Paradiso Natural
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 17 de abril del 2026

1090-0632

Doctora:

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON

Secretaría de contratación

Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 5 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaria de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 5 en el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
 Recibido por: Kara P
 Fecha: 20 ABR 2026
 Herr: axu Zam

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES

Secretario de Infraestructura

Elaboró: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025

Revisó: Christian Julián Fernández Reyes - Secretario de Infraestructura

REDACTED TO: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán Paradiso Negro
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 02 de marzo del 2026

1090-0449

Doctora:

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON

Secretaría de contratación

Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta



Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 5 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaría de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 5 en el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES

Secretario de Infraestructura

Elaboró: Jesús Andrés Devia Tarache – Profesional de Apoyo CPS 1087 de 2025 *Jesús A.*
Revisó: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025 *Hanlly*

CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025



C-015.26

Villavicencio (Meta), 24 febrero de 2026

Ingeniero:

Ing CRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Calle 10No. 10-90 Barrio Centro – Palacio Municipal

e-mail: infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co

Puerto Gaitán – Meta.

Puerto Gaitán 2261.11.0001837



Tipo: Radicado Entrada Fecha Rad: 26/02/2026 16:10 Folios: 1
Asunto: entrega de informe mensual del contrato de obra 0
Radicador: MAIRELY.BETANCURT
Procedencia: JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO/CONSORCIO INTERVENTORIA AC
Destinatario: CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
La recepción del documento no implica aceptación

Ref.: Contrato de Interventoría No. 1004 de 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEIMPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META.

Asunto: Entrega de informe mensual No.5 Contrato de obra 0821 de 2025

Cordial Saludo:

A continuación, hacemos entrega del informe de actividades de obra del contrato No 0821 de 2025, informe que fue revisado y ajustado a requerimientos contractuales.

- ✓ Original informe mensual No.05 correspondiente al contrato de obra 0821 de 2025, junto con sus anexos. Periodo del (01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026). # de carpetas:1.

Cordialmente,

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDIGENAS 2025

Anexo. lo enunciado en 1 carpeta

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	COMUNICACIONES EXTERNAS	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: junio 2025

CE-005-2026

Villavicencio, 11 de febrero de 2026

Ingeniero:

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO

CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

Calle 41B #30 – 11

e-mail: interventoria.acindigenas@gmail.com

Ciudad

Ref.: Contrato de Obra No. 0821 de 2025 “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”

Asunto: Entrega informe mensual No. 5

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito entregar el informe mensual No.5 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026, para su respectiva revisión, aprobación y tramite.


Agradeciendo la atención prestada y a la espera de sus indicaciones.

Atentamente,


LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
Contratista

Anexo: lo enunciado en 1 carpeta

		FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA				
		Infraestructura				
		Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025		
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN 13/02/2026						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
Radicado No:			Fecha:			
Periodo del informe: Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/01/2026						
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
1,01	Generalidades del contrato, localización específica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes aéreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	INFORMACION DEL CONTRATO					
2,01	Cuadro de trazabilidad: 1) Numero del proceso (Etapa pre-contratual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial, 3) Objeto del contrato, 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato, 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
4	INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO					
4,01	Plan de inversión de anticipo	X	X			
4,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.	X	X			
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra.	X	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			
4,07	Ordenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)	X	X			
5	INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO					
5,01	Gráfico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas, (financiera, por porcentajes)	X	X			
5,02	Cuadro de avance con acumulado mes a mes	X	X			
5,03	Control del estado del tiempo resumen (día a día mes reportado en el informe)	X	X			
6	INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matrícula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)				X	
7	CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO				X	
8	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)	X	X			
9	INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).	X	X			
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales	X	X			
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			
10	ANEXOS					
10,01	Actas de socialización (informes inicial)	X	X			
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)	X	X			
10,03	Relación de comités de obra, (según orden cronológico y debidamente numeradas)				X	
10,04	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexas de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)	X	X			

		FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA				
		Infraestructura				
		Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025		
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN 13/02/2026						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
Radicado No.:			Fecha:			
Periodo del informe: Desde: 01/01/2026 Hasta: 31/01/2026						
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,07	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente	X	X			
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)	X	X			
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)	X	X			
10,13	Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)	X	X			
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoría, así como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico), firmado por el profesional (si aplica).				X	
11	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			
NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaría de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.						
Revisó y aprobó:						
						
R/L JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025						
Nota: se debe paginar los informes						



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

INFORME DE OBRA



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo	5
2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba	6
2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas	6
2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome	7
2.1.5 Comunidad beneficiada	8
3. ALCANCE DEL PROYECTO.....	8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.....	9
5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO.....	10
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS	11
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	12
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	12
6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	13
6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	13
6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	14
6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.....	15
6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.	15
6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS.....	15
7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO	16
7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES	16
7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO	17
7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	19
7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.	22
7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	24
7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	23
8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.....	24

**CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**

NIT. 901.965.630 – 1

8.1	RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)	24
8.2	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	25
8.3	ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	26
8.4	PAZ Y SALVO PERSONAL.....	26
9	CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	27
10	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	27
11	INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.....	27
12	CONCLUSIONES.....	28
13	ANEXOS.....	29



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 821 DE 2025
“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS
RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y
ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”

INFORME MENSUAL No. 5
PERIODO DEL INFORME
DEL 01 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2026

CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1
R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
NIT. 901.972.868 – 4
R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las leyes y normas, principalmente del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que *“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las actividades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y de agua potable”*, el municipio de Puerto Gaitán en enmarcado en el cumplimiento de las metas de su Plan de Desarrollo **“JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027”** PDM 0344- Construcción, ampliación, optimización, y adecuación de redes de acueducto y plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Atendiendo a la política pública de VIVIENDA, establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.

Algunas comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, presentan vulneración en el servicio de agua potable ya que no cuentan con sistemas de acueductos, se han visto afectadas por la carencia de agua potable, llevando a realizar malas prácticas de la captación del agua, tomando como forma de abastecimiento los pozos profundos rudimentarios en algunas de sus viviendas, que con el tiempo por el desconocimiento sobre las consecuencias que se podrían presentar, algunas familias construyeron pozos sépticos o letrinas a corta distancia de la fuente, lo cual ocasiona la contaminación inmediata de los mismos; evidenciándose condiciones incorrectas para el acceso al agua potable.

Surtidos los tramites de planeación del proyecto, mediante resolución No. 0014 del 10 de junio de 2025 **“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIP-005-2025”** se inició el proceso de contratación el cual culmino con la adjudicación y suscripción del Contrato de Obra Pública No. 821 del 17 de julio de 2025 cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”**.

Así las cosas, con la presentación del presente informe damos cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 821 – 2025 en su cláusula OCTAVA. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** numeral 6. *Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecución, según el avance de la obra (secuencias de actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.*



Así mismo, el presente informe cumple con los requerimientos exigidos en el *FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA (INF-FR-72 V05 vigente desde el 10/01/2025)* establecido por la entidad para tal fin.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza y beneficia a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas de la zona rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta, así:

2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo

RESGUARDO WACOYO									
CÓDIGO	COMUNIDAD / POZO	COMUNIDADES BENEFICIARIAS	TOTAL COMUNIDADES	ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	D. GAITÁN
WAC01	POZO KALIWIWIRNAE	ACACIOS	2	838.322.2.694m	973031.6969m	204.700m	W71° 59' 36.52"	N4° 21' 06.35"	14,00 KM
WAC02	POZO ESMERALDA WALABO	LAS BRISAS, MANANTIAL Y WALABO	4	900.418.0.667m	972896.7131m	226.400m	W71° 58' 28.56"	N4° 21' 02.04"	16,00 KM
WAC03	POZO PALOGRANDE WALABO	PALOMENZO, PARAISO Y CAIMANA 2	4	900.588.5.666m	972854.4974m	226.400m	W71° 58' 28.03"	N4° 21' 00.67"	16,00 KM
WAC04	POZO LA UNION		1	902.309.6.873m	973188.3818m	218.100m	W71° 57' 27.23"	N4° 21' 11.61"	16,00 KM
WAC05	POZO PUNTO GRILLO	CARDADO, LA BALSA, LLANO ALTO, ACETICO	5	903.640.5.670m	974478.3613m	221.500m	W71° 56' 44.12"	N4° 21' 53.65"	18,00 KM
WAC06	POZO ALGARROBO	SANTAINES, VILLANUEVA	3	904.014.1.047m	975025.1358m	221.100m	W71° 55' 32.02"	N4° 22' 11.46"	18,00 KM
WAC07	POZO MATAPALITO	LAS PIEDRAS	2	906.626.4.761m	979804.6633m	209.800m	W71° 55' 07.48"	N4° 24' 47.14"	27,00 KM
WAC08	POZO LA PORFIA	LA HERMOSA	2	907.524.2.408m	981153.8279m	191.200m	W71° 54' 38.41"	N4° 25' 31.09"	29,00 KM
WAC09	POZO LA CAIMANA	VERGEL	2	900.487.6.918m	971329.8396m	202.200m	W71° 55' 26.24"	N4° 20' 11.04"	18,00 KM

Tabla 1. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

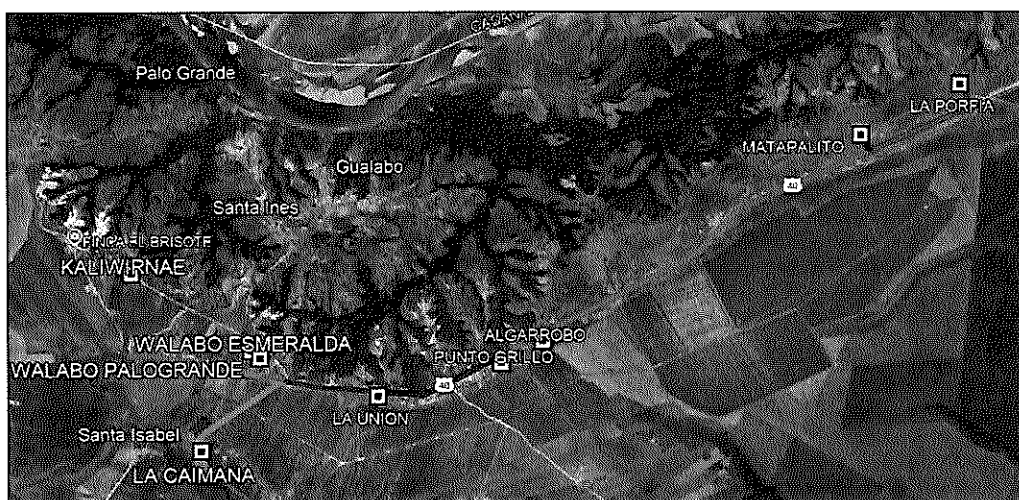


Figura 1. Localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo



2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba

RESGUARDO AWALIBA									
CÓDIGO	COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO DE CASAS	COORDENADAS UTM X	COORDENADAS UTM Y	ALTURA (m)	COORDENADAS WGS84 LONGITUD	COORDENADAS WGS84 LATITUD	ÁREA (KM²)
AWA01	POZO MAKAPAY	LA VEREMOS	2	927966.5314m	948604.7669m	234.100m	W71° 43' 34.52"	N4° 07' 52.17"	81,00 KM
AWA02	POZO COMUNITARIO AWALIBA CENTRAL	CEREQUITO, LA BRISA, LA PISTA, CHAVAJIVALLI, LA ENVIDIA, DESEO	7	932219.8422m	949522.6407m	240.200m	W71° 41' 16.65"	N4° 08' 22.16"	85,00 KM
AWA03	POZO PUERTO LOPEZ		1	938332.3132m	944145.5908m	206.500m	W71° 40' 40.45"	N4° 05' 27.15"	90,00 KM
AWA04	POZO PUNTO GRILLO		1	932907.1761m	942400.7501m	187.200m	W71° 40' 54.19"	N4° 04' 30.33"	93,00 KM
AWA05	POZO SAN GIL	TAPIVA, BELLAVIDA	3	942563.2402m	947574.8922m	203.600m	W71° 35' 41.26"	N4° 07' 18.99"	96,00 KM
AWA06	POZO FACUNAE		1	935423.3607m	942265.4095m	194.400m	W71° 39' 32.61"	N4° 04' 25.99"	93,00 KM

Tabla 2. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

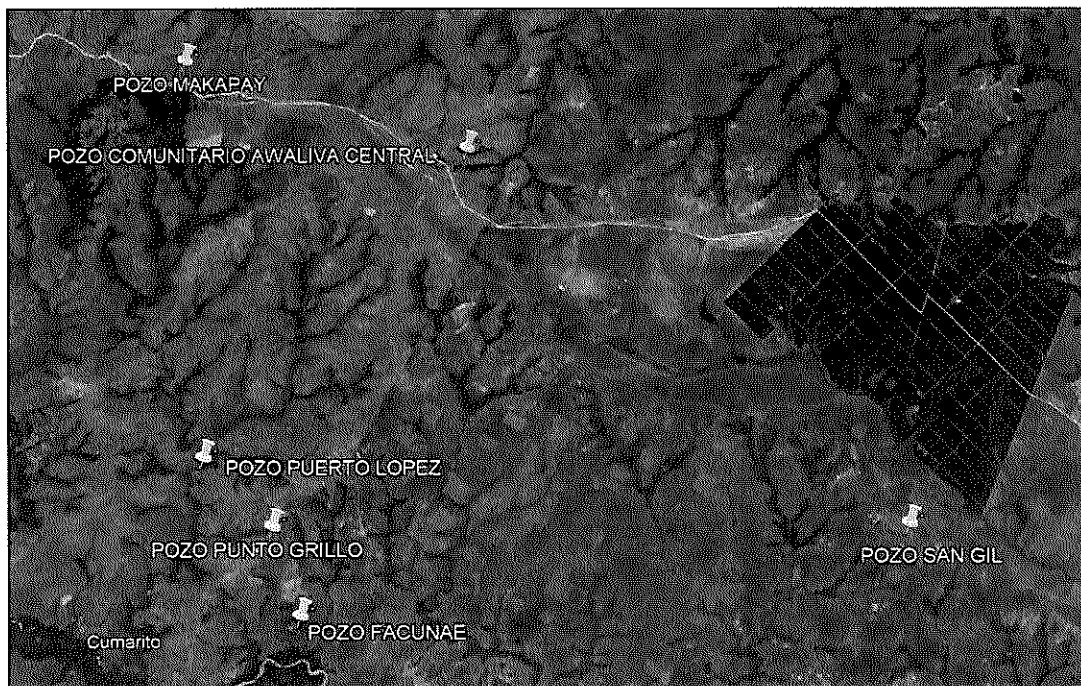


Figura 2. Localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas

RESGUARDO DOMOPLANAS									
CÓDIGO	COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO DE CASAS	COORDENADAS UTM X	COORDENADAS UTM Y	ALTURA (m)	COORDENADAS WGS84 LONGITUD	COORDENADAS WGS84 LATITUD	ÁREA (KM²)
DOM01	POZO OLIVOS	WARROJO	2	979779.5881m	963044.8119m	185.800m	W71° 15' 54.74"	N4° 15' 48.15"	132,00 KM
DOM02	POZO PARAISO	VISTA HERMOSA	2	970139.3986m	962795.7268m	201.100m	W71° 20' 47.35"	N4° 15' 34.95"	125,00 KM
DOM03	POZO BUENAVISTA		1	968668.4144m	953173.8691m	232.350m	W71° 21' 34.94"	N4° 10' 21.70"	112,00 KM
DOM04	POZO VILLAMARCIA	DILUVIO	2	976124.0172m	945937.1103m	194.500m	W71° 17' 33.14"	N4° 06' 26.18"	124,00 KM
DOM05	POZO LAS BRISAS		1	977507.6932m	947082.3612m	200.550m	W71° 16' 48.28"	N4° 07' 03.47"	124,00 KM
DOM06	POZO CUMARAITO		1	977551.1217m	944929.8396m	197.550m	W71° 16' 46.86"	N4° 05' 53.40"	126,00 KM
DOM07	POZO YATORROBO		1	976876.8066m	943115.3330m	194.300m	W71° 17' 08.70"	N4° 04' 54.32"	129,00 KM
DOM08	POZO CERRITO		1	980241.7249m	947463.0325m	183.500m	W71° 15' 19.64"	N4° 07' 15.89"	126,00 KM
DOM09	POZO PUERTO GAVILAN	SOLEDA	2	983468.1415m	944328.3256m	203.100m	W71° 13' 35.02"	N4° 05' 33.86"	132,00 KM
DOM10	POZO LAS DELICIAS		1	965468.1246m	941561.4449m	180.200m	W71° 12' 30.18"	N4° 04' 03.79"	137,00 KM
DOM11	POZO CACHAMITAS		1	979870.7900m	939807.9630m	186.933m	W71° 15' 31.62"	N4° 03' 06.67"	134,00 KM

Tabla 3. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

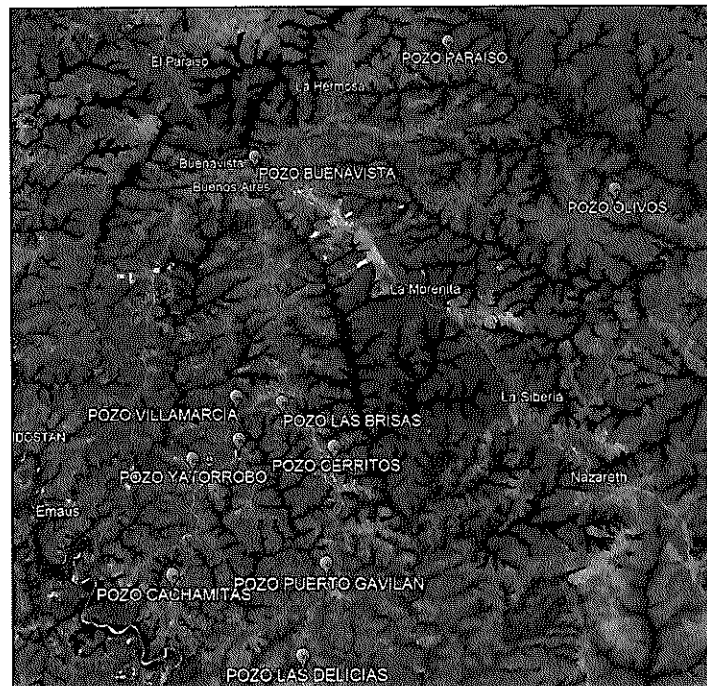


Figura 3. Localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome

RESGUARDO ASEINPOME									
CÓDIGO	COMUNIDAD	LOCALIDAD	OTRO	ASITA	VALLE	ALCANTARILLA	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	OTRO
UNU01	KEKO		1	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92.00 KM
UNU01	SIETE RODRIGUEZ	SAN FERNANDO	2	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92.00 KM

Tabla 4. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



Figura 4. Localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



2.1.5 COMUNIDAD BENEFICIADA

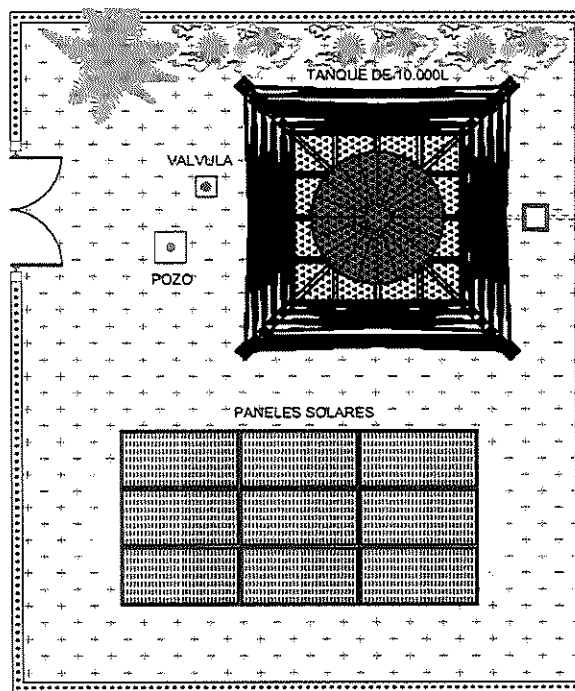
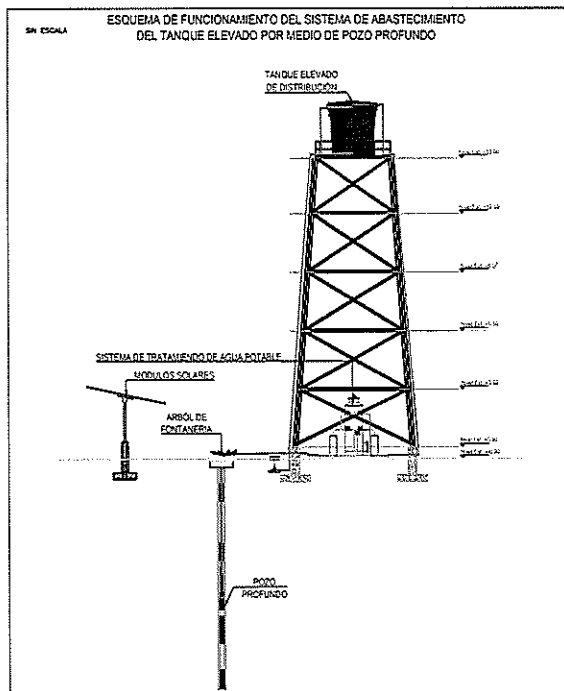
El número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto es de 3.246 habitantes como se muestra a continuación:

GRUPOS ÉTNICOS:		Población Indígena	
ETARIA:	Edad:	0 a 14 años	1.087
		15 a 19 años	390
		20 a 59 años	1.617
		Mayor de 60 años	152
GÉNERO:	Masculino:	1.737	
	Femenino:	1.509	

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto como se mencionó anteriormente beneficiara a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas distribuidos en toda la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, cada sistema está concebido que sea igual para todas las comunidades, que requieran de la menor operación y que brinde agua potable para el beneficio de las comunidades.

El sistema consta de manera general de los siguientes componentes:




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

- **Pozo profundo:** Se contemplan profundidades de perforación desde 90 metros hasta los 153 metros, en tubería PVC de 6" al igual que los filtros.
- **Equipo de bombeo y sistema de energía solar:** bombas sumergibles solares de potencias entre 1.500, 3.000 y 16.000 wattios. Controladores de carga, sensores de nivel para tanque y pozo, y sistema de protección de malla a tierra.
Paneles solares monocristalinos de 570 wattios, distribuidos en módulos de 5, 9 y 22 paneles según las características de cada sistema.
- **Sistema de tratamiento de agua:** compuestos por una unidad presurizada en acero inoxidable que filtra, clarifica y purifica; diseñados para tratar caudales de 0.5 lts/seg, 1 lts/seg y 2 lts/seg según el requerimiento de cada sistema.
- **Redes de acueducto:** 56.682.22 metros de tubería de pvc 2" RDE 21 – 941 acometidas domiciliarias y sus respectivos accesorios (válvulas, uniones, tapones, codos, tees).
- **Tanque elevado de distribución:** tanques plásticos de 6.000 lts, 10.000 lts, y 20.000 lts, soportados en estructuras de acero estructural ASTM de 13.7 metros de altura cimentados en zapatas y pedestales en concreto de 3.000 psi.
- **Cerramiento perimetral:** en tubo galvanizado de 2" soportados en viga de cimentación y concreto ciclópeo con portón de acceso.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DEL PROCESO		LP-SIP-005-2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	NÚMERO:	821 DE 2025
	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
CONTRATISTA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT. 901.965.630 – 1 R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

VALOR DEL CONTRATO	EN LETRAS	CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
	EN NUMEROS	\$42.408.897.278,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		QUINCE (15) MESES
INTERVENTOR DEL CONTRATO:		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 NIT. 901.972.868 – 4 R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO C.C. 79.134.525 DE FONTIBÓN interventoria.acindigenas@gmail.com
SUPERVISOR		CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE INICIO		29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL		28 DE NOVIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		36,40%
COSTO EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$15.435.907.083,00
PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		27,49%
COSTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$ 11.657.188.378,00
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO		156 días
DIAS PENDIENTES DE EJECUCION		300 días
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO		34,21%

5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen las pólizas expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. que amparan la ejecución del contrato desde su suscripción y las correspondientes modificaciones que se han realizado a la fecha del presente informe y que aplican para actualización de pólizas.

- Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 93833.
- Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 27002.


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

Póliza No. 93833				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	01	04	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	01	12	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29	08	2025	01	04	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29	08	2025	28	11	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	29	08	2025	01	12	2026	\$2.120.444.864,00

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato de obra No. 821 de 2025 cuenta con un anticipo del 50% del valor del contrato correspondiente a la suma de \$21.204.448.639,00; por concepto de FONSET la entidad retiene el 5% de este valor que son \$1.060.222.431,95 es decir que el valor neto entregado del anticipo corresponde a \$20.144.226.207,05.

En cumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato, el contratista suscribió con la FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS denominado **PATRIMONIO AUTONOMO ANTICIPO CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, con el fin de manejar y girar los recursos del anticipo del contrato.

De igual manera se registra la cuenta de ahorros No. 500807651648 del Banco Popular correspondiente al fideicomiso donde se deben abonar los recursos objeto del contrato fiduciario.

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo aprobado inicialmente y que se encuentra vigente a la fecha.


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS

PÓLIZAS INICIALES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 DE JULIO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00
DERIVADA DE CIVIL							

PÓLIZAS INICIALES CORRECCIÓN NIT. DEL CONTRATISTA.

Póliza No. 93833				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	% PORCENTAJE PROGRAMADO DE INVERSIÓN EN EL TIEMPO EN MESES				
				1	2	3	4	5
1	MANO DE OBRA, PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS DEL PERSONAL OFERTADO Y OPERATIVO (SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DOTACIONES)	\$2.417.307.144,85	12%	2%	3%	3%	3%	1%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	\$13.496.631.558,72	67%	15%	20%	20%	5%	7%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	\$4.230.287.503,48	21%	3%	5%	5%	5%	3%
TOTALES		\$20.144.226.207,05	100%					

6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

A continuación, se mencionan y describen cada uno de las ordenes de giro a la fiducia durante el periodo del informe

CONSECUTIVO	ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	SALDO ANTICIPO
ORDEN GIRO No. 60	1	21/01/2026	CONSORCIO AGUAS GAITAN	\$ 70.410.428,00	\$ 12.533.085.464,45
ORDEN GIRO No. 61	1	28/01/2026	TERRACQUA SAS	\$ 19.052.228,00	\$ 12.514.033.236,45
ORDEN GIRO No. 62	1	28/01/2026	GEODELTA SAS	\$ 50.050.000,00	\$ 12.463.983.236,45
ORDEN GIRO No. 63	1	28/01/2026	TERRACQUA SAS	\$ 33.600.000,00	\$ 12.430.383.236,45
ORDEN GIRO No. 64	1	30/01/2026	M&G INGENIERIA S.A.S	\$ 38.309.739,72	\$ 12.392.073.496,73

6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES		VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	\$ 1.132.883.754,00	\$ 1.132.883.754,00	\$ 1.165.283.191,00	\$ 1.165.283.191,00
2	01-10-25 a 31-10-25	\$ 1.533.938.149,00	\$ 2.666.821.903,00	\$ 1.615.778.986,00	\$ 2.781.062.177,00

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana
Villavicencio – Meta
e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

3	01-11-25 a 30-11-25	\$ 2.752.982.664,00	\$ 5.419.804.567,00	\$ 4.469.897.773,00	\$ 7.250.959.950,00
4	01-12-25 a 31-12-25	\$ 3.182.797.359,00	\$ 8.602.601.926,00	\$ 3.384.230.051,00	\$ 10.635.190.489,00
5	01-01-26 a 31-01-26	\$ 3.054.586.452,00	\$ 11.657.188.378,00	\$ 4.800.716.596,00	\$ 15.435.907.083,00
6	01-02-26 a 28-02-26	\$ 1.361.475.374,00	\$ 13.018.663.752,00		
7	01-03-26 a 31-03-06	\$ 1.707.014.984,00	\$ 14.725.678.736,00		
8	01-04-26 a 30-04-26	\$ 2.122.894.222,00	\$ 16.848.572.958,00		
9	01-05-26 a 31-05-26	\$ 3.538.600.653,00	\$ 20.387.173.611,00		
10	01-06-26 a 30-06-26	\$ 5.196.889.486,00	\$ 25.584.063.097,00		
11	01-07-26 a 31-07-26	\$ 6.886.687.533,00	\$ 32.470.750.630,00		
12	01-08-26 a 31-08-26	\$ 4.957.368.139,00	\$ 37.428.118.769,00		
13	01-09-26 a 30-09-26	\$ 3.283.638.775,00	\$ 40.711.757.544,00		
14	01-10-26 a 31-10-26	\$ 1.494.587.472,00	\$ 42.206.345.016,00		
15	01-11-26 a 28-11-26	\$ 202.576.537,00	\$ 42.408.921.553,00		

6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$42.408.897.278,00
VALOR ADICIONES	\$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	\$42.408.897.278,00
VALOR ANTICIPO	\$20.144.226.207,05
ACTAS PARCIALES	\$0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$20.144.226.207,05

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NÚMERO	DIS.2025000172
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-05-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
CONCEPTO	SPGR CDP 13325 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.921.552,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.921.552,00

6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.

REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO	RS1.2025000156
FECHA DEL REGISTRO	23-07-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
DESCRIPCIÓN	CTO-821 "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
FUENTE O RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.897.278,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.897.278,00

6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO 50,00%	2025090008	\$ 20.144.266.208,00	17/09/2025


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

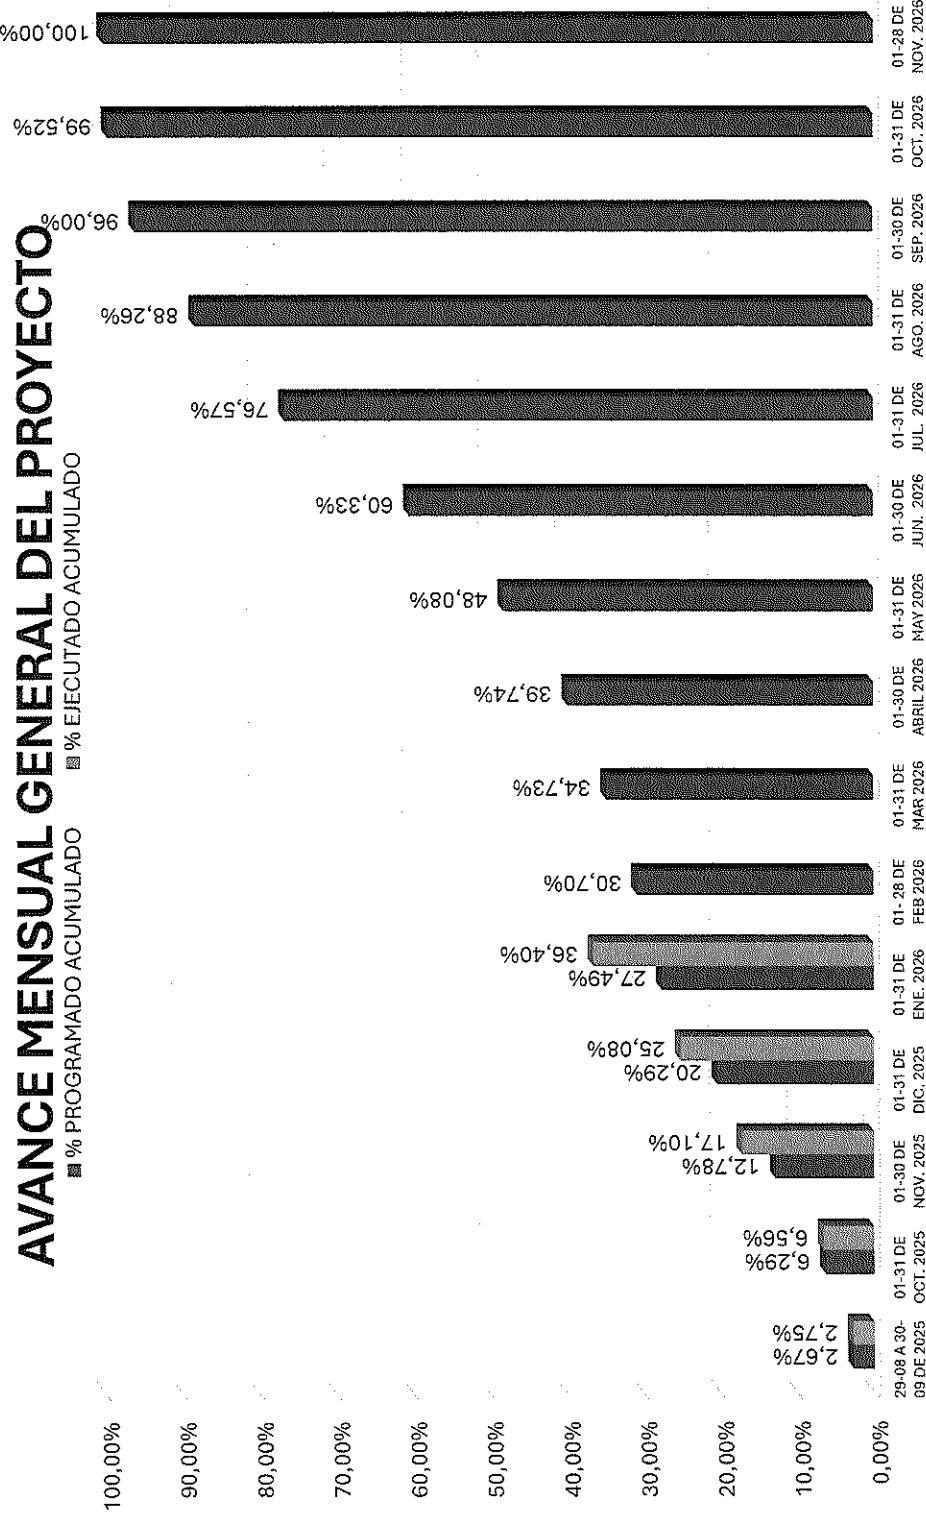
7.1 CUADRO DE AVANCE % ACUMULADO MES A MES

MES		% PROGRAMADO		% EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	2,67%	2,67%	2,75%	2,75%
2	01-10-25 a 31-10-25	3,62%	6,29%	3,81%	6,56%
3	01-11-25 a 30-11-25	6,49%	12,78%	10,54%	17,10%
4	01-12-25 a 31-12-25	7,51%	20,29%	7,98%	25,08%
5	01-01-26 a 31-01-26	7,20%	27,49%	11,32%	36,40%
6	01-02-26 a 28-02-26	3,21%	30,70%		
7	01-03-26 a 31-03-06	4,03%	34,73%		
8	01-04-26 a 30-04-26	5,01%	39,74%		
9	01-05-26 a 31-05-26	8,34%	48,08%		
10	01-06-26 a 30-06-26	12,25%	60,33%		
11	01-07-26 a 31-07-26	16,24%	76,57%		
12	01-08-26 a 31-08-26	11,69%	88,26%		
13	01-09-26 a 30-09-26	7,74%	96,00%		
14	01-10-26 a 31-10-26	3,52%	99,52%		
15	01-11-26 a 28-11-26	0,48%	100,00%		

Ver anexo No. 1 Cuadro de avance actividades ejecutadas.



7.1.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO



Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relaciona las actividades de obra ejecutadas en el presente corte:

RESGUARDO AWALIBA.

COMUNIDAD PUERTO LOPEZ

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro con la ejecución de registro eléctrico, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se continuo con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

COMUNIDAD SAN GIL

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se inició con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del



material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapones.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

COMUNIDAD FACUNAE

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se continuo con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", después se procede a instalar la tubería de 6" RDE 21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

RESGUARDO DOMOPLANAS.

COMUNIDAD PUERTO GAVILAN

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se inició con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de rio para la instalación de la tubería de 2", junto con el



relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo.

COMUNIDAD LAS DELICIAS

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se inició con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de río para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

RESGUARDO WACOYO.

COMUNIDAD LA UNIÓN

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

- **POZO PROFUNDO**

Durante el periodo reportado en este informe, se realiza la ejecución de la piscina de lodos junto con los demás trabajos preparatorios para posteriormente iniciar la



perforación de prueba en 8 ½" con equipo de rotación directa, a la par de esta perforación inicial se realiza el análisis litológico y granulométrico metro a metro, para luego proceder con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½".

COMUNIDAD ALGARROBO

• REDES DE ACUEDUCTO.

En el periodo comprendido en este informe se inició con las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de río para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, finalmente se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo.

• SUMINISTRO

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

COMUNIDAD LA PORFIA

• REDES DE ACUEDUCTO.

En el periodo comprendido en este informe se iniciaron las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de río para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

COMUNIDAD LA CAIMANA

• POZO PROFUNDO

Durante el periodo reportado en este informe, al terminar con la ampliación de la perforación hasta su tamaño final de 12 ½", se procedió a instalar la tubería de 6" RDE



21 con sus respectivos filtros, se suministra la gravilla y el material estabilizador de relleno, se realiza la prueba de bombeo, el lavado y desinfección del pozo, la construcción de cabeza y sello sanitario.

- **REDES DE ACUEDUCTO.**

En el periodo comprendido en este informe se iniciaron las actividades de excavación mecánica, se realizó a su vez el retiro del material sobrante de las excavaciones, la instalación de la base en arena de río para la instalación de la tubería de 2", junto con el relleno de material seleccionado de la excavación, se realiza la instalación del material de 3" para la parte superior de esta excavación, al realizar actividades como instalación de arena y relleno de material de 3" trae consigo la ejecución de sobre acarreo. Igualmente se realizó la excavación manual y se instalaron las acometidas domiciliarias con los respectivos accesorios como codos, tee y tapón.

- **SUMINISTRO**

En el periodo de ejecución del presente informe se terminó con la compra y suministro de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de la red de acueducto en esta comunidad.

Las cantidades ejecutadas y mencionadas anteriormente para el periodo referenciado en este informe se pueden verificar en el **Anexo N°1**.

7.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

En el **Anexo No. 2** se encontrarán los certificados de calidad de los materiales usados al corte del presente informe, junto con los certificados de calibración de los equipos usados si aplica.

7.4 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se anexa el informe emitido por parte del profesional SISO, entrega de asistencia de charlas de seguridad, salud en el trabajo y las entregas de dotación.

Ver Anexo No. 3 Informe seguridad y salud en el trabajo (SISO)



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.680 - 1

7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

RESGUARDO WACOYO ENERO 2026																																
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
LLUVIAS MODERADAS AM													X																			
LLUVIAS INTENSAS AM																										X					X	
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LLUVIAS MODERADAS PM									X							X														X		
LLUVIAS INTENSAS PM																				X											X	

RESGUARDO AWALIBA ENERO 2026																															
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
LLUVIAS MODERADAS AM																	X						X								
LLUVIAS INTENSAS AM																															X
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
LLUVIAS MODERADAS PM									X				X																	X	X
LLUVIAS INTENSAS PM																															

RESGUARDO DOMOPLANAS ENERO 2026																															
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	
LLUVIAS MODERADAS AM							X								X							X									
LLUVIAS INTENSAS AM																										X					X
SECO PM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	
LLUVIAS MODERADAS PM																													X		X
LLUVIAS INTENSAS PM																							X								

RESGUARDO ASEINPOME ENERO 2026																															
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO AM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

[illegible]

8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)

De acuerdo con las necesidades del proyecto, las actividades ejecutadas durante el presente periodo y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO: ENERO 2026

PERSONAL PROFESIONAL						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	R/L Consorcio	86.051.533	PORVENIR	SANITAS	SURA	9499301789
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN	Director de Obra	40.326.478	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9499301789
WENDY VANESA GARZON GARCIA	Residente de Obra 1	1.121.902.403	PROTECCION	SANITAS	SURA	9499301789
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	Residente de Obra 2	1.121.834.340	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9499301789
GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.869.998	PORVENIR	SANITAS	SURA	9499301789
DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	Contadora	40.395.435	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9499300676
LINA MARCELA GOMEZ LEAL	Auxiliar Contable	40.328.285	PORVENIR	SANITAS	SURA	9499300676



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

PERSONAL TECNICO OPERATIVO						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ	Secretaria	1.092.394.700	PORVENIR	SANITAS	SURA	9499300676
JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	Conductor 1	80.013.513	PORVENIR	SANITAS	SURA	9499300676
ROSEMBERG MURCIA JOJOA	Conductor 2	1.003.359.252	PORVENIR	SANITAS	SURA	9499301789
OBER ASMED PEREZ PEREZ	Almacenista	96.193.788	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9499300676
MIGUEL DIOSID CORREA	Oficial de obra	1.103.470.729	PORVENIR	CAJACOPI	SURA	9499301789
YEFERSON ENRIQUE GALVAN	Operador de maquinaria	78.646.546	COLFONDOS	NUEVA EPS	SURA	9499301789
JOSE JAVIER MONCADA	Oficial de tubería	1.093.921.945	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9499301789
EDWIN BARRIOS	Oficial de obra	1.120.864.265	PORVENIR	SALUDTOTAL	SURA	9499301789
DUVAN ARLEY ROMERO	Oficial de tubería	1.004.819.005	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA	9499301789

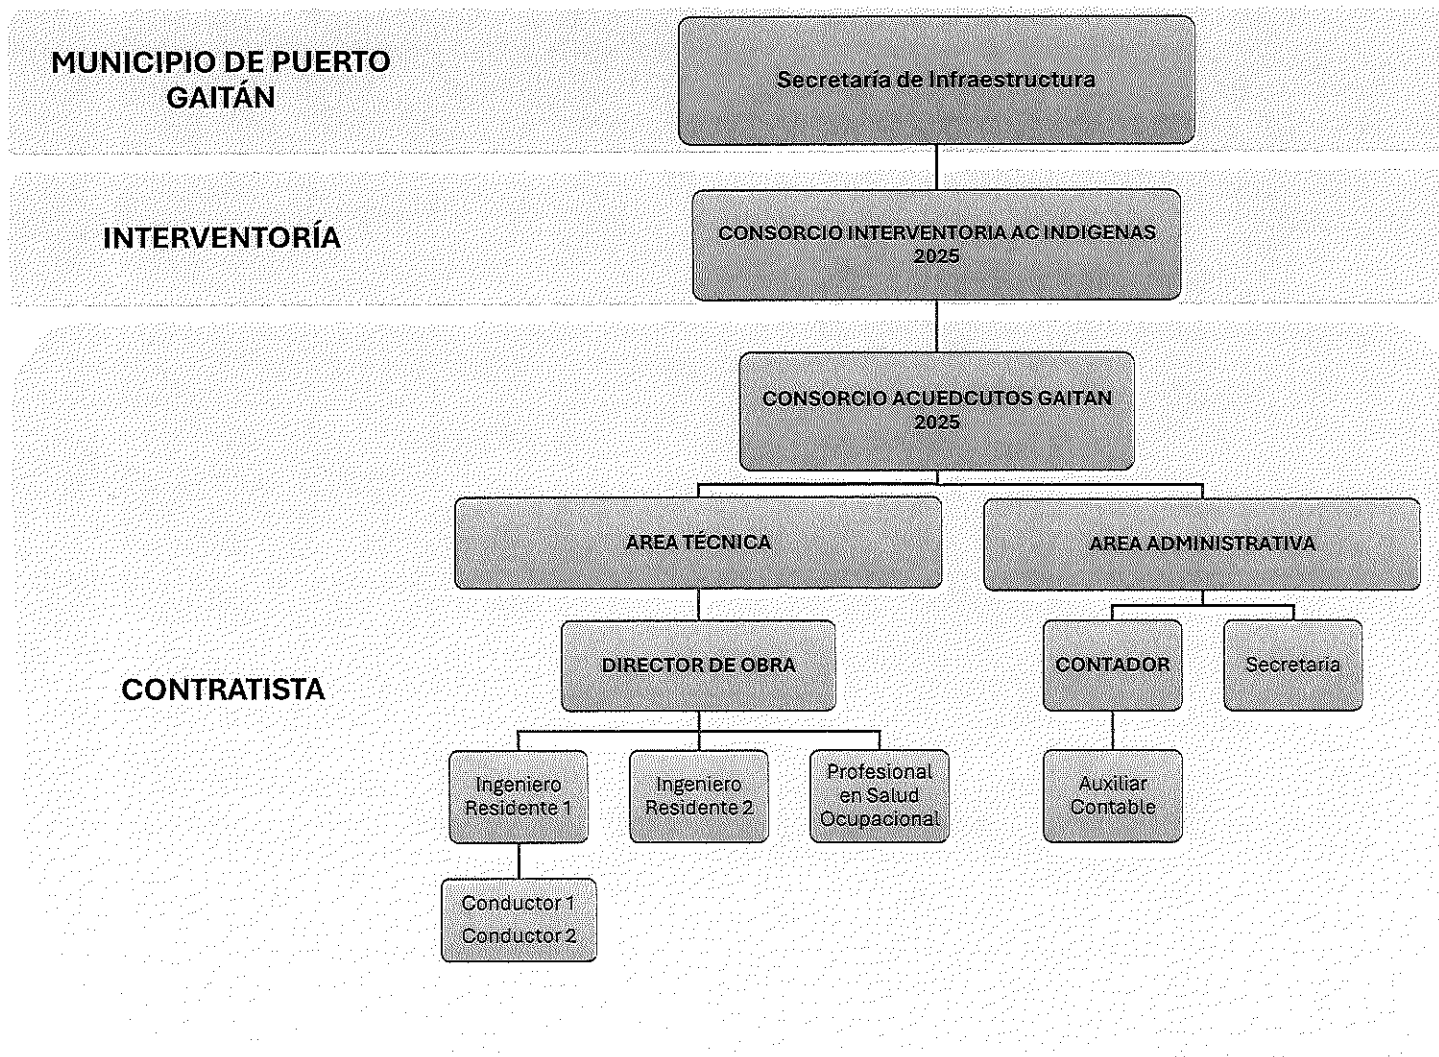
8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

Ver Anexo No. 4. Planillas de pago seguridad social y Certificación contador.



8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO



8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL.

En el presente corte no se retiro personal.



9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se anexo el diseño de mezcla para concretos de 3.000 PSI a utilizar en la construcción de estructuras que lo requieren.

10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
NIVEL DE PRECISIÓN	NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM	1
ESTACIÓN TOTAL	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOPCOM	1
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	2
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	2
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.

En lo corrido del presente mes las actividades ejecutadas no causaron afectación ambiental en la zona de trabajo.

A la fecha el contrato cuenta con los permisos de prospección y exploración en de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales a continuación se relacionan:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA



EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

12 CONCLUSIONES

- Se presenta el siguiente informe con el fin de mantener informadas a las partes involucradas del estado y avance del contrato en el periodo correspondiente al informe mensual No. 5 con corte del (01-01-2026 al 31-01-2026), actividades que se desarrollaron con normalidad.
- En el presente periodo se suministró aproximadamente el 3,05% de la tubería en los resguardos de wacoyo y awaliba, dejando un acumulado del 80,83% de suministro.
- Una vez recibidos los recursos de anticipo en la fiducia constituida para el manejo de este, se continua la inversión de tal forma que se logre el cumplimiento del cronograma, priorizando las actividades que más tiempo requieren en su ejecución.
- Al terminar la ejecución de la actividad de localización y replanteo de las redes de acueducto en las comunidades beneficiarias se evidencio la existencia de nuevos usuarios, así como el desplazamiento de algunos usuarios dentro de la misma comunidad, situación que genera mayor cantidad de actividades de obra por lo que se cuantificara junto con interventoría para realizar el balance del contrato.
- Para efectos de precisión, se deja claridad en que el porcentaje acumulado consignado en el cuadro de avance está redondeado a dos decimales.



13 ANEXOS

- **ANEXO No. 1.** CUADRO DE AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- **ANEXO No. 2.** CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.
- **ANEXO No. 3.** INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISO).
- **ANEXO No. 4.** PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.
- **ANEXO No. 5.** NOMINAS DEL PERSONAL.
- **ANEXO No. 6.** REGISTRO FOTOGRAFICO.
- **ANEXO No. 7.** COPIA DE LA BITACORA.
- **ANEXO No. 8.** APROBACIÓN FIDUCIA

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS AGUAS 2025
Contratista



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 1. CUADRO DE CANTIDADES AVANCE DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WADOYO, ANVALIBA, DONOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GATAM, META										
CONDICIONES INICIALES			ACTIVIDADES			ANÁLISIS ACUARDADO			CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR	
N° ITEM	ITEM DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RESGUARDO ANVALIBA										
COMUNIDAD WACOTO (0000 - 11) (PZ. 130)										
1.1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
4. REDES DE ACUEDUCTO										
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUIE COMISIÓN TOPOGRAFICA CARTERIA Y PLAFIOS	ML	4140,25	\$ 431,00	\$ 17861,0900	3917,61	\$ 16,900,570,00	222,64	\$ 960,469,00	
4.2	RECORTO DE SOBANTERRE DE EXCAVACIÓN	M3	1.035,06	\$ 43,390,00	\$ 44,919,5310	932,50	\$ 40,468,635,00	102,56	\$ 4,450,899,00	
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUIE CARGUE	M3	112,50	\$ 99,750,00	\$ 11,169,713,00	112,51	\$ 11,081,974,00	0,29	\$ 28,638,00	
4.4	CANALIZACION PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	691,56	\$ 169,050,00	\$ 116,153,339,00	645,52	\$ 122,094,800,00	285,04	\$ 54,088,734,00	
4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN	M3	1.204,58	\$ 44,840,00	\$ 54,015,981,00	1.203,57	\$ 53,971,690,00	1,01	\$ 45,291,00	
4.6	RELLENO COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	310,59	\$ 78,730,00	\$ 24,458,892,00	279,75	\$ 22,042,342,00	30,77	\$ 2,424,481,00	
4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	327,182,73	\$ 2,300,00	\$ 752,462,191,00	172,681,48	\$ 400,984,300,00	106,100,91	\$ 244,969,999,00	
4.8	TUBERÍA PVC RIE 21" E INSTALACIÓN	ML	3.690,25	\$ 23,402,00	\$ 91,043,551,00	3.542,38	\$ 82,901,451,00	347,89	\$ 6,141,670,00	
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ELASTICA RIE 2" INCLUIE CALA VALV Y ANCLAJE EN CONCRETO	UND	1,00	\$ 1,148,570,00	\$ 1,148,570,00	1,00	\$ 1,148,570,00	-	\$ -	
4.10	CODO GRAN RADIO 60" PVC-PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNIÓN MECANICA X UNO (2)	UND	4,00	\$ 128,040,00	\$ 512,172,00	4,00	\$ 512,172,00	-	\$ -	
4.11	CODO GRAN RADIO 45" PVC-PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNIÓN MECANICA X UNO (2)	UND	10,00	\$ 123,890,00	\$ 1,238,940,00	6,00	\$ 737,964,00	4,00	\$ 491,576,00	
4.12	TEE PVC-PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X UNO (2)	UND	2,00	\$ 140,168,00	\$ 280,336,00	2,00	\$ 280,336,00	-	\$ -	
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE REPARACIÓN EN PVC 62 UN UN	UND	5,00	\$ 84,430,00	\$ 422,150,00	5,00	\$ 422,150,00	-	\$ -	
4.14	TAPON PVC-PRESION TRABAJO 280 PSI (2)	UND	1,00	\$ 4,065,00	\$ 4,065,00	1,00	\$ 4,065,00	-	\$ -	
4.15	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUIE CARGUE	M3	2.334,15	\$ 52,350,00	\$ 122,204,423,00	2.126,41	\$ 111,275,841,00	208,74	\$ 10,926,593,00	
4.16	ACQUEDUCTO DOMIC. ACUED. 2X10" (ING. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA, UN. ACCESORIOS Y RESISTIVO)	UND	25,00	\$ 365,180,00	\$ 9,129,500,00	25,00	\$ 9,129,500,00	-	\$ -	
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO WACOTO					\$ 1.397.518.890,00	\$ 87.147.719,00	\$ 109.433.519,00	\$ 890.971.251,00	-	\$ 338.541.250,00
5. TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN										
5.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-2,00 M INCLUIE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	7,44	\$ 98,750,00	\$ 734,722,00	7,44	\$ 734,722,00	-	\$ -	
5.4	ZAPATA EN CONCRETO 20" MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	4,90	\$ 44,840,00	\$ 219,731,00	4,28	\$ 191,628,00	0,62	\$ 27,653,00	
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 16" (400 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	2,03	\$ 1,591,805,00	\$ 3,231,364,00	2,03	\$ 3,231,364,00	-	\$ -	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 16" (400 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	0,77	\$ 2,251,614,00	\$ 1,733,743,00	0,77	\$ 1,733,743,00	-	\$ -	
5.7	ACERO REFUERZO F# 4200 MPa (6200 KG/CM2 660) INCLUIE SUMINISTRO REFORZADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	M3	461,58	\$ 13,243,00	\$ 6,107,623,00	269,29	\$ 3,583,515,00	192,27	\$ 2,544,339,00	
5.8	SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13" (300 PSI)	M3	0,63	\$ 1,659,773,00	\$ 1,050,737,00	0,63	\$ 1,050,737,00	-	\$ -	
TOTAL TANQUE ELEVADO WACOTO					\$ 184.353.529,00	\$ 10.304.119,00	\$ 10.304.119,00	\$ 184.353.529,00	-	\$ 184.353.529,00
6. CERRAMIENTO PERIMETRAL										
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIÓNAL OBRA	M2	48,30	\$ 5,300,00	\$ 255,460,00	48,30	\$ 255,460,00	2,70	\$ 14,310,00	
6.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUIE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	5,00	\$ 84,750,00	\$ 423,765,00	4,97	\$ 423,765,00	0,03	\$ 2,493,00	
6.3	CONCRETO CIGRULO 3000 PSI - 20" MPa PROPORCIÓN 800-100-200 MEZCLA EN OBRA	M3	4,10	\$ 1,128,028,00	\$ 4,627,315,00	3,92	\$ 4,424,222,00	0,18	\$ 203,193,00	
6.4	VIGA EN CONCRETO 20" MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	2,28	\$ 1,705,960,00	\$ 3,888,677,00	2,18	\$ 3,718,121,00	0,10	\$ 170,556,00	
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 16" (400 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	0,19	\$ 2,251,614,00	\$ 427,807,00	0,19	\$ 427,807,00	-	\$ -	
6.6	RELLENO CON GRANILLA	M3	1,31	\$ 169,595,00	\$ 222,616,00	1,31	\$ 222,616,00	-	\$ -	
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 16" (400 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	0,38	\$ 1,591,805,00	\$ 604,886,00	0,38	\$ 604,886,00	-	\$ -	
6.8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO, INCLUIE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y REFORZADO	UND	375,41	\$ 13,233,00	\$ 4,967,801,00	374,22	\$ 4,952,051,00	1,19	\$ 15,747,00	
6.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO, INCLUIE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y REFORZADO	UND	1,00	\$ 815,572,00	\$ 815,572,00	1,00	\$ 815,572,00	-	\$ -	
6.10	EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,44	\$ 44,840,00	\$ 19,731,00	0,44	\$ 19,731,00	-	\$ -	
6.11	SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13" (300 PSI)	M3	0,06	\$ 1,599,773,00	\$ 95,986,00	0,06	\$ 95,986,00	-	\$ -	
6.12	TUBO GALVANIZADO DE 2" (1/2" 2M, E=15 MM) PARA CERRAMIENTO, COC. ANTICORROSIÓN Y PINTURA, INCLUIE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	298,00	\$ 122,681,00	\$ 36,598,938,00	298,00	\$ 36,598,938,00	-	\$ -	
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE TUBO REDONDO GALVANIZADO 1-1/4" (1/2" 2M) E=15 MM, 222	M2	9,84	\$ 334,950,00	\$ 3,295,988,00	-	\$ -	9,84	\$ 3,295,988,00	
TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL WACOTO					\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	-	\$ -
COMUNIDAD ANVALIBA CENTRAL (0000 - 11) (PZ. 129)										
1.1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LUDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	\$ 2,892,980,00	\$ 2,892,980,00	1,00	\$ 2,892,980,00	-	\$ -	
1.3	PERFORACIÓN DE PROBAR EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN	ML	102,00	\$ 35,600,448,00	\$ 35,600,448,00	102,00	\$ 35,600,448,00	-	\$ -	
1.4	DIRECTA POR LUDOS PARA ESTUDIO LITOLOGICO	UND	1,00	\$ 134,131,00	\$ 134,131,00	1,00	\$ 134,131,00	-	\$ -	
1.5	ANÁLISIS DE SUELO Y GRUPO TECNICO DEL POZO	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.6	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.7	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	\$ 502,845,00	\$ 51,250,190,00	102,00	\$ 51,250,190,00	-	\$ -	
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 8" NOSTAGUA RIE 21" PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M.	ML	66,00	\$ 320,450,00	\$ 21,146,898,00	66,00	\$ 21,146,898,00	-	\$ -	
1.9	AFORO DEL POZO (PULERA DE BORDE)	UND	1,00	\$ 3,765,959,00	\$ 3,765,959,00	1,00	\$ 3,765,959,00	-	\$ -	
1.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAYALLADORES	UND	1,00	\$ 1,668,279,00	\$ 1,668,279,00	1,00	\$ 1,668,279,00	-	\$ -	
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RIE 21" PRESIÓN	ML	36,00	\$ 259,462,00	\$ 8,929,632,00	36,00	\$ 8,929,632,00	-	\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL ANVALIBA					\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	-	\$ -
COMUNIDAD ANVALIBA CENTRAL (0000 - 11) (PZ. 129)										
1.1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LUDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	\$ 2,892,980,00	\$ 2,892,980,00	1,00	\$ 2,892,980,00	-	\$ -	
1.3	PERFORACIÓN DE PROBAR EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN	ML	102,00	\$ 35,600,448,00	\$ 35,600,448,00	102,00	\$ 35,600,448,00	-	\$ -	
1.4	DIRECTA POR LUDOS PARA ESTUDIO LITOLOGICO	UND	1,00	\$ 134,131,00	\$ 134,131,00	1,00	\$ 134,131,00	-	\$ -	
1.5	ANÁLISIS DE SUELO Y GRUPO TECNICO DEL POZO	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.6	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.7	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	\$ 502,845,00	\$ 51,250,190,00	102,00	\$ 51,250,190,00	-	\$ -	
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 8" NOSTAGUA RIE 21" PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M.	ML	66,00	\$ 320,450,00	\$ 21,146,898,00	66,00	\$ 21,146,898,00	-	\$ -	
1.9	AFORO DEL POZO (PULERA DE BORDE)	UND	1,00	\$ 3,765,959,00	\$ 3,765,959,00	1,00	\$ 3,765,959,00	-	\$ -	
1.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAYALLADORES	UND	1,00	\$ 1,668,279,00	\$ 1,668,279,00	1,00	\$ 1,668,279,00	-	\$ -	
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RIE 21" PRESIÓN	ML	36,00	\$ 259,462,00	\$ 8,929,632,00	36,00	\$ 8,929,632,00	-	\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL ANVALIBA					\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	-	\$ -
COMUNIDAD ANVALIBA CENTRAL (0000 - 11) (PZ. 129)										
1.1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LUDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	\$ 2,892,980,00	\$ 2,892,980,00	1,00	\$ 2,892,980,00	-	\$ -	
1.3	PERFORACIÓN DE PROBAR EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN	ML	102,00	\$ 35,600,448,00	\$ 35,600,448,00	102,00	\$ 35,600,448,00	-	\$ -	
1.4	DIRECTA POR LUDOS PARA ESTUDIO LITOLOGICO	UND	1,00	\$ 134,131,00	\$ 134,131,00	1,00	\$ 134,131,00	-	\$ -	
1.5	ANÁLISIS DE SUELO Y GRUPO TECNICO DEL POZO	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.6	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.7	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	\$ 502,845,00	\$ 51,250,190,00	102,00	\$ 51,250,190,00	-	\$ -	
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 8" NOSTAGUA RIE 21" PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M.	ML	66,00	\$ 320,450,00	\$ 21,146,898,00	66,00	\$ 21,146,898,00	-	\$ -	
1.9	AFORO DEL POZO (PULERA DE BORDE)	UND	1,00	\$ 3,765,959,00	\$ 3,765,959,00	1,00	\$ 3,765,959,00	-	\$ -	
1.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAYALLADORES	UND	1,00	\$ 1,668,279,00	\$ 1,668,279,00	1,00	\$ 1,668,279,00	-	\$ -	
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RIE 21" PRESIÓN	ML	36,00	\$ 259,462,00	\$ 8,929,632,00	36,00	\$ 8,929,632,00	-	\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL ANVALIBA					\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	-	\$ -
COMUNIDAD ANVALIBA CENTRAL (0000 - 11) (PZ. 129)										
1.1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LUDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1,00	\$ 2,892,980,00	\$ 2,892,980,00	1,00	\$ 2,892,980,00	-	\$ -	
1.3	PERFORACIÓN DE PROBAR EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN	ML	102,00	\$ 35,600,448,00	\$ 35,600,448,00	102,00	\$ 35,600,448,00	-	\$ -	
1.4	DIRECTA POR LUDOS PARA ESTUDIO LITOLOGICO	UND	1,00	\$ 134,131,00	\$ 134,131,00	1,00	\$ 134,131,00	-	\$ -	
1.5	ANÁLISIS DE SUELO Y GRUPO TECNICO DEL POZO	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.6	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA	UND	1,00	\$ 3,990,050,00	\$ 3,990,050,00	1,00	\$ 3,990,050,00	-	\$ -	
1.7	AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	ML	102,00	\$ 502,845,00	\$ 51,250,190,00	102,00	\$ 51,250,190,00	-	\$ -	
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 8" NOSTAGUA RIE 21" PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M.	ML	66,00	\$ 320,450,00	\$ 21,146,898,00	66,00	\$ 21,146,898,00	-	\$ -	
1.9	AFORO DEL POZO (PULERA DE BORDE)	UND	1,00	\$ 3,765,959,00	\$ 3,765,959,00	1,00	\$ 3,765,959,00	-	\$ -	
1.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAYALLADORES	UND	1,00	\$ 1,668,279,00	\$ 1,668,279,00	1,00	\$ 1,668,279,00	-	\$ -	
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RIE 21" PRESIÓN	ML	36,00	\$ 259,462,00	\$ 8,929,632,00	36,00	\$ 8,929,632,00	-	\$ -	
TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL ANVALIBA					\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	\$ 62.244.522,00	-	\$ -
COMUNIDAD ANVALIBA CENTRAL (0000 - 11) (PZ. 129)										
1.1	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1,00	\$ 139.220,00	\$ 139.220,00	1,00	\$ 139.220,00	-	\$ -
1.2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LUDOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS									

CONDICIONES INICIALES										ACTAS ANTERIORES		RESERVA CTA		AVANCE ADECUADO		CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO	BTO	20.40	\$ 42,479.00	\$ 865,572.00	20.40	\$ 865,572.00										
1.13	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR METODOS COMBINADOS	UNO	1.00	\$ 4,282,500.00	\$ 4,282,500.00	1.00	\$ 4,282,500.00										
1.14	DESARROLLO DEL POZO (POSICIONAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UNO	1.00	\$ 442,646.00	\$ 442,646.00	1.00	\$ 442,646.00										
1.15	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA	UNO	1.00	\$ 405,516.00	\$ 405,516.00	1.00	\$ 405,516.00										
TOTAL POZO PROFUNDO AVALUBIA CENTRAL					\$ 151,123,410.00		\$ 151,123,410.00										
4	REDES DE ADECUADO																
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUIVE COMISION TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	ML	3,747.00	\$ 4,314.00	\$ 16,164,558.00	3,747.00	\$ 16,164,558.00										
4.2	RETRO DE SOBRIANTES DE EXCAVACION	M3	938.75	\$ 43,398.00	\$ 40,853,077.00	938.75	\$ 40,853,077.00										
4.3	CARGUE UN MANUAL EN MATERIAL COMUN H40 - 2.00m INCLUIVE	M3	319.50	\$ 68,753.00	\$ 31,551,584.00	319.50	\$ 31,551,584.00										
4.4	CANALIZACION PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	843.08	\$ 189,055.00	\$ 159,422,213.00	843.08	\$ 159,422,213.00										
4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3	1,017.60	\$ 44,843.00	\$ 45,632,237.00	1,017.60	\$ 45,632,237.00										
4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARBESCE TAMAÑO MAX. 3"	M3	284.00	\$ 78,793.00	\$ 22,143,187.00	284.00	\$ 22,143,187.00										
4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	284.00	\$ 23,920.00	\$ 6,795,280.00	284.00	\$ 6,795,280.00										
4.8	TUBERIA PVC RIE 21.2 INCHES TAMAÑO MAX. 3"	M3	284.00	\$ 23,920.00	\$ 6,795,280.00	284.00	\$ 6,795,280.00										
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPACTA ELASTICA	UN	1.00	\$ 1,148,570.00	\$ 1,148,570.00	1.00	\$ 1,148,570.00										
4.10	TRABAJO DE CEMENTO EN CEMENTO H40 - 2.00m INCLUIVE	UN	5.00	\$ 128,043.00	\$ 640,215.00	5.00	\$ 640,215.00										
4.11	CODO GRAN RADIO 45° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS	UN	10.00	\$ 122,894.00	\$ 1,228,940.00	10.00	\$ 1,228,940.00										
4.12	TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA	UN	10.00	\$ 140,168.00	\$ 1,401,680.00	10.00	\$ 1,401,680.00										
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION EN PVC 607	UN	10.00	\$ 94,930.00	\$ 949,300.00	10.00	\$ 949,300.00										
4.14	TRAPERO EN PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI (2)	UN	5.00	\$ 4,065.00	\$ 20,325.00	5.00	\$ 20,325.00										
4.15	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUIVE CARGUE	M3	1,822.20	\$ 92,355.00	\$ 168,277,993.00	1,822.20	\$ 168,277,993.00										
4.16	ACOMETIDA CONIG. AQUED. 24" (2) INCH. SUMIN. E INSTAL. MANEJO (M3. ACCESORIOS Y REGISTRO)	UNO	71.00	\$ 265,163.00	\$ 18,827,993.00	71.00	\$ 18,827,993.00										
TOTAL REDES DE ADECUADO AVALUBIA CENTRAL					\$ 1,182,138,842.00		\$ 1,182,138,842.00										
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION																
5.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H40-2.00m INCLUIVE	M3	7.44	\$ 98,753.00	\$ 734,722.00	7.44	\$ 734,722.00										
5.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	4.90	\$ 44,843.00	\$ 216,731.00	4.90	\$ 216,731.00										
5.5	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	2.05	\$ 1,591,805.00	\$ 3,263,194.00	2.05	\$ 3,263,194.00										
5.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	0.77	\$ 2,251,614.00	\$ 1,733,743.00	0.77	\$ 1,733,743.00										
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJO COMPACTA ELASTICA	M3	481.56	\$ 13,233.00	\$ 6,377,802.00	481.56	\$ 6,377,802.00										
5.8	SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	M3	0.68	\$ 1,095,773.00	\$ 747,845.00	0.68	\$ 747,845.00										
TOTAL TANQUE ELEVADO AVALUBIA CENTRAL					\$ 207,352,391.00		\$ 207,352,391.00										
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REPLANTEO CONVENCIONAL																
6.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H40 - 2.00m INCLUIVE	M2	48.20	\$ 5,300.00	\$ 255,460.00	48.20	\$ 255,460.00										
6.2	CARGUE	M3	5.00	\$ 88,753.00	\$ 443,765.00	5.00	\$ 443,765.00										
6.3	CONCRETO CIGARRON 3000 PSI - 20.7 MPA PIEDRA PROPORCION	M3	4.10	\$ 1,128,678.00	\$ 4,627,375.00	4.10	\$ 4,627,375.00										
6.4	RELLENO CONGRUVA	M3	1.31	\$ 169,935.00	\$ 222,616.00	1.31	\$ 222,616.00										
6.5	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	M3	0.38	\$ 1,591,805.00	\$ 604,886.00	0.38	\$ 604,886.00										
6.6	ACERO REFUERZO F# 4000 Mpa (4200 KG/CM2 680) INCLUIVE	KG	375.41	\$ 13,233.00	\$ 4,967,801.00	375.41	\$ 4,967,801.00										
6.7	REFUERZO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	UNO	1.00	\$ 815,572.00	\$ 815,572.00	1.00	\$ 815,572.00										
6.8	REFUERZO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	UNO	1.00	\$ 815,572.00	\$ 815,572.00	1.00	\$ 815,572.00										
6.9	REFUERZO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	UNO	1.00	\$ 815,572.00	\$ 815,572.00	1.00	\$ 815,572.00										
6.10	REFUERZO EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA	UNO	1.00	\$ 815,572.00	\$ 815,572.00	1.00	\$ 815,572.00										
6.11	SOLADO LIMPIEZA CONCRETO 13.8 Mpa (2000 PSI)	M3	0.68	\$ 1,095,773.00	\$ 747,845.00	0.68	\$ 747,845.00										
TOTAL CERRAMIENTO AVALUBIA CENTRAL					\$ 17,958,911.00		\$ 17,958,911.00										
COMUNIDAD PUERTO LOPEZ (809-094) (FZ. 139)																	
1	POZO PROFUNDO																
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UNO	1.00	\$ 139,220.00	\$ 139,220.00	1.00	\$ 139,220.00										
1.2	INSTALACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS	UNO	1.00	\$ 2,882,940.00	\$ 2,882,940.00	1.00	\$ 2,882,940.00										
1.3	PERFORACION DE PUEBLO EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACION	ML	96.00	\$ 34,024.00	\$ 3,266,304.00	96.00	\$ 3,266,304.00										
1.4	DIRECTA POR LOZOS PARA ESTUDIOS TOPOLOGICO	ML	96.00	\$ 134,131.00	\$ 12,876,576.00	96.00	\$ 12,876,576.00										
1.5	ANALISIS TOPOLOGICO Y GRANULOMETRICO DEL POZO	UNO	1.00	\$ 3,993,053.00	\$ 3,993,053.00	1.00	\$ 3,993,053.00										
1.6	EJECUCION DE REGISTRO ELECTROICO (POTENCIAL, EXFOTAREO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)	ML	96.00	\$ 502,845.00	\$ 48,273,120.00	96.00	\$ 48,273,120.00										
TOTAL POZO PROFUNDO PTO LOPEZ					\$ 144,117,311.00		\$ 144,117,311.00										
4	REDES DE ADECUADO																
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUIVE COMISION TOPOGRAFICA CARTERA Y PLANOS	ML	689.00	\$ 43,140.00	\$ 29,706,060.00	689.00	\$ 29,706,060.00										
4.2	RETRO DE SOBRIANTES DE EXCAVACION	M3	187.25	\$ 43,398.00	\$ 8,130,315.00	187.25	\$ 8,130,315.00										
4.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H40 - 2.00m INCLUIVE	M3	54.00	\$ 88,753.00	\$ 4,794,942.00	54.00	\$ 4,794,942.00										
4.4	CANALIZACION PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	150.53	\$ 189,055.00	\$ 28,454,470.00	150.53	\$ 28,454,470.00										
4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3	192.70	\$ 44,843.00	\$ 8,619,816.00	192.70	\$ 8,619,816.00										
4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARBESCE TAMAÑO MAX. 3"	M3	50.18	\$ 78,793.00	\$ 3,953,333.00	50.18	\$ 3,953,333.00										
4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	57.00	\$ 23,920.00	\$ 1,359,160.00	57.00	\$ 1,359,160.00										
4.8	TUBERIA PVC RIE 21.2 INCHES TAMAÑO MAX. 3"	UN	549.00	\$ 23,920.00	\$ 12,953,240.00	549.00	\$ 12,953,240.00										
4.9	CODO GRAN RADIO 90° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS	UN	4.00	\$ 128,043.00	\$ 512,172.00	4.00	\$ 512,172.00										
4.10	CODO GRAN RADIO 45° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS	UN	1.00	\$ 122,894.00	\$ 122,894.00	1.00	\$ 122,894.00										
4.11	CODO GRAN RADIO 90° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS	UN	1.00	\$ 122,894.00	\$ 122,894.00	1.00	\$ 122,894.00										

CONDICIONES INICIALES										PREVISTO ACTA		ACTIVAS ANTERIORES		14/10/19		FINANCIALES		CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR		
ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.12	TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X3)		UN	1.00	\$ 140.168.00	\$ 140.168.00	1.00	\$ 140.168.00	-	\$ -	1.00	\$ 140.168.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION EN PVC Ø2		UN	1.00	\$ 94.930.00	\$ 94.930.00	1.00	\$ 94.930.00	-	\$ -	1.00	\$ 94.930.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.14	TARON EN PVC- PRESION TRABAJO 200 PSI (Ø2)		UN	2.00	\$ 4.055.00	\$ 8.110.00	2.00	\$ 8.110.00	-	\$ -	2.00	\$ 8.110.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.15	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE		M3	229.40	\$ 52.395.00	\$ 17,263,710.00	252.00	\$ 13,193,460.00	77.40	\$ 4,092,277.00	-	\$ -	329.40	\$ 17,263,710.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.16	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X107 (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA, UN. ACCESORIOS Y REGISTRO)		M3	12.00	\$ 265.183.00	\$ 3,182,196.00	9.00	\$ 2,386,647.00	-	\$ -	9.00	\$ 2,386,647.00	-	\$ -	3.00	\$ 786,549.00	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PUNTO GRELLO					\$ 34,272,331.00		\$ 34,272,331.00		\$ -		\$ 41,933,085.00		\$ -		\$ 17,231,659.00		\$ -		\$ 46,944,789.00
5	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION																			
5.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=2.00 M INCLUYE CARGUE		M3	7.44	\$ 89.753.00	\$ 734,722.00	7.44	\$ 734,722.00	-	\$ -	7.44	\$ 734,722.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA		M3	4.80	\$ 44.843.00	\$ 219,731.00	4.80	\$ 219,731.00	-0.82	\$ -	4.28	\$ 191,528.00	0.62	\$ 27,803.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	2.03	\$ 1,591,865.00	\$ 3,231,364.00	2.03	\$ 3,231,364.00	-	\$ -	2.03	\$ 3,231,364.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA		M3	0.77	\$ 1,733,743.00	\$ 1,333,743.00	0.77	\$ 1,333,743.00	-	\$ -	0.77	\$ 1,333,743.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	481.86	\$ 13,233.00	\$ 6,107,823.00	180.00	\$ 2,381,940.00	10.69	\$ 141,461.00	-	\$ -	190.69	\$ 2,523,401.00	270.87	\$ 3,584,423.00	-	\$ -	-	\$ -
5.8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	0.68	\$ 1,696,773.00	\$ 1,153,805.00	0.68	\$ 747,846.00	-	\$ -	0.68	\$ 747,846.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL TANQUE ELEVADO PUNTO GRELLO					\$ 18,532,633.00		\$ 18,532,633.00		\$ -		\$ 9,449,246.00		\$ -		\$ 113,659.00		\$ -		\$ 169,200,656.00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																			
6.1	LOCACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA INGENIERIA CIVIL M2 INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA		M2	48.20	\$ 5,300.00	\$ 255,460.00	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRELLO					\$ 255,460.00		\$ 255,460.00		\$ -		\$ 255,460.00		\$ -		\$ 255,460.00		\$ -		\$ 255,460.00
	TOTAL COMUNIDAD PUNTO GRELLO					\$ 786,629,433.00		\$ 786,629,433.00		\$ -		\$ 140,118,618.00		\$ -		\$ 292,827,313.00		\$ -		\$ 499,709,192.00
7	COMUNIDAD PUNTO GRELLO (Ø100 - Ø151) (F.Z. 1.39)																			
7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1.00	\$ 139,220.00	\$ 139,220.00	1.00	\$ 139,220.00	-	\$ -	1.00	\$ 139,220.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.2	INSTALACION DE TUBERIA DE 12" CON EQUIPO DE ROTACION		UND	1.00	\$ 2,882,980.00	\$ 2,882,980.00	1.00	\$ 2,882,980.00	-	\$ -	1.00	\$ 2,882,980.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.3	PERFORACION DE TUBERIA EN 8" CON EQUIPO DE ROTACION		UND	58.00	\$ 34,204,352.00	\$ 34,204,352.00	58.00	\$ 34,204,352.00	-	\$ -	58.00	\$ 34,204,352.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.4	ANALISIS TOPOGRAFICO Y GRAFICO METRICO DEL POZO		UND	99.00	\$ 13,144,938.00	\$ 13,144,938.00	99.00	\$ 13,144,938.00	-	\$ -	99.00	\$ 13,144,938.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.5	RECONSTRUCCION DE TUBERIA		UND	1.00	\$ 3,993,053.00	\$ 3,993,053.00	1.00	\$ 3,993,053.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,993,053.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.6	APLICACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12.12"		UND	98.00	\$ 49,278,810.00	\$ 49,278,810.00	98.00	\$ 49,278,810.00	-	\$ -	98.00	\$ 49,278,810.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 12" CON EQUIPO DE ROTACION		UND	62.00	\$ 19,668,086.00	\$ 19,668,086.00	62.00	\$ 19,668,086.00	-	\$ -	62.00	\$ 19,668,086.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.8	21 PRESION PARA PROFUNDIDAD DE 100 M		UND	1.00	\$ 3,765,969.00	\$ 3,765,969.00	1.00	\$ 3,765,969.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,765,969.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.9	CONSTRUCCION DE GRAVILLADORE		UND	1.00	\$ 1,668,279.00	\$ 1,668,279.00	1.00	\$ 1,668,279.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,668,279.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERIA PVC Ø 21"		UND	36.00	\$ 233,462.00	\$ 8,520,632.00	35.00	\$ 8,381,170.00	-	\$ -	35.00	\$ 8,381,170.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.11	SUMINISTRO DE GRANALLA, TANQUEADA, SELECCIONADA Y SIN CALCARIOS		M3	5.70	\$ 952,179.00	\$ 3,204,396.00	5.70	\$ 3,204,396.00	-0.34	\$ -	5.36	\$ 3,013,258.00	0.34	\$ 34,138.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO		UND	19.60	\$ 42,479.00	\$ 832,588.00	18.60	\$ 832,588.00	-	\$ -	18.60	\$ 832,588.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.13	RELLENO DE TUBERIA DEL POZO POR METODOS COMBINADOS		UND	1.00	\$ 4,282,909.00	\$ 4,282,909.00	1.00	\$ 4,282,909.00	-	\$ -	1.00	\$ 4,282,909.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.14	DESINFECTACION DEL POZO (DISINFECTACION DE TIPO CLORITO DE SODIO)		UND	1.00	\$ 442,848.00	\$ 442,848.00	1.00	\$ 442,848.00	-	\$ -	1.00	\$ 442,848.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.15	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA		UND	1.00	\$ 405,510.00	\$ 405,510.00	1.00	\$ 405,510.00	-	\$ -	1.00	\$ 405,510.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL POZO PROFUNDO PUNTO GRELLO					\$ 140,734,878.00		\$ 140,734,878.00		\$ -		\$ 140,734,878.00		\$ -		\$ 140,734,878.00		\$ -		\$ 140,734,878.00
8	REDES DE ACUEDUCTO																			
8.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERIA Y PLANOS		M2	782.00	\$ 3,373,546.00	\$ 3,373,546.00	782.00	\$ 3,373,546.00	-	\$ -	782.00	\$ 3,373,546.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.2	RETRO DE SOBANTES DE EXCAVACION		M3	195.50	\$ 43,389.00	\$ 8,484,359.00	181.75	\$ 7,867,597.00	-	\$ -	181.75	\$ 7,867,597.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2.00M INCLUYE CARGUE		M3	49.50	\$ 98,753.00	\$ 4,888,274.00	33.00	\$ 3,258,845.00	-	\$ -	33.00	\$ 3,258,845.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.4	TARON EN PVC PARA CHEQUERON DE TUBERIAS		M3	175.95	\$ 180,052.00	\$ 31,271,285.00	127.23	\$ 24,057,611.00	-	\$ -	127.23	\$ 24,057,611.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA		M3	216.10	\$ 44,843.00	\$ 9,702,258.00	216.10	\$ 9,702,258.00	-	\$ -	216.10	\$ 9,702,258.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.6	RELLENO COMATERIAL DE ARBOLITE TAMAÑO MAX 3"		M3	54.65	\$ 79,793.00	\$ 4,357,299.00	54.65	\$ 4,357,299.00	-	\$ -	54.65	\$ 4,357,299.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3	87,300.00	\$ 2,399.00	\$ 208,045.00	42,881.05	\$ 97,659,035.00	9,510.30	\$ 21,659,263.00	-	\$ -	51,881.35	\$ 119,559,317.00	4,13	\$ 35,415.00	-	\$ -	-	\$ -
8.8	TUBERIA PVC Ø 21" E INSTALACION		M3	672.00	\$ 23,403.00	\$ 15,726,816.00	672.00	\$ 15,726,816.00	-	\$ -	672.00	\$ 15,726,816.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.9	TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X3)		UN	4.00	\$ 128,043.00	\$ 512,172.00	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.10	TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI- EXTREMOS UNION MECANICA X LISO (2X2X3)		UN	2.00	\$ 140,168.00	\$ 280,336.00	2.00	\$ 280,336.00	-	\$ -	2.00	\$ 280,336.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION EN PVC Ø2		UN	2.00	\$ 94,930.00	\$ 189,860.00	2.00	\$ 189,860.00	-	\$ -	2.00	\$ 189,860.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.12	TARON EN PVC- PRESION TRABAJO 200 PSI (Ø2)		UN	1.00	\$ 4,055.00	\$ 4,055.00	1.00	\$ 4,055.00	-	\$ -	1.00	\$ 4,055.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.13	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE		M3	493.20	\$ 52,395.00	\$ 25,759,596.00	493.20	\$ 25,759,596.00	-	\$ -	493.20	\$ 25,759,596.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8.14	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X107 (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA, UN. ACCESORIOS Y REGISTRO)		UND	11.00	\$ 265,183.00	\$ 2,917,013.00	11.00	\$ 2,917,013.00	-	\$ -	11.00	\$ 2,917,013.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PUNTO GRELLO					\$ 63,164,933.00		\$ 63,164,933.00		\$ -		\$ 131,959,282.00		\$ -		\$ 213,862,752.00		\$ -		\$ 48,102,232.00
9	TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION																			
9.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=2.00 M INCLUYE CARGUE		M3	7.44	\$ 89,753.00	\$ 734,722.00	7.44	\$ 734,722.00	-	\$ -	7.44	\$ 734,722.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA		M3	4.80	\$ 44,843.00	\$ 219,731.00	4.80	\$ 219,731.00	-0.82	\$ -	4.28	\$ 191,528.00	0.62	\$ 27,803.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	2.03	\$ 1,591,865.00	\$ 3,231,364.00	2.03	\$ 3,231,364.00	-	\$ -	2.03	\$ 3,231,364.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MEZCLA OBRA		M3	0.77	\$ 1,733,743.00	\$ 1,333,743.00	0.77	\$ 1,333,743.00	-	\$ -	0.77	\$ 1,333,743.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	481.86	\$ 13,233.00	\$ 6,107,823.00	180.00	\$ 2,381,940.00	10.69	\$ 141,461.00	-	\$ -	190.69	\$ 2,523,401.00	270.87	\$ 3,584,423.00	-	\$ -	-	\$ -
9.8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	0.68	\$ 1,696,773.00	\$ 1,153,805.00	0.68	\$ 747,846.00	-	\$ -	0.68	\$ 747,846.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL TANQUE ELEVADO PUNTO GRELLO					\$ 18,532,633.00		\$ 18,532,633.00		\$ -		\$ 9,449,246.00		\$ -		\$ 113,659.00		\$ -		\$ 169,200,656.00
10	CERRAMIENTO PERIMETRAL																			
10.1	LOCACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA INGENIERIA CIVIL M2 INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA		M2	48.20	\$ 5,300.00	\$ 255,460.00	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	48.20	\$ 255,460.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRELLO					\$ 255,460.00		\$ 255,460.00		\$ -		\$ 255,460.00		\$ -		\$ 255,460.00		\$ -		

CONDICIONES INICIALES				ACTIVIDADES				PRESTACIÓN				PROYECTO DE INICIACIÓN				AVANCE ACUMULADO				CANTIDAD POR EJECUTAR			
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
REDES DE ACUEDUCTO																							
4		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	ML	3,218.00	\$ 4,314.00	\$ 13,882.452.00	3,218.00	\$ 13,882.452.00	-	\$ -	-	\$ -	3,218.00	\$ 13,882.452.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.1		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 140" - 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	804.50	\$ 43,393.00	\$ 34,913,931.00	-	\$ -	765.25	\$ 33,232,010.00	-	\$ -	765.25	\$ 33,232,010.00	-	\$ -	38.75	\$ 1,681,613.00	-	\$ -			
4.2		CAÑADA EN AREIA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	139.00	\$ 189,050.00	\$ 26,277,950.00	-	\$ -	93.00	\$ 17,665,050.00	-	\$ -	93.00	\$ 17,665,050.00	-	\$ -	46.50	\$ 8,902,015.00	-	\$ -			
4.3		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	724.05	\$ 44,843.00	\$ 32,574,123.00	-	\$ -	528.34	\$ 23,890,455.00	-	\$ -	528.34	\$ 23,890,455.00	-	\$ -	195.71	\$ 8,797,702.00	-	\$ -			
4.4		RELLERO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	918.90	\$ 44,843.00	\$ 41,209,233.00	-	\$ -	41,209.23	\$ 1,840,233.00	-	\$ -	41,209.23	\$ 1,840,233.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.5		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	241.35	\$ 78,793.00	\$ 18,916,691.00	-	\$ -	229.12	\$ 18,100,328.00	-	\$ -	229.12	\$ 18,100,328.00	-	\$ -	11.63	\$ 916,363.00	-	\$ -			
4.6		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	M3	25,390.00	\$ 2,300.00	\$ 58,395,924.00	-	\$ -	197,205.37	\$ 453,347,190.00	-	\$ -	197,205.37	\$ 453,347,190.00	-	\$ -	60,765.51	\$ 140,353,743.00	-	\$ -			
4.7		CODO GRAN RADIO 60° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	2,806.00	\$ 128,043.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	2,806.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	2,806.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.8		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	UN	3.00	\$ 128,043.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	3.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	3.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.9		CODO GRAN RADIO 60° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	4.00	\$ 128,043.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.10		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	UN	7.00	\$ 128,043.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	7.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	7.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.11		CAÑADA EN AREIA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	5.00	\$ 189,050.00	\$ 945,250.00	-	\$ -	5.00	\$ 945,250.00	-	\$ -	5.00	\$ 945,250.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.12		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	6.00	\$ 44,843.00	\$ 269,058.00	-	\$ -	6.00	\$ 269,058.00	-	\$ -	6.00	\$ 269,058.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.13		RELLERO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1,744.80	\$ 44,843.00	\$ 78,143,424.00	-	\$ -	1,744.80	\$ 78,143,424.00	-	\$ -	1,744.80	\$ 78,143,424.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.14		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	31.00	\$ 285,183.00	\$ 8,840,773.00	-	\$ -	31.00	\$ 8,840,773.00	-	\$ -	31.00	\$ 8,840,773.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.15		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 24"12" INCL. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA IVA ACCESORIOS Y REGISTRO	UNID	1.00	\$ 1,095,730,340.00	\$ 1,095,730,340.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,095,730,340.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,095,730,340.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
4.16		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO SAN GIL				\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00			
REDES DE AGUAS RESIDUALES																							
5		GERMINARIO PERIMETRAL	M2	48.20	\$ 255,460.00	\$ 12,313,952.00	48.20	\$ 12,313,952.00	-	\$ -	-	\$ -	48.20	\$ 12,313,952.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	ML	3,218.00	\$ 4,314.00	\$ 13,882.452.00	3,218.00	\$ 13,882.452.00	-	\$ -	-	\$ -	3,218.00	\$ 13,882.452.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 140" - 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	804.50	\$ 43,393.00	\$ 34,913,931.00	-	\$ -	765.25	\$ 33,232,010.00	-	\$ -	765.25	\$ 33,232,010.00	-	\$ -	38.75	\$ 1,681,613.00	-	\$ -			
5.3		CAÑADA EN AREIA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	139.00	\$ 189,050.00	\$ 26,277,950.00	-	\$ -	93.00	\$ 17,665,050.00	-	\$ -	93.00	\$ 17,665,050.00	-	\$ -	46.50	\$ 8,902,015.00	-	\$ -			
5.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	724.05	\$ 44,843.00	\$ 32,574,123.00	-	\$ -	528.34	\$ 23,890,455.00	-	\$ -	528.34	\$ 23,890,455.00	-	\$ -	195.71	\$ 8,797,702.00	-	\$ -			
5.5		RELLERO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	918.90	\$ 44,843.00	\$ 41,209,233.00	-	\$ -	41,209.23	\$ 1,840,233.00	-	\$ -	41,209.23	\$ 1,840,233.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.6		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	241.35	\$ 78,793.00	\$ 18,916,691.00	-	\$ -	229.12	\$ 18,100,328.00	-	\$ -	229.12	\$ 18,100,328.00	-	\$ -	11.63	\$ 916,363.00	-	\$ -			
5.7		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	M3	25,390.00	\$ 2,300.00	\$ 58,395,924.00	-	\$ -	197,205.37	\$ 453,347,190.00	-	\$ -	197,205.37	\$ 453,347,190.00	-	\$ -	60,765.51	\$ 140,353,743.00	-	\$ -			
5.8		CODO GRAN RADIO 60° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	2,806.00	\$ 128,043.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	2,806.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	2,806.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.9		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	UN	3.00	\$ 128,043.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	3.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	3.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.10		CODO GRAN RADIO 60° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	4.00	\$ 128,043.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.11		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	UN	7.00	\$ 128,043.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	7.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	7.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.12		CAÑADA EN AREIA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	5.00	\$ 189,050.00	\$ 945,250.00	-	\$ -	5.00	\$ 945,250.00	-	\$ -	5.00	\$ 945,250.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.13		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	6.00	\$ 44,843.00	\$ 269,058.00	-	\$ -	6.00	\$ 269,058.00	-	\$ -	6.00	\$ 269,058.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.14		RELLERO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	1,744.80	\$ 44,843.00	\$ 78,143,424.00	-	\$ -	1,744.80	\$ 78,143,424.00	-	\$ -	1,744.80	\$ 78,143,424.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.15		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	31.00	\$ 285,183.00	\$ 8,840,773.00	-	\$ -	31.00	\$ 8,840,773.00	-	\$ -	31.00	\$ 8,840,773.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.16		ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 24"12" INCL. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA IVA ACCESORIOS Y REGISTRO	UNID	1.00	\$ 1,095,730,340.00	\$ 1,095,730,340.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,095,730,340.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,095,730,340.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
5.17		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO FACUMBE				\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00		\$ 1,095,730,340.00			
REDES DE AGUAS RESIDUALES																							
6		GERMINARIO PERIMETRAL	M2	48.20	\$ 255,460.00	\$ 12,313,952.00	48.20	\$ 12,313,952.00	-	\$ -	-	\$ -	48.20	\$ 12,313,952.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	ML	3,218.00	\$ 4,314.00	\$ 13,882.452.00	3,218.00	\$ 13,882.452.00	-	\$ -	-	\$ -	3,218.00	\$ 13,882.452.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
6.2		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 140" - 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	804.50	\$ 43,393.00	\$ 34,913,931.00	-	\$ -	765.25	\$ 33,232,010.00	-	\$ -	765.25	\$ 33,232,010.00	-	\$ -	38.75	\$ 1,681,613.00	-	\$ -			
6.3		CAÑADA EN AREIA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	139.00	\$ 189,050.00	\$ 26,277,950.00	-	\$ -	93.00	\$ 17,665,050.00	-	\$ -	93.00	\$ 17,665,050.00	-	\$ -	46.50	\$ 8,902,015.00	-	\$ -			
6.4		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	724.05	\$ 44,843.00	\$ 32,574,123.00	-	\$ -	528.34	\$ 23,890,455.00	-	\$ -	528.34	\$ 23,890,455.00	-	\$ -	195.71	\$ 8,797,702.00	-	\$ -			
6.5		RELLERO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	918.90	\$ 44,843.00	\$ 41,209,233.00	-	\$ -	41,209.23	\$ 1,840,233.00	-	\$ -	41,209.23	\$ 1,840,233.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
6.6		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	241.35	\$ 78,793.00	\$ 18,916,691.00	-	\$ -	229.12	\$ 18,100,328.00	-	\$ -	229.12	\$ 18,100,328.00	-	\$ -	11.63	\$ 916,363.00	-	\$ -			
6.7		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	M3	25,390.00	\$ 2,300.00	\$ 58,395,924.00	-	\$ -	197,205.37	\$ 453,347,190.00	-	\$ -	197,205.37	\$ 453,347,190.00	-	\$ -	60,765.51	\$ 140,353,743.00	-	\$ -			
6.8		CODO GRAN RADIO 60° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	2,806.00	\$ 128,043.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	2,806.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	2,806.00	\$ 359,412,840.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
6.9		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	UN	3.00	\$ 128,043.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	3.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	3.00	\$ 384,129.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
6.10		CODO GRAN RADIO 60° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECÁNICA X USO 12"	UN	4.00	\$ 128,043.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	4.00	\$ 512,172.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			
6.11		TUBERÍA PVC R2 21" 2' INSTALACIÓN	UN	7.00	\$ 128,043.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	7.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	7.00	\$ 896,301.00	-	\$ -	-	\$ -					

CONDICIONES INICIALES										PRESIDENTE JACIA			AVANCE EJECUTADO			CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		
N° ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.9		GAJA DE INSPECCION DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO, SUMINISTRO Y MANEJO DE LA GAJA	UND	1.00	\$ 780.751.00	\$ 780.751.00	1.00	\$ 780.751.00	-	\$ -	1.00	\$ 780.751.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.10		EXCAVACION DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3	0.44	\$ 44.004.00	\$ 19.362.00	0.44	\$ 19.362.00	-	\$ -	0.44	\$ 19.362.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.11		SOALADO LIMPZA DE CONCRETO 13.9 Mps (2000 PSI)	M3	0.06	\$ 1,003.546.00	\$ 60.213.00	0.06	\$ 60.213.00	-	\$ -	0.06	\$ 60.213.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.12		TUBO GALVANIZADO DE 2" (E=21A, E=15 MM) PARA CERRAMIENTO, CON ANTI CORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE SUMINISTRO Y MANEJO	UND	298.00	\$ 116.767.00	\$ 34,796.568.00	298.00	\$ 34,796.568.00	-	\$ -	298.00	\$ 34,796.568.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.13		SUMINISTRO E INSTALACION PORTON TUBO REDONDO GALVANIZADO 1.1/4" (1.12 M) MALLA EMBLADA 2x2	M2	9.84	\$ 324.465.00	\$ 3,192.738.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9.84	\$ 3,192.738.00	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL CERRAMIENTO VALERON						\$ 63,832.817.00		\$ 63,832.817.00		\$ 63,832.817.00		\$ 63,832.817.00		\$ 63,832.817.00		\$ 63,832.817.00		\$ 63,832.817.00
TOTAL COMUNIDAD VALERON						\$ 1,147,137.000.00		\$ 1,147,137.000.00		\$ 1,147,137.000.00		\$ 1,147,137.000.00		\$ 1,147,137.000.00		\$ 1,147,137.000.00		\$ 1,147,137.000.00
COMUNIDAD ESMERALDA VALABO (2,400 - 21) (P. 2, 122)																		
1.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 135.845.00	\$ 135.845.00	1.00	\$ 135.845.00	-	\$ -	1.00	\$ 135.845.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2		INSTALACION Y ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCION DE FICHERA DE LADOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1.00	\$ 2,729.257.00	\$ 2,729.257.00	1.00	\$ 2,729.257.00	-	\$ -	1.00	\$ 2,729.257.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.3		PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACION DIRECTA POR LADOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO	M3	120.00	\$ 331.069.00	\$ 39,731.880.00	120.00	\$ 39,731.880.00	-	\$ -	120.00	\$ 39,731.880.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.4		ANALISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	M3	120.00	\$ 128.520.00	\$ 15,422.400.00	120.00	\$ 15,422.400.00	-	\$ -	120.00	\$ 15,422.400.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.5		EJECUCION DE REGISTRO ELECTRO POTENCIAL EXPLORATORIO, RESISTIVIDAD, BAYOS GAMA	UND	1.00	\$ 3,849.951.00	\$ 3,849.951.00	1.00	\$ 3,849.951.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,849.951.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.6		AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"	M3	120.00	\$ 473.781.00	\$ 56,854.920.00	120.00	\$ 56,854.920.00	-	\$ -	120.00	\$ 56,854.920.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.8		ACORDAR DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UND	1.00	\$ 3,590.984.00	\$ 3,590.984.00	1.00	\$ 3,590.984.00	-	\$ -	1.00	\$ 3,590.984.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9		CONSTRUCCION DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACION DE GRANULADORES	UND	1.00	\$ 1,633.976.00	\$ 1,633.976.00	1.00	\$ 1,633.976.00	-	\$ -	1.00	\$ 1,633.976.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.11		SUMINISTRO DE GRANILLA TAMAZO, SELECCIONADA Y SIN CARGADEROS	M3	7.02	\$ 532.966.00	\$ 3,741.421.00	7.02	\$ 3,741.421.00	-	\$ -	7.02	\$ 3,741.421.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.12		LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR METODOS COMBINADOS	UND	24.00	\$ 968.926.00	\$ 23,253.224.00	24.00	\$ 23,253.224.00	-	\$ -	24.00	\$ 23,253.224.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.13		RELLENO DE DESARROLLO DEL POZO POR METODOS COMBINADOS	UND	1.00	\$ 4,028.724.00	\$ 4,028.724.00	1.00	\$ 4,028.724.00	-	\$ -	1.00	\$ 4,028.724.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.14		RELLENO DE DESARROLLO DEL POZO POR METODOS COMBINADOS	UND	1.00	\$ 423.843.00	\$ 423.843.00	1.00	\$ 423.843.00	-	\$ -	1.00	\$ 423.843.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.15		ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA	UND	1.00	\$ 380.561.00	\$ 380.561.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 380.561.00	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL POZO PROFUNDO ESMERALDA VALABO						\$ 168,376.634.00		\$ 168,376.634.00		\$ 168,376.634.00		\$ 168,376.634.00		\$ 168,376.634.00		\$ 168,376.634.00		\$ 168,376.634.00
TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA ESMERALDA VALABO						\$ 88,316.839.00		\$ 88,316.839.00		\$ 88,316.839.00		\$ 88,316.839.00		\$ 88,316.839.00		\$ 88,316.839.00		\$ 88,316.839.00
4		REDES DE ACUEDUCTO																
4.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION	M3	3,898.88	\$ 4,250.00	\$ 16,578.168.00	3,898.88	\$ 16,578.168.00	-	\$ -	3,898.88	\$ 16,578.168.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.2		RETRO DE SOBANTES DE EXCAVACION	M3	972.25	\$ 847.00	\$ 824,955.750.00	972.25	\$ 824,955.750.00	-	\$ -	972.25	\$ 824,955.750.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.3		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	409.50	\$ 88,925.00	\$ 36,409.263.00	234.00	\$ 20,864.850.00	-	\$ -	234.00	\$ 20,864.850.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.4		CARGUE EN ARENA PARA CUANTIFICACION DE TUBERIAS	M3	875.02	\$ 160.167.00	\$ 140,847.230.00	593.07	\$ 95,049.720.00	-	\$ -	593.07	\$ 95,049.720.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.5		EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3	1,033.19	\$ 44,009.00	\$ 45,464.483.00	1,033.19	\$ 45,464.483.00	-	\$ -	1,033.19	\$ 45,464.483.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.6		RELLENO CONTRA MATERIAL DE ARRECIJE E TAMAÑO MAX. 3"	M3	261.67	\$ 76,250.00	\$ 20,000.630.00	254.17	\$ 19,380.463.00	-	\$ -	254.17	\$ 19,380.463.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.7		TUBERIA PVC DE 21 1/2" INSTALACION	M3	188,958.98	\$ 2,309.00	\$ 435,709.859.00	102,714.22	\$ 237,167.134.00	-	\$ -	102,714.22	\$ 237,167.134.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.8		TRANSFORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	2,998.98	\$ 23,070.00	\$ 69,186.459.00	2,998.98	\$ 69,186.459.00	-	\$ -	2,998.98	\$ 69,186.459.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.10		CONDO GRAN RADIO 90° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNION MECANICA X USO 12)	UND	3.00	\$ 120.164.00	\$ 360.492.00	3.00	\$ 360.492.00	-	\$ -	3.00	\$ 360.492.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.11		CONDO GRAN RADIO 45° PVC - PRESION TRABAJO 200PSI EXTREMOS UNION MECANICA X USO 12)	UND	5.00	\$ 115.332.00	\$ 576.660.00	5.00	\$ 576.660.00	-	\$ -	5.00	\$ 576.660.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.12		TEE PVC - PRESION TRABAJO 200 PSI EXTREMOS UNION MECANICA X USO 12)	UND	14.00	\$ 131.542.00	\$ 1,841.588.00	14.00	\$ 1,841.588.00	-	\$ -	14.00	\$ 1,841.588.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.13		APRON EN PVC - PRESION TRABAJO 280 PSI (C)	UND	15.00	\$ 90,816.00	\$ 1,362.240.00	15.00	\$ 1,362.240.00	-	\$ -	15.00	\$ 1,362.240.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.14		APRON EN PVC - PRESION TRABAJO 280 PSI (C)	UND	3.00	\$ 38,140.00	\$ 11,442.00	3.00	\$ 11,442.00	-	\$ -	3.00	\$ 11,442.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE	M3	1,799.39	\$ 58,519.00	\$ 105,296.704.00	1,799.39	\$ 105,296.704.00	-	\$ -	1,799.39	\$ 105,296.704.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.16		CONCRETO PARA CARGUE 2x4x7" (BUC. SUMIN. E INSTAL. MANEJO, UN. ACCESORIOS Y REGISTRO)	UND	89.00	\$ 248,083.00	\$ 22,048.887.00	76.00	\$ 19,411.314.00	-	\$ -	76.00	\$ 19,411.314.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL REDES DE ACUEDUCTO ESMERALDA VALABO						\$ 853,836.249.00		\$ 853,836.249.00		\$ 853,836.249.00		\$ 853,836.249.00		\$ 853,836.249.00		\$ 853,836.249.00		\$ 853,836.249.00
6		CERRAMIENTO PERIMETRAL																
6.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA	M2	54.20	\$ 5,185.00	\$ 281.091.00	54.20	\$ 281.091.00	-	\$ -	54.20	\$ 281.091.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL CERRAMIENTO ESMERALDA VALABO						\$ 49,519.842.00		\$ 49,519.842.00		\$ 49,519.842.00		\$ 49,519.842.00		\$ 49,519.842.00		\$ 49,519.842.00		\$ 49,519.842.00
TOTAL COMUNIDAD PALAGRANDE VALABO (N.009 - 11) (P. 2, 122)						\$ 1,162,380.336.00		\$ 1,162,380.336.00		\$ 1,162,380.336.00		\$ 1,162,380.336.00		\$ 1,162,380.336.00		\$ 1,162,380.336.00		\$ 1,162,380.336.00
1.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 135.845.00	\$ 135.845.00	1.00	\$ 135.845.00	-	\$ -	1.00	\$ 135.845.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.2		INSTALACION Y ADECUACION DE EQUIPOS CONSTRUCCION DE FICHERA DE LADOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS	UND	1.00	\$ 2,729.257.00	\$ 2,729.257.00	1.00	\$ 2,729.257.00	-	\$ -	1.00	\$ 2,729.257.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4		REDES DE ACUEDUCTO																
4.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION	M3	2,709.38	\$ 4,250.00	\$ 11,514.865.00	2,709.38	\$ 11,514.865.00	-	\$ -	2,709.38	\$ 11,514.865.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.2		RETRO DE SOBANTES EN EXCAVACION	M3	677.35	\$ 847.00	\$ 573,543.330.00	571.10	\$ 573,543.330.00	-	\$ -	571.10	\$ 573,543.330.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.3		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.00m INCLUYE CARGUE	M3	342.00	\$ 88,925.00	\$ 30,438.550.00	201.00	\$ 19,803.525.00	-	\$ -	201.00	\$ 19,803.525.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.4		CARGUE EN ARENA PARA CUANTIFICACION DE TUBERIAS	M3	699.91	\$ 160.167.00	\$ 112,031.565.00	399.77	\$ 55,949.461.00	-	\$ -	399.77	\$ 55,949.461.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.5		EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3	688.61	\$ 44,009.00	\$ 30,290.435.00	699.61	\$ 30,760.435.00	-	\$ -	699.61	\$ 30,760.435.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.6		RELLENO CONTRA MATERIAL DE ARRECIJE E TAMAÑO MAX. 3"	M3	203.20	\$ 76,250.00	\$ 15,494.000.00	171.33	\$ 13,063.813.00	-	\$ -	171.33	\$ 13,063.813.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.7		TUBERIA PVC DE 21 1/2" INSTALACION	M3	133,936.32	\$ 2,309.00	\$ 308,549.953.00	70,819.60	\$ 163,522.816.00	-	\$ -	70,819.60	\$ 163,522.816.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.8		TRANSFORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3	1,349.38														

CONDICIONES INICIALES										ACTAS ANTERIORES				PRESENTE ACTA				MOPCO (141-1014 AL 14-11-1999)				AVANCE ACUERDOS				CANTIDAD OBRAS POR EJECUTAR			
N° ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
5.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HQ=200 M/INCLUIVE CARGUE		M3	7.44	\$ 98,925.00	\$ 733,025.00	7.44	\$ 733,025.00																					
5.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA CAPA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	4.90	\$ 44,004.00	\$ 215,620.00	4.28	\$ 189,337.60																					
5.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA CAPA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	2.03	\$ 1,906,465.00	\$ 3,868,124.00	2.03	\$ 3,868,124.00																					
5.6	COLUMNA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	0.77	\$ 2,148,100.00	\$ 1,652,487.00	0.77	\$ 1,652,487.00																					
5.7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA CAPA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	481.58	\$ 12,684.00	\$ 6,100,271.00	381.38	\$ 4,947,066.00																					
5.8	SOLADO LIMPIEZA ARMADO 13.8 Mpa (2000 PSI)		M3	0.58	\$ 1,040,945.00	\$ 607,553.00	0.58	\$ 707,573.00																					
5.9	TOTAL TANQUE EL PIVADO PAL GORANDE WALABO					\$ 197,395,146.00																							
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REPLANTIO CONVENCIONAL		M2	48.20	\$ 5,186.00	\$ 249,965.00	48.20	\$ 249,965.00																					
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTIO CONVENCIONAL		M2	48.20	\$ 5,186.00	\$ 249,965.00	48.20	\$ 249,965.00																					
6.2	TOTAL CERRAMIENTO PAL GORANDE WALABO					\$ 53,832,881.00																							
6.3	TOTAL CERRAMIENTO PAL GORANDE WALABO					\$ 1,298,127,485.00																							
COMUNIDAD LA UNION #000 - 1U (F. 2. 12)																													
1	POZO PROFUNDO		UNID	1.00	\$ 135,845.00	\$ 135,845.00	1.00	\$ 135,845.00																					
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTIO PARA POZOS PROFUNDOS		UNID	1.00	\$ 2,729,257.00	\$ 2,729,257.00																							
1.2	REPLANTIO DE SOBRESANTES DE EXCAVACION		UNID	1.00	\$ 2,729,257.00	\$ 2,729,257.00																							
1.3	PERFORACION DE PROBAR EN 1/2" CON EQUIPO DE ROTACION DIRECTA POR LADOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	140.00	\$ 46,353,860.00	\$ 6,489,532.00	140.00	\$ 6,489,532.00																					
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	140.00	\$ 17,892,800.00	\$ 2,504,912.00	140.00	\$ 2,504,912.00																					
1.5	REDUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTENCIA, RÁFAGOS, SENSIBIL)		UNID	1.00	\$ 3,849,951.00	\$ 3,849,951.00	1.00	\$ 3,849,951.00																					
1.6	AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"		ML	140.00	\$ 413,791.00	\$ 57,930,740.00	140.00	\$ 57,930,740.00																					
4	REDES DE ACUEDUCTO		UNID	1.00	\$ 4,296.00	\$ 4,296.00	1.00	\$ 4,296.00																					
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTIO DE REDES INCLUIVE CONSIGN		ML	1,059.62	\$ 4,296.00	\$ 4,502,960.00	1,059.62	\$ 4,502,960.00																					
4.2	REPLANTIO DE REDES INCLUIVE CONSIGN		M3	264.88	\$ 40,722.00	\$ 10,787,768.00	228.63	\$ 9,311,410.00																					
4.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HQ= 2.00m INCLUIVE CARGUE		M3	126.00	\$ 98,925.00	\$ 12,461,550.00	81.00	\$ 7,980,250.00																					
4.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA CAPA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	228.33	\$ 180,187.00	\$ 40,950,011.00	195.05	\$ 35,140,873.00																					
4.5	EXCAVACION COMPACTACION MANUAL		M3	275.86	\$ 44,004.00	\$ 12,139,943.00	275.86	\$ 12,139,943.00																					
4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRIQUE TAMAÑO MAX. 3"		M3	75.46	\$ 76,250.00	\$ 5,750,000.00	68.59	\$ 5,229,985.00																					
4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/MH	54,943.00	\$ 2,300.00	\$ 126,166.00	30,620.92	\$ 1,406,337.00																					
4.8	TUBERIA PVC DE 21" P/ INSTALACION		M3/MH	77.52	\$ 23,070.00	\$ 1,785,576.00	77.52	\$ 1,785,576.00																					
4.9	CODIGO GRAN RADIO 60" PVC PRESION TRABAJO 200PSI-EXTREMOS X LISO (2X2X2)		UN	1.00	\$ 120,164.00	\$ 120,164.00	1.00	\$ 120,164.00																					
4.10	TEE PVC PRESION TRABAJO 200 PSI-EXTREMOS UNION MECANICA		UN	4.00	\$ 131,542.00	\$ 526,168.00	4.00	\$ 526,168.00																					
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE REPARACION EN PVC 92 UNION		UN	4.00	\$ 90,836.00	\$ 363,344.00	4.00	\$ 363,344.00																					
4.12	REPLANTIO DE REDES INCLUIVE CONSIGN		UN	5.00	\$ 3,814.00	\$ 19,070.00	5.00	\$ 19,070.00																					
4.13	EXCAVACION COMPACTACION MANUAL		M3	467.71	\$ 27,369,464.00	\$ 12,780,464.00	467.71	\$ 12,780,464.00																					
4.14	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANEJERA 10M. ACOSESORIOS Y RESISTOR)		M3	28.00	\$ 248,863.00	\$ 6,968,164.00	27.00	\$ 6,568,164.00																					
4.15	TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LA UNION					\$ 271,221,121.00																							
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL		UNID	48.20	\$ 5,186.00	\$ 249,965.00	48.20	\$ 249,965.00																					
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTIO CONVENCIONAL		M2	48.20	\$ 5,186.00	\$ 249,965.00	48.20	\$ 249,965.00																					
6.2	TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRELLO					\$ 53,832,881.00																							
6.3	TOTAL CERRAMIENTO PUNTO GRELLO					\$ 1,298,127,485.00																							
COMUNIDAD PUNTO GRELLO (10.000 - 1U) (F. 2. 12)																													
1	POZO PROFUNDO		UNID	1.00	\$ 135,845.00	\$ 135,845.00	1.00	\$ 135,845.00																					
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTIO PARA POZOS PROFUNDOS		UNID	1.00	\$ 2,729,257.00	\$ 2,729,257.00																							
1.2	REPLANTIO DE SOBRESANTES DE EXCAVACION		UNID	1.00	\$ 2,729,257.00	\$ 2,729,257.00																							
1.3	PERFORACION DE PROBAR EN 1/2" CON EQUIPO DE ROTACION DIRECTA POR LADOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	140.00	\$ 46,353,860.00	\$ 6,489,532.00	140.00	\$ 6,489,532.00																					
1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	140.00	\$ 17,892,800.00	\$ 2,504,912.00	140.00	\$ 2,504,912.00																					
1.5	REDUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTENCIA, RÁFAGOS, SENSIBIL)		UNID	1.00	\$ 3,849,951.00	\$ 3,849,951.00	1.00	\$ 3,849,951.00																					
1.6	AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"		ML	140.00	\$ 413,791.00	\$ 57,930,740.00	140.00	\$ 57,930,740.00																					
4	REDES DE ACUEDUCTO		UNID	1.00	\$ 4,296.00	\$ 4,296.00	1.00	\$ 4,296.00																					
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTIO DE REDES INCLUIVE CONSIGN		ML	1,059.62	\$ 4,296.00	\$ 4,502,960.00	1,059.62	\$ 4,502,960.00																					
4.2	REPLANTIO DE REDES INCLUIVE CONSIGN		M3	264.88	\$ 40,722.00	\$ 10,787,768.00	228.63	\$ 9,311,410.00																					
4.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HQ= 2.00m INCLUIVE CARGUE		M3	126.00	\$ 98,925.00	\$ 12,461,550.00	81.00	\$ 7,980,250.00																					
4.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA CAPA EN CONCRETO 207 MPA (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION		M3	228.33	\$ 180,187.00	\$ 40,950,011.00	195.05	\$ 35,140,873.00																					
4.5	EXCAVACION COMPACTACION MANUAL		M3	275.86	\$ 44,004.00	\$ 12,139,943.00	275.86	\$ 12,139,943.00																					
4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRIQUE TAMAÑO MAX. 3"		M3	75.46	\$ 76,250.00	\$ 5,750,000.00	68.59																						

CONDICIONES INICIALES										ACTAS INTERIORES				PRESENTE ACTA				MODIFICACIONES AL 1º				AVANCE ACUMULADO				CANTIDAD OBLIGATORIA			
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
COMUNIDAD ALGARROBO (6000 - 1) (P.Z. 123)																													
1	POZO PROFUNDO																												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	135.845,00	135.845,00	1,00	135.845,00				1,00	135.845,00			1,00	135.845,00			1,00	135.845,00			-	-	-	-		
4	REDES DE ACUEDUCTO																												
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS		ML	2.362,75	4.250,00	10.041.688,00	2.362,75	10.041.688,00				2.362,75	10.041.688,00			2.362,75	10.041.688,00			2.362,75	10.041.688,00			-	-	-	-		
4.2	RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACIÓN		M3	596,69	40.727,00	24.407.032,00	-	-				-	-			-	-			-	-			112,50	11.094.063,00				
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		M3	112,50	98.525,00	11.094.063,00	-	-				-	-			-	-			-	-			227,19	24.944.741,00				
4.4	CONCRETO EN MATERIAL PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS		M3	531,52	160.187,00	85.203.381,00	-	-				304,43	54.848.240,00			304,43	54.848.240,00			304,43	54.848.240,00			55,33	9.032.141,00				
4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL		M3	871,33	44.004,00	38.354.225,00	-	-				816,00	27.108.664,00			816,00	27.108.664,00			816,00	27.108.664,00			45,31	3.447.283,00				
4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRECHE TAMAÑO MAX. 3"		M3	17.772	76.250,00	1.352.293,00	-	-				132,00	10.055.060,00			132,00	10.055.060,00			132,00	10.055.060,00			47,254,68	10.255.013,00				
4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3	19.337,28	2.293,00	44.340.145,00	-	-				71.522,48	165.330.128,00			71.522,48	165.330.128,00			71.522,48	165.330.128,00			352,75	8.137.243,00				
4.8	TUBERÍA PVC 6" RØ 21" INSTALACIÓN		ML	21.123,5	3.007,00	63.514.123,50	-	-				1.750,00	46.603.200,00			1.750,00	46.603.200,00			1.750,00	46.603.200,00			352,75	8.137.243,00				
4.15	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	1.287,65	59.516,00	76.430.343,00	-	-				990,51	57.962.664,00			990,51	57.962.664,00			990,51	57.962.664,00			277,14	15.217.679,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA AGUICULTURAL (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	5.186,00	249.965,00	48,20	249.965,00				48,20	249.965,00			48,20	249.965,00			48,20	249.965,00			-	-	-	-		
COMUNIDAD MATAPOALO (6000 - 1) (P.Z. 124)																													
1	POZO PROFUNDO																												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	135.845,00	135.845,00	1,00	135.845,00				1,00	135.845,00			1,00	135.845,00			1,00	135.845,00			-	-	-	-		
4	REDES DE ACUEDUCTO																												
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS		ML	2.976,40	4.246,00	12.637.320,00	2.976,40	12.637.320,00				2.976,40	12.637.320,00			2.976,40	12.637.320,00			2.976,40	12.637.320,00			-	-	-	-		
4.2	RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACIÓN		M3	744,10	41.355,00	30.892.020,00	695,25	28.784.013,00				1,25	51.744,00			1,25	51.744,00			1,25	51.744,00			47,50	1.985.253,00				
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		M3	144,00	98.540,00	14.189.600,00	75,00	7.399.550,00				3,00	295.146,00			3,00	295.146,00			3,00	295.146,00			66,00	6.506.412,00				
4.4	CONCRETO EN MATERIAL PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS		M3	659,59	182.350,00	122.150.756,00	486,75	88.781.801,00				486,75	88.781.801,00			486,75	88.781.801,00			486,75	88.781.801,00			182,95	33.366.855,00				
4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL		M3	644,92	44.214,00	28.367.253,00	31,57	1.357.263,00				844,92	37.357.263,00			844,92	37.357.263,00			844,92	37.357.263,00			-	-	-	-		
4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRECHE TAMAÑO MAX. 3"		M3	223,23	76.895,00	17.180.035,00	203,51	15.638.935,00				203,51	15.638.935,00			203,51	15.638.935,00			203,51	15.638.935,00			14,25	1.056.611,00				
4.7	TUBERÍA PVC 6" RØ 21" INSTALACIÓN		M3	153.417,86	2.370,00	363.601.700,00	92.815,83	21.380.090,00				21.604,09	57.273.950,00			21.604,09	57.273.950,00			21.604,09	57.273.950,00			41.011,11	9.494.033,00				
4.8	TUBERÍA PVC 6" RØ 21" INSTALACIÓN		ML	2.855,40	23.153,00	66.185.622,00	2.855,40	66.185.622,00				2.855,40	66.185.622,00			2.855,40	66.185.622,00			2.855,40	66.185.622,00			-	-	-	-		
4.10	CONCRETO EN MATERIAL PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS		UN	3,00	123.134,00	369.402,00	3,00	369.402,00				3,00	369.402,00			3,00	369.402,00			3,00	369.402,00			-	-	-	-		
4.11	CONCRETO EN MATERIAL PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS		UN	8,00	117.230,00	937.784,00	8,00	937.784,00				8,00	937.784,00			8,00	937.784,00			8,00	937.784,00			-	-	-	-		
4.12	TUBERÍA PVC 6" RØ 21" INSTALACIÓN		UN	4,00	133.685,00	534.740,00	4,00	534.740,00				4,00	534.740,00			4,00	534.740,00			4,00	534.740,00			-	-	-	-		
4.13	CONCRETO EN MATERIAL PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS		UN	6,00	91.855,00	551.154,00	6,00	551.154,00				6,00	551.154,00			6,00	551.154,00			6,00	551.154,00			-	-	-	-		
4.14	TUBERÍA PVC 6" RØ 21" INSTALACIÓN		UN	3,00	3.877,00	11.631,00	3,00	11.631,00				3,00	11.631,00			3,00	11.631,00			3,00	11.631,00			-	-	-	-		
4.15	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE		M3	1.583,84	50.020,00	79.238.877,00	1.583,84	79.238.877,00				1.583,84	79.238.877,00			1.583,84	79.238.877,00			1.583,84	79.238.877,00			-	-	-	-		
4.16	CONCRETO EN MATERIAL PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS		UN	32,00	252.943,00	8.095.176,00	25,00	6.320.976,00				25,00	6.320.976,00			25,00	6.320.976,00			25,00	6.320.976,00			6,00	1.517.658,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA AGUICULTURAL (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA		M2	48,20	5.214,00	251.315,00	48,20	251.315,00				48,20	251.315,00			48,20	251.315,00			48,20	251.315,00			-	-	-	-		
COMUNIDAD LA POBLA (6000 - 1) (P.Z. 124)																													
1	POZO PROFUNDO																												
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS		UND	1,00	135.855,00	135.855,00	1,00	135.855,00				1,00	135.855,00			1,00	135.855,00			1,00	135.855,00			-	-	-	-		
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		UND	1,00	2.767.688,00	2.767.688,00	1,00	2.767.688,00				1,00	2.767.688,00			1,00	2.767.688,00			1,00	2.767.688,00			-	-	-	-		
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		UND	1,00	33.558.000,00	33.558.000,00	1,00	33.558.000,00				1,00	33.558.000,00			1,00	33.558.000,00			1,00	33.558.000,00			-	-	-	-		
1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		UND	1,00	12.892.300,00	12.892.300,00	1,00	12.892.300,00				1,00	12.892.300,00			1,00	12.892.300,00			1,00	12.892.300,00			-	-	-	-		
1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		UND	1,00	3.865.726,00	3.865.726,00	1,00	3.865.726,00				1,00	3.865.726,00			1,00	3.865.726,00			1,00	3.865.726,00			-	-	-	-		
1.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		UND	1,00	48.105.400,00	48.105.400,00	1,00	48.105.400,00				1,00	48.105.400,00			1,00	48.105.400,00			1,00	48.105.400,00			-	-	-	-		
1.7	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 - 2,00m INCLUYE CARCÓN		UND	1,00	22.358.432,00	22.358.432,00	1,00	22.358.432,00				1,00	22.358.432,00			1,00	22.358.432,00			1,00	22.358.432,00			-	-				



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

CERTIFICADO

N° REGISTRO

F-1306919

N.I.T:
900783521

Cliente
ARCOE S.A.S

ESPECIFICACIONES DE BOBINA MADRE

# Lote	% Cx100	% Mnx100	% Px1000	% Sx1000
JP-334273-03135	4.00	18.00	18.00	3.00

P. SPHT1 - TUB CERR GALV - OTROS

UND TUBO CRR GALV 1,50 X 2" X 6000 MM

# Lote	Fecha Fabricación	Abocardado	Diámetro Externo (mm)	Longitud (mm)
JP-B196583	29/4/2025	Cumple	60.05	6010.00
# Lote	Fecha Fabricación	Abocardado	Diámetro Externo (mm)	Longitud (mm)
JP-B196584	29/4/2025	Cumple	60.05	6010.00
# Lote	Fecha Fabricación	Abocardado	Diámetro Externo (mm)	Longitud (mm)
JP-B196585	29/4/2025	Cumple	60.05	6010.00

OBSERVACIONES

*Los datos del presente certificado de calidad, han sido revisados por el área de calidad.

**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

***No se debe reproducir información parcial del certificado de calidad, excepto, si se hace en su totalidad, con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

AUTORIZA: Mariana López Rojas - Jefe de Calidad

Mariana López R.

El presente certificado de calidad del cliente ARCOE S.A.S. es válido por 12 meses.

El presente certificado de calidad es válido para el uso interno del cliente.

Porque Usted



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO**

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289



No.	TOC-79949
FECHA DESPACHO	DO/11/1/AAAA
	1/07/2025

CLIENTE	ARCOE S.A.S.				DESTINO	VILLAVICENCIO		NORMA	NTC 2289		PEDIDO No.	34311					
					PLACA	NWN 812		GRADO	420		REMISIÓN No.	34367					
											FACTURA No.	114311					
												RESULTADOS DIMENSIONALES					
												ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA					
												% Max.					
												ESPECIFICACIONES DE NORMA					
												OBSERVACIONES					
												ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA					
												CE: CARBONO EQUIVALENTE					
												"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIATIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM - 210"					
												Envío: lesocia@termetalscolombia.com info@termetalscolombia.com Felipe.Gonzalez@termetalscolombia.org					



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO**

NUUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





NTC 2282 2009
LISTAS COMPUSTAT DE
ACCIONES Y ADESION
PLURIRENTES DE ECONOMIA

TOC-85178

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
21/11/2025

[illegible]



CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-
Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000381347
CLIENTE: ARCOE S.A.S

FECHA 30.01.2023
PAG. 1 DE 2

MATERIAL: 111205 - Metaltub N 1_1/2"-1.50 6000 CERRAMIENTO					
NORMA DE CALIDAD: NORMA NTC 1560					
LOTE No	0009024982	0009024984	0009026392	0009026394	0009026737
COLADA No	445249	445249	445249	445249	445249
PESO	650,748 kg	650,748 kg	650,748 kg	650,748 kg	650,748 kg
PORCENTAJE DE CARBONO	0,060 %	0,060 %	0,060 %	0,060 %	0,060 %
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,230 %	0,230 %	0,230 %	0,230 %	0,230 %
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,017 %	0,017 %	0,017 %	0,017 %	0,017 %
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,004 %	0,004 %	0,004 %	0,004 %	0,004 %
PORCENTAJE DE SILICIO	%	%	%	%	%

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.



CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-
Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000381347
CLIENTE: ARCOE S.A.S

FECHA 30.01.2023

PAG. 2 DE 2

MATERIAL: 111205 - Metaltub N 1_1/2"-1.50 6000 CERRAMIENTO NORMA DE CALIDAD: NORMA NTC 1560					
LOTE No	0009026739	0009026894	0009027013	0009027014	0009027015
COLADA No	445249	445249	445249	445249	445249
PESO	650,748 kg	650,748 kg	650,748 kg	650,748 kg	650,748 kg
PORCENTAJE DE CARBONO	0,060 %	0,060 %	0,060 %	0,060 %	0,060 %
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,230 %	0,230 %	0,230 %	0,230 %	0,230 %
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,017 %	0,017 %	0,017 %	0,017 %	0,017 %
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,004 %	0,004 %	0,004 %	0,004 %	0,004 %
PORCENTAJE DE SILICIO	%	%	%	%	%

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha:	15-oct-25	Consecutivo	8.019
Norma:	NTC-382/2295	Referencia:	UNION REPAR. ACAMP 2" RIEBER
		Lote de Fabricación:	30000079511

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA A	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,32
DIAMETRO INT DEL ANILLO A	mm	NTC-3358	72,20 - 74,20	72,57
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA A	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,46
ESPESOR DE LA PESTAÑA A	mm	NTC-3358	$\geq 2,87$	3,53
ESPESOR DEL ANILLO A	mm	NTC-3358	$\geq 2,87$	3,00
ESPESOR DE LA CAMPANA A	mm	NTC-3358	$\geq 3,15$	3,55
LONGITUD DE LA PESTAÑA A	mm	NTC-3358	$\geq 15,00$	26,05
LONGITUD DE LA CAMPANA A	mm	NTC-3358	$\geq 190,00$	190,60
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA B	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,33
DIAMETRO INT DEL ANILLO B	mm	NTC-3358	72,20 - 74,20	72,42
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA B	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,50
ESPESOR DE LA PESTAÑA B	mm	NTC-3358	$\geq 2,87$	3,49
ESPESOR DEL ANILLO B	mm	NTC-3358	$\geq 2,87$	3,01
ESPESOR DE LA CAMPANA B	mm	NTC-3358	$\geq 3,15$	3,45

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Pag. 1 of 2

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha:	15-oct-25	Consecutivo	8.019
Norma:	NTC-382/2295	Referencia:	UNION REPAR. ACAMP 2" RIEBER
		Lote de Fabricación:	30000079511

LONGITUD DE LA PESTAÑA B	mm	NTC-3358	>= 15,00	27,51
LONGITUD DE LA CAMPANA B	mm	NTC-3358	>= 95,00	127,33

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2295	100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2295	22 InHg X 1 HORA	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2. 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Pag. 2 of 2

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha: 14-oct-25
Norma: NTC-1339

Consecutivo 7.831
Referencia: TAPON PRESION SOLD. 2"
Lote de Fabricación: 30000080516

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO DE ENTRADA A	mm	NTC-3358	60,48 - 60,78	60,73
OVALAMIENTO ENTRADA A	mm	NTC-3358	<= 0,61	0,02
DIAMETRO DE BASE A	mm	NTC-3358	60,02 - 60,32	60,23
OVALAMIENTO BASE A	mm	NTC-3358	<= 0,61	0,02
LONGITUD DE LA CAMPANA A	mm	NTC-3358	>= 29,36	31,74
ESPESOR DE CAMPANA A MINIMO	mm	NTC-3358	>= 3,91	4,14
ESPESOR DE CUERPO MINIMO	mm	NTC-3358	>= 4,90	5,25
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 890	900,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
ROTULADO	N/A	NTC-1339	GERFOR IND. COL 60mm -2" PVC SCH-40	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
 Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S.
 Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
 Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
 Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
 AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
 COTA - CUNDINAMARCA Colombia
 PBX: 8776820 FAX: 8776849
 www.gerfor.com

Pag. 1 of 1

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha:	15-oct-25	Consecutivo	7.957
Norma:	NTC-382/2295	Referencia:	CODO G.RADIO ACAMP 90°X2"
		Lote de Fabricación:	30000079873

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,19
DIAMETRO INT DEL ANILLO	mm	NTC-3358	72,20 - 74,20	72,11
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	61,50
ESPESOR DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 2,87	3,50
ESPESOR DEL ANILLO	mm	NTC-3358	>= 2,87	2,99
ESPESOR DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 3,15	3,47
LONGITUD DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 15,00	26,70
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 95,00	124,30
ANGULO DE LA CURVA	°	NTC-3358	89,00 - 91,00	90,00

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2295	100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2295	22 InHg X 1 HORA	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
 Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
 Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
 Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
 Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
 AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
 COTA - CUNDINAMARCA Colombia
 PBX: 8776820 FAX: 8776849
 www.gerfor.com

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha:	03-sep-25	Consecutivo	7.261
Norma:	NTC-382/2295	Referencia:	TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
		Lote de Fabricación:	30000077123

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	60,17 - 60,47	60,40
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 1,52	0,24
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	2,87 - 3,38	3,14
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6008,30
ESPESOR DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 2,87	3,31
ESPESOR DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 3,15	3,34
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	62,21
DIAMETRO INT DEL ANILLO	mm	NTC-3358	72,20 - 74,20	72,63
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	60,50 - 62,50	62,12
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 95,00	116,02
LONGITUD DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 15,00	25,03
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	628,35
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	648,50

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
 Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
 Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Aprobó:

Juan Manuel Ramos Morales
 Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Jenny Andrea Rodríguez Gutierrez
 Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
 AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
 COTA - CUNDINAMARCA Colombia
 PBX: 8776820 FAX: 8776849
 www.gerfor.com

CERTIFICADO DE CALIDAD
Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S



Fecha: 03-sep-25
Norma: NTC-382/2295

Consecutivo
Referencia:
Lote de Fabricación:

7.261
TUBO PRESION ACAMP RDE 21 2"
30000077123

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	40,7	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2295	100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2295	22 InHg X 1 HORA	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 2" - 60mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Pag. 2 of 2



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.680 – 1.

ANEXO 3. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

FECHA DE INFORME			CONTRATO N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MM	DD	AAAA	821	ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG)	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
FEBRERO	5	2025				
MES AL QUE PERTENECE EL INFORME			OBJETO DEL CONTRATO			SEDE / PROYECTO
ENERO			CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIHOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.			MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN

1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST										
Item	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	No. HORAS	Fecha Programada	Indicador cobertura			Indicador eficacia			Responsable O Líder
				Total asistentes a la capacitación	Numero de trabajadores programados	% de Cumplimiento	Numero trabajadores evaluados	Numero de evaluaciones eficaces	% de Cumplimiento	
1	SOCIALIZACIÓN DE AFICHE DE SIGNOS DE ALARMA DEL DENGUE.	0,15	7/01/2026	10	10	100%	10	10	100%	COORDINADOR SST
2	COMUNICACIÓN ASERTIVA	0,15	7/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
3	DETENTE, PIENSA Y ACTUA - CLAVES PRINCIPALES	0,15	10/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
4	DETENTE, PIENSA Y ACTUA - OBJETIVOS	0,15	14/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
5	EPP	1,00	17/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
6	ACCIDENTES OFIDICOS	0,15	20/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
7	CONDICIONES DE SALUD	0,15	23/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
8	GOLPES DE CALOR - PAUSAS ACTIVAS	0,15	27/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST
9	RIESGO PSICOLOGICO	1,00	31/01/2026	14	14	100%	14	14	100%	COORDINADOR SST

2. Programa de inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)								
Item	Inspección Realizada	Fecha	Periodicidad	Descripción del hallazgo	Plan de acción	Fecha del Cierre	% de Cumplimiento	
1	BOTIQUÍN WACOYO	14/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
2	CAMILLA WACOYO	14/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
3	EXTINTOR WACOYO	14/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
4	HERRAMIENTAS MENORES	8/01/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
5	BOTIQUÍN AWALIBA	9/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
6	CAMILLA AWALIBA	9/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
7	EXTINTOR AWALIBA	9/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
8	LOCATIVA	11/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
9	BOTIQUÍN ASEIHOME	28/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
10	CAMILLA ASEIHOME	28/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
11	EXTINTOR ASEIHOME	28/01/2026	MENSUAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
12	HERRAMIENTAS MECANIZADAS	21/01/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	
13	INSPECCIÓN DE EPP	21/01/2026	QUINCENAL	NINGUNO	N/A	N/A	100%	

3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST			
Item	Descripción de Gestión SST y demás Actividades	Fecha	Observaciones
1	SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SE VALIDÓ DOCUMENTACIÓN DEL OPERADOR.	SEMANAL	NINGUNA
2	SE DA CUMPLIMIENTO A LAS INSPECCIONES PLANEADAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS.	MENSUAL	NINGUNA
3	SE REALIZAN CHARLAS PRE OPERACIONALES, SOCIALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EJECUTAR.	DIARIA	NINGUNA
4	SEGUIMIENTO AL USO DE EPP Y DOTACIÓN EN OBRA.	DIARIA	NINGUNA

4. Inventario de Maquinaria y Equipos					
Item	Nombre del Equipo	Referencia	Propio o Alquilado	Nombre del Operador	Observaciones
1	EXCAVADORA	97165	PROPIO	YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES	NINGUNA

5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente							
Item	Descripción del hallazgo encontrado	Plan de Acción	Fecha	Se Notifico al Responsable		Fecha propuesta para el cierre	Estado
				SI	No		
1	NINGUNA	N/A	N/A			N/A	N/A

6. Seguimiento Ausentismo Laboral							
Item	Fecha	Nombre del Trabajador	Cedula	Cargo	Periodo de ausentismo		Descripción del ausentismo
					Fecha Inicial	Fecha final	



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

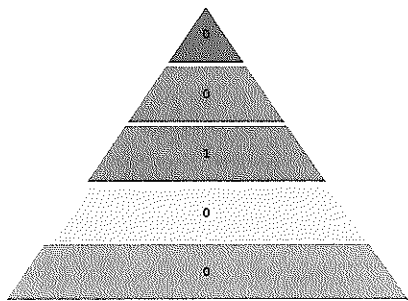
INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077


Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

7. Seguimiento a indicadores de Accidentalidad



FATALIDAD
ACCIDENTE TRABAJO GRAVE
ACCIDENTE TRABAJO MODERADO
ACCIDENTE TRABAJO LEVE
INCIDENTES



Item	Obra / Proyecto (Empresa contratista)	Promedio Trabajadores en el Mes	Total días trabajados en el Mes	HHT	INCIDENTE	AT LEVE	AT MODERADO	AT GRAVE	FATALIDAD	TOTAL AT	TOTAL DÍAS INCAPACIDAD	TOTAL DÍAS CARGADOS	ÍNDICES					
													Mes	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	TASA DE AUSENTISMO	TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES
1	CAG	17	26	3525	0	0	0	0	0	0	0	0	ENERO	0	0	0	0	0

8. Descripción de los Accidentes e incidentes presentados durante la Semana

Fecha del AT	Nombre	# Cedula	Ubicación y tipo de lesión	Incapacidad	Avance Incapacidad	At investigado	Descripción del accidente

9. Registro Fotográfico de Gestión SST



Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Estiramiento muscular



Ubicación:

OBRA

Descripción:

Ubicación de acero para asegurar la posición y realizar el corte de forma segura



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-077

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025



Ubicación:

OBRA

Descripción:

Inspección de botiquín, camilla y extintor.



Ubicación:

OBRA

Descripción:

Uso de protección facial y de manos en actividad de corte de acero.





Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Inspección de botiquín



Ubicación:

OFICINA

Descripción:

Inspección, ubicación, señalización de extintores y camilla



Ubicación:

Resguardo indígena Wacoyo

Descripción:

Se realizó Charla SST: Socialización de afiche de signos de alarma del dengue

10. Comentarios generales SST

- 1 Es importante destacar que se ejecutaron actividades de suministros de equipos, estructura y materiales para el desarrollo del proyecto, por lo tanto no se conto con personal operativo en el proyecto.
- 2 De acuerdo a lo anterior se realiza el presente Informe teniendo en cuenta el personal independiente, que debido al desarrollo de proyecto solo se realizaron actividades de inspección.

FIRMA	
NOMBRE	GUSTAVO MEDINA
CARGO	RESPONSABLE SST



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla ☒ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 07-01-2026

Hora: 11:00

Duración: 15 Minutos

Tema: Socialización de afiche de signos de alarma del dengue.

Lugar: Oficina 826

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO	1121869998	COORDINADOR SST	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla x Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 7 DE ENERO 2026

Hora: 7:00 am

Duración: 15 minutos

Tema: COMUNICACIÓN ABELTUA

Lugar: PUEBLO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 30 ENERO 2026

Hora: 7:00 am

Duración: 15 minutos

Tema: DETENTE, PIENSA Y ACTUA - CLAVES PRINCIPALES

Lugar: PUERTO GAITÁN.

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				







OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA


FIRMA:

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: SST-F-025
		Versión: 01
		Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla <u>X</u> Visita__ Campaña__ Otra__		
Fecha de actividad: 14 DE ENERO 2026	Hora: 7:00 am	Duración: 15 minutos
Tema: DETENTE, PIENSA Y ACTUA - OBJETIVOS		Lugar: PUERTO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA
FIRMA: 



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación ☒ Charla__ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 17 de Agosto 2026

Hora: 7:00 AM

Duración: 1 Hora

Tema: EPP

Lugar: Puerto Gaitán

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla ☒ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 20 DE ENERO DE 2026

Hora: 7:00 AM

Duración: 15 minutos

Tema: ACCIDENTES OFICIOS

Lugar: PUEBLO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	GUSTAVO MEDINA
FIRMA:	



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla__ ☒ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 23 de mayo de 2026 Hora: 7:00 AM

Duración: 35 minutos

Tema: CONDICIONES DE SALUD.

Lugar: PUERTO GAITÁN.

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla ☒ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 29 de ENERO 2026

Hora: 7:00 AM

Duración: 35 minutos

Tema: GÓPES DE CALOR - PRUEBAS ACTIVAS

Lugar: PUERTO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación X Charla__ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 31- ENERO 2026

Hora: 7:00 am

Duración: 1 HORA

Tema: RIESGO PSICOLOGICO


Lugar: PUERTO GAITÁN

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	FRANCY CAROLINA ARÉVALO GARZÓN	40326478	DIRECTOR DE OBRA	
2	DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	40395435	CONTADORA	
3	GENESIS PAOLA PARADA MARTÍNEZ	1092394700	SECRETARIA	
4	LINA MARCELA GÓMEZ LEAL	40328285	AUXILIAR CONTABLE	
5	JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	80013513	CONDUCTOR	
6	OBER ASMED PÉREZ PÉREZ	96193788	ALMACENISTA	
7	WENDY VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	
8	GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	1121834340	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	
9	EDWIN ALEJANDRO BARRIOS POLOCHE	1120864265	OFICIAL DE OBRA	
10	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	17497322	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	
11	YEFERSON ENRIQUE GALVÁN MONTES	78646546	OPERADOR DE MAQUINARIA	
12	DUVÁN ARLEY ROMERO ARÉVALO	1004819005	OFICIAL DE TUBERÍA	
13	JOSÉ JAVIER MONCADA CANO	1093921945	OFICIAL DE TUBERÍA	
14	MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA	1103470729	OFICIAL DE OBRA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: GUSTAVO MEDINA

FIRMA:



INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST-F-020

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN:

9-01-20

LUGAR:

Perle Garz

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:



608740 mdo wa

CARGO:

CARGO: COOP. SBT

[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:

		INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA			Código: SST-F-021
					Versión: 01
					Fecha: agosto 2025
Codigo: N/A		Fecha de Inspeccion: 9-01-26			
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MEDINA		Cargo: CDD. SST			
Lugar: PUEBLO GAITÁN		Ubicación de la camilla: ACULAHUA			
DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA					
Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2 Estado del soporte	X				
3 Sugetadores o Manijas de agarre	X				
4 Correas de amarre o seguridad	X				
5 Lugar visible y fácil acceso	X				
6 Rotulada / Señalización	X				
7 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				
OBSERVACIONES:					
 Firma					



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A

Código: SST-F-085

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Lugar: **POBLO DAIWAN**

Fecha de inspección: **9** / **1** / **26**

Ubicación del botiquín: **AUALIBA**

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?

Si

☒

No

Localizado en lugar visible?

Si

☒

No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos?

Si

☒

No

El botiquín se encuentra señalizado?

Si

☒

No

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	4-20	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	9-24	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2	9-24	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	9-24	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:

GUSTAVO MEDINA

Firmas:

FECHA INSPECCIÓN: 14-01-26


RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: GUSTAVO NEERINA

LUGAR: PUEBLO GAITÁN

CARGO: COORD. SST

N°.	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de última recarga	Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A										OBSERVACIONES				
							Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador		Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte
1	WACOLO	NA	20/65	ABC	POS	NOV-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

OBSERVACIONES GENERALES:

		INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA			Código: SST-F-021
					Versión: 01
					Fecha: agosto 2025
Codigo: N/A		Fecha de Inspección: 14-05-20			
Responsable de la Inspección: GUSTAVO MORA		Cargo: COORD. SST			
Lugar: PUERTO GAITÁN		Ubicación de la camilla: UNACCUCO			
DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA					
Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2 Estado del soporte	X				
3 Sujetadores o Manijas de agarre	X				
4 Correas de amarre o seguridad	X				
5 Lugar visible y fácil acceso	X				
6 Rotulada / Señalización	X				
7 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				
OBSERVACIONES:					
 Firma					



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2023

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A

Código: SST-F-085

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Lugar: **PUERTO GAITÁN**

Fecha de inspección: **19** **11** **2025**

Ubicación del botiquín: **WACCORO**

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado
en la pared?

Si

☒

No

☐

Localizado en lugar visible?

Si

☒

No

☐

El botiquín se encuentra libre de obstáculos?

Si

☒

No

☐

El botiquín se encuentra señalizado?

Si

☒

No

☐

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	01-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	9-30	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2	9-22	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	9-22	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	

FECHA INSPECCIÓN: 28.08.20



RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: CESAR MEDINA

LUGAR: PUERTO GAITÁN

CARGO: COORD. SST

N°	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de última recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	ASGIDOME	NA	20 lts	ABC	PAJ	NOV. 18	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:

		INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA			Código: SST-F-021
					Versión: 01
					Fecha: agosto 2025
Código: <u>N/A</u>		Fecha de Inspección: <u>28.01.26</u>			
Responsable de la Inspección: <u>GUSTAVO MEDINA</u>		Cargo: <u>COORD. SST</u>			
Lugar: <u>Puerto Gaitán</u>		Ubicación de la camilla: <u>ASEPORA</u>			
DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA					
Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X				
2 Estado del soporte	X				
3 Sujetadores o Manijas de agarre	X				
4 Correas de amarre o seguridad	X				
5 Lugar visible y fácil acceso	X				
6 Rotulada / Señalización	X				
7 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X				
OBSERVACIONES:					
 Firma					



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO A

Código: SST-F-085

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Lugar: **POERTO GAITÁN**

Fecha de Inspección: **08/08/2025**

Ubicación del botiquín: **ASEGURADO**

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?

Si

☒

No

Localizado en lugar visible?

Si

☒

No

El botiquín se encuentra libre de obstáculos?

Si

☒

No

El botiquín se encuentra señalizado?

Si


☒

No

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	20	4-28	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	4-30	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	50 Pares	50	12-26	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	9-30	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	9-29	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	2	7-29	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	NA	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	9-22	
16	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1	NA	
17	OTRO:				
18	OTRO:				
19	OTRO:				
20	OTRO:				
21	OTRO:				
22	OTRO:				
23	OTRO:				
24	OTRO:				

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:	GUSTAVO MEDINA	Firmas:	



VERSIÓN: 01
FECHA: AGOSTO 2025

FECHA DE INSPECCION:	DIA	MES	AÑO	HERRAMIENTAS/PROPIAS	CONTRATISTA RESPONSABLE	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUAS - CAG 2015
	21	6 AÑO	2016	☒ SI ☐ NO			

[illegible]

[illegible]



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES

SST-F-066

Versión: 01

Fecha: Agosto 2025

CONTRATISTA: CAG 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS - NOVENAS

FECHA: 01-08-26

ITEM	ACTIVIDADES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Herramientas				
1,1	Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS	X			
1,2	Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos)	X			
1,3	Se guardan y portan adecuadamente (en cinturón o caja de herramientas)	X			
1,4	Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados	X			
1,5	Se usan prensas de banco para sujetar	X			
1,6	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	X			
2	Herramientas de corte				
2,1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X	
2,2	Los cinceles se encuentran afilados			X	
2,3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes			X	
2,4	Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, aseguradas) y no presentan defectos	X			
2,5	Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	X			
2,6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos			X	
2,7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X			
3	Herramientas manuales y de golpe				
3,1	Se emplea el martillo adecuado según labor	X			
3,2	Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos)	X			
3,3	Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo	X			
3,4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos	X			
4	Herramientas de torsion-llaves				
4,1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas	X			
4,2	Se observan en la llave huellas de palancas		X		
4,3	Se disponen de llaves para golpear		X		
4,4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas		X		
4,5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			X	
4,6	La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos	X			
4,7	Se disponen de herramientas que no produzcan chispas			X	
5	Herramientas electricas				
5,1	Estan limpias y lubricadas	X			
5,2	Tiene sus guardas	X			
5,3	Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
5,4	El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico)	X			
5,5	En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes	X			
5,6	Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequenos	X			
5,7	Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes			X	
5,8	Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve			X	
5,9	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas	X			
6	Herramienta neumatica				
6,1	Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos)			X	
6,2	Se trabaja a las presiones indicadas			X	
6,3	La herramienta es descargada al terminar			X	
7	Herramienta por detonación				
7,1	El personal se encuentra autorizado			X	
7,2	Se descarga y es almacenada			X	
7,3	Su sistema de disparo es bajo presión			X	

ACCIONES DE MEJORA

Item	Acción	Responsable	Fecha de reinspección

RESPONSABLE SST

RESPONSABLE DE LA INSPECCION



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: SST-F-023

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Fecha de inspección: 11 DE ENERO DE 2026

Lugar: PUERTO GAITÁN

Inspección realizada por: GUSTAVO MEDINA

Cargo: COORDINADOR SST.

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
PELIGROS FISICOS					
1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
2	Las luminarias están en buen estado.			X	
3	Hay buena ventilación en el área.	X			
4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores)	X			
5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de	X			
6	La temperatura es confortable.	X			
PELIGROS ELECTRICOS					
7	Instalaciones eléctricas bien aisladas, con conexiones a tierra,	X			
8	Instalaciones eléctricas señaladas	X			
9	Cables eléctricos debidamente entubados.	X			
10	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X			
11	Tomas e interruptores en buen estado	X			
12	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.			X	
13	Cables en buen estado.	X			
14	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			X	
15	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			X	
16	Existe señalización de peligros.			X	
PELIGROS DE SEGURIDAD					
17	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X			
18	Extintores de carga vigente.	X			
19	Extintores libre de obstaculos.	X			
20	Existe señalización de extintores.	X			
21	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X			
22	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
23	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X			
24	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X			
25	Cuentan con Inmovilizador cervical	X			
26	Hay botiquín y control de consumo.	X			
27	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X			
28	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			
PELIGROS BIOLOGICOS					
29	Se realizan controles a los Factores que puedan generar Accidentes por contacto con Animales, y plantas.	X			
PELIGROS BIOMECANICO					
30	Las sillas / puestos de las maquinas cumplen, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y postura del operador.			X	
31	Las condiciones del puesto de trabajo, (escritorio) son las adecuadas a nivel Ergonomico. Teniendo en cuenta que se trabajaría 1/2 jornada en este sitio.			X	
32	Cuentan con las especificaciones del peso de las cargas que manejan en obra.	X			

CÓDIGO: SST-F-060	VERSION: 01	FECHA: AGOSTO 2025	CONSECUTIVO No. 002
Obra/oficina/Planta:		Fecha:	
CONSTRUCCION SIGT. DE ACCESORIOS		29 ENERO 2026	

Evento observado		
Acto inseguro	☐	Práctica segura ☒
Condición insegura	☐	Condición más segura ☐
Procedimiento inseguro	☐	Reconocimiento ☐
Incidente Ambiental	☐	Casiaccidente ☐

Descripción del evento o condición

SE OBSERVA PERSONAL USANDO LOS GPR. DELINTE LA ACTIVIDAD.

Conversación con la persona observada/Acciones

SE REALIZÓ EL COMPLENTO QUE TIENE EL PERSONAL CON LA SEGURIDAD

Acciones acordadas o recomendadas

SE INVITA A CONTINUAL CON ESTA PRÁCTICA SEGURA.

CONTRATISTA:

Se llevó a cabo la conversación? SI ☒ NO ☐

Se suspendió el trabajo? SI ☐ NO ☒

Nombre del observador (opcional)

Vo.Bo. Residente SST y/o Director de obra

GUSTAVO MEDINA



CÓDIGO: SST-F-060	VERSION: 01	FECHA: AGOSTO 2025	CONSECUTIVO No. 001
Obra/oficina/Planta:		Fecha:	
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACCESORIOS		6 ENERO 2026	

Evento observado		
Acto inseguro	☐	Práctica segura ☐
Condición insegura	☒	Condición más segura ☐
Procedimiento inseguro	☐	Reconocimiento ☐
Incidente Ambiental	☐	Casiaccidente ☐

Descripción del evento o condición

SE EVIDENCIA ELEMENTOS EN EL SUELO, GENERANDO UN RIESGO DE CAIDA A MISMO NIVEL.

Conversación con la persona observada/Acciones

SE CONVERSÓ CON EL PERSONAL, RECORDANDO EL RIESGO QUE SE GENERA AL TENER OBSTACULOS EN EL CAMINO.

Acciones acordadas o recomendadas

REALIZAR TORNOVA DE ORDEN Y ASEO

CONTRATISTA:

Se llevó a cabo la conversación? SI ☒ NO ☐

Se suspendió el trabajo? SI ☐ NO ☒

Nombre del observador (opcional)

Vo.Bo. Residente SST y/o Director de obra

GUSTAVO MEDINA





CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
NIT 900751966	6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	VILLAVO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2026-01	2026-02	39925250	9499300676	E	2026/02/16	2026/02/05	BAI-COLOMBIA	0	\$2,685,700								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLREADO		NOVEDADES				PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS				
No. Identificación	Nombre	In re te s t e p l a n i l l a	va a c a c i o n e s	va a c a c i o n e s	va a c a c i o n e s	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Tarifa	Aporte	Dias
SUCURSAL VILLAVO (6 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																	
1 CC 40326478	AREVALO GARCON FRANCY CAROLINA					\$1,623,300			\$562,000			\$16,072,457	\$657,000		\$16,049,413	\$317,000	
2 CC 40326478	AREVALO GARCON FRANCY CAROLINA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
3 CC 40328085	GOMEZ LEAL LINA MARCELA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
4 CC 40328085	GOMEZ LEAL LINA MARCELA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
5 CC 40395435	WACHARO TEJERO DIVA VANIRIA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
6 CC 40395435	WACHARO TEJERO DIVA VANIRIA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
7 CC 40395435	WACHARO TEJERO DIVA VANIRIA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
8 CC 1092394700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
9 CC 1092394700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
10 CC 1092394700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
11 CC 1092394700	PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)																	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																	
12 CC 80013513	MUÑOZ AURICIA JEIVANY ALEJANDRO					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
13 CC 96193788	PEREZ PEREZ OBER ASHED					\$1,623,300			\$406,700			\$10,133,037	\$401,100		\$10,154,991	\$46,500	
Total Afiliados(6)																	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$2,248,500	\$0	\$0	\$2,248,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,300,200	\$0	\$0	\$1,300,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$948,300	\$0	\$0	\$948,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$317,600	\$0	\$0	\$317,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$317,600	\$0	\$0	\$317,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$557,000	\$0	\$0	\$557,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$557,000	\$0	\$0	\$557,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$562,600	\$0	\$0	\$562,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$562,600	\$0	\$0	\$562,600
TOTAL				6	\$3,685,700	\$0	\$0	\$3,685,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL. 15-40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago																	
2026-01	2026-02	39937379	9499301789	E	2026/02/09	2026/02/05	BANCOLOMBIA	0	\$8,050,200														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES									
No	Identificación	Nombre	In g t e p r t i n a c p t	In g t e p r t i n a c p t	In g t e p r t i n a c p t	Codig o	IBC	Aporte	IBC	Codig o	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (3 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																							
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							
1	C.C. 940051533	MURCIA MURCIA LUIS FERNANDO																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES									
No	Identificación	Nombre	In g t e p r t i n a c p t	In g t e p r t i n a c p t	In g t e p r t i n a c p t	Codig o	IBC	Aporte	IBC	Codig o	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CAG RESGUARDOS INDIGENAS (10 Afiliados)																							
Ciudad: PUERTO GAITAN Depto: META (10 Afiliados)																							
2	C.C. 40326478	ARREVALO GARZON FRANCY CAROLINA																					
3	C.C. 1120864265	BARROS POLOCHIE EDITH ALCALDE																					
4	C.C. 1103470729	FORERA DE OJEDA WIDUEL DIOSID																					
5	C.C. 78646546	GALVAH MONTES VETERSON ENRIQUE																					
6	C.C. 1121902403	GARCON GARCIA WENDY VANESA																					
7	C.C. 1121902403	GARCON GARCIA WENDY VANESA																					
8	C.C. 1121869998	MEDINA PABLO GUSTAVO ADOLFO																					
9	C.C. 1121869998	MEDINA PABLO GUSTAVO ADOLFO																					
10	C.C. 1121869998	MEDINA PABLO GUSTAVO ADOLFO																					
11	C.C. 1121869998	MEDINA PABLO GUSTAVO ADOLFO																					
12	C.C. 109321945	MONCADA CANO JOSE JAVIER																					
13	C.C. 17497322	MURCIA JOYDA ROSEMBERG																					
14	C.C. 1121834340	RODRIGO MORGAS GUILLERMO ALBERTO																					
15	C.C. 1121834340	RODRIGO MORGAS GUILLERMO ALBERTO																					
16	C.C. 1004819005	RODRIGO ARREVALO ROYAL AILEY																					
Total	Afiliados(11)																						

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$4,633,600	\$0	\$0	\$4,633,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$168,100	\$0	\$0	\$168,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$665,100	\$0	\$0	\$665,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$3,414,800	\$0	\$0	\$3,414,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	11	\$385,600	\$0	\$0	\$385,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CCF REA	CCF34	892,000,146	3	11	\$1,163,500	\$0	\$0	\$1,163,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
CAJACORI	CCFC55	901,543,211	6	11	\$1,122,900	\$0	\$0	\$1,122,900	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$1,130,200	\$0	\$0	\$1,130,200	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	2	\$44,500	\$0	\$0	\$44,500	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$138,400	\$0	\$0	\$138,400	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$84,200	\$0	\$0	\$84,200	
TOTAL					11	\$8,050,200	\$0	\$0	\$8,050,200

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: junio 2025


Villavicencio, 06 de febrero de 2026

CERTIFICACIÓN:

Yo, **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**, identificada con Cédula de ciudadanía. No. 40.395.435 de Villavicencio y TP 227117 -T, designada como Contadora del **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con **NIT. 901.965.630-1**, certifico que en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025, CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" la entidad cumplió del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026 en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, y en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicios Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, por lo tanto la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de febrero del año 2026.

Cordialmente,


LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO
 R.L. CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025


DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
 C.C. 40.395.435 DE VILLAVICENCIO
 CONTADORA PUBLICA
 TP 227117-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.395.435

MACHADO TEJEIRO

APELLIDOS

DIVA YANIRA

INDICES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1972

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

24-SEP-1990 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00126010-F-0040395435-20081108

00055701MA 1

6720096039

Ministerio de Comercio e Industria

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

227117-T

DIVA YANIRA
MACHADO TEJEIRO
C.C. 40305435

RES. INSCRIPCION 297 DEL 31/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

231370

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244594

PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMO CONTADOR DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Verificación Placa D.A. 102147117

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.620 – 1.

ANEXO 5. NOMINAS DEL PERSONAL.



NIT. 901.955.630-1

Nomina del día 01 al 15 de Enero de 2.026

[illegible][illegible]

DIVA VANIRIA MACHADO TEJEIRO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA


Nombre del pago: NOMINA01AL15_ENERO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 16-01-2026 Hora: 14:39:49 Fecha de envío del pago: 16-01-2026
Fecha de Generación: 16-01-2026 Fecha para Procesar el pago: 16-01-2026

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$10,487,065.00	Valor Registros Procesados: \$3,108,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,378,565.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000489190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	930,000.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR16-01-2026 OTRO BANCO	16-01-2026
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,071,038.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-01-2026
00000003125364066	Ahorros	1121869998	GUSTAVO ADOLFO MED	1,188,265.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	16-01-2026
00000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	5,260,300.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR16-01-2026 OTRO BANCO	16-01-2026
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	1,048,904.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-01-2026
84968486569	Ahorros	1121834340	GUILLERMO ALBERTO	988,558.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	16-01-2026



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nómina del día 16 al 31 de Enero de 2.025

DENICIONES										DENICIONES									
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Edad	Salario Básico	Días trabajados	Turno	Aux. de transporte	Unidad Remunerada	Incapacidad (DPS/AN)	Gratificación por retiro (DPS/AN)	Total Devengado	Salud	Pensión	Fondo de Salubridad Previsional	Relación en la Prueba	Anticipo a Nómina	Total Retenciones	Neto Pagar	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.328.478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.750.905	15	\$ 876.453	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 35.018	\$ 35.018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.036	\$ 929.964	Se envía desprendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1.121.802.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2.417.300	15	\$ 1.208.650	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 1.333.798	\$ 48.370	\$ 48.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.740	\$ 1.237.058	Se envía despendible de nómina al correo: ing.wvg2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO (INC GRAL)	1.121.889.698	COORDINADOR EST	5	\$ 2.732.600	13	\$ 1.184.127	\$ 107.941	\$ -	\$ 182.173	\$ 700	\$ 1.474.941	\$ 54.680	\$ 54.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.360	\$ 1.365.581	Se envía despendible de nómina al correo: g.pardoa@gmail.com
MUÑOZMURCIA LUIS FERNANDO	88.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.561.000	15	\$ 5.780.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.780.500	\$ 231.220	\$ 231.220	\$ 57.805	\$ 275.000	\$ 2.000.000	\$ 2.795.245	\$ 2.985.255	Se envía despendible de nómina al correo: Inguilsterfandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	5	\$ 2.009.512	15	\$ 1.004.756	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.125.304	\$ 40.190	\$ 40.190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.380	\$ 1.048.923	Se envía despendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	\$ 2.417.300	15	\$ 1.208.650	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 1.334.088	\$ 48.382	\$ 48.382	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.764	\$ 1.237.334	Se envía despendible de nómina al correo: esap87@hotmail.com
TOTALES						\$ 11.262.138	\$ 606.191	\$ -	\$ 2.200	\$ 2.200	\$ 12.082.440	\$ 457.860	\$ 457.860	\$ 57.805		\$ 2.000.000	\$ 3.248.235	\$ 8.804.114	

A cargo del empleador										A cargo del empleado									
Seguridad Social					Seguridad Social					Seguridad Social					Seguridad Social				
Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes
\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802
1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%
0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%
Total Seguridad Social					Total Seguridad Social					Total Seguridad Social					Total Seguridad Social				
\$ 1.785.013					\$ 1.785.013					\$ 1.785.013					\$ 1.785.013				
Total Parafiscales					Total Parafiscales					Total Parafiscales					Total Parafiscales				
\$ 457.772					\$ 457.772					\$ 457.772					\$ 457.772				
Total a cargo del empleador					Total a cargo del empleador					Total a cargo del empleador					Total a cargo del empleador				
\$ 4.546.121					\$ 4.546.121					\$ 4.546.121					\$ 4.546.121				

A cargo del empleado										A cargo del empleado									
Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes
\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802
1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%
0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%
Total Seguridad Social					Total Seguridad Social					Total Seguridad Social					Total Seguridad Social				
\$ 1.785.013					\$ 1.785.013					\$ 1.785.013					\$ 1.785.013				
Total Parafiscales					Total Parafiscales					Total Parafiscales					Total Parafiscales				
\$ 457.772					\$ 457.772					\$ 457.772					\$ 457.772				
Total a cargo del empleado					Total a cargo del empleado					Total a cargo del empleado					Total a cargo del empleado				
\$ 4.546.121					\$ 4.546.121					\$ 4.546.121					\$ 4.546.121				

A cargo del empleado										A cargo del empleado									
Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes	Salud	Pensión	ARL	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes
\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802	\$ 1.003.802
1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%	0,522%
0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%
Total Seguridad Social					Total Seguridad Social					Total Seguridad Social					Total Seguridad Social				
\$ 1.785.013					\$ 1.785.013					\$ 1.785.013					\$ 1.785.013				
Total Parafiscales					Total Parafiscales					Total Parafiscales					Total Parafiscales				
\$ 457.772					\$ 457.772					\$ 457.772					\$ 457.772				
Total a cargo del empleado					Total a cargo del empleado					Total a cargo del empleado					Total a cargo del empleado				
\$ 4.546.121					\$ 4.546.121					\$ 4.546.121					\$ 4.546.121				

IMPORTANTE!
Si encuentra error en el pago de aportes de Parafiscales y Salud Ley 1507 de 2012, marque con una "X" si es así.

SI	X
----	---

DNA MARIA MICHARDO TEJERO

ver documento

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA	
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	30/01/2025

NOVEDAD	
NOVEDAD GENERAL	2025 (1º y 2º Bimestre)
NOVEDAD POR CONTRATO	ANTICIPA A NOMINA
NOVEDAD POR CONTRATO	EL DIA 15 DE ENERO DE 2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA16AL30ENERO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 30-01-2026 Hora: 11:43:23 Fecha de envío del pago: 30-01-2026
Fecha de Generación: 30-01-2026 Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$8,804,115.00	Valor Registros Procesados: \$4,453,279.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,350,836.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	929,964.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,237,058.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026
00000003125364066	Ahorros	1121869998	GUSTAVO ADOLFO MED	1,365,581.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	30-01-2026
00000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	2,985,255.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR30-01-2026 OTRO BANCO	30-01-2026
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	1,048,923.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026
84968486569	Ahorros	1121834340	GUILLERMO ALBERTO	1,237,334.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA


Nombre del pago: NOMINA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 20-01-2026 Hora: 15:43:41 Fecha de envío del pago: 20-01-2026
Fecha de Generación: 20-01-2026 Fecha para Procesar el pago: 20-01-2026

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$2,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	2,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR20-01-2026 OTRO BANCO	



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. 901.965.630-1
Nomina del día 01 al 31 de Enero de 2.026
NOMINA MENSUAL

[illegible]


DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
V.B. CONTADOR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA


Nombre del pago: NOMINA01AL30-ENERO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 30-01-2026 Hora: 11:44:14 Fecha de envío del pago: 30-01-2026
Fecha de Generación: 30-01-2026 Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: \$5,990,185.00	Valor Registros Procesados: \$2,407,114.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$3,583,071.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28996411518	Ahorros	1120864265	EDWIN ALEJANDRO BA	1,171,157.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-01-2026
00000003183993083	Ahorros	1103470729	MIGUEL DOISID CORR	1,291,157.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	30-01-2026
84959547491	Ahorros	78646545	YEFERSON ENRIQUE G	1,235,957.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-01-2026
00000003124865277	Ahorros	1093921945	JOSE JAVIER MONCAD	1,115,957.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	30-01-2026
00000003114981893	Ahorros	1004819005	DUVAN ARLEY ROMERO	1,175,957.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	30-01-2026

[illegible]

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado del pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1507 din 2012?
marque con una "X" es así.

[illegible][illegible]

11

DIVA YANIRA MACHADO TEJERO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNOZ AREVALO
NIT: 900751966
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_ENERO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 05700001408


Fecha: 16-01-2026 Hora: 14:58:14
Fecha de Generación: 16-01-2026

Fecha de envío del pago: 16-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-01-2026

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$6,424,254.00	Valor Registros Procesados: \$5,494,254.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$930,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,415,902.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-01-2026
84100000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	924,067.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-01-2026
84424812583	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,239,463.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-01-2026
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MU OZ	1,110,505.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-01-2026
58600019048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	804,317.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-01-2026
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	930,000.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	16-01-2026



MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.751.986-8

Nom/lna del d/a 16 al 31 de Enero de 2.026

NOIINA PERSONA CAG 2025

Nombre del Empleado	No. identificación	Cargo	REGISTRO	INGRESOS							DEDUCCIONES										
				Días hábiles	Total básico	Año de inscripción	INCAVACAO	DAW	Escala Recaudatoria / Opciones	ANTICIPA A RETENIR	Desvalúes Votando Anticipo	Total Desgravado	Salud	Pensión	Fondo de Solidaridad Pensional	Relaciones en la familia	Aportes deducibles	Otras Deducciones	Total Deduciones	Monto Pagado	OBSERVACIÓN
GOMEZ LEAL LINA MARCELA	40.328.295	ASISTENTE CONTABLE	1	\$ 2.050.905	16	\$ 1.025.453	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.600	\$ 1.161.600	\$ 41.018	\$ 41.018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.038	\$ 1.069.664	Se envía desprendible de nómina al correo: marce.g83@hotmail.com
MACHADO TEJERO DIVA YANIRA (VAC)	40.395.435	CONTADOR	1	\$ 2.840.012	11	\$ 1.041.338	\$ 91.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 1.133.423	\$ 41.664	\$ 41.664	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.307	\$ 1.050.116	Se envía desprendible de nómina al correo: divaya_2005@hotmail.com	
HUARÓZ MURCIA JEWAMY ALEJANDRO	60.013.813	CONDUCTOR	6	\$ 2.143.515	16	\$ 1.071.768	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.198.305	\$ 42.870	\$ 42.870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.741	\$ 1.110.664	Se envía desprendible de nómina al correo: alejandromunoz021@gmail.com	
PARADA MARTINEZ GEREMIS PHOLA (ING GRAL TUN)	1.022.394.100	SECRETARIA	1	\$ 1.750.905	12	\$ 700.352	\$ 99.638	\$ 116.727	\$ 66.364	\$ -	\$ -	\$ 975.091	\$ 35.018	\$ 35.018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.036	\$ 905.054	Se envía desprendible de nómina al correo: parada Paola181@gmail.com	
PEREZ PEREZ OBER SASHED	96.193.788	ADMINISTRATIVO	3	\$ 1.750.905	16	\$ 875.453	\$ 124.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 35.018	\$ 35.018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.036	\$ 929.964	Se envía desprendible de nómina al correo: oberperez1979@gmail.com	
TOTALES				\$ 4.714.362		\$ 564.615	\$ 116.727	\$ 58.364	\$ 2.389	\$ -	\$ 5.456.418	\$ 195.578	\$ 195.578	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 391.156	\$ 5.065.262			

FECHA ENVIO DESPRENDIALES DE NOMINA	
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	30.01.2026

Salário Mínimo Legal Vigente 2018	\$ 1.760,905
Auxílio de Frequentes	\$ 249,085

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

¡IMPORTANTE!

Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?

_____ marque con una "X" si es así.

SI	_____	NO	_____
----	-------	----	-------

[illegible][illegible]

DIVA YANIRA MACHADO TEJERO

Empresa: MUNOZ AREVALO

NIT: 900751966

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA16AL30_ENERO

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 05700001408

Fecha: 30-01-2026

Fecha de Generación: 30-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-01-2026

Hora: 11:36:08

Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$6,700,933.00	Valor Registros Procesados: \$4,135,298.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,565,635.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00489000200190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,635,671.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	30-01-2026
84100000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	1,069,564.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-01-2026
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MU OZ	1,110,564.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-01-2026
58600019048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	905,054.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-01-2026
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	929,964.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	30-01-2026
84424812683	Ahorros	40396435	DIVA MACHADO	1,050,116.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-01-2026



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

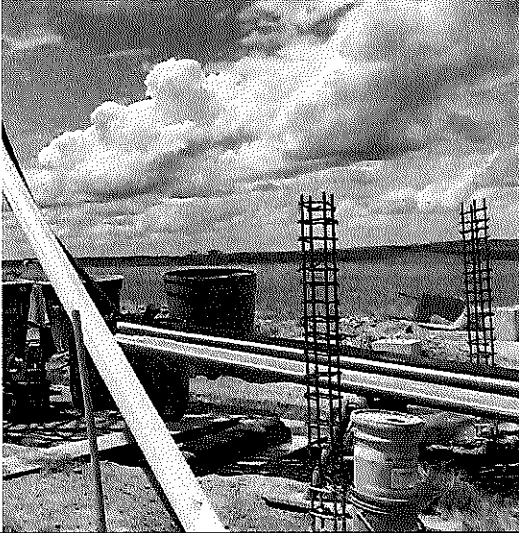
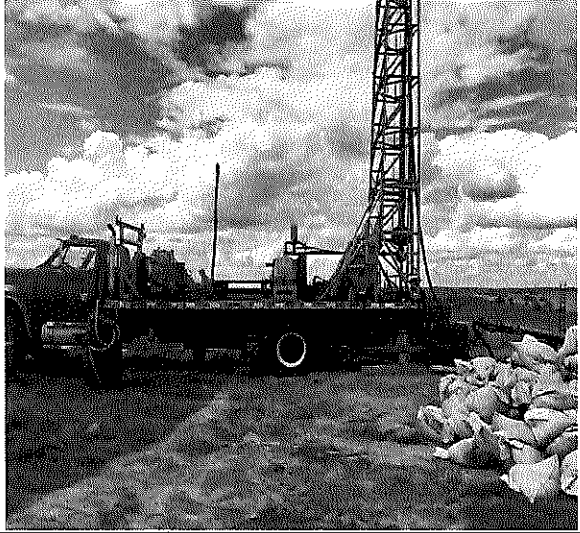
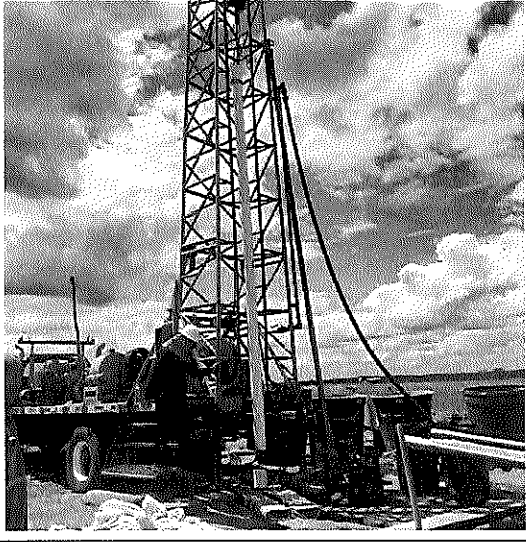


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO AWALIBA

POZO PROFUNDO

COMUNIDAD PUERTO LOPEZ	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS  <i>Construcción piscina de lodos</i>	Ítem 1,3 PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.  <i>perforación de prueba</i>
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)  <i>Registro eléctrico</i>	Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M  <i>Suministro tubería 6"</i>

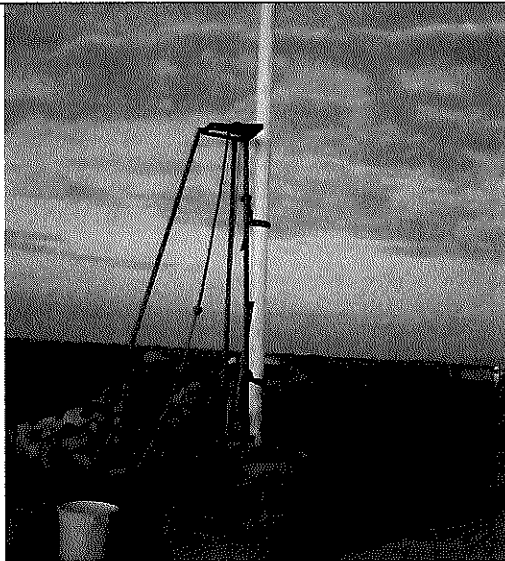


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

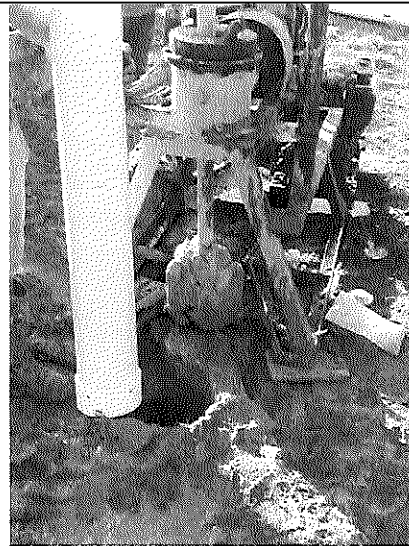
COMUNIDAD FACUNAE

Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M



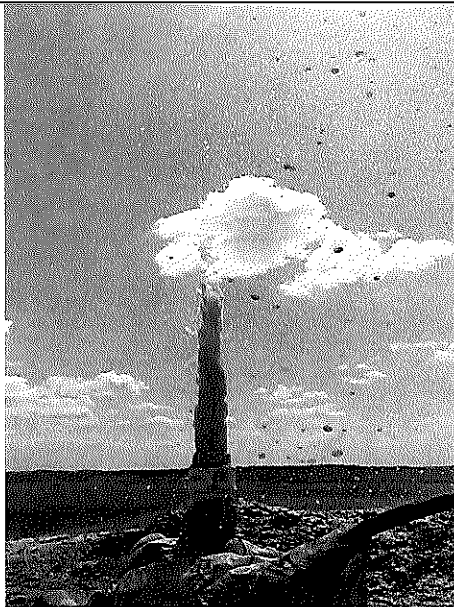
Suministro tubería 6"

Ítem 1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION



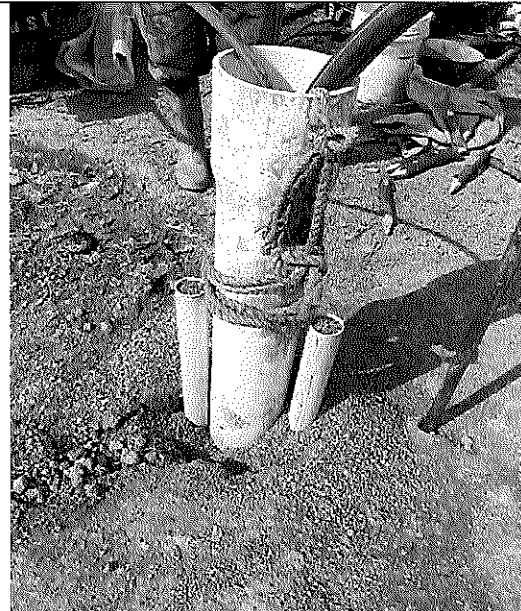
Instalación filtro tubería

Ítem 1,8 AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)



Prueba de bombeo

Ítem 1,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO



Suministro material estabilizador

**REDES DE ACUEDUCTO**

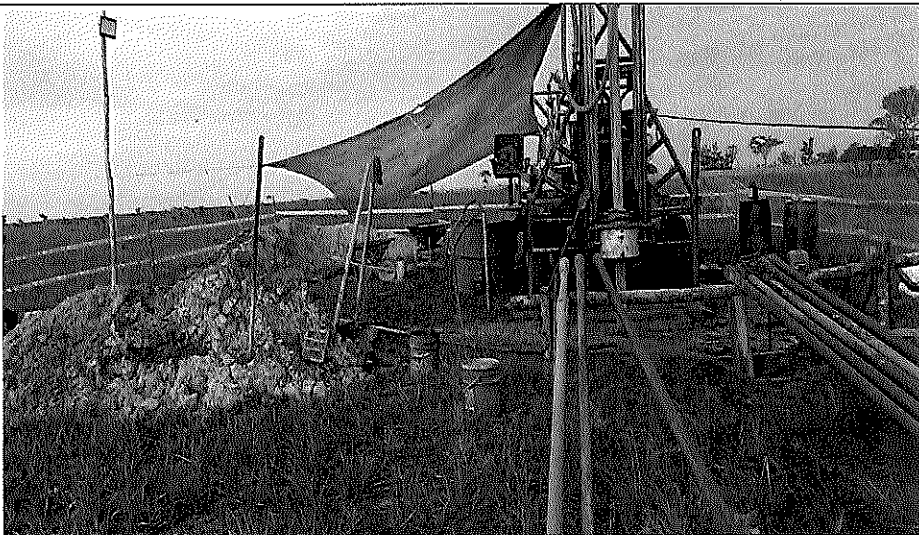
COMUNIDAD SAN GIL	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	Ítem 4,5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
<i>Camada de arena</i>	<i>Relleno proveniente de la excavación</i>
Ítem 4,8 TUBERÍA PVC RDE 21 2" INSTALACIÓN	Ítem 4,15 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.
	
<i>Instalación tubería 2"</i>	<i>Excavación mecánica</i>



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO DOMOPLANAS

POZO PROFUNDO

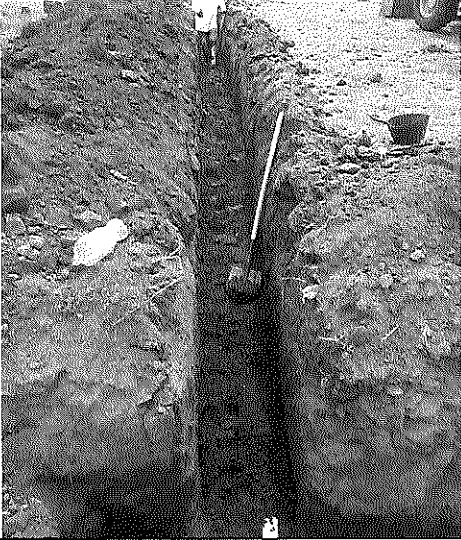
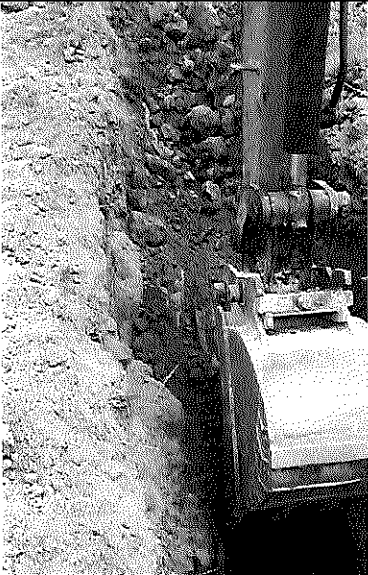
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS  <i>Construcción piscina de lodos</i>	Ítem 1,4 ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO  <i>Análisis litológico</i>
Ítem 1,6 AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"  <i>Ampliación perforación</i>	



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

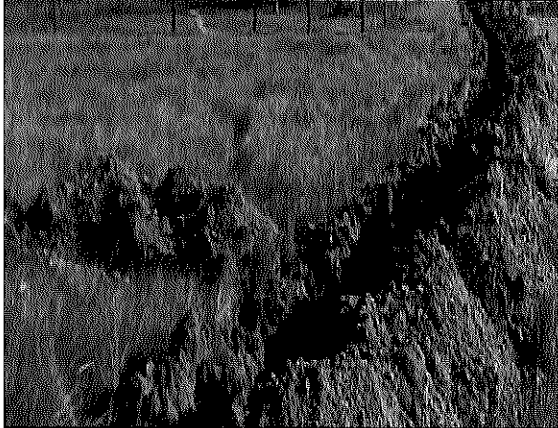
REDES DE ACUEDUCTO

COMUNIDAD PUERTO GAVILAN	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS 	Ítem 4,5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL. 
<i>Camada de arena</i>	<i>Relleno proveniente de la excavación</i>
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN 	Ítem 4,15 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE. 
<i>Instalación tubería 2"</i>	<i>Excavación mecánica</i>



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD LAS DELICIAS	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS  <i>Camada de arena</i>	Ítem 4,5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.  <i>Relleno proveniente de la excavación</i>
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN  <i>Instalación tubería 2"</i>	Ítem 4,15 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.  <i>Excavación mecánica</i>

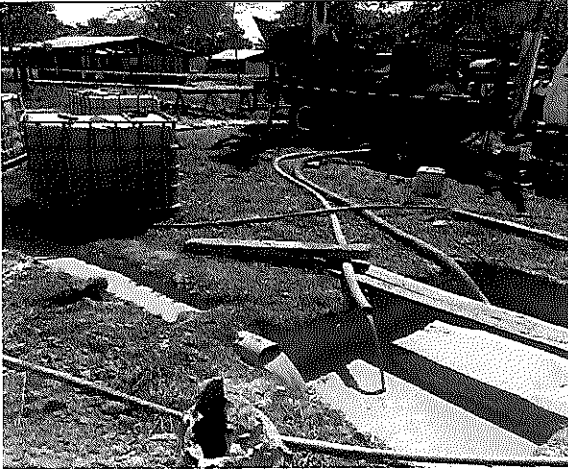


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO WACOYO

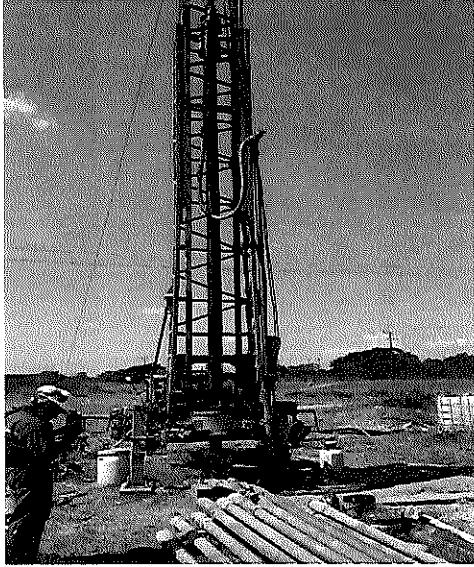
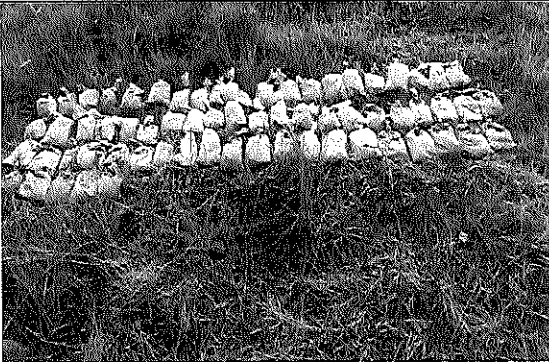
POZO PROFUNDO

COMUNIDAD LA UNIÓN	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS 	Ítem 1,3 PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO. 
<i>Construcción piscina de lodos</i>	<i>perforación de prueba</i>
Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) 	Ítem 1,6 AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2" 
<i>Registro Eléctrico</i>	<i>Ampliación perforación</i>



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

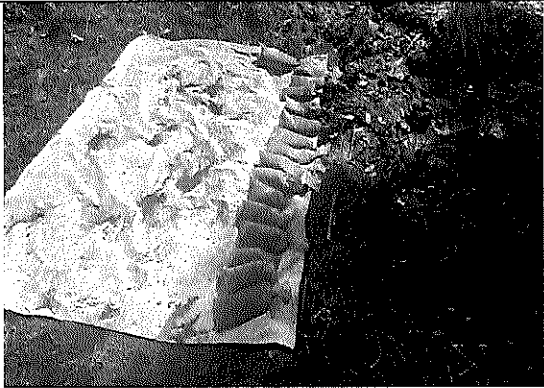
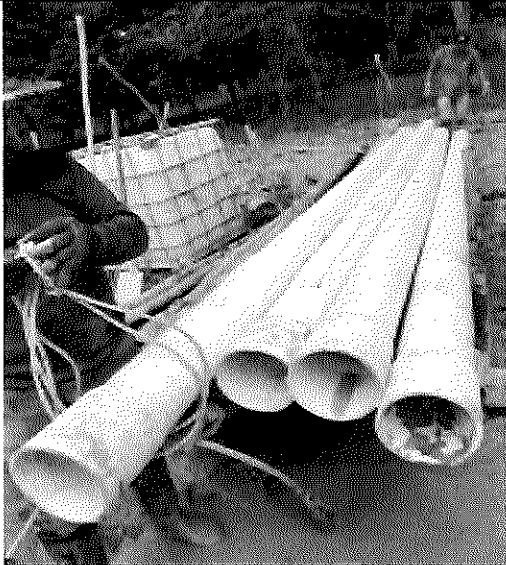
NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD PUNTO GRILLO	
Ítem 1,2) INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS  <i>Construcción piscina de lodos</i>	Ítem 1,3 PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO.  <i>perforación de prueba</i>
Ítem 1,4 ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO  <i>Análisis Litológico</i>	Ítem 1,5 EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA)  <i>Registro Eléctrico</i>



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

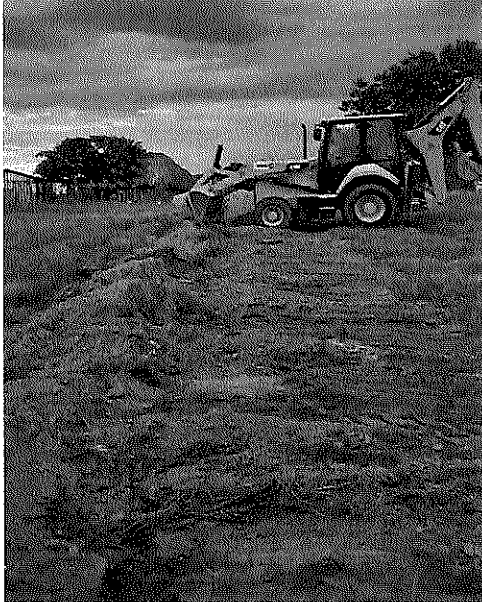
COMUNIDAD LA CAIMANA	
Ítem 1,4 ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO 	Ítem 1,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M 
<i>Análisis Litológico</i>	<i>Instalación Tubería de 6"</i>
Ítem 1,8 AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO) 	Ítem 1,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO 
<i>Prueba de bombeo</i>	<i>Instalación material estabilizador</i>

REDES DE ACUEDUCTO



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

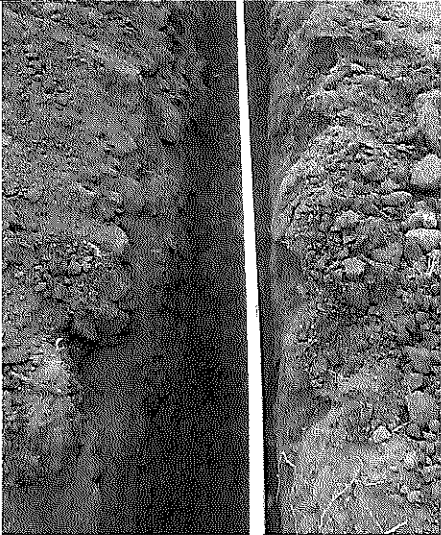
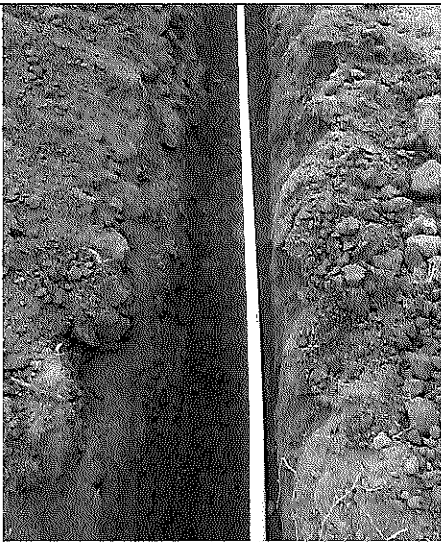
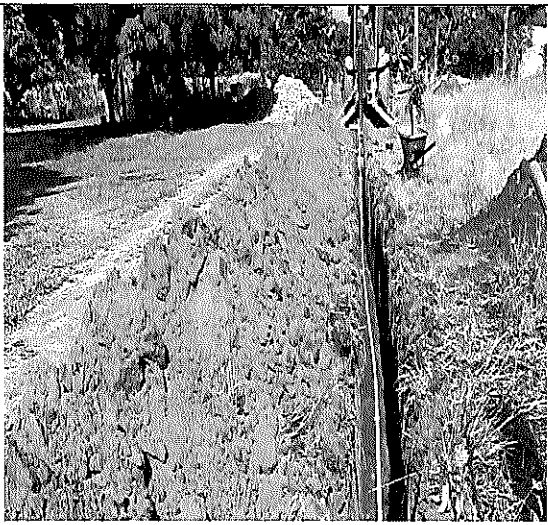
COMUNIDAD PUNTO GRILLO	
Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS  <i>Camada de arena</i>	Ítem 4,5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.  <i>Relleno proveniente de la excavación</i>
Ítem 4,8 TUBERÍA PVC RDE 21 2" INSTALACIÓN  <i>Instalación tubería 2"</i>	Ítem 4,15 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.  <i>Excavación mecánica</i>

COMUNIDAD ALGARROBO

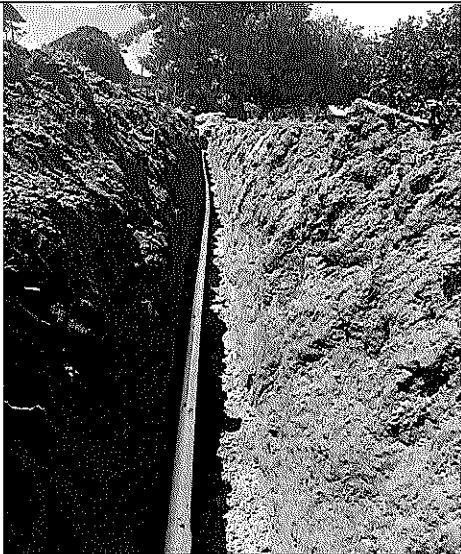
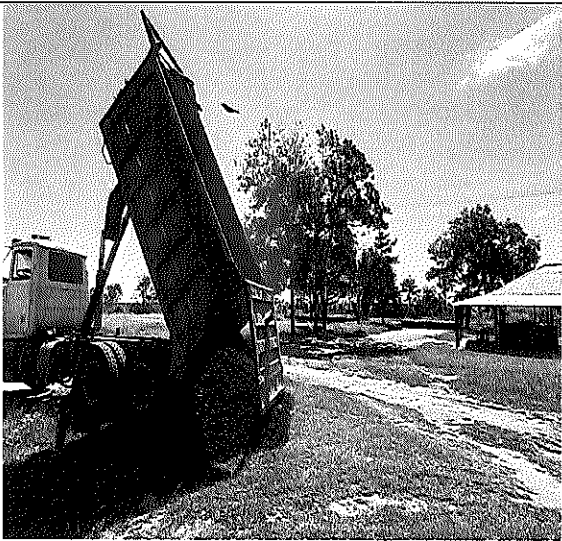
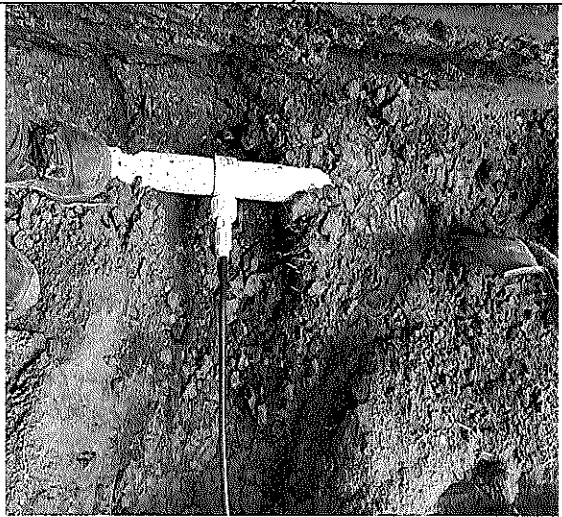


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

Ítem 4,4) CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	Ítem 4,5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL.
	
<i>Camada de arena</i>	<i>Relleno proveniente de la excavación</i>
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN	Ítem 4,15 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.
	
<i>Instalación tubería 2"</i>	<i>Excavación mecánica</i>

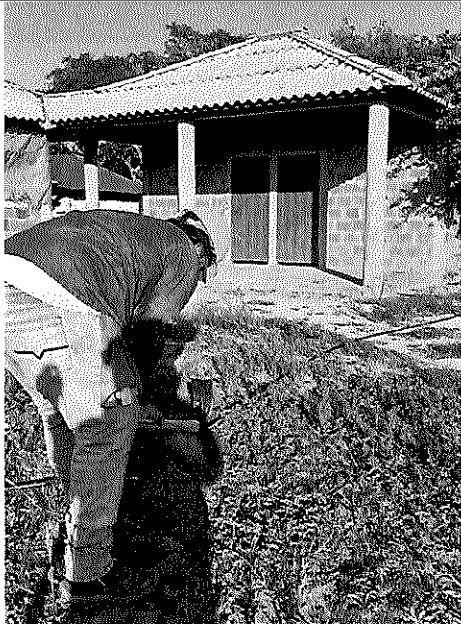


COMUNIDAD LA PORFIA	
Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN  <i>Instalación tubería 2"</i>	Ítem 4,7 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.  <i>Transporte material pétreo</i>
Ítem 4,15 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.  <i>Excavación mecánica</i>	Ítem 4,16 ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)  <i>Acometidas domiciliarias</i>



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD LA CAIMANA	
Ítem 4,3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 – 2,00m INCLUYE CARGUE  <i>Excavación manual</i>	Ítem 4,8 TUBERÍA PVCP RDE 21 2" INSTALACIÓN  <i>Instalación tubería 2"</i>
Ítem 4,7 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.  <i>Transporte material pétreo</i>	Ítem 4,15 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE.  <i>Excavación mecánica</i>



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA



Valla informativa



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.620 – 1.

ANEXO 7. COPIA DE LA BITACORA.

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Jueves 01 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	126	DÍAS PENDIENTES 330
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX		
MAESTRO		CAMION CHEVROLET		
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN		
OPERARIO		RETROEXCAVADORA		
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C NC	
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO C NC FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI NO		
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, MEYU	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Mérida
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punta del Palmar
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Viernes 02 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	127	DÍAS PENDIENTES
		329		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX		
MAESTRO		CAMION CHEVROLET		
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN		
OPERARIO		RETROEXCAVADORA		
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				


		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Sabado 03 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	128	DÍAS PENDIENTES		328		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX				Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET				Guantes	X	
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN				Botas	X	
OPERARIO		RETROEXCAVADORA				Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD				
				C	NC			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDIA DE PUERTO GAITANI, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitani Cesar, Colombia
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Domingo 04 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL:	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	129	DÍAS PENDIENTES
		327		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX		
MAESTRO		CAMION CHEVROLET		
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN		
OPERARIO		RETROEXCAVADORA		
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
				Elemento SI NO
				Cascos X
				Gafas X
				Tapabocas X
				Guantes X
				Botas X
				Alcohol X
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Lunes 05 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	130	DÍAS PENDIENTES 326
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX		
MAESTRO		CAMIÓN CHEVROLET		
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN		
OPERARIO		RETROEXCAVADORA		
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C NC	
TRABAJO ADMINISTRATIVO	DIA	OFICINA PRINCIPAL CONSORCIO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO C NC FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán 2015-2019
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	


SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Martes 06 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	131	DÍAS PENDIENTES
				325

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX				Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET				Guantes	X	
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN				Botas	X	
OPERARIO		RETROEXCAVADORA				Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
TRABAJO ADMINISTRATIVO	DIA	OFICINA PRINCIPAL CONSORCIO			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán MUNICIPIO						
	Infraestructura									
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Miercoles 07 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	132	DÍAS PENDIENTES		324		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX				Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET				Guantes	X	
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN				Botas	X	
OPERARIO		RETROEXCAVADORA				Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD				
				C	NC			
TRABAJO ADMINISTRATIVO		DIA	OFICINA PRINCIPAL CONSORCIO					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES				
Nota: Adjuntar los soporte de la Investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Provincia de Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Jueves 08 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	133	DÍAS PENDIENTES
		323		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX		
MAESTRO		CAMION CHEVROLET		
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN		
OPERARIO		RETROEXCAVADORA		
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
TRABAJO ADMINISTRATIVO	DÍA	OFICINA PRINCIPAL CONSORCIO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				



FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12


Version:04

Vigencia: 10-01-2025



SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

FIRMA

RESIDENTE 1 OBRA
ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO

FIRMA

RESIDENTE 1 INTERVENTORIA
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA				 Puerto Gaitán Municipio del Meta
	Infraestructura				
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025		

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025			
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META			
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO			
FECHA:	Viernes 09 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:			
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	134	DÍAS PENDIENTES		322	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX				Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET				Guantes	X	
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN				Botas	X	
OPERARIO		RETROEXCAVADORA				Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
TRABAJO ADMINISTRATIVO	DIA	OFICINA PRINCIPAL CONSORCIO			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo:INF-FR-12****Version:04****Vigencia: 10-01-2025****SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:****C: Conforme****NC: No Conforme**
FIRMA**RESIDENTE 1 OBRA**
ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO
FIRMA**RESIDENTE 1 INTERVENTORIA**
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE**NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara**

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio - Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Sabado 10 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	135	DÍAS PENDIENTES
				321


PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX				Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET				Guantes	X	
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN				Botas	X	
OPERARIO		RETROEXCAVADORA				Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAIFÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaifán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Domingo 11 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	136	DÍAS PENDIENTES
		320		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX		
MAESTRO		CAMION CHEVROLET		
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN		
OPERARIO		RETROEXCAVADORA		
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GARZÓN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Garzón Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ				RESIDENTE 2: VANESA GARZÓN GARCIA				
FECHA:	Lunes 12 de enero de 2026 (Festivo)			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	137	DÍAS PENDIENTES		319		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX				Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET				Guantes	X	
OFICIAL		EQUIPO PERFORACIÓN				Botas	X	
OPERARIO		RETROEXCAVADORA				Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GARZÓN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Garzón
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZÓN GARCÍA		RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Martes 13 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	138	DÍAS PENDIENTES		318		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS		UND	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								



FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12

Version:04

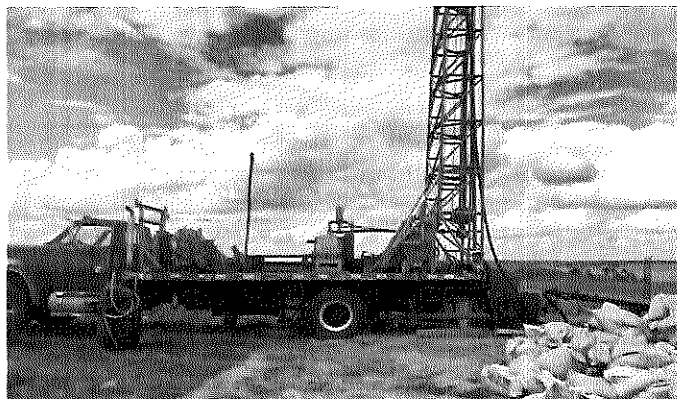
Vigencia: 10-01-2025



Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

FIRMA

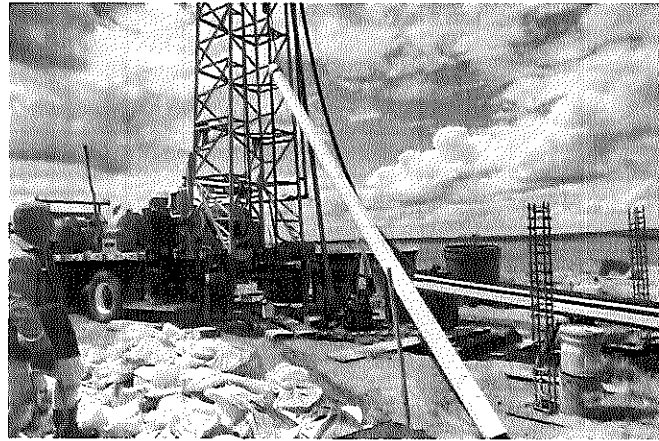
RESIDENTE 1 OBRA
ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO

FIRMA

RESIDENTE 1 INTERVENTORIA
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Miércoles 14 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	139	DÍAS PENDIENTES	317			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	COMUNIDAD PUERTO LOPEZ					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soportes de la investigación si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo:INF-FR-12****Version:04****Vigencia: 10-01-2025****SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:****C: Conforme****FIRMA****RESIDENTE 1 OBRA****ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO****NC: No Conforme****FIRMA****RESIDENTE 1 INTERVENTORIA****ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE****NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara**

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Jueves 15 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	140	DÍAS PENDIENTES 316
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO Operación Mantenimiento ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Elemento SI NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		Cascos X
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		Gafas X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	Guantes X
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	Botas X
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	Alcohol X
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C NC	
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD SAN GIL		
INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"	ML	COMUNIDAD SAN GIL		
INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD SAN GIL		
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/K	COMUNIDAD SAN GIL		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO C NC FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo:INF-FR-12****Version:04****Vigencia: 10-01-2025****Puerto Gaitán**
MÉRIDA**SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:**

C: Conforme

NC: No Conforme

RESIDENTE 1 OBRA

ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO

RESIDENTE 1 INTERVENTORIA

ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitan Municipio de Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Viernes 16 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	141	DÍAS PENDIENTES
				315
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD SAN GIL		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVC/P RDE	ML	COMUNIDAD SAN GIL		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD SAN GIL		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES			SI	NO
OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES			SI	NO
OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
SI				
NO				
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

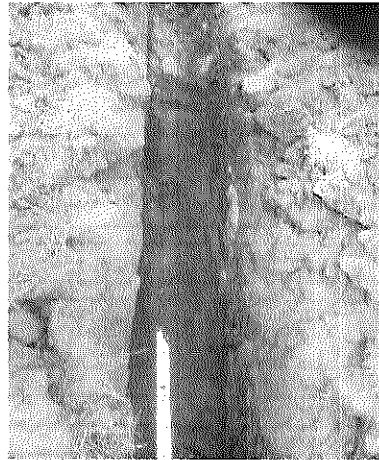
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Sabado 17 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	142	DÍAS PENDIENTES
		314		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD SAN GIL			
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE	ML	COMUNIDAD SAN GIL			
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	COMUNIDAD SAN GIL			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD		SI NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO		

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo:INF-FR-12****Version:04****Vigencia: 10-01-2025****SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:****C: Conforme****FIRMA****NC: No Conforme****RESIDENTE 1 OBRA**
ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO**FIRMA****RESIDENTE 1 INTERVENTORIA**
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE**NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara**

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Domingo 18 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	143	DÍAS PENDIENTES
		313		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1	
AYUDANTE				
TOPOGRAFO				
ALMACENISTA	1			
CONDUCTOR	2			
CONTADOR	1			
SECRETARIA	1			
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI	NO		
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán METLA
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
		Infraestructura							
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Lunes 19 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	144	DÍAS PENDIENTES		312			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO	
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X		
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X		
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X	
AYUDANTE									
TOPOGRAFO									
ALMACENISTA	1								
CONDUCTOR	2								
CONTADOR	1								
SECRETARIA	1								
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON									
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD				
					C	NC			
INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE 21 2"		ML	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/KM	COMUNIDAD LAS DELICIAS						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO		
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.									
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA									
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO							
		C	NC	FECHA					
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO					
OBSERVACIONES:									

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo:INF-FR-12****Version:04****Vigencia: 10-01-2025****SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:****C: Conforme****FIRMA****RESIDENTE 1 OBRA****ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO****NC: No Conforme****FIRMA****RESIDENTE 1 INTERVENTORIA****ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE****NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara**

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio de Meta
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

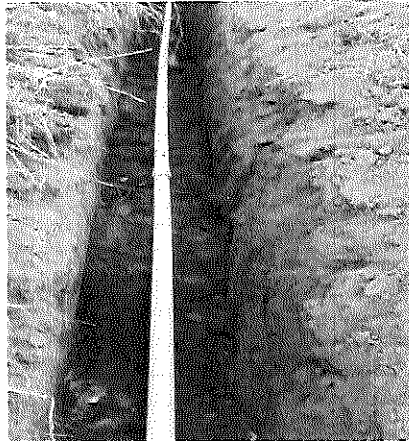
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:		Martes 20 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	145	DÍAS PENDIENTES		311			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Gautes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

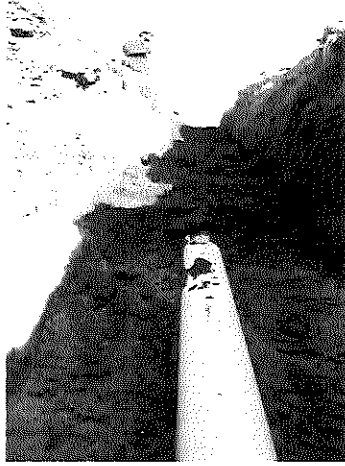
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE	M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS			
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVC/RDE	ML	COMUNIDAD LAS DELICIAS			
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITHAN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaithan Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Miercoles 21 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	146	DÍAS PENDIENTES	310			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD				
				C	NC			
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS					
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE		ML	COMUNIDAD LAS DELICIAS					
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD LAS DELICIAS					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Jueves 22 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	147	DÍAS PENDIENTES		309		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		M3	COMUNIDAD SAN GIL					
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN TUBERÍA PVCP RDE		ML	COMUNIDAD SAN GIL					
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		M3	COMUNIDAD SAN GIL					
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		M3/K	COMUNIDAD SAN GIL					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								



FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12

Version:04

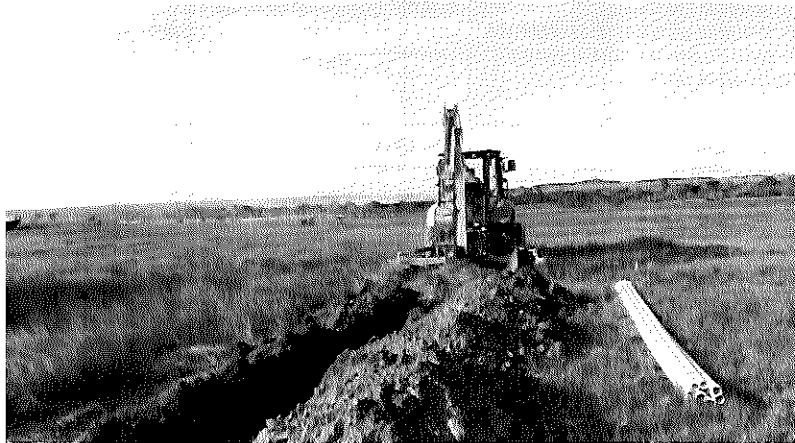
Vigencia: 10-01-2025



Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

FIRMA

RESIDENTE 1 OBRA

ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO

NC: No Conforme

FIRMA

RESIDENTE 1 INTERVENTORIA

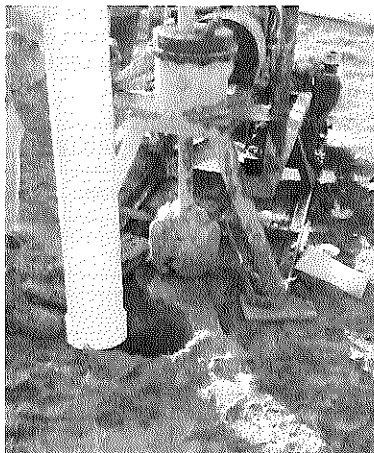
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán PUERTO GAITÁN				
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO						
FECHA:	Viernes 23 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	148	DIAS PENDIENTES				
				308				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN		ML	COMUNIDAD FACUNAE					
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION		ML	COMUNIDAD FACUNAE					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO				
				C	NC	FECHA		
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				SI		NO		
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, MEYU	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Sabado 24 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	149	DIAS PENDIENTES	307			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN		ML	COMUNIDAD FACUNAE					
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION		ML	COMUNIDAD FACUNAE					
SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.		M3	COMUNIDAD FACUNAE					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo:INF-FR-12****Version:04****Vigencia: 10-01-2025****Puerto Cárden**
MÉRIDA YUCATÁN**SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:**

C: Conforme

NC: No Conforme

FIRMA**RESIDENTE 1 OBRA**
ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO**FIRMA****RESIDENTE 1 INTERVENTORIA**
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE**NOTA:** La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 2: FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:	Domingo 25 de enero de 2026				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	150	DÍAS PENDIENTES	306				

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán VENEZUELA
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 2 INTERVENTORIA ING.FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO						
FECHA:	Lunes 26 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	151	DIAS PENDIENTES				
		305						
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN		ML	COMUNIDAD FACUNAE					
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE TUBERÍA PVC 6" RDE 21 PRESION		ML	COMUNIDAD FACUNAE					
SUMINISTRO DE GRAVIILA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.		M3	COMUNIDAD FACUNAE					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Cultura y Turismo
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA						
		Infraestructura						
		Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025				
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Martes 27 de enero de 2026			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	152	DÍAS PENDIENTES	304			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN-INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESIÓN		ML	COMUNIDAD FACUNAE					
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ESTABILIZADOR Y DE RELLENO		BTO	COMUNIDAD FACUNAE					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO				
OBSERVACIONES:								



FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12

Version:04

Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán
Cesar

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

ESQUEMA DE OBRA



OBSERVACIONES:

C: Conforme

FIRMA

NC: No Conforme

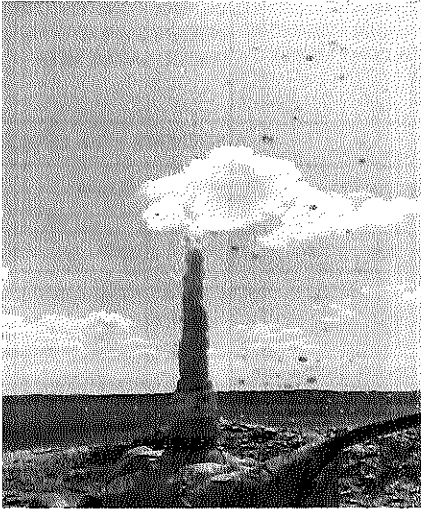
RESIDENTE 1 OBRA
ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO

FIRMA

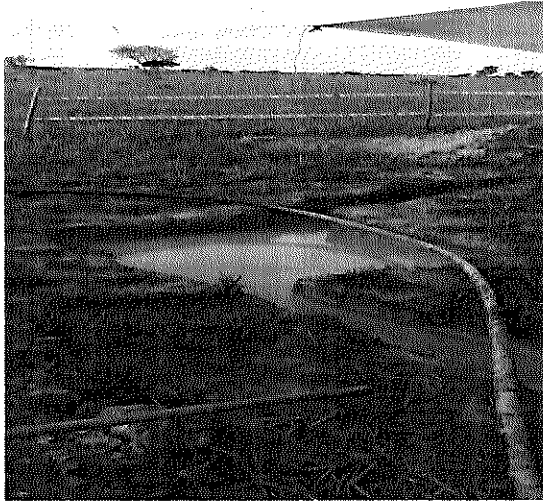
RESIDENTE 1 INTERVENTORIA
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

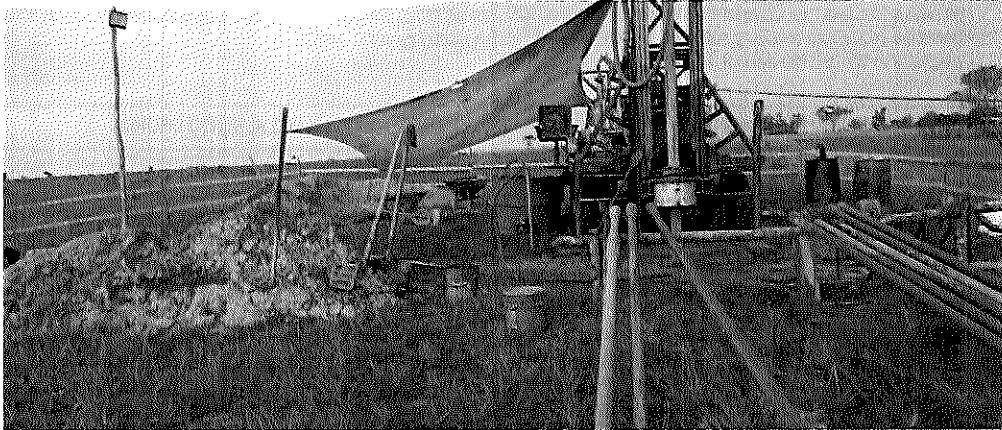
	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Miércoles 28 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	153	DÍAS PENDIENTES	303			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD					
			C	NC				
LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UND	COMUNIDAD FACUNAE						
DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UND	COMUNIDAD FACUNAE						
CONSTRUCCION DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES	UND	COMUNIDAD FACUNAE						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO				
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO			
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO			
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO					
			C	NC				
				FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán MUNICIPIO
	Infraestructura			
	Código:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Jueves 29 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	154	DÍAS PENDIENTES				
302								
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS		UND	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS								
PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ANALISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán CONCRETO Y PASADIZO
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO						
FECHA:	Viernes 30 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	155	DÍAS PENDIENTES 301				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas	X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X	
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X	
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X
AYUDANTE								
TOPOGRAFO								
ALMACENISTA	1							
CONDUCTOR	2							
CONTADOR	1							
SECRETARIA	1							
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
CONTINUACIÓN PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO		
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO				
				C	NC	FECHA		
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				SI		NO		
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

		FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
		Infraestructura							
		Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE				RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:		Sabado 31 de enero de 2026		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	156	DÍAS PENDIENTES		300			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO	
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos	X		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		X	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X	
MAESTRO		CAMION CHEVROLET	1			Guantes	X		
OFICIAL	4	EQUIPO PERFORACIÓN	3			Botas	X		
OPERARIO	1	RETROEXCAVADORA	1			Alcohol		X	
AYUDANTE									
TOPOGRAFO									
ALMACENISTA	1								
CONDUCTOR	2								
CONTADOR	1								
SECRETARIA	1								
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON									
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD					
				C	NC				
CONTINUACIÓN PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN						
CONTINUACIÓN AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN						
ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO		ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO		
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD				SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS				SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.									
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA									
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO							
		C	NC	FECHA					
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO					
OBSERVACIONES:									

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo:INF-FR-12****Version:04****Vigencia: 10-01-2025****Puerto Gaitán**
Municipio - Meta**SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:**

C: Conforme

FIRMA**RESIDENTE 1 OBRA**
ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO

NC: No Conforme

FIRMA**RESIDENTE 1 INTERVENTORIA**
ING.JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE**NOTA:** La presente bitacora debe venir impresa a doble cara



ANEXO 8. APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIARIO

	COMUNICACIÓN OFICIAL			
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 27 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
 NIT 800.079.035-1 / R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 C.C. 86.051.533 de Villavicencio
 Calle 15 No. 40-01 Centro Comercial Primavera Urbana
 Celular 3123143658
Consortioaguasgaitan2025@gmail.com
 Villavicencio Meta


Asunto: ACEPTACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TITULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 (CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025).

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que ustedes atendieron cabalmente los requerimientos que le hiciere la Administración Municipal contenidos en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 0821 de 2025, cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META** " y de conformidad al Art. 91 de la Ley 1474 de 2011, "En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista" y que, frente a nuestro deber legal de pronunciamos como entidad contratante, debemos indicar que el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) por medio la Secretaría de Contratación, responde **POSITIVAMENTE** a la aceptación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración y pagos, para la Administración de los recursos entregados como anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.


La mencionada aceptación, se efectúa de conformidad con el Decreto Administrativo No. 001 del siete (07) de enero de 2025, por medio del cual se deroga el Decreto No. 0180 del tres (3) de julio de 2024, y se delegan unas facultades en materia de contratación pública y ordenación del gasto en el municipio de Puerto Gaitán - Meta

Con todo respeto,


ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
 Secretaria de Contratación

Elaboró: Herder Faján Burgos García	Revisó: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS SO	Cargo: Secretaria de Contratación	Cargo: Secretaria de Contratación

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO				
11		EFFECTIVO	14,144,134,609.53		11,196,919.58	12,614,682,100.18
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	14,142,114,296.94		9,156,816.17	12,612,652,709.57
111505		BANCOS NACIONALES	14,142,114,296.94		9,156,816.17	12,612,652,709.57
11150501		CUENTA AHORROS	14,142,114,296.94		9,156,816.17	12,612,652,709.57
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	14,142,114,296.94		9,156,816.17	12,612,652,709.57
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	2,020,312.59		2,031,025.39	2,029,390.61
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2,020,312.59		2,031,025.39	2,029,390.61
130205		EMISORES NACIONALES	2,020,312.59		2,031,025.39	2,029,390.61
13020501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	2,020,312.59		2,031,025.39	2,029,390.61
1302050105		ORDINARIOS	2,020,312.59		2,031,025.39	2,029,390.61
2		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUCIOPULAR				
25		PASIVO	-288,927,670.38		1,865,523,361.32	-9,156,816.17
2501		CUENTAS POR PAGAR	-288,927,670.38		1,865,523,361.32	-9,156,816.17
250115		COMISIONES Y HONORARIOS			846,982.50	
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS			846,982.50	
2501150101		COMISIONES FIDUCIARIAS			846,982.50	
2570		COMISIONES FIDUCIARIAS			846,982.50	
257000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-10,594,619.28		10,594,619.28	-9,156,816.17
25700000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-10,594,619.28		10,594,619.28	-9,156,816.17
2570000001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-10,594,619.28		10,594,619.28	-9,156,816.17
2590		DIVERSOS	-278,333,051.10		1,654,081,759.54	
259095		OTROS	-278,333,051.10		1,654,081,759.54	
25909501		DIVERSOS	-278,333,051.10		1,654,081,759.54	
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	-278,333,051.10		1,654,081,759.54	
3		PATRIMONIO	-13,855,206,939.15		1,365,154,089.16	-12,605,525,284.01
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-13,855,186,626.56		1,365,154,089.16	-12,605,495,893.40
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-20,146,226,208.00			-20,146,226,208.00
350505		APORTES EN DINERO	-20,146,226,208.00			-20,146,226,208.00
35050501		APORTES EN DINERO	-20,146,226,208.00			-20,146,226,208.00
3505050105		APORTES EN DINERO	-20,146,226,208.00			-20,146,226,208.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	6,291,039,581.44		1,365,154,089.16	7,540,730,314.60
351010		PAGOS A TERCEROS	6,291,039,581.44		1,365,154,089.16	7,540,730,314.60
35101000		PAGOS A TERCEROS	6,291,039,581.44		1,365,154,089.16	7,540,730,314.60
3510100095		OTROS	-20,312.59			-29,390.61
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-11,432,685.88		9,078.02	-11,441,763.90
3915		GANANCIAS DEL EJERCICIO	-11,432,685.88		9,078.02	-11,441,763.90
391501		GANANCIAS DEL EJERCICIO	-11,432,685.88		9,078.02	-11,441,763.90
39150101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	-11,432,685.88		9,078.02	-11,441,763.90
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	-11,432,685.88		9,078.02	-11,441,763.90
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11,412,373.29			11,412,373.29
392001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11,412,373.29			11,412,373.29
39200101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11,412,373.29			11,412,373.29
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11,412,373.29			11,412,373.29
4		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	-21,701.98		9,167,528.97	-32,414.78
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-21,701.98		9,167,528.97	-32,414.78



Fiduciaria Popular S.A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

316331-P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025

SIFI

CONTABILIDAD

Página 2 de 3
14/01/26 02:02 PM
Programa: SCMRSLNA
Santiago Hilarion Niño

Periodo: 202512

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL	.00	9,156,816.17	.00
410395		OTROS INTERESES	NAPL	.00	9,156,816.17	.00
41039501		OTROS INTERESES	NAPL	.00	9,156,816.17	.00
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	.00	9,156,816.17	.00
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-21,701.98	.00	-32,414.78
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-21,701.98	.00	-32,414.78
41080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-21,701.98	.00	-32,414.78
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-21,701.98	.00	-32,414.78
5		GASTOS	NAPL	21,701.98	11,452,314.58	32,414.78
51		GASTOS OPERACIONALES	NAPL	1,389.39	11,443,236.56	3,024.17
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	NAPL	1,389.39	1,634.78	3,024.17
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	1,389.39	1,634.78	3,024.17
51080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	1,389.39	1,634.78	3,024.17
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	1,389.39	1,634.78	3,024.17
5115		COMISIONES	NAPL	.00	846,982.50	.00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	846,982.50	.00
51151801		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	846,982.50	.00
5115180101		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	846,982.50	.00
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	10,594,619.28	.00
516701		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	10,594,619.28	.00
51670101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	10,594,619.28	.00
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	10,594,619.28	.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	20,312.59	9,078.02	29,390.61
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	20,312.59	9,078.02	29,390.61
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	20,312.59	9,078.02	29,390.61
59050101		GANANCIAS	NAPL	20,312.59	9,078.02	29,390.61
5905010101		GANANCIAS	NAPL	20,312.59	9,078.02	29,390.61
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	846,982.50	.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	846,982.50	.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	846,982.50	.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	846,982.50	.00
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	846,982.50	.00
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	846,982.50	.00

Total .00 3,063,330,483.31 3,063,330,483.31 .00

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-12-2025 hasta 31-12-2025

Fideicomiso - Sistema de Fideicomiso

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 316331 P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025

Fec.Causac.	FpG	Banco Origen	Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco	Destino	Cuenta	Vir Bruto	Vir Dcto	Vir Neto	Estado	Observaciones	Descripción	Conceptos	Fch Aprb.	Num. Oper.
01/12/2025	EF	2	500807651648	901975926	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	7	84400008288		52.860,171,00	0,00	52.860,171,00	PAGADA	FACT.FE 4-Mano de obra (\$6.343.220.52) Compra de Materiales y Accesorios (\$35.416.314.57) Transporte de materiales (\$11.100.635.91)	PAGOS CON IMPUESTOS		01/12/2025	42
01/12/2025	EF	2	500807651648	900740652	CONSTRUCIVIL M&A SAS	7	05700001847		252.095.969,47	0,00	252.095.969,47	PAGADA	MYAC 411-Mano de obra (\$0.251.516.34) Materiales (\$68.904.299.54) Transporte (\$2.940.153.59)	PAGOS CON IMPUESTOS		01/12/2025	43
01/12/2025	EF	2	500807651648	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY XIMENA	7	395986743477		885.000,00	0,00	885.000,00	PAGADA	CTA N° 003-Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofrecido y operativo	PAGOS CON IMPUESTOS		01/12/2025	44
01/12/2025	EF	2	500807651648	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	7	84400008225		31.788.377,00	0,00	31.788.377,00	PAGADA	REEMBOLSO Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofrecido y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones) (\$31.167.771). Compra de materiales y accesorios (\$620.606)	PAGOS CON IMPUESTOS		01/12/2025	45
02/12/2025	EF	2	500807651648	17335397	NELSON HERNAN MORALES ROJAS	7	84435574890		26.823.312,00	0,00	26.823.312,00	PAGADA	NHMR 28-Compra de materiales y accesorios	PAGOS CON IMPUESTOS		02/12/2025	46
03/12/2025	EF	2	500807651648	900769044	TERRACQUA SAS	51	05501089000		35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	PAGADA	CTA 001-2025-Mano de obra (\$4.284.000) Compra de Materiales y Accesorios (\$23.919.000) Transporte de materiales (\$7.497.000)	PAGOS CON IMPUESTOS		05/12/2025	47
05/12/2025	EF	2	500807651648	1121866701	MURCIA TOBON BRAYAN SNEIDER	7	28919617371		30.848.941,00	0,00	30.848.941,00	PAGADA	FACT.FEV 488-Transporte De Materiales	PAGOS CON IMPUESTOS		09/12/2025	48
05/12/2025	EF	2	500807651648	1032410751	MURCIA TOBON MARLON STEVEN	51	09176000034		23.968.693,00	0,00	23.968.693,00	PAGADA	FACT.FEV 483-Transporte De Materiales	PAGOS CON IMPUESTOS		09/12/2025	49
05/12/2025	EF	2	500807651648	9620227	PINEROS CASTRO GILBERTO	40	44524009718		27.499.999,68	0,00	27.499.999,68	PAGADA	FACT.FEV 1-Mano de obra (\$3.259.999,96) Compra de Materiales y Accesorios (\$18.424.999,79) Transporte de materiales (\$5.774.999,93)	PAGOS CON IMPUESTOS		09/12/2025	50
05/12/2025	EF	2	500807651648	40333384	ELIZABETH ARIAS PARRA	51	48842410216		31.895.936,00	0,00	31.895.936,00	PAGADA	FACT.FEV 293-Transporte De Materiales	PAGOS CON IMPUESTOS		09/12/2025	51
05/12/2025	EF	2	500807651648	1006975279	GOMEZ ARIAS BRAYAM FELIPE	51	09170008923		27.670.566,00	0,00	27.670.566,00	PAGADA	FACT.FEV 256-Mano de obra (\$3.599.564,04) Compra de Materiales y Accesorios (\$19.930.065,89) Transporte de materiales (\$6.246.737,07)	PAGOS CON IMPUESTOS		09/12/2025	52
05/12/2025	EF	2	500807651648	17414465	PEREZ SANCHEZ EDUAR BENJAMIN	7	85000027015		29.746.367,00	0,00	29.746.367,00	PAGADA	CAG042-Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofrecido y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones)	PAGOS CON IMPUESTOS		09/12/2025	53
09/12/2025	EF	2	500807651648	37832768	CASTELLANOS PAEZ LUZ DARY	51	05500917000		1.409.730,00	0,00	1.409.730,00	PAGADA	PROF IN003-COMPRAS DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS		09/12/2025	54
10/12/2025	EF	2	500807651648	17321114	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	13	0742008840		30.597.560,00	0,00	30.597.560,00	PAGADA	REEMBOLSO-Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofrecido y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones) (\$10.682.220). Compra de materiales y accesorios (\$517.400)	PAGOS CON IMPUESTOS		11/12/2025	55
11/12/2025	EF	2	500807651648	901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	7	84400008225		11.199.620,00	0,00	11.199.620,00	PAGADA	FACT TRQ 1-Mano de obra (\$2.379.584,28) Compra de Materiales y Accesorios (\$13.286.012,24) Transporte de materiales (\$4.164.272,49)	PAGOS CON IMPUESTOS		12/12/2025	56
12/12/2025	EF	2	500807651648	900769044	TERRACQUA SAS	51	05501089000		19.829.869,01	0,00	19.829.869,01	PAGADA		PAGOS CON IMPUESTOS		12/12/2025	57

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-12-2025 hasta 31-12-2025

EMPRESA 316331 P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025

Fec.Causac.	FPG	Banc	Banco Origen Cuentla	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuentla	Vir Bruto	Vir Dcto	Vir Neto	Estado	Observaciones	Descripción	Conceptos	Fch Aprob. GG.	Num. Oper
12/12/2025	EF	2	500807651648	900751966 MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	7	05700001408	59.848,167,79	0,00	59.848,167,79	PAGADA	FACT.MART2-Mano de obra (7.181.780,13) Compra de Materiales y Accesorios (40.098.272,42) Transporte de materiales (12.568.115,24)	PAGOS CON IMPUESTOS		15/12/2025	58
12/12/2025	EF	2	500807651648	901658784 GEODELTA SAS	7	39500005121	28.350.000,01	0,00	28.350.000,01	PAGADA	FACT.GEO 84-Mano de obra (3.402.000) Compra de Materiales y Accesorios (18.394.500,01) Transporte de materiales (5.953.500)	PAGOS CON IMPUESTOS		12/12/2025	59
15/12/2025	PT	2	500807651648	900517804 SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			10.594.619,28	0,00	10.594.619,28	PAGADA	Pago de rendimientos de Noviembre del 2025	DEVOLUCIONES		15/12/2025	60
15/12/2025	EF	2	500807651648	900740652 CONSTRUCCION M&A SAS	7	05700001847	230.474.307,87	0,00	230.474.307,87	PAGADA	MYAC 419-Mano de obra (27.656.916,94) Compra de materiales y accesorios (154.417.785,28) Transporte de materiales (48.399.604,65)	PAGOS CON IMPUESTOS		16/12/2025	61
15/12/2025	EF	2	500807651648	900777214 LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.	7	36132028096	886.147,00	0,00	886.147,00	PAGADA	FACT.FEV1322-Compra de Materiales y Accesorios	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	62
15/12/2025	EF	2	500807651648	17414465 PEREZ SANCHEZ EDUAR BENJAMIN	7	89000027015	49.350.000,00	0,00	49.350.000,00	PAGADA	CTA N°14-001-Mano de obra (\$5.922.000) Compra de Materiales y Accesorios (\$33.064.500) Transporte de materiales (\$10.363.500)	PAGOS CON IMPUESTOS		16/12/2025	63
15/12/2025	EF	2	500807651648	17335397 NELSON HERNAN MORALES ROJAS	7	84435574890	23.328.000,00	0,00	23.328.000,00	PAGADA	NHMR 30-Compra de materiales y accesorios	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	64
15/12/2025	EF	2	500807651648	17416479 ARREDONDO ARBOLEDA ANCIZAR GUILLERMO	7	28985117209	15.510.000,00	0,00	15.510.000,00	PAGADA	CTA N°001-Mano de obra (\$1.861.200) Compra de Materiales y Accesorios (\$10.391.700) Transporte de materiales (\$3.257.100)	PAGOS CON IMPUESTOS		16/12/2025	65
16/12/2025	EF	2	500807651648	901975926 SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	7	84400008288	101.487.194,70	0,00	101.487.194,70	PAGADA	PROF N°002-Transporte de materiales	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	66
16/12/2025	EF	2	500807651648	1121932438 CASTILLO BLANDON ANGY XIMENA	7	39568743477	885.000,00	0,00	885.000,00	PAGADA	CTA N° 004-Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofrecido y separado	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	67
16/12/2025	EF	2	500807651648	901975926 SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	7	84400008288	92.600.775,00	0,00	92.600.775,00	PAGADA	FACT.FE 6-Mano de obra (\$11.112.093) Compra de Materiales y Accesorios (\$62.042.519,25) Transporte de materiales (\$19.446.162,75)	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	68
16/12/2025	EF	2	500807651648	900769044 TERRACQUA SAS	61	05501069000	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	PAGADA	CTA 002-2025-Mano de obra (\$4.116.000) Compra de Materiales y Accesorios (\$22.981.000) Transporte de materiales (\$7.203.000)	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	69
16/12/2025	EF	2	500807651648	800216499 AGOFER LTDA	7	20575957415	17.732.659,00	0,00	17.732.659,00	PAGADA	PV1810764-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	70
16/12/2025	EF	2	500807651648	901658784 GEODELTA SAS	7	39500005121	24.500.000,34	0,00	24.500.000,34	PAGADA	FACT.GEO 96-Mano de obra (\$2.940.000,04) Compra de Materiales y Accesorios (\$5.145.000,07) Transporte de materiales (\$16.415.000,23)	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	71
16/12/2025	EF	2	500807651648	17627950 ORLANDO BONILLA CASTELLANO	7	28975311823	2.202.365,00	0,00	2.202.365,00	PAGADA	FACT.1030283-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	72
16/12/2025	EF	2	500807651648	900763521 ARCOE SAS	7	36452637120	49.764.361,29	0,00	49.764.361,29	PAGADA	PROF.101714-COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PAGOS CON IMPUESTOS		17/12/2025	73



RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-12-2025 hasta 31-12-2025

EMPRESA 316331 P.A. ANT. CONS. AGUAS GAITAN 2025

Fec.Causac.	Fpg	Banco Origen	Beneficiario	Nro. de Operaciones:	Banco	Banco Destino	Vir Bruto	Vir Desc	Vir Neto	Estado	Observaciones	Descripción	Conceptos	Fch Aprb.	Num. Oper
		Banc				Cuenta								GG.	
				TOTAL			1,376.633,708,44		0,00		1,376.633,708,44				
					Bancos										
EF	PAGO ELECTRONICO ACH	67			67	MIBANCO S.A.				0	BANCO DE LA REPUBLICA				
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA	1			1	BANCO DE BOGOTA				2	BANCO POPULAR S.A.				
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA	6			6	BANCO CORPBANCA-ITALI				7	BANCOLOMBIA				
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS	9			9	CITIBANK				10	HSEC COLOMBIA				
		12			12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA				13	BBVA COLOMBIA				
CF	BANCO POPULAR	14			14	HELM BANK-ITALI				19	BANCO COLPATRIA				
	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR	23			23	BANCO DE OCCIDENTE				32	BANCO CAJA SOCIAL				
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR	37			37	ADMINISTRADORA COUNTRY				40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				
TW	TRANSFERENCIA WEB-BANCOS	51			51	BANCO DAVIVIENDA				52	BANCO AV VILLAS				
		60			60	BANCO PICHINCHA				147	BANCO ALIADAS				
		531			531	FIDUCOLOMBIA				8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT				
		58			58	BANCO CREDITFINANCIERA S.A.				61	BANCO COOMEVA S.A.				
		63			63	BANCO FINANCIERA S.A.				62	BANCO FALABELLA S.A.				
		59			59	BANCA MIA S.A.-BANCO MICROFINAN				53	BANCO WWB S.A.				
		64			64	BANCO MULTIBANK S.A.				66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL				
		65			65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO				121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.				
		292			292	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA				69	BANCO SERFINANZA S.A.				
		108			108	IRIS CF-COMPANIA DE FINANCI				68	BANCO MUNDO MUJER S.A.				
		46			46	COLTEFINANCIERA S.A.				70	LULO BANK S.A.				
		286			286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA				289	COTRAFA FINANCIERA				
		25			25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD				130	BANCO UNION S.A.				
		128			128	NU COLOMBIA COMPANIA DE FINANCI				507	NEQUI				
		551			551	DAVIPLATA				124	RAPPINAY				

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 382973 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 779969, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **GEODELTA SAS**, identificado con número de documento **901658784**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$50050000**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 0550108900765083** el día **30-01-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025,**

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 383898 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 781797, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **M&G INGENIERIA S.AS**, identificado con número de documento **900974864**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$38309739.72**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA CH 098470022017** el día **04-02-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Hola **3 1 P126331 ANT CONS AGUAS GAITAN 2025**,

¡Buenas noticias! Tu solicitud de pago número 379710 en el portal y número interno de Aval Fiduciaria 779964, donde generaste la instrucción de giro al beneficiario **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con número de documento **901965630**, con la forma de pago **TRANSFERENCIA BANCARIA**, por un valor de **\$70410428**, fue **ENVIADA** a la entidad financiera **BANCOLOMBIA CH 84400008225** el día **30-01-2026**. Todo el proceso interno de Aval Fiduciaria se ha completado exitosamente.

Si tienes alguna inquietud sobre este comprobante, por favor comunícate con tu analista de gestión o con nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá **(601) 755 0340**, a la Línea nacional gratuita **01 8000 189 799** o desde su celular **#432**.

¡Gracias por confiar en nosotros!



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

CERTIFICADOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL.

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Páez de Hurtado	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		 INF.FR-14
		Contrato de Interventoría		Versión: 04
		Contrato de Obra Pública		1004 de 2025
			0821 de 2025	
CERTIFICACION				


CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES Y PEDIALES PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO Y SU VIGENCIA

Teniendo en cuenta las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del Contrato de Obra No. **0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, particularmente la establecida en la **CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**, numeral 34. “**EL CONTRATISTA debe realizar los trámites y atender los requerimientos que le realice la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial “La Macarena”-CORMACARENA y las entidades y/o autoridades con las que se tengan permisos, licencias o autorizaciones**”; en mi calidad de Interventor del contrato mencionado, para el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2026, me permito **CERTIFICAR** el cumplimiento de esta obligación en relación a los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales se encuentran vigentes y amparan las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, conforme a la siguiente relación:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	VIGENCIA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	WACOYO	KALIWIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

Así mismo, se verificó que las actividades ejecutadas en obra se desarrollan dentro del alcance de los permisos otorgados y conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.


JORGE ADELFO DÍAZ SARMIENTO

Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND

Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



Imagen 1 Acopio de materiales en cubierta

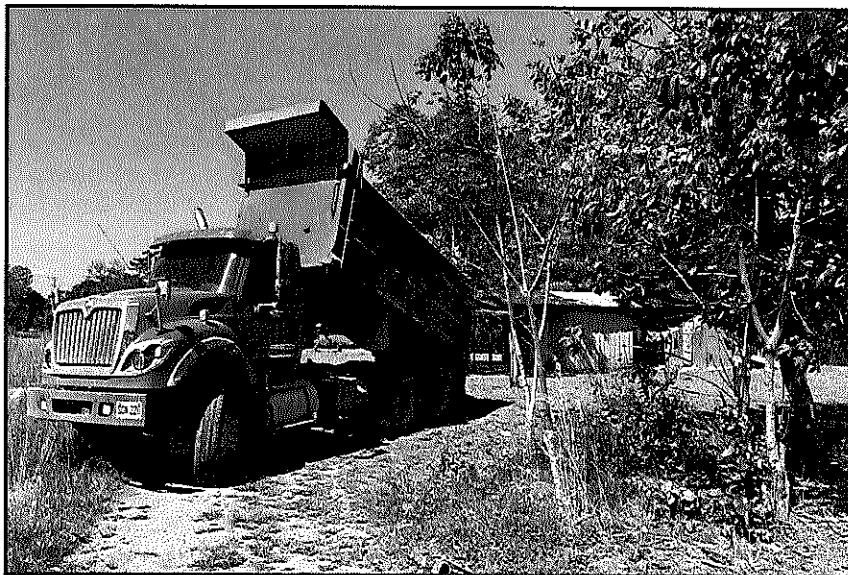


Imagen 2 Control ingreso y salida de volquetas

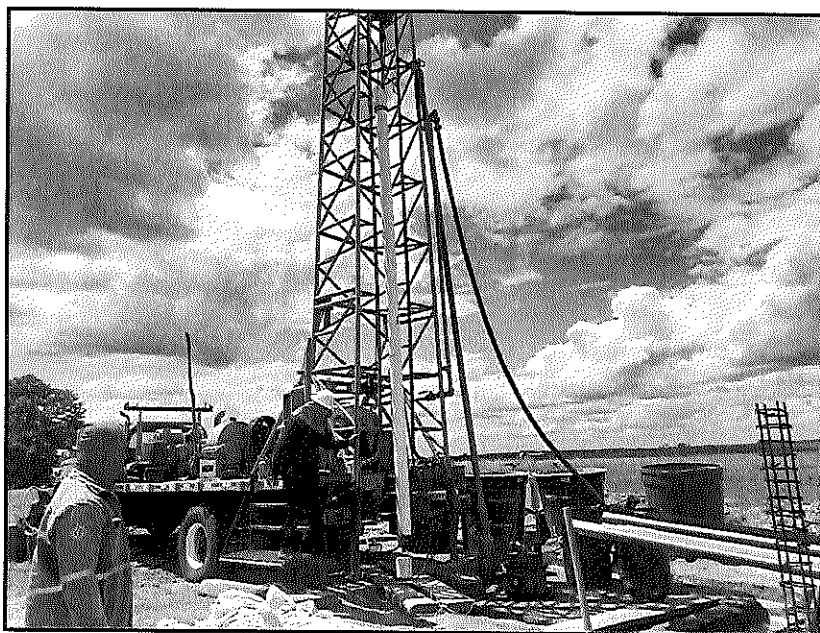


*Imagen 3 Frente de trabajo libre de residuos, sin afectación
A bosques (comunidad Puerto Lopez)*

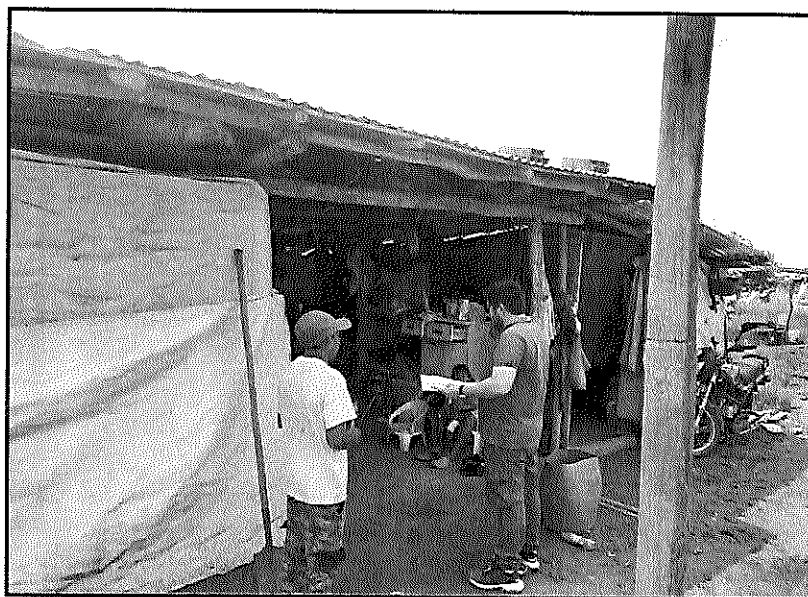


Imagen 4 Gestión social

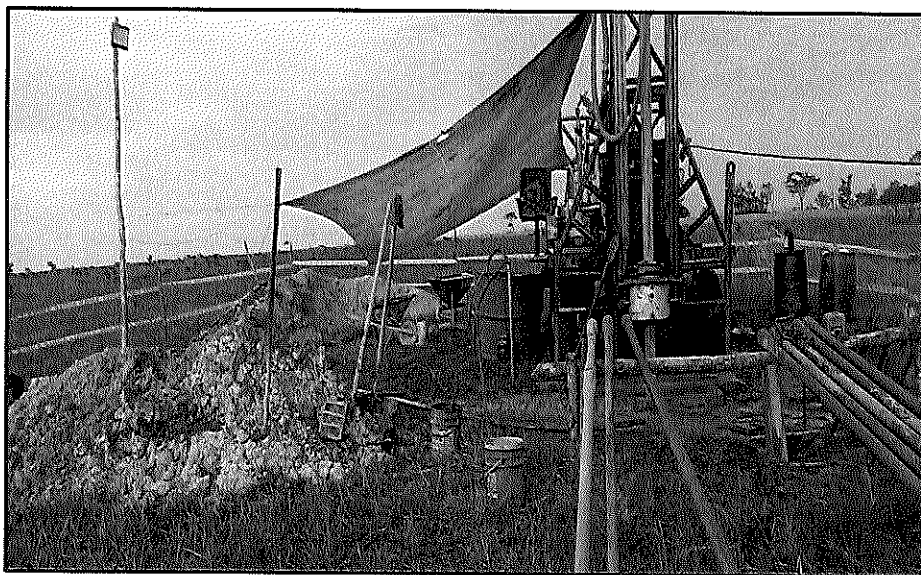


Imagen 5 Cerramiento y señalización



Imagen 6 Manejo y secado de lodos

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025

CERTIFICACION CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito **CERTIFICAR** que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de impactos ambientales.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELFO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil M.E. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION			

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito **CERTIFICAR** que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ALEJANDRO DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil M.P. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Interventoría		0821 de 2025
	Contrato de Obra Pública		
CERTIFICACION			

CERTIFICACION

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de enero de 2026, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-SIP-005-2025, el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con NIT. 901.965.630-1 representado legalmente por **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.051.533, certificamos que se **CUMPLIO** con los requisitos exigidos respecto a la maquinaria y equipos establecidos durante el mes de enero de 2026. Así las cosas, a continuación, enumeramos uno a uno la maquinaria y equipos colocados en la obra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Maquinaria y equipo dispuesto por el Consorcio Agua Gaitan 2025.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	1
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
EQUIPO DE PERFORACION	REO, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

Fuente: Elaboración propio Consorcio Interventoría AC Indígenas 2025.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil, M.P. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Parque Nacional	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
		Contrato de Interventoría		Versión: 04
		Contrato de Obra Pública		1004 de 2025
				0821 de 2025
CERTIFICACION				

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1004 DE 2025**,

CERTIFICO QUE:

El **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META**”, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION			

CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No.: No. 821 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITÁN 202

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

FECHA DE CORTE: 31 de enero de 2026

PERIODO EVALUADO: Del 01 al 31 de enero de 2026

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.

1. AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION AL 31 ENERO 2026	\$ 3,054,586,452	\$ 4,800,716,596
INVERSION ACUMULADA	\$ 11,657,188,378	\$ 15,435,907,083
ADELANTO EN PROGRAMACION		\$ 3,778,718,705

2. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

Para la fecha de corte del presente informe, se evidencia un avance de obra física ejecutada por un valor de \$ 15,435,907,083, frente a un avance programado de \$ 11,657,188,378. Este resultado refleja un adelanto financiero del 0,3242%, equivalente a \$ 3,778,718,705. El porcentaje de ejecución mensual es del 11.32%, con un acumulado del 36.40%. Este valor representa en el replanteo de las comunidades indígenas, lo cual fue la actividad que se desarrolló durante el quinto mes de ejecución y se realizó en los tiempos establecidos.

El presente certificado se expide a los treinta y uno (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO

Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND

Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
