



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

INFORME MENSUAL NO. 11

MES O PERIODO: JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	INTRODUCCIÓN		X		5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		X		6
2.1	Localización		X		6
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		7
2.3	Características técnicas del proyecto		X		10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		X		13
3.1	Información general del contrato		X		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		14
3.3	Seguimiento ítems no previstos		X		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		16
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		X		21
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		23
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		25
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		48
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		50
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		53
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		62
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		66
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		69
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		80
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		84
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		84
	• Seguimiento Programa de Obra	MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		84
			X		86
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		86
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		86
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		88
		MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		99
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		100
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		X		109
5.1	Información general del contrato		X		109
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		110
5.3	Informes especialistas		X		115
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A		143
5.5	Información otros programas y aplicativos		N/A		143
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		X		143
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		143
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		145
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		151
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		153
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		155
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	N/A		
6.7	Otros documentos seguimiento mensual		N/A		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		159
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	N/A		
7	Conclusiones y recomendaciones		X		161
8	Anexos		X		162
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		162
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		165
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		165

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

**INFORME MENSUAL N° 11 DE INTERVENTORIA
CONTRATO N° 00912 DE 2018 - INVIAS**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN
EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

**CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1250 de 06 de Julio de 2018
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**

INTERVENTOR:



CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA.

PERIODO EN INFORME: DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

BOGOTA D.C JUNIO DEL 2019



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1 LOCALIZACIÓN.....	6
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA	7
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.	10
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	13
3.1 INFORMACIÓN GENERAL (Incluye seguimiento, garantías contractuales).....	13
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019.....	14
3.2.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO..	15
3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	15
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	16
3.4.1 INFORMACIÓN GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL.....	16
3.4.2 GESTIÓN SOCIAL	16
3.4.3 GESTION AMBIENTAL	20
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	21
4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....	21
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	23
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA	25
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.....	48
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.	50
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	53
4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	62
4.8 INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO.....	66
4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....	69
4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....	80
4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	84
4.11.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.....	84
4.11.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.	86
4.11.3 ACTAS DEL CONTRATO	88
5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	109



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	109
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR EN EL MES DE JUNIO DE 2019	110
5.2.1	INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA.....	112
5.3	INFORME DE LOS ESPECIALISTAS.....	115
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA -PAC.....	143
5.5	INFORME DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS	143
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	143
6.1	EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	143
6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	145
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	151
6.4	CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	153
6.5	SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	155
6.6	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	159
6.6.1	SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO.....	159
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	161
8.	ANEXOS.....	162
8.1	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO....	162
8.1.1	OFICIOS RADICADOS POR LA INTERVENTORÍA	162
8.1.2	OFICIOS RADICADOS POR EL CONTRATISTA.	164
8.2	REGISTRO FOTOGRAFICO.....	165
8.2.1	REGISTRO FOTOGRAFICO	165
8.2.2	BITACORA	171



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto describir las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra y el Interventor, durante el undécimo 11° período de labores comprendido entre el del 1 de junio al 30 de junio de 2019. Se informa sobre el avance de la obra y en general del seguimiento al proyecto en cumplimiento de las funciones delegadas a CODIPRO INGENIERIA LTDA, con el acompañamiento de la Supervisión Técnica del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, TERRITORIAL TOLIMA y la SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA.

Se incluyen las actividades desarrolladas en cumplimiento del Contrato de Obra N° 1250 de 2018, celebrado entre el Contratista **CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA** y la GOBERNACION DEL TOLIMA, contrato éste que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**.

Las actividades de Interventoría incluidas en este informe vienen siendo adelantadas por la firma CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA, quien fue favorecida con la adjudicación del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-077-2018, mediante Contrato N° 00912 de 2018 cuyo es objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA • EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."**

Los recursos utilizados para el proyecto son financiados por El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (**OCAD**) quien evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que son financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTel, del Sistema General de Regalías.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto motivo del presente Informe tiene como propósito el **"MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, se encuentra localizado en el departamento del Tolima, vía secundaria de gran importancia para el centro de éste departamento y para el país en general.

Las principales actividades y obras a ejecutar en el proyecto comprenden entre otras: EXPLANACION, AFIRMADO, SUBBASES Y BASES, PAVIMENTO RIGIDO, ESTRUCTURAS Y DRENAJE, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD, TRANSPORTES, todo esto en cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas por el Instituto Nacional de Vías.

El Estado colombiano a través de la Gobernación del Tolima como ente Ejecutor y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, han considerado importante realizar para el Mejoramiento y Mantenimiento de esta vía, las obras de pavimentación de 7.7 kms, dentro del alcance de los recursos presupuestales, estipuladas en la Licitación Pública N° 36-2018 de la Gobernación del Tolima.

2.1 LOCALIZACIÓN

La vía objeto del contrato, **"MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, se encuentra localizada en este Departamento del centro del país, en la carretera de Rioblanco a Herrera, carretera de orden secundario a cargo de la Gobernación del Tolima, para efectos de su mantenimiento, cuidado e inversión de recursos.

La siguiente figura detalla la ubicación de la vía en el departamento del Tolima.

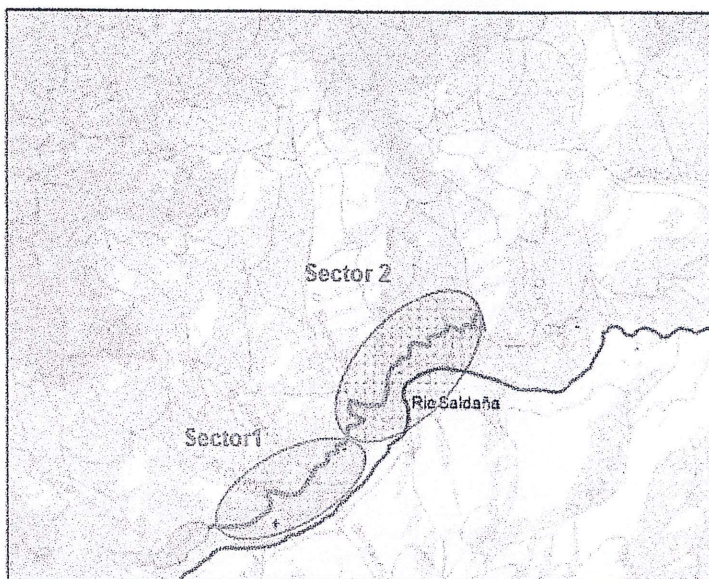


Figura No 1. Localización de la vía Secundaria Herrera – El Diamante, Departamento del Tolima.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El Departamento del Tolima está conformado por una red vial secundaria de 2.464,4 kms de los cuales solo 809 kms. (32,82%) se encuentran pavimentados, los 1.655,4 kms (67,18%) restantes que se encuentran sin pavimentar y presentan un alto deterioro, generando grandes problemas de movilidad. De igual manera el Departamento cuenta con 2.115 kms. de red vial terciaria ubicada en todo el territorio rural tolímense. Se resalta la infraestructura vial como un pilar fundamental para el progreso en sectores como salud, educación, agropecuario, turismo y seguridad general.

El municipio de Rioblanco, presenta deterioro en la red vial secundaria, en virtud al precario mantenimiento que se ha realizado sobre estas vías. La vía ubicada entre el corregimiento de Herrera - hacia el corregimiento El Diamante presenta afectaciones graves, debido a que en épocas de invierno se generan taponamientos de los corredores viales entre los municipios y las veredas.

La administración departamental recomienda la construcción de estructura de pavimento rígido (placa de concreto hidráulico MR 42 MPA y subbase granular) por



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

tratarse de una vía secundaria de bajos volúmenes de tráfico y de vehículos pesados (buses y camiones), ajustándose en buena medida a la geometría de la vía actual.

El departamento del Tolima, en aras de mejorar la movilidad de la vía pretende realizar el mejoramiento de la vía secundaria de Herrera - El Diamante interviniendo 7,7 kilómetros iniciando desde el sector de Herrera (K0+000) hasta el sector de El Diamante (K7+926). Atendiendo los siguientes tramos:

MUNICIPIO DE RIOBLANCO	Sector 1	Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684.
	Sector 2	Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

Las condiciones que presenta actualmente la vía en los tramos a intervenir, son en material de afirmado con un ancho promedio entre 3 y 5 metros.

En las siguientes abscisas se proyectaron inicialmente obras de contención así:

K4+690 al 4+720	Se necesitan 4 módulos de muros, 2 intermedios de 4.0 m de altura y dos extremos de 3.0 m de altura, todos los módulos de 4.0 m de longitud.
K4+790 al 4+810	Se necesitan 3 módulos de muros, 2 módulos de 4.0 m de altura y uno extremo de 3.0 m de altura, todos los módulos de 4.0 m de longitud.

Adicionalmente a lo largo del trayecto, la vía presenta afectaciones por deformaciones en varios puntos, también se presentan derrumbes sobre la calzada que impiden el normal tránsito de los vehículos.

A continuación se presenta un resumen de la construcción de las obras de arte (alcantarillas) ejecutadas hasta el momento:



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA



INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018

OBRA No.	ABSCISA	ALCANTARILLA	BOX CULVERT	ESTADO
1	K+289.24	X		CONSTRUCCION REALIZADA
2	K0+444.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
3	K0+601.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
4	K0+975.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
5	K1+034.80	X		CONSTRUCCION REALIZADA
6	K1+592.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
7	K1+709.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
8	K1+938.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
9	K2+167.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
10	K2+235.00		X	CONSTRUCCION REALIZADA
11	K2+577.23	X		CONSTRUCCION REALIZADA
12	K2+749.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
13	K2+831.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
14	K2+905.30	X		CONSTRUCCION REALIZADA
15	K3+103.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
16	K3+612.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
17	K3+660.00		X	CONSTRUCCION REALIZADA
18	K3+907.00	X		POR CONSTRUIR
19	K4+070.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
20	K4+207.00			CONSTRUCCION REALIZADA
21	K4+285.00			CONSTRUCCION REALIZADA
22	K4+381.00			CONSTRUCCION REALIZADA
23	K4+488.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
24	K4+600.00	X		POR CONSTRUIR
25	K4+776.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
26	K4+918.00		X	CONSTRUCCION REALIZADA
27	K5+070.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
28	K5+180.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
29	K5+414.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
30	K5+518.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
31	K5+660.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
32	K5+836.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
33	6+033.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
34	K6+201.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
35	K6+310.00			POR CONSTRUIR
36	K6+380.00			POR CONSTRUIR
37	K6+465.00	X		POR CONSTRUIR
38	K6+571.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
39	K6+640.00	X		POR CONSTRUIR
40	K6+782.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
41	K6+845.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
42	K6+939.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
43	K7+046.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
44	K7+150.00	X		POR CONSTRUIR
45	K7+237.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
46	K7+318.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
47	K7+417.00	X		CONSTRUCCION REALIZADA
48	K7+546.00	X		EN CONSTRUCCION
49	K7+700.00	X		POR CONSTRUIR
50	K7+822.00	X		POR CONSTRUIR



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

Se realizó recorrido en conjunto con el consultor diseñador de los estudios contratados por la Gobernación del Tolima en su oportunidad para hacer posible la licitación pública que originó el proceso que nos ocupa, Ingeniero ORLANDO HOYOS, Representante legal de la firma DPI LTDA.

En este recorrido se vio la necesidad de revisar algunos estudios y/o complementarlos, tal es el caso de los Estudios de Suelos para fundaciones de Muros, el propio estudio de pavimentos, así como ofrecer recomendaciones tendientes a garantizar la estabilidad de taludes.

Con las inspecciones realizadas en los Comités Técnicos, se ha visto la necesidad de reubicar algunas obras inicialmente contempladas, así:

- 1) Construcción de Muro de contención en el PR 2+870 conformado por cinco módulos de cuatro metros de longitud y altura de 4.30 metros.
- 2) Construcción de Muro de contención en el PR 2+240 previsto para hacerse en módulos de 4 metros de longitud y 5 metros de altura. (Se revisó su diseño).
- 3) Construcción de Muro de contención en curva del PR 6+640 (Se revisó su diseño).
- 4) Ampliación de box coulvert en el PR 3+660 en una longitud de 6 metros, y 2.00 * 1.96 metros de sección.

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

Estas obras son necesarias para que en las vías secundarias del departamento no se genere un deterioro progresivo y además de esto minimizar el índice de accidentalidad, mejorando la velocidad de operación, disminución en los tiempos de viaje y reducción en los costos operación vehicular. Por lo tanto, el Departamento pretende optimizar la infraestructura vial ajustada a los requerimientos de competitividad que brinden condiciones de eficiencia, seguridad y buenos niveles de servicio.


Para ello y de acuerdo a los diseños, se establece una sección transversal de calzada de 7.4 metros incluyendo cunetas, como se puede apreciar en el siguiente gráfico ilustrativo:



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA



INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018

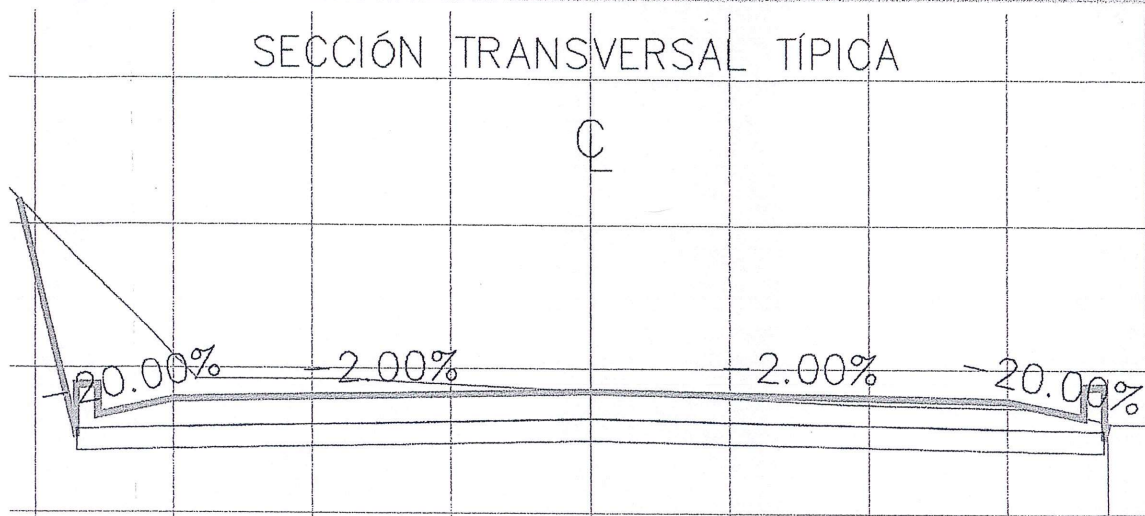

Para ello cuenta con un presupuesto que procura alcanzar las metas físicas de obra para el MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, que contempla las siguientes actividades y cantidades:



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA



INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018

GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT												
MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA- EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA												
NO.	CODIGO CLAS.	ITEM DE PAGO	EXECCION PRELIMINAR	EXECCION PRINCIPAL	EXECCION FINAL	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (C)	PRECIO TOTAL (C)	PRECIO TOTAL (S)	
1.0 EXPLANACION												
	100-2			100-2-1P		LOCALIZACION Y REPLANTIO	M2	57.750,00	\$	624	\$	36.036.000
	201-7		201-13			DEMANDACION DE ESTRUCTURAS	M3	350,00	\$	88.000	\$	13.200.000
	210-11		210-13			EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	41.950,00	\$	7.120	\$	238.755.200
	230-1		230-13			MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	19.000,00	\$	73.940	\$	1.518.860.000
2.0 PAVIMENTADO, TUBERIAS Y BASES												
	320-1		320-1			SUBBASE GRAVILLAR CLASE A	M3	6.930,00	\$	191.343	\$	1.316.006.990
3.0 PAVIMENTO RIGIDO												
	500-1		500-1			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 47	M3	8.535,12	\$	915.931	\$	7.817.580.997
4.0 ESTRUCTURAS Y DERRIALES												
	600-13		600-13			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	4.661,30	\$	15.037	\$	70.101.291
	610-2		610-13			RELLENO ESTRUCTURAL	M3	1.860,00	\$	72.800	\$	136.864.000
	630-13		630-13			CONCRETO RESISTENCIA 18 MPa (C)	M3	168,00	\$	774.850	\$	130.124.080
	630-4		630-13			CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (C)	M3	768,00	\$	702.560	\$	539.566.080
	630-6		630-13			CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPa	M3	199,36	\$	590.360	\$	94.111.647
	640-1		640-13			ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPa	KG	70.801,69	\$	4.560	\$	322.855.706
	673-2		673-13			MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	3.731,20	\$	250.761	\$	935.639.997
	673-12		600-13			GEOTEXTIL NT 2500	M2	22.464,00	\$	5.512	\$	123.821.568
	681-1		681-13			GAJONES	M3	44,00	\$	189.930	\$	8.356.940
	691-1		661-13			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 18 MPa, DE 9000 MM DE DIAMETRO INTERIOR	M1	399,50	\$	576.000	\$	230.112.000
	671-3		673-13			CUNETA DE CONCRETO VAGADA IN SITU. INCLUIE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1.857,51	\$	775.343	\$	1.440.706.235
5.0 SERIALIZACION Y SEGURIDAD												
	700		700-1			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	Nº	30.000,00	\$	2.160	\$	64.800.000
	710-1		710-13			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	UND	100,00	\$	280.000	\$	28.000.000
6.0 TRANSPORTES												
	900-2		900-13			TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M) METRO CUBICO - KILOMETRO	M3-KM	176.480,00	\$	1.136	\$	200.481.280
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS												
15.315.481.595												
3.833.870.399												
19.189.351.994												
TOTAL COSTO OBRAS												
19.189.351.994												
CAPACITACION VIAL												
588.754												
VALOR TOTAL CAPACITACION VIAL												
211.863												
VALOR TOTAL CAPACITACION VIAL												
700.617												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA INCLUIDO CARACTERIZACION VIAL + OBRAS AMBIENTALES DEL PAGU												
88.000.000												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA INCLUIDO CARACTERIZACION VIAL + OBRAS AMBIENTALES DEL PAGU												
19.288.032.411,9												
DESCRIPCION												
ADMINISTRACION												
IMPREVISTO												
UTILIDAD												
TOTAL A LU												
PERCENTAJE												
15%												
5%												
25%												



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL (Incluye seguimiento, garantías contractuales)

PROCESO DE SELECCION	LICITACION PUBLICA No. 36 DE 2018.
N° DEL CONTRATO	1250 del 6 de Julio de 2018 – Gobernación del Tolima.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE JULIO DE 2018
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA (JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 94% - INGENIERIA DE VIAS 4%)
NIT	901.190.351-2
DEPARTAMENTO	TOLIMA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 15.358'105.867 IVA EXCLUIDO.
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 3.900'221.719
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.258'327.586
PLAZO DE EJECUCIÓN	450 DIAS
ORDEN DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2018
FECHA TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACTAS PARCIALES	Ninguna.
DIRECCION	CALLE 100 N° 8 A – 55 TORRE C OFICINA 401
TELEFONO	466 0906 – 466 1431



3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

A continuación se mencionan las principales actividades llevadas a cabo en el presente periodo:

- La comisión de topografía continuó con actividades de control en el cajeo de material de subrasante, así como el control en el céreo del mejoramiento de la subrasante y subbase granular, también en la verificación de los cortes de taludes para el tramo dos, específicamente en la abscisa k7+544.
- Se realizó control topográfico en el céreo del mejoramiento de la subrasante en su extendido y colocación, desde el PR 2+000 al PR 2+840. Se realizó también revisión de densidades de acuerdo con la normativa de Proctor modificado y especificaciones técnicas Invias.
- Se verifica y controla el extendido, colocación y compactación de la subbase granular en espesor de diseño 15 cms desde el PR 1+200 hasta el PR 1+270 por el carril izquierdo, de acuerdo con las cotas establecidas en los planos de topografía y con las tomas de densidades en campo.
- Se controla la colocación de formaletas para las losas de concreto establecidas en los planos y su modulación desde el PR 1+063 al PR 1+271 en el costado izquierdo. Igualmente se avanza por el carril derecho a partir del PR0+728 avanzando hasta el PR1+042 controlando niveles de formaleta, asentamientos del concreto, acabados finales y cortes estipulados para la modulación, de manera paralela se han realizado los sellos de juntas.
- En lo concerniente a estructuras de drenaje, se culmina la construcción de alcantarillas en los PR 7+046, PR 7+236, PR 7+318 y PR 7+416, ejecutando así la construcción total de 4 alcantarillas dentro del periodo comprendido y se está ejecutando la construcción de la alcantarilla ubicada en el PR7+546.



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

- Se realizó remoción y limpieza de derrumbes en los puntos críticos afectados: PR 0+290, PR 1+840, PR 2+050, PR 3+100, por los deslizamientos que obstaculizaron el paso vehicular de la vía en intervención.
- El Consorcio Vías del Tolima inició y culminó el montaje de la planta dosificadora de concreto, ubicando las tolvas de agregados fino y grueso, el silo de almacenamiento de cemento, la planta eléctrica y el punto de acopio de material. Se inicia con la calibración y programación de la fórmula de trabajo correspondiente al MR.
- El pozo de sedimentos que se había puesto de manera temporal en el zodme para el lavado de los camiones mixer se ha deshabilitado, en razón a que se va a reubicar en la nueva planta dosificadora de concreto.

Debido a las condiciones climatológicas presentadas en el mes de junio, han ocurrido deslizamientos a lo largo del tramo objeto del proyecto, los cuales se han venido retirando por parte del Contratista, manteniendo la continuidad de flujo en la vía.

3.2.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO.

Durante el undécimo periodo de labores el Consorcio Vías del Tolima programó avanzar en las actividades de obra que representan un costo de \$ 7.517.065.000 que corresponden al 39.21% del valor de las obras, frente a un avance ejecutado acumulado de \$3.641.887.126 que constituyen el 18.98% del valor total del contrato incluido adicional, que igualmente corresponden a los valores de las obras programadas y ejecutadas acumuladas respectivamente. Así las cosas, a corte de 30 de junio de 2019 el Proyecto presenta un atraso del 20.23% del valor de las obras, es decir un valor de \$3.875.177.874.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

Durante este undécimo periodo de labores, no hubo la necesidad de tramitar ítems no previstos.



3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

La Interventoría viene revisando el cumplimiento de la ejecución de actividades de acuerdo a la Programación de Obra presentada por el Consorcio Vías del Tolima. Programó avanzar en las actividades de obra que representan un costo de \$7.517.065.000 que corresponden al 39.21% del valor de las obras, frente a un avance ejecutado acumulado de \$3.364.188.126 que constituyen el 18.98% del valor total de la obra, lo que refleja el atraso de \$3.875.177.874 que representa 20.23% un valor total de las obras.

El personal de la Interventoría aprobado por INVIAS Subdirección de la Red Terciaria, ha venido laborando desde el inicio de las actividades de obra, revisando documentación (Estudios y Diseños), replanteando topográficamente el Proyecto en campo e inspeccionando las obras en las tareas físicas de construcción de alcantarillas, muros de contención, excavación para ampliación de banca, cortes en taludes, rellenos, aplicación de concreto hidráulico para pavimento y conformación de la vía.

3.4.1 INFORMACIÓN GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL

Durante el presente periodo se continuó con el seguimiento al PAGA: Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, elaborado por el Contratista, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría.

3.4.2 GESTIÓN SOCIAL

Para el mes informado desde el área social de Interventoría en el marco de la ejecución del Contrato No 1250 de 2018, se adelantaron las siguientes actividades de acompañamiento al contratista:



- En vista que el contratista continuó con la intervención de obras de arte para el tramo 2, en conjunto con la parte social se realizan visitas a predios donde según diseño están programadas obras de arte ya sea para remplazo de tubería o instalación de nuevas. En tal sentido, el día 12-06-2019 se realiza visita a predios en el Km 7+822 del proyecto.




**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

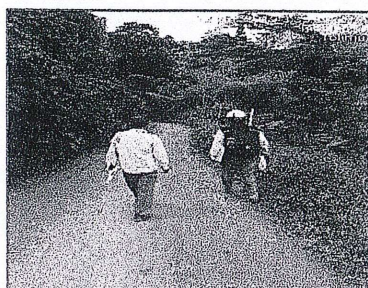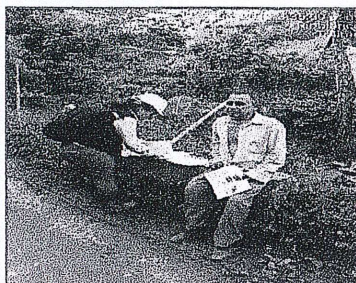

- En predio del Km 4+381 margen izquierda propiedad del Señor Luis Enrique Orta se realizó visita el día 12-06-2019 en conjunto con el componente social del Contratista, el objetivo de la visita se hace por que dicho propietario manifestó en días anteriores a la comisión topográfica de Interventoría que no estaba de acuerdo con el ancho de vía que quedó frente a la estructura para galpón que tiene en su predio. Se aclara que el mismo propietario meses atrás dio autorización para intervención en su predio, tanto para actividades de obra de corte para talud como también para la intervención de las dos obras de arte localizadas por diseño que colindan con su predio. Para la respectiva autorización citada se realizó en forma conjunta desde el área de Gestión Social y Técnica tanto del Contratista como de la Interventoría, gestiones con el propietario en campo donde se le socializó en detalle el tipo de afectación que iba tener predio teniendo en cuenta el diseño.

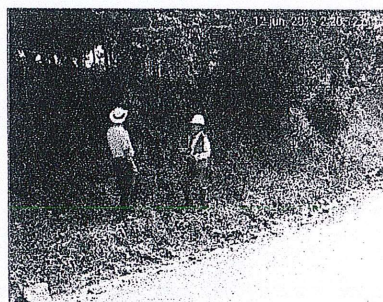

- El 13-06-2019 se continúan realizando visitas de campo en conjunto el componente social del contratista, en predios donde se tienen programadas obras de arte según diseño desde el PR7+542 del abscisado del proyecto. Importante a tener en cuenta y que requiere un manejo especial desde la parte técnica y social es el referido al caso del PR 7+572 margen izquierda de vía, predio propiedad del Señor Faiber Espinoza. Dicho predio, cuenta con acceso vehicular y estructura con columnas y cubierta para portón metálico, el cual



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

será afectado. En visita del mismo día al predio en mención, el propietario que no tiene inconvenientes en que el proyecto de la pavimentación avance en el sitio, ya que meses atrás autorizó intervenir mediante acta. Le preocupa en gran medida que el acceso a restablecer no quede funcional, que presente mucha pendiente lo que dificultaría el acceso y salida a su finca cafetera con todo lo que esto implica en términos de entrada de insumos y salida de carga. La anterior preocupación le surge a raíz de la observación que ha hecho de los nuevos accesos que ha restablecido el contratista que según aduce no quedaron funcionales. Se acuerda entre las partes, realizar nuevas visitas en conjunto con la parte técnica para definir en campo las acciones a seguir en procura de restablecer funcionalmente dicho acceso.

- El día 18-06-2019 por iniciativa de la Interventoría se realiza acercamiento con el presidente de la J.A.C de la Vereda El Cedral con el objetivo de abordar el tema de la necesidad de adelantar capacitaciones alusivas al tema de seguridad vial con estudiantes de la institución educativa y el resto de la comunidad en esa importante localidad rural. Al mencionado líder social le pareció importante que ese tipo de capacitaciones se realicen porque es necesario debido a la coyuntura por el avance de obra en su localidad. En los próximos días se programará dicha capacitación en fecha y hora que le permita a la comunidad asistir.





- El 20-06-2019 se hace acompañamiento al componente social del Consorcio a la capacitación en el tema de Seguridad Vial que se realizó en la instalación educativa de la Vereda Los Guayabos con estudiantes de básica primaria. En dicha capacitación participa igualmente la docente de la institución educativa en mención.



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**




**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

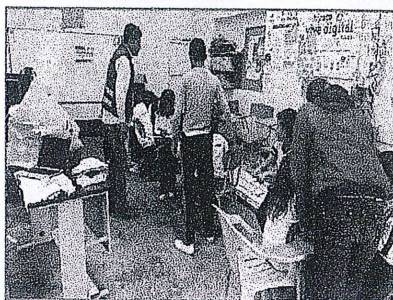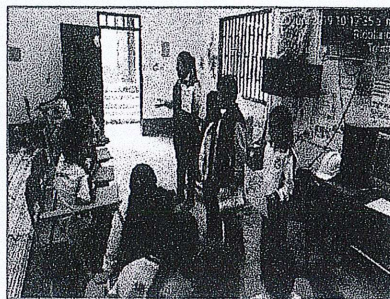

- El 21-06-2019 se asiste al Comité Técnico de obra en las instalaciones de la Interventoría con la participación de representantes del OCAD, Invias, Interventoría y Consorcio Vías Tolima. Los temas abordados y compromisos adquiridos por las partes quedaron plasmados en el Acta.



- El 22-06-2019 en conjunto con el componente social del Contratista se realiza visita de campo para tramo 1 y 2, con el objetivo de verificar compromisos adquiridos por parte del consorcio en aras de lograr el cierre formal de algunas PQR. Una vez hecho el recorrido, se da directriz a la profesional social del contratista para que se cumpla a cabalidad con el proceso establecido para atención al ciudadano – Programa de Gestión Social establecido en el PAGA y que permita que los solicitantes firmen a satisfacción el cierre de las PQR.

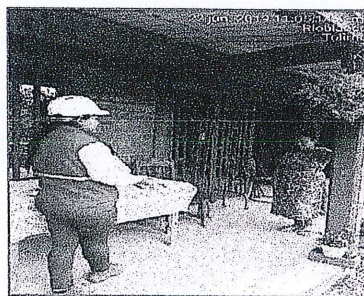




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA



INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018

- Se realiza acompañamiento a la profesional social del contratista en el traslado y ubicación del buzón de sugerencias desde el sector urbano de Herrera a la Vereda El Cedral. Lo anterior, debido al avance de obra y, por ende, mayor acceso de dicha comunidad a la presentación de las PQR. El buzón quedó instalado en la tienda "el paradero" propiedad de la Sra. Marlyn Oyola.

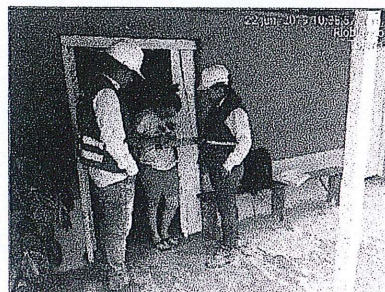

3.4.3 GESTION AMBIENTAL

Teniendo en cuenta los permisos ambientales solicitados por el contratista para la ejecución del presente contrato se presenta la relación y el estado actual de cada uno de ellos:

Aprovechamiento forestal: Permiso otorgado mediante Resolución N°705 del 10 de diciembre de 2018 la cual solicita una compensación por 154 árboles, y un periodo de mantenimiento de DOS (2) AÑOS. Se ha solicitado al contratista presentar el formato de Actos administrativos el cual hace parte del Manual de Interventoría del INVIAS diligenciado, donde se consignen cada una de las obligaciones adquiridas por el contratista.

Concesión de aguas: El permiso de Concesión de aguas se solicitó ante CORTOLIMA el día 02 de agosto de 2018, la interventoría solicita hacer estricto seguimiento ante la Corporación, teniendo en cuenta los plazos establecidos por la ley para el estudio y respuesta por parte de la Autoridad Ambiental; lo anterior, para no prolongar más de lo necesario el tiempo para la obtención del Acto Administrativo en trámite, y así, poder dar cumplimiento a la ejecución de la obra dentro del tiempo establecido para la ejecución del presente contrato; del mismo modo, conocer las posibles compensaciones a ejecutar y/o pagos de Tasas de uso de agua por el otorgamiento del permiso en mención.



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



**INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018**

Zonas de disposición de material de excavación y/o demolición - ZODMES: La Corporación emitió concepto bajo radicado 27421 de fecha 12 de diciembre de 2018, donde se considera viable la disposición de material de excavación, demolición y material estéril proveniente de la ampliación de la vía Herrera – Diamante, en un predio localizado en el PR 1+500, margen derecha de la vía que comunica el área urbana del Municipio de Río Blanco con el Corregimiento Herrera en el Departamento del Tolima. Predio denominado “El Recreo”.

A la fecha la corporación Cortolima respecto al permiso del zodme en el PR1+500 margen derecha, ya emitió la resolución definitiva No. 1148 del 29 de marzo de 2019 para un volumen de 20.000 m³

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Correspondiente al período comprendido del 1 de junio al 30 de junio de 2019, a continuación, se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO MINFRAN-IN-15-FR-3
VERSION 1
PÁGINA DE

FECHA 30 6 2019
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DEL 6 DE JULIO DE 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS DEL TOLIMA
PLAZO ACUMULADO: 15 MESES
22 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR ADICIONALES: \$ 3.900.221.719,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ 4.607.431.760

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0912 DE 2018 INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HUMBERTO LEÓN VELÁSQUEZ CONTRERAS

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO			AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	KM	7.7	Mejoramiento	KM	-
Construcción	KM	7.7	Construcción	KM	-
Pavimentación	KM	7.7	Pavimentación	KM	-
Puentes			Puentes		-
Otros			Otros		-

AVANCE FINANCIERO

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)					VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Inversión Programada (P)	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	Costos de Intervent (I)	Año	Valor
En el mes: 1.504.735.000	488.537.128	-	488.537.128	\$ 89.754.084	2018	553.276.197
Acumulado 7.517.065.000	3.641.887.128	-	3.641.887.128	\$ 642.245.339	2019	18.695.057.390
					Total	19.258.327.587

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)					VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
En el mes: 1.504.735.000	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	Costos de Intervent (I)	Año	Valor
Acumulado 7.517.065.000	488.537.128	-	488.537.128	\$ 89.754.084	2018	553.276.197
					2019	18.695.057.390
					Total	19.258.327.587

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)					VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
En el mes: 1.504.735.000	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	Costos de Intervent (I)	Año	Valor
Acumulado 7.517.065.000	488.537.128	-	488.537.128	\$ 89.754.084	2018	553.276.197
					2019	18.695.057.390
					Total	19.258.327.587

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ULTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

VIGENCIA		VIGENCIA	
Desde	Hasta	Desde	Hasta
6-jul-18	23-sep-19	6-jul-18	23-sep-19
Responsabilidad Civil Extracontractual		Seguro	
Otros		Responsabilidad Civil Extracontractual	

VIGENCIA		VIGENCIA	
Desde	Hasta	Desde	Hasta
6-jul-18	23-sep-19	6-jul-18	23-sep-19
Responsabilidad Civil Extracontractual		Seguro	
Otros		Responsabilidad Civil Extracontractual	

Documento v fecha de aprobación última garantía v seguros: 31/08/2018

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción al aplicarla)

N/A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

1. Consorcio Vías del Tolima programó avanzar en las actividades de obra que representen un costo de \$ 7.517.065.000 que corresponden al 39,21% del valor de las obras, frente a un avance ejecutado acumulado de \$3.641.887.128 que constituyen el 18,99% del valor total del contrato incluido adicional. Así las cosas, a corte de 30 de junio de 2019 el Proyecto presenta un atraso del 20,23% del valor de las obras, es decir un valor de \$3.875.177.674.

Al respecto esta Interventoría informa que la primera semana del mes de julio solicitará a la Gobernación del Tolima aplicación de sanción al Consorcio Vías del Tolima por incumplimiento parcial en el programa de Inversiones de Obra.

Firma: J. OR

Nombre: JUAN SAMUEL ORDUZ GOMEZ

Cargo: Director de Interventoría

Matrícula No. 2350733506 CND

Original: Informes Mensuales Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Subdirección Territorial



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1 de junio al 30 de junio de 2019, a continuación, se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO: MINFRA-MIN-IN-15-FR-4

VERSION: 1

PÁGINA: 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCERA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

FECHA

30 (Día)

6 (Mes)

2019 (Año)

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO

CONTRATO No. 1250 DE 6 DE JULIO 2018

CONTRATISTA: VIAS DEL TOLIMA

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIOBLANCO - HERRERA

SECTOR: K0-000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

(Asociate alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA WCT 668	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA WCT 667	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA TIT 898	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA TIT 856	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA TDV437	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA SLG 021	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAJARITA CAT 420E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAJARITA CAT 420F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA KOMATSU PC200-8	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO HITACHI RC-45	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO DYNAPAC CA250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA CAT 120M	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA LINK-BELT 210X3E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA SRA489	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA WBA951	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA SJC955	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA SENCILLA SINW766	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA MITSUBISHI STC088	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA TOYOTA QH7834	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MIXER SHACOMAN WNM216	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MIXER BPN469	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MIXER NHR WNM217	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARROTAQUE SYK782	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA ZAXIS 200	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACION= R, INACTIVO= I.

Firma: 

Nombre: ARQUIMEDES BERNAL

Residente de Obra: 

Matrícula No.: 15728108223 BYC

Firma: 

Nombre: URIEL MARTINEZ S

Residente de Interventoria

Matrícula No.: 25202-73178 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
 Copias: Interventor, Dirección Territorial



**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL - TOLIMA**



INFORME MENSUAL No. 11
Contrato de Interventoría No. 0912 de 2018

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1 de junio al 30 de junio de 2019, a continuación se presenta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 donde se relaciona el personal en obra utilizado.

DAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

8 DEL INFORME:	<u>JUNIO</u>	CONTRATO DE OBRA NO. <u>1250 DE 6 DE JULIO 2018</u>	CARRETERA Y/O PROYECTO: <u>RIO BLANCO - HERRERA</u>
ENTRATISTA:	<u>CONSORCIO VIAS DEL TOLEMA</u>		SECTOR: <u>K0+000 AL K3+665 Y DEL K3+692 AL K7+928</u>

NÚMERO DE INTERVENCIÓN No.		09.12 DE 2018		INTERVENCIÓN: CODIPRO INGENIERIA LTDA.		DÍAS DEL MES																														
NOMBRE		CARGO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DRO ARQUIMEDES BERNAL GONZALEZ		INGENIERO RESIDENTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
CAGUI PEREZ JULIAN RICARDO		AUXILIAR DE INGENIERIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROLAY DEL PILAR GORDILLO		PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LIX ANDRES ANGULO PICO		TOPOGRAFO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
BINSON RUBIO REINOSO		CONTROLADOR DE VIAJES		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ILSON ENRIQUE APARICIO VILLAMIL		OPERADOR DE PAJARITA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
MANDO BUSTAMANTE MORALES		AUXILIAR DE TOPOGRAFIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SAR TARAZONA PEREZ		CADENERO PRIMERO		X																																
CAR VASQUEZ NIETO		AUXILIAR DE TOPOGRAFIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SE LEONARDO ESPINOSA MAYORQUIN		OFICIAL DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
IBEY RUBIO RUBIO		CONDUCTOR DE VOLQUETA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
MAR RUBIO VALENCIA		CONDUCTOR DE VOLQUETA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ALEXANDER SANCHEZ RINCON		VOLQUETERO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
FERRERA GOMEZ		MAESTRO DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
PEPE HERRERA GOMEZ		MAESTRO DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANCHEZ SANCHEZ		VOLQUETERO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
WILLY ALADINO URBANO BRAVO		OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
NESTO YOSSA CAMPOS		VOLQUETERO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
OLFO MORA ORDOÑEZ		VOLQUETERO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JE DIMAS BLANDON		CONTROLADOR VIAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
IAEL ANTONIO PARRA GARCIA		CONTROLADOR VIAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
IHAN ESTRADA DIAZ		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JINOSA MAYORQUIN JESUS ALBERTO		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
EVARA HENAO YILBER		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SURIEL CRUZ NAVAS		OPERADOR PAJARITA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JARA LEIVA CESAR		CONDUCTOR MIXER		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Y MARCELA CORREA ANGEL		SECRETARIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
DRES FELIPE RUBIO		AUXILIAR DE LABORATORIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JITH YOJAN VASQUEZ MORENO		OPERADOR DE PAJARITA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
PERSON PRIETO CASALLAS		OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SE FABIAN VILLA CARDONA		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JUS ARBENZ HERRERA GOMEZ		OFICIAL DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JGE ELIECER GONZALEZ BABATIBA		INSPECTOR DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JAR HERNAN OSORIO CASTAÑEDA		CONDUCTOR DE TURBO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
EL AURELIO JARAMILLO		MECANICO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SERP MOSQUERA DEVA		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JAN ORTIZ GOMEZ		VIGILANTE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
KA TATIANA MENDEZ		INGENIERA SOCIO AMBIENTAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JEY ALEXANDER ARMERO MACIAS		OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LIAM LOPEZ MARTINEZ		AYUDANTE PLANTA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JLOS ANDRES PINEDA MARIN		AYUDANTE PLANTA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
R ANDRES DIAZ VARGAS		AYUDANTE PLANTA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
STIAN ALFONSO VELASQUEZ		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JANA MARCELA DIAZ MARIN		CONTROLADORA VIAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JARA DIAZ CUENCA		CONTROLADORA VIAL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JNATAN TIQUE HERNANDEZ		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JN MOSQUERA CELIS		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JARD LOPEZ MORALES		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JIERRE MANUEL MARTELO PION		OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JER FAVIO CORAL AZA		OPERADOR DE PLANTA CONCRETO												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
JGUILAR ROMERO		VOLQUETERO												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
JANEY MARIN MORALES		VOLQUETERO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JNARDIO MARQUEZ MARTIN		CONDUCTOR DE MIXER								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JNOLFO CESPEDES ATENCIO		OPERADOR DE MINICARGADOR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JAL EMERQUEZ DIAZ		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
NARDO ACEVEDO FERNANDEZ		CONDUCTOR DE CARRO TANQUE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
N ALEXIS GUAN BENARITE		AUXILIAR DE LABORATORIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LOS MAURICIO WERSARA GALLEGO		PLANTERO																																		
E HAROLD MESA CASTILLO		CONDUCTOR MIXER		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JN ANTHIDIO CARVAJAL PORTILLA		OPERADOR DE MOTONIVELADORA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
J DIEGO HERRERA SIERRA		AYUDANTE DE OBRA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ACIO MORA		VOLQUETERO																																		
NER HUMBERTO VARGAS		AYUDANTE PLANTA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					

A: Responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 c) Pagar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: ARQUIMEDES BERNAL
Residente de Obra
Matrícula No.: 15228108228 BYC

Firma
Nombre: URIEL MARTINEZ S
Residente de Intervención
Matrícula No 25202-73178 CND

ffil: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa).
ss: Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	APORTES VOLUNTARIOS			TOTAL APORTES A PAGAR						TOTALES		
			Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
20001	20001-POVENIR		1	\$ 185.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 185.200	\$ 800	\$ 186.000		

[illegible][illegible]

TOTAL INGRESOS A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO				MEDIA	\$ 84.100
COST-CAFAM			2	APOYTES	\$ 94.100
USP*					\$ 84.100
TOTAL PFC					\$ 900
					VALOR PAGADO \$ 94.800

[illegible]

TOTAL	\$ 520.000
--------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NIT: 900000000-1		NÚMERO PLANILLA: 7732356168	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTÁ - DISTRITO DE BOGOTÁ		PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	
DIRECCIÓN MUNICIPIO: CL 84 132 OF 607 TELEFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	
TIPO APORTANTE: APORTANTE DONATIVO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 20190814 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20190814	
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE DONATIVO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	
NIT: 900000000-1		MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTÁ - DISTRITO DE BOGOTÁ		MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	
DIRECCIÓN MUNICIPIO: CL 84 132 OF 607 TELEFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	
TIPO APORTANTE: APORTANTE DONATIVO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE DONATIVO PAGO APORTES SALUD, SENIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2019	

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	LIQUIDACIÓN	UPC	MORA	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230001	230001-PORVENIR	230001-PORVENIR	3	\$ 397.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.500	\$ 0	\$ 397.500
230002	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	230002-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	5	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.000	\$ 0	\$ 1.091.000
230003	230003-COL FONDOS	230003-COL FONDOS	6	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.900	\$ 0	\$ 1.323.900
SUBTOTAL:												\$ 3.812.400

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO				DATOS GENERALES DE LA EMPRESA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	TIPO IDENTIFICACIÓN:	NTI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	TRANSACCION	NÚMERO PLANILLA:	7722255169	TIPO DE PLANILLA:	EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	Ciudad/Municipio:	JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ	FECHA DE EMISIÓN:	mayo AÑO	PERÍODO CITACIÓN SALUD:	2019
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	20190614	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	45775281
TIPO APORTANTE:	TIPO APORTANTE:	CL 84 15 32 OF 307 TELEFONO:	8215920	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			
EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 250 CITIZANES	B-MENOS DE 250 CITIZANES				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	FORMA DE PRESENTACIÓN:	PERSONAS NATURALES sin Actividad Económica	PERSONAS NATURALES sin Actividad Económica				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E CSBF (REFORMA TRIBUTARIA):	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E CSBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI				

[illegible]

2019/06/17 7:54 PM USUARIO: SOI CC79946569



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E (CBF) (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BAGUE DEPARTAMENTO: CALLE 100 8 A 55 TORRE C OFICINA 401 TELÉFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: UNICO		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FESATVICO (aaaa/mm/dd): B MENOS DE 200 COTIZANTES Contribución de otras cosas de Ingeniería Civil.		MAYO AÑO MAYO AÑO MAYO AÑO		MAYO AÑO MAYO AÑO MAYO AÑO		MAYO AÑO MAYO AÑO MAYO AÑO	
NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FESATVICO (aaaa/mm/dd): B MENOS DE 200 COTIZANTES Contribución de otras cosas de Ingeniería Civil.		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FESATVICO (aaaa/mm/dd): B MENOS DE 200 COTIZANTES Contribución de otras cosas de Ingeniería Civil.		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FESATVICO (aaaa/mm/dd): B MENOS DE 200 COTIZANTES Contribución de otras cosas de Ingeniería Civil.		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FESATVICO (aaaa/mm/dd): B MENOS DE 200 COTIZANTES Contribución de otras cosas de Ingeniería Civil.		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FESATVICO (aaaa/mm/dd): B MENOS DE 200 COTIZANTES Contribución de otras cosas de Ingeniería Civil.		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: FESATVICO (aaaa/mm/dd): B MENOS DE 200 COTIZANTES Contribución de otras cosas de Ingeniería Civil.	

APORTES VOLUNTARIOS										TOTAL APORTES VOLUNTARIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR
230301	CCSS	PORTAVENIR	10	2	\$ 1,583,200	\$ 0	\$ 1,583,200	\$ 0	\$ 1,583,200	\$ 0	\$ 1,583,200	\$ 0	\$ 1,583,200	\$ 0	\$ 1,583,200	\$ 0	\$ 1,583,200	\$ 0	\$ 1,583,200
230301	CCSS	PROTECCIÓN (INC-PROTEC)	2	2	\$ 248,800	\$ 0	\$ 248,800	\$ 0	\$ 248,800	\$ 0	\$ 248,800	\$ 0	\$ 248,800	\$ 0	\$ 248,800	\$ 0	\$ 248,800	\$ 0	\$ 248,800
25-14	CCSS	COLPENSIONES	1	1	\$ 261,600	\$ 0	\$ 261,600	\$ 0	\$ 261,600	\$ 0	\$ 261,600	\$ 0	\$ 261,600	\$ 0	\$ 261,600	\$ 0	\$ 261,600	\$ 0	\$ 261,600
231001	CCSS	COLFONDOS	2	2	\$ 474,200	\$ 0	\$ 474,200	\$ 0	\$ 474,200	\$ 0	\$ 474,200	\$ 0	\$ 474,200	\$ 0	\$ 474,200	\$ 0	\$ 474,200	\$ 0	\$ 474,200
SUB-TOTALES:										\$ 2,568,800									

APORTES OBLIGATORIOS										TOTAL APORTES OBLIGATORIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR
CF555	CCSS	CAJACOPRI ATLANTICO	1	1	\$ 107,200	\$ 0	\$ 107,200	\$ 0	\$ 107,200	\$ 0	\$ 107,200	\$ 0	\$ 107,200	\$ 0	\$ 107,200	\$ 0	\$ 107,200	\$ 0	\$ 107,200
EP5002	CCSS	SALUD TOTAL	4	4	\$ 497,700	\$ 0	\$ 497,700	\$ 0	\$ 497,700	\$ 0	\$ 497,700	\$ 0	\$ 497,700	\$ 0	\$ 497,700	\$ 0	\$ 497,700	\$ 0	\$ 497,700
EP5017	CCSS	FAMISANAR	1	1	\$ 496,800	\$ 0	\$ 496,800	\$ 0	\$ 496,800	\$ 0	\$ 496,800	\$ 0	\$ 496,800	\$ 0	\$ 496,800	\$ 0	\$ 496,800	\$ 0	\$ 496,800
EP5031	CCSS	ECOPISOS EPS	1	1	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000	\$ 0	\$ 140,000
EP5032	CCSS	ANUEVA EPS	2	2	\$ 399,700	\$ 0	\$ 399,700	\$ 0	\$ 399,700	\$ 0	\$ 399,700	\$ 0	\$ 399,700	\$ 0	\$ 399,700	\$ 0	\$ 399,700	\$ 0	\$ 399,700
EP5044	CCSS	MEDINAS	2	2	\$ 298,900	\$ 0	\$ 298,900	\$ 0	\$ 298,900	\$ 0	\$ 298,900	\$ 0	\$ 298,900	\$ 0	\$ 298,900	\$ 0	\$ 298,900	\$ 0	\$ 298,900
SUB-TOTALES:										\$ 2,097,100									

APORTES OBLIGATORIOS										TOTAL APORTES OBLIGATORIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR
14-11	CCSS	ARL SUR	15	15	\$ 1,118,000	\$ 0	\$ 1,118,000	\$ 0	\$ 1,118,000	\$ 0	\$ 1,118,000	\$ 0	\$ 1,118,000	\$ 0	\$ 1,118,000	\$ 0	\$ 1,118,000	\$ 0	\$ 1,118,000
SUB-TOTALES:										\$ 1,118,000									

APORTES OBLIGATORIOS										TOTAL APORTES OBLIGATORIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR
CF48	CCSS	CONFATOLIMA	15	15	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300
SUB-TOTALES:										\$ 824,300									

APORTES OBLIGATORIOS										TOTAL APORTES OBLIGATORIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR
CF48	CCSS	CONFATOLIMA	15	15	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300
SUB-TOTALES:										\$ 824,300									

APORTES OBLIGATORIOS										TOTAL APORTES OBLIGATORIOS									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR
CF48	CCSS	CONFATOLIMA	15	15	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300	\$ 0	\$ 824,300
SUB-TOTALES:										\$ 824,300									

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUADRA/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT DEPARTAMENTO: CALLE TELÉFONO: TIPO APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	CONSORCIO VÍAS DEL TOLIMA TOLIMA 2200008 2200008 01 PRIVADA UNICO	801190351 CONSORCIO VÍAS DEL TOLIMA TOLIMA 2200008 2200008 01 PRIVADA UNICO	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	mayo AÑO 2019 20190614 20190614	TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	77228261261 2019 20190614	mayo AÑO 2019 20190614	MES junio AÑO MES	E-EMPLADOS 45786504

[illegible]

TOTAL	\$ 7,121.900
--------------	---------------------

