

SCS INGENIERIA S.A.S**CONTRATO 072 DE 2025**

CONTRATO LLEVAR A CABO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034 – 2025

CLIENTE:**FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER****DOCUMENTO:****072-2025-INFORME MENSUAL 4 V4****SUPERVISOR:****FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER****VERSIÓN 4****SCS INGENIERIA S.A.S****PERIODO****13 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025****EL RETIRO – COLOMBIA**

Copias de este documento han sido entregadas a:

Nombre	Dependencia	Empresa	Copias
Fondo de Desarrollo Social de El Retiro – FONDESER		Fondo de Desarrollo Social de El Retiro – FONDESER	1
Biblioteca	Archivo Proyectos	SCS INGENIERIA S.A.S	1
INTERTELCO S.A.S		INTERTELCO S.A.S	1

TABLA DE CONTROL Y REVISIÓN



Número de revisión		0	1	2	3
Responsable Elaboración:	Nombre	Santiago Muñoz			
	Firma				
Responsable Revisión:	Nombre				
	Firma				
Responsable Aprobación:	Nombre	Jorge Dairo Giraldo			
	Firma				
Fecha: 31/12/2025					

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ÁREA TÉCNICA	4
2.1 Necesidad a Satisfacer	4
2.2 Duración del Contrato	4
2.3 Descripción de Actividades Contractuales	5
2.4 Lugar de Ejecución del Contrato	5
2.5 Estado Contractual Contratista e Interventoría	6
2.5.1 Estado Contractual del Contratista	6
2.5.2 Estado Contractual de Interventoría	6
2.6 Actividades Ejecutadas	7
2.7 Registro Fotográfico	9
3. ÁREA ADMINISTRATIVA	10
3.1 Actas de Comité	10
3.2 Bitácora	10
4. ÁREA JURÍDICA	11
4.1 Pólizas de Cumplimiento – Contratista	11
5. ÁREA FINANCIERA	13
5.1 Acta de obra	13
5.2 Presupuesto Inicial	13
5.3 Acta de Interventoría	13
6. COMPONENTE AMBIENTAL	13
6.1 gestión ambiental	13
6.1.1 Programa para el Manejo de los Residuos Sólidos	13

6.1.2 Programa de Uso y Almacenamiento Adecuado de Materiales de Construcción	13
7. COMPONENTE SST.....	13
7.1 Personal de Interventoría de Obra.....	13
7.1.1 Personal Administrativo de Interventoría	13
7.2 Alcance	13
7.3 Definiciones.....	13
7.4 Personal en Obra.....	13
7.4.1 Personal Administrativo de Obra	13
8. Anexos	13

1. INTRODUCCIÓN

En virtud del contrato N° 072 de 2025, cuyo objeto corresponde a **CONTRATO LLEVAR A CABO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034 – 2025** suscrito entre el **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER**, y la empresa **SCS INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT **901.155.456-9** y representada legalmente por el señor **DAVID ESTRADA GARCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.010.138.464**; y del contrato N° 064 de 2025, cuyo objeto corresponde a **EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025**; el presente documento constituye el informe técnico, administrativo, financiero, ambiental y social, producto de la ejecución del proyecto relacionado anteriormente, convenido entre el **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER** y la empresa **INTERTELCO S.A.S.**, identificada con NIT 900382516-1 y representada legalmente por **CLAUDIA CRISTINA BOTERO SUAREZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. **42.828.402**, cuyo alcance se resume en las siguientes actividades:

Obras civiles, eléctricas, metalmecánica y demás actividades técnicas para el diseño e implementación de los sistemas electrónicos para los nueve puntos estratégicos de cámaras en los siguientes puntos de reconocimiento automático de placas de matrículas (LPR):

- LPR Alto del Escobero
- LPR El Chuscal
- LPR Lejos del Nido
- LPR Cementerio
- LPR Pista de Motocross
- LPR Casas viejas
- LPR Alto de la Guija
- LPR El Tablero
- LPR Carrizales

Además, en tres puntos estratégicos se realiza la instalación de cabezote AMU LITE que incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, cámara PTZ y cámara fija que hacen que los espacios públicos sean más seguros.

El presente informe corresponde al resumen de las actividades realizadas en el desarrollo del contrato, que comprenden las actividades preliminares de obras civiles, metalmecánica, obras eléctricas e instalación de tecnología.

2. ÁREA TÉCNICA

2.1 Necesidad a Satisfacer

El contrato de interventoría 072-2025 y el de obra 064-2025, suscrito entre la SCS INGENIERIA S.A.S e INTERTELCO S.A.S, respectivamente; y el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER, pretende llevar a cabo el **FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025.**

Para la ejecución de estos contratos, se inicia con la medición a nivel de los dos anclajes a lado y lado de la vía en conjunto con la longitud del ancho de la vía para realizar las obras civiles y sus respectivos acabados, una vez hechas las obras, se toman las medidas de ancho de vía de

cada punto para el diseño e instalación de los postes y cerchas para la integración de los pórticos y posteriormente hacer todo el montaje de la tecnología con sus correctas conexiones.

2.2 Duración del Contrato

A partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las pólizas de garantías únicas del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 sin superar la fecha de terminación del contrato.

2.3 Descripción de Actividades Contractuales

En esta tabla se evidencia todos los ítems que serán ejecutados hasta la finalización del contrato equivalente a todas las cantidades que se cotizan en el contrato

CONDICIONES CONTRACTUALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.
1,0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00
2,0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00
3,0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00
4,0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	14,00
5,0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00
6,0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00
7,0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00
8,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00
9,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00
10,0	Desmonte de Controlador y Cámara	und	4,00
11,0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	1,00
12,0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autosoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, muflas, pigtail.	m	1000,00
13,0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	3,00
14,0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00

Tabla 1. Descripción de actividades contractuales

2.4 Lugar de Ejecución del Contrato

Las obras se desarrollan en diferentes puntos rurales del municipio de El Retiro y un punto se ejecuta dentro del casco urbano. Hasta la fecha de cierre del presente informe, se tienen nueve puntos intervenidos con obras civiles, eléctricas y diseño de los postes y cerchas para la integración de los nueve pórticos como se describe en la tabla 1 y se ha ido ejecutando la instalación de todas las cámaras LPR con sus componentes electrónicos y todas sus conexiones para cada punto con sus pruebas técnicas.

2.5 Estado Contractual Contratista e Interventoría

El 13 de agosto de 2025, se firma el acta de inicio del contrato de interventoría N° 072-2025, ejecutado por la empresa SCS INGENIERIA S.A.S y del contrato de obra N° 064-2025 ejecutado por la empresa INTERTELCO S.A.S; ambos suscritos con el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER.

2.5.1 Estado Contractual del Contratista

- El contrato se encuentra debidamente legalizado conforme al acta de inicio
- A la fecha no se le han adelantado procesos sancionatorios de incumplimiento o multas
- El contrato se encuentra activo desde el pasado 13-08-2025, fecha en que se firmó el acta de inicio.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL – CONTRATISTA	
CONTRATO No:	C.O. 064-2025
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025
CONTRATISTA:	INTERTELCO S.A.S.
NIT CONTRATISTA:	900.382516-1
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER
INTERVENTOR:	SCS INGENIERIA S.A.S
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL:	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L (\$ 2185.518.766)
FECHA DE INICIO:	13-08-2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31-12-2025

Tabla 2. Información contractual del contratista

2.5.2 Estado Contractual de Interventoría

- El contrato se encuentra debidamente legalizado y con todas y cada una de las garantías contractuales actualizadas conforme el acta de inicio.
- A la fecha no se le han adelantado procesos sancionatorios de incumplimiento o multas.
- Se encuentra al día en las obligaciones laborales.
- El contrato se encuentra activo desde el pasado 13-08-2025, fecha en que se firmó el acta de inicio.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL – INTERVENTORÍA	
CONTRATO No:	C.I. 072-2025
OBJETO:	LLEVAR A CABO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034 – 2025
NIT INTERVENTOR:	901.155.456-9
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (\$148.725.693,00)
FECHA DE INICIO:	13-08-2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31-12-2025

Tabla 3. Información contractual de la interventoría

2.6 Actividades Ejecutadas

Hasta la fecha 27-12-2025 se culmina con todas las actividades contractuales de toda la instalación de los sistemas tecnológicos de seguridad, como las cámaras y sistemas de monitoreo, además de la puesta en funcionamiento de estos sistemas para asegurar su operatividad junto con capacitaciones al personal del centro de monitoreo, desde entonces cumpliendo con todas las cantidades de las condiciones contractuales que se evidencian en la tabla 4.

- **Componente Técnico:**

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.
------	-----------------------	-----	-------

1,0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00
2,0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00
3,0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	10,00
4,0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	5,00
5,0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00
6,0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00
7,0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00
10,0	Desmonte de Controlador y Cámara		
11,0	Reubicación de Controlador y Cámara		
12,0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autosoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, muflas, pigtail.	1.000,00	
13,0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.		

Tabla 4. Actividades ejecutadas

2.7 Registro Fotográfico

Evidencia del estado actual de las actividades realizadas y el avance total del proyecto en todos los puntos de los sistemas tecnológicos de Cámaras LPR y cámaras de monitoreo , como se evidencia a continuación:

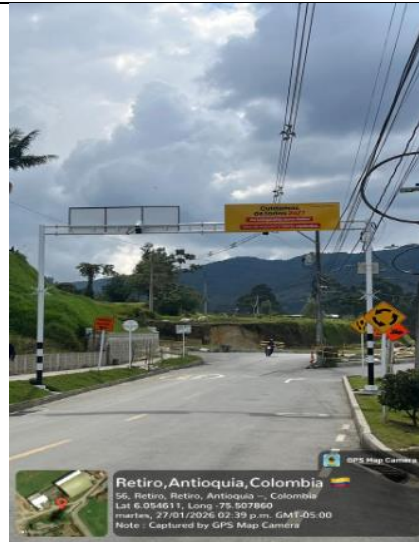
AMU Lite - Cámaras LPR /Alto del Escobero



Carrizales



Sector Vereda el Carmen



Lejos del Nido



Vereda el Chuscal



Pista de motocross



Casas Viejas



Alto de la Guija



El Tablero



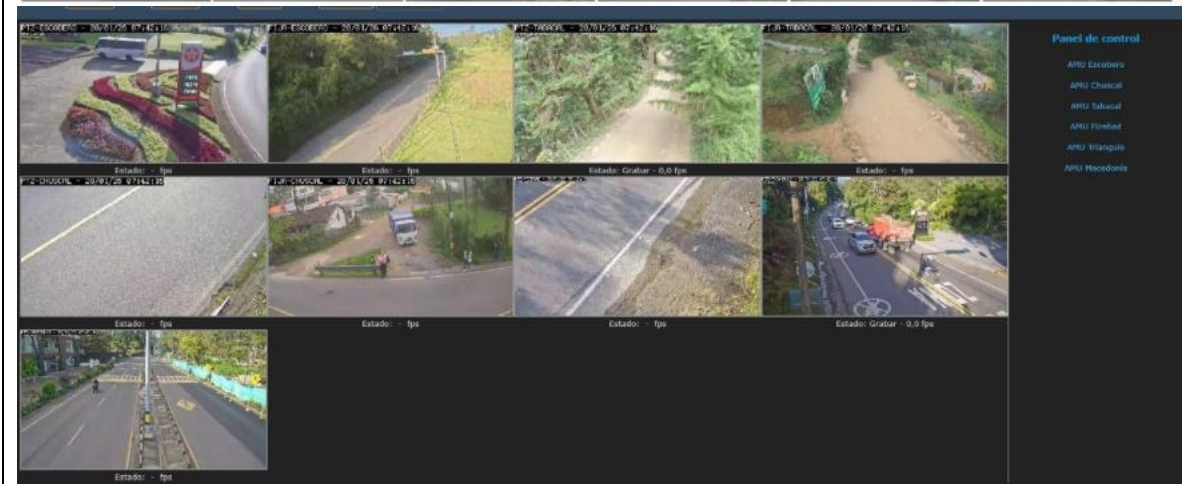
Pantalla Outdoor Mall Macedonia



AMU Lite Chuscal / Partidas Tabacal



Plataformas en Funcionamiento



neural Labs

Estado de conexión en tiempo real 🇪🇸 Español

Admin
 5.5.1.23

Últimos registros

Seleccionar Fechas: 28/1/2026 12:00:00 a.m. - 28/1/2026 11:39:59 p.m. 🔍 Gestionar consultas

Filtros extra

🔍 Buscar
🔄 Restablecer filtros
🛑 Deshabilitar tiempo real
🕒 Detalle tiempo real
📊 Seleccionar columnas
🔄 Reset columnas

Cámara	Fecha	Matrícula	Imagen	Fiducial	Altura caracter	País	Clase	Marca	Modelo
MACEDONIA LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:39	J2D129		96,70	40,33	Colombia	Coche	MAZDA	CR-5
EL TRIANGULO LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:31	2XQ813		96,25	29,67	Colombia	Coche	FORD	ESCAPE
CHUSCAL LPR ENTRADA	28/01/2026 07:52:05	DJ886		90,21	23,20	Colombia	Moto	?	Desconocido
ESCOBERO LPR SALIDA	28/01/2026 07:52:04	LKW502		99,90	35,17	Colombia	Coche	TOYOTA	COROLL
LEJOS DEL NIDO LPR SALIDA	28/01/2026 07:52:14	GF07H		97,52	21,50	Colombia	Moto	?	Desconocido
CARRISALES LPR SALIDA	28/01/2026 07:49:28	VVV594		83,37	45,50	Colombia	Camión	?	Desconocido
FIEZBAD LPR ENTRADA	28/01/2026 07:52:30	QHU02H		96,28	22,00	Colombia	Moto	?	Desconocido
EL TRIANGULO LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:29	FQU191		98,26	25,33	Colombia	Coche	FMT	PAJAO
EL TRIANGULO LPR ENTRADA	28/01/2026 07:51:39	KR0234		99,90	30,50	Colombia	Coche	HONDA	HR-V

3. ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 Actas de Comité

En el primer comité técnico de obra, realizado el 20 de agosto de 2025, se acuerdan los comités técnicos de seguimiento en cuanto al avance del proyecto, cada quince días los miércoles a partir de la fecha mencionada del primer comité. Dichas actas de reunión con su respectiva lista de asistencia se encuentran como anexo en la carpeta compartida junto con este documento.

No. De comité	Fecha	Asunto por tratar
1	20-08-2025	Definir recorrido de los puntos, anticipo y priorización
2	29-08-2025	Definición topología de fibra óptica
3	03-09-2025	Orden cronológico de los puntos a intervenir
4	18-09-2025	Avance obras civiles
5	01-10-2025	Revisión puntos de instalación
6	15-10-2025	Fabricación e integración de pórticos
7	29-10-2025	Socialización avance de obra
8	13-11-2025	Montaje de tecnología
9	27-11-2025	Conexión F.O puntos LPR
10	11-12-2025	Avance de obra
11	14-01-2026	Análisis de video software Neural Labs

3.2 Bitácora

Se evidencia copia de la bitácora como anexo en la carpeta compartida junto con este documento.

4. ÁREA JURÍDICA

En aras de dar cumplimiento a las obligaciones de la presente interventoría, de ser garante del cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo y demás obligaciones contraídas; y en pro de la responsabilidad de la presente interventoría, de documentar las causas o motivos de incumplimiento de los indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, o causas netamente imputables al contratista y con las cuales se genera un incumplimiento en el desarrollo normal de las actividades programadas; en el presente informe no se reportan incumplimientos, ni siniestros que atrasen o suspenda la obra.

4.1 Pólizas de Cumplimiento – Contratista

A continuación, se relacionan las vigencias y cuantías que cubren las pólizas expedidas para el contrato de obra.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 Date: 2026.02.24 09:36:22 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
 TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: p9Co0BC+3EQY4ThykefCZw==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1892
 VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CVA-109010220	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	369032040	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA
VIGENCIA DESDE	13/08/2025	VIGENCIA HASTA	04/02/2031	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
00:00 Horas Del	24:00 Horas Del					VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	INTERTELCO SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.382.516-1
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA ENVIGADO	TELÉFONO	5280500
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	TELÉFONO	4366620
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	TELÉFONO	4366620

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 04/02/2026. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.069 DE 2025, CUYO OBJETO ES

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA A SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025.

SE ACLARA ASEGURADO/BENEFICIARIO A EL MUNICIPIO EL RETIRO - ANTIOQUIA CON NIT: 890983674

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/05/2026	218.551.876,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTECIPLO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/01/2026	655.655.629,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/01/2029	218.551.876,60	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/07/2026	437.103.753,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/05/2026	327.827.814,90	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/02/2026	24:00 Horas Del 04/02/2031	218.551.876,60	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 2.076.242.827,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
RICAURTE ROSSO RR ASESORES DE SEGUROS CI	AGENCIAS	100,00		0,00
			DESCUENTOS	\$
			EXTRA PRIMA	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					PRIMA NETA	\$
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN		0,00
CONVENIO DE PAGO					GASTOS EXP.	\$
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/02/2026					IVA	\$
					TOTAL A PAGAR	\$
						0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
 ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Clavdia C Botero S.
 TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
 • Nacional: 01 8000 111 935
 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
 Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Hoja No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PSLA - AIFP



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	CVA-100018220	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	360032040	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	13/08/2025	24:00 Horas Del	04/02/2031		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguromundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguromundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"





Aliados



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CVA-100010220** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **INTERTELCO SAS** Asegurado o Beneficiario: **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER / FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER**, expedida por la Compañía en **24/02/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN VALLE DE ABURRA a los **24** días del mes **FEBRERO** del año **2026**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. UTILIZADO IMPRESORA SUSTENTABLE

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.seguorsmundial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



4.2 pólizas de cumplimiento - Interventoría

FECHA EXPEDICIÓN		VICENCIA DESDE			VICENCIA HASTA			TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	ANO	DÍA	MES	ANO	DÍA	MES	ANO	
02	03	2026	13	08	2025	04	02	2031	ANEXO DE PRORROGA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.	SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY	COD.SUC 21	Nº PÓLIZA 21-44-101477158	ANEXO 3
---	------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
 IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.456-9
 DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 2658469

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
 IDENTIFICACIÓN NIT: 900.198.194-5
 DIRECCIÓN: CALLE 20 NO. 20-26 PARQUE PRINCIPAL CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA TELÉFONO 4366620

OBJETO DEL SEGURO
 CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034- 2023.
 NOTA: ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO -FONDESER- IDENTIFICADO CON EL NIT 900.198.194-5 Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIOQUIA IDENTIFICADO CON NIT 890.983.674-9.

AMPAROS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2025	04/06/2026	\$14,872,569.30	\$14,872,569.30
CALIDAD DEL SERVICIO	02/01/2026	02/01/2031	\$22,308,853.95	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/08/2025	04/02/2029	\$14,872,569.30	\$14,872,569.30

ACLARACIONES
 POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA POLIZA SEGUN ACTA FINAL DE FECHA 04/02/2026.
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,067.00	\$ *****4,000.00	\$ *****2,292.00	\$ *****14,360.00	\$ *****52,053,992.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLGA MARGOTH SILVA SILVA	132994	100.00			




QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
 21-44-101477158

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-4019330 DLF132994A 1

 NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015						
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101477158	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 03 2026	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 13 08 2025	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2031	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA			
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.456-9		
DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202				CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 2658469		
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO								
ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO						IDENTIFICACIÓN NIT: 900.198.194-5		
DIRECCIÓN: CALLE 20 N° 20-26 PARQUE PRINCIPAL				CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 4306620		
ADICIONAL: TEXTO ACLARATORIO								
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.								
 21-44-101477158 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas				 FIRMA TOMADOR				
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA						DL132894A 2		



**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101477158, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTÁ, D.C. a los 02 días del mes de MARZO de 2026

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

5. ÁREA FINANCIERA

5.1 Acta de obra

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA No.4	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00	\$ 74.637.460	\$ 223.912.380		\$ 0
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00	\$ 102.380.550	\$ 921.424.950	0,60	\$ 61.428.330
Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00	\$ 5.644.900	\$ 101.608.200		\$ 0
Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	14,00	\$ 1.371.230	\$ 19.197.220		\$ 0
Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$ 1.875.380	\$ 16.878.420	0,30	\$ 562.614
Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$ 2.796.390	\$ 25.167.510	1,00	\$ 2.796.390
Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00	\$ 25.372.610	\$ 228.353.490	0,80	\$ 20.298.088
Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00	\$ 2.228.250	\$ 31.195.500	14,00	\$ 31.195.500
Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00	\$ 1.999.710	\$ 7.998.840	4,00	\$ 7.998.840
Desmante de Controlador y Cámara	und	4,00	\$ 274.240	\$ 1.096.960	2,00	\$ 548.480
Reubicación de Controlador y Cámara	und	1,00	\$ 342.800	\$ 342.800	-	\$ 0
Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasdores, tensores, enfrentadores, muflas, pigtail.	m	857,00	\$ 48.720	\$ 41.753.040		\$ 0
Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	3,00	\$ 20.797.000	\$ 62.391.000	0,40	\$ 8.318.800
Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00	\$ 39.560.608	\$ 39.560.608	1,00	\$ 39.560.608

OBRA EXTRA							
Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	m		\$ 28.495		213,00	\$ 6.069.435	
COSTO TOTAL MEJORAMIENTO						\$ 178.777.085	

COSTO DIRECTO		\$ 1.720.880.918	COSTO DIRECTO	\$ 178.777.085
A	22%	\$ 378.593.802	22%	\$ 39.330.959
U	5%	\$ 86.044.046	5%	\$ 8.938.854
TOTAL OBRA		\$ 2.185.518.766	TOTAL ACTA No. 4	\$ 227.046.898
			AMORTIZACIÓN	\$ 68.115.073
			VALOR ACTA No. 4	\$ 158.931.825

Tabla 5. Balance financiero de obra

Durante el periodo correspondiente a la fecha de corte del presente informe se presenta un avance en el cronograma del 64% correspondiente al tiempo contractual, cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato 064-2025.

5.2 Presupuesto Inicial

Contratista: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L (\$ 2185.518.766)

Interventoría: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L (\$148.725.693,00)

Forma de Pago

EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER pagará el valor del objeto contractual de interventoría, así:

- (...) El valor del contrato se cancelará por medio de actas parciales de avance, previa radicación de factura electrónica, informe de actividades, bitácora, acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social y recibido a satisfacción por parte de la interventoría o supervisión.

El FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER pagará el valor del objeto contractual de obra, así:

- El valor del contrato se cancelará por medio de actas parciales de avance, previa radicación de factura electrónica, informe de actividades, bitácora, acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social y recibido a satisfacción por parte de la interventoría o supervisión.

5.3 Acta de Interventoría

Condiciones Contractuales				Acta Final # 4		Acumulado		Saldo por ejecutar	
Ítem	Descripción	Unidad	Valor contrato (\$)	Cantidad	Valor (\$)	Cantidad	Valor (\$)	Cantidad	Valor (\$)
1	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para la ampliación y optimización.	1	124.979.574,00	10,42 %	13.018.059,04	100,00 %	124.979.382,54	0,00 %	191,46
	SUBTOTAL		124.979.574,00		13.018.059,04		124.979.382,54		191,46
	IVA 19%		23.746.119,00		2.473.431,22		23.746.082,68		36,38
	TOTAL		148.725.693,00		15.491.490,26		148.725.465,22		227,84



	<p style="text-align: center;">Informe mensual de Interventoría</p>	 <p style="font-size: small;">SCS INGENIERÍA S.A.S NIT. 901.155.654-9 (300) 204.3710 - (4) 301.79.19 Cr 63C N° 42-24 - Medellín edmon.scsingenieria@gmail.com</p>
---	---	--

Tabla 6. Balance financiero interventoría

6. COMPONENTE AMBIENTAL

6.1 gestión ambiental

El presente informe de actividades ambientales relaciona la gestión ambiental de la obra para el periodo comprendido entre el 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2025.

6.1.1 Programa para el Manejo de los Residuos Sólidos

A la fecha de corte del presente informe no se realizaron actividades correspondientes al manejo de sólidos ya que no se realizaron demoliciones en los tramos que se encuentran en ejecución, pero es de vital importancia aclarar que, para el manejo de los residuos sólidos en la obra, se contará con un punto de disposición en cada uno de los frentes. Estos residuos obedecen a las remociones de tierra u otras actividades que generen escombros, necesarias para llevar a cabo el objeto contractual. Ellos se dispondrán correctamente en las escombreras certificadas.

6.1.2 Programa de Uso y Almacenamiento Adecuado de Materiales de Construcción

Para el presente periodo se generaron algunos residuos provenientes de las excavaciones y construcciones, los cuales, en su temporada de acopio, se mantuvieron con su respectivo cubrimiento y señalizados como medida de prevención, evitando que estos emanen material particulado contaminante. Estos fueron dispuestos oportuna y correctamente.

En cuanto a los materiales de construcción, también se le aplican medidas de cuidado, con el fin de preservar su calidad, como lo son cemento, arena, triturado, Acero, elementos propios de trabajo, como maquinaria, entre otros.

6.2 Conclusiones y Recomendaciones

Para el periodo reportado en general, se presentó un buen manejo ambiental inicial dentro de la obra por parte del contratista.

7. COMPONENTE SST

7.1 Personal de Interventoría de Obra

La interventoría de obra cuenta con los profesionales conforme lo establecido del equipo de trabajo mínimo requerido **“PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”**, por lo que a continuación relacionamos el equipo de trabajo de interventoría.

7.1.1 Personal Administrativo de Interventoría

CARGO	NOMBRE	PERFIL	T.P
Director de interventoría	Jorge Dairo Giraldo	Ingeniero electricista	MP. AN205-49383
Residente de interventoría	Mauricio Andrés Mesa	Ingeniero Electrónico	MP. AN206-62922
SST	Carolina Estrada Ospina	Especialista en SST	N/A

Tabla 7. Personal Interventoría

7.2 Alcance

Implicar todos los centros de trabajo de **INTERTELCO S.A.S.**, y subcontratistas, los cuales deben acatar todas las medidas ya que son de estricto cumplimiento, con el fin de contribuir a la reducción de los riesgos laborales, enmarcados en el indebido o inadecuado cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

7.3 Definiciones

Según el Ministerio de Trabajo (2019), la Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades generadas por causa o con ocasión de trabajo; de la protección y promoción de la salud mediante el autocuidado y la adopción de hábitos laborales seguros su objetivo consiste en implementar las acciones necesarias para contribuir al mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo, la preservación y promoción de la salud física y mental en los espacios laborales.

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Acción Correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción de Mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad u otras situaciones potenciales no deseables.

Amenaza: según el (Decreto 1072/2015 cap.6 Artículo 2.2.4.6.2.) es: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de 24 manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Auto-reporte de Condiciones de Trabajo y Salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el ambiente.

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones de Seguridad: Son todos los factores del proceso productivo que pueden causar daño a los trabajadores, pueden clasificarse en:

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia de este, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo.

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algún peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable.

Identificación de Peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus características. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Sistema de Gestión: Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad.

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Sitio de Trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo son realizadas bajo el control de la organización.

Valoración del Riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

7.4 Personal en Obra

Se relaciona, a continuación, los profesionales y el personal operativo que interviene en el proyecto.

7.4.1 Personal Administrativo de Obra

CARGO	NOMBRE
-------	--------

Director de obra	Nicolas Posada
Residente de obra	Jhonny Metaute
SST	Lina María Flórez Ramírez
Oficial de Obra	Juan Camilo Restrepo
Operario	Eberto Cadrazco León
Auxiliar de Obra	Jorge Luis Rodríguez
Auxiliar de Obra	José Eduardo Pérez
Auxiliar de Obra	Leomar José Riera
Conductor	León Alberto Oquendo


Tabla 8. Personal de Obra

8. Anexos

Anexo con este informe se encontrarán los siguientes documentos en la carpeta compartida:

1. Actas de comité
2. Bitácora
3. Acta de obra
4. Seguridad social personal de obra
5. Acta de interventoría
6. Seguridad social personal de interventoría
7. Pólizas de cumplimiento – contratista
8. Pólizas de cumplimiento - interventoría

Cordialmente,



Jorge Dairo Giraldo

ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



FECHA: 20 de agosto del 2025

HORA: 2:00 PM

ACTA NÚMERO:001

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 1


DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sección de anexos	<p>Descripción del evento: El motivo del acta es la definición de los puntos para cada sitio acordado según el contrato y se coordina un recorrido entre el personal de Secretaría de Gobierno, Infraestructura, supervisión, interventoría y el personal contratista de obra en los puntos para los nuevos pórticos de lectura de placas.</p> <p>Detalles específicos: El día 20 del mes 08 del 2025 en el municipio de el Retiro en la alcaldía municipal, las condiciones acordadas entre las partes; es hacer el recorrido de los puntos asignados para cada sistema para el día lunes 25 y día martes 26 del mes de agosto. Uno de los puntos destacados a visitar por necesidad por parte del municipio es el punto del Tablero, además la reubicación de ciertas cámaras ya instaladas, también se habla para el punto del Descanso la instalación conexión satelital y la definición de fibra óptica para los puntos requeridos.</p>	<p>Una vez que se realicen los recorridos programados para cada punto, se ordena programar una reunión presencial cada quince días los miércoles a las 2 de la tarde, además se habla de fomentar una capacitación en el centro de monitoreo para el conocimiento y control de las señales de alerta en tiempo real en caso de alguna emergencia.</p> <p>Se entrega la documentación del plan de inversión de anticipo a la entidad Fondeser.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Recorrido	Sec. Infraestructura, Fondeser, Inter-telco, Sec. Gobierno, Interventoría	25/08/2025
Priorización	Secretaría de Gobierno	Se define después del recorrido
Anticipo	Fondeser	Por definir

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada




Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos



SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA

MIPG Versión: 02
Aprobado: 2020-01-30
Código Archivístico:
3070.19.02
Página: 1 de 1

CONCEPTO: *Contrato portación de Seguridad* FECHA: *20/ agosto/ 2025.*

TEMA: _____ HORA: _____

LUGAR: _____

No.	NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	<i>Andrés Henderson Santos</i>	<i>1017256109</i>	<i>El Retiro</i>	<i>3106462306</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Maria Camila Triguero Restrepo</i>	<i>1040197073</i>	<i>El Retiro</i>	<i>3113069736</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Ahony Mejía de Peral</i>	<i>1041176822</i>	<i>Inter-telco</i>	<i>3212690042</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Santiago Muñoz Martínez</i>	<i>1040048804</i>	<i>Interventoría</i>	<i>3128855447</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Lisa F. Laydora Ramirez</i>	<i>1040.045.265</i>	<i>Fondestel</i>	<i>3009288105</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Wagn Munera</i>	<i>71603140</i>	<i>60811110</i>	<i>3207010076</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Nicolás Posada</i>	<i>1010193756</i>	<i>Inter-telco</i>	<i>3113696160</i>	<i>[Signature]</i>
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ELABORO: _____
REVISO: _____
FECHA: _____

Calle 20 No. 20-40 Parque Principal
El Retiro - Antioquia - Colombia

Línea de Atención: (4) 402 5450
www.elretiro.gov.co

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



FECHA: 29 de agosto del 2025

HORA: 11:00 AM

ACTA N.º 002 de 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial Sala de juntas alcaldía el Retiro

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Reunión definición de fibra óptica


DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Nicolas Posada – Intertelco Jhony Metaute – Intertelco Santiago Muñoz – Interventoría Weimar – Smart Wilson Giraldo – TI Alcaldía	<p>Descripción del evento: El objetivo de la reunión fue definir los puntos de instalación de la infraestructura de fibra óptica para el sistema de seguridad del municipio de El Retiro, dirigida a la empresa Smart encargada de la topología de la fibra óptica en el municipio. La reunión destaca los acuerdos necesarios para aclarar la disponibilidad de la fibra óptica conforme cada punto lo requiera. Por parte de la empresa Smart se deja claro cuales son las distribuciones de la fibra óptica en todo el perímetro del municipio para así tener mas claridad en como va a ser ejecutado el proyecto conforme al cronograma.</p> <p>Detalles específicos: El día 29 del mes 08 del 2025 en la sala de juntas de la alcaldía municipal de el Retiro se habla el tema necesario respecto a la fibra óptica, además de la viabilidad técnica que toda esta tecnología requiere, desde las conexiones y las derivaciones a los puntos donde serán instaladas las cámaras de seguridad.</p>	<p>Una vez realizado el análisis detallado de cada uno de los puntos proyectados en pantalla, se llevó a cabo una discusión técnica orientada a identificar los requerimientos necesarios en relación con la infraestructura existente de fibra óptica. En este proceso, se evaluó la capacidad de la red actual, las posibilidades de derivación y ampliación, así como las condiciones de accesibilidad en cada sitio específico. El objetivo central fue garantizar que la infraestructura pueda soportar de manera eficiente las futuras conexiones de las cámaras LPR (Lectura de Placas), asegurando estabilidad en la transmisión de datos, continuidad del servicio y cobertura adecuada en las zonas críticas del municipio. Además, se plantearon las necesidades de adecuaciones técnicas, ajustes en la distribución de la fibra y posibles refuerzos en puntos estratégicos.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Acuerdos con punto control en la conexión de fibra óptica	Intertelco	En proceso
Intervención de posibles podas	Intertelco, Secretaría de Gobierno	Por definir
Reunión de comité	Sec. Infraestructura, Fondeser, Intertelco, Sec. Gobierno, Interventoría	03/09/2025

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada



Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



FECHA: 03 de septiembre del 2025

HORA: 2:00 PM

ACTA N.º 003 de 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 3

DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sección de anexos	<p>En el municipio del Retiro, se reunieron los integrantes de Intertelco, Fondeser, Dependencia de infraestructura, Seguridad e interventoría con el fin de tratar los temas relacionados con el proyecto de instalación de cámaras LPR y sistemas AMU LITE.</p> <p>Durante la sesión se definió el orden de los nueve puntos en los que se llevará a cabo la instalación de los equipos.</p> <p>Asimismo, iniciar con las obras civiles para cada punto que comprenden excavaciones de un metro cúbico a lado y lado de la vía, así como el vaciado en concreto de los anclajes donde se ubicarán los pórticos.</p> <p>De igual manera, se discutió la programación de las actividades de instalación y la coordinación técnica necesaria para su correcta ejecución</p>	<p>En el desarrollo de la reunión se dejaron consignadas varias observaciones. En primer lugar, se abordó la proyección de dos ítems a todo costo: la instalación del anclaje con platina, que incluye excavación y vaciado en concreto y la construcción de la caja de paso con tapa.</p> <p>También se hizo énfasis en la importancia de organizar el acopio del material requerido en cada punto de instalación, con el propósito de garantizar la continuidad de las labores. De igual forma, se reiteró la necesidad de implementar las medidas de seguridad y la señalización preventiva en los frentes de la obra, además de llevar un registro detallado de los avances, tanto fotográficos como escritos. Finalmente, se socializó el estado actual del proceso de adquisiciones de las cámaras LPR y de sus componentes, lo cual permitirá articular los tiempos de entrega e instalación con la programación establecida.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Adquisiciones	Inter-telco	En proceso
Obras civiles	Inter-telco	En ejecución
Registro de actividades	Interventoría	En ejecución

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada




Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos



**ALCALDÍA DE
El Retiro**

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA








MIPG Versión: 02
 Aprobado: 2020-01-30

Código Archivístico:
 3070.19.02


Página: 1 de 1



CONCEPTO: Reunión Interna
 TEMA: Definición de puntos cámaras LPR
 LUGAR: Alcaldía El Retiro

FECHA: 03/09/2025
 HORA: 2:00 Pm.

No.	NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Monny Melo de	104176475	Inter-telco	3226400	
2	Nicolás Posada	1010193756	Inter-telco	3118896160	
3	Lisa F. Gaidona Ramirez	1040045265	Fonosex	300833105	
4	Santiago Muñoz Martínez	1040048801	Interventoría	3128855447	
5	Andrés Fernando Sorels	1017256109	Infraestructura	3106462300	
6	Maria Paula Longstre Ferder	1040123073	Infraestructura	3113069736	
7	Fabian Sneider Lombro Cortes	8064463	Director de Seguridad	3016474239	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ELABORO:
 REVISO:
 FECHA:

 Calle 20 No. 20-40 Parque Principal
 El Retiro - Antioquia - Colombia

 Línea de Atención: (4) 402 5450
 www.elretiro.gov.co

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



FECHA: 18 de septiembre del 2025

HORA: 11:00 PM

ACTA N° 004

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 4


DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos	<p>El jueves diez ocho de septiembre, en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, se lleva a cabo el comité de obra con la participación de los actores responsables e interesados en el desarrollo del proyecto. Durante la reunión se socializa los avances de las actividades realizadas en las obras civiles correspondientes a la instalación de los anclajes, evidenciándose cumplimiento de los cronogramas previstos. Así mismo, se presenta la validación de la fibra óptica realizada por la empresa Punto Control, la cual confirma la disponibilidad de la infraestructura en los puntos acordados de intervención.</p>	<p>Se discute las especificaciones de los avisos reflectivos que acompañarán los puntos de instalación de cámaras LPR, abordando dimensiones, materiales y mensajes que deberán garantizar visibilidad y resistencia. Se recomienda a los actores involucrados la inclusión de mensajes de disuasión dentro del sistema de comunicación para alertar en los corredores viales, con el fin de robustecer la solución y generar un efecto preventivo mas activo.</p>
	<p>En cuanto al proceso de fabricación de los postes, se informa que este se encuentra en ejecución y la entrega está programada para finales de septiembre. Una vez realizada dicha entrega e instalación, se procede a efectuar las mediciones exactas para la fabricación e instalación de las cerchas que unirán los postes y permitirán la correcta disposición de la tecnología. También se comunica que toda la tecnología objeto del contrato ya fue entregada por el fabricante y actualmente se encuentra almacenada en bodega bajo custodia, en espera de su instalación.</p>	<p>Adicionalmente, se plantea la necesidad de realizar una capacitación integral al personal del centro de monitoreo, en la cual se presenten todas las funcionalidades de las cámaras y su adecuado uso operativo como muestra de que el conocimiento quede dentro de la organización, finalmente se deja como tema pendiente la definición del lugar donde será ubicada la pantalla outdoor, elemento que también hace parte de los ítems contemplados en el contrato.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Avance obras civiles	Intertelco	En ejecución
Verificar entrega de postes y definir medidas de cerchas	Intertelco	En ejecución
Ubicación pantalla outdoor	Sec. Gobierno, Sec. Infraestructura, Intertelco	Por definir

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada




Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz











Firma

1. Anexos





SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA

MIPG Versión: 02
Aprobado: 2020-01-30
Código Archivístico:
3070.19.02
Página: 1 de 1

CONCEPTO: Reunión comité interno		FECHA: 18/09/23			
TEMA: Avance y socialización del contrato 009		HORA: 11:00			
LUGAR: Secretaría de Gobierno					
No.	NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Fabron Londoño Cortes	8069463	CI Retiro	3016414239	
2	Jhenny Meléndez Pérez	1041176477	Inter - Telco	3212690042	
3	Nicolás Posada	1010193756	Inter - Telco	311396160	
4	Santiago Muñoz M.	51603145	Alcaldía Retiro	3207010016	
5	Andrés Rondón Saiz	1617256109	Alcaldía Retiro	3106462306	
6	Wendy Fernanda Cadena Ramírez	1040045265	Fondestel	3009385105	
7	Santiago Muñoz Martínez	1040048804	Interventoría	3128855447	
8	Manu Camila Tangarife R.	104123073	Interventoría	3115069736	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ELABORO:
REVISÓ:
FECHA:

 Calle 20 No. 20-40 Parque Principal
El Retiro - Antioquia - Colombia

 Línea de Atención: (4) 402 5450
www.elretiro.gov.co

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

FECHA: 01 de octubre del 2025

HORA: 10:00 AM

ACTA N° 005

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 5


DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos	<p>El primero de octubre de 2025 se lleva a cabo la reunión de comité de obra N° 05 con el fin de revisar los puntos de instalación de los pórticos del sistema de cámaras de seguridad, varios de los cuales ya se encontraban instalados. Durante la sesión se presenta una solicitud para una reunión el mismo día con el alcalde Santiago Montoya Giraldo para replantear uno de los puntos previamente establecidos en la zona del Tablero, vereda de El Retiro, proponiendo su reubicación en la vía Carrizales, sentido El Retiro – Medellín.</p> <p>Dado que ya se contaba con una trazabilidad detallada de los informes, avances y cronograma general del proyecto, el equipo técnico dispone de los argumentos y soportes necesarios para explicar al alcalde la planeación inicial y las decisiones tomadas desde la fase de diseño y aprobación; por lo que solo se instala uno de los dos puntos en la vereda el Tablero y el otro se replantea para ser instalado en la vía Carrizales.</p>	<p>Respecto al punto del Chuscal que se pensaba replantear para ubicarlo en otras coordenadas sobre la misma vía el Chuscal sentido La Ceja – El Retiro, se socializa con el alcalde el punto ya ejecutado y se analiza la implicación del cambio solicitado. Se explica que modificar el punto de instalación a esa altura del proyecto afectaría directamente el cronograma y generaría costos adicionales, dado que las obras civiles y la instalación de los postes del pórtico ya estaban finalizadas en el sitio siendo uno de los primeros puntos intervenidos al inicio del proyecto.</p> <p>Después del análisis en conjunto de la mesa, se concluye que mantener el punto en su ubicación original era lo mas viable técnica y administrativamente, pues realizar un cambio en esta fase podría representar un posible detrimento patrimonial al dejar obras ya ejecutadas sin uso. En consecuencia, el alcalde aceptó mantener la planificación inicial, garantizando así la continuidad del proyecto sin retrasos ni sobrecostos</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Recorrido punto carrizales	Sec. infraestructura, Intertelco, Interventoría	01/10/2025
Diseño de avisos reflectivos	Sec. Gobierno, Sec. Infraestructura	En ejecución

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada









Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos

FONDESER		FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO			INTER-TELCO	SCS
CONCEPTO:		CONTROL DE ASISTENCIA			FECHA:	
TEMA:					HORA:	
LUGAR:						
No.	NOMBRE	CÉDULA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Adán Muñoz	71605116	Subir-us	3207010016		
2	Fabian Lombardo Cortes	8064463	Dirección de Seguridad	3016414239	Seguridadelretiro.gov.co	
3	Luis F. Cardona Ramirez	1040045265	Fondeser	3008382105	obrasfondeser@gmail.com	
4	Andrés Mendonza Sants	1017256109	Infraestructura	3106462306	andres_sants@me.com	
5	Maria Constanza Tanguye R.	1041128073	Infraestructura	3113069736	mariaconstanza.tanguye@elretiro.gov.co	
6	Santiago Muñoz Marín	1010048804	Interventoría	3128855447	Interventoria.prelretiro2023@outlook.es	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



FECHA: 15 de octubre del 2025

HORA: 10:00 AM

ACTA N° 006

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 6

DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos	<p>En la reunión se aborda el tema de la fabricación de las cerchas necesarias para la integración de los pórticos de seguridad que serán instalados en los primeros cinco puntos de los nueve definidos. Se socializa la gestión de los permisos requeridos para la ejecución de las obras civiles en el sector de Carrizales, a ambos lados de la vía, dado que sin la autorización de los propietarios no es posible realizar las intervenciones correspondientes. Este punto se establece como el último punto en ejecución según las condiciones contractuales.</p> <p>Asimismo, se prioriza el avance en los diseños de los avisos reflectivos que integrarán un mensaje de seguridad en cada pórtico. El diseño del arte será elaborado por el área de comunicaciones de la Alcaldía Municipal, con previa aceptación del alcalde antes de su implementación definitiva.</p>	<p>De acuerdo con el cronograma de ejecución, se continúa con la planeación de las actividades de fabricación, obras civiles y eléctricas, aclarando que no todas las cerchas se entregan para una misma fecha sino con la disponibilidad del fabricante, y se van instalando en los puntos conforme estén a disposición para el montaje e integración de los pórticos.</p> <p>Adicionalmente, se efectúa una visita técnica al Centro de Monitoreo con el fin de conocer su infraestructura y capacidad operativa, y de esta manera definir la adaptación de una pantalla variable RGB outdoor, destinada a visualizar la información recopilada por las cámaras LPR y de seguridad, siendo este un ítem contemplado dentro de las condiciones contractuales del proyecto.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Permisos carrizales	Sec. de Infraestructura	Definido
Avisos reflectivos	Sec. De Infraestructura	En proceso
Procesos de fabricación y obra	Inter-telco	En proceso

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada



Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos

Fondeser		FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
		FONDESER		
		CONTROL DE ASISTENCIA		
CONCEPTO: Socialización avance de obra		15/10/25		
TEMA: Comité de obra		10:00 am		
LUGAR: Dep de Gobierno.				
No.	NOMBRE	CÉDULA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CELULAR
1	Maria Camila Tanguiza Restrepo	1040193073	Infraestructura	3113069736
2	Johnny Alejandro Pérez	164176925	Inter - Telco	521290047
3	César Muñoz M	21603140	Sec. Gobierno	3203010016
4	Fabian Antonio Cortes	8069463	Dirección de Seguridad Seg. Gobierno	3016974239
5	Nicolás Posada	1010193756	Inter-telco	3113696160
6	Santiago Muñoz	1040648804	Interventoría	3128855447
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

FECHA: 29 de octubre del 2025

HORA: 10:00 AM

ACTA N° 007

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 7

DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos	<p>En la reunión de comité de obra se socializa el avance general del proyecto de pórticos de cámaras LPR para la seguridad, confirmando que la ejecución se desarrolla conforme el cronograma y las condiciones contractuales, se informa la integración de toda la tecnología para su posterior montaje en cada punto junto con sus gabinetes y todas las conexiones correspondientes, además de la fabricación de las últimas cerchas para la instalación en los demás puntos pendientes.</p> <p>Se anuncia a todos los presentes el proceso de un nuevo corte de cobro Acta #2 con su respectiva acta de balance para su correspondiente cobro de obra y todas sus respectivas actividades justificadas en los informes.</p> <p>Se acuerda coordinar acompañamiento de la Inspección de Tránsito en los puntos de Chuscal y Alto de Escobero para controlar el flujo vehicular y garantizar un trabajo seguro durante las labores de instalación.</p>	<p>Para el punto Alto del Escobero está contemplado un ítem del contrato que es el retiro de tecnología existente sobre el pilar donde irá ubicado el sistema AMU LITE, el cual se ordena se pueda emitir por medio de un informe el acta de entrega de ciertos componentes.</p> <p>Así mismo se habla de la gestión y aprobación del diseño gráfico para los avisos reflectivos que serán instalados en cada pórtico; el responsable encargado debe presentar los artes para revisión y consentimiento antes de su producción.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Avisos reflectivos	Sec. De Infraestructura	En proceso
Procesos de fabricación y obra	Inter-telco	En proceso

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada




Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos

 **ALCALDÍA DE El Retiro**







SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA

MIPG Versión: 02
Aprobado: 2020-01-30
Código Archivístico: 3070.19.02
Página: 1 de 1

CONCEPTO: Socialización a unce de obra
TEMA: Comité de obra
LUGAR: Dep de Gobierno.

FECHA: 29/10/25
HORA: 10:00 am

No.	NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Nicolás Posada	1.010.193.756	Inter-telco	313696160	
2	Lisa F. Cardona Ramirez	1.040.045.265	Fondoser	3008388105	
3	Fabian Sneider Jondaro	8069463	Seg. Gobierno - Seguridad	3016974759	
4	Andrés Henkel Gante	1017256109	Infuserbrutins.	3106462300	
5	María Mercedes Pérez	1041176935	Inter-telco	3212690042	
6	Santiago Muñoz Martínez	1040048804	Interventoría	3128855447	
7	Adán Herrera M.	71602140	Gobern	3207010096	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ELABORO:
REVISÓ:
FECHA:

Calle 20 No. 20-40 Parque Principal
El Retiro - Antioquia - Colombia

Línea de Atención: (4) 402 5450
www.elretiro.gov.co

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

FECHA: 13 de noviembre del 2025

HORA: 10:00 AM

ACTA N° 008

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 8

DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos	<p>Se inicia la reunión abordando el uso estratégico de la información captada por las cámaras LPR instaladas en los diferentes puntos del municipio. Se expone la importancia de fortalecer la analítica de datos para obtener información más precisa, mejorar la capacidad de reacción ante eventos que puedan alterar el espacio público y optimizar la toma de decisiones en tiempo real.</p> <p>Se evalúan propuestas para integrar modelos analíticos más robustos y eficientes que permitan un mayor aprovechamiento de los datos generados por el sistema.</p> <p>Se presentan las facturas correspondientes a los cortes establecidos en cada acta de avance.</p> <p>Se deja claridad sobre la liquidación del contrato, indicando que el contrato se encuentra ejecutado en un 84% del valor total.</p>	<p>Se informa que los montajes tecnológicos han avanzado satisfactoriamente en los primeros pórticos donde ya se encuentran instaladas las cerchas y se aclara que aún restan tres puntos pendientes por instalar cerchas, los cuales serán intervenidos durante la presente semana, dado que se contará con la disponibilidad operativa para ejecutar dichas actividades.</p> <p>Se aborda la coordinación con la empresa Smart respecto a la configuración de la fibra óptica. Es fundamental garantizar la correcta fusión y habilitación del enlace para dejar plenamente operativo el acceso a internet en todos los puntos del sistema de pórticos y cámaras. Las partes se comprometen a realizar seguimiento constante hasta asegurar su completa funcionalidad.</p> <p>Se discute la posible ubicación de la pantalla outdoor incluida dentro de los ítems contractuales. Se sugiere como punto de instalación la entrada al municipio, en el sector Macedonia.</p> <p>Como requisito previo a su montaje, se solicita verificar la capacidad de carga de la estructura que la soportará, a fin de garantizar seguridad y cumplimiento normativo.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Avisos reflectivos	Sec. De Infraestructura	En proceso
Montaje de tecnología	Intertelco	En ejecución

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada









Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos

Fondesar		FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO			INTER-TELCO		SCS	
El Retiro		FONDESER			El aliado tecnológico		CORPORACIÓN SCS	
		CONTROL DE ASISTENCIA						
CONCEPTO: Socialización avance de obra					FECHA: 13/11/2025			
TEMA: Pórticos de seguridad					HORA: 10:00 am			
LUGAR: Secretaría de Gobierno								
No.	NOMBRE	CÉDULA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA		
1	Arnelson González Jardi	1017786109	S. Infraestructura	3106467306				
2	Mary Carolina Trujante	1040183073	Infraestructura	313069736				
3	Nicolás Posada	1010193756	Inter-telco	3113696160	nicolas.posada@inter-telco			
4	Wiss F. Cardona R	1040045265	Fondesar	3008388105	obrasfondesar@ogm.net.com			
5	Santiago Muñoz	71603140	SR. GOBIERNO	3207070076				
6	Santiago Muñoz M	1040048804	Interventoría	3128855447				
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



FECHA: 27 de noviembre del 2025

HORA: 10:00 AM

ACTA N° 009

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 9


DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
<p>Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos</p>	<p>En la fecha indicada se llevó a cabo la reunión del comité de obra con la participación de la mayoría de los actores involucrados en la ejecución del proyecto de pórticos con cámaras LPR de seguridad. El propósito central del encuentro fue socializar el avance del proyecto y verificar el cumplimiento del cronograma, así como abordar aspectos técnicos y administrativos críticos para asegurar la correcta operación del sistema una vez entre en funcionamiento.</p> <p>Durante la sesión, se revisó detalladamente el estado de las conexiones de fibra óptica previstas para cada punto de instalación de las cámaras LPR, con el objetivo de garantizar que todos los nodos cuenten con cobertura y puedan integrarse adecuadamente a la red de fibra óptica del municipio. En este contexto, se discutieron las alternativas económicas y técnicas para habilitar los tramos de fibra requeridos, analizando los costos asociados, la disponibilidad de infraestructura existente y los requerimientos de ampliación. A partir de esta discusión, se acordó gestionar con la empresa prestadora del servicio de fibra óptica un plan de priorización para asegurar que los enlaces destinados a las cámaras LPR queden conectados directamente a la topología de fibra óptica municipal, estableciendo así un diseño que evite inconsistencias o desacuerdos con futuras administraciones y preserve la integridad del proyecto como infraestructura oficial de seguridad.</p> <p>Igualmente, se trató el tema de la póliza contractual, dado que los meses hábiles del contrato culminan a finales del mes de diciembre. Con el fin de garantizar la correcta ejecución de las pruebas técnicas, las validaciones de conectividad y la verificación de operabilidad de todos los puntos de cámaras LPR, se acordó iniciar el proceso de actualización y ampliación de la póliza, de modo que la liquidación del contrato, prevista para el mes de enero, cuente con las coberturas necesarias durante la etapa final de revisión y puesta en servicio.</p>	<p>En el marco del comité, se confirmó que las cerchas correspondientes al último punto del proyecto, ubicado en el sector de Carrizales, ya se encuentran fabricadas y listas para su instalación, lo cual permitirá avanzar con el montaje del sistema de cámaras LPR en ese sitio. Adicionalmente, se acordó con el proveedor de servicios de fibra óptica, la empresa Smart, la realización de un recorrido técnico en el sector de Carrizales con el fin de definir el tramo definitivo para el tendido de fibra óptica y la derivación requerida hacia el Hogar San José, ubicado en la zona cercana al punto de instalación.</p> <p>Por otra parte, se verificó que la pantalla Outdoor programada para ubicarse en el Mall Macedonia cumple con las especificaciones técnicas necesarias para ser instalada en la ménsula prevista, asegurando su compatibilidad estructural, eléctrica y de operación. Esta confirmación permite avanzar con la integración de elementos complementarios del sistema de información y seguridad asociados al proyecto.</p>

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Avisos reflectivos	Sec. De Infraestructura	En proceso
Instalación de pórtico y cámaras LPR Carrizales	Inter-telco	En ejecución
Pantalla outdoor	Sec. De Infraestructura, Inter-telco	En proceso
Cobertura F.O	Smart, Intertelco	En ejecución

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada











Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos

Fondesar		FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER			INTER-TELCO su aliado tecnológico		SCS	
CONTROL DE ASISTENCIA								
CONCEPTO: Reunión comité de obra					FECHA: 27/11/2025			
TEMA: Conexión F.O puntos LPR					HORA: 10:00 AM			
LUGAR: Secretaría de Gobierno								
No.	NOMBRE	CÉDULA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA		
1	Fabian Jondara Cortes	8069463	Secretaría de Gobierno	3010974239	Seguridadelretiro.gov.co			
2	Wilson A. García Ochoa	1020181662	DI	303477422	ti@retiro.gov.co			
3	Leon Muñoz	71605140	SAC - Gobio. m	3207010070	leonmunoz@retiro.gov.co			
4	ALEXANDER Olaya	89007840	INTERTELCO	3127202141	alexolaya@intertelco.com			
5	Nicolás Posada	1010193758	Inter-telco	3113696180	nicolas.posada@inter-telco.com			
6	WISQ + GARDONA FANIEL	1040045265	Fondesar	3008328105	obrasfondesar@gmail.com			
7	Andrés Román Santa	1017256109	S. Infraestructura	3166467306	"			
8	Santiago Muñoz Martínez	101048804	Interventoría	312 8855447	"			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

FECHA: 11 de diciembre del 2025

HORA: 2:00 PM

ACTA N° 010

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial oficina Gobierno

CIUDAD:

El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 10

DETALLE DE LA REUNIÓN

PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos	<p>En el municipio de El Retiro, siendo las 2:00 p. m. del día 11 de diciembre de 2025, se reunieron en la sala de juntas los integrantes del comité de obra, con el fin de revisar el estado de avance del contrato, las actividades pendientes por ejecutar y los compromisos a desarrollar en el cierre del año 2025 y el inicio del año 2026.</p> <p>Se da inicio a la reunión con la revisión de las últimas actividades pendientes del contrato por ejecutar. En primer lugar, se aborda el suministro, transporte e instalación de los avisos reflectivos, dejando constancia de que dichos elementos serían entregados por el fabricante durante el mes de enero de 2026. Se aclara que esta actividad quedó como pendiente debido a que el contrato tiene fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. Seguidamente, se revisan las actividades que sí fueron ejecutadas durante el mes de diciembre de 2025, entre las cuales se destacan la garantía de conectividad y operatividad de todos los puntos de cámaras LPR, así como la instalación de la pantalla outdoor en el sector Mall Macedonia, junto con sus respectivas pruebas de estabilidad y funcionamiento. Finalmente, se deja establecido que los avisos reflectivos quedarán programados para su ejecución en el mes de enero de 2026.</p>	<p>Durante el desarrollo de la reunión se deja constancia de que, al momento del comité, existían seis puntos correspondientes a cámaras LPR y sistemas AMU Chuscal que no contaban con acceso a internet. No obstante, se informa que, en el transcurso de los días posteriores a la reunión, estas actividades fueron siendo ejecutadas de manera progresiva, en coordinación con la empresa Smart, encargada de la topología de la red de fibra óptica del municipio de El Retiro.</p> <p>El director de Ingeniería Nicolas Posada de la empresa Inter-Telco presenta el estado general del proyecto, indicando que a la fecha de la reunión se registra un avance financiero presupuestal del 97,7 % y un avance de obra del 96 %. Así mismo, se deja claro que para las actividades a realizar durante el mes de enero de 2026 se procederá con la elaboración de un acta de recibo correspondiente a los pendientes, específicamente el suministro e instalación de los avisos reflectivos.</p> <p>Por parte de la empresa Smart se socializa el estado de la conectividad a internet en los diferentes puntos del proyecto, indicando que se encuentran conectados y operativos los puntos LPR Alto de la Quija, LPR Chuscal, LPR Cementerio, LPR Lejos del Nido, LPR Alto Escobero y LPR Carrizales. De igual forma, se informa que se encuentran con inconvenientes técnicos, pero con soluciones en proceso, los puntos AMU Campanita, el cual cuenta con transceiver y medio activo con señal, LPR Casas Viejas, LPR El Tablero y LPR Pista de Motocross, este último en ejecución para garantizar el soporte de acceso a internet.</p> <p>Adicionalmente, se acuerda la programación de un plan de capacitación dirigido a los encargados del</p>

centro de monitoreo y del área de publicidad, con el objetivo de socializar y fortalecer el conocimiento sobre la tecnología instalada. Se deja constancia de que los sistemas de cámaras LPR y los sistemas AMU se encuentran funcionando y operando en un alto porcentaje, garantizando el cumplimiento del alcance técnico del proyecto.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por finalizado el comité, dejando constancia de los compromisos y actividades pendientes descritas en la presente acta.

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Avisos reflectivos	Sec. De Infraestructura Inter-telco	En proceso
Estado de conectividad a internet de todos los puntos	Smart	En ejecución

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada








Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER					INTER-TELCO Su aliado tecnológico		SCS	
CONTROL DE ASISTENCIA					FECHA: 11/12/2025			
CONCEPTO: Reunión comité de obra					HORA: 2:00 PM			
TEMA: Socialización avance de obra								
LUGAR: Secretaría de Gobierno								
No.	NOMBRE	CÉDULA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA		
1	Luis F. Cardona R	1040045265	Fondeser	3008388105	obrasfondeser@gmail.com			
2	Andrés Hernández S	1017256109	Inteestructuras	3106462306	"			
3	Walter Reynier	71603140	Gobernación	3207010076	"			
4	Nicolás Posada	1010193758	Inter-telco	3113696160	nicolas.posada@inter-telco.com			
5	Santiago Muñoz M	1040048804	Interventoría	3128855447	santocerdan@inter-telco.com			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

ACTA DE REUNIÓN INTERNA



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

FECHA: 14 de enero del 2026

HORA: 10:00 PM

ACTA N° 011

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

MEDIO: Presencial Centro de Monitoreo

CIUDAD:

El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD RELACIONADA: Comité de Obra 11

DETALLE DE LA REUNIÓN


PARTICIPANTES	ORDEN DEL DÍA	OBSERVACIONES
<p>Se agrega foto de los asistentes en la sesión de anexos</p>	<p>Una vez verificada la asistencia de los actores responsables del proyecto, se procede a la instalación formal del comité. Posteriormente, se desarrolla una capacitación dirigida al personal del Centro de Monitoreo, seguida de la socialización del alcance funcional del software Neural Labs y de las herramientas disponibles para el análisis y gestión de la información proveniente de los sistemas de videovigilancia. A continuación, se expone la operatividad del sistema de visualización y de la pantalla Outdoor instalada en el Mall Macedonia. Seguidamente, se realiza la revisión del alcance contractual del proyecto y del estado de cumplimiento de las actividades ejecutadas. Como punto posterior, se analiza el estado del ítem pendiente correspondiente a los avisos reflectivos para los pórticos de cámaras LPR. Finalmente, se revisan las condiciones relacionadas con las licencias, garantías y pólizas asociadas al proyecto, y se procede al cierre de la reunión.</p>	<p>Se lleva a cabo una capacitación integral al personal encargado del Centro de Monitoreo, en la cual se explica el funcionamiento del software Neural Labs, resaltando sus capacidades para el análisis inteligente de fotografías y videos captados por las cámaras LPR, cámaras tipo cabezote AMU Lite y cámaras fijas instaladas en el municipio. Se enfatiza en las herramientas de filtrado y priorización de información relevante para la seguridad ciudadana.</p> <p>Durante la sesión, se capacita al personal en la operatividad general de la pantalla Outdoor, incluyendo el uso de credenciales de acceso y la gestión de la información de interés que será visualizada en la pantalla Outdoor ubicada en el Mall Macedonia, la cual tiene como finalidad informar y beneficiar a los actores viales en el acceso al municipio.</p> <p>De común acuerdo entre los asistentes, se deja constancia de que el proyecto cumple con la totalidad de las condiciones contractuales establecidas, tanto en los aspectos técnicos como operativos, con excepción de un ítem pendiente previamente identificado.</p> <p>El ítem correspondiente al suministro, fabricación e instalación de los avisos reflectivos para cada pórtico de cámaras LPR queda programado para su ejecución durante el mes de enero de 2026, debido a que el fabricante informó disponibilidad para dicho periodo, situación que es aceptada por las partes.</p>

Se deja establecido que las licencias de los sistemas de cámaras LPR, la plataforma de análisis y la pantalla Outdoor tienen una vigencia de un (1) año. No obstante, se aclara que esta vigencia no cubre eventos externos tales como daños ocasionados por descargas eléctricas, vandalismo, apagones o hurto, razón por la cual se acuerda mantener vigentes las pólizas que respalden dichos riesgos.

ACUERDOS/COMPROMISO

TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
Avisos reflectivos	Sec. De Infraestructura Inter-telco	En proceso
Conectividad a internet puntos pendientes (Casas Viejas, El Tablero)	Smart	En ejecución

FIRMA INTER-TELCO:
Nombre: Nicolás Posada








Firma

FIRMA QUIEN REALIZA EL ACTA:
Nombre: Interventoría Santiago Muñoz



Firma

1. Anexos

Fondesar		FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO			INTER-TELCO Su aliado tecnológico	
El Retiro		FONDESER			SCS	
CONTROL DE ASISTENCIA						
CONCEPTO: Capacitación Cámaras UPR				FECHA: 14/01/26		
TEMA: Análisis de video Neural labs.				HORA: 10:00 am		
LUGAR: Centro de Monitoreo El Retiro.						
No.	NOMBRE	CÉDULA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Johnny Meléndez	1041176475	Inter-telco	3212640042	johnny.melendez@inter-telco	
2	Edgar Muñoz M	71603145	Sec. gobierno	3207210016	sec.tria@elretiro.gov.co	
3	Fabian Jandara Cortes	8084463	Director de Seguridad	3016474239	seguridad@retiro.gov.co	
4	Nicolás Posada	1010193756	Inter-telco SAS	3113596160	nicolas.posada@inter-telco.com	
5	Santiago Muñoz M	1040048804	Interventoría	3128855447		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

BITÁCORA



Bitácora de Obra



SCS INGENIERÍA S.A.S
NIT. 901.155.456-9
(300) 204.3710 - (4) 301.79.19
Cr 63C N° 42-24 - Medellín
admon.scsingenieria@gmail.com

BITÁCORA DE ACTIVIDADES

**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN,
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN
DELEGADA CI 034 DE 2025**

MUNICIPIO DEL RETIRO

Enero de 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Actividades contractuales actualizadas	4
3. Seguimiento técnico	5
3.1 Actividades ítem 2 (Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual)	6
3.2 actividad ítem 5 (Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	9
3.3 actividad ítem 6 (Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	10
3.4 actividad ítem 7 (suministro, transporte e instalación de estructura Tipo Cercha)	11
3.5 actividad ítem 8 (Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m)	13
3.6 actividad ítem 9 (Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m)	17
3.7 actividad ítem 10 (Desmonte de controlador de cámara)	19
3.8 actividad ítem 14 (Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido)	20

CONTRATO	<i>069 DE 2025</i>
CONTRATANTE	<i>FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO - FONDESER</i>
NIT	<i>900.198.194-5</i>
CONTRATISTA	<i>INTERTELCO S.A.S</i>
NIT	<i>900.382.516-1</i>



Bitácora de Obra



SCS INGENIERÍA S.A.S
NIT. 901155456-9
(300) 204.3710 - (4) 301.79.19
Cr 63C N° 42-24 - Medellín
admon.scsingenieria@gmail.com

OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025
VALOR	<i>DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$2.185.518.766)</i>
PLAZO	<i>CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.</i>
FECHA DE INICIO	<i>13 DE AGOSTO DE 2025</i>
LOCALIZACIÓN	<i>MUNICIPIO DEL RETIRO</i>
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME	<i>DICIEMBRE DE 2025</i>

CONTRATO	<i>072 DE 2025</i>
CONTRATISTA	<i>SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S</i>
NIT	<i>901155456-9</i>
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034-2025
VALOR	<i>CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (\$148.725.693,00)</i>
PLAZO	<i>CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS POLIZAS DE GARANTÍAS ÚNICAS DEL CONTRATO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</i>
SUPERVISOR	<i>GERENTE</i>
CDP	<i>317 DEL 31 DE JULIO DE 2025</i>
CRP	<i>367 DEL 11 DE AGOSTO DE 2025</i>

	Bitácora de Obra	 <div style="font-size: small; margin-left: 10px;"> SCS INGENIERÍA S.A.S NIT. 901.155.456-9 (300) 204.3710 - (4) 301.79.19 Cr 63C N° 42-24 - Medellín admon.scsingenieria@gmail.com </div>
---	-------------------------	---

Firma de Intertelco:


Nombre: Nicolas Posada



Firma

Firma de Interventoría:

Nombre: Jorge Dairo Giraldo



Firma

1. Introducción

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato cuyo objeto es el fortalecimiento de la seguridad local mediante la construcción, instalación y funcionamiento de un sistema de infraestructura para la seguridad con cámaras de reconocimiento de placas vehiculares (LPR) en doble sentido.

El alcance de la interventoría para este mes de diciembre comprende la supervisión integral de las actividades finales para el montaje de toda la tecnología empleada para las cámaras LPR, las cuales incluye su gabinete de potencia y gabinete de control donde se conservan todos los equipos electrónicos para cada punto de pórtico donde están destinados estratégicamente. Además, se contemplan las actividades que quedan como pendientes y que se ejecutan durante todo el mes de diciembre como toda la integración electrónica de cámaras LPR y puesta a tierra del punto de Carrizales verificando viabilidad técnica y operatividad en la recopilación de las matrículas en el flujo de los vehículos. También se programa la Instalación de la pantalla outdoor en el sector Mall Macedonia para proyectar información de interés que pueda beneficiar a toda la comunidad a la entrada del municipio.

Este informe tiene como finalidad dejar constancia detallada de las actividades desarrolladas, verificar su cumplimiento en relación con las condiciones contractuales, las especificaciones técnicas, los cronogramas de ejecución y la calidad de los materiales empleados, así como documentar mediante registros escritos y fotográficos el avance físico alcanzado. De esta manera se garantiza la trazabilidad del proceso constructivo y se proporcionan los soportes necesarios para la validación de los porcentajes de avance que sustentan las solicitudes de pago presentadas por el contratista

2. Actividades contractuales actualizadas

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.
------	-----------------------	-----	-------

1,0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00
2,0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00
3,0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00
4,0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	11,00
5,0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00
6,0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00
7,0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00
8,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00
9,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00
10,0	Desmonte de Controlador y Cámara	und	4,00
11,0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	1,00
12,0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autosoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, muflas, pigtail.	m	1.000,00
13,0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	2,00
14,0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	m	301,81

3. Seguimiento técnico

Este seguimiento conlleva a la supervisión detallada de todas las actividades de obras civiles, eléctricas, metalmecánica e instalación de la tecnología suscritas en el marco del contrato, el inicio de las obras se dio el día cuatro de septiembre de 2025 según el cronograma acordado en la reunión de comité con respecto a cada punto. Cabe resaltar que las evidencias presentadas para este informe son a partir del corte de cobro del acta # 4 respecto a la instalación de toda la tecnología para cada pórtico. A continuación, se evidencia un acta con las condiciones actualizadas de cómo fue ejecutada cada actividad respecto a lo que se debe facturar para este corte de cobro.

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA No.4	
		UN.	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL

1,0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00	\$ 223.912.380		\$ 0
2,0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00	\$ 921.424.950	0,60	\$ 61.428.330
3,0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00	\$ 101.608.200		\$ 0
4,0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	11,00	\$ 15.083.530		\$ 0
5,0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00	\$ 20.629.180	0,30	\$ 562.614
6,0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00	\$ 30.760.290	1,00	\$ 2.796.390
7,0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00	\$ 228.353.490	0,80	\$ 20.298.088
8,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00	\$ 31.195.500	14,00	\$ 31.195.500
9,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00	\$ 7.998.840	4,00	\$ 7.998.840
10,0	Desmonte de Controlador y Cámara	und	2,00	\$ 548.480	2,00	\$ 548.480
11,0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	-	\$ 0	-	\$ 0
12,0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autosoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, muflas, pigtail.	m	1.000,00	\$ 48.720.000		\$ 0
13,0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	2,00	\$ 41.594.000	0,40	\$ 8.318.800
14,0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00	\$ 39.560.608	1,00	\$ 39.560.608
OBRA EXTRA						
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	m	333,09	\$ 9.491.470	213,00	\$ 6.069.435
COSTO TOTAL MEJORAMIENTO				\$ 1.720.880.918		\$ 178.777.085

COSTO DIRECTO		\$ 1.720.880.918	COSTO DIRECTO	\$ 178.777.085
A	22%	\$ 378.593.802	22%	\$ 39.330.959
U	5%	\$ 86.044.046	5%	\$ 8.938.854
TOTAL OBRA		2185518766	TOTAL ACTA No. 4	\$ 227.046.898
			AMORTIZACIÓN	\$ 68.115.073
			VALOR ACTA No. 4	\$ 158.931.825

3.1 Actividades ítem 2 (Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UND	DETALLE
2	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	9	0,60	UND	Se realiza la instalación y configuración del sistema LPR para los puntos: Lejos del Nido, Pista de motocross, Alto de la Guija, El Tablero, Casas Viejas, Carrizales

Ubicación: Lejos del Nido



Ubicación: Pista de Motocross



Ubicación: Alto de la Guija



Ubicación: El Tablero



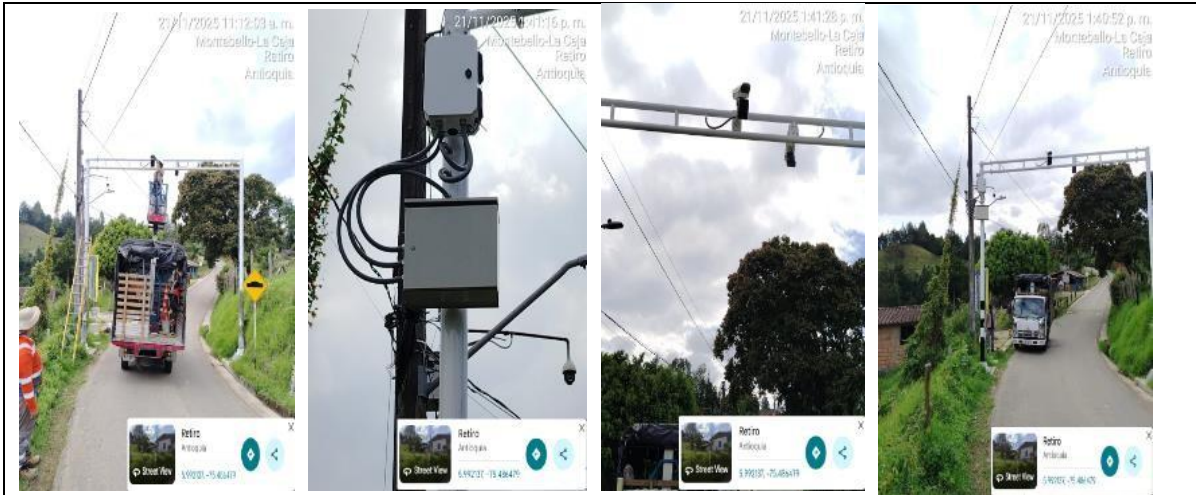
Ubicación: Casas Viejas



Bitácora de Obra



SCS INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.155.456-9
(300) 204.3710 - (4) 301.79.19
Cr 63C N° 42-24 - Medellín
admon.scsingenieria@gmail.com



Ubicación: Carrizales



Plataformas en Funcionamiento

CARRISALES LPR ENTRADA 07:41:28

CARRISALES LPR SALIDA 07:41:27

CASAS VIEJAS LPR ENTRADA 07:41:04

CASAS VIEJAS LPR SALIDA 07:41:07

CEMENTERO LPR ENTRADA 07:39:39

CEMENTERO LPR SALIDA 07:39:32

CHUSCAL LPR ENTRADA 07:41:26

CHUSCAL LPR SALIDA 07:41:21

EL TRIANGULO LPR ENTRADA 07:40:51

EL TRIANGULO LPR SALIDA 07:40:43

ESCOBERO LPR ENTRADA 07:41:23

ESCOBERO LPR SALIDA 07:41:20

FIEZBAD LPR ENTRADA 07:41:40

FIEZBAD LPR SALIDA 07:41:51

LA GALIA LPR ENTRADA 07:37:04

LA GALIA LPR SALIDA 07:37:39

LEJOS DEL NIDO LPR ENTRADA 07:41:25

LEJOS DEL NIDO LPR SALIDA 07:41:23

MACEDONIA LPR ENTRADA 07:40:44

MACEDONIA LPR SALIDA 07:40:46

MOTOCROSS LPR ENTRADA 07:40:58

MOTOCROSS LPR SALIDA 07:40:56

TABLERO LPR ENTRADA 07:40:51

TABLERO LPR SALIDA 07:40:36

Estado: - fps

Estado: - fps

Estado: Grabar - 0,0 fps

Estado: - fps

Estado: - fps

Estado: - fps

Estado: - fps

Estado: Grabar - 0,0 fps

Estado: - fps

Panel de control

- AMU Escobero
- AMU Chuscal
- AMU Tabacal
- AMU Fiezbad
- AMU Triangulo
- AMU Macedonia

Estado de conexión en tiempo real
Español

Admin v.5.5.1.23

Último registro: Seleccionar Fechas 28/1/2026 12:00:00 a.m. - 28/1/2026 11:59:59 p.m. Gestionar consultas

Filtros extra

Buscar
Restablecer filtros
Deshabilitar tiempo real
Detalle tiempo real
Seleccionar columnas
Reset columnas

Cámara	Fecha	Matrícula	Imagen	Fiabilidad	Altura carácter	País	Cclose	Marca	Modelo
MACEDONIA LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:39	JZ0129		96,70	40,33	Colombia	Coche	MAZDA	CX-5
EL TRIANGULO LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:31	JXQ013		96,25	29,67	Colombia	Coche	FORD	ESCAPE
CHUSCAL LPR ENTRADA	28/01/2026 07:52:05	DJR86		90,21	23,20	Colombia	Moto	?	Desconocido
ESCOBERO LPR SALIDA	28/01/2026 07:52:04	LCW502		99,90	35,17	Colombia	Coche	TOYOTA	COROLLA
LEJOS DEL NIDO LPR SALIDA	28/01/2026 07:52:14	GZF07H		97,52	21,50	Colombia	Moto	?	Desconocido
CARRISALES LPR SALIDA	28/01/2026 07:49:28	VVV594		83,37	45,50	Colombia	Camión	?	Desconocido
FIEZBAD LPR ENTRADA	28/01/2026 07:52:30	QHJ02H		96,28	22,00	Colombia	Moto	?	Desconocido
EL TRIANGULO LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:29	FQU191		98,26	25,33	Colombia	Coche	FIAT	PALIO
EL TRIANGULO LPR ENTRADA	28/01/2026 07:51:39	KRU234		99,90	30,50	Colombia	Coche	HONDA	HR-V

3.2 actividad ítem 5 (Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UND	DETALLE
5	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	11	0,3	und	Se realiza la construcción de acometida, instalación de gabinete de potencia en el punto Carrizales

Carrizales



3.3 actividad ítem 6 (Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UND	DETALLE
6	(Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	11	1	Und	Se realiza la puesta a tierra en carrizales

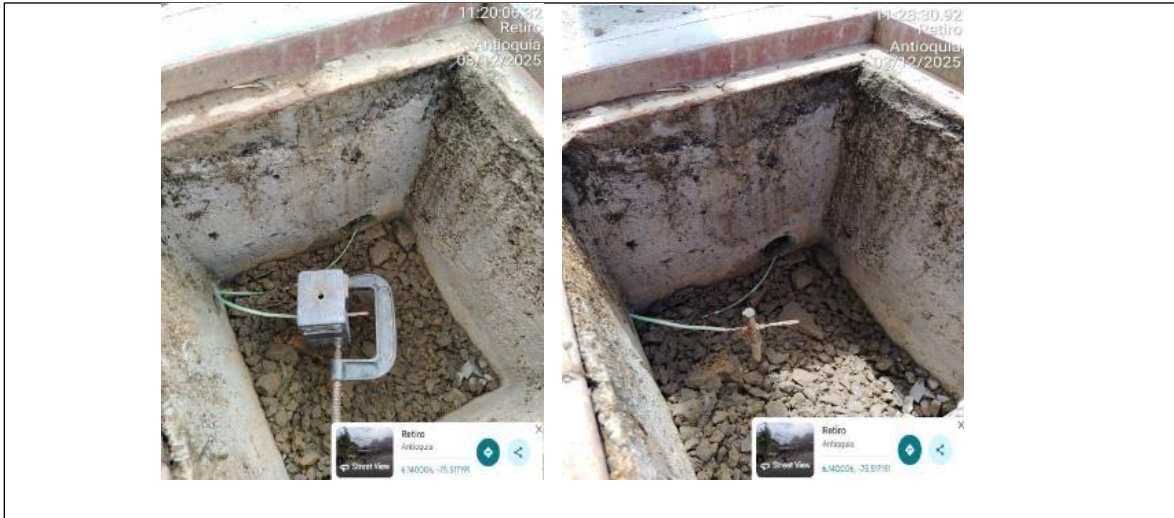

3.4 actividad ítem 7 (suministro, transporte e instalación de estructura Tipo Cercha)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UND	DETALLE
7	suministro, transporte e instalación de estructura Tipo Cercha	9	0,8	Und	Se instalan en sitio correctamente las estructuras de los puntos de Casas viejas, alto de Guija, El Tablero y carrizales -

Casas Viejas



Alto de la Guija



El Tablero



Carrizales



3.5 actividad ítem 8 (Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UND	DETALLE
8	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	14	14	UND	Se instalaron los avisos reflectivos en los puntos Alto de Escobero, Carrizales, Cementerio, Lejos del nido, El Chuscal, pista de motocross, Casas Viejas. 2 avisos por punto.
Ubicación: Alto del Escobero					



Ubicación: Sector Carrizales



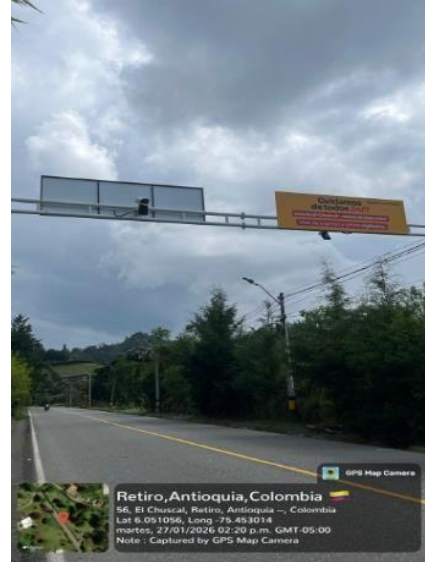
Ubicación: Sector Vereda el Carmen



Ubicación: Lejos del Nido



Ubicación: Vereda el Chuscal



Ubicación: Pista de Motocross



Ubicación: Casas Viejas



3.6 actividad ítem 9 (Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UNIDAD	DETALLE
9	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	4	4	UND	Se instalaron los avisos reflectivos en los puntos El Tablero y Alto de la guija. 2 avisos por punto.
Ubicación: Alto de la Guija					



Ubicación: Sector El Tablero



3.7 actividad ítem 10 (Desmante de controlador de cámara)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UNIDAD	DETALLE
10	Desmante de controlador de cámara	2	2	und	Se realizó el desmontaje de 1 cámara PTZ y 1 Cámara fija en el punto del escobero y s ele entregó al municipio. Incluye accesorios como brazos y radio enlace.



3.8 actividad ítem 13 (suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UNIDAD	DETALLE
13	suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año	2	0,4	Und	Se realiza la instalación de 2 sistemas de internet satelital Starlink en los puntos El Escobero y Partidas Tabacal. Con 1 año de servicio.

Alto de Escobero



Partidas Tabacal



3.9 actividad ítem 14 (Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UNIDAD	DETALLE
14	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	1	1	UND	Se realiza el suministro e instalación de pantalla variable RGB. Outdoor en el punto Macedonia, incluye 1 año de servicio de la plataforma de gestión.
Ubicación: Mall Macedonia					



3.10 actividad ítem OE1 (Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECTUADA	UND	DETALLE
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores	333,09	213	Und	Se realiza el suministro e instalación de fibra drop para los puntos carrizales y Cementerio (57m y 156m respectivamente)

Carrizales



Cementerio



ACTA DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER													CONTRATO DE OBRA		N° 069-2025			
MUNICIPIO DEL RETIRO													VALOR INICIAL		\$ 2.185.518,766			
CONTRATO N° 069-2025													VALOR ADICION		\$ -			
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 634 DE 2025*													VALOR TOTAL		\$ 2.185.518,766			
													PLAZO INICIAL		5 MESES			
CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIÓN 1			MODIFICACIÓN 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.4		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	
1.0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y funcionamiento anual	und	3,00	\$ 74.637,460	\$ 223.912,380					3,00	\$ 223.912,380			3,00	\$ 223.912,380			
2.0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y funcionamiento anual	und	9,00	\$ 102.380,550	\$ 921.424,950					9,00	\$ 921.424,950	0,60	\$ 61.428,330	9,60	\$ 921.424,950			
3.0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00	\$ 5.644,900	\$ 101.608,200					18,00	\$ 101.608,200			18,00	\$ 101.608,200			
4.0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	14,00	\$ 1.371,235	\$ 19.197,220	(3,00)	\$ (4.113,690)			11,00	\$ 15.083,530			11,00	\$ 15.083,530			
5.0	Construcción acomoda eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$ 1.875,380	\$ 16.878,420	2,00	\$ 3.750,760			11,00	\$ 20.629,180	0,30	\$ 562,614	11,30	\$ 20.629,180			
6.0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$ 2.796,390	\$ 25.167,510	2,00	\$ 5.592,780			11,00	\$ 30.760,290	1,00	\$ 2.796,390	12,00	\$ 30.760,290			
7.0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00	\$ 25.372,610	\$ 228.353,490					9,00	\$ 228.353,490	0,80	\$ 20.298,088	9,80	\$ 228.353,490			
8.0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00	\$ 2.228,250	\$ 31.195,500					14,00	\$ 31.195,500	14,00	\$ 31.195,500	14,00	\$ 31.195,500			
9.0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00	\$ 1.998,840	\$ 7.998,840					4,00	\$ 7.998,840	4,00	\$ 7.998,840	4,00	\$ 7.998,840			
10.0	Diagnostico de Controlador y Cámara	und	4,00	\$ 274,240	\$ 1.096,960			(2,00)	\$ (848,480)	2,00	\$ 548,480	2,00	\$ 548,480	2,00	\$ 548,480			
11.0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	1,00	\$ 342,800	\$ 342,800			(1,00)	\$ (342,800)		\$ -		\$ -		\$ -			
12.0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autosportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandi, pasadores, tensores, enfrentadores, mufas, pigtail.	m	857,00	\$ 48,720	\$ 41.753,040	143,00	\$ 6.966,960			1.000,00	\$ 48.720,000			1.000,00	\$ 48.720,000			
13.0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	3,00	\$ 20.797,000	\$ 62.391,000	(1,00)	\$ (20.797,000)			2,00	\$ 41.594,000	0,40	\$ 8.318,800	2,40	\$ 41.594,000			
14.0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00	\$ 39.560,608	\$ 39.560,608					1,00	\$ 39.560,608	1,00	\$ 39.560,608	1,00	\$ 39.560,608			
OBRA EXTRA																		
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Fat Drop incluye helicoidales, cinta bandi, pasadores, tensores, correctores.	m		\$ 28,495		301,81	\$ 8.600,190	31,28	\$ 891,280	333,09	\$ 9.491,470	213,00	\$ 6.069,435	333,00	\$ 9.488,835	0,09	\$ 2,635	
COSTO TOTAL MEJORAMIENTO					\$ 1.720.880.918		\$ -		\$ -	\$ 1.720.880.918		\$ 178.777,082		\$ 1.720.878,283		\$ 2.635		

COSTO DIRECTO		\$ 1.720.880.918		\$ -		\$ 1.720.880.918	COSTO DIRECTO	\$ 178.777,082		\$ 1.720.878,283		\$ 2.635
A	22%	\$ 378.593,802	22%	\$ -	22%	\$ 378.593,802	22%	\$ 39.330,959	22%	\$ 378.593,222	22%	\$ 580
U	5%	\$ 86.044,046	5%	\$ -	5%	\$ 86.044,046	5%	\$ 8.938,854	5%	\$ 86.043,914	5%	\$ 132
TOTAL OBRA		\$ 2.185.518,766		\$ -		\$ 2.185.518,766	TOTAL ACTA No. 3	\$ 227.046,898		\$ 2.185.515,410		\$ 3.346
							AMORTIZACIÓN	\$ 68.114,066				
							VALOR ACTA No. 3	\$ 158.932,832				

Cristina C. Botero S.

CLAUDIA CRISTINA BOTERO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTER-TELCO S.A.S.

NICOLAS POSADA
DIRECTOR DE INGENIERIA Y OPERACIONES
INTER-TELCO SAS

DAVID ESTRADA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

JORGE DAIRO GIRALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER															
MUNICIPIO DEL RETIRO										CONTRATO DE OBRA N° 069-2025					
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025*										VALOR INICIAL		\$ 2.185.518.766		N° 069-2025	
										VALOR ADICION		\$ -			
										VALOR TOTAL		\$ 2.185.518.766			
										PLAZO INICIAL		5 MESES			
CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.4		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00	\$ 74.637.460	\$ 223.912.380		\$ -	3,00	\$ 223.912.380		\$ -	3,00	\$ 223.912.380	-	\$ -
2.0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00	\$ 102.380.550	\$ 921.424.950		\$ -	9,00	\$ 921.424.950	0,60	\$ 61.428.330	9,00	\$ 921.424.950	-	\$ -
3.0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00	\$ 5.644.900	\$ 101.608.200		\$ -	18,00	\$ 101.608.200		\$ -	18,00	\$ 101.608.200	-	\$ -
4.0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	14,00	\$ 1.371.230	\$ 19.197.220	(3,00)	\$ (4.113.690)	11,00	\$ 15.083.530		\$ -	11,00	\$ 15.083.530	-	\$ -
5.0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$ 1.875.380	\$ 16.878.420	2,00	\$ 3.750.760	11,00	\$ 20.629.180	0,30	\$ 562.614	11,00	\$ 20.629.180	-	\$ -
6.0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$ 2.796.390	\$ 25.167.510	2,00	\$ 5.592.780	11,00	\$ 30.760.290	1,00	\$ 2.796.390	11,00	\$ 30.760.290	-	\$ -
7.0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00	\$ 25.372.610	\$ 228.353.490		\$ -	9,00	\$ 228.353.490	0,80	\$ 20.298.088	9,00	\$ 228.353.490	-	\$ -
8.0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00	\$ 2.228.250	\$ 31.195.500		\$ -	14,00	\$ 31.195.500	14,00	\$ 31.195.500	14,00	\$ 31.195.500	-	\$ -
9.0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00	\$ 1.999.710	\$ 7.998.840		\$ -	4,00	\$ 7.998.840	4,00	\$ 7.998.840	4,00	\$ 7.998.840	-	\$ -
10.0	Desmonte de Controlador y Cámara	und	4,00	\$ 274.240	\$ 1.096.960		\$ -	2,00	\$ 548.480	2,00	\$ 548.480	2,00	\$ 548.480	-	\$ -
11.0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	1,00	\$ 342.800	\$ 342.800		\$ -		\$ 0		\$ -		\$ -	-	\$ -
12.0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autosoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, muflas, pigtail.	m	857,00	\$ 48.720	\$ 41.753.040	143,00	\$ 6.966.960	1.000,00	\$ 48.720.000		\$ -	1.000,00	\$ 48.720.000	-	\$ -
13.0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	3,00	\$ 20.797.000	\$ 62.391.000	(1,00)	\$ (20.797.000)	2,00	\$ 41.594.000	0,40	\$ 8.318.800	2,00	\$ 41.594.000	-	\$ -
14.0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00	\$ 39.560.608	\$ 39.560.608		\$ -	1,00	\$ 39.560.608	1,00	\$ 39.560.608	1,00	\$ 39.560.608	-	\$ -
OBRA EXTRA															
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	m		\$ 28.495		301,81	\$ 8.600.190	333,09	\$ 9.491.470	213,00	\$ 6.069.435	333,00	\$ 9.488.835	0,09	\$ 2.635
COSTO TOTAL MEJORAMIENTO					\$ 1.720.880.918		\$ -		\$ 1.720.880.918		\$ 178.777.085		\$ 1.720.878.283		\$ 2.635

COSTO DIRECTO		\$ 1.720.880.918		\$ 0	\$ 1.720.880.918	COSTO DIRECTO	\$ 178.777.085		\$ 1.720.878.283		\$ 2.635	
A	22%	\$ 378.593.802	22%	\$ 0	22%	\$ 378.593.802	22%	\$ 39.330.959	22%	\$ 378.593.222	22%	\$ 580
U	5%	\$ 86.044.046	5%	\$ 0	5%	\$ 86.044.046	5%	\$ 8.938.854	5%	\$ 86.043.914	5%	\$ 132
TOTAL OBRA		\$ 2.185.518.766		\$ 0		2185518766	TOTAL ACTA No.	\$ 227.046.898		\$ 2.185.515.419		\$ 3.346
				\$ 655.655.630		AMORTIZACIÓN	\$ 68.115.073					
						VALOR ACTA No.	\$ 158.931.825					

Claudia C. Botero S.

CLAUDIA CRISTINA BOTERO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTER-TELCO S.A.S.

Nicolas Posada

NICOLAS POSADA
DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
INTER-TELCO SAS

David Estrada García

DAVID ESTRADA GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Jorge Dairo Giraldo

JORGE DAIRO GIRALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SCS CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

MEMORIAS DE CÁLCULO



MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA						DD	22	MM	12	AA	2025	Consecutivo	1	Memoria de Cálculo	2	DE	2
												CORTE N°	4	ELABORÓ	Nicolas Posada		

OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025".																
CONTRATISTA	INTER-TELCO SAS						NIT O C.C.	900 382 516 - 1			CONTRATO N°	069-2025					

ÍTEM	UNID	MUNICIPIO	EL RETIRO
2	Und		

Descripción / localización	Cant.	L	B	H	TOTAL
					ACTA No.1
  <p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CARULLA ESCOBERO</p>	0,5				0,50
  <p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: EL CHUSCAL</p>	0,5				0,50
  <p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CEMENTERIO</p>	0,5				0,50
  <p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: VÍA LEJOS DEL NIDO - PANTANILLO</p>	0,5				0,50
  <p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: PISTA DE MOTOCROS</p>	0,5				0,50



Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CASAS VIEJAS	0,5				0,50
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: LA GUIJA ESCOBERO	0,5				0,50
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: EL TABLERO 1	0,5				0,50
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: EL TABLERO 2	0,5				0,50
ACTA No.2					
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CARULLA ESCOBERO	0,4				0,40



Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: EL CHUSCAL	0,4				0,40
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CEMENTERIO	0,4				0,40
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: VÍA LEJOS DEL NIDO - PANTANILLO	0,4				0,40
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: PISTA DE MOTOCROS	0,4				0,40



<p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CASAS VIEJAS</p>	0,4				0,40
<p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: LA GUIJA</p>	0,4				0,40
<p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: EL TABLERO</p>	0,4				0,40
<p>Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CARRIZALES</p>	0,4				0,40



ACTA No.3					
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CARULLA ESCOBERO	0,1				0,10
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: EL CHUSCAL	0,1				0,10
Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: CEMENTERIO	0,1				0,10
ACTA No.4					



Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: LEJOS DEL NIDO

0,1

0,10



Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: PISTA DE MOTOCROS

0,1

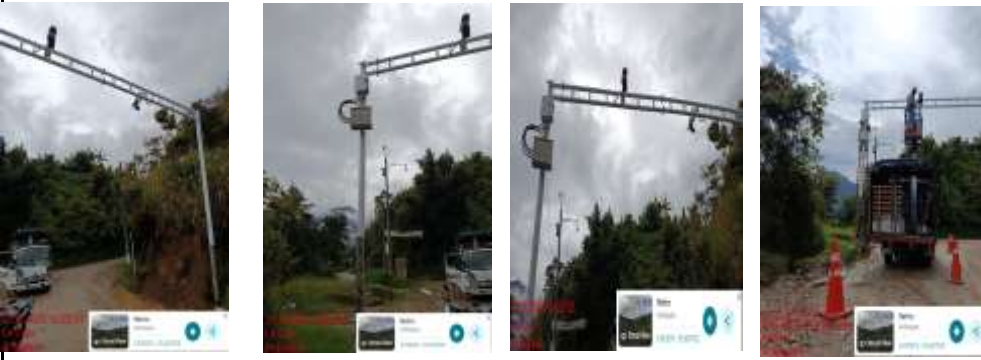
0,10



Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: ALTO DE LA GUIJA

0,1

0,10



Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual . UBICACIÓN: EL TABLERO

0,1

0,10








MEMORIAS DE CÁLCULO



FECHA	DD	22	MM	12	AA	2025	Consecutivo	1	HOJA	5	DE	15
							CORTE N°	4	ELABORÓ	Nicolas Posada		

OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025".											
CONTRATISTA	INTER-TELCO SAS			NIT O C.C.	900 382 516 - 1			CONTRATO N°	069-2025			

ITEM	5	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UNID	Und	MUNICIPIO	EL RETIRO						
------	---	--	------	-----	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Descripción / localización	Cant.	L	B	H	TOTAL
 <p>Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Alto del Escobero</p>	1				1,00
 <p>Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR El Chuscal</p>	1				1,00
 <p>Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. AMU El Chuscal</p>	1				1,00
 <p>Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Cementerio</p>	1				1,00
 <p>Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Lejos del Nido</p>	1				1,00
 <p>Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Pista de Motocross</p>	1				1,00
 <p>Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Casas Viejas</p>	1				1,00

MEMORIAS DE CÁLCULO








MEMORIA DE CÁLCULO ACTA No. 1

FECHA	DD	22	MM	12	AA	2025	Consecutivo	1	HOJA	6	DE	15
							CORTE N°	4	ELABORÓ	Nicolas Posada		

OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025".											
CONTRATISTA	INTER-TELCO SAS			NIT O C.C.	900 382 516 - 1			CONTRATO N°	069-2025			

ÍTEM	6	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UNID	Und	MUNICIPIO	EL RETIRO					
------	---	---	------	-----	-----------	-----------	--	--	--	--	--

Descripción / localización	Cant.	L	B	H	TOTAL
 <p>Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Alto del Escobero</p>	1				1,00
 <p>Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. AMU el Chuscal</p>	1				1,00
 <p>Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR El Chuscal</p>	1				1,00
 <p>Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Cementerio</p>	1				1,00
 <p>Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Lejos del Nido</p>	1				1,00



Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Pista de Motocross	1					1,00
Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Casas Viejas	1					1,00
Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Alto de la Guja	1					1,00
Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. AMU Partidas Tabacal	1					1,00
Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR El Tablero	1					1,00
ACTA No.4						
Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. LPR Canizales	1					1,00
						11,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL						11,00
menos pagado actas anteriores						10,00
TOTAL						1,00

FIRMA: 
 NOMBRE: **NICOLAS POSADA**
 DIRECTOR OBRA

FIRMA: 
 NOMBRE: **JORGE DAIRO GIRALDO**
 DIRECTOR INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CÁLCULO








MEMORIA DE CÁLCULO ACTA No. 1

FECHA	DD	22	MM	12	AA	2025	Consecutivo	1	HOJA	7	DE	15	
							CORTE N°	4	ELABORÓ	Nicolas Posada			


OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025".											
CONTRATISTA	INTER-TELCO SAS			NIT O C.C.	900 382 516 - 1			CONTRATO N°	069-2025			

ÍTEM	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	UNID	Und	MUNICIPIO	EL RETIRO							
7												

Descripción / localización	Cant.	L	B	H	TOTAL
 <p>Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA. Ubicación: Chuscal</p>	1,00				1,00
 <p>Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA. Ubicación: Cementerio</p>	1,00				1,00
 <p>Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA. Ubicación: Alto del Escobero</p>	1,00				1,00
 <p>Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA. Ubicación: Lejos del Nido</p>	1,00				1,00
 <p>Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA. Ubicación: Pista de motocross</p>	1,00				1,00



Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA . Ubicación: Casas viejas	0,90				0,90
---	------	--	--	--	------

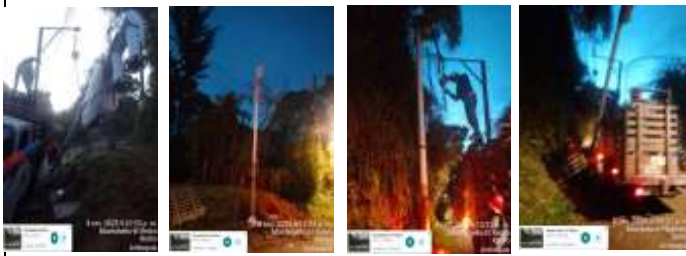

Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA . Ubicación: Alto de la Guija	0,90				0,90
---	------	--	--	--	------



Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA . Ubicación: El Tablero	0,90				0,90
---	------	--	--	--	------



Suministro de Estructura Tipo CERCHA . Ubicación: Carrizales	0,50				0,50
--	------	--	--	--	------

ACTA No.4



Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA . Ubicación: Casas viejas	0,10				0,10
---	------	--	--	--	------



Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA . Ubicación: Alto de la Guija	0,10				0,10
---	------	--	--	--	------

MEMORIAS DE CÁLCULO



MEMORIA DE CÁLCULO ACTA No. 4

FECHA	DD	22	MM	12	AA	2025	Consecutivo	1	HOJA	13	DE	15	
							CORTE N°	4	ELABORÓ	Nicolas Posada			

OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025".											
CONTRATISTA	INTER-TELCO SAS			NIT O C.C.	900 382 516 - 1			CONTRATO N°	069-2025			

ÍTEM	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	UNID	Und	MUNICIPIO	EL RETIRO							
8												



Descripción / localización	Cant.				TOTAL
		L	B	H	

ACTA No.4

Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m. Ubicación: Alto del Escobero	2				2,00
---	---	--	--	--	------



Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m. Ubicación: Sector Carrizales	2				2,00
---	---	--	--	--	------



Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m. Ubicación: Sector vereda el Carmen (Retirar)	2				2,00
---	---	--	--	--	------



Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m. Ubicación: Lejos del Nido	2				2,00
--	---	--	--	--	------

MEMORIAS DE CÁLCULO



MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 4

FECHA	DD	22	MM	12	AA	2025	Consecutivo	1	HOJA	13	DE	15	
							CORTE N°	4	ELABORÓ	Nicolas Posada			

OBJETO DEL CONTRATO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025".

CONTRATISTA	INTER-TELCO SAS	NIT O C.C.	900 382 516 - 1	CONTRATO N°	069-2025
-------------	-----------------	------------	-----------------	-------------	----------

ÍTEM	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	UNID	Und	MUNICIPIO	EL RETIRO
------	---	------	-----	-----------	-----------



Descripción / localización	Cant.	L	B	H	TOTAL
ACTA No.4					
Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m. Ubicación: Alto de la Guija	2				2,00
Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m. Ubicación: Sector El Tablero	2				2,00
					4,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	4,00
menos pagado actas anteriores	
TOTAL	4,00

FIRMA:
 NOMBRE: **NICOLAS POSADA**
 DIRECTOR OBRA

FIRMA:
 NOMBRE: **JORGE DAIRÓ GIRALDO**
 DIRECTOR INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CÁLCULO



MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	22	MM	12	AA	2025	Consecutivo	1	HOJA	13	DE	15	
							CORTE N°	4	ELABORÓ	Nicolas Posada			

OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025".											
CONTRATISTA	INTER-TELCO SAS			NIT O C.C.	900 382 516 - 1			CONTRATO N°	069-2025			

ÍTEM	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	UNID	Und	MUNICIPIO	EL RETIRO							
13												



Descripción / localización	Cant.				TOTAL
		L	B	H	

ACTA No.2

Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año. AMU El Escobero	0,80				0,80
--	------	--	--	--	------

Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año. Partidas Tabacal	0,80				0,80
---	------	--	--	--	------

ACTA No.4

Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año. AMU El Escobero	0,20				0,20
--	------	--	--	--	------


Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año. AMU Partidas Tabacal	0,20				0,20
---	------	--	--	--	------



OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL	1,80
menos pagado actas anteriores	1,60
TOTAL	0,20

FIRMA: 
 NOMBRE: NICOLÁS POSADA
 DIRECTOR OBRA

FIRMA: 
 NOMBRE: JORGE DAIRO GIRALDO
 DIRECTOR INTERVENTORIA

SEGURIDAD SOCIAL OBRA

Información básica de la planilla

Empresa: INTER-TELCO S.A.S
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: Of ppal 2015
Número de Radicación: 46996319
Fecha de vencimiento: 05/02/2026
Fecha de Pago: 04/02/2026

NIT: 900382516
Periodo liquidación Pensiones: enero 2026
Periodo liquidación Salud: febrero 2026
Total a pagar: \$3,134,400
Total de empleados: 8
Número de Administradoras: 6

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 36511552

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	8		\$0	\$317,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0	\$522,800
230301	800224808	Porvenir	6		\$0	\$1,401,200
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$481,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0	\$140,200
EPS010	800088702	EPS Sura	4		\$0	\$271,200
						\$3,134,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Medellín, 05 de febrero de 2026.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La ciudad.


Asunto: **CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES.**

Yo, JOSÉ ALEJANDRO VILLA PALACIO, identificado con C.C. 1.036.952.599, y con Tarjeta Profesional No. 242867- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTER-TELCO S.A.S identificado con NIT 900.382.516-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes, por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los periodos correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Del mismo modo certifico que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Dada en Medellín, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026.



JOSÉ ALEJANDRO VILLA
INTER-TELCO S.A.S
Revisor Fiscal 242.867-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900382516-1	INTER-TELCO S.A.S		Cra 35A #15B-35 de 212 edificio Prisma	3015409631	direccionadministrativa@inter-telco.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	Of ppal 2015	Med 2015	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E		46996319	\$3.134.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	271.200	0		0		0	0	0	0	271.200	4

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	522.800	0	0	0	0	0	0	0	522.800	2	
230301	Porvenir	800224808-8	1.401.200	0	0	0	0	0	0	0	1.401.200	6	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	317.400				317.400	0	0	317.400			3.174	317.400	8

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF04	Comfama	890900841-9	481.600	0	0	481.600	8	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	411.400	411.400
Pensión	2	1.924.000	1.924.000
Riesgos Laborales	1	317.400	317.400
CCF	1	481.600	481.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.134.400	3.134.400

ACTA INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 034 - 2025



CONTRATO N°	072 DE 2025
VALOR INICIAL	148.725.693,00
VALOR ADICION	
VALOR TOTAL	148.725.693,00
PLAZO INICIAL	6 MESES
PLAZO ADICIONAL	

CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034 – 2025

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA PARCIAL No. 4		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL.	1	\$ 124.979.574,00	36,96%	\$ 46.187.819,00	47,59%	\$ 59.477.449,04	5,04%	\$ 6.296.055,46	10,42%	\$ 13.018.059,04	100,00%	\$ 124.979.382,54	0,00%	\$ 191,46
	SUBTOTAL		\$ 124.979.574,00		\$ 46.187.819,00		\$ 59.477.449,04		\$ 6.296.055,46		\$ 13.018.059,04		\$ 124.979.382,54		\$ 191,46
	IVA 19%		\$ 23.746.119,00		\$ 8.775.686,00		\$ 11.300.715,32		\$ 1.196.250,54		\$ 2.473.431,22		\$ 23.746.082,68		\$ 36,38
	TOTAL		\$ 148.725.693,00		\$ 54.963.505,00		\$ 70.778.164,36		\$ 7.492.306,00		\$ 15.491.490,26		\$ 148.725.465,22		\$ 227,84

-\$ 227,78

 FIRMA SUPERVISOR
 Fondo Desarrollo Social Retiro
 FONDESER

 NOMBRE REPRESENTANTE
 Representante Legal
 SCS COMPLETAR

PÓLIZAS OBRA



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.02.24 09:36:22 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: p0Co0BC+JEQY4IhykejCZw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 - 1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CVA-100010220	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	360032040	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/08/2025	24:00 Horas Del	04/02/2031	N/A		N/A	

TOMADOR	INTERTELCO SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.382.516-1
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA ENVIGADO	TELÉFONO	5200500
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	TELÉFONO	4366620
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER	No. DOC. IDENTIDAD	900.198.194-5
DIRECCIÓN	CALLE 20 N 20-26	TELÉFONO	4366620

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 04/02/2026. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAN EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.069 DE 2025, CUYO OBJETO ES

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA A SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025.

SE ACLARA ASEGURADO/BENEFICIARIO A EL MUNICIPIO EL RETIRO - ANTIOQUIA CON NIT: 890983674

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/05/2026	218.551.876,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/01/2026	655.655.629,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/01/2029	218.551.876,60	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/07/2026	437.103.753,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 13/08/2025	24:00 Horas Del 05/05/2026	327.827.814,90	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/02/2026	24:00 Horas Del 04/02/2031	218.551.876,60	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 2.076.242.827,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RICARTE ROSSO RR ASESORES DE SEGUROS CI	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/02/2026
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

CLAUDIA C BOTERO S.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
 Nacional: 01 8000 111 935
 Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	CVA-100010220	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	360032040	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	13/08/2025	24:00 Horas Del	04/02/2031		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CVA-100010220** y endoso, 3 cuyo afianzado es: **INTERTELCO SAS** Asegurado o Beneficiario: **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER / FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO FONDESER**, expedida por la Compañía en **24/02/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN VALLE DE ABURRA a los **24** días del mes **FEBRERO** del año **2026**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 360032040

Fecha de Facturación	24/02/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CVA-100010220	
Periodo Facturado	13/08/2025	04/02/2031

Fecha Límite de Pago	26/03/2026	
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00	
IVA	00,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	00,00	

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INTERTELCO SAS	
ANTIOQUIA ENVIGADO	900.382.516	
Intermediario	RICAURTE ROSSO RR ASESORES DE	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 360032040

Fecha de Facturación	24/02/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CVA-100010220	
Periodo Facturado	13/08/2025	04/02/2031

Fecha Límite de Pago	26/03/2026	
Prima (incluye gastos de expedición)	00,00	
IVA	00,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	00,00	

EFFECTIVO \$


Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INTERTELCO SAS	
ANTIOQUIA ENVIGADO	900.382.516	
Intermediario	RICAURTE ROSSO RR ASESORES DE	


Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

**Corresponsales
OPCIÓN 1**



**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**









INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES				
				

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		
	 Banco de Occidente	

 CORRESPONSALES	 Te damos más
--	--

Tu compañía siempre

PÓLIZAS INTERVENTORÍA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101477158		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
02 03 2026		13 08 2025		00:00		04 02 2031		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.456-9			
DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 2658469		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.198.194-5			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NO: 20-26 PARQUE PRINCIPAL						CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA			TELÉFONO 4366620		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034- 20225.

NOTA: ASEGURADO Y/O BENEFICARIO FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO -FONDESER- IDENTIFICADO CON EL NIT 900.198.194-5 Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO,ANTIOQUIA IDENTIFICADO CON NIT 890.983.674-0.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2025	04/06/2026	\$14,872,569.30	\$14,872,569.30
CALIDAD DEL SERVICIO	02/01/2026	02/01/2031	\$22,308,853.95	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/08/2025	04/02/2029	\$14,872,569.30	\$14,872,569.30

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA POLIZA SEGUN ACTA FINAL DE FECHA 04/02/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,067.00	\$ *****4,000.00	\$ *****2,292.00	\$ *****14,360.00	\$ *****52,053,992.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLGA MARGOTH SILVA SILVA	132994	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



[Handwritten Signature]
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101477158		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 03 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 13 08 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 04 02 2031		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.456-9				
DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 2658469		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.198.194-5				
DIRECCIÓN: CALLE 20 NO: 20-26 PARQUE PRINCIPAL						CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 4366620		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101477158, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de MARZO de 2026


Firma autorizada de Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101477158		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
02 03 2026		13 08 2025		00:00		02 01 2031		23:59		ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.456-9			
DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 2658469		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.198.194-5			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NO: 20-26 PARQUE PRINCIPAL						CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA			TELÉFONO 4366620		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034- 20225.

NOTA: ASEGURADO Y/O BENEFICARIO FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO -FONDESER- IDENTIFICADO CON EL NIT 900.198.194-5 Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO,ANTIOQUIA IDENTIFICADO CON NIT 890.983.674-0.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2025	04/06/2026	\$14,872,569.30	\$14,872,569.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/08/2025	04/02/2029	\$14,872,569.30	\$14,872,569.30
CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2026	02/01/2031	\$22,308,853.95	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA POLIZA REFERENTE A VIGENCIA INICIAL AMPARO CALIDAD DESDE 04/02/2026 SEGUN ACTA FINAL.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EWN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****52,053,992.55	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLGA MARGOTH SILVA SILVA	132994	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101477158		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 03 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 13 08 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 01 2031		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.456-9				
DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 2658469		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.198.194-5				
DIRECCIÓN: CALLE 20 NO: 20-26 PARQUE PRINCIPAL						CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 4366620		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101477158, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de MARZO de 2026


Firma autorizada de Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101477158		ANEXO 5	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
02 03 2026		13 08 2025		00:00		04 02 2031		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.456-9			
DIRECCIÓN: CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 2658469		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.198.194-5			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NO: 20-26 PARQUE PRINCIPAL						CIUDAD: RETIRO, ANTIOQUIA			TELÉFONO 4366620		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034- 20225.

NOTA: ASEGURADO Y/O BENEFICARIO FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO -FONDESER- IDENTIFICADO CON EL NIT 900.198.194-5 Y EL MUNICIPIO DE EL RETIRO,ANTIOQUIA IDENTIFICADO CON NIT 890.983.674-0.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2025	04/06/2026	\$14,872,569.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/08/2025	04/02/2029	\$14,872,569.30	
CALIDAD DEL SERVICIO	04/02/2026	04/02/2031	\$22,308,853.95	\$22,308,853.95

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALZIA POLIZA REFERENTE A VIGENCIA FINAL DEL AMPARO DE CALIDAD HASTA 04/02/2031.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDCIIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****52,053,992.55	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLGA MARGOTH SILVA SILVA	132994	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101477158	ANEXO 5					
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS			VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS			TIPO MOVIMIENTO
DÍA 02	MES 03	AÑO 2026	DÍA 13	MES 08	AÑO 2025	00:00	DÍA 04	MES 02	AÑO 2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT:	901.155.456-9
DIRECCIÓN:	CL 42 NRO. 63 C - 164 OF 202	CIUDAD:	MEDELLIN, ANTIOQUIA
		TELÉFONO:	2658469

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO	IDENTIFICACIÓN NIT:	900.198.194-5
DIRECCIÓN:	CALLE 20 NO: 20-26 PARQUE PRINCIPAL	CIUDAD:	RETIRO, ANTIOQUIA
		TELÉFONO:	4366620

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101477158, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de MARZO de 2026


Firma autorizada de Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

21-44-101477158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

INFORME DE OBRA

INFORME ACTIVIDADES No. 4

**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025**

MUNICIPIO DEL RETIRO

Diciembre de 2025

1. TABLA DE CONTENIDO

1.	RESUMEN DEL CONTRATO	3
2.	PÓLIZAS CONTRACTUALES	4
3.	MODIFICACIONES	4
4.	ACTIVIDADES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS.....	5
5.	SEGUIMIENTO TÉCNICO.....	6
5.1.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA LPR PARA DOS SENTIDOS VIALES, INCLUYE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y LICENCIAMIENTO ANUAL).....</i>	<i>7</i>
5.2.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 5 (CONSTRUCCIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE SUMINISTRO DE GABINETE DE POTENCIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN</i>	<i>11</i>
5.3.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 6 (CONSTRUCCIÓN PUESTA A TIERRA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN</i>	<i>11</i>
5.4.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 7 (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO CERCHA).....</i>	<i>12</i>
5.5.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 8 (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISO REFLECTIVO 3X1M)</i>	<i>14</i>
5.6.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 9 (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISO SENCILLO 2X1M.....</i>	<i>17</i>
5.7.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 10 (DESMONTE DE CONTROLADOR Y CÁMARA)</i>	<i>18</i>
5.8.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 13 (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INTERNET SATELITAL STARLINK CON SERVICIO POR 1 AÑO.</i>	<i>20</i>
5.9.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM 14 (SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANTALLA VARIABLE RGB OUTDOOR, CON 1 AÑO DE PLATAFORMA DE PANTALLA INCLUIDO.....</i>	<i>21</i>
5.10.	<i>ACTIVIDADES ÍTEM OE1 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE FIBRA FALT DROP INCLUYE HELICOIDALES, CINTA BANDIT, PASADORES, TENSOSES, CONECTORES.).....</i>	<i>22</i>
6.	INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS	23
7.	CAPACITACIONES	29
8.	SEGUIMIENTO FINANCIERO	31

1. RESUMEN DEL CONTRATO

CONTRATO	069-2025
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO – FONDESER
NIT	900.198.194-5
CONTRATISTA	INTER-TELCO S.A.S
NIT	900.382.516-1
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LOCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, DERIVADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CI 034 DE 2025
VALOR	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$2.185.518.766)
PLAZO	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2025
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE EL RETIRO
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	DICIEMBRE DE 2025

2. PÓLIZAS CONTRACTUALES

Póliza No. CVA-100010220 – Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales decreto 1082

AMPARO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	22/08/2025	218.551.876,60	13/08/2025	05/05/2026
Buen manejo del anticipo		655.655.629,80	13/08/2025	05/01/2026
Prestaciones sociales		218.551.876,60	13/08/2025	05/01/2029
Calidad de los elementos		437.103.753,20	13/08/2025	05/07/2026
Calidad del servicio		327.827.814,90	13/08/2025	05/05/2026
Estabilidad de la obra		218.551.876,60	05/01/2026	05/01/2031

Póliza No. CVA-100005556 – Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPARO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	22/08/2025	427.050.000	13/08/2025	05/01/2026

3. MODIFICACIONES

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIÓN 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00	\$74.637.460	\$ 223.912.380	-	-	3,00	\$ 223.912.380
2.0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00	\$102.380.550	\$ 921.424.950	-	-	9,00	\$ 921.424.950
3.0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00	\$5.644.900	\$ 101.608.200	-	-	18,00	\$ 101.608.200
4.0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	14,00	\$1.371.230	\$ 19.197.220	(3,00)	\$ (4.113.690)	11,00	\$ 15.083.530
5.0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$1.875.380	\$ 16.878.420	2,00	\$ 3.750.760	11,00	\$ 20.629.180
6.0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	9,00	\$2.796.390	\$ 25.167.510	2,00	\$ 5.592.780	11,00	\$ 30.760.290
7.0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00	\$25.372.610	\$228.353.490	-	-	9,00	\$ 228.353.490
8.0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00	\$ 2.228.250	\$ 31.195.500	-	-	14,00	\$ 31.195.500

9,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00	\$ 1.999.710	\$ 7.998.840	-	-	4,00	\$ 7.998.840
10,0	Desmante de Controlador y Cámara	und	4,00	\$ 274.240	\$ 1.096.960	-	-	4,00	\$ 1.096.960
11,0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	1,00	\$ 342.800	\$ 342.800	-	-	1,00	\$ 342.800
12,0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, muflas, pigtail.	m	857,00	\$ 48.720	\$ 41.753.040	143,00	\$ 6.966.960	1.000,00	\$ 48.720.000
13,0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	3,00	\$ 20.797.000	\$ 62.391.000	(1,00)	\$ (20.797.000)	2,00	\$ 41.594.000
14,0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00	\$ 39.560.608	\$ 39.560.608	-	-	1,00	\$ 39.560.608
OBRA EXTRA									
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	m		\$ 28.495		301,81	\$ 8.600.190	301,81	8.600.190
COSTO TOTAL MEJORAMIENTO					\$ 1.720.880.918		-		\$ 1.720.880.918
COSTO DIRECTO					\$ 1.720.880.918		-		\$ 1.720.880.918
A				22%	\$ 378.593.802	22%	-	22%	\$ 378.593.802
U				5%	\$ 86.044.046	5%	-	5%	\$ 86.044.046
TOTAL OBRA					\$ 2.185.518.766		-		\$ 2.185.518.766

4. ACTIVIDADES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.
1,0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00
2,0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00
3,0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00
4,0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	11,00
5,0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00
6,0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00
7,0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00
8,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00
9,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00
10,0	Desmante de Controlador y Cámara	und	4,00
11,0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	1,00

12,0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 auto soportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, mufas, pigtail.	m	1.000,00
13,0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	2,00
14,0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	m	301,81

5. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Los trabajos se iniciaron, de acuerdo a lo indicado en Acta de Inicio, el 13 de agosto de 2025, y vienen desarrollándose según lo pactado, y el cual se ha venido contando con el acompañamiento permanente y seguimiento a la ejecución de los trabajos por parte de personal FONDESER, de la interventoría, verificando que se dé cumplimiento a lo pactado, se construya en los sitios indicados y según las Especificaciones Técnicas del Contrato velando así por una adecuada ejecución de los trabajos; las actividades realizadas y sus respectivas cantidades de obra ejecutadas para el periodo del presente informe son las relacionadas a continuación:

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.4	
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UN.	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1,0	Suministro e instalación de Cabezote AMU LITE, incluye sistema de iluminación, sistema de audio y control, sistema de comunicaciones, una cámara PTZ, una cámara fija y licenciamiento anual	und	3,00	\$ 223.912.380		\$0
2,0	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	und	9,00	\$ 921.424.950	0,60	\$61.428.330
3,0	Instalación anclaje con platina. Incluye excavación y vaciado en concreto	und	18,00	\$ 101.608.200		\$0
4,0	Construcción caja de paso con tapa. Incluye herraje, excavación y vaciado en concreto	und	11,00	\$ 15.083.530		\$0
5,0	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00	\$ 20.629.180	0,30	\$ 562.614
6,0	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	und	11,00	\$ 30.760.290	1,00	\$2.796.390

7,0	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	und	9,00	\$ 228.353.490	0,80	\$20.298.088
8,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	und	14,00	\$ 31.195.500	14,00	\$31.195.500
9,0	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	und	4,00	\$ 7.998.840	4,00	\$7.998.840
10,0	Desmante de Controlador y Cámara	und	2,00	\$ 548.480	2,00	\$548.480
11,0	Reubicación de Controlador y Cámara	und	-	\$ 0	-	\$0
12,0	Suministro e instalación de metro de fibra monomodo 12 hilos span 200 autosoportada para instalación aérea helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, enfrentadores, mufas, pigtail.	m	1.000,00	\$ 48.720.000		\$0
13,0	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	und	2,00	\$ 41.594.000	0,40	\$8.318.800
14,0	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	und	1,00	\$ 39.560.608	1,00	\$39.560.608
OBRA EXTRA						
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	m	333,09	\$9.491.470	213,00	\$6.069.435
COSTO TOTAL MEJORAMIENTO				\$ 1.720.880.918		\$ 178.777.085
		COSTO DIRECTO		\$ 1.720.880.918	COSTO DIRECTO	\$178.777.085
		A	22%	\$ 378.593.802	22%	\$39.330.959
		U	5%	\$ 86.044.046	5%	\$8.938.854
		TOTAL OBRA		\$ 2.185.518.766	TOTAL ACTA No. 4	\$227.046.898
					AMORTIZACIÓN	\$68.114.069
					VALOR ACTA No. 4	\$158.932.829

5.1. Actividades ítem 2 (Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
------	-------------	----------------------	--------------------	-----	---------

2	Suministro e instalación sistema LPR para dos sentidos viales, incluye sistema de comunicaciones y licenciamiento anual	9	0,6	und	Se realiza la instalación y configuración del sistema LPR para los puntos: Lejos del Nido, Pista de Motocross, Alto de La Guija, El Tablero, Casas Viejas, Carrizales
---	---	---	-----	-----	---

LEJOS DEL NIDO



PISTA DE MOTOCROSS



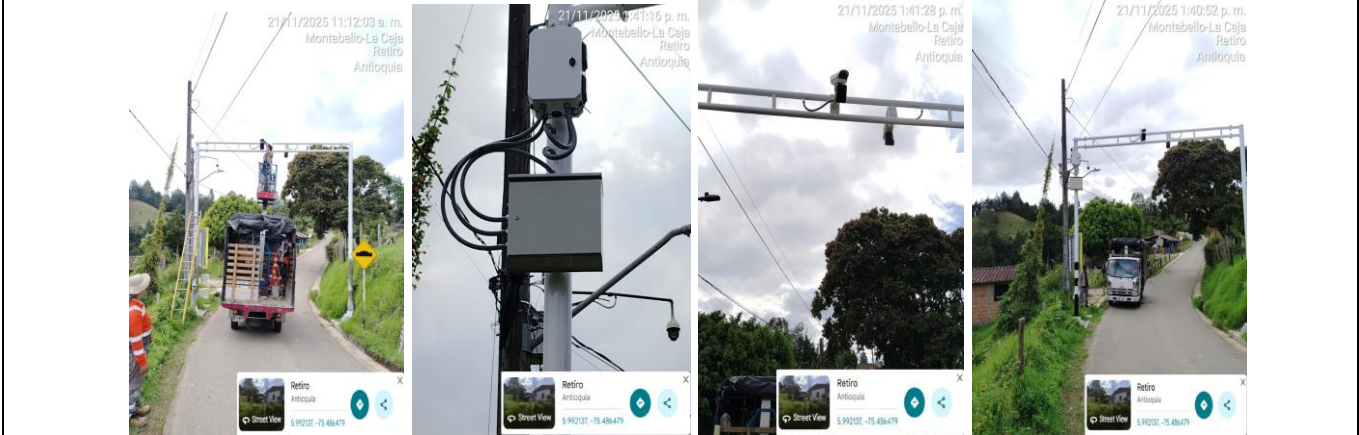
ALTO DE LA GUIJA




EL TABLERO




CASAS VIEJAS



CARRIZALES

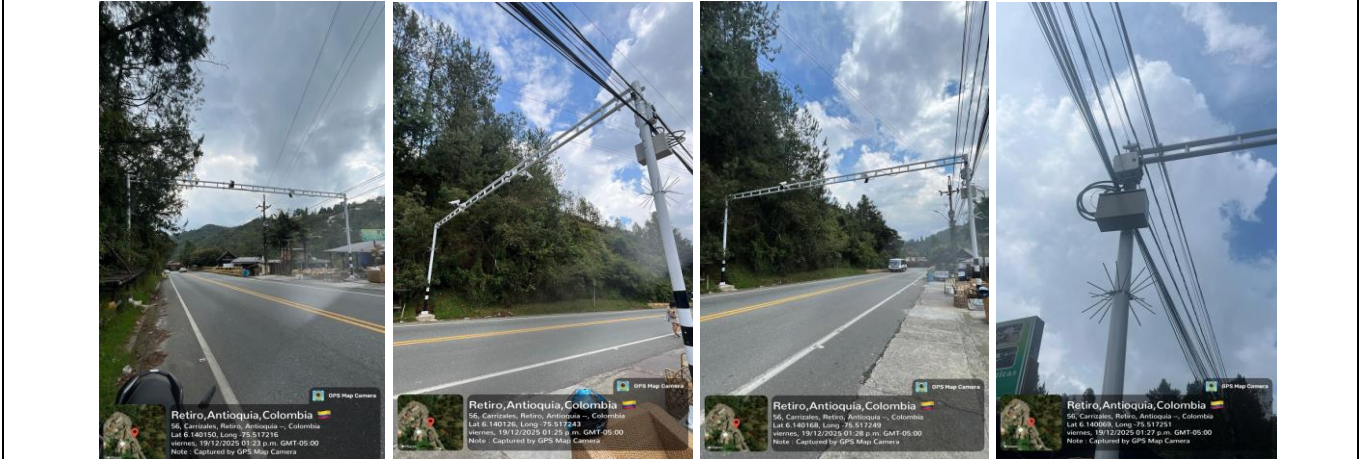

Plataformas funcionando correctamente.

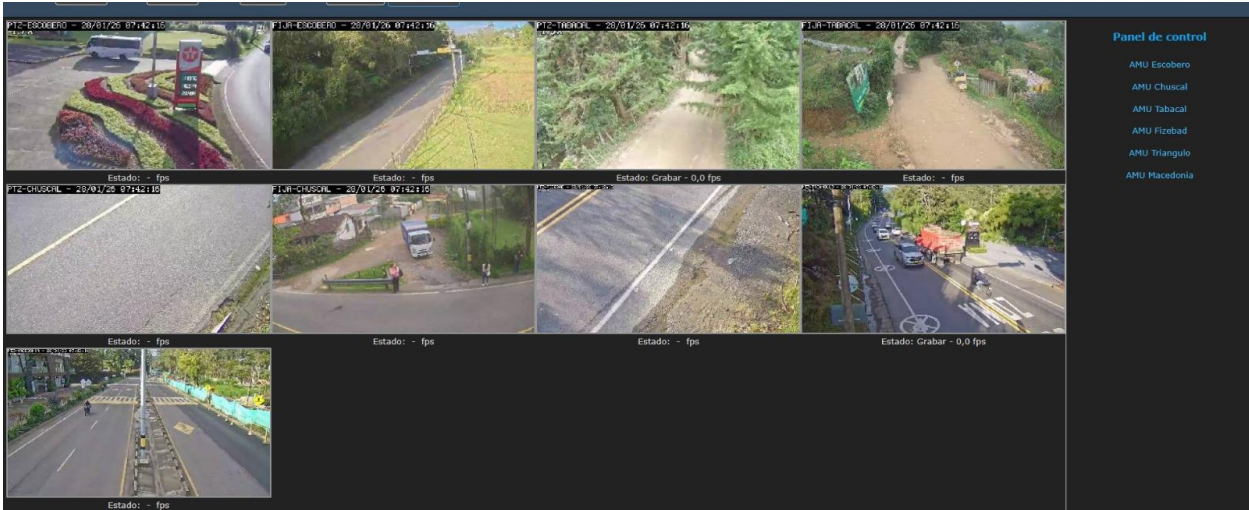

Admin
v.5.5.1.23

- Info. Sistema
- Incidencias
- Tramos
- Alarmas
- Sanciones
- Ocupación
- Informes
- Configuración

Últimos registros

Fecha desde: 28/1/2026 | Hora desde: 12:00:00 a. m. | Fecha hasta: 28/1/2026 | Hora hasta: 11:59:59 p. m. | Gestionar consultas

Filtros extra

Cámara	Fecha	Matrícula	Imagen	Fiabilidad	Altura carácter	País	Clase	Marca	Modelo
MACEDONIA LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:39	JZ0129		96,70	40,33	Colombia	Coche	MAZDA	MX-5
EL TRIANGULO LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:31	JXQ013		96,25	29,67	Colombia	Coche	FORD	ESCAPE
CHUSCAL LPR ENTRADA	28/01/2026 07:52:05	DJR86		90,21	23,20	Colombia	Moto	Desconocido	Desconocido
ESCOBERO LPR SALIDA	28/01/2026 07:52:04	LCW502		99,90	35,17	Colombia	Coche	TOYOTA	COROLLA
LEJOS DEL NIDO LPR SALIDA	28/01/2026 07:52:14	GZF07H		97,52	21,50	Colombia	Moto	Desconocido	Desconocido
CARRISALES LPR SALIDA	28/01/2026 07:49:28	VV594		83,37	45,50	Colombia	Camión	Desconocido	Desconocido
FIZEBAD LPR ENTRADA	28/01/2026 07:52:30	QHJ02H		96,28	22,00	Colombia	Moto	Desconocido	Desconocido
EL TRIANGULO LPR SALIDA	28/01/2026 07:51:29	FQU191		98,26	25,33	Colombia	Coche	FIAT	PALIO
EL TRIANGULO LPR ENTRADA	28/01/2026 07:51:39	KRU234		99,90	30,50	Colombia	Coche	HONDA	HR-V

5.2. Actividades ítem 5 (Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
5	Construcción acometida eléctrica, incluye suministro de gabinete de potencia y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	11	0,3	und	Se realiza la construcción de acometida, instalación de gabinete de potencia en el punto Carrizales

CARRIZALES



5.3. Actividades ítem 6 (Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
6	Construcción puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	11	1	und	Se realiza la construcción a puesta a tierra en Carrizales.

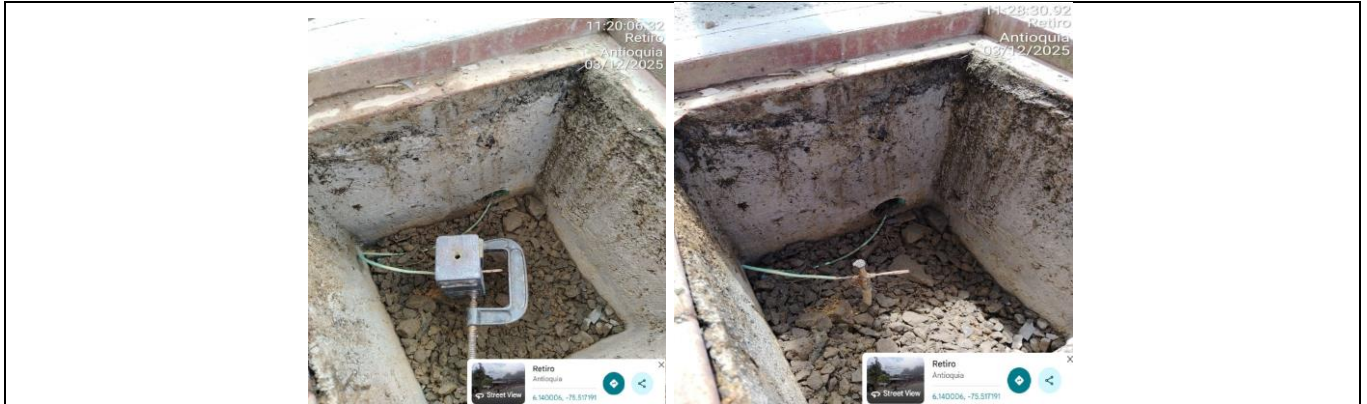

5.4. Actividades ítem 7 (Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
7	Suministro, transporte e instalación de Estructura Tipo CERCHA	9	0,8	und	<i>Se instalan en sitio correctamente las estructuras de los puntos Casas viejas, Alto de la Guija, El Tablero y Carrizales.</i>

CASAS VIEJAS



ALTO DE LA GUIJA



EL TABLERO




CARRIZALES

5.5. Actividades ítem 8 (Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
8	Suministro, transporte e instalación de Aviso Reflectivo 3X1m	14	14	und	<i>Se instalaron los avisos reflectivos en los puntos Alto del Escobero, Carrizales, Cementerio, Lejos del Nido, Vereda el chuscal, Pista de motocross, Casas viejas. 2 avisos por punto.</i>

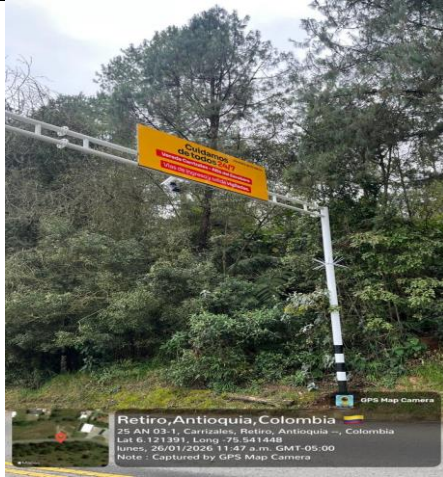
ESCOBERO



CARRIZALES



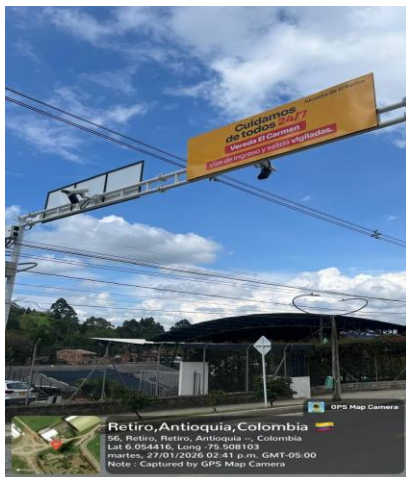CEMENTERIO



LEJOS DEL NIDO



EL CHUSCAL



PISTA MOTOCROSS



CASAS VIEJAS



5.6. Actividades ítem 9 (Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
------	-------------	----------------------	--------------------	-----	---------

9	Suministro, transporte e instalación de Aviso Sencillo 2x1m	4	4	und	Se instalaron los avisos reflectivos en los puntos El Tablero y Alto de la Guija. 2 avisos por punto.
---	---	---	---	-----	---

ALTO DE LA GUIJA



EL TABLERO



5.7. Actividades ítem 10 (Desmonte de Controlador y Cámara)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
10	Desmante de Controlador y Cámara	2	2	und	Se realizó el desmontaje de 1 cámara PTZ y 1 Cámara fija en el punto del escobero y s ele entregó al municipio. Incluye accesorios como brazos y radio enlace.



ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS

FECHA:

INFORMACIÓN

Alcaldía

MUNICIPIO: El Retiro

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PROYECTO RELACIONADO: LPR-Retiro-2025

ACTIVIDAD RELACIONADA: Entrega de equipos

DETALLE DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS

CANT.	PRODUCTO	OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN
1	Antena de radio enlace de la marca Mikrotik	Se desconoce funcionalidad, Incluye soporte en tubería
1	Cámara PTZ de la marca AVIGILON	Funcional, Incluye brazo extensor
1	Cámara FIJA de la marca AVIGILON	Funcional, Incluye brazo extensor
1	Iluminador de la marca Raytec	Se desconoce funcionalidad
1	Percha con aislador cerámico	En buen estado

ENTREGADO POR:

Nombre: Jhonny Metaute

Cédula 1041176975


Inter-Telco S.A.S



RECIBIDO POR:

 Nombre: *EDGAR MYNERA*

 Cédula: *31603140*

 Entidad: *SEC-SOBORINO*


Firma

5.8. Actividades ítem 13 (Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
------	-------------	----------------------	--------------------	-----	---------

13	Suministro, transporte e instalación de sistema de internet satelital Starlink con servicio por 1 año.	2	0,4	und	Se realiza la instalación de 2 sistemas de internet satelital Starlink en los puntos El Escobero y Partidas Tabacal. Con 1 año de servicio.
----	--	---	-----	-----	---

ESCOBERO




PARTIDAS TABACAL



5.9. Actividades ítem 14 (Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
------	-------------	----------------------	--------------------	-----	---------

14	Suministro, transporte e instalación de pantalla variable RGB outdoor, con 1 año de plataforma de pantalla incluido	1	1	und	Se realiza el suministro e instalación de pantalla variable RGB. Outdoor en el punto Macedonia, incluye 1 año de servicio de la plataforma de gestión.
					

5.10. Actividades ítem OE1 (Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	UND	DETALLE
OE1	Suministro e instalación de metro de fibra Falt Drop incluye helicoidales, cinta bandit, pasadores, tensores, conectores.	333,09	213	und	Se realiza el suministro e instalación de fibra drop para los puntos carrizales y Cementerio (57m y 156m respectivamente)

CARRIZALES



CEMENTERIO



6. INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS

A continuación, se describe el inventario de los elementos tecnológicos instalados.

Orden	Punto	Elemento	Código	Serial
1	LPR el Chuscal	Fuente HLG-120H-24	4870	GC4A8K8836
		Fuente HLG-120H-24	4871	GC4A8K8835
		Fuente LPV-100-12	5002	MC42021919
		Modem	4991	6003665379
		Swiche 5P	4960	242009050013
		UPS	4818	E241122780
		Cámara IP9165-HT-v2	4885	0002D1BB1BB3
		Cámara IP9165-HT-v2	4884	0002D1BB1BB0
		Lente AL-252	4893	NA
		Lente AL-252	4898	NA
		IR CA-8018-2040	4924	CBA1225070098
		IR CA-8018-2040	4923	CBA1225070125
		Carcasa AE-23L	4927	AE23L24120084



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

		Carcasa AE-23L	4926	AE23L24120026		
		Swiche 5P	4983	242009050023		
		Gabinete UPS	4959	NA		
		Gabinete Control	4944	NA		
	AMU Chuscal	Modem	4990	6003660822		
		Swiche 5P	4973	242009050020		
		Fuente LPV-150-12	4995	GC535V4448		
		Fuente RS-25-12	5001	SC543U8531		
		Fuente DRL-48V120W1EN	4847	E148120EN0244901H 4G		
		Parlante	5012	NA		
		Reflector	4323	NA		
		Reflector	4322	NA		
		Gabinete control	4947	NA		
		UPS	4811	E2411122912		
		Gabinete UPS	4957	NA		
		PTZ SD9368-EHL	4851	0002D1ADDD1C		
		FIJA IB9391-EHTV-V2	4850	0002D1C19763		
		Caja AM-71G	4833	AM71G25020102		
		2	LPR el Escobero	Fuente HLG-120H-24	4868	GC4A8K8823
				Fuente HLG-120H-24	4869	GC4A8K8821
Fuente LPV-100-12	5007			MC42021920		
Modem	4986			6003660823		
Swiche 5P	4978			242009050027		
UPS						
Cámara IP9165-HT-v2	4883			0002D1BB1BB1		
Cámara IP9165-HT-v2	4873			0002D1BB1BD6		
Lente AL-252	4896			NA		
Lente AL-252	4892			NA		
IR CA-8018-2040	4921			CBA1225070063		
IR CA-8018-2040	4920			CBA1225070097		
Carcasa AE-23L	4935			AE23L25080040		
Carcasa AE-23L	4934			AE23L25080038		
Gabinete UPS			NA			
Gabinete Control	5029	NA				
		Modem	4988	6003659853		



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

	AMU el Escobero	Swiche 5P	4972	242009050021
		Fuente LPV-150-12	4993	GC514J2967
		Fuente RS-25-12	4997	SC543U8529
		Fuente DRL-48V120W1EN	4845	E148120EN0244901 GYG
		Parlante	5013	NA
		Reflector	4325	NA
		Reflector	5043	NA
		Gabinete control	5034	NA
		UPS	4815	E2411122789
		Gabinete UPS	4949	Na
		PTZ SD9368-EHL	4852/4853	
		FIJA IB9391-EHTV-V2	4849	0002D1C19751
		Caja AM-71G	4832	AM71G25020101
	Starlink el Escobero	Gabinete Starlink	3924	NA
		Antena Starlink	4139	KIT303353688
Swiche 5P iETong		4968	242009050033	
Modem Starlink		4139	WAWC02518975	
3	LPR Cementerio	Conversor Starlink-UTP	4820	NA
		Fuente HLG-120H-24	4867	GC4A8K8826
		Fuente HLG-120H-24	4866	GC4A8K8824
		Fuente LPV-100-12	5008	MC42021916
		Modem	4987	6003660972
		Swiche 5P	4970	242009050039
		UPS		
		Cámara IP9165-HT-v2	4874	0002D1BB1BD7
		Cámara IP9165-HT-v2	4872	0002D1BB1BCE
		Lente AL-252	4891	NA
		Lente AL-252	4907	NA
		IR CA-8018-2040	4919	CBA1225070126
		IR CA-8018-2040	4922	CBA1225070105
		Carcasa AE-23L	4933	AE23L25080039
		Carcasa AE-23L	4932	AE23L24120081
Gabinete UPS				
Gabinete Control	5035	NA		
4		Fuente HLG-120H-24	4861	GC4A8K8831



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

	LPR Lejos del Nido	Fuente HLG-120H-24	4864	GC4A8K8832
		Fuente LPV-100-12	5004	MC42021913
		Modem	5040	6002817389
		Swiche 5P	4979	242009050001
		UPS		
		Cámara IP9165-HT-v2	4889	0002D1BB1BD2
		Cámara IP9165-HT-v2	4888	0002D1BB1BCF
		Lente AL-252	4894	NA
		Lente AL-252	4899	NA
		IR CA-8018-2040	4918	CBA1225070055
		IR CA-8018-2040	4916	CBA1225070099
		Carcasa AE-23L	4929	AE23L24120025
		Carcasa AE-23L	4931	AE23L24120082
		Gabinete UPS		
		Gabinete Control	5036	NA
5	LPR Moto Cross	Fuente HLG-120H-24	4863	GC4A8K8833
		Fuente HLG-120H-24	4854	GC4A8K8834
		Fuente LPV-100-12	5003	MC42021912
		Modem	5039	6002817316
		Swiche 5P	4977	242009050010
		UPS		
		Cámara IP9165-HT-v2	4887	0002D1BB1BB2
		Cámara IP9165-HT-v2	4886	0002D1BB1BD0
		Lente AL-252	4904	NA
		Lente AL-252	4895	NA
		IR CA-8018-2040	4917	CBA1225070087
		IR CA-8018-2040	4912	CBA1225070089
		Carcasa AE-23L	4928	AE23L24120083
		Carcasa AE-23L	4930	AE23L25080037
		Gabinete UPS		
Gabinete Control	5028	NA		
6	LPR Casas Viejas	Fuente HLG-120H-24	4865	GC4A8K8828
		Fuente HLG-120H-24	4862	GC4A8K8830
		Fuente LPV-100-12	5009	MC42021914
		Modem	5038	6002817012



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

		Swiche 5P	4971	242009050028
		UPS		
		Cámara IP9165-HT-v2	4877	0002D1BB1BD5
		Cámara IP9165-HT-v2	4875	0002D1BB1BB8
		Lente AL-252	4900	NA
		Lente AL-252	4897	NA
		IR CA-8018-2040	4914	CBA1225050004
		IR CA-8018-2040	4913	CBA1225070056
		Carcasa AE-23L	4943	AE23L24120073
		Carcasa AE-23L	4942	AE23L24120076
		Gabinete UPS		
		Gabinete Control	4945	NA
		7	AMU Partidas Tabacal	Modem
Swiche 5P	4967			242009050007
Fuente LPV-150-12	4996			GC535V4447
Fuente RS-25-12	4999			SC543U8672
Fuente DRL-48V120W1EN	4846			E148120EN0244901 GXG
Parlante	5014			NA
Reflector	4327			NA
Reflector	4324			
Gabinete control	5030			NA
UPS	4808			E2411122853
Gabinete UPS	4951			
PTZ SD9368-EHL	4852/4853			
FIJA IB9391-EHTV-V2	4848			0002D1BBDC0E
Caja AM-71G	4831			AM71G25020104
Starlink Partidas Tabacal	Gabinete Starlink			
	Antena Starlink			
	Modem Starlink			
	Conversor Starlink-UTP			
8	LPR Alto la Guija		Fuente HLG-120H-24	4859
		Fuente HLG-120H-24	4860	GC4A8K8827
		Fuente LPV-100-12	5006	MC42021915
		Modem	5042	6002817193



INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

		Swiche 5P	4974	242009050022
		UPS		
		Cámara IP9165-HT-v2	4876	0002D1BB1BB6
		Cámara IP9165-HT-v2	4878	0002D1BB1BB7
		Lente AL-252	4906	NA
		Lente AL-252	4905	NA
		IR CA-8018-2040	4915	CBA1225070090
		IR CA-8018-2040	4911	CBA1225070106
		Carcasa AE-23L	4941	AE23L24120018
		Carcasa AE-23L	4940	AE23L24120020
		Gabinete UPS		NA
		Gabinete Control	5032	NA
9	LPR Tablero	Fuente HLG-120H-24	4855	GC4A8K8825
		Fuente HLG-120H-24	4856	GC4A8K8838
		Fuente LPV-100-12	5005	MC42021911
		Modem	5041	6002816597
		Swiche 5P	4980	242009050037
		UPS		
		Cámara IP9165-HT-v2	4879	0002D1BB1BB9
		Cámara IP9165-HT-v2	4880	0002D1BB1BD3
		Lente AL-252	4890	NA
		Lente AL-252	4901	NA
		IR CA-8018-2040	4909	CBA1225070100
		IR CA-8018-2040	4910	CBA1225070088
		Carcasa AE-23L	4939	AE23L24120017
		Carcasa AE-23L	4938	AE23L24120074
		Gabinete UPS		
		Gabinete Control	5031	NA
10	LPR Carrisales	Fuente HLG-120H-24	4858	GC4A8K8822
		Fuente HLG-120H-24	4857	GC4A8K8829
		Fuente LPV-100-12	4992	GC535V4449
		Modem	4989	6003660359
		Swiche 5P	4981	242009050025
		UPS		
		Cámara IP9165-HT-v2	4881	0002D1BB1BB4

		Cámara IP9165-HT-v2	4882	0002D1BB1BB5
		Lente AL-252	4902	NA
		Lente AL-252	4903	NA
		IR CA-8018-2040	4925	CBA1225070064
		IR CA-8018-2040	4908	CBA1225050003
		Carcasa AE-23L	4937	AE23L24120019
		Carcasa AE-23L	4936	AE23L24120075
		Gabinete UPS		
		Gabinete Control	4946	NA

7. CAPACITACIONES

Se realizaron las respectivas capacitaciones respectivas al equipo designado por el cliente, para las plataformas de VMS, LPR y Gestión de Pantalla.





INTER-TELCO

Su aliado tecnológico

	FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES	CÓDIGO: GC FT 02
		Version 1.0
		Página 1 de 1

Términos y condiciones:
Al firmar este documento los participantes están de acuerdo con la información suministrada, recibida y aprendida. Además, exoneran a Inter-telco de soporte adicional después de finalizados los acuerdos vigentes.

Proceso: Publicidad El Retiro	Temas Tratados: Capacitación software publicidad			
Capacitador (es): Sergio Quintero	Firma del Capacitador (es): Sergio Quintero			
Fecha: 14/01/2026	Lugar: El Retiro			
Hora de Inicio: 9:30 am	Hora de Finalización: 9:45 am			
N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Número de Cédula	Firma de Asistencia
1	Cristian Ovaco Vienna	Asesor Alcañal	101262710	<i>Cristian Ovaco Vienna</i>
2				
3				

	FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES	CÓDIGO: GC FT 02
		Version 1.0
		Página 1 de 1

Términos y condiciones:
Al firmar este documento los participantes están de acuerdo con la información suministrada, recibida y aprendida. Además, exoneran a Inter-telco de soporte adicional después de finalizados los acuerdos vigentes.

Proceso: LPR El Retiro	Temas Tratados: Capacitación Neural Jobs y Satelo			
Capacitador (es): Eli Jara Cueros A	Firma del Capacitador (es): Eli Jara Cueros A.			
Fecha: 14/01/2026	Lugar: El Retiro			
Hora de Inicio: 9:30 AM	Hora de Finalización: 10:30 AM			
N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Número de Cédula	Firma de Asistencia
1	Lazarus Mirra	OP medios	15442179	<i>Lazarus Mirra</i>
2	Josman Zapata	coordinador	14.252.446	<i>Josman Zapata</i>
3	Diego A. Cordoba	ingeniero	1036653212	<i>Diego</i>
4				

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 2.185.518.766
ANTICIPO	\$ 655.655.629,80
VALOR INFORME 001	\$ 807.686.745
VALOR INFORME 002	\$ 1.040.682.606
VALOR INFORME 003	\$110.099.170
VALOR INFORME 004	\$227.046.898
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.185.515.419
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA 3	\$ 68.115.073
VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	\$ 158.931.825
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 3.346



Ing. NICOLAS POSADA
Director de Ingeniería y Operaciones
Inter-telco S.A.S



INTERVENTORÍA
SCS Consultoría e Interventoría de Proyectos
de Ingeniería S.A.S
