

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander	INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER
--	---

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL No 9

CONTRATO DE OBRA	087-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$64.028.082.699,20)
ANTICIPO 40%	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA (\$25.611.233.079,68)
VALOR ADICIONAL	SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE (\$ 665.389.158,15)
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA N.I.T 900.067.169-9 R.L. CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA C.C. 7.169.545
CONTRATISTA	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501
SUPERVISOR	ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSÉ ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ROGER RODRÍGUEZ MORENO
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA** como contratista y avalada por **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL** como interventoría, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:



ACTIVIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
3,0	ELEMENTOS EN CONCRETO		
3,02	ACERO DE REFUERZO FG	KG	84,40
3,03	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 5000 KG/CM2, 500 MP Q6	M2	836,03
3-NP75	CONCRETO DE 4000 PSI PARA PEDESTALES	M3	1,58
3-NP76	CONCRETO DE 4000 PSI PARA RELLENO DE COLUMNAS METALICAS	M3	25,64
4,0	ESTRUCTURA METALICA		
4-NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	1664,17
4-NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE VIGAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	11951,45
4-NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE RIOSTRAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	4241,13
4-NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONEXIONES DE COLUMNAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Y/O A36	KG	31209,83
4-NP71	SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMINA DE METALDECK 2" CALIBRE 20 INCLUYE CONECTOR DE CORTANTE 5/8" SOLDADO	M2	604,45
5,0	CUBIERTA		
5,01	CUBIERTA EN TEJA CASTELLANA, INCLUYE REMATES LIMAHOYAS CUMBRERA Y LIMATESAS	M2	877,50
7,0	INSTALACIONES SANITARIAS		
7-NP81	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DRENAJE DE 60X60 CM DE TUBERIA PERFORADA DE 6 PULG. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA FILTRANTE DE 1" A 3"	ML	30,77
9,0	RED CONTRA INCENDIO		
9,46	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETRO HASTA 2"	ML	69,40
9,47	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	26,25
10,0	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		
10,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AISLAMIENTO ESTANDAR 10kVA PARA QUIROFANO.	UND	2,00
12	CARPINTERIA (PUERTAS - VENTANAS - DIVISIONES Y MUEBLES)		
NP147	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA HOJA (APERTURA UNIDIRECCION) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	28,64
NP148	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA CON DOBLE HOJA (APERTURA VAIVEN) RH (PMVTFPS070 CON CANTO RIGIDO 2MM (ANCHO:1.0 MT, ALTO:2.27MT)	M2	9,60
28,0	ASCENSORES		
NPS 8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS	UND	2,00



PERIODO DE EJECUCIÓN:

Las actividades reportadas por parte del contratista de obra y avaladas por interventoría correspondientes con el acta parcial No 9 se desarrollaron durante el periodo de **26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2026**

AVANCE DE OBRA:

Durante el periodo de ejecución se realizaron los reportes de información de avance y cargue de la información a la plataforma PISIS - SISPRO según lo siguiente:

- Del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2025

Avance programado: 69,00%

Avance ejecutado: 59,42%

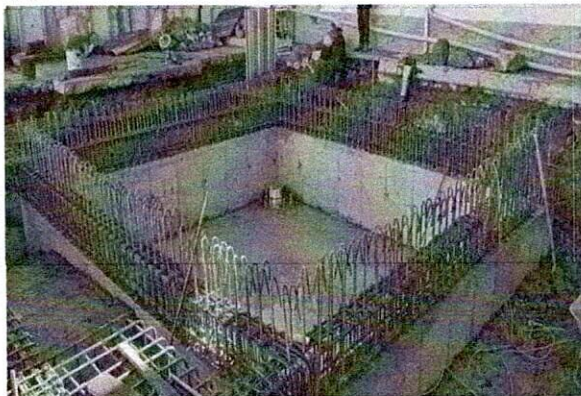
En el módulo A se continuaron actividades de instalación de estructura metálica por medio de la fabricación e instalación de elementos como columnas compuestas y vigas, así mismo se adelantaron actividades de construcción de mamposterías, elementos de confinamiento, disposición de pases y regatas para la instalación de redes hidrosanitarias.

En el módulo D

- Se realiza adecuación de espacio de piso 1 del módulo, con la finalidad de habilitar el espacio para el traslado temporal de servicios por contingencia, una vez que se requieren zonas existentes para la construcción del punto fijo del modulo A
- Se continúan realizando actividades correspondientes con la construcción de elementos de estructura metálica para punto fijo del módulo, paralelamente se desarrollaron actividades de acabados arquitectónicos en el interior del módulo.

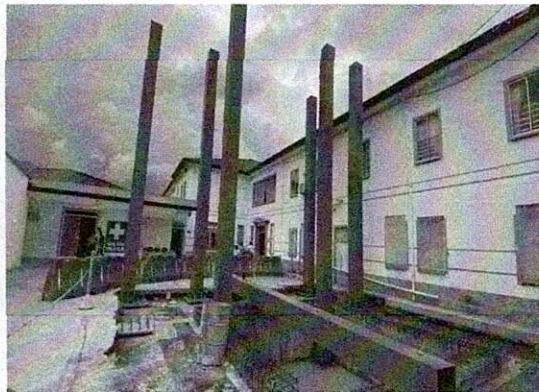
REGISTRO FOTOGRAFICO

ELEMENTOS EN CONCRETO





ESTRUCTURA METÁLICA



CUBIERTA

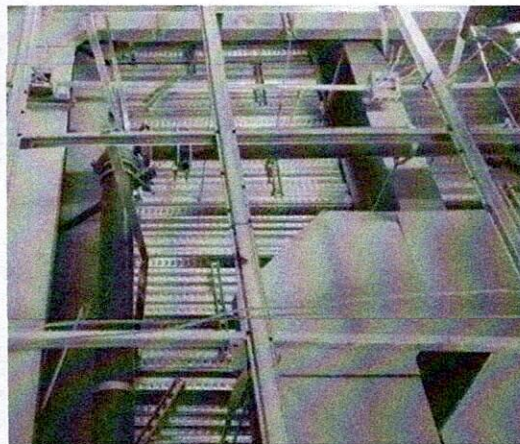
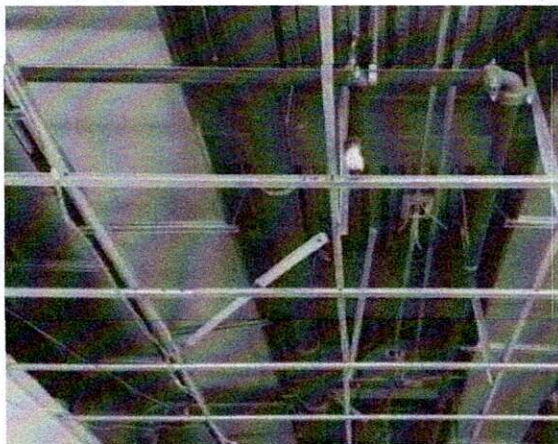


INSTALACIONES SANITARIAS





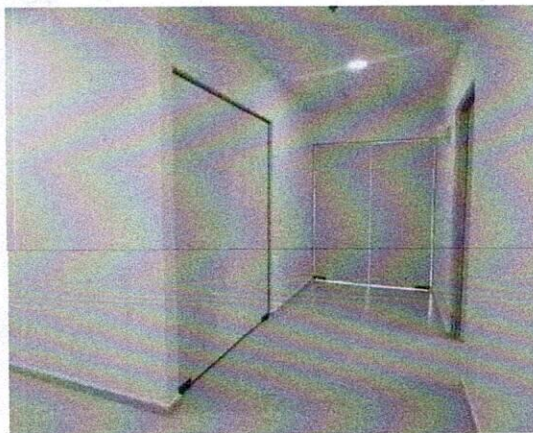
RED CONTRA INCENDIO



INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

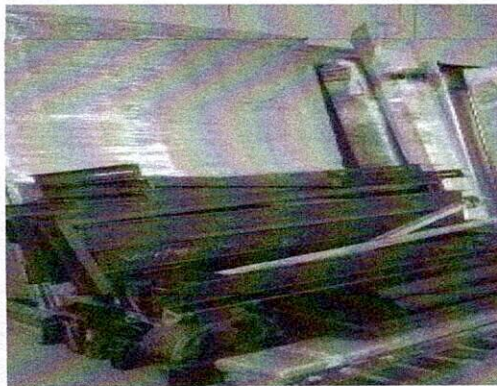


CARPINTERÍA





SUMINISTROS



BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO	
Anticipo 40%:	\$ 25.611.233.080,00
Acta parcial 1:	\$ 10.681.193.566,88
Acta parcial 2:	\$ 3.054.273.511,53
Acta parcial 3:	\$ 4.448.460.052,02
Acta parcial 4:	\$ 1.403.466.358,77
Acta parcial 5:	\$ 3.180.168.623,59
Acta parcial 6:	\$ 4.305.543.655,45
Acta parcial 7:	\$ 3.754.076.678,63
Acta parcial 8:	\$ 1.741.557.083,91
Acta parcial 9:	\$ 3.483.607.422,08
Total amortizado	\$ 14.420.938.781,14
Total pagado:	\$ 36.052.346.952,86
Saldo restante:	\$ 28.641.124.904,49

Avance financiero		55,73%
Avance Físico		59,42%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga - Santander

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER

Una vez revisadas las cantidades de obra ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato No 087-23 cuyo objeto es "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA - SANTANDER", en conjunto con el contratista **CONSORCIO DE GARCÍA ROVIRA** y la interventoría al contrato **UNIÓN TEMPORAL INTER HOSPITAL** se considera conveniente realizar el pago correspondiente al acta parcial No 9 de la siguiente forma:

Periodo de ejecución: del 26/02/2025 al 25/03/2026 ✓

Valor acta parcial No 9: \$ 3.483.607.422,08 ✓

Amortización anticipo 40%: \$ 1.393.442.968,83 ✓

Valor a pagar en la presenta acta: \$ 2.090.164.453,25 ✓

Se expide en Málaga, al día dieciocho (18) del mes de abril del 2026.

Ing. JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR

ROGER RODRIGUEZ M

Ing. ROGER RODRÍGUEZ MORENO
Apoyo a la Supervisión E.S.E HRGR

ACTA PARCIAL No. 9



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander

ACTA PARCIAL DE OBRA No 9
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA – SANTANDER.

ACTA PARCIAL DE OBRA N°9

CONTRATO No.:	087 DE 2023							
OBJETO:	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA / MÁLAGA - SANTANDER							
VALOR INICIAL:	SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$64.028.082.699,20)							
VALOR ADICIONAL:	SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE (\$ 665.389.158,15)							
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y SEIS (36) MESES							
PLAZO ADICIONAL:	N/A							
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA Nit: 901740580-3 R.L. CARLOS ADOLFO GUTIÉRREZ PINTO C.C. 91.273.201							
SUPERVISOR:	ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ							
APOYO A LA SUPERVISION:	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA							
APOYO A LA SUPERVISION:	ROGER RODRÍGUEZ MORENO							
INTERVENTOR CONTRATO:	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL Nit: 901746842-5 R.L. CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES C.C 91.159.501							
ANTICIPO (40%)	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA (\$25.611.233.079,68)							
FECHA DE INICIACION:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							
ACTA DE SUSPENSION	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACION:	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							
MUNICIPIO:	MALAGA, SANTANDER							

En Málaga Santander, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2026, se reunieron, **ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ**, en calidad de Supervisor y el señor **CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO** Representante Legal de **CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA**, como Contratista, el señor **CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES**,




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander


ACTA PARCIAL DE OBRA No 9
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MÁLAGA – SANTANDER.


Representante Legal de **UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL**, como Interventor, el Ingeniero **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA** como Apoyo a la supervisión, el ingeniero **ROGER RODRÍGUEZ MORENO** como a poyo a la supervisión, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial No. 9 correspondiente al periodo **(26 de febrero del 2025) al (25 de marzo del 2026)** del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09	\$ 3.483.607.422,08 /
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 40%	\$ 1.393.442.968,83 /
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 2.090.164.453,25 /
SON: DOS MIL NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$2.090.164.453,25)	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:




CARLOS ADOLFO GUTIERREZ PINTO
CONTRATISTA


CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES
INTERVENTOR


ZAIDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
SUPERVISOR


JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ROGER RODRIGUEZ M
ROGER RODRÍGUEZ MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectó:	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA Apoyo a la Supervisión	
Proyectó:	ROGER RODRÍGUEZ MORENO Apoyo a la Supervisión	ROGER RODRIGUEZ M
Revisó:	KAREN ANDREA MÉNDEZ ESPINOSA Asesora jurídica E.S.E HRGR	

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
	VERSIÓN	1
	FECHA	06/02/2025
	PÁG	1 de 12

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA No. 087-2023

1. INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	23 de abril de 2026
Informe de Supervisión:	009
Periodo de Seguimiento:	Del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2026
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT	901.740.580 - 3
Representante legal:	Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto
C.C:	Cc # 91.273.201
Fecha de inicio:	04 de Septiembre de 2023
Fecha de finalización:	03 de Septiembre de 2026
Valor del Contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor de adición:	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 // 28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas:	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del Anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****H**ospital **R**egional **G**arcía **R**ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 2 de 12

Pago de seguridad social:

Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de Paz y Salvo de aportes parafiscales, de fecha 25 de marzo de 2026; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondiente al periodo del 26 de febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026, así:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO
9501285224	Pensión, ARL y CC - febrero de 2026 Salud – marzo de 2026 	19/03/2026
1080345469	Pensión, ARL y CC - febrero de 2026 Salud – marzo de 2026 	24/03/2026
84083000	Pensión, ARL y CC - febrero de 2026 Salud – marzo de 2026	24/03/2026

3. REVISION TECNICA:**Descripción del alcance del contrato:**

Obligación: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante

Dentro de las Actividades Ejecutadas en el Período de esta supervisión están:

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****H**ospital **R**egional **G**arcía **R**ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 3 de 12

Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación:

- a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud)
- b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU'S (Según proyecto radicado ante Minsalud)
- c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra
- d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud)
- e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos
- f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales
- g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos
- h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios
- i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios
- j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases
- k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado

Del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2026.

Avance programado: 69,00%

Avance ejecutado: 59,42%

En el módulo A

se continuaron actividades de instalación de estructura metálica por medio de la fabricación e instalación de elementos como columnas compuestas y vigas, así mismo se adelantaron actividades de construcción de mamposterías, elementos de confinamiento, disposición de pases y regatas para la instalación de redes hidrosanitarias.

En el módulo D

Se realiza adecuación de espacio de piso 1 del módulo, con la finalidad de habilitar el espacio para el traslado

temporal de servicios por contingencia, una vez que se requieren zonas existentes para la construcción del punto fijo del módulo A

Se continúan realizando actividades correspondientes con la construcción de elementos de estructura metálica para punto fijo del módulo, paralelamente se desarrollaron actividades de acabados arquitectónicos en el interior del módulo.

Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:

Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 26 de febrero de 2026 a 25 de marzo de 2026; soportadas por el Apoyo de la Supervisión Ingeniero José Alejandro Sandoval Medina y el Ingeniero Roger Rodríguez Moreno con Informe Técnico de fecha 18 de abril de 2026.

De acuerdo con el plazo de ejecución contractual el avance de las actividades ejecutadas fue del 59.49%, siendo este avance físico del proyecto, y el avance financiero del 55.74%, a 25 de marzo de 2026 respectivamente.

Además, se realizan seguimientos semanales al avance físico del proyecto, y se realizan comité de Obra.

El día 3 de marzo de 2026 se realizó mesa técnica con la Contraloría general de la Republica



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	4 de 12



ACTA DE REUNIÓN

MESES DE TRABAJO INSTITUCIONAL
PROYECTO: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA - MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER - CONTRATO No. 957-2023

FECHA: 10 de marzo de 2025

HORA: 10:00 AM

Modalidad: Virtual

OBJETIVO: Realizar seguimiento al estado actual del proyecto "Adecuación y ampliación de la estructura física de la E.S.E. Hospital Regional García Rovira", con el propósito de verificar el avance físico, financiero y contractual de la obra, medir el cumplimiento de los compromisos establecidos en la mesa realizada el 21 de enero de 2025, identificar hitos que puedan afectar la ejecución del proyecto y definir acciones de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República.

ESTADO ACTUAL:

Desde la mesa de seguimiento se presentaron los avances actualizados del proyecto con fecha al 25 de febrero de 2025, informándose lo siguiente:

Avance físico: 54.35%

Avance financiero: 31.85%

Avance programado: 33.85%

Duración: 36 meses

Inicio de obra: 4 de septiembre de 2023

Fecha estimada de terminación: 31 de septiembre de 2025

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, actualmente se trabaja en la formulación de un plan de contingencia que permita recuperar el avance económico hasta al avance programado.

Asimismo, se informó que se encuentra en proceso de revisión una Modificación No. 5 del contrato, la cual busca reestablecer la continuidad de la ejecución de actividades del proyecto, particularmente en los compromisos eléctricos y mecánicos de la obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión fue iniciada por Olga Lucía Rincón Forero, coordinadora de gestión del equipo de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República - Oficina Documental Santander, quien recordó que el proyecto se encuentra bajo seguimiento por parte del nivel central de la entidad.

Incidentalmente se permitió a revisar los compromisos establecidos en la mesa de trabajo realizada el 21 de enero de 2025, dentro de las cuales se encontraron:

- Elaboración de un balance técnico-financiero detallado por módulos del proyecto, con el fin de establecer el estado real de ejecución de la obra y los recursos necesarios para su culminación.



- Validación de dicho balance por parte de la interventoría, consolidando la información técnica para su presentación ante la entidad contratante y la Contraloría General de la República.
- Revisión por parte del Hospital Regional García Rovira sobre la viabilidad de gestionar recursos adicionales, en caso de evidenciarse insuficiencia presupuestal.
- Actualización de la programación de obra.

Durante la reunión también se planteó como nuevo compromiso establecer contacto con la Personería Municipal de Málaga, con el fin de identificar si existen ciudadanos interesados en constituir una veeduría ciudadana que acompañe el seguimiento al proyecto.

Posteriormente, representantes de la interventoría y del proyecto validaron la necesidad de realizar ajustes al acta de la mesa anterior, debido a inconsistencias en los porcentajes de avance consignados en dicho documento.

Se aclaró que en el acta del 21 de enero se registró erróneamente un avance físico del 38%, cuando en realidad el avance reportado para esa fecha correspondía a 51.02% de avance físico y 47.86% de avance financiero.

En ese sentido, se solicitó realizar la corrección correspondiente en el acta anterior para reflejar los valores reales presentados durante esa sesión.

SITUACIONES IDENTIFICADAS

Durante la mesa de seguimiento se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

Se evidenció la necesidad de contar con un balance técnico-financiero detallado del proyecto, con el fin de determinar con precisión el estado de ejecución por módulos y establecer los recursos requeridos para la culminación total de la obra.

Igualmente, se señaló que dicho análisis permitirá establecer si existe suficiencia presupuestal, situación que requerirá la gestión de recursos adicionales por parte de la entidad contratante.

Adicionalmente, se reconoció la existencia de un desfase entre el avance programado y el avance físico real del proyecto, lo cual motivó la formulación de un plan de contingencia orientado a optimizar el desarrollo de las actividades pendientes.

COMPROMISOS ACTUALES

Durante la mesa de seguimiento se establecieron los siguientes compromisos:

Contratista de obra

Elaborar y entregar un balance técnico-financiero detallado del proyecto por módulos, que permita identificar el estado real de ejecución y los recursos requeridos para la terminación del proyecto.

Interventoría

Validar el balance técnico-financiero presentado por el contratista, consolidar la información técnica y presentar informe a la entidad contratante y a la Contraloría General de la República.

E.S.E. Hospital Regional García Rovira

Analizar la viabilidad de gestionar recursos adicionales en caso de que el balance técnico-financiero evidencie insuficiencia presupuestal para la culminación del proyecto.



Contraloría General de la República

Continuar realizando seguimiento preventivo al desarrollo del proceso y controlar con la Personería Municipal de Málaga la posibilidad de promover la constitución de una veeduría ciudadana.

CERRE

La mesa permitió actualizar la información sobre el estado del proyecto de adecuación y ampliación del Hospital Regional García Rovira, evidenciándose que la obra presenta avances en su ejecución, aunque se identifica un desfase entre el avance programado.

En ese sentido, se destacó la importancia de consolidar un balance técnico-financiero del proyecto que permita determinar el estado real de la obra, validar la necesidad de recursos adicionales y adoptar las medidas necesarias para garantizar la culminación del proyecto.

La Contraloría General de la República continuará realizando seguimiento preventivo al desarrollo del proyecto en el marco de sus funciones constitucionales de vigilancia y control fiscal.

ASISTENTES: Hacia cada integrante de la presente acta, la lista de asistencia y grabación de la reunión en plataforma TEAMS.

OLGA LUCÍA RINCÓN FORERO

Coordinadora de Gestión - Contraloría General de la República

ERIKA JOHANA VARGAS CASTAÑO

Profesional - Contraloría General de la República

SANTHIA LUJANA CUARTE RUEDA

Subgerente administrativas y supervisión del contrato

JOSÉ SANDOVAL

Apoyo a la supervisión

CRISTIAN EDUARDO DONDÁLEZ

Director de obra, Construcción

DIEGO ARMANDO PÉREZ

Interventoría, Unión temporal Hospital

El 10 de marzo de 2026 se realizó reunión de seguimiento con el Ministerio de Salud y Protección Social



ANTECEDENTES

Valor de Aprobación: \$ 60.000.000.000

Resolución No.: 0677 DE 2023

Fecha de Giro: 09 DE JUNIO DE 2023

Alcance de las Obras: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA, MÁLAGA - SANTANDER

OBSERVACIÓN (Presupuesto de obra aprobado vs presupuesto de obra contratado) El contrato inicial que da la ejecución al proyecto cuyo objeto es ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA, MÁLAGA - SANTANDER, tuvo un presupuesto inicial entre los contratos de obra e interventoría por valor de \$68.831.189.909,00, de los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social financió \$50.000.000.000 y la ESE Hospital Regional García Rovira \$18.831.189.909,00.

TEMAS TRATADOS - DESARROLLO (Puntos de control) 1- Estado actual de contratos (Obra e Interventoría)

Obras: Valor actual \$ 64.953.471.857 Pazo Viabilidad: 24 meses Pazo Contractual: 36 meses

Fecha fin: 03/09/2026

Modificaciones: A la fecha el contrato de obra presenta cuatro actos modificatorios según lo manifestado por la ESE Hospital Regional de García Rovira.

Por otro lado, según lo manifestado por la ESE el contrato de obra tuvo una adición de \$865.288.132.15 autorizada por la gobernación del departamento de Santander el 28 de diciembre de 2023.

En embargo, cabe aclarar que estas modificaciones fueron realizadas de manera unilateral por parte de la ESE, sin contar con la viabilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, haciendo énfasis que las modificaciones fueron contractuales, pero afectan según lo manifestado por la ESE el alcance del proyecto y la capacidad instalada previamente validados, las mencionadas modificaciones de acuerdo a la viabilidad inicial reportes ser validados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y que esta solicitud deberá ser tramitada conforme a los procedimientos y normatividad de presentación de proyectos y deberán ser justificadas técnica, jurídica y financieramente por parte de la ESE para la definición de la correspondiente viabilidad.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.



Valor Inicial \$ 2.823.107.210,40 Pazo Viabilidad: 24 meses Pazo Contractual: 36 meses Fecha fin: 31/08/2026 Modificaciones: No aplica

2. Estado de avance físico (Programación de obra)

Según lo manifestado por la ESE Hospital Regional de García Rovira, el proyecto presenta un avance del 54,35% sobre el avance programado del 34,85%, presentando un atraso del 9,89% en la ejecución. Por lo que se solicita a la entidad realizar las acciones tendientes a recuperar el atraso y reanudar la ejecución con la programación establecida, a fin de que la entidad se comprometa que el día 08 de mayo la obra se encontrará reanuda, conforme a la programación establecida en el plan de acción y en caso contrario adicionalmente las acciones administrativas por sanciones a los contratistas conforme a su estatuto sancionatorio y normatividad vigente.

Aclarando que la ESE Hospital Regional de García Rovira ya ha tomado acciones tendientes a la recuperación de este atraso, enviando requerimientos a los contratistas de obra e interventoría, solicitando además, entre otros, que serán descritos en el informe de la ESE que será presentado posteriormente.

3. Estado de avances financieros, pagos de obra, % avance

A la fecha según lo manifestado por la ESE Hospital Regional de García Rovira el proyecto presenta un avance en la ejecución financiera correspondiente al 47,83%, habiéndose realizado pagos de obra (\$7) antes del inicio del contrato de obra y plane (\$7) antes del inicio del contrato de interventoría, lo cual se realizó antes del 40% del presupuesto, el pago al contratista de obra correspondiente a \$25.611.233.079,88. Y se ha ido autorizando conforme a los pagos realizados.

4. Balance actual del presupuesto (mayores, menores cantidades de obra; tem no previsto)

Según lo manifestado por la ESE Hospital Regional de García Rovira, hasta la fecha se han desautorizado 4 actos modificatorios de mayor y menores cantidades, presentando 165 líneas no previstas; estas modificaciones son contractuales y conexas de las acciones en este proceso contractual.

Sin embargo, vale la pena aclarar que estas modificaciones al modificar el alcance del proyecto deberán ser presentadas para viabilidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y a la fecha no cuentan con viabilidad por parte de este y a la fecha no han sido presentadas para el desarrollo del trámite correspondiente.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Interventoría: Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 10201, Bogotá D.C.

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrg.gov.co

Pag web: http://www.esegarciarovira-málaga-santander.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital **R**egional **G**arcía **R**ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

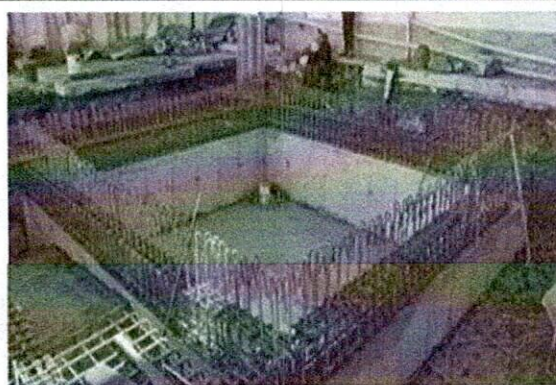
PÁG 6 de 12

Observaciones Adicionales:


Durante el periodo de está supervisión se realizaron Comités de Seguimiento y ejecución de obra, Supervisión del Contrato, Apoyo a la Supervisión, Contratista de Obra e Interventoría.

Registro Fotográfico:

ELEMENTOS EN CONCRETO



ESTRUCTURA METÁLICA



CUBIERTA



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

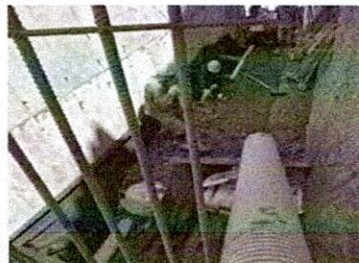
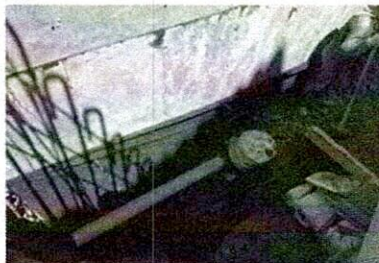
CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

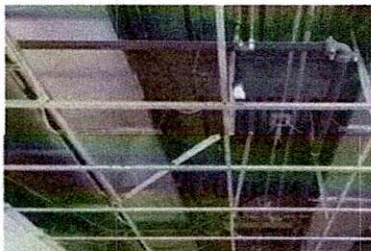
FECHA 06/02/2025

PÁG 7 de 12

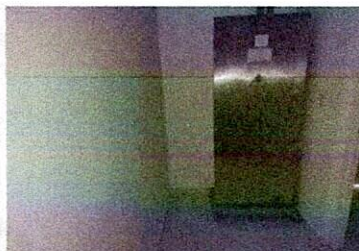
INSTALACIONES SANITARIAS




RED CONTRA INCENDIO



INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES



CARPINTERÍA



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

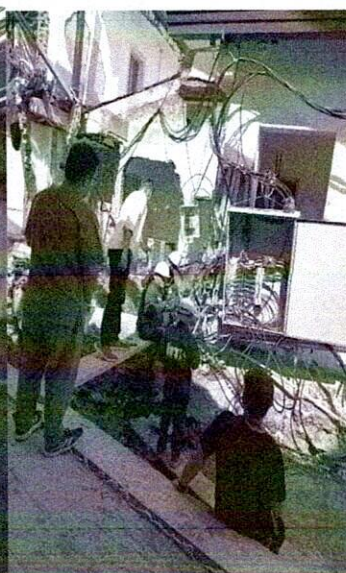
Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO	A-GJ-FTO-08
VERSIÓN	1
FECHA	06/02/2025
PÁG	8 de 12

SUMINISTROS



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 9 de 12



Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****H**ospital **R**egional **G**arcía **R**ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 10 de 12

Documentos verificados para el pago:

- Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos:
 - Del 26 de febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026.
- Factura Electrónica No. CGR 12.
- Planillas de pago de Seguridad Social No. 9501285224, 1080345469, 84083000 del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 26 de febrero de 2026 a 25 de marzo de 2026 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 del presente informe.
- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales.
- Informe escrito de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.

Nota: Esta información reposa en la Oficina de contratación de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira

4. REVISION FINANCIERA:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
Anticipo inicial:	\$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	\$ 4.272.477.426,75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	\$ 1.221.709.404,61
Amortización anticipo en Pago No. 003:	\$ 1.779.384.020,81
Amortización anticipo en Pago No. 004:	\$ 561.386.543,51
Amortización anticipo en Pago No. 005:	\$ 1.272.067.449,44
Amortización anticipo en Pago No. 006:	\$ 1.722.217.462,18
Amortización anticipo en Pago No. 007:	\$ 1.501.630.671,45
Amortización anticipo en Pago No. 008:	\$ 696.622.833,56
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 12 (40%):	\$ 1.393.442.968,83
Total Amortizado a 25 de marzo de 2025:	\$ 14.420.938.781,14

RUBROS**VALOR**

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****H**ospital **R**egional **G**arcía **R**ovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO**

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 11 de 12

2.3.2.01.01.001.02.08.01	\$ 3.483.607.422,08
TOTAL GENERAL	\$ 3.483.607.422,08

Valor del contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	\$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores desde al Acta No. 001 al Acta No. 008	\$ 13.027.495.812,31
Valor anticipo a amortizar en la presente Acta No. 009 (Factura CGR 12)	\$ 1.393.442.968,83
Valor Total Amortizado del Acta No. 001 al Acta No. 009	\$ 14.420.938.781,14
Saldo anticipo después de amortizaciones	\$ 11.190.294.298,54
Valor Pagado en Actas	
Valor Pagado Acta No. 001	\$ 10.681.193.566,88
Valor Pagado Acta No. 002	\$ 3.054.273.511,53
Valor Pagado Acta No. 003	\$ 4.448.460.052,02
Valor Pagado Acta No. 004	\$ 1.403.466.358,77
Valor Pagado Acta No. 005	\$ 3.180.168.623,59
Valor Pagado Acta No. 006	\$ 4.305.543.655,45
Valor Pagado Acta No. 007	\$ 3.754.076.678,63
Valor Pagado Acta No. 008	\$ 1.741.557.083,91
Valor pagado a la fecha:	\$ 32.568.739.530,78
Valor de la presente factura Acta No. 009	\$ 3.483.607.422,08
Descuentos a realizar Amortización Factura CRG 12	\$ 1.393.442.968,83
Valor a Pagar después de descuentos	\$ 2.090.164.453,25
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 28.641.124.904,49



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Hospital Regional García Rovira

Málaga – Santander

COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

FORMATO DE INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CÓDIGO A-GJ-FTO-08

VERSIÓN 1

FECHA 06/02/2025

PÁG 12 de 12

5. RADICACION PARA PAGO

FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
23 de abril de 2026	- Informe Técnico de Apoyo a la supervisión - Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes períodos: Del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2025. - Factura Electrónica No. CGR 12. - Planillas de pago de Seguridad Social No. 9501285224, 1080345469, 84083000 del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 26 de febrero de 2026 a 25 de marzo de 2026 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en las páginas 2 del presente informe. - Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales. - Informe escrito de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	ZAYDA MILENA PEREIRA GUTIERREZ
Cargo:	Supervisora
Firma:	

Elaborado por: Zayda Milena Pereira Gutiérrez – Subgerente Administrativo	Fecha: 23-04-2026	Firma:
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 23-04-2026	Firma:

Carrera 7 N° 15-80 Barrio Unión Málaga – Santander.

email: gerencia@hrgr.gov.co

Pag web. <http://www.esegarciarovira-malaga-santander.gov.co>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional De García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA
CONTABILIDAD Y PAGOS**

CODIGO	A-GAF-FTO-12
VERSION	1
FECHA	30/09/2025
PAG	1 de 1

BENEFICIARIO	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
CONCEPTO	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
PERIODO	DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR					
	DOCUMENTOS	SI	NO	NA	RESPONSABLE
FECHA DE RECIBIDO	1. Factura/Cuenta de Cobro/Resolución	X			VB PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
	2. Documento Equivalente				
	3. Verificar Valor No del RP del cual debe hacerse la acusación de los valores.	X			
	4. Entrada a Farmacia o Almacén en el caso de suministros				
	5. Tiquetes de Viaje en caso de Viáticos				
	6. Certificación para Efectos de la Retención				
ELABORADO POR	7. Informe de Supervisión/Interventor	X			
	8. Planilla, recibo de pago y certificación pago aportes parafiscales	X			
	9. Rut para contratistas nuevos				
	10. Orden de compra de almacén donde conste el recibido a satisfacción				
	11. Formato de Declaración juramentada primer pago				
	12. Certificación Bancaria primer pago				
	13. Acto administrativo de Asignación de Supervisor				

REQUISITOS PARA PAGO					
	DOCUMENTOS	SI	NO	NA	RESPONSABLE
Vo. Bo Supervisor	14. Comprobante de Contabilización de la cuenta	X			CONTABILIDAD
	15. Recibo de Estampillas Departamentales visadas por Contabilidad				BENEFICIARIO
	16. Invitación o citación de entidad Pública/Privada informe de actividades o certificado de permanencia en caso de viáticos				BENEFICIARIO
	17. Acta Inicial o acta final				BENEFICIARIO Y SUPERVISOR

CARGO		FIRMA
REVISÓ:	Profesional Universitario de Contabilidad	
	Área de Tesorería	
	Subgerente Administrativo	
	Aprobación Gerencia	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

BANTE DE EGRESO GENERAL : CE-834

FECHA DOCUMENTO : 24/04/2026

GARCIA ROVIRA

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

Pag: 1

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580

LA SUMA DE: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y


CONCEPTO: UNO COP M/L
PAGO N 9 - CONTRATO 087-2023- ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HRGR


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FACTURA	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	ANTICI/DCTO
240101.01	Bienes y Servicios	CGR-12	FCS 471	1,846,311,934	
				1,846,311,934	0


CUENTA
113210.01

FORMA DE PAGO
CTA AHORROS 312-00001408 ADECUACION

VALOR PAGADO
1,846,311,934

ELABORADO POR
 FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA

REVISADO POR


APROBADO POR
 C. C. o NIT



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

TA DE CONTABILIDAD OBRA : NC02-5

FECHA DOCUMENTO : 24/04/2026




PÁig: 1

RECIBIDO DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - 900474727

LA SUMA DE: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO

CONCEPTO: COP M/L TRÁSLADO DE PAGO A REALIZAR POR CONTRATO DE OBRA EN ESE HRGR, REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2026

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
299003.01	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	BI 1	3,483,607,422	
443005.01	Nacional			3,483,607,422
TOTALES IGUALES			\$ 3,483,607,422	\$ 3,483,607,422

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
 FUENTES VILLAMIL ANGELA TATIANA		 C. C. o NIT NA°



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

DEFINITIVA DE PAGO No 276

FECHA: 24/04/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO PARCIAL CONTRATO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 253 DEL 24/04/2026


CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :


RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	3,483,607,422.08
TOTAL A PAGAR :		3,483,607,422.08

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL

ELABORO : ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

ROVIRA

N.I.T.: 900067169

URA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-471

FECHA DOCUMENTO : 24/04/2026

GARCIA ROVIRA

DIRECCION: KR 7A NO 1580 - MALAGA

Pag: 1

PAGADO A: CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA - 901740580

SOPORTE: CGR-12

LA SUMA DE: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO

CONCEPTO: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
161590.01	otras construcciones en curso		3,483,607,422.08	
243626.01	contratos de obra			69,672,148.44
244023.01	Contribucion contratos de obra publica 5%			174,180,371.10
443005.01	Nacional			1,393,442,968.83
240101.01	Bienes y Servicios			1,846,311,933.71
		TOTALES IGUALES	\$ 3,483,607,422.08	\$ 3,483,607,422.08

ELABORADO POR
ANAYA OSORIO RUTHBY JAZMIN

REVISADO POR
Mabel Calderón Acero

APROBADO POR
Cesar Augusto Becerra Correa



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 258

FECHA: 24/04/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO HACEN CONSTAR:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EXISTE SALDO DE DISPONIBILIDAD PARA RESPALDAR EL SIQUIENTE COMPROMISO:

PAGO PARCIAL CONTRATO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA SANTANDER.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	3,483,607,422.08
		<u>3,483,607,422.08</u>

VIGENCIA : 2026


VALOR : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO


SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
N.I.T. : 900,067,169 - 9

REGISTRO PRESUPUESTAL No 253

FECHA: 24/04/2026

A FAVOR DE : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA NIT : 901740580

COMPROMISO : PAGO PARCIAL CONTRATO ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA SANTANDER.

DISPONIBILIDAD : 258 DEL 24/04/2026


CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :


RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
001-2.3.2.01.01.001.02.08.01	Adecuación y Mantenimiento Edificios - Infraestructura	3,483,607,422.08
		3,483,607,422.08

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHO PESOS

ELABORO : CALDERON ACEROS MABEL


CALDERON ACEROS MABEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


BECERRA CORREA CESAR AUGUSTO
GERENTE ESE HRGR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD

NIT: 900067169

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONSORGR09

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 31200001408

Fecha: 27-04-2026

Hora: 10:30:27

Fecha de Generación: 27-04-2026

Fecha de envío del pago: 24-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 24-04-2026

Impreso por: FUENTES25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,846,311,933.71	Valor Registros Procesados: \$1,846,311,933.71	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000004666997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	1,846,311,933.71	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-04-2026
