



SIE WATER SAS
NIT 901.560.724-4
Calle 80 Parque Industrial de Combita LT 10 MZ 123
Br. Portal de Hunzahua
Tel: (+57) 3232318783
Tunja - Colombia
siewater1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SW 1904

Señores	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA "IDEBOY"		
NIT	891.800.462-5	Teléfono	(608) 6087423079
Dirección	CL 19 9 35 P 7	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2026, 08:44
Expedición	23/04/2026, 08:53
Vencimiento	08/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA SA-MC-005-2025 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE AGUA TERMOMINERAL PARA LOS HOTELES LA CASONA DEL SALITRE Y SOCHAGOTA, UBICADOS EN PREDIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ	1.00		54,844,224.00	54,844,224.00	54,844,224.00
2	ADMINISTRACIÓN (15%)	1.00		8,226,633.60	8,226,633.60	8,226,633.60
3	IMPREVISTOS 3%	1.00		1,645,326.72	1,645,326.72	1,645,326.72
4	UTILIDAD 7%	1.00		3,226,130.82	3,226,130.82	3,839,095.68

Total items: 4

Valor en Letras:

Sesenta y ocho millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por \$ 68,555,280.00

Observaciones:

Cuenta de ahorros N° 882-000018-20 de BANCOLOMBIA

Total Bruto	67,942,315.14
IVA 19%	612,964.86
Total a Pagar	68,555,280.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076376688 aprobado en 20240802 prefijo SW desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**


Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE: 86b40a62f2a6b571842ea0673c1e0b41f4130c5c002149308b422cd5c03558af7205174510fa402112f5aed43bd014c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

 891800462	REPUBLICA DE COLOMBIA TUNJA - BOYACA INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA ENTRADA DIRECTA A ALMACEN	ENTRADA A ALMACEN No. ENDI 2026 1 FECHA: 13-02-2026			
Proveedor	901560724	SIE WATER SAS			
Bodega	01	BODEGA INFIBOY TUNJA			
Concepto:	ENTRADA CONTRATO DE OBRA No. SA-MC-005 DE 2025				
REGISTRO DE ENTRADAS					
ARTICULO		VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
208010008	TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 70CM*90CM CON MARCO	378,000	UND	1	378,000.00
208010009	TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 1M*1M CON MARCO	537,000	UND	1	537,000.00
208010010	MACROMEDIDOR DE AGUA TERMAL DE 6 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS	27,585,000	UND	1	27,585,000.00
208010011	MACROMEDIDOR DE AGUA TERMAL DE 4 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS	23,425,000	UND	1	23,425,000.00
208010012	CHEQUE DE 4 CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	562,500	UND	1	562,500.00
208010013	CHEQUE DE 6 CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	985,000	UND	1	985,000.00
Total:				53,472,500.00	

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
SUPERVISOR	YAQUELIN ESTUPIÑÁN MANRIQUE Almacenista General

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				REGISTRO INFORME FINAL DE SUPERVISION Y PAGO																											
		MIPG				CODIGO: R-AJ-26																											
		PROCESO:				VERSION: 3																											
		APOYO JURIDICO				FECHA: 30-06-2021																											
						PAG: 1 DE 1																											
Dependencia Encargada	BIENES Y ARCHIVO	Número de pago:	1	Total Pagos:	1	Fecha:	8/04/2026																										
ACTO ADMINISTRATIVO																																	
Marque con "X"		DATOS ESPECIFICOS																															
ContratoAG/SP	X	Número:	SA-MC-005		Fecha de iniciación:	9/09/2025																											
RESOLUCIÓN		Fecha de suscripción:	16/08/2025		Fecha de terminación:	28/01/2026																											
FACTURA		N° CDP:	2025-107 / 059 - 2026	Fecha :	12/06/2025 - 11/02/2026	Duración:	Meses 60 Dias																										
CONVENIO		N° RP:	2025 - 125 / 056 - 2026	Fecha :	26/08/2025 - 11/02/2026	Periodo a pagar:	09/09/2025 al 28/01/2026																										
		Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:	2																										
		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga No.:	1																										
						En tiempo:	15 días																										
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE AGUA TERMOMINERAL PARA LOS HOTELES LA CASONA DEL SALITRE Y SOCHAGOTA, UBICADOS EN PREDIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ."																																
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA																																	
Nombre:	SIE WATER SAS																																
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	Nit.	X	Número:	901.560.724	DV. 4																										
Dirección:	CALLE 80 PARQUE INDUSTRIAL DE COMBITA MZ 10 LT 123																																
Número de Teléfono:	FAX:	TEL:		3232318783																													
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros	X	Número	88200001820	Banco:	BANCOLOMBIA																										
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	Persona Jurídica:																														
		Gran Contribuyente:	Autoretenedor:																														
		IVA Régimen Común:	Entidad sin ánimo de lucro																														
		Código UNSPSC:	Tarifa:																														
		He verificado de esta información frente al RUT :					SI: X	NO:																									
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																	
Valor inicial del contrato:	\$ 69.561.575,50																																
Adición No. 1	\$ 0,00																																
Valor Total del contrato:	\$ 69.561.575,50																																
Valor pagado:	<table border="1"> <tr> <td>Anticipo:</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Primer Pago</td> <td>Segundo Pago</td> <td>Tercer pago</td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Septimo Pago</td> <td>Octavo Pago</td> <td>Noveno Pago</td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto pago</td> <td>Quinto Pago</td> <td>Sexto Pago</td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Decimo Pago</td> <td>Onceavo Pago</td> <td>Doceavo Pago</td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </table>							Anticipo:	\$ 0,00	Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Anticipo:	\$ 0,00																																
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago																															
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																															
Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago																															
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																															
Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago																															
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																															
Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago																															
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																															
Total pagado	\$ 0,00																																
Valor a pagar en el periodo:	\$ 68.555.280,00																																
Saldo a favor de la entidad:	\$ 1.006.295,50																																
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:		SI:	X	NO:		# de folios: 82																										
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI:	X	NO:																												
	Documentos Soportes		Informe de avance contratista y soportes																														
			FECHA: _____	No: _1_	FECHA: _____	No: _____																											
Observaciones del Supervisor a las Actividades Ejecutadas:		El contratista ejecuto las actividades encomendadas soportadas con informe y documentos anexos																															
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Aportes a Salud				Aportes a Pensión																												
	Valor pagado \$	Periodo			Valor pagado \$	Periodo																											
	Comprobante de pago Número:				Comprobante de pago Número:																												
	Fecha de pago:				Fecha de pago:																												
	Aportes ARP				Pensionado:																												
Valor pagado \$	Periodo			Certificación:	SI:	X	NO:																										
Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal o R/Legal:				SI:	NO:	X																										
EVALUACION DEL CONTRATISTA	TEMA	PESO	CRITERIO		Cal.	Vr. Real	Vr. Ideal	DIFERENCIA																									
	Cumplimiento Exigencias Contractuales	100%	Los servicios, bienes, obras ejecutadas cumplen con lo pactado en el contrato.		5	0,05	0,05	0,00																									
			Cumplimiento del plazo contractual y ejecución oportuna de las actividades.		5	0,05	0,05	0,00																									
			Presentación de informes de manera oportuna y completa		5	0,05	0,05	0,00																									
	Si es contrato de obra, suministro o consultoría, diligenciar la Hoja 2 anexo RAJ26	100%	Atención oportuna a requerimientos		5	0,00	0,00	0,00																									
			La celebración y ejecución del contrato satisfizo la necesidad identificada por la entidad		5	0,00	0,00	0,00																									
			TOTALES					0,00																									
		CALIFICACIÓN TOTAL				100,00%																											
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Criterios de Evaluación:																																
	TEMA: Celda no modificable																																
	PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato																																
	CRITERIO: Celda no modificable																																
	CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor																																
Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables																																	
BUENO		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%																															
REGULAR		SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51% Y 79%																															
DEFICIENTE		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%																															
Acción a seguir:																																	
GESTIÓN DEL RIESGO	NOTA: Opción 1. Certificado que en el periodo que comprende este informe no se materializó ningún riesgo previsible de los tipificados en la matriz de riesgo elaborada en la etapa de planeación del Contrato No. SA-MC-005-2025. / OPCIÓN 2: Certificado que en el periodo a que hace referencia este informe NO se materializaron ningún tipo de riesgos																																
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Contrato, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.																																
SOportes y Documentos del Contrato	Anexos: Informe de actividades con sus anexos en ochenta y dos (82) folios, Planilla Pago Aportes Sociales en dos (02) folios, Rut, Certificación bancaria en un (01) folio.																																
FIRMA DEL SUPERVISOR:																																	
Nombre Del Supervisor:	CLAUDIA MARIELA GONZÁLEZ VILLANUEVA																																
Nº. C.C.:	33701976																																
CARGO:	Profesional Universitario de Bienes y Archivo																																



Profesionales en Suministros
e ingeniería en sistemas de
tratamiento de aguas y
acueducto

NIT:901.560.724-4

**INFORME DE ENTREGA FINAL CONTRATO SA-MC-005 DE 2025 ENTRE EL
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ Y SIE WATER SAS**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	SA-MC-005 DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA NIT: 891.800.462-5
CONTRATISTA	SIE WATER S.A.S Nit: 901560724-4 RL: Wilmar Fernando Peña Salas C.C: 1054092107 de Villa de Leyva
SUPERVISOR DESIGNADO	CLAUDIA MARIELA GONZALES VILLANUEVA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE AGUA TERMOMINERAL PARA LOS HOTELES LA CASONA DEL SALITRE Y SOCHAGOTA, UBICADOS EN PREDIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
VALOR CONTRATADO	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO COP CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 69.561.575,50) MCTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR SIN EJECUTAR	UN MILLÓN SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COP CON 50 CENTAVOS (\$1.006.295,5) MCTE
VALOR EJECUTADO	SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS COP (\$68.555.280) MCTE
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Avenida Norte No. 71 -39 Tunja, Boyacá. Celular: 3232318783

siewater1@gmail.com

NIT:901.560.724-4

CONTRATO	
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPECIÓN DEL CONTRATO No. 1	DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE
ACTA DE REACTIVACIÓN DEL CONTRATO No.1	23 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	23 DE DICIEMBRE. SE MODIFICAN LA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MACROMEDIDORES PARA PASAR DE ALIMENTADO A BATERÍA A ALIMENTADO A CORRIENTE
ACTA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No.2	26 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REACTIVACIÓN DEL CONTRATO No.2	14 DE ENERO DE 2026
TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	28 DE ENERO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las actividades específicas SIE WATER SAS como contratista ejecutor del presente contrato se procede a hacer presentación del presente informe de entrega final en el cual se relacionan las respectivas bitácoras de las actividades realizadas con su respectivo registro fotográfico, planilla de parafiscales, tabla de cantidades, informe de SST durante el tiempo de ejecución y demás información relevante financiera y técnica solicitada por la entidad contratante, en este caso el INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ (IDEBOY)

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Avenida Norte No. 71 -39 Tunja, Boyacá. Celular: 3232318783
siewater1@gmail.com

NIT:901.560.724-4

Para la ejecución del contrato se llevaron a cabo las siguientes actividades las cuales estuvieron supervisadas en su totalidad por un ingeniero residente de obra bajo las respectivas recomendaciones una profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Excavación manual para construcción de cajas de seguridad e instalación de cheques antirretorno
- Construcción de dos cajas de seguridad de acuerdo con las opacificaciones establecidas
- Instalación de cheque antirretorno en la salida de las cajas de seguridad.
- Instalación de tapas de inspección de cajas de seguridad.
- Pañetado e impermeabilizado de cajas de seguridad.
- Instalación de macromedidores electromagnéticos de 4" y 6" de acuerdo con las especificaciones y la modificación de estas avaladas por la entidad contratante.
- Instalación de tubería y cableado para alimentación eléctrica de cada uno de los macromedidores.
- Programación y puesta en marcha de macromedidores.
- Entrega del contratista a la entidad contratante.

3. COSTO FINAL DE LA EJECUCIÓN

1. EXCAVACIONES							
ITEM	DESCRIPCIÓN			MEDID A	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,01	EXCAVACIÓN	MANUAL	EN	M3	\$ 69.420,00	2,2	\$ 152.724,00
	MATERIAL COMUN						
2. CIMETANCÓN Y DESAGUES							
2,01	CAJAS DE INSPECCION DE 0,92 X 0,72 X 0,75 MTS LADRILLO (NO			UND	\$ 519.000,00	1,00	\$ 519.000,00

Avenida Norte No. 71 -39 Tunja, Boyacá. Celular: 3232318783

siewater1@gmail.com



Profesionales en Suministros
e ingeniería en sistemas de
tratamiento de aguas y
acueducto

NIT:901.560.724-4

	INCLUYE TAPA).				
2,00	CAJAS DE INSPECCION DE 1.02 X 1.02 X 1.15 MTS LADRILLO (NO INCLUYE TAPA).	UND	\$ 700.000,00	1,00	\$ 700.000,00
3. TAPA METALICA					
3,01	TAPA DE INSPECCION METALICA DE 70 CM X 90 CM. CON MARCO	UND	\$ 378.000,00	1,00	\$ 378.000,00
3,02	TAPA DE INSPECCION METALICA DE 1 M X 1 M. CON MARCO	UND	\$ 537.000,00	1,00	\$ 537.000,00
4. TUBERÍA PVC					
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	\$ 114.750,00	0	\$ 0,0
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC MECANICA D=6"	UNS	\$ 212.750,00	0	\$ 0,0
5. MACROMEDIDOR					
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR AGUA TERMAL DE 4" PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS	UND	\$ 23.425.000,00	1,00	\$ 23.425.000,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR AGUA TERMAL DE 6" PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS	UND	\$ 27.585.000,00	1,00	\$ 27.585.000,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4" CON ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	\$ 562.500,00	1,00	\$ 562.500,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 6" CON ACCESORIOS DE INSTALACION (BRIDA, TORNILLERIA, EMPAQUES, ETC)	UND	\$ 985.000,00	1,00	\$ 985.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 54.844.224,00
AIU 25%					\$ 13.711.056,00
ADMINISTRACIÓN (15%)					\$ 8.226.633,60
IMPREVISTOS (3%)					\$ 1.645.326,72
UTILIDAD (7%)					\$ 3.839.095,68
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 68.555.280

Avenida Norte No. 71 -39 Tunja, Boyacá. Celular: 3232318783

siewater1@gmail.com

NIT:901.560.724-4

4. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 69.561.575,50
VALOR ADICIONAL:	\$ 0.00
VALOR SIN EJECUTAR:	\$ 1.006.295,5
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 68.555.280
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ACTA PARCIAL:	N/A
VALOR DE ACTA FINAL	\$ 68.555.280
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0.00
PORCENTAJE EJECUTADO	100 %

5. MEMORIA DE CANTIDADES

1.01	1	1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN				M3
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
CAJA 0,92*0,72			0,92	0,72	1,05	1	0,70
CAJA 1,02*1,02			1,02	1,02	1,45	1	1,51
TUBERIA 6 PULGADAS			0	0	0	1	0,00
TOTAL CANTIDAD							2,20
CAJAS DE INSPECCION							
2.01	1	1	CAJA DE INSPECCION DE 0,92 X 0,72 X 0,75 MTS LADRILLO (NO INCLUYE TAPA).				UND
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
CAJA DE INSPECCION DE 0,92 X 0,72 X 0,75 MTS LADRILLO (NO INCLUYE TAPA).			0,92	0,72	1,05	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00
2.02	1	1	CAJAS DE INSPECCION DE 1.02 X 1.02 X 1.15 MTS LADRILLO (NO INCLUYE TAPA).				UND
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		



Profesionales en Suministros
e ingeniería en sistemas de
tratamiento de aguas y
acueducto

NIT:901.560.724-4

CAJAS DE INSPECCION DE 1.02 X 1.02 X 1.15 MTS LADRILLO (NO INCLUYE TAPA).			1,02	1,02	1,45	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00
TAPAS EN METAL							
3.01	1	1	TAPA DE INSPECCION METALICA DE 70 CM X 90 CM. CON MARCO				UNI
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
TAPA DE INSPECCION METALICA DE 70 CM X 90 CM. CON MARCO			0,9	0,7	N/A	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00
3.02	1	1	TAPA DE INSPECCION METALICA DE 1 M X 1 M. CON MARCO				UND
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
TAPA DE INSPECCION METALICA DE 1 M X 1 M. CON MARCO			1	1	N/A	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00
4.01	1	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).				ML
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).			4	N/A	N/A	0	0,00
TOTAL CANTIDAD							0,00
4.02	1	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC MECANICA D=6"				UND
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC MECANICA D=6"			N/A	N/A	N/A	0	0,00
TOTAL CANTIDAD							0,00

Avenida Norte No. 71 -39 Tunja, Boyacá. Celular: 3232318783

siewater1@gmail.com

NIT:901.560.724-4


MACROMEDIDORES							
5.01	1	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR AGUA TERMAL DE 4" PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS			UND	
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR AGUA TERMAL DE 4" PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS			N/A	N/A	N/A	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00
5.02	1	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR AGUA TERMAL DE 6" PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS			UND	
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR AGUA TERMAL DE 6" PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS			N/A	N/A	N/A	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00
5.03	1	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4" CON ACCESORIOS DE INSTALACION (BRIDA, TORNILLERIA, EMPAQUES, ETC)			UND	
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4" CON ACCESORIOS DE INSTALACION (BRIDA, TORNILLERIA, EMPAQUES, ETC)			N/A	N/A	N/A	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00
5.04	1	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 6" CON ACCESORIOS DE INSTALACION (BRIDA, TORNILLERIA, EMPAQUES, ETC)			UND	
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 6" CON ACCESORIOS DE INSTALACION (BRIDA, TORNILLERIA, EMPAQUES, ETC)			N/A	N/A	N/A	1	1,00
TOTAL CANTIDAD							1,00

NIT:901.560.724-4

De acuerdo con la aceptación de las modificaciones según **MODIFICATORIO No. 01 SA-MC-005-2025**, donde, con previa solicitud por parte del contratista se solicita la modificación del tipo de alimentación de los macromedidores pasando a alimentación eléctrica se relaciona la respectiva memoria de cantidades que constituyen este modificadorio y cuyos costos fueron asumidos por el contratista.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
6,01	1	1	EXCAVACIÓN DE ZANJA				M3
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
EXCAVACIÓN DE ZAJA			180	0,3	0,4	1	21,60
TOTAL CANTIDAD							21,60
6,01	1	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT SCH 40				ML
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT SCH 40			3	N/A	N/A	60	180,00
TOTAL CANTIDAD							180,00
6,02	1	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #12 COBRE				ML
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #12 COBRE			540	N/A	N/A	1	540,00
TOTAL CANTIDAD							540,00
6,03	1	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #12 COBRE				UND
LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES (m)			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
			LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS			N/A	N/A	N/A	2	2,00
TOTAL CANTIDAD							2,00

6. GEOREFERENCIACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA MACROMEDIDOR HOTEL

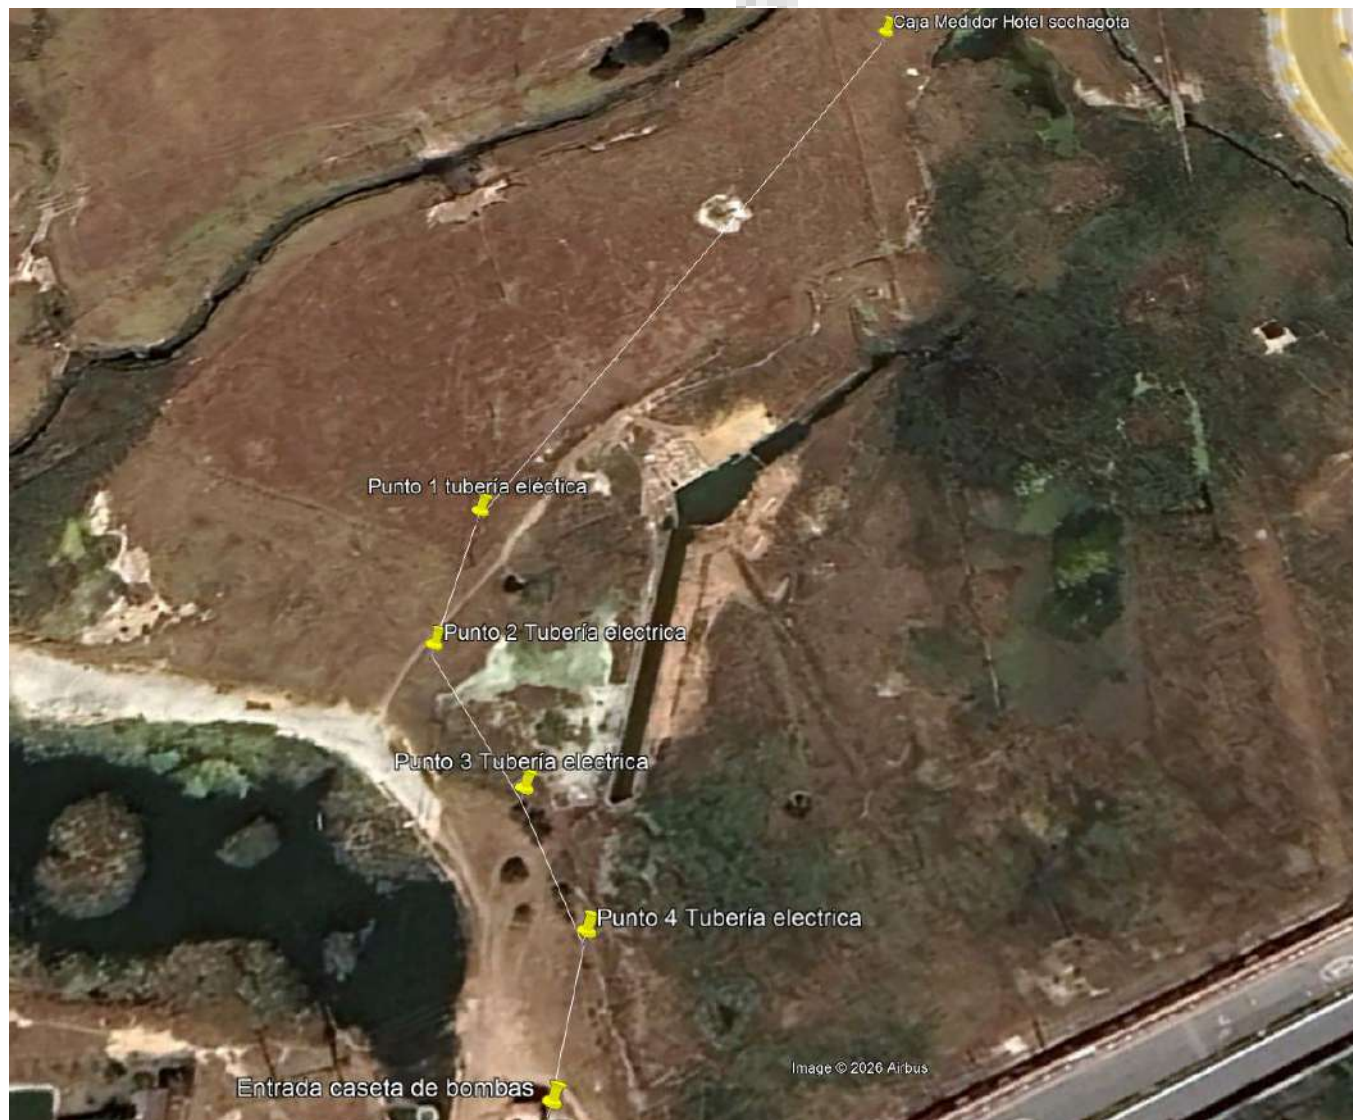

PUNTO	LATITUD	LONGITUD
Punto inicial, Caja medidor	5°45'27.52"N	73° 6'39.54"O


Avenida Norte No. 71 -39 Tunja, Boyacá. Celular: 3232318783
siewater1@gmail.com

NIT:901.560.724-4

Punto 1.	5°45'24.33"N	73° 6'39.09"O
Punto 2.	5°45'23.78"N	73° 6'38.78"O
Punto 3.	5°45'23.57"N	73° 6'38.06"O
Punto 4.	5°45'23.32"N	73° 6'37.49"O
Punto final, caseta de bombas	5°45'22.80"N	73° 6'37.15"O

7. OFRECIMIENTO ADICIONAL

Dando cumplimiento a las obligaciones específicas del contratista establecidas en la invitación, se hace suministro del ofrecimiento adicional que consiste en dos candamos de 75 mm para la seguridad de las cajas de inspección de cada uno de los macromedidores.

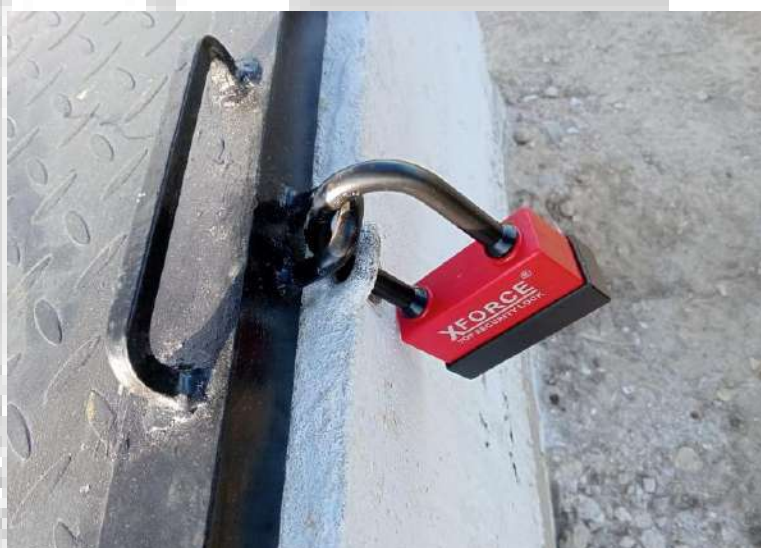



NIT:901.560.724-4

Profesionales en Suministros
e ingeniería en sistemas de
tratamiento de aguas y
acueducto

Paipa 28 de enero de 2026

Señores:

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY

ASUNTO: ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA DE CONTRATO SA-MC-005 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE AGUA TERMOMINERAL PARA LOS HOTELES LA CASONA DEL SALITRE Y SOCHAGOTA, UBICADOS EN PREDIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Mediante la presente acta se deja constancia que el día 28 de enero del 2026 se realiza socialización de entrega del contrato en mención por parte de SIE WATER SAS como contratista, en cual se realiza en la cual se da a conocer la siguiente información:

- Generalidades del funcionamiento de los macromedidores y toma de lectura.
- Parámetros de correcto funcionamiento (velocidad de flujo y caudal).
- Cuidado de los equipos.
- Posibles mantenimientos futuros.
- Acciones por seguir en caso de una falla.

A esta socialización asisten las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
Julian Torres Mora	Apoyo Ideboy	1054093896	
Wilmar Fernando Páez	Contratista	1054092107	Wilmar F. Páez S.
Angel Y Cepeda	Apoyo Ideboy	74322899	
Jorge Fonseca	Gerente Mantenimiento	4192259	
Jaime Rodriguez	Gerente Mantenimiento	74360283	

Calle 80 Parque industrial de Combita MZ 10 LT 123 – Barrio Portal de Hunzahua –
Tunja Boyacá. Celular: 3232318783 siewater1@gmail.com



NIT:901.560.724-4

Profesionales en Suministros
e ingeniería en sistemas de
tratamiento de aguas y
acueducto



Atentamente:

Wilmar Fernando Peña Salas

Nombre: Wilmar Fernando Peña Salas

Cargo: Representante Legal

Documento de Identidad: 1.054.092.107

No. de celular: 3232318783

Correo electrónico: siewater1@gmail.com

Dirección: Calle 80 Parque industrial de Combita MZ 10 LT 123 – Barrio Portal de Hunzahua – Tunja Boyacá

**Calle 80 Parque industrial de Combita MZ 10 LT 123 – Barrio Portal de Hunzahua –
Tunja Boyacá. Celular: 3232318783 siewater1@gmail.com**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalizado el objeto del contrato se puede concluir que:

1. Los requisitos presupuestales y técnicos junto con sus modificaciones fueron los apropiados para garantizar el objetivo del contrato que es el control de la captación de agua termomineral para los hoteles la casona del salitre y Sochagota, ubicados en predios del instituto de fomento y desarrollo de Boyacá en el municipio de Paipa, Boyacá
2. Los sistemas de bombeo instalados en las respectivas casetas de maquinas brindaron las condiciones de velocidad y caudal que garantizan una medición con una precisión satisfactoria de los macromedidores.

Una de las ventajas de los Macromedidores de caudal tipo electromagnéticos es casi nula necesidad de mantenimiento y que una vez que quedan en funcionamiento no requiere ningún tipo de operación, por lo que las recomendaciones que se puede dar están asociadas mas elemento o condiciones que lo rodean como:

- Garantizar que las condiciones de bombeo se mantengan o en caso de que requieran de algún cambio, estas suban.
- Supervisión eventual de los sellos y tornillería para verificar que requieran

**Calle 80 Parque industrial de Combita MZ 10 LT 123 – Barrio Portal de Hunzahua –
Tunja Boyacá. Celular: 3232318783 siewater1@gmail.com**



Profesionales en Suministros
e ingeniería en sistemas de
tratamiento de aguas y
acueducto

NIT:901.560.724-4

algún ajuste

- En caso de que se requiera un desmontaje del medidor del Hotel Sochagota, realizar un vaciado de la tubería desajustando el cheque que está después de la caja de inspección.
- Verificar que la velocidad de flujo sea superior a 0.3 m/s. Este parámetro aparece en la pantalla del medidor.
- En caso de alguna eventualidad comunicarse con el contratista antes de actuar.

**Calle 80 Parque industrial de Combita MZ 10 LT 123 – Barrio Portal de Hunzahua –
Tunja Boyacá. Celular: 3232318783 siewater1@gmail.com**

BITÁCORA DE OBRA			
		NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 01
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:		Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de medidores para los hoteles sochagota y la Casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:		Predio la Esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:		SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA: 01
FECHA DE INICIO:		PROGRAMADA:	REAL: 22/09/2025
FECHA DE CONCLUSIÓN:		PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SIE WATER SAS	
DOMICILIO		Calle 80 LT10 M2123, Barrio portal de Hunzahn, Tunja	
TELÉFONOS		3232318783 - 3112927219	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Colocación de Valla informativa e inicio de excavación para construcción de caja de Seguridad maximedidor para el Hotel la Casona. Socialización del Peligro Biomecánico, Clasificación riesgos asociados y como evitar enfermedades y accidentes por este peligro. Ejercicios de Puntos Activos y Calentamiento			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Yamir Alexandra Zargueta	Responsable de SST	Yamir Alexandra Zargueta	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

02

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		03
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY		
LOCALIZACIÓN:	Predio La esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 23/09/2025	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT10 MZ123, Barrio Portal de Hunzahua, Tunja		
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se termina excavación para macromedidor de la casona y se realiza excavación completa para caja de macromedidor del Sochagota. Se realiza fundición de placa para construcción tanto de la caja para macromedidor de la casona como para el sochagota.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña S.	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	
			
			

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

04

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		05
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sachagota y la casona del IDEBOY.		
LOCALIZACIÓN:	Predio la Esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 24/04/2025	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT10 MZ123 Barrio portal de Hunzahua, Tunja		
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se termina de fundir piso y se hace construcción de muros de la caja de seguridad para el macromedidor de la casona con refuerzos en varilla de 1/4" cada dos hiladas de ladrillo. Se termina de fundir piso y se inicia construcción de muros para la caja de seguridad del macromedidor de hotel Sachagota			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña J.	Residente de Obra	Wilmar F. Peña J	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

06

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA		
	NOMBRE DE LA EMPRESA	FOLIO:
	SIE WATER SAS	07
DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sachagota y la casera del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:	Piedra la Esperanza IDEBOY, Daipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005-2025	No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 25/09/2024
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS	
DOMICILIO	Calle 80 LT 10 MZ 123, Barrio portal de Hunzahua, Tunja	
TELÉFONOS	3232318783 - 3112427214	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
Se termina construcción de muros de caja de seguridad del macromedidor de Sachagota con refuerzo al varilla de 1/4" y se inicia a paquetar en el exterior.		
RESPONSABLES EN LA OBRA		
Nombre	Cargo	Firma
Wilmar Fernando Peña S.	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.

BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		08
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de maxímedidores para Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY		
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 25/09/2025	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT 10 MZ123 Barrio Portal de Hunzahoa, Tunja		
TELÉFONOS	3232318283 - 3112927219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
- Inspección a Planos de trabajo; Verificación de cumplimiento de Protocolos de Seguridad, uso de EPP, manejo adecuado de herramientas - Charla de seguridad enfocada en altas y condiciones de seguridad - Ponerse Activos y Calistenia			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Yenni Alexandra Zengueris	Profesional de SST	Yenni A Zengueris	
Wilmar Fernando Peña S.	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

09

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA			
		NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 10
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de Seguridad, Suministro e Instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y la casa del IDEBOY		
LOCALIZACIÓN:	Predio la cooperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 29/09/2025	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT 10 MZ 123, Barrio Portal de Hunzahua, Tunja		
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se realiza pañete interior de la caja de seguridad para el macromedidor del hotel Sochagota como de la caja de seguridad para el macromedidor de la casa. Se realiza excavación para la instalación del cheque antirretorno a la salida de la caja del macromedidor del Hotel Sochagota.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

11

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA		
	NOMBRE DE LA EMPRESA	FOLIO:
	SIE WATER SAS	12
DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, Suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:	Predio la esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 30/04/2025
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS	
DOMICILIO	Calle 80 LT 10, MZ123 Barrio Portal de Hunzahuel, Tunja	
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
Fundición de viga superior en las dos cajas de seguridad para empotramiento de los soportes de las tapas metálicas e instalación de las tapas metálicas. Se realiza excavación para intación de cheque para macromedidos de la casona. Se realiza verificación de protocolos, normas de seguridad en obra. Se realiza charla de seguridad.		
RESPONSABLES EN LA OBRA		
Nombre	Cargo	Firma
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.
Yamir Alexandra Zargueta Barot	Profesional EOT.	Yamir A. Zargueta

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

13

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA		
	NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 14
DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de maxímedidores para los Hoteles Sochagoto y La Casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:	Predio la Esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:	SA - MC - 005 de 2025	No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 02/10/2025
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS	
DOMICILIO	Calle 80, LT 10 M2123, Barrio Portal de Hunzahua, Tunja.	
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
Instalación de cheque Antirretorno de 4" en la salida de la caja de seguridad del maxímedidor del Hotel La Casona de Salitre, emboquillado de tapas de cajas de seguridad y terminación del pañete.		
RESPONSABLES EN LA OBRA		
Nombre	Cargo	Firma
Wilmar Fernando Peón Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peón S.

BITÁCORA DE OBRA

	NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 15
---	---	------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA		
	NOMBRE DE LA EMPRESA	FOLIO:
	SIE WATER SAS	16
DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, Suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y la Casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:	SA - MC - 005 de 2025	No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 14/10/2025
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS	
DOMICILIO	Calle 80 LT 10 MZ 123 Barrio Portal de Hunzahua, Tunja	
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
Se realiza desmonte del cheque de 4" a la salida de la caja del Hotel la casona. Se hace reemplazo de 2 metros de Tubería de 4" en PVC. Se realiza cambio de una brida de 4" y de sellos de cheque y se realiza nuevamente la instalación de este. Se corrigen filtraciones en esta misma caja debido al alto nivel freático. Se realizan estos cambios imprevistos por la antigüedad de la tubería la cual no permitió una buena instalación y se presentaban fugas, así mismo no se tenía previsto que los sellos instalados inicialmente no soportaran la temperatura.		
RESPONSABLES EN LA OBRA		
Nombre	Cargo	Firma
Wilmar Fernando Peña Silva	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.

BITÁCORA DE OBRA

	NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 17
---	---	------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA			
		NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 18
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:		Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:		Piedio La Esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:		SA- MC - 005 de 2025	No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:		PROGRAMADA:	REAL: 15/10/2025
FECHA DE CONCLUSIÓN:		PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SIE WATER SAS	
DOMICILIO		Calle 80 LT 10 M2123 Barrio Portal de Hunzahut, Tunja	
TELÉFONOS		3232318783 - 3112427214	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Instalación de Cheque antirretorno de 6" en la salida de la caja de seguridad del macro-medidor del Hotel Sochagota. Se realiza charla de seguridad. Inspección de uso de EPP y cumplimiento de Protocolos de seguridad.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	
Yermi Alexandra Zargueta Barón	Profesional SST	Yermi A. Zargueta	
_____	_____	_____	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

20

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA				
		NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS		FOLIO: 21
DATOS DE LA OBRA				
NOMBRE:		Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macro-medidores para los Hoteles Sochagota y la Casona del IDEBOY.		
LOCALIZACIÓN:		Predio La Esperanza IDEBOY, Paipa Boyacá		
No. DE CONTRATO:		SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:	01
FECHA DE INICIO:		PROGRAMADA:	REAL: 23/10/2025	
FECHA DE CONCLUSIÓN:		PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SIE WATER SAS		
DOMICILIO		Calle 80 Lt 10 M2123 Barrio Portal de Hunzahua, Tunja		
TELÉFONOS		3232318783 - 3112427219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES				
Se realiza impermeabilización de la caja de seguridad del macromedidor dirigido al Hotel la casona del Salitre con material BroncoSil.				
Nota: Se aclara que la humedad que se presenta en esta caja de seguridad es debido a la condensación de vapor de agua debido a la temperatura presente en el interior de la caja.				
RESPONSABLES EN LA OBRA				
Nombre	Cargo		Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Presidente de Obra		Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

22

REGISTRO FOTOGRAFICO



Humedad al interior de la caja debido a la condensación debido a la temperatura



BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		23
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y La Casona del IDEBOY		
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza IDEBOY, Párra Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:	01
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 30/10/2025	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT10 MZ123, Barrio Portal de Hanzahua, Tunja		
TELÉFONOS	323 2319183 - 3112927219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Impermeabilización de caja de seguridad del macromedidor dirigido al Hotel Sochagota con mortero BroncoSil.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA


SIE WATER SAS

FOLIO:

24

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA		
	NOMBRE DE LA EMPRESA	FOLIO:
	SIE WATER SAS	25
DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2015	No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 14/01/2026
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS	
DOMICILIO	Calle 80 LT 10 M2123, Barrio Portal de Hunzahua, Tunja	
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		
Instalación de macromedidor Electro magnético de 4" y macromedidor electro magnético de 6" alimentados a batería para la medición de agua Termal captada por el hotel La casona del Salitre y del Hotel Sochagota respectivamente del IDEBOY.		
RESPONSABLES EN LA OBRA		
Nombre	Cargo	Firma
Wilmar Fernando Peña Silas	Presidente de Obra	Wilmar F. Peña S.
		
		

BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		26
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los Hoteles Sochagota y la Casona del IDEBOY		
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA - MC - 005 de 2025	No. DE OBRA:	01
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 14/01/2026	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT10 MZ123, Barrio Portal de Honzahua, Tunja		
TELÉFONOS	3232318783 - 3112427219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se realizan labores activas y calientomía, en la mañana y tarde ya que se realizan trabajos de protección de mobiliario en campo. Adicionalmente se realiza charlas de seguridad en higiene Destructiva,			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Yenni Alexandra Zarguira	Profesional EOT	Yenni Alexandra Zarguira	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

27

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		28
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macromedidores para los hoteles sochagota y la Casona del IDEBOY.		
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA - MC - 005 de 2025	No. DE OBRA:	01
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 14/01/2026	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT10 M2123, Barrio Portal de Hunzahua - Tunja		
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se inicia excavación de zanja para cableado que alimentará los macromedidores. Se hace la excavación de aproximadamente 70 metros de zanja con profundidad de 40cm para el macromedidor de sochagota.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	
			
			

BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		29
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de micromedidores para los Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY.		
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA - MC - 005 de 2025	No. DE OBRA:	01
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 15/01/2026	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT 10 M2123, Barrio Portal de Hunzahua - Tunja		
TELÉFONOS	3232318783 - 3112427219		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se continúa con la excavación de Zanja, se hace la excavación de otros 30 metros aproximadamente. Se completan 140 metros aproximadamente.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Presidente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA		
	NOMBRE DE LA EMPRESA	FOLIO:
	SIE WATER SAS	30
DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	Construcción de cajas de Seguridad, suministro e instalación de macro-medidores para los Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:	SA- MC- 005 de 2025	No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 16/01/2026
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS	
DOMICILIO	Calle 80, LT 10 MZ 123, Barrio postal de Hunzahua, Tunja	
TELÉFONOS	3232318783 - 3112927214	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
Se termina la excavación de 170 metros de zanja para la instalación eléctrica del macromedidor del Sochagota y se realiza la excavación de 10 metros de zanja para la instalación eléctrica del macromedidor de la casona de Salitre.		
RESPONSABLES EN LA OBRA		
Nombre	Cargo	Firma
Wilmar Fernando Peón Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peón S.

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

31

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA			
		NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 32
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:		Predio La Esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá	
LOCALIZACIÓN:		Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macro-medidores para los Hoteles Sochagotí y la caseta del IDEBOY.	
No. DE CONTRATO:		SA-MC-005- de 2025	No. DE OBRA: 01
FECHA DE INICIO:		PROGRAMADA:	REAL: 14/01/2026
FECHA DE CONCLUSIÓN:		PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SIE WATER SAS	
DOMICILIO		Predio La Esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá	
TELÉFONOS		3232310783 - 3112927219	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se realiza el enterramiento de 180 metros de tubería conduit SCH 40 y de 540 metros de cable #12 (tres líneas) para alimentación eléctrica a 220 VAC de los dos macromedidores desde la caseta de bombas ubicada en el predio la esperanza.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

33

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITÁCORA DE OBRA			
		NOMBRE DE LA EMPRESA SIE WATER SAS	FOLIO: 34
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:		Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de macro medidores para los hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY	
LOCALIZACIÓN:		Prodia la esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá	
No. DE CONTRATO:		SA-MC-005 - de 2025	No. DE OBRA: 01
FECHA DE INICIO:		PROGRAMADA:	REAL: 20/01/2026
FECHA DE CONCLUSIÓN:		PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SIE WATER SAS	
DOMICILIO		Calle 80 LT 10 MZ 123, Barrio portal de Hunzahon, Tunja	
TELÉFONOS		3232318783 - 3112927219	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se realiza incorporación del cableado eléctrico dentro de cada una de las cajas de seguridad y se realiza la adecuación del mismo dentro de la caseta			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmar Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmar F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA




NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

35

REGISTRO FOTOGRAFICO

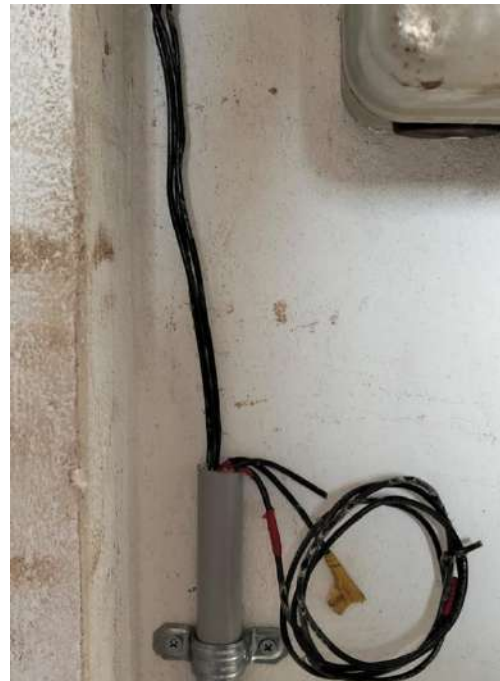

BITÁCORA DE OBRA			
	NOMBRE DE LA EMPRESA		FOLIO:
	SIE WATER SAS		36
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE:	Construcción de cajas de Seguridad, suministro e instalación de macro medidores para los Hoteles Sochagota y la casona del IDEBOY.		
LOCALIZACIÓN:	Predio La Esperanza del IDEBOY, Paipa - Boyacá		
No. DE CONTRATO:	SA-MC-005 de 2025	No. DE OBRA:	01
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL: 24/01/2026	
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIE WATER SAS		
DOMICILIO	Calle 80 LT10 MZ 123 Barrio portal de Honzahun, Tunja		
TELÉFONOS	3232318383 - 3112927214		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
Se realiza instalación de dos (02) Breaker para alimentación eléctrica de cada uno de los macro medidores. Conexión, programación y puesta en marcha de los dos macro medidores y verificación de su medición.			
RESPONSABLES EN LA OBRA			
Nombre	Cargo	Firma	
Wilmari Fernando Peña Salas	Residente de Obra	Wilmari F. Peña S.	

BITÁCORA DE OBRA



NOMBRE DE LA EMPRESA

SIE WATER SAS

FOLIO:

37

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763421844	9491613866	E	2025/09/05	2025/09/09	BANCOLOMBIA	4	\$1,982,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)					\$6,987,900	\$1,118,200			\$6,987,900	\$279,700			\$6,864,400	\$274,700			\$6,987,900	\$304,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: QUIMICOS (4 Afiliados)					\$6,987,900	\$1,118,200			\$6,987,900	\$279,700			\$6,864,400	\$274,700			\$6,987,900	\$304,300		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)					\$6,987,900	\$1,118,200			\$6,987,900	\$279,700			\$6,864,400	\$274,700			\$6,987,900	\$304,300		\$0	\$0	
1	CC	74181701	BUITRAGO GERMAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
2	CC	1010761043	CARVAJAL VALENTINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
3	CC	1054709398	CASTELBLANCO JUAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
4	CC	1054092107	PEÑA WILMAR	230301	30	\$2,717,400	\$434,800	EPS005	30	\$2,717,400	\$108,700	CCF10	30	\$2,717,400	\$108,700	14-23	30	\$2,717,400	\$118,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$6,987,900	\$1,118,200			\$6,987,900	\$279,700			\$6,864,400	\$274,700			\$6,987,900	\$304,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763421844	9491613866	E	2025/09/05	2025/09/09	BANCOLOMBIA	4	\$1,982,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$1,118,200	\$2,900	\$0	\$1,121,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$600	\$0	\$228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$662,600	\$1,700	\$0	\$664,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$600	\$0	\$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$304,300	\$800	\$0	\$305,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$304,300	\$800	\$0	\$305,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$274,700	\$700	\$0	\$275,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$274,700	\$700	\$0	\$275,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$279,700	\$900	\$0	\$280,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$108,700	\$300	\$0	\$109,000
TOTAL				4	\$1,976,900	\$5,300	\$0	\$1,982,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1838510501	9493089357	E	2025/10/07	2025/10/08	BANCOLOMBIA	1	\$2,221,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)					\$7,842,000	\$1,255,000			\$7,842,000	\$313,900			\$7,718,500	\$308,900			\$7,842,000	\$341,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: QUIMICOS (6 Afiliados)					\$7,842,000	\$1,255,000			\$7,842,000	\$313,900			\$7,718,500	\$308,900			\$7,842,000	\$341,500		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)					\$7,842,000	\$1,255,000			\$7,842,000	\$313,900			\$7,718,500	\$308,900			\$7,842,000	\$341,500		\$0	\$0	
1	CC	74181701	BUITRAGO GERMAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
2	CC	1010761043	CARVAJAL VALENTINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
3	CC	1054709398	CASTELBLANCO JUAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
4	CC	1054092107	PEÑA WILMAR	230301	30	\$2,717,400	\$434,800	EPS005	30	\$2,717,400	\$108,700	CCF10	30	\$2,717,400	\$108,700	14-23	30	\$2,717,400	\$118,300	30	\$0	\$0
5	CC	4277871	RODRIGUEZ MAURICIO	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS005	9	\$427,050	\$17,100	CCF10	9	\$427,050	\$17,100	14-23	9	\$427,050	\$18,600	9	\$0	\$0
6	CC	1057410515	SALINAS YOJAN	230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC24	9	\$427,050	\$17,100	CCF10	9	\$427,050	\$17,100	14-23	9	\$427,050	\$18,600	9	\$0	\$0
Total Afiliados(6)					\$7,842,000	\$1,255,000			\$7,842,000	\$313,900			\$7,718,500	\$308,900			\$7,842,000	\$341,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1838510501	9493089357	E	2025/10/07	2025/10/08	BANCOLOMBIA	1	\$2,221,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,255,000	\$900	\$0	\$1,255,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$296,200	\$200	\$0	\$296,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$731,000	\$500	\$0	\$731,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$341,500	\$300	\$0	\$341,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$341,500	\$300	\$0	\$341,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$308,900	\$200	\$0	\$309,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$308,900	\$200	\$0	\$309,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	\$313,900	\$500	\$0	\$314,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$17,100	\$100	\$0	\$17,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$125,800	\$100	\$0	\$125,900	
TOTAL				6	\$2,219,300	\$1,900	\$0	\$2,221,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1920852206		9494622141	E	2025/11/10	2025/11/11	BANCOLOMBIA	\$2,230,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74181701	BUITRAGO GERMAN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
2	CC	1010761043	CARVAJAL VALENTINA																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$398,800
3	CC	1054709398	CASTELBLANCO JUAN								X									25-14	30	\$1,455,852	\$233,000	EPS041	30	\$1,455,852	\$58,300	CCF10	30	\$1,455,852	\$58,300	14-23	30	\$1,455,852	\$63,400	30	\$0	\$0	Si	\$413,000
4	CC	1054092107	PEÑA WILMAR																	230301	30	\$2,717,400	\$434,800	EPS005	30	\$2,717,400	\$108,700	CCF10	30	\$2,717,400	\$108,700	14-23	30	\$2,717,400	\$118,300	30	\$0	\$0	Si	\$770,500
5	CC	4277871	RODRIGUEZ MAURICIO		X															25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS005	9	\$427,050	\$17,100	CCF10	9	\$427,050	\$17,100	14-23	9	\$427,050	\$18,600	9	\$0	\$0	Si	\$121,200
6	CC	1057410515	SALINAS YOJAN		X															230301	9	\$427,050	\$68,400	ESSC24	9	\$427,050	\$17,100	CCF10	9	\$427,050	\$17,100	14-23	9	\$427,050	\$18,600	9	\$0	\$0	Si	\$121,200
Total		Afiliados(6)																				\$7,874,352	\$1,260,200			\$7,874,352	\$315,200			\$7,750,852	\$310,200			\$7,874,352	\$342,900		\$0	\$0		\$2,228,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-10	2025-11	1920852206	9494622141	E	2025/11/10	2025/11/11	BANCOLOMBIA	1	\$2,230,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$1,260,200	\$900	\$0	\$1,261,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$301,400	\$200	\$0	\$301,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$731,000	\$500	\$0	\$731,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$342,900	\$300	\$0	\$343,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$342,900	\$300	\$0	\$343,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$310,200	\$200	\$0	\$310,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$310,200	\$200	\$0	\$310,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					6	\$315,200	\$500	\$0	\$315,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$17,100	\$100	\$0	\$17,200		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$58,300	\$100	\$0	\$58,400		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$125,800	\$100	\$0	\$125,900		
TOTAL					6	\$2,228,500	\$1,900	\$0	\$2,230,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997137044	9496256756	E	2025/12/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	5	\$2,011,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)					\$7,084,957	\$1,133,700			\$7,084,957	\$283,600			\$6,961,457	\$278,600			\$7,084,957	\$308,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: QUIMICOS (4 Afiliados)					\$7,084,957	\$1,133,700			\$7,084,957	\$283,600			\$6,961,457	\$278,600			\$7,084,957	\$308,500		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)					\$7,084,957	\$1,133,700			\$7,084,957	\$283,600			\$6,961,457	\$278,600			\$7,084,957	\$308,500		\$0	\$0	
1	CC	74181701	BUITRAGO GERMAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
2	CC	1010761043	CARVAJAL VALENTINA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
3	CC	1054709398	CASTELBLANCO JUAN	25-14	30	\$1,520,557	\$243,300	EPS041	30	\$1,520,557	\$60,900	CCF10	30	\$1,520,557	\$60,900	14-23	30	\$1,520,557	\$66,200	30	\$0	\$0
4	CC	1054092107	PEÑA WILMAR	230301	30	\$2,717,400	\$434,800	EPS005	30	\$2,717,400	\$108,700	CCF10	30	\$2,717,400	\$108,700	14-23	30	\$2,717,400	\$118,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$7,084,957	\$1,133,700			\$7,084,957	\$283,600			\$6,961,457	\$278,600			\$7,084,957	\$308,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997137044	9496256756	E	2025/12/05	2025/12/10	BANCOLOMBIA	5	\$2,011,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$1,133,700	\$3,700	\$0	\$1,137,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$243,300	\$800	\$0	\$244,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$662,600	\$2,100	\$0	\$664,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$800	\$0	\$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$308,500	\$1,000	\$0	\$309,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$308,500	\$1,000	\$0	\$309,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$278,600	\$900	\$0	\$279,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$278,600	\$900	\$0	\$279,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$283,600	\$1,000	\$0	\$284,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$60,900	\$200	\$0	\$61,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$108,700	\$400	\$0	\$109,100
TOTAL				4	\$2,004,400	\$6,600	\$0	\$2,011,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2073307866	9497789532	E	2026/01/08	2026/01/13	BANCOLOMBIA	5	\$1,995,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74181701	BUITRAGO GERMAN																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
2	CC	1010761043	CARVAJAL VALENTINA									X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,313,176	\$52,600	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$399,400
3	CC	1054709398	CASTELBLANCO JUAN									X									25-14	30	\$1,463,940	\$234,300	EPS041	30	\$1,463,940	\$58,600	CCF10	30	\$1,463,940	\$58,600	14-23	30	\$1,463,940	\$63,700	30	\$0	\$0	Si	\$415,200
4	CC	1054092107	PEÑA WILMAR																		230301	30	\$2,717,400	\$434,800	EPS005	30	\$2,717,400	\$108,700	CCF10	30	\$2,717,400	\$108,700	14-23	30	\$2,717,400	\$118,300	30	\$0	\$0	Si	\$770,500
Total Afiliados(4)																							\$7,028,340	\$1,124,700			\$7,028,340	\$281,300			\$6,918,016	\$276,900			\$7,028,340	\$306,000		\$0	\$0		\$1,988,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2073307866	9497789532	E	2026/01/08	2026/01/13	BANCOLOMBIA	5	\$1,995,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$1,124,700	\$3,600	\$0	\$1,128,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$234,300	\$800	\$0	\$235,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$662,600	\$2,100	\$0	\$664,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$700	\$0	\$228,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$306,000	\$1,000	\$0	\$307,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$306,000	\$1,000	\$0	\$307,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$276,900	\$900	\$0	\$277,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$276,900	\$900	\$0	\$277,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$281,300	\$1,000	\$0	\$282,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$58,600	\$200	\$0	\$58,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$108,700	\$400	\$0	\$109,100	
TOTAL				4	\$1,988,900	\$6,500	\$0	\$1,995,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	54914333	9499549188	E	2026/01/08	2026/02/11	BANCOLOMBIA	34	\$55,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$189,800	\$30,400			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$8,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: QUIMICOS (1 Afiliados)					\$189,800	\$30,400			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$8,300		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$189,800	\$30,400			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$8,300		\$0	\$0	
1	CC	1057410515	SALINAS YOJAN	230301	4	\$189,800	\$30,400	ESSC24	4	\$189,800	\$7,600	CCF10	4	\$189,800	\$7,600	14-23	4	\$189,800	\$8,300	4	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$189,800	\$30,400			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$8,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	54914333	9499549188	E	2026/01/08	2026/02/11	BANCOLOMBIA	34	\$55,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,400	\$700	\$0	\$31,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$30,400	\$700	\$0	\$31,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,300	\$200	\$0	\$8,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,300	\$200	\$0	\$8,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,600	\$200	\$0	\$7,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$7,600	\$200	\$0	\$7,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,600	\$200	\$0	\$7,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$7,600	\$200	\$0	\$7,800	
TOTAL				1	\$53,900	\$1,300	\$0	\$55,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54906503	9499549309	E	2026/02/06	2026/02/11	BANCOLOMBIA	5	\$242,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					\$875,453	\$140,100			\$875,453	\$35,100			\$711,750	\$28,500			\$875,453	\$38,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: QUIMICOS (1 Afiliados)					\$875,453	\$140,100			\$875,453	\$35,100			\$711,750	\$28,500			\$875,453	\$38,100		\$0	\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$875,453	\$140,100			\$875,453	\$35,100			\$711,750	\$28,500			\$875,453	\$38,100		\$0	\$0	
1	CC	1057410515	SALINAS YOJAN	230301	15	\$875,453	\$140,100	ESSC24	15	\$875,453	\$35,100	CCF10	15	\$711,750	\$28,500	14-23	15	\$875,453	\$38,100	15	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$875,453	\$140,100			\$875,453	\$35,100			\$711,750	\$28,500			\$875,453	\$38,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901560724	4	SIE WATER SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 22 7A 15 APTO 102	TUNJA-BOYACA	3232318783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54906503	9499549309	E	2026/02/06	2026/02/11	BANCOLOMBIA	5	\$242,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,100	\$500	\$0	\$140,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,100	\$500	\$0	\$140,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,100	\$200	\$0	\$38,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$38,100	\$200	\$0	\$38,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$28,500	\$100	\$0	\$28,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300	
TOTAL				1	\$241,800	\$1,000	\$0	\$242,800	

INFORME ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

EMPRESA:

SIE WÁTER S.A.S

ELABORADO POR:

YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON

ESP EN SST

FEBRERO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Actividad: Construcción de cajas de seguridad, suministro e instalación de para los hoteles de Sochagota y la Casona del IDEBOY

Localización: Predio La esperanza IDEBOY, Paipa – Boyacá

Periodo: se ejecuto dentro de los meses septiembre, octubre y noviembre del año 2025.

Personal involucrado: Ingeniero de obra, maestros de obra y coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo: El objetivo principal de SIE WATER con la implementación del SG-SST es evaluar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, documentar accidentes y enfermedades, y usar esa información para diseñar e implementar estrategias de prevención de riesgos. Es una herramienta clave para asegurar la salud de los empleados, cumplir con la normativa legal y mejorar continuamente las condiciones laborales.

2. GESTIÓN DE RIESGOS

2.1. Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Durante la ejecución del contrato, se elaboraron y socializaron los ATS de manera diaria y previa al inicio de cada actividad. Este proceso permitió identificar peligros y valorar riesgos específicos, asegurando que todo el personal contara con las medidas de control necesarias para una operación segura.

2.2. Charla de 5 minutos y socializaciones: Durante el periodo reportado, se realizaron charlas de cinco minutos y diversas capacitaciones. A continuación, se relacionan algunos temas impartidos:

Charlas de 5 minutos:

- Uso de Epp
- Actos inseguros
- Condiciones inseguras.
- Manejo adecuado de herramientas
- Normas generales de seguridad
- Cuidado de la columna e higiene postural.

Capacitaciones:

- + Peligro biomecánico: principales riesgos asociados al peligro biomecánico, medidas de control y como evitar lesiones por manipulación de cargas.
- + Actos y condiciones inseguras: se socializa acerca de los actos inseguros más consecutivos que cometen los trabajadores en el trabajo. También se socializa de acerca de las condiciones inseguras más comunes y como prevenir accidentes por estas.

+ **Registro fotográfico:**



2.3. Calistenias y pausas activas.

Durante la etapa de construcción de las cajas, se implementaron de manera sistemática jornadas de **calistenia (calentamiento preventivo)** antes de iniciar las labores y **pausas activas** durante la jornada. Estas acciones buscaron mitigar la fatiga muscular, mejorar la disposición biomecánica de los operarios y prevenir trastornos musculoesqueléticos derivados de las tareas de excavación y armado.



2.4. Inspección de herramientas: Se realizó el seguimiento técnico de la obra mediante la inspección de herramientas y la validación de maniobras seguras durante la construcción de las cajas.



3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para la ejecución de las actividades de construcción de cajas, se garantizó el uso permanente de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP): casco de seguridad con barbuquejo, botas de seguridad con puntera de acero, guantes de protección (vaqueta o nitrilo, según la tarea), gafas y dotación de camisa de manga larga y pantalón de alta resistencia. Estas medidas se implementaron para mitigar riesgos de impactos, laceraciones y proyección de partículas.



4. INCIDENTES Y ACCIDENTES

Durante la fase de construcción de las cajas, se mantuvo un índice de accidentalidad de cero, sin que se registraran accidentes, incidentes ni ausentismos derivados de incapacidades médicas.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la construcción de las cajas, se ejecutaron las siguientes medidas preventivas para garantizar la integridad del personal:

Delimitación y Señalización: Se señalizó el área operativa utilizando cinta de señalización, restringiendo el acceso a personal no autorizado y previniendo caídas de terceros.

Ergonomía y Manejo de Cargas: Durante la preparación de mezclas y levantamiento de materiales, se supervisó la higiene postural (espalda recta, flexión de rodillas) para prevenir lesiones osteomusculares y fatiga lumbar.

Seguridad Operativa y Mecánica: Se mantuvo vigilancia constante para mitigar riesgos de **atrapamiento** de extremidades, golpes por herramientas manuales o proyecciones de partículas durante la construcción de las estructuras.

Protección Personal (EPP): Uso obligatorio de guantes de seguridad, botas reforzadas y protección ocular durante la manipulación de cemento y herramientas, evitando contacto directo con químicos o cortes.

Orden y Aseo (Programa 5S): Se realizó la clasificación y disposición adecuada de escombros y sobrantes de material, para evitar tropezones y manteniendo el área libre de condiciones inseguras al finalizar la jornada.

Cordialmente,



Yeimi Alexandra Zanguña
Esp en SST
Licencia 0568

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	01/10/2025	90264548	\$886.200	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	388.700	0		0		0	0	0	388.700	1	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.500	0	0	0	0	0	0		497.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	388.700	388.700
Pensión	1	497.500	497.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	886.200	886.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON		Calle 25 19-43	7850657	yomaire21@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	PAIPA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-09	2025-09	I	01/10/2025	90264548	\$886.200

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	1053607431	ZANGUÑA BARON YEIMI ALEXANDRA	3	0		N																		25-14	3.109.186	497.500	0	0	0	0	0	EPS037	3.109.186	388.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON		Calle 25 19-43	7850657	yomaire21@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	PAIPA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-10	I	23/10/2025	90817066	\$886.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	388.700	0		0		0	0	0	0	388.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.500	0	0	0	0	0	0		497.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	388.700	388.700
Pensión	1	497.500	497.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	886.200	886.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON		Calle 25 19-43	7850657	yomaire21@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	PAIPA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-10	I	23/10/2025	90817066	\$886.200
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONSECO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1053607431	ZANGUÑA BARON YEIMI ALEXANDRA	3	0		N																		25-14	3.109.186	497.500	0	0	0	0	EPS037	3.109.186	388.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON		Calle 25 19-43	7850657	yomaire21@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	PAIPA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	21/11/2025	91653287	\$886.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	388.700	0		0		0	0	0	0	388.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.500	0	0	0	0	0	0		497.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	388.700	388.700
Pensión	1	497.500	497.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	886.200	886.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON		Calle 25 19-43	7850657	yomaire21@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	PAIPA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	21/11/2025	91653287	\$886.200

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	1053607431	ZANGUÑA BARON YEIMI ALEXANDRA	3	0		N																		25-14	3.109.186	497.500	0	0	0	0	0	EPS037	3.109.186	388.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON		Calle 25 19-43	7850657	yomaire21@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	PAIPA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-12	2025-12	I	10/12/2025	92274989	\$886.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	388.700	0		0		0	0	0	0	388.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.500	0	0	0	0	0	0		497.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	388.700	388.700
Pensión	1	497.500	497.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	886.200	886.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON		Calle 25 19-43	7850657	yomaire21@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	PAIPA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	I	10/12/2025	92274989	\$886.200

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres					Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORREGIDA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1053607431	ZANGUÑA BARON YEIMI ALEXANDRA					3	0		N																		25-14	3.109.186	497.500	0	0	0	0	EPS037	3.109.186	388.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

**CERTIFICADOS DE
CALIBRACION
MACROMEDIDORES**

DI9A / All.10	REF. 85003943 / 25
UID.20477	NUM. 06CR

RAPPORTO DI CALIBRAZIONE DEL MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
CALIBRATION REPORT OF THE ELECTROMAGNETIC FLOW METER
 Conforme alla Norma ISO 20456/According to ISO 20456

MISURATORE / METER UNDER TEST EUT			
Modello / Model	MUT2200EL / MC608A	Liquido / Liquid	H2O
Matricola / S/N	RAC07885 / RCA08531	Temp. Liquido / Liquid. temp.	23,1°C
Coeff. KA	1,8153	Temp. amb. / Env. temp.	21,1°C
Diametro / Size	DN150		
PN	ANSI 150	Lunghezza tub.diritta a monte/valle misuratore Length of straight pipe upstream/downstream meter	2200 mm / 1500 mm
Anno di Produzione Year of manufacturing	2025	DN nominale tub. a monte/valle misuratore Nominal DN pipe upstream/downstream meter	150 (Di=162)
Data Report Report Date (dd/mm/yyyy)	01/10/2025	Ordine cliente Customer Order (PO)	85003943 / 25

STRUMENTO DI RIFERIMENTO / REFERENCE INSTRUMENT		
BILANCIA CERTIFICATA SECONDO ISO 17025 / WEIGHT SCALE CERTIFIED ACCORDING TO ISO 17025		
MISURATORE MASTER OIML R49-2013 / MASTER METER OIML R49-2013		
Matricola S/N	Report N°	Data Verifica / Verification date
C035930807 (GS1-ON2)	LAT 044 B250216	05/05/2025
C035930808 (GS1-ON1)	LAT 044 B250217	05/05/2025

RISULTATI DELLA TARATURA / CALIBRATION RESULTS				
Test N° (**)	AVER. REF. SPEED [m/s]	AVER. REF. FLOWRATE [m3/h]	AVER. TEST FLOWRATE [m3/h]	AVER. ERROR (*) (%)
1	2,950	187,59	187,73	0,07
2	1,805	114,76	114,82	0,05
3	0,588	37,388	37,371	-0,05

Operator Signature



DI9A / All.10	REF. 85003943 / 25
UID.20477	NUM. 06CR

RAPPORTO DI CALIBRAZIONE DEL MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
CALIBRATION REPORT OF THE ELECTROMAGNETIC FLOW METER
Conforme alla Norma ISO 20456/According to ISO 20456

MISURATORE / METER UNDER TEST EUT			
Modello / Model	MUT2200EL / MC608A	Liquido / Liquid	H2O
Matricola / S/N	RAC07884 / RCA08530	Temp. Liquido / Liquid. temp.	22,5°C
Coeff. KA	1,6882	Temp. amb. / Env. temp.	22,9°C
Diametro / Size	DN100		
PN	ANSI 150	Lunghezza tub.diritta a monte/valle misuratore Length of straight pipe upstream/downstream meter	1100 mm / 550 mm
Anno di Produzione Year of manufacturing	2025	DN nominale tub. a monte/valle misuratore Nominal DN pipe upstream/downstream meter	100 (Di=110)
Data Report Report Date (dd/mm/yyyy)	29/09/2025	Ordine cliente Customer Order (PO)	85003943 / 25

STRUMENTO DI RIFERIMENTO / REFERENCE INSTRUMENT		
BILANCIA CERTIFICATA SECONDO ISO 17025 / WEIGHT SCALE CERTIFIED ACCORDING TO ISO 17025		
MISURATORE MASTER OIML R49-2013 / MASTER METER OIML R49-2013		
Matricola S/N	Report N°	Data Verifica / Verification date
C035930807 (GS1-ON2)	LAT 044 B250216	05/05/2025
C035930808 (GS1-ON1)	LAT 044 B250217	05/05/2025

RISULTATI DELLA TARATURA / CALIBRATION RESULTS				
Test N° (**)	AVER. REF. SPEED [m/s]	AVER. REF. FLOWRATE [m3/h]	AVER. TEST FLOWRATE [m3/h]	AVER. ERROR (*) (%)
1	2,981	84,234	84,602	0,44
2	1,855	52,435	52,585	0,29
3	0,598	16,898	16,889	-0,06

Operator Signature



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			
			CÓDIGO: P-AJ-04		VERSIÓN: 0	
	PROCESO: APOYO JURIDICO		FECHA: 20-01-2023		PÁGINA 1 DE 4	

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	<u> X </u>	CONVENIO:	<u> </u>
INTERVENTORÍA:	<u> </u>	SUPERVISIÓN	<u> X </u>
PARCIAL	<u> </u>	FINAL	<u> X </u>

INFORME No:	2		FECHA:	10	de	FEBRERO	de	2026
-------------	---	--	--------	----	----	---------	----	------

PERIODO:	DEL	9	de	SEPTIEMBRE	de	2025	AL	28	de	ENERO	de	2026
----------	-----	---	----	------------	----	------	----	----	----	-------	----	------

No. CONTRATO O CONVENIO	SA-MC-005	DE	2025	FECHA:	26	de	AGOSTO	de	2025
----------------------------	-----------	----	------	--------	----	----	--------	----	------

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 69.561.575,60	RPC	No. 125 - 2025 / 056 - 2026
----------------------------------	------------------	-----	-----------------------------

CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO O CONTRATO	SIE WATER SAS
---	---------------

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE AGUA TERMOMINERAL PARA LOS HOTELES LA CASONA DEL SALITRE Y SOCHAGOTA, UBICADOS EN PREDIOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CLAUDIA MARIELA GONZÁLEZ VILLANUEVA		
Dirección:	Calle 19 No. 9-35 Piso 7. Edificio Lotería de Boyacá		

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO		
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	9	09	2025
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO		
PLAZO CON ADICIONES	SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	7	11	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	28	01	2026

INFORME ADMINISTRATIVO
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG			INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
				CÓDIGO: P-AJ-04	VERSIÓN: 0
	PROCESO: APOYO JURIDICO			FECHA: 20-01-2023	PÁGINA 1 DE 4

CONTRATO O CONVENIO						
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN		
ACTA DE INICIO	9	09	2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	5	11	2025	Suspensión por demora en importación de equipos de medición		
INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 01	6	11	2025	Se relacionan actividades relacionadas con la construcción de las cajas de seguridad		
ACTA DE REINICIO No. 01	23	12	2025			
MODIFICATORIO No. 01	23	12	2025	Cambio característica técnica macromedidores alimentación por batería a alimentación eléctrica y se amplía 15 días calendario vigencia de ejecución contractual		
ACTA DE SUSPENSION No. 02	26	12	2025	Suspensión por baja disponibilidad de personal debido a temporada de fin de año		
ACTA DE REINICIO No. 02	14	01	2026			
ACTA DE TERMINACIÓN	28	1	2026			

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO						
CONTRATO O CONVENIO						
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO	
1	23	12	2025	N/A	15 DIAS	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				N/A	75 DIAS	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO						
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	
1	Descripción técnica Macromedidores	23	12	2023	Modificación técnica de los macromedidores a instalar donde se cambia el modo de alimentación a batería por alimentación eléctrica.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		
			CÓDIGO: P-AJ-04	VERSIÓN: 0	
	PROCESO: APOYO JURIDICO		FECHA: 20-01-2023	PÁGINA 1 DE 4	
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Dar cumplimiento a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS Y A LAS RESPECTIVAS NOTAS	El contratista presento informe final donde se evidencia el cumplimiento total de todas las actividades contratadas y las derivadas del modificadorio No. 01	X			Se cumplieron las especificaciones técnicas plasmadas en los estudios previos y en el modificadorio No. 01
Entregar la obra contratada en los términos y condiciones establecidos, en los anexos técnicos, términos de referencia y la propuesta presentada por el Contratista.	Se entrego la obra en términos y condiciones establecidas. Se verifico funcionamiento de macromedidores, cumpliendo condiciones de funcionamiento y operación.	X			Actividad entregada acorde a las consideración técnicas establecidas
Establecer en conjunto con la supervisión del contrato, un cronograma para el desarrollo de cada actividad.	El contratista presento cronograma de actividades previo inicio de obras y cronograma por debido a suspensiones ejecutadas.	X			
El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su propiedad, utilizados para la ejecución del contrato.	Actividad cumplida	X			
Mantener vinculado a todo el personal necesario para ejecutar el presente contrato.	El contratista presenta en el informe final planillas de seguridad social de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2025 y enero de 2026.	X			
Suministrar por su cuenta y riesgo los equipos, materiales de obra y recursos que el personal a su cargo requiera para ejecutar las actividades asignadas.	Actividad cumplida totalmente: El contratista suministro los equipos, materiales de obra y recursos de personal necesarios para el cumplimiento de las actividades.	X			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG				INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
					CÓDIGO: P-AJ-04	VERSIÓN: 0
	PROCESO: APOYO JURIDICO				FECHA: 20-01-2023	PÁGINA 1 DE 4
Elaborar y suscribir junto con la supervisión las actas que se deriven de la ejecución del contrato.	Actividad cumplida	X				
El contratista deberá asegurar la correcta impermeabilización de las cajas de seguridad	Se realizo revisión de la impermeabilización, cumple.	X				La caja de inspección del macromedidores de 4 pulgadas presenta mínima lamina de agua, debido a la sudoración generada la temperatura en el terreno por la proximidad con la fuente termal.
Garantizar que los bienes objeto de este proceso que deban ser entregados por el contratista, cuenten con los más altos estándares de calidad y en caso de que presenten defectos, es deber del contratista reemplazarlos sin que ello implique erogación algún a cargo del IDEBOY.	Actividad cumplida. Actividades ejecutadas cumplen con criterios de calidad	X				
El contratista se compromete a entregar en funcionamiento los equipos de medición	El contratista entrega equipos en funcionamiento, verificados en acta de visita del día 28 de enero de 2026.	X				
Entregar los respectivos manuales de uso y mantenimiento de las obras y bienes ejecutados cuando se requiera y capacitar al personal definido por el IDEBOY para la operación y toma de lecturas de los equipos de medición	En reunión el día 28 de enero de 2026, se realiza capacitación al personal para la toma de lectura de los equipos de medición.	X				El contratista no entrega manuales de mantenimiento de los equipos debido a que no requieren mantenimiento y señala en acta que si se presenta una falla en su funcionamiento se deben comunicar directamente con el empresa representante de los macromedidores o el contratista.
Suministrar de los materiales, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás elementos requeridos para el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. En todos los casos se debe contemplar el retiro de sobrantes, limpieza de los sitios intervenidos, la dedicación del personal técnico o profesional requerido.	Actividad cumplida: El contratista suministro los equipos, materiales de obra y recursos de personal necesarios para el cumplimiento de las actividades.	X				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG				INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
					CÓDIGO: P-AJ-04	VERSIÓN: 0
	PROCESO: APOYO JURIDICO				FECHA: 20-01-2023	PÁGINA 1 DE 4

No ejecutar ítems adicionales, sin previa autorización del IDEBOY, quien se encargará de revisar y aprobar o no según lo considere; para tal fin se deberán soportar las debidas actas, de lo contrario será responsabilidad exclusiva del contratista	El contratista informa que durante la ejecución de las actividades fue necesario el suministro e instalación de un tubo de urgencia el cual no estaba previsto inicialmente, dado que presento fallas, por lo cual debido a la necesidad urgente de tener operativa la tubería se contemplo como un imprevisto	X			
Presentar informe final de las obras donde se incluyan memorias de cantidades, registro fotográfico y descripción de los trabajos realizados.	El contratista presento informe final donde se anexo memorias de cantidades, bitácoras con el respectivo registro fotográfico.	X			
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021	Actividad cumplida	X			Contratista presento documento de una persona que acredita vulnerabilidad catalogado como sujeto de especial protección, previo inicio de actividades.
Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación de los servicios contratados como resultado del presente proceso.	Actividad cumplida: Se cumplieron obligaciones requeridas para la ejecución del contrato	X			


INFORME TÉCNICO

En desarrollo de las funciones de supervisión del contrato SA-MC-005-2025, se verificó la presentación por parte del contratista del informe final de las actividades ejecutadas tanto en el contrato inicial como en las actividades derivadas del Modificadorio No. 01. Dicho informe contiene la relación de cantidades ejecutadas, registros fotográficos, bitácoras y demás soportes técnicos, con los cuales se evidencia la ejecución de las actividades contractualmente previstas y que garantizaron el objeto de la instalacion de los equipos de medicion.

Así mismo, se constató que el informe incluye cantidades correspondientes a actividades derivadas del Modificadorio No. 01 que no fueron objeto de reconocimiento ni pago, cuyo costo de ejecución fue asumido por el contratista. Esta situación se originó en el ajuste de la característica técnica inicialmente contemplada, consistente en el cambio del sistema de alimentación por batería a un sistema de alimentación eléctrica para los macromedidores contratados, sin que ello genere obligaciones económicas adicionales para la entidad contratante.

Adicionalmente, desde la supervisión se verificó la presentación del informe de ejecución de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y el pago de seguridad social fue soportado mediante certificación emitida por el contador, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en esta materia.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
			CÓDIGO: P-AJ-04	VERSIÓN: 0
	PROCESO: APOYO JURIDICO		FECHA: 20-01-2023	PÁGINA 1 DE 4

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,00%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,00%
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO % PAGOS AUTORIZADOS					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCIÓN: Se ejecutaron el 100% de las actividades contratadas conforme a las características técnicas establecidas en el pliego de condiciones y modificadorio No. 01 . **AVANCE:** 100%. **ESTADO:** Terminado

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	88200001820	FIDUCIA No.:	BANCO: BANCOLOMBIA		
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		BANCOLOMBIA			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		SIE WATER SAS			
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
TOTAL					\$ 0,00

INFORME JURÍDICO					
El contrato se ejecuto conforme a las especificaciones dadas en el contrato y modificación aprobada, no se presentaron multas o sanciones al contratista, el personal relacionado por contratista cuenta con los respectivos pagos al sistema de seguridad social; salud pensión y riesgos laborales.					
OBSERVACIONES:					
 CLAUDIA MARIELA GONZALEZ VILLANUEVA Nombre y Firma Supervisor o Interventor					
Elaboró: Julián Jhair Torres Mora - Ing. Ambiental - Apoyo a la supervisión					
NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."					




FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

La suscrita LEIDY JOHANA PEREZ CAMARGO identificada con cédula de ciudadanía N° 1.049.625.014 de Tunja y tarjeta profesional No. 256253-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador del SIE WATER S.A.S identificada con Nit 901.560.724-4, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa, bajo la gravedad de juramento, **certifico** el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Tunja, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026

Se firma por:



Leidy Johana Pérez Camargo

Contadora Pública

T.P. N° 256.253-T



Cel.: 3102048046

Email.: leidyperezcontadora@gmail.com

Centro Comercial y Empresarial Plaza Real Ofi. 205A – Tunja



Leidy Pérez
Contadora Pública



SOLUCIONES CONTABLES.
TELÈFONO: 310 204 8046
E-MAIL: LEIDYPEREZCONTADORA@GMAIL.COM
CII 20 N° 14 - 63. APTO 201 TUNJA - BOYACÁ - COLOMBIA.



Leidy Pérez
Publica

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

5916A87700450197

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY JOHANA PEREZ CAMARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049625014 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 256253-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOLUCIONES CONTABLES.

TELÉFONO: 310 204 8046

E-MAIL: LEIDYPEREZCONTADORA@GMAIL.COM


CII 20 N° 14 - 63. APTO 201 TUNJA - BOYACÁ - COLOMBIA.




Leidy Pérez
Contadora Pública



SOLUCIONES CONTABLES.
TELÈFONO: 310 204 8046
E-MAIL: LEIDYPEREZCONTADORA@GMAIL.COM
CII 20 N° 14 - 63. APTO 201 TUNJA - BOYACÁ - COLOMBIA.


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141162421331			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116242133 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 6 0 7 2 4		4		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
SIE WATER SAS							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Boyacá		Tunja		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 80 MZ 10 LT 123 BRR PORTAL DE HUNZAHUA PAR INDUSTRIAL DE COMBITA SEC ULTIMA BODEGA DE LA CALLE							
42. Correo electrónico siewater1@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 2 3 2 3 1 8 7 8 3		3 1 1 2 9 2 7 2 1 9	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 6 6 4		2 0 2 2 0 2 0 1		4 6 6 3		2 0 2 2 0 2 0 1	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
				7 1 1 2 4 2 9 0			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEÑA SALAS WILMAR FERNANDO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141162421331			
				(415)7707212489984(8020) 000014116242133 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 6 0 7 2 4		4		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número		1				1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 2 2 0 1 1 6				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 2 2 0 1 2 8				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 1 9 7 8 6 9				85. Extranjero	
78. Departamento		1 5				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 2 2 0 1 2 8				87. Extranjero privado	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 2 0 4 2 6		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141162421331



(415)7707212489984(8020) 000014116242133 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 0 7 2 4

6. DV

4

12. Dirección seccional


Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 2 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 5 4 0 9 2 1 0 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEÑA	105. Segundo apellido SALAS	106. Primer nombre WILMAR
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 2 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 4 1 8 1 7 0 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BUITRAGO	105. Segundo apellido PUENTES	106. Primer nombre GERMAN
107. Otros nombres DARIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141162421331			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116242133 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 6 0 7 2 4		4		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 9 6 2 5 0 1 4		2 5 6 2 5 3 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	PEREZ		CAMARGO		LEIDY		JOHANA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 2 0 4 2 2							

Certificado Bancario

Viernes, 12 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SIE WATER SAS identificado(a) con NIT 901560724, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	88200001820	2022/02/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.
