

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

Principio de Procedencia	4602.375
--------------------------	----------

Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 12/09/2020

Página: 1 de # 1

UNIDAD EJECUTORA:

Semana No

(cuarenta) 40

Del :

1/11/2020

as

as

10/10/2020

AL:


7/11/2020

Plazo Total	
-------------	--

Tiempo transcurrido desde la iniciaci3n
porcentaje del tiempo transcurrido(%)

Nombre del Supervisor :

MARISOL PUENTES ROMERO

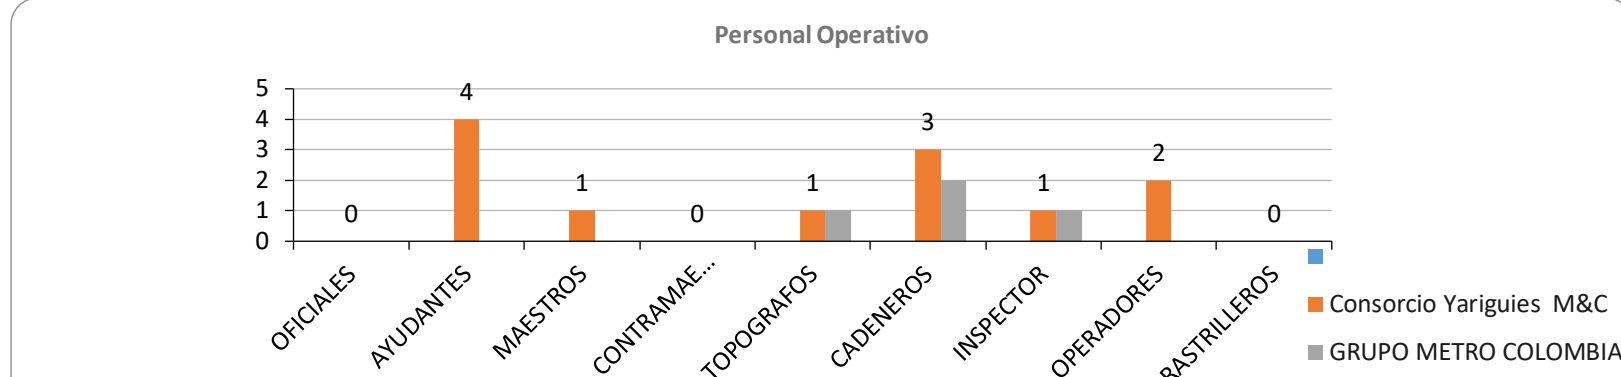

En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
ESTACION	X		NIKON NPL-392 SERIAL #031166
NIVEL DE PRECISION	X		TOPCON AT-N
RETRO DE LLANTAS	X		CATERPILLAR 426 F2
PLANTAS ELECTRICAS	X		HUSQVARNA
MINICARGADOR	X		MINICARGADOR
VIBROCOMPACTADOR GRANULARES	X		CATERPILLAR CBS34D
CAMONETA GUIA	X		JEK 768 FORD RANGE
GUADAÑA	X		HUSQVARNA-MOD 143 R8
CAMONETA INTERVENTORIA	X		MITSUBISHI
VOLQUETA	X		KENWORTH 199F 2015- WFC202
VIBROCOMPACTADOR	X		WACKER
Total Maquinaria	11		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.		Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
1	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 108.648.605,00		Valor Total Contrato Obra	
2	16 de marzo de 2020 al 15 de mayo de 2020	\$ 136.626.500,00		\$ 25.476.606.360,00	
3	16 de mayo de 2020 al 15 de junio de 2020	\$ 4.652.098.110,00		Valor facturado Contrato Obra	
4	16 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020	\$ 10.215.829.704,00		\$ 22.036.012.455,00	
5	16 de julio al 20 de octubre de 2020	\$ 6.922.809.535,00		% Avance facturado Acumulado	
6				86,50%	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Total Acumulado		\$ 22.036.012.455,00			

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total	
1	30 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020	\$ 42.420.574,00	Valor Total Contrato interventoría
2	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 123.471.130,00	\$ 2.549.676.150,00
3	16 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020	\$ 122.730.699,00	Valor facturado Contrato Interventoría
4	16 de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020	\$ 47.408.390,00	\$ 1.815.690.349,00
5	16 de mayo de 2020 al 15 de junio de 2020	\$ 312.299.441,00	% Avance facturado Acumulado
6	16 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020	\$ 646.409.006,00	71,21%
7	16 de julio al 20 de octubre de 2020	\$ 520.951.109,00	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Total Acumulado	\$ 1.815.690.349,00		

	OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		ING. CESAR FERNANDO LOSADA
