

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. ESE 2025000407 DE 2025

**“ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD TASNAQUE DEL CENTRO DE SALUD
SALUDYA ESE YACUANQUER”**

**CONSTRUCTORA DROMOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA**

**MUNICIPIO DE YACUANQUER, NARIÑO
14 DE OCTUBRE - 14 DE NOVIEMBRE DE 2025**

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente informe es dar a conocer el cumplimiento de las funciones como contratista de obra sobre el desarrollo y avance de las actividades correspondientes a la adecuación del Puesto de Salud Tasnaqué del Centro de Salud Saludya ESE Yacuanquer, ejecutadas conforme a lo establecido en los cronogramas, análisis de precios unitarios, planos y presupuestos aprobados para el contrato de obra No. ESE 2025000407 de 2025.

Las actividades se realizaron garantizando la correcta ejecución de cada ítem, con el fin de asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de las normas técnicas de construcción vigentes.

Cabe resaltar que todos los trabajos se ejecutaron en coordinación permanente con la Supervisión de Interventoría y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

En el presente informe se relaciona la ejecución de las actividades desarrolladas desde la firma del acta de inicio hasta el acta de entrega, conforme a lo indicado en la tabla que se presenta a continuación.

Fecha Acta de inicio	14 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo del contrato inicial	2 MESES
Porcentaje de avance:	33.34%

1. Información del contrato

- **CONTRATO No. – FECHA:** ESE 2025000407 DE 2025
- **TIPO DE CONTRATO:** OBRA
- **DEPENDENCIA CONTRATANTE:** CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER.
- **CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA DROMOS SAS.
- **NIT:** 901.475.414-2.
- **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA EN LA ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD TASNAQUE DEL CENTRO DE SALUD SALUDYA ESE YACUANQUER.
- **VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE M/L (\$189.564.559.09) M/L.
- **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE M/L (\$189.564.559.09) M/L.
- **PLAZO O DURACIÓN INICIAL:** DOS (02) MESES
- **FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:** VEINTE (20) DE DICIEMBRE

GARANTÍAS:**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N.º 41-44-101298091**

GARANTÍAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6 POLIZA No. 41-44-101298091				
Amparo	Vigencia	Valor Asegurado	Suma asegurada	Vigencia hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	10% del valor total del contrato	\$18.955.445.04	14/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5% del valor total del contrato	\$9.477.722.52	14/12/2028
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	5 años	10% del valor final de las obras	\$18.955.445.04	Si ampara 5 años

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N.º 41-40-101057683

POLIZA RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6 GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POLIZA No. 41-40-101057683				
Amparo	Suficiencia	Vigencia	VALOR ASEGURADO	Vigencia hasta
RCE CONTRATOS	Doscientos (200) SMMLV	Igual al período de ejecución del Contrato.	\$284.700.000,00	14/04/2026

2. PRESUPUESTO DE OBRA.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES		\$ 4,411,035.71		\$ 4,443,094.714
1.01	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	\$ 1,299,055.94	74.74	\$ 1,299,055.940
1.02	DEMOLICION DE ENCHAPE EXISTENTE	M2	\$ 1,307,945.39	91.53	\$ 1,307,945.394
1.03	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	\$ 1,131,479.20	122.80	\$ 1,131,479.200
1.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	\$ 192,354.00	7.00	\$ 224,413.000
1.05	DESMONTE DE PUERTAS	UND	\$ 159,144.00	8.00	\$ 159,144.000
1.06	DESMONTE DE VENTANA	M2	\$ 321,057.18	18.54	\$ 321,057.180
2	EXCAVACIONES		\$ 1,129,672.71		\$ 957,967.395
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	\$ 1,129,672.71	15.51	\$ 957,967.395
3	MAMPOSTERÍA, ESTUCO Y PINTURA		\$ 9,847,291.39		\$ 7,706,803.868
3.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	\$ 4,796,557.60	0.00	\$ -
3.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	\$ 519,031.80	46.00	\$ 519,031.800
3.03	ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES	M2	\$ 1,494,426.89	167.00	\$ 1,868,033.610
3.04	REPOSICION PINTURA VINILO TIPO 1 DOS MANOS MUROS INTERIORES	M2	\$ 1,483,104.29	167.00	\$ 1,853,880.360
3.05	REPOSICION PINTURA VINILO TIPO 1 DOS MANOS MUROS EXTERIORES	M2	\$ 771,027.70	83.93	\$ 963,842.048
3.06	ESTUCO ACRILICO PARA EXTERIORES	M2	\$ 783,143.12	0.00	\$ -
NP.3.07	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA	M2	\$ -	1.80	\$ 396,000.000
NP.3.08	PAÑETE PARA PISO 1:3	M2	\$ -	61.07	\$ 2,106,016.050
4	PISOS Y CIELO RASO		\$ 19,473,093.27		\$ 30,175,341.750
4.01	GUARDAESCOBA CERÁMICA	ML	\$ 990,751.15	66.80	\$ 990,751.147

4.02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	\$ 5,651,227.92	52.76	\$ 5,488,931.974
4.03	REPOSICIÓN Y SUMINISTRO DE ENCHAPE DE PISO BAÑOS CERAMICO	M2	\$ 723,049.23	8.31	\$ 864,537.997
4.04	REPOSICION ENCHAPE EN CERÁMICA, DE , PAREDES DE BAÑOS	M2	\$ 3,094,737.45	33.83	\$ 3,134,579.882
4.05	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	\$ 5,165,886.78	0.00	\$ -
4.06	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO	M2	\$ 3,847,440.75	111.75	\$ 3,847,440.750
NP.4,07	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA	ML	\$ -	65.70	\$ 7,884,000.000
NP.4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	\$ -	61.27	\$ 7,965,100.000
5	APARATOS SANITARIOS		\$ 2,317,972.50		\$ 2,317,972.500
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	\$ 625,719.00	3.00	\$ 625,719.000
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	\$ 1,326,127.50	3.00	\$ 1,326,127.500
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	\$ 366,126.00	1.00	\$ 366,126.000
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		\$ 2,543,031.20		\$ 5,601,575.200
6.01	REPOSICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L	UND	\$ 501,456.00	0.00	\$ -
6.02	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	\$ 2,041,575.20	1.00	\$ 2,041,575.200
NP.6,03	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA, REGATA, CODOS, NIPLES Y VALVULA	UND	\$ -	17.00	\$ 1,445,000.000
NP.6,04	PUNTO SANITARIO, INCLUYE TUBERIA, REGATA, CODOS Y NIPLES	UND	\$ -	13.00	\$ 1,105,000.000

NP.6,05	REPOSICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L, INCLUYE LOSETA DE APOYO EN CONCRETO	UND	\$ -	1.00	\$ 1,010,000.000
7	CARPINTERÍA		\$ 14,883,706.25		\$ 14,068,567.769
7.01	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	\$ 2,346,832.00	0.00	\$ -
7.02	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	\$ 5,192,097.44	20.80	\$ 6,749,726.672
7.03	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18	UND	\$ 2,007,740.61	11.00	\$ 2,453,905.190
7.04	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	\$ 3,520,743.22	16.90	\$ 3,209,307.465
7.05	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	\$ 1,816,292.98	16.90	\$ 1,655,628.442
8	CUBIERTA		\$ 10,131,048.39		\$ 9,899,975.040
8.01	REPOSICION CUBIERTA TERMOACUSTICA A-360, TRAPESOIDAL	M2	\$ 7,453,195.37	0.00	\$ -
8.02	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	\$ 1,583,654.22	12.00	\$ 1,104,875.040
8.03	BAJANTE CUADRADO PVC 3"	ML	\$ 431,271.68	0.00	\$ -
8.04	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	\$ 662,927.12	0.00	\$ -
NP.8,05	REPOSICION CUBIERTA TERMOACUSTICA, TRAPESOIDAL UPVC	M2	\$ -	74.74	\$ 8,595,100.000
NP.8,06	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES	UND	\$ -	2.00	\$ 200,000.000
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		\$ 3,083,806.00		\$ 9,742,789.000
9.01	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA, BARRAJE DE COBRE Y BREAKERS ENCHUFABLES INCLUYE CABLEADO	UND	\$ 285,270.00	2.00	\$ 285,270.000
9.02	REPOSICION LUMINARIA TIPO BALA LED DE 18W DE INCRUSTAR, INLCUYE MARCO Y CABLE ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG	UND	\$ 1,012,290.00	11.00	\$ 1,113,519.000

9.03	REPOSICION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS	UND	\$ 789,460.00	0.00	\$ -
9.04	REPOSICION SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA, DOBLE MONOFASICO DE MURO 15 AMP, 120 VOLT	UND	\$ 78,946.00	0.00	\$ -
9.05	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA GFCI, doble monofasico, 15 AMP, 120 VOLT.	UND	\$ 917,840.00	0.00	\$ -
NP.9,06	PUNTO ELECTRICO, INCLUYE CABLE, REGATA Y (TOMACORRIENTE O INTERRUPTOR)	UND	\$ -	46.00	\$ 7,360,000.000
NP.9,07	PUNTO DE VOZ Y DATOS, INCLUYE CABLE, REGATA Y PUNTO DE CONEXIÓN	UND	\$ -	6.00	\$ 984,000.000
10	CERRAMIENTO		\$ 77,990,005.80		\$ 60,896,575.997
10.01	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO, (Suministro, extendido, humedecimiento y compactación)	M3	\$ 489,031.87	2.64	\$ 358,623.371
10.02	CIMENTACIÓN TIPO ZAPATAS EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3500 PSI	M3	\$ 2,994,420.93	2.16	\$ 2,199,982.723
10.03	CIMENTACIÓN TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3500 PSI (0,3X0,3)M	M3	\$ 2,392,259.61	1.59	\$ 1,728,951.261
10.04	CIMENTACIÓN TIPO PEDESTAL EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3500 PSI (0,3X0,3)M	M3	\$ 451,245.07	0.30	\$ 330,179.319
10.05	ACERO DE REFUERZO DE RESISTENCIA 420 MPA	KG	\$ 5,202,558.49	442.21	\$ 3,893,224.900
10.06	CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN CON ALTURA DE 2 M, INCLUYE MALLA ESLABONADA, ÁNGULO EXTERNO DE 2 1/2 ", ANGULO INTERNO 1 1/2", TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADA,	M2	\$ 29,236,487.38	66.72	\$ 29,236,487.380

	ANTICORROSIVO Y PINTURA				
10.07	CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN CON ALTURA DE 2 M, INCLUYE MALLA ESLABONADA, ÁNGULO EXTERNO DE 2 1/2 ", ANGULO INTERNO 1 1/2", TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADA, ANTICORROSIVO, PINTURA, ESTRUCTURA Y EPOXICO PARA ANCLAJE A PROFUNDIDADES DE 0,6 METROS	M2	\$ 26,110,214.18	27.23	\$ 12,035,338.763
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO METALICO, INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE (SEGÚN DISEÑO)	UND	\$ 7,770,191.85	1.00	\$ 7,770,191.850
10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO DE ENTRADA PARA ACCESO , INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE (SEGÚN DISEÑO), PINTURA Y ANTICORROSIVO	UND	\$ 3,343,596.43	1.00	\$ 3,343,596.430

3. PROGRAMACIÓN DE PAGOS:

Dentro de las actividades de seguimiento desarrolladas del proyecto, se realizaron los controles necesarios que garanticen el adecuado manejo de los recursos asignados por el municipio para la ejecución de obra, para lo cual los aspectos relevantes de dicho control se evidencian a continuación

3.1 RELACIÓN DE PAGOS

A la fecha se han tramitado los siguientes pagos al contrato de obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$189.564.559.09
VALOR DEL ANTICIPO	\$0
VALOR ACTAS PARCIALES	\$0
VALOR SALDO POR PAGAR	\$189.564.559.09

1. Capítulo 1 – Preliminares

1. PRELIMINARES

1.01. DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)

En este ítem se refiere a la ejecución del desmonte de las cubiertas existentes en asbesto-cemento, realizado de forma manual y controlada por personal capacitado, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se dejó registro en campo del retiro ordenado del material desmontado y su adecuada disposición.



1.02. DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE

En este ítem se refiere a la demolición del enchape existente, actividad ejecutada de forma manual, retirando las piezas sin afectar los elementos aledaños y manteniendo el área de trabajo limpia y ordenada. Los trabajos se realizaron dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y al adecuado manejo de los residuos generados.



1.04. DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

En este ítem se refiere al desmonte de los aparatos sanitarios existentes, actividad ejecutada de manera ordenada, previa suspensión de las fuentes de agua, retirando los elementos sin generar afectaciones a las instalaciones existentes. Los trabajos se realizaron cumpliendo las especificaciones del proyecto y garantizando la limpieza del área intervenida.



1.05. DESMONTE DE PUERTAS

En este ítem se refiere al desmonte de las puertas existentes, actividad ejecutada de manera cuidadosa, retirando hojas, marcos y herrajes sin afectar los muros ni los elementos aledaños. Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones del proyecto, garantizando el manejo adecuado de los elementos desmontados y la limpieza del área intervenida.



3. MAMPOSTERIA, ESTUCO Y PINTURA.

3.02 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

En este ítem se refiere a la ejecución de filos y juntas de dilatación en los pañetes, con el fin de controlar fisuras y garantizar un adecuado comportamiento del acabado. La actividad se realizó conforme a las especificaciones del proyecto, asegurando alineación, continuidad y correcta terminación de las superficies.



3.03 ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES

En este ítem se refiere a la aplicación de estuco plástico en superficies interiores, realizada con el fin de lograr acabados uniformes y lisos, adecuados para la posterior aplicación de pintura. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones del proyecto, garantizando una correcta preparación de las superficies y la calidad del acabado final.



3.04. REPOSICIÓN PINTURA VINILO TIPO 1 DOS MANOS MUROS INTERIORES

En este ítem se refiere a la reposición de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores, aplicada en dos manos, previa preparación y limpieza de las superficies. La actividad se ejecutó garantizando una adecuada cobertura, acabado uniforme y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.



3.05. REPOSICIÓN PINTURA VINILO TIPO 1 DOS MANOS MUROS EXTERIORES

En este ítem se refiere a la reposición de pintura vinilo tipo 1 en muros exteriores, aplicada en dos manos, previa preparación y limpieza de las superficies. La actividad se ejecutó garantizando una cobertura uniforme y adecuada adherencia, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto y asegurando un acabado final de calidad.



NP. 3.07 MUROS SUPERBOARD DOBLE CARA

En este ítem se refiere a la construcción de muros en sistema superboard doble cara, ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando correcta instalación, alineación y fijación de las placas, así como la estabilidad y acabado adecuado del elemento constructivo.



NP. 3.08. PAÑETE PARA PISO 1:3

En este ítem se refiere a la ejecución del pañete para piso en mortero dosificado en proporción 1:3, aplicado de manera uniforme para garantizar nivelación, adecuada adherencia y acabado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.



4. PISOS Y CIELO RASO

NP. 4.07 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA

En este ítem se refiere al suministro e instalación de guardaescoba tipo media caña, colocado de manera continua y alineada en los encuentros entre piso y muro, garantizando una correcta adherencia, acabado uniforme y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.



NP. 4.08. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA

En este ítem se refiere al suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluyendo la estructura de soporte, actividad ejecutada conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando correcta nivelación, fijación y acabado, así como la limpieza del área intervenida.



6. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

NP 6.03. PUNTO HIDRÁULICO 1/2"

En este ítem se refiere a la ejecución del punto hidráulico de 1/2", incluyendo el suministro e instalación de tubería, regata, codos, niples y válvula, conforme a las especificaciones del proyecto. Los trabajos se realizaron garantizando correcta alineación, estanqueidad y adecuado funcionamiento de la instalación.



NP. 6.04. PUNTO SANITARIO

En este ítem se refiere a la ejecución del punto sanitario, incluyendo tubería, regata, codos y niples, actividad realizada conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la correcta instalación, alineación y funcionamiento del sistema sanitario.



8. CUBIERTA


8.02. CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA

En este ítem se refiere al suministro e instalación del caballete para la cubierta termoacústica, garantizando el correcto traslape y sellado entre faldones. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones del proyecto, asegurando estanqueidad, alineación y adecuada fijación.



NP. 8.05 REPOSICIÓN CUBIERTA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL UPVC

En este ítem se refiere a la reposición de la cubierta termoacústica trapezoidal en UPVC, actividad ejecutada conforme a los planos y especificaciones del proyecto, garantizando una correcta instalación, fijación y alineación de las piezas, así como la estanqueidad y el adecuado desempeño térmico y acústico de la cubierta.

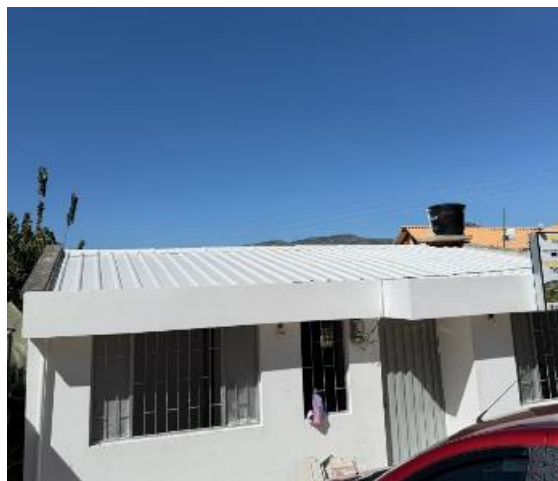

NP. 8.06 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BAJANTES

En este ítem se refiere a la limpieza y mantenimiento de los bajantes existentes, actividad ejecutada mediante el retiro de residuos y material acumulado, garantizando su correcto funcionamiento y evacuación de aguas lluvias. Los trabajos se realizaron cumpliendo las especificaciones del proyecto y dejando el área intervenida en adecuadas condiciones.



9. INSTALACIONES ELECTRICAS

9.02. REPOSICIÓN LUMINARIA TIPO BALA LED DE 18W DE INCRUSTAR

En este ítem se refiere a la reposición de luminarias tipo bala LED de 18W de incrustar, incluyendo marco y cable encauchetado 3x14 AWG, actividad ejecutada conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando su correcta instalación, funcionamiento y acabado.



NP. 9.06 PUNTO ELÉCTRICO (INCLUYE CABLE, REGATA Y TOMACORRIENTE O INTERRUPTOR)

En este ítem se refiere a la ejecución del punto eléctrico, incluyendo el suministro e instalación del cableado, regata y el elemento final correspondiente (tomacorriente o interruptor), realizado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y garantizando el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica.



NP 9.07 PUNTO DE VOS Y DATOS INCLUYE CABLE, REGATA Y PUNTO DE CONEXION

En este ítem se refiere a la ejecución del punto de voz y datos, incluyendo el suministro e instalación del cableado, la regata y el punto de conexión correspondiente, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando una correcta disposición, funcionamiento y terminación del sistema.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is written in a cursive style and appears to read "Adriana Araujo".

ADRIANA MILENA ARAUJO BENAVIDES

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA DE OBRA
