

 República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL N.º 002

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7912853 30 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO EMR-APP BELLEZA R/L WILMER ANDRÉS GARCIA RUIZ
Nit o C.C. No.	901.949.762-6 / 1.114.119.732 de Bolívar, Valle del Cauca
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$3.945.863.857
VALOR ADICIONAL:	\$0,00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	\$0,00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	\$0,00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	\$0,00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	\$0,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	64.31%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	UNION TEMPORAL SOLASEC R/L CARLOS ALBERTO GALVIS RUEDA CO1.PCCNTR.7924460 DEL 13 DE JUNIO DE 2025
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	901.953.373 / 1.095.809.243 DE FLORIDABLANCA
SUPERVISOR:	Ing. MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA Acto administrativo 18 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIACION:	25 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 01	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	29 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	24 DE MAYO DEL 2026
MUNICIPIO:	SUCRE - SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, a los **28 ABR 2025**, se reunieron, MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA, en calidad de Supervisor del Departamento y WILMER ANDRÉS GARCIA RUIZ quien comparece en calidad de Representante legal del CONSORCIO EMR-APP BELLEZA, como Contratista, CARLOS ALBERTO GALVIS RUEDA, quien comparece en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL SOLASEC, como Interventor, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (del 15/12/2025 al día 30/12/2025 y del 29/01/2026 al 28/02/2026) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002	\$ 910.539.243,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	\$ 0,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	\$ 0,00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 910.539.243,00

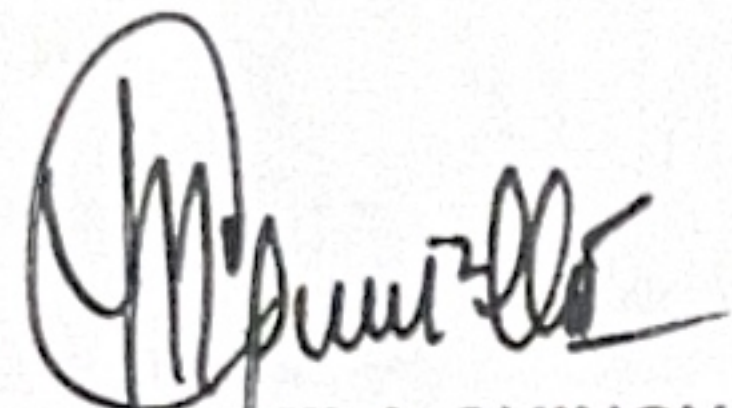
SON: NOVECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE: (\$910.539.243,00).

 República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **28 ABR 2026** :


WILMER ANDRES GARCIA RUIZ
CONSORCIO EMR-APP BELLEZA
CONTRATISTA


CARLOS ALBERTO RUEDA GALVIS
UNION TEMPORAL SOLASEC
INTERVENTOR



MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA
SUPERVISOR


Proyecto: Ing María Camila Chinchilla Urrea

		ANEXO AL ACTA N° 02 DEL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7912853										CODIGO	AP-CCP-RG-45		
												VERSION	0		
												FECHA DE APROBACION	22/03/2023		
												PAGINA	1 DE 1		
												CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.7912853 DE 30 DE MAYO 2025			
												GOBERNACION DE SANTANDER			
												SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
												OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA – SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
												VALOR: \$3.945.863.857			
												PORCENTAJE DE EJECUCION: 64,31%			
ITEM	NORMA ESPECIFICA ACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS, N° 01)				CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		PRELIMINARES DE OBRA													
1.01	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	HA	0,26	\$ 6.099.800,00	\$ 1.585.948,00		0,24	\$ 6.099.800,00	\$ 1.463.952,00	✓	0,02	\$ 121.996,00	0,24	\$ 1.463.952,00
1.02	210.2.1	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	297,58	\$ 184.057,00	\$ 54.771.682,00		393,65	\$ 184.057,00	\$ 72.454.038,00	✓	44,98	\$ 8.278.884,00	367,54	\$ 67.648.310,00
1.03	210.1.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	2678,18	\$ 41.834,00	\$ 112.038.982,00		4163,14	\$ 41.834,00	\$ 174.160.799,00	✓	404,82	\$ 16.935.240,00	3928,07	\$ 164.326.881,00
1.04	310.1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	4992,00	\$ 3.165,00	\$ 15.799.680,00		5101,72	\$ 3.165,00	\$ 16.146.944,00	✓	351,58	\$ 1.112.751,00	4751,56	\$ 15.038.688,00
1.05	201.16	REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE	M	1110,00	\$ 3.981,00	\$ 4.418.910,00		932,00	\$ 3.981,00	\$ 3.710.292,00	✓	142,00	\$ 565.302,00	932,00	\$ 3.710.292,00
1.06	220.1	TERRAPLENES	M3	305,53	\$ 49.167,00	\$ 15.021.994,00		37,71	\$ 49.167,00	\$ 1.854.088,00	✓	0,11	\$ 5.408,00	37,05	\$ 1.821.637,00
1.07	201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	35,60	\$ 229.192,00	\$ 8.159.235,00		0,00	\$ 229.192,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
		SUBTOTAL PRELIMINARES DE OBRA				\$ 211.796.431,00				\$ 269.790.113,00			\$ 27.019.581,00		\$ 254.009.760,00
2		FILTROS													
2.01	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	40,80	\$ 211.065,00	\$ 8.611.452,00		45,71	\$ 211.065,00	\$ 9.647.781,00	✓	5,68	\$ 1.198.849,00	42,57	\$ 8.985.037,00
2.02	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA FILTRO	M3	367,20	\$ 78.908,00	\$ 28.975.018,00		411,31	\$ 78.908,00	\$ 32.455.649,00	✓	51,10	\$ 4.032.199,00	383,04	\$ 30.224.921,00
2.03	231.1.2	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	2475,44	\$ 13.479,00	\$ 33.366.456,00		7352,61	\$ 13.479,00	\$ 99.105.830,00	✓	628,58	\$ 8.472.630,00	8866,93	\$ 92.559.350,00
2.04	610.8	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	306,00	\$ 318.673,00	\$ 97.513.938,00		244,83	\$ 318.673,00	\$ 78.020.711,00	✓	30,42	\$ 9.694.033,00	228,01	\$ 72.660.631,00
2.05	1P	DREN EN TUBERIA PERFORADA 4"	ML	850,00	\$ 51.068,00	\$ 43.407.800,00		680,08	\$ 51.068,00	\$ 34.730.325,00	✓	84,50	\$ 4.315.246,00	633,35	\$ 32.343.918,00
2.06	610.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	119,00	\$ 322.614,00	\$ 38.391.066,00		81,61	\$ 322.614,00	\$ 26.328.529,00	✓	10,14	\$ 3.271.306,00	76,00	\$ 24.518.664,00
		SUBTOTAL FILTROS				\$ 250.265.730,00				\$ 280.288.825,00			\$ 30.984.263,00		\$ 261.292.521,00
3		ALCANTARILLAS													
3.01	201.15	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	7,58	\$ 174.785,00	\$ 1.324.870,00		0,00	\$ 174.785,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.02	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	21,00	\$ 211.065,00	\$ 4.432.365,00		31,05	\$ 211.065,00	\$ 6.553.568,00		0,00	\$ 0,00	31,05	\$ 6.553.568,00
3.03	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	189,00	\$ 78.908,00	\$ 14.913.612,00		279,48	\$ 78.908,00	\$ 22.053.208,00		0,00	\$ 0,00	279,48	\$ 22.053.208,00
3.04	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1736,78	\$ 11.838,00	\$ 20.560.002,00		1586,03	\$ 11.838,00	\$ 18.775.423,00		0,00	\$ 0,00	1586,03	\$ 18.775.423,00
3.05	661.1.2	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 (MM) DE DIAMETRO INTERIOR	ML	21,00	\$ 790.052,00	\$ 16.591.092,00		28,00	\$ 790.052,00	\$ 22.121.456,00		0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 22.121.456,00
3.06	630.1.6	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION.	M3	2,40	\$ 1.209.807,00	\$ 2.903.537,00		3,87	\$ 1.209.807,00	\$ 4.681.953,00		0,00	\$ 0,00	3,87	\$ 4.681.953,00
3.07	630.1.4.1	SUMINISTRO CONCRETO CLASE D, PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION.	M3	28,08	\$ 1.754.521,00	\$ 49.266.950,00		22,49	\$ 1.754.521,00	\$ 39.459.177,00		0,00	\$ 0,00	22,49	\$ 39.459.177,00
3.08	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	7,56	\$ 60.625,00	\$ 458.325,00		24,48	\$ 60.625,00	\$ 1.484.100,00		0,00	\$ 0,00	24,48	\$ 1.484.100,00

3.09	630.1.7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) (CICLOPEO)	M3	11.70	\$ 1.028.343,00	\$ 12.031.613,00	12,00	\$ 1.028.343,00	\$ 12.340.116,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 12.340.116,00
3.10	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	68.04	\$ 272.778,00	\$ 18.559.815,00	63,54	\$ 272.778,00	\$ 17.332.314,00	0,00	\$ 0,00	63,54	\$ 17.332.314,00
		SUBTOTAL ALCANTARILLAS				\$ 141.042.181,00			\$ 144.801.315,00		\$ 0,00		\$ 144.801.315,00
4		TRATAMIENTO DE TALUDES											
4.01	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	M2	83.85	\$ 10.765,00	\$ 902.645,00	300,00	\$ 10.765,00	\$ 3.229.500,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS											
4.02	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	75.47	\$ 78.908,00	\$ 5.955.187,00	138,35	\$ 78.908,00	\$ 10.916.922,00	24,95	\$ 1.968.755,00	24,95	\$ 1.968.755,00
4.03	600.2.1	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F. PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.	M3	8.39	\$ 211.065,00	\$ 1.770.835,00	15,37	\$ 211.065,00	\$ 3.244.069,00	2,77	\$ 584.650,00	2,77	\$ 584.650,00
4.04	630.1.6	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M3	2,00	\$ 1.209.807,00	\$ 2.419.614,00	0,00	\$ 1.209.807,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.05	231.1.2	GAVIÓN EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 RECUBRIMIENTO	M2	40,00	\$ 13.479,00	\$ 539.160,00	0,00	\$ 13.479,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.06	681.1	DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	60,00	\$ 644.305,00	\$ 38.658.300,00	0,00	\$ 644.305,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.07	610.8	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	30.40	\$ 318.673,00	\$ 9.687.659,00	0,00	\$ 318.673,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.08	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	20,00	\$ 272.778,00	\$ 5.455.560,00	0,00	\$ 272.778,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.09	2P	DREN EN TUBERÍA PVC 3"	ML	20,00	\$ 41.131,00	\$ 822.620,00	0,00	\$ 41.131,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10	810.1	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	83.85	\$ 65.348,00	\$ 5.479.430,00	300,00	\$ 65.348,00	\$ 19.604.400,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.11	3P	CANALETAS EN SUELO CEMENTO SECCIÓN TRAPEZOIDAL (1X0.4X0.4) m	ML	26,00	\$ 214.924,00	\$ 5.588.024,00	44,00	\$ 214.924,00	\$ 9.456.656,00	44,00	\$ 9.456.656,00	44,00	\$ 9.456.656,00
4.12	674.1	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A VEINTE METROS (20 m)	ML	135,00	\$ 501.270,00	\$ 67.671.450,00	0,00	\$ 501.270,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
		SUBTOTAL TRATAMIENTO DE TALUDES				\$ 144.950.484,00			\$ 46.451.647,00		\$ 12.010.061,00		\$ 12.010.061,00
5		ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO											
5.01	320.3.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-38	M3	1814,48	\$ 322.614,00	\$ 585.376.651,00	1530,52	\$ 322.614,00	\$ 493.767.179,00	105,47	\$ 34.026.099,00	1425,46	\$ 459.873.353,00
5.02	230.1	10%	M3	708.64	\$ 237.927,00	\$ 168.604.589,00	0,00	\$ 237.927,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.03	221.1	PEDRAPLEN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO	M3	1020,38	\$ 214.865,00	\$ 219.243.949,00	1801,07	\$ 214.865,00	\$ 386.986.906,00	74,96	\$ 16.106.280,00	1715,63	\$ 368.628.195,00
5.04	4P	CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO (Incluye fracturamiento de rocas a tamaño según especificación No incluye la piedra relén)	M3	356,38	\$ 49.561,00	\$ 17.662.549,00	137,84	\$ 49.561,00	\$ 6.831.488,00	15,30	\$ 758.283,00	126,63	\$ 6.275.909,00
5.05	500.1.2	PAVIMENTO HIDRÁULICO (CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR40 (kg/cm2))	M3	729,60	\$ 1.353.734,00	\$ 987.684.326,00	793,58	\$ 1.353.734,00	\$ 1.074.296.228,00	379,62	\$ 513.904.501,00	379,62	\$ 513.904.501,00
5.06	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	7373,88	\$ 11.838,00	\$ 87.291.991,00	9780,17	\$ 11.838,00	\$ 115.777.652,00	4662,75	\$ 55.197.635,00	4662,75	\$ 55.197.635,00
5.07	6P	SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	1756,00	\$ 46.061,00	\$ 80.883.116,00	2390,03	\$ 46.061,00	\$ 110.087.172,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
		SUBTOTAL ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO				\$ 2.146.747.171,00			\$ 2.187.746.625,00		\$ 619.992.798,00		\$ 1.403.879.593,00
6		CUNETAS											
6.01	671.1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	170,23	\$ 1.614.091,00	\$ 274.766.711,00	172,51	\$ 1.614.091,00	\$ 278.446.838,00	70,00	\$ 112.986.370,00	70,00	\$ 112.986.370,00
6.02	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	8135,94	\$ 11.838,00	\$ 108.151.258,00	9362,03	\$ 11.838,00	\$ 110.827.711,00	3822,17	\$ 45.246.848,00	3822,17	\$ 45.246.848,00
6.03	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	287,31	\$ 60.625,00	\$ 17.418.169,00	119,20	\$ 60.625,00	\$ 7.226.500,00	50,00	\$ 3.031.250,00	50,00	\$ 3.031.250,00
		SUBTOTAL CUNETAS				\$ 400.336.138,00			\$ 396.501.049,00		\$ 161.264.468,00		\$ 161.264.468,00
7		OBRAS HIDRÁULICAS (DESCOLES, DISIPADORES DE ENERGÍA, ZANJAS DE CORONACION)											
7.01	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	28,21	\$ 211.065,00	\$ 5.954.144,00	2,76	\$ 211.065,00	\$ 582.539,00	2,72	\$ 574.097,00	2,72	\$ 574.097,00
7.02	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO PARA ESTRUCTURAS	M3	253,89	\$ 78.908,00	\$ 20.033.952,00	24,89	\$ 78.908,00	\$ 1.964.020,00	24,47	\$ 1.930.879,00	24,47	\$ 1.930.879,00
7.03	630.1.6	SUMINISTRO CONCRETO CLASE F. PARA ESTRUCTURAS. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN.	M3	11,38	\$ 1.209.807,00	\$ 13.767.604,00	2,55	\$ 1.209.807,00	\$ 3.085.008,00	2,55	\$ 3.085.008,00	2,55	\$ 3.085.008,00
7.04	630.1.4.1	SUMINISTRO CONCRETO CLASE D. INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN	M3	29,40	\$ 1.682.317,00	\$ 49.460.120,00	6,22	\$ 1.682.317,00	\$ 10.464.012,00	6,22	\$ 10.464.012,00	6,22	\$ 10.464.012,00
7.05	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2817,92	\$ 11.838,00	\$ 33.356.537,00	624,61	\$ 11.838,00	\$ 7.394.133,00	624,61	\$ 7.394.133,00	624,61	\$ 7.394.133,00
7.06	3P	CANALETAS EN SUELO CEMENTO SECCIÓN TRAPEZOIDAL (1X0.4X0.4) m	ML	70,00	\$ 214.924,00	\$ 15.044.680,00	0,00	\$ 214.924,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
		SUBTOTAL OBRAS HIDRÁULICAS (DESCOLES, DISIPADORES DE ENERGÍA, ZANJAS DE CORONACION)				\$ 137.619.037,00			\$ 23.489.712,00		\$ 23.448.129,00		\$ 23.448.129,00

8		SEÑALIZACIÓN											
8.01	6P	PINTURA IMPRIMANTE BASE PARA DEMARCACIÓN											
8.02	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	1280.00	\$ 3,841.00	\$ 4,660,480.00	1788.00	\$ 3,641.00	\$ 6,610,108.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
		SEÑAL SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA DE 75X75 CM.	ML	1280.00	\$ 4,139.00	\$ 5,297,920.00	1788.00	\$ 4,139.00	\$ 7,400,632.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.03	710.1.1	CALIBRE 16, RETORREFLECTIVA TIPO IV.	UND	27.00	\$ 1,084,687.00	\$ 29,284,119.00	39.00	\$ 1,084,597.00	\$ 35,781,701.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.04	710.1.5	SEÑAL VERTICAL TIPO IV (DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL)	UND	22.00	\$ 1,157,122.00	\$ 25,456,684.00	24.00	\$ 1,157,122.00	\$ 27,770,928.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.05	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	280.00	\$ 555,562.00	\$ 155,557,360.00	185.00	\$ 555,562.00	\$ 102,778,970.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.06	730.1	TERMINAL DE ABATIMIENTO	UND	12.00	\$ 3,412,742.00	\$ 40,952,904.00	14.00	\$ 3,412,742.00	\$ 47,778,388.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.07	740.1	INSTALACIÓN DE CATAPAFAROS PARA BARRERAS	UND	89.00	\$ 22,084.00	\$ 1,966,386.00	64.00	\$ 22,084.00	\$ 1,193,076.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.08	701.1.1	TACHA REFLECTIVAS PARA DEMARCACIÓN	UND	240.00	\$ 17,717.00	\$ 4,262,080.00	225.00	\$ 17,717.00	\$ 3,986,325.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
8.09	710.1.3	POSTES DE REFERENCIA	UND	2.00	\$ 793,039.00	\$ 1,586,078.00	2.00	\$ 793,039.00	\$ 1,586,078.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
		SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN				\$ 269,013,991.00			\$ 234,786,106.00		\$ 0.00		\$ 0.00
9		VARIOS											
		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, ALCANTARILLAS, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIA											
9.01	900.2.1	MAYORES A 1000 METROS.	M3/KM	24933.36	\$ 2,781.00	\$ 69,339,674.00	74377.44	\$ 2,781.00	\$ 206,843,661.00	68648.28	\$ 190,910,866.00		\$ 190,910,866.00
9.02	800.2	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO (CUATRO FILAS)	ML	1280.00	\$ 52,324.00	\$ 66,974,720.00	932.00	\$ 52,324.00	\$ 48,765,988.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
9.03	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBRES	M3	24.00	\$ 24,553.00	\$ 589,272.00	0.00	\$ 24,553.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
9.04	900.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100m)	M3/KM	288.00	\$ 2,781.00	\$ 800,928.00	0.00	\$ 2,781.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
		SUBTOTAL VARIOS				\$ 137,704,694.00			\$ 255,609,629.00		\$ 0.00		\$ 190,910,866.00
TOTAL COSTO DIRECTO + AUI						\$ 3,839,474,921.00			\$ 895,220,053.00		\$ 0.00		\$ 2,451,816,713.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT						\$ 56,191,700.00			\$ 56,191,700.00		\$ 0.00		\$ 45,895,720.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA						\$ 50,196,400.00			\$ 50,196,400.00		\$ 0.00		\$ 40,080,000.00
COSTO TOTAL						\$ 3,945,863,857.00			\$ 3,945,863,857.00		\$ 0.00		\$ 2,537,572,433.00
AJUSTE PRESUPUESTO						\$ 0.00			\$ 836.00		\$ 0.00		\$ 0.00
VALOR TOTAL OBRA						\$ 3,945,863,857.00			\$ 3,945,863,857.00		\$ 0.00		\$ 2,537,572,433.00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (0.0%)						\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR						\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 2,537,572,433.00


REPRESENTANTE
CARLOS ALBERTO GALVIS RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SOLASEC


SUPERVISOR
ING. MARIA CAMILA CHINCHILLA URREA
