

- INFORME DE SUPERVISION



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO	No. 110.2010.378.2025	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2025	FECHA DE SEGUIMIENTO	DE 07 DE MAYO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
No CONTRATO / CONVENIO	No. 110.2010.378.2025
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S
NIT / CC	900.557.241-4
REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	74.810.428 de Sabanalarga
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	DOCIENTOS TRECE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$213.254.375.00)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: A) actas parciales: hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato mediante actas parciales, de acuerdo con el avance de obra, previa suscripción del acta de recibo parcial. B) acta final: un pago final correspondiente al saldo restante del valor facturado, que no puede ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato previa suscripción del acta de recibo y liquidación final para efectos de cada pago. Las actas deberán ser suscritas por el interventor y/o supervisor del contrato, el contratista deberá adjuntar con los informes, las



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

	constancias del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, para el pago final además de la documentación referida anteriormente el contratista deberá presentar paz y salvos de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, Icbf y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2025

2. GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	MODIFICACIÓN- ACTA DE RECIBO	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	625 47 994000004320	25-11-2025 / 06-05-2026	ANEXO 4 Y 5	25-11-2025 / 06-05-2026	\$ 21.325.437,50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625 47 994000004320	25-11-2025 / 06-01-2029	ANEXO 4 Y 5	25-11-2025 / 06-01-2029	\$ 21.325.437,50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	625 47 994000004320	el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de	ANEXO 4 Y 5	el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir	\$ 21.325.437.50



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

			suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,		de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante,	
ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIA DE	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	625 47 994000004320	25-11-2025 / 06-05-2026	ANEXO 4 Y 5	25-11-2025 / 06-05-2026	\$ 106.627.187,50
ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIA DE	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	625 47 994000001607	20-11-2025/31-12-2025	ANEXO 2	31-12-2025 / 06-01-2026	\$ 284.700.000,00



**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

PLACAS HUELLAS VEREDA CAÑO BLANCO				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% EJECUTADO
1	OBRAS PRELIMINARES			
1,1	Replanteo y localización para vías	M2	525,00	100%
1,2	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	78,75	100%
1,3	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	M2	525,00	100%
1,4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	M3	262,50	100%
1,5	Excavación manual en conglomerado	M3	27,00	100%
1,6	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	35,80	100%
2	PLACA HUELLAS			
2,1	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm2 - 3000 PSI e=0,15 m	M3	26,55	100%
2,2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 PSI	M3	0,90	100%
2,3	Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	5,40	100%
2,4	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm²	M3	10,89	100%
2,5	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	1552.75	100%
2,6	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	M2	88.02	100%
PRESUPUESTO P.A.G.A				100%
PRESUPUESTO P.M.T				100%

4. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR		
					TOTAL	ANTICIPO/PARCIAL 1	ACTA PARCIAL
1434	20/11/2025	2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.02	realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de las vías del municipio de sabanalarga (construcción de placas huellas)	TCRU	\$ 69.879.702,00	\$ 54.404.656,08	\$ 15.492.552,20
1435	20/11/2025	2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.11	Realizar el mantenimiento, rehabilitación y/o mejoramiento de las vías del Municipio de Sabanalarga (Construcción de Placas huellas) Convenio TGI N.551007543.	OATN	\$ 111.451.647,00	\$ 63.371.087,20	\$ 48.080.559,80
1533	11/12/2025	2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.01	realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de las vías del municipio de sabanalarga (construcción de placas huellas)	TCRU	\$ 6.228.853,00		\$ 6.228.853,00
1535	11/12/2025	2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.02	realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de las vías del municipio de sabanalarga (construcción de placas huellas)	TCRU	\$ 25.676.666,00		\$ 25.676.666,00



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	SATISFACT ORIO	SOBRE SA- LIENTE	POR MEJO RAR
1	OBRAS PRELIMINARES	X		
1, 1	Replanteo y localización para vías	X		
1, 2	Excavación mecánica con retiro y disposición final	X		
1, 3	Conformación de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	X		
1, 4	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	X		
1, 5	Excavación manual en conglomerado	X		
1, 6	Movilización y desmovilización de equipo pesado	X		
2	PLACA HUELLA	X		
2, 1	Losa de pavimento en concreto resistencia 210 kg/cm ² - 3000 PSI e=0,15 m	X		
2, 2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm ² - 2000 PSI	X		
2, 3	Riostras o diafragmas concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm ²	X		
2, 4	Berma-cuneta y bordillo concreto 3000 PSI, resistencia 210 Kg/cm ²	X		
2, 5	Acero de Refuerzo Grado 60			
2, 6	Piedra pegada concreto de 2500 PSI, e=0.15 m	X		

Observaciones: Se realiza validación por sistema del pago de seguridad social, de los periodos correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, se anexa soporte.



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

6. REGISTRO FOTOGRAFICO








**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

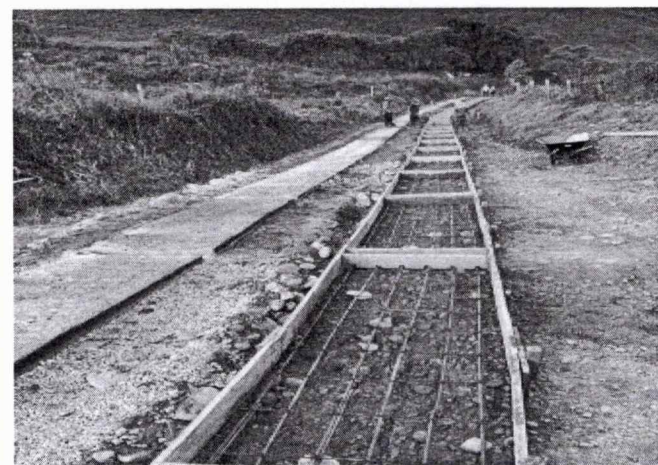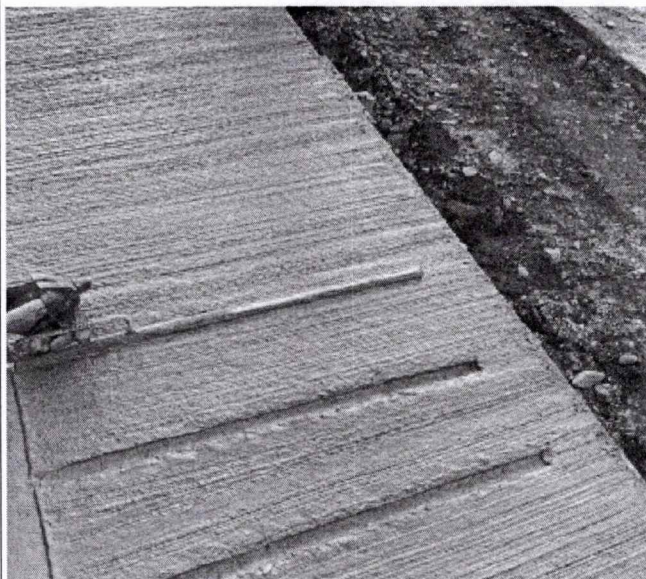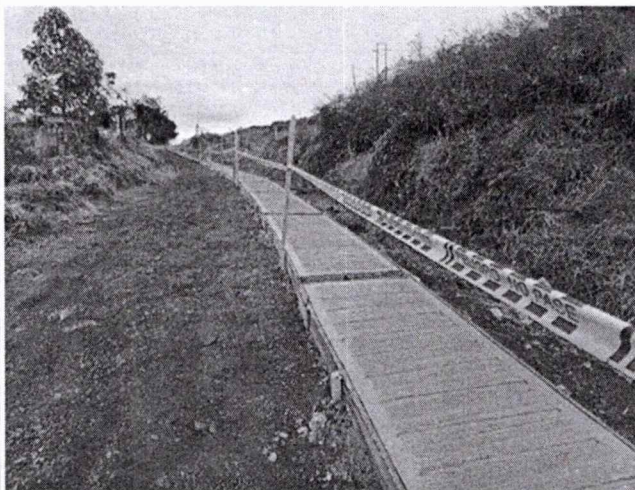






**ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: F-CT-010

VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias

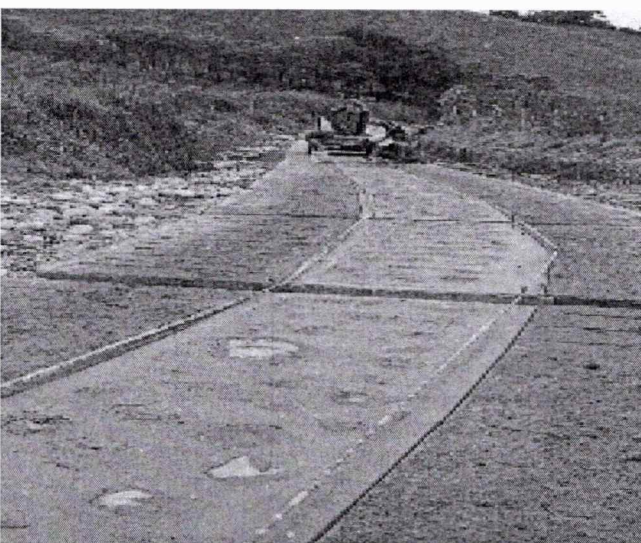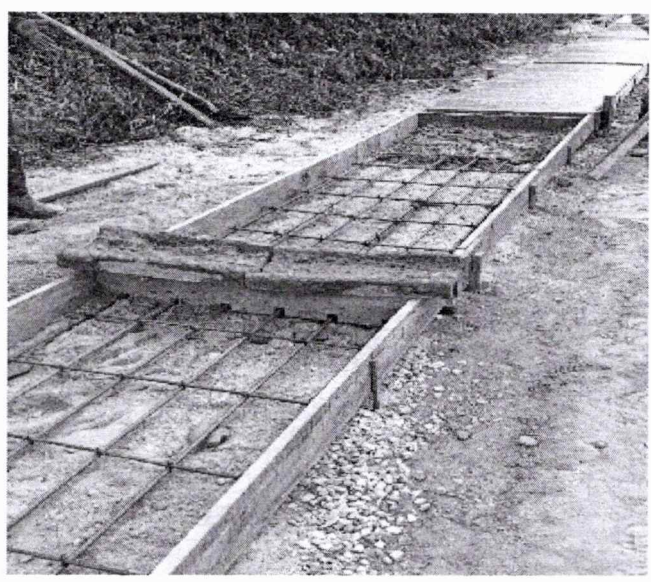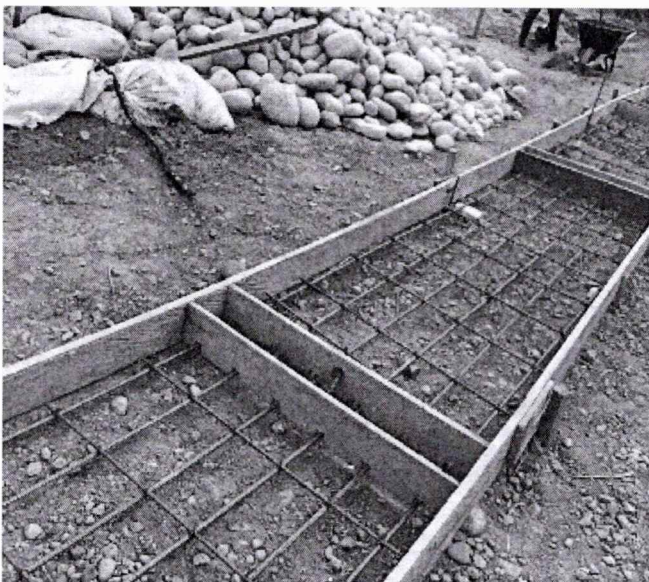



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-CT-010


VERSIÓN: 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016

RESPONSABLES: Todos las dependencias



7. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor	Mónica Yulieth Rodríguez Torres
Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Firma	
Nombre de quien elaboró el informe	Yimer Fernando Caro Gaitan
Cargo	Profesional de Apoyo S.P.O.P
Firma	
