



CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4
CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA
MEDELLÍN
TEL- 4440568
FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE4

Documento Ref.:

Código CIIU / Actividad Económica: 4210

Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	Fecha Documento :	8 - May - 2026
NIT:	901387801-2	Hora Documento:	17:04:22-05:00
Dirección:	CL 35 SUR 40 35 - Envigado - Antioquia	Fecha Vencimiento:	7 - Jun - 2026
Teléfono:	6044801300	Condición Pago:	Crédito
		Lugar de Pago:	MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANO GRAVADA	ACTA DE OBRA NO GRAVADA	1	175,370,247.00	175,370,247.00	




Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-011270-R Id: 108411
Fecha: 2026-05-13 11:33
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipología Documental: COMUNICACIÓN RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0



CONTIENE ANEXOS

ACTA NCONTRATO DESur-IA-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN NDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24"	Sub Total:	175,370,247.00
ifs17	Amortización IVA:	53,721,180.00
	Retención:	0.00
	Retención AMB:	0.00
	Retención ICA:	0.00
	Valor Total:	121,649,067.00



Firma Digital : 18e0f1c1987d7e2e3d97776de08d7d6a1fdab0041b96223d86cf76149031d8ccb5f6b9628140ce91bcd8a2f25cb8ffe4
CuFe : 0f9105d2033fd9921848f480fdf016292b155694598ef1fd815c7e775e0fb63ea18501c7f54730afe411a610164552e1

SON : CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS Y CERO CENTAVO MIL

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 041 de Enero 30 de 2014

Documento Ref.: -
Esta Factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio
Resolución No. 18764100452377 Fecha:22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000

ELABORADO POR	APROBADO	FECHA RECIBIDO:
---------------	----------	-----------------

Envigado, 8 de Mayo de 2026

CMC- 2026



Señores
DESUR
Atn. Laura Quintero Gaviria
Antioquia



Al Contestado: Radicado: 2026-1300-011228-R Id: 108085
Fecha: 2026-05-11 08:27
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESUR-IA-168-2025

REF. CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24".

ASUNTO: Entrega Acta de obra No 2

Cordial saludo


Por medio del presente realizamos entrega de 2 copias de los documentos que se relacionan a continuación:

- Acta de pago N°2 con sus respectivas memorias
- Formato de cambio de obra
- Formato de aprobación de APU de obras extras
- Factura FE 4 por valor de \$175.370.247
- Factura FE 5 por valor de \$5.286.217
- Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Planilla de pago de la seguridad social

Quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,


JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ
Director de Obra
Consorcio Mayorca Conecta



Archivo.

Anexo: lo enunciado

[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. 001-2024				DESA-24-15-03/24				OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VAL AGRÍCOLA EN LA ALDEA LAS VEGAS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE GUAYAS, CON UN PRESUPUESTO ESTIMADO EN \$ 1.006.363,614.			
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2			
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor (\$)
3.4	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 12,55 m.	m3	150	\$ 447.704	\$ 67.155.600	150,00	\$ 67.155.600,0	16,72	\$ 7.485.611,00	13,28	\$ 59.550.989
3.5	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 15,75 m.	m3	150	\$ 495.376	\$ 72.006.400	150,00	\$ 72.006.400,0	13,28	\$ 6.431.232,00	136,75	\$ 66.375.168
3.6	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 10,125 m.	m3	150	\$ 570.608	\$ 85.595.400	150,00	\$ 85.595.400,0	4,42	\$ 2.522.211,00	145,58	\$ 83.073.189
3.7	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 10,125 m.	m3	120	\$ 643.998	\$ 77.279.760	120,00	\$ 77.279.760,0	0,00	\$ -	120,00	\$ 77.279.760
3.8	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 12,55 m.	m3	79	\$ 723.266	\$ 57.611.224	79,00	\$ 57.611.224,0	0,00	\$ -	79,00	\$ 57.611.224
3.9	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 15,75 m.	m3	61	\$ 814.516	\$ 49.685.416	61,00	\$ 49.685.416,0	0,00	\$ -	61,00	\$ 49.685.416
3.10	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 15,75 m.	m3	20	\$ 899.774	\$ 17.995.480	20,00	\$ 17.995.480,0	0,00	\$ -	20,00	\$ 17.995.480
3.11	EXCAVACIÓN DE ROCA EN PILAS con CEMENTO. Ejecución de pilas tipo CIPAL o equivalente con diámetro de 80 cm, altura de 4 m, con 10% de cemento, 90% de grava, deflacion de 8 kg por metro cúbico, desambombas, extracción del material de la pila y acarreo interno y acople donde lo indique la interventoría. Se pagará como ítem completo. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con la cantidad autorizada. SU MEDIDA SERÁ EN SITIO. NO INCLUYE análisis de reestudio. Profundidad de 17,5-20 m.	m3	150	\$ 464.480	\$ 69.672.000	150,00	\$ 69.672.000,0	0,00	\$ -	150,00	\$ 69.672.000
3.12	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca desmenuzada, bolas de roca de diámetro inferior a 0,3m, molienda, molibombas, extracción del material, acarreo interno de materiales, carga, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye análisis de reestudio. Profundidad de 12,55 m.	m3	10878	\$ 78.935	\$ 858.654.930	10.878,00	\$ 858.654.930,0	198,03	\$ 15.394.693,00	10582,97	\$ 843.250.237
3.13	CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el equipo con máquina, repase, transporte interno y externo y botada de material tipo escombros en botaderos donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	500	\$ 45.865	\$ 22.932.500	500,00	\$ 22.932.500,0	0,00	\$ -	500,00	\$ 22.932.500
4	VERIFICACIÓN DE MUESTRAS DE APROXIMACIÓN COMPACTADAS EN MATERIAL seleccionado. Incluye suministro, transporte interno y compactación.	m3	7382	\$ 144.847	\$ 1.066.363.614	7.382,00	\$ 1.066.363.614,0	0,00	\$ -	7382,00	\$ 1.066.363.614
4.2	Uso de apoyos completos mecánicamente en almirado, según norma INACAP, Art. 311, CIRC-350, incluye suministro, transporte, instalación y mantenimiento de los apoyos, con un costo máximo de \$ 43.191.540,00, mayor al 5% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.	m3	252	\$ 171.385	\$ 43.191.540	252,00	\$ 43.191.540,0	0,00	\$ -	252,00	\$ 43.191.540

ACTA DECEVA

[illegible]

CONTRATO DE OBRA No. 001-2015-03-03-00									
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VAL ADESIÓN EN LA AVENIDA LAS VEGAS CONTIGUA AL BARRIO DEL AMBROSIO DE BARRIO EN LA COMUNA DE SAN CARLOS, INTERCOMUNICACIÓN EN 0,20 X 0,15 M.									
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)	Valor Total (\$)	Valor Total (\$)
0.1	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m	2140	\$ 120,202	\$ 257,232,280	2140,00	\$	\$ 257,232,280	\$ 257,232,280
0.2	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m	1110	\$ 81,632	\$ 90,611,520	1110,00	\$	\$ 90,611,520	\$ 90,611,520
0.3	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	1467	\$ 160,033	\$ 234,768,411	1467,00	\$	\$ 234,768,411	\$ 234,768,411
0.4	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	255	\$ 177,231	\$ 45,193,905	255,00	\$	\$ 45,193,905	\$ 45,193,905
0.5	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	87	\$ 96,634	\$ 8,407,158	87,00	\$	\$ 8,407,158	\$ 8,407,158
0.6	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	130	\$ 78,102	\$ 9,492,240	130,00	\$	\$ 9,492,240	\$ 9,492,240
0.7	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	250	\$ 131,107	\$ 32,776,750	250,00	\$	\$ 32,776,750	\$ 32,776,750
0.8	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	972	\$ 174,912	\$ 170,014,464	972,00	\$	\$ 170,014,464	\$ 170,014,464
0.9	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	193	\$ 142,547	\$ 27,511,571	193,00	\$	\$ 27,511,571	\$ 27,511,571
0.10	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	111	\$ 888,452	\$ 98,618,172	111,00	\$	\$ 98,618,172	\$ 98,618,172
0.11	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m	207	\$ 1,255,700	\$ 253,719,900	207,00	\$	\$ 253,719,900	\$ 253,719,900
0.12	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m	85	\$ 100,846	\$ 8,571,910	85,00	\$	\$ 8,571,910	\$ 8,571,910
0.13	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	5	\$ 3,919,615	\$ 19,598,075	5,00	\$	\$ 19,598,075	\$ 19,598,075
0.14	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	1250	\$ 64,529	\$ 80,766,250	1250,00	\$	\$ 80,766,250	\$ 80,766,250
0.15	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	669	\$ 60,564	\$ 40,478,006	669,00	\$	\$ 40,478,006	\$ 40,478,006
0.16	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	258	\$ 157,080	\$ 40,533,720	258,00	\$	\$ 40,533,720	\$ 40,533,720
0.17	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	5453	\$ 58,395	\$ 318,373,405	5453,00	\$	\$ 318,373,405	\$ 318,373,405
0.18	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	19	\$ 229,551	\$ 4,351,469	19,00	\$	\$ 4,351,469	\$ 4,351,469
0.19	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	27	\$ 503,394	\$ 13,591,638	27,00	\$	\$ 13,591,638	\$ 13,591,638
0.20	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	1	\$ 778,079	\$ 778,079	1,00	\$	\$ 778,079	\$ 778,079
0.21	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	9	\$ 3,509,375	\$ 32,034,375	9,00	\$	\$ 32,034,375	\$ 32,034,375
0.22	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	9	\$ 4,512,500	\$ 40,612,500	9,00	\$	\$ 40,612,500	\$ 40,612,500
0.23	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	m2	1076	\$ 84,923	\$ 91,377,148	1076,00	\$	\$ 91,377,148	\$ 91,377,148
0.24	Suministro, transporte e instalación de la bodega prefabricada en concreto de 20x10x6 cm, color basáltico y laca, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes al diámetro, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4 cm compactada, arena para sellar la base de la bodega orgánica.	un	1	\$ 306,628,154	\$ 306,628,154	1,00	\$	\$ 306,628,154	\$ 306,628,154

CONTRATO DE OBRA No.		OBJETO DE OBRA No.		OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESARROLLAR EN LA AVENIDA LAS VEGAS CALLE 80 SUR DEL MUNICIPIO DE ENRIQUEN, EN COMPLEMENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN No. 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-003A-14-24.		DESBAYA-19-10-2025		ACTA 1		CONTRATISTA:		ACTA 2		ACTA DE OBRA No.2	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONSEJO MUNICIPAL DE ENRIQUEN		CONSEJO MUNICIPAL DE ENRIQUEN		CONSEJO MUNICIPAL DE ENRIQUEN	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONSEJO MUNICIPAL DE ENRIQUEN		CONSEJO MUNICIPAL DE ENRIQUEN		CONSEJO MUNICIPAL DE ENRIQUEN	
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor (\$)	Cant	Valor Total (\$)
10.1	Suministro, transporte e instalación de barrera tipo 4 (Imperial de 50x24cm, vertical en placa de 3/8" de 85cm longitud, anclajes y pernos de 3/8" y tubo 30x3/4" en concreto reforzado de 3000PSI).	un	5	\$ 1,281.407	\$ 6,407.035	5	\$ 6,407.035	5	\$ 6,407.035	5	\$ 6,407.035	5	\$ 6,407.035	5	\$ 6,407.035
10.2	Suministro, transporte e instalación de bideletero tipo 4 (Imperial de 50x24cm, vertical en placa de 3/8" de 85cm longitud, anclajes y pernos de 3/8" y tubo 30x3/4" en concreto reforzado de 3000PSI).	un	4	\$ 559.818	\$ 2,239.272	4	\$ 2,239.272	4	\$ 2,239.272	4	\$ 2,239.272	4	\$ 2,239.272	4	\$ 2,239.272
10.3	Suministro, transporte e instalación de señal vertical indicativa de 2.6m de altura y ancho 7.6cm con pluma metálica con pintura electrolítica negra semi mate. Según diseño.	un	7	\$ 591.047	\$ 4,137.329	7	\$ 4,137.329	7	\$ 4,137.329	7	\$ 4,137.329	7	\$ 4,137.329	7	\$ 4,137.329
10.4	Suministro, transporte y construcción de banco tipo 1 de la mancha más banca tipo 1 (6.00m de longitud x 0.40m de altura y 0.50m de ancho) en concreto y madera. Incluye construcción de muro en electrolítica de 0.05m separación entre vallas, de 1.00m de longitud y altura de 1.60m + 0.40m de alto de la banca. Lleno en leja de barro reciclada hasta 2.00m de altura y 0.05m de ancho, lleno en placa de canto rodado de 50x40cm y longitud 6.00m, banco en concreto simple de 21MPa de 1.50m x 0.45m de ancho, según diseño estructural, lleno de 50x40x100cm en losa de piso, hejas secas y paja seca. Según diseño.	un	2	\$ 5,995.117	\$ 11,990.234	2	\$ 11,990.234	2	\$ 11,990.234	2	\$ 11,990.234	2	\$ 11,990.234	2	\$ 11,990.234
10.5	Suministro, transporte y construcción de banco tipo 2 en concreto y madera. Incluye construcción de muro en electrolítica de 0.05m separación entre vallas, de 1.00m de longitud y altura de 1.60m + 0.40m de alto de la banca. Lleno en leja de barro reciclada hasta 2.00m de altura y 0.05m de ancho, lleno en placa de canto rodado de 50x40cm y longitud 6.00m, banco en concreto simple de 21MPa de 1.50m x 0.45m de ancho, según diseño estructural, lleno de 50x40x100cm en losa de piso, hejas secas y paja seca. Según diseño.	un	2	\$ 4,733.767	\$ 9,467.574	2	\$ 9,467.574	2	\$ 9,467.574	2	\$ 9,467.574	2	\$ 9,467.574	2	\$ 9,467.574
10.6	Suministro, transporte y construcción de banco tipo 3 en concreto, según diseño. Incluye banca en concreto de 0.45m de ancho x 0.45m de altura y 0.05m de separación entre vallas, de 1.00m de longitud y altura de 1.60m + 0.40m de alto de la banca. Lleno en leja de barro reciclada hasta 2.00m de altura y 0.05m de ancho, lleno en placa de canto rodado de 50x40cm y longitud 6.00m, banco en concreto simple de 21MPa de 1.50m x 0.45m de ancho, según diseño estructural, lleno de 50x40x100cm en losa de piso, hejas secas y paja seca. Según diseño.	un	1	\$ 3,567.546	\$ 3,567.546	1	\$ 3,567.546	1	\$ 3,567.546	1	\$ 3,567.546	1	\$ 3,567.546	1	\$ 3,567.546
10.7	Suministro, transporte y construcción de banco tipo 4 en concreto, según diseño. Incluye banca en concreto de 0.45m de ancho x 0.45m de altura y 0.05m de separación entre vallas, de 1.00m de longitud y altura de 1.60m + 0.40m de alto de la banca. Lleno en leja de barro reciclada hasta 2.00m de altura y 0.05m de ancho, lleno en placa de canto rodado de 50x40cm y longitud 6.00m, banco en concreto simple de 21MPa de 1.50m x 0.45m de ancho, según diseño estructural, lleno de 50x40x100cm en losa de piso, hejas secas y paja seca. Según diseño.	un	1	\$ 3,504.545	\$ 3,504.545	1	\$ 3,504.545	1	\$ 3,504.545	1	\$ 3,504.545	1	\$ 3,504.545	1	\$ 3,504.545
10.8	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 1 curva (ver detalle planos de espacio público). Banca con estructura en concreto, con correa para fijación de liones en madera leca de 0.05x0.15m con laparand, liones en madera leca de 1.50x0.05x0.02m y 0.45x0.05x0.02m, pluma metálica 38" y taldón en madera leca de 0.15x0.05x0.02m. Según diseño.	un	3	\$ 3,714.377	\$ 11,143.131	3	\$ 11,143.131	3	\$ 11,143.131	3	\$ 11,143.131	3	\$ 11,143.131	3	\$ 11,143.131
10.9	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 2 curva (ver detalle planos de espacio público). Incluye banca tipo 2 con dimensiones de 3.50x0.60m, con espátar, con estructura en concreto, con correa para fijación de liones en madera leca de 0.05x0.15m con laparand, liones en madera leca de 1.50x0.05x0.02m y 0.45x0.05x0.02m, pluma metálica 38" y taldón en madera leca de 0.15x0.05x0.02m. Según diseño.	un	4	\$ 4,384.736	\$ 17,538.944	4	\$ 17,538.944	4	\$ 17,538.944	4	\$ 17,538.944	4	\$ 17,538.944	4	\$ 17,538.944
10.10	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 3 curva (ver detalle planos de espacio público). Incluye banca tipo 3 con dimensiones de 3.50x0.60m, con espátar, con estructura en concreto, con correa para fijación de liones en madera leca de 0.05x0.15m con laparand, liones en madera leca de 1.50x0.05x0.02m y 0.45x0.05x0.02m, pluma metálica 38" y taldón en madera leca de 0.15x0.05x0.02m. Según diseño.	un	5	\$ 2,033.726	\$ 10,168.630	5	\$ 10,168.630	5	\$ 10,168.630	5	\$ 10,168.630	5	\$ 10,168.630	5	\$ 10,168.630
10.11	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 3 curva ver detalle planos de espacio público) Banca en concreto simple de 21MPa según diseño estructural. De 0.50m de espesor y 0.50m de ancho, con correa para fijación de liones en madera leca de 0.05x0.15m con laparand, liones en madera leca de 1.50x0.05x0.02m y 0.45x0.05x0.02m, pluma metálica 38" y taldón en madera leca de 0.15x0.05x0.02m. Según diseño.	m	25	\$ 1,006.969	\$ 25,174.225	25	\$ 25,174.225	25	\$ 25,174.225	25	\$ 25,174.225	25	\$ 25,174.225	25	\$ 25,174.225
10.12	Suministro, transporte e instalación de bideletero tipo 4 (Imperial de 50x24cm, vertical en placa de 3/8" de 85cm longitud, anclajes y pernos de 3/8" y tubo 30x3/4" en concreto reforzado de 3000PSI).	un	12	\$ 1,499.169	\$ 17,630.028	12	\$ 17,630.028	12	\$ 17,630.028	12	\$ 17,630.028	12	\$ 17,630.028	12	\$ 17,630.028
10.13	Suministro, transporte e instalación de parque infantil y gimnasio. Según diseño.	un	1	\$ 71,123.077	\$ 71,123.077	1	\$ 71,123.077	1	\$ 71,123.077	1	\$ 71,123.077	1	\$ 71,123.077	1	\$ 71,123.077

5/15

40500

ACTA OECOLOGIA

ACTA 64054

Abstract

CONTRATO DE OBRA Nro.		DE 0000-14-102-005		OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VAL AGRIER/VAL EN LA VIVIENDA LAS RECAS CALLE CAL 59 SUR DEL MUNICIPIO DE ENRIQUEN EN EL CANTÓN MONTAÑA, PROVINCIA DE LOS RIOS		ACTA DE OBRA Nro. 2	
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Valor Total (\$)	Valor Total (\$)
14.1.01	Relevo de topografía por planimetría para la obra y estudio de las áreas de la obra (propiedad de los propietarios), donde se incluye: topografía, levantamiento, intervención y todo lo necesario para su ejecución.	un	1	\$ 3.648.750	\$ 3.648.750	\$ 3.648.750	\$ 3.648.750
14.1.02	Suministro e instalación de provisional eléctrica. Incluye montaje de transformador T1 fútil, galpónes de medida y protección, acometidas y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en marcha, supervisión, intervención y todo lo necesario para su ejecución.	un	1	\$ 53.768.658	\$ 53.768.658	\$ 53.768.658	\$ 53.768.658
15	CONCRETOS ESTRUCTURALES				\$ 8.537.032.715	\$ 8.537.032.715	\$ 8.537.032.715
15.1	Colación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, de s=0.05m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	1691	\$ 31.185	\$ 52.733.835	\$ 52.733.835	\$ 52.733.835
15.2	Colación de concreto de 4000 psi para pila de fundación. Incluye el suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para pila de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	612	\$ 808.353	\$ 494.712.036	\$ 494.712.036	\$ 494.712.036
15.3	CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pila. Incluye colocación de concreto 3000 psi (incluye suministro, transporte, formateo, colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado) y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	337	\$ 905.641	\$ 305.268.417	\$ 305.268.417	\$ 305.268.417
15.4	Conexión de DAZOS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	580	\$ 946.447	\$ 548.938.260	\$ 548.938.260	\$ 548.938.260
15.5	Conexión de ESTRIBOS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	180	\$ 1.092.886	\$ 199.319.480	\$ 199.319.480	\$ 199.319.480
15.6	Conexión de COLUMNAS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	182	\$ 1.670.070	\$ 320.653.440	\$ 320.653.440	\$ 320.653.440
15.7	Conexión de VIGAS TIPO CAJÓN en concreto de 5000 psi. Incluye la colocación de concreto para vigas tipo cajón (incluye: sacado interior, labio exterior, losa inferior y losa superior). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción, mano de obra, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	1469	\$ 2.992.305	\$ 4.395.698.045	\$ 4.395.698.045	\$ 4.395.698.045
15.8	Conexión de MUROS DE APROXIMACIÓN en concreto de 5000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	908	\$ 1.752.345	\$ 1.591.125.260	\$ 1.591.125.260	\$ 1.591.125.260
15.9	Colación de concreto 4000 psi para losa superior de 0.35m x 0.80m x 1.00m (incluye suministro, transporte, formateo, colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo).	m3	6	\$ 2.015.481	\$ 12.092.886	\$ 12.092.886	\$ 12.092.886
15.10	Colación de concreto 4000 psi para losa inferior de 0.35m x 0.80m x 1.00m (incluye suministro, transporte, formateo, colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo).	m3	245	\$ 1.385.437	\$ 339.432.065	\$ 339.432.065	\$ 339.432.065
15.11	Conexión de DIAFRAGMAS en concreto de 5000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	146	\$ 1.473.444	\$ 215.122.824	\$ 215.122.824	\$ 215.122.824
15.12	Conexión de LOSA DE APROXIMACIÓN en concreto de 3000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	42	\$ 1.428.164	\$ 59.982.888	\$ 59.982.888	\$ 59.982.888
15.13	Conexión de ANILLOS en concreto de 21 Mpa, sobre losa de concreto según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, adecuación de la superficie, acabado según diseño, mezcla electrolizada D-84, formateo en vapor T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y puesta en marcha.	m3	31	\$ 906.139	\$ 28.090.309	\$ 28.090.309	\$ 28.090.309
16	ACTA DE OBRA Nro. 2				\$ 6.713.911.220	\$ 6.713.911.220	\$ 6.713.911.220

ACTA DE CUSA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (H)	Valor Total (H)
REANUESTE: \$ 2.609.607.985,11					

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Cant	4%	Valor (H)	Cant	Valor (H)
REANUESTE				

RESUMEN:

COSTO DIRECTO	\$ 135.516.248
COSTOS INDIRECTOS AL 21,51%	\$ 29.216.033
COSTO TOTAL CD + CI	\$ 165.194.279
GASTOS REEMBOLSABLES	\$ -
REEMBOLSABLES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 13.875.350
TOTAL EJECUTADO ACTA DE OBRA N° 2	\$ 179.070.659
REANUESTE	\$ 51.854.241.992
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 51.854.241.992

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2


Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses	Plazo Final:	22 meses

ACTA N° 2

Valor Actual:	\$ 51.854.241.992,00	Valor Final:	\$ 51.854.241.992,00
Plazo Inicial:	22 meses		



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 2

En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de febrero de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GAVIRIA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO, representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026:

JUSTIFICACION

Item 6.1 - Construcción de carpeta asfáltica a máquina con mezcla semidensa en caliente tipo msc-25, compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte y colocación de material tipo capa de rodadura: Se realiza el ajuste en menores cantidades teniendo en cuenta el cambio en el diseño presentado para el eje vial 11 y eje vial 12 donde la estructura de pavimento no contempla el uso de este material asfáltico, permitiendo el balance en las cantidades y presupuesto de obra, sin afectar la actividad.

Item 2.3 - DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio. Teniendo en cuenta que las áreas correspondientes al desmonte y limpieza del sector entre los apoyos 2 - 3 - 4 del puente y el eje vial 3, son mayores que las presupuestadas, se requiere la adición de cantidades para esta actividad.

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6.1	Construcción de carpeta asfáltica a máquina con mezcla semidensa en caliente tipo msc-25, compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte y colocación de material tipo capa de rodadura.	m3	-1,20	\$ 1.210.640,00	-\$ 1.451.892,00
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					-\$ 1.451.892,00

OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2,3	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m2	136,20	\$ 10.660,00	\$ 1.451.892,00
TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA					\$ 1.451.892

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA					\$ -

TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA	\$ 1.451.892,00
DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA	\$ -

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empresa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESUR-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente


EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

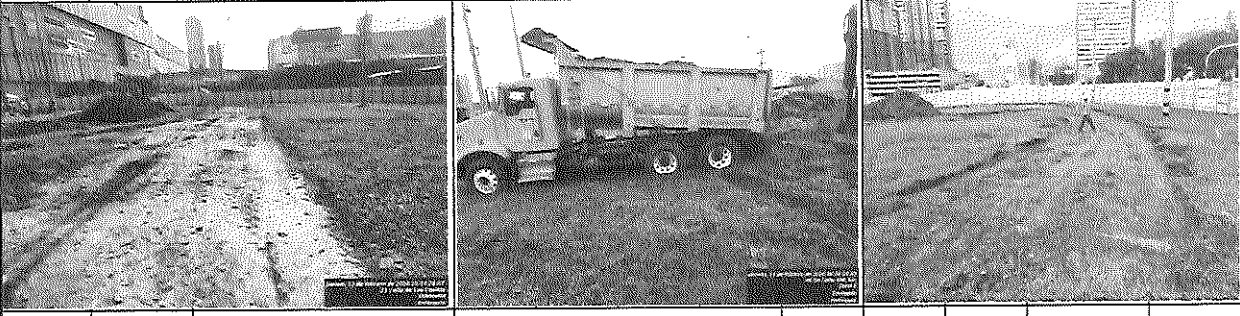

JESUS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA


ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025






DOCUMENTOS DE SOPORTE



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	540,00	
1,1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	540,00	
dia												Saldo por Ejecutar	497,00	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	43,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
23,00	10/03/2026	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle			Cant	Largo	Ancho	Alto	Total				
2	10/03/2026	Localizacion, trazado y replanteo.	Levantamiento general del proyecto			20,00					20,00			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												20,00		
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														


		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.000,00	
2,3	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio.											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	1.000,00	
m2												Saldo por Ejecutar	240,28	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	759,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	10/03/2026	759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total			
2	10/03/2026	Carreteable	Carreteable glorieta				759.72					759.72		
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2														759,72
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



	CONTROL CANTIDADES DE OBRA											 		
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.											DESUR-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8.160,00	
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.											Cant. Adicional	0,00	
Unidad m3												Cant. Total	8.160,00	
												Saldo por Ejecutar	8.157,40	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	2,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026													
0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total			
2	10/03/2026	Demolicion de concreto	Caisson eje 3				2,60					2,60		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2													2,60	
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	3,384,00	
3,1	Excavación manual en tierra de 0 a 2m bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.											Cant. Contractual	0,00	
Unidad												Cant. Total	3,384,00	
m3												Saldo por Ejecutar	3,366,35	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	17,65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	10/03/2026	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total					
2	10/03/2026	Apique	Glorieta Costado occidental		13,82	4,70	4,20	0,70	13,82					
2	10/03/2026	Apique	Glorieta Costado occidental		3,83	2,13	0,90	2,00	3,83					
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2 17,65														
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



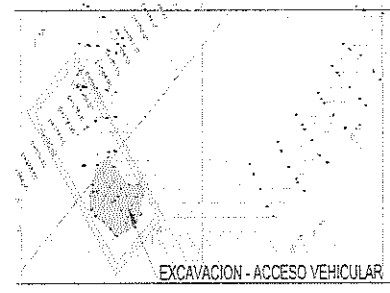
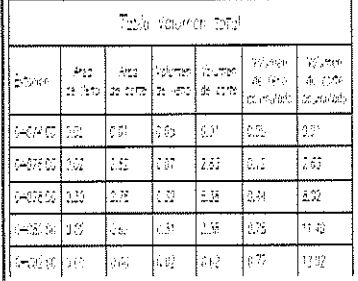
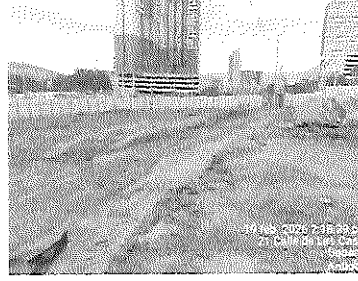
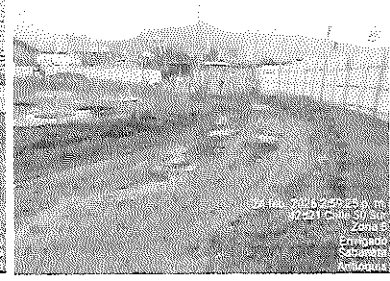




		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	912,00	
3,2	Excavación manual en tierra de 2 a 4m bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	912,00	
m3												Saldo por Ejecutar	911,71	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total					
2	10/03/2026	Apique	Glorieta Costado occidental		0,29	2,13	0,90	0,15	0,29					
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2														
													0,29	
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150,00	
3,3	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (0-2,5 m)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	150,00	
m3												Saldo por Ejecutar	112,90	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	37,10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10,60	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
2	10/03/2026	Excavacion de caisson	Eje 3 - eje 4				26.50					26,50		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2														
26,50														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150,00	
3,4	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2,5-5 m)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	150,00	
m3												Saldo por Ejecutar	133,28	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	16,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026													
	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total					
2	10/03/2026	Excavacion de caisson	Eje 3 - eje 4		16,72				16,72					
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2													16,72	
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA											 		
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO													
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150,00	
3,5	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (5-7,5 m)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	150,00	
m3												Saldo por Ejecutar	136,75	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	13,25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026													
	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad		Detalle			Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
2	10/03/2026	Excavacion de caisson		Eje 3 - eje 4			13,25				13,25			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												13,25		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150,00	
3,6	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (7,5-10 m)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	150,00	
m3												Saldo por Ejecutar	145,58	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	4,42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026													
	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad				Detalle				Cant	Diámetro	Ancho	Alto	Total
2	10/03/2026	Excavacion de caisson				Eje 3 - eje 4				4,42				4,42
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2														4,42
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												DESUR-IA-168-2025	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.													
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	10.878,00
3,12	Excavación mecánica hasta 4,00m de profundidad, incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones											Cant. Adicional	0,00
Unidad												Cant. Total	10.878,00
m3												Saldo por Ejecutar	10.682,97
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	195,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10/03/2026	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total					
2	10/03/2026	Excavación - Acceso vehicular	Glorieta costado sur	12,02				12,02					
2	10/03/2026	Excavación - carretable	Glorieta	183,01				183,01					
  													
  													
  													
  													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												195,03	
													
CONSORCIO MAYORÍA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA												CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA	

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	337,00	
15,3	CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pilas, incluye colocación de concreto 3000 psi (Incluye suministro, transporte, formaleta, colocación del concreto, molinete, motobomba, acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción.)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	337,00	
m3												Saldo por Ejecutar	317,53	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	19,47
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
2	10/03/2026	Anillos de revestimiento	Eje 3 - eje 4				19,47				19,47			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												19,47		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	861.540,00	
16.1	Acero de refuerzo de fy=60.000 psi. Suministro, transporte e instalación. Acero según especificaciones particulares y de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero pdr-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos (herramienta menor), transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. Incluye separadores que garanticen el recubrimiento mínimo especificado.											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	861.540,00	
kg												Saldo por Ejecutar	854.859,28	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	6680,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	10/03/2026	6680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total					
2	10/03/2026	Acero de refuerzo	Anillos de caisson eje 3 - eje 4		1403,56	1/2"; 3/8"			1403,56					
2	10/03/2026	Acero de refuerzo	Fustes eje 3		5277,16	1"; 3/8"			5277,16					
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2 6680,72														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

**FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO identificada con C.C. 42.961.311 de Medellín y con Tarjeta Profesional No 9622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. identificada con Nit 811006928-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ABURRÁ SUR, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en el Municipio de Envigado a los siete (07) días del mes mayo del año 2026. /

Atentamente,




NOMBRE: MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO

CARGO: REVISOR FISCAL de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. en nombre de FM CONASESORES S.A.S

C.C. 42.961.311 de Medellín

Tarjeta Profesional No 9622-T



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito revisor fiscal de **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, identificada con **NIT 900.240.169-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al personal vinculado y contratado por Servicios Profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la firma de dicha certificación, y a la fecha de este certificado se encuentra al día en sus pagos y respectivos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 7 días del mes de mayo del 2026.

JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C 98.578.337
T.P 106587-T

Medellín, 02 de mayo de 2026.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.


Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6. certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,



Daniel Flórez Osorio

Revisor fiscal

T.P. 237007-T

Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A



+57 604 266 6474
+57 301 208 5777



www.ochgroup.co




Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A identificada con NIT 800.014.246-8, declaro bajo la gravedad de juramento, que la sociedad ha cumplido en los últimos meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Medellín Antioquia, a los seis (06) día de mayo de 2026.

Cordialmente,



Raúl A. Menco V.

Revisor fiscal designado por Auren Consultores Medellín
Tarjeta Profesional No. 66200-T
C.C. 19.872.348 de Magangué Bolívar



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscriptor representante legal del **Consorcio Mayorca Conecta** identificado con nit 901.999.695 - 4, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089**, y el suscrito contador público, **CARLOS MARIO ALVAREZ CANO** identificado con cédula de ciudadanía **1.152.185.206**, certifican que el consorcio en mención se encuentra al día a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (7) siete días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

Camilo Angel Machado.
Representante legal.
Consorcio Mayorca Conecta

Carlos Mario Alvarez Cano.
Contador Público.
T.P 207249 – T

PAGADA 13/04/2026

Se certifica que en la fecha 2026-04-13, la empresa CONSORCIO CONECTA MAYORCA con documento de identificación NI901999695, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1001233778	OCHOA MORALES EDUARDO SMITH	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1003083720	MERCADO ALVAREZ CARLOS ALFREDO	PROTECCION	NUOVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1019039747	HERNANDEZ QUINCHARA DIEGO ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1028010718	TERAN SANTOS FAIDIER LUIS	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1039288649	RODRIGUEZ CASTRILLON JHONNY ALEXANDER	PORVENIR	NUOVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1045706561	JULIO ACOSTA HAROLD	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1045706561	JULIO ACOSTA HAROLD	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1046933283	RIOS CARDONA EDISON ANDRES	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1058820423	CASTAÑEDA GIRALDO HECTOR HERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1072751399	CAÑIZALES AVILA JHON SEBASTIAN	PROTECCION	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1128429470	ARANGO ESPINAL JORGE EMILIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1193076337	ALTAMIRANDA LONDOÑO JULIAN SIVEN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1193076337	ALTAMIRANDA LONDOÑO JULIAN SIVEN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 70328174	ECHAVARRIA MEJIA ALEJANDRO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 70421223	MONTOYA VASQUEZ WILMAR FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 70952073	VELASQUEZ RIVERA OTONIEL DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 71210420	YEPEZ CASTRO HUMBERTO HERNAN	COLFONDOS	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 72153375	DEL CAMPO MARTELO WILLIAM	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 74180099	CARDENAS CHAPARRO GEOVANNY YAIR	COLPENSIONES	NUOVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 78006668	RUÍZ MUÑOZ YOHAN ENRIQUE	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 79303055	DORIA HERNANDEZ JORGE LUIS	PROTECCION	EPS SANTAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 91180240	VEGA ARDILA ANDELFO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Se certifica que en la fecha 2026-04-13, la empresa CONSORCIO CONECTA MAYORCA con documento de identificación N1901999695, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 91180240	VEGA ARDILA ANDELFO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 91523846	CORONEL PABON FREDY ARMANDO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 91523846	CORONEL PABON FREDY ARMANDO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 98476799	OCHOA TORRES JESUS MARIA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 98610281	FIGUEROA BERMUDEZ FRANCISCO FIDEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 98610281	FIGUEROA BERMUDEZ FRANCISCO FIDEL	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Certificación Bancaria

Señores


CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/04/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefania Niño Piza

 **Bancolombia**
