



CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4
CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA
MEDELLÍN
TEL- 4440568
FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FES

Documento Ref.:

Código CIIU / Actividad Económica: 4210

Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: 901387801-2
Dirección: CL 35 SUR 40 35 - Envigado - Antioquia
Teléfono: 6044801300

Fecha Documento : 8 - May - 2026
Hora Documento: 17:04:23-05:00

Fecha Vencimiento: 7 - Jun - 2026
Condición Pago: Crédito
Lugar de Pago: MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANOGRABADA	ACTA DE OBRA NO GRAVADA	1	5,286,217.00	5,286,217.00	



Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-011271-R Id: 108413
Fecha: 2026-05-13 11:38
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0



ACTA NCONTRATO DESur-IA-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN NDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24"
ifs17

Sub Total:	5,286,217.00
Descuento:	
IVA:	
Retención:	0.00
Retención AMB:	0.00
Retención: ICA	0.00
Valor Total:	5,286,217.00



Firma Digital : 9b65312cfc5f6f7ad9929a63bed8e07cfa8384c2388ae8cc5d27a389813a3db5705080731768c6f12f750ccff326a5a3
Cufe : c4b5f59ce5c1bce5b6be701a3e75cfd94f30daec0483eb4a455633be545baf31d276e3590c9f9060a530de7b92bcec0c

SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS Y CERO CENTAVO M/L

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 041 de Enero 30 de 2014

Documento Ref.: -
Esta Factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio
Resolución No. 18764100452377 Fecha:22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000

ELABORADO POR

APROBADO

FECHA RECIBIDO:

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-08 HORA DE VALIDACIÓN 21:58:11-05:00 Elaborado por: Icuartas

Page 1 of 1

30111360028591

1999

[illegible]

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
Item	Actividad	Unidad	Cant.	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant.	Valor (\$)
7.4	Suministro, transporte e instalación de señalización vertical tipo B1 -señal vertical informativa de 150x 300 mm, de acuerdo al manual de señalización vial-, según normas y especificaciones del Intendente de Vías y Transportes, incluye suministro, transporte, paraca, ardo y colocación, según especificaciones de la Intendencia de Vías y Transportes para la correcta instalación.	un	12	\$ 1.198.095	\$ 14.382.695	12,00	\$ 14.382.695
7.5	Suministro, transporte e instalación de Señalización elevada tipo banderita con dos tableros, 14 metros de ancho de vía, de mt. de carrilero y altura de 5 mte. de acuerdo a diseño anexo, Intendencia de Vías y Transportes, según especificaciones de la Intendencia de Vías y Transportes para la correcta instalación. Incluye suministro, transporte, paraca, ardo y colocación, según especificaciones de la Intendencia de Vías y Transportes para la correcta instalación.	un	8	\$ 50.677.625	\$ 405.421.000	8,00	\$ 405.421.000
7.6	Suministro, transporte e instalación de Señalización elevada tipo banderita con dos tableros, 14 metros de ancho de vía, de mt. de carrilero y altura de 5 mte. de acuerdo a diseño anexo, Intendencia de Vías y Transportes, según especificaciones de la Intendencia de Vías y Transportes para la correcta instalación. Incluye suministro, transporte, paraca, ardo y colocación, según especificaciones de la Intendencia de Vías y Transportes para la correcta instalación.	m2	405	\$ 66.500	\$ 26.827.500	405,00	\$ 26.827.500
7.7	Suministro, transporte e instalación de señalizaciones tipo flechas según diseño, con esquemas de pintura, SSP-302 con base antirreflexión (fénica) y acabado pintura emulsión acrílica amarilla para exteriores de 1,5 mts. Incluye suministro, transporte, paraca, ardo y colocación, según especificaciones de la Intendencia de Vías y Transportes para la correcta instalación.	m	520	\$ 1.620.097	\$ 842.450.760	520,37	\$ 842.450.760
7.8	Contribución de caja de distribución RS 3-016 50 x 50 con marco antirreflexo, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	42	\$ 675.300	\$ 28.382.400	42,00	\$ 28.382.400
7.9	Contribución de señalización en tubería de 3" en piso duro, norma RS1-100, incluye excavación, bolsa de escorbones, reposición del acabado existente y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	252	\$ 198.300	\$ 49.982.400	252,00	\$ 49.982.400
7.10	Contribución de señalización en tubería de 3" en pavimento, norma RS1-100, incluye excavación, bolsa de escorbones, reposición del acabado existente y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	208	\$ 821.100	\$ 171.000.800	208,00	\$ 171.000.800
7.11	Contribución de cable para señal x x 18, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	2090	\$ 12.732	\$ 26.552.500	2.090,00	\$ 26.552.500
7.12	Suministro, transporte e instalación de Fwec recto para señalizaciones, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	un	23	\$ 4.210.818	\$ 96.848.745	23,00	\$ 96.848.745
7.13	Suministro, transporte e instalación de intersecciones galvanizadas para instalación de señalizaciones.	un	15	\$ 6.156.762	\$ 92.351.445	15,00	\$ 92.351.445
7.14	Suministro, transporte e instalación de señalizaciones vehiculares en pavimento para poste, incluye: Soporte y placa de contenido de acuerdo a las normas de la Secretaría de Movilidad.	un	27	\$ 1.365.097	\$ 37.665.599	27,00	\$ 37.665.599
7.15	Suministro, transporte e instalación de señalizaciones vehiculares en pavimento para poste, incluye: Soporte y placa de contenido de acuerdo a las normas de la Secretaría de Movilidad.	un	15	\$ 1.724.428	\$ 25.866.425	15,00	\$ 25.866.425
7.16	Suministro, transporte e instalación de señalizaciones peatonales, incluye: soporte y placa de contenido de acuerdo a las normas de la Secretaría de Movilidad.	un	20	\$ 900.097	\$ 18.018.740	20,00	\$ 18.018.740
7.17	Suministro, transporte e instalación de señalizaciones vehiculares en pavimento para poste, incluye: Soporte y placa de contenido de acuerdo a las normas de la Secretaría de Movilidad.	un	14	\$ 1.292.697	\$ 18.097.758	14,00	\$ 18.097.758
7.18	Suministro, transporte e instalación de señalizaciones vehiculares en pavimento para poste, incluye: Soporte y placa de contenido de acuerdo a las normas de la Secretaría de Movilidad.	un	26	\$ 284.113	\$ 7.386.938	26,00	\$ 7.386.938
7.19	Contribución de Caja de distribución de 60 x 90cm, incluye: suministro, transporte, paraca, ardo y colocación, según especificaciones de la Intendencia de Vías y Transportes para la correcta instalación.	un	1	\$ 1.621.673	\$ 1.621.673	1,00	\$ 1.621.673
7.20	Suministro, transporte e instalación, programación y puesta en servicio de equipos de control de tráfico vial, con capacidad de 1000 dispositivos (1000) grupos vehiculares y/o peatonales.	un	4	\$ 65.298.798	\$ 261.195.152	4,00	\$ 261.195.152
7.21	Suministro, transporte e instalación de equipos de control de tráfico vial, con capacidad de 1000 dispositivos (1000) grupos vehiculares y/o peatonales.	un	4	\$ 3.915.100	\$ 15.660.400	4,00	\$ 15.660.400
7.22	Compra e instalación de software de programación con licencia de uso, incluye: computador portátil y otros) y capacitación para personal técnico.	un	1	\$ 17.201.509	\$ 17.201.509	1,00	\$ 17.201.509
8	TOTAL				\$ 1.348.013.211		\$ 1.348.013.211

[illegible]

KEYWORDS:

TABLE 1

CONTRATO DE OBRAS N°.				OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VAL A LERENAL EN LA AVENIDA DE LA CONECTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTA DE EJECUCIÓN N° DEL CONTRATO INTERMUNICIPAL INTERMUNICIPAL EN 09-05-141524.				CONTRATANTE				ACTA DE OBRAS N° 2			
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2				CONTRATADO ANTERIOR CONECTA				CONTRATADO ANTERIOR CONECTA			
Item	Actividad	Unidad	Cant.	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Cant.	Valor (\$)	Cant.	Valor (\$)	Cant.	Valor (\$)	Cant.	Valor (\$)	Cant.	Valor Total (\$)
12.25	Telefonación de redes de abastecimiento para diagnóstico con equipo operado mediante cámara (Cincocho corredo de telefonía), incluye inspección y calificación de la red con los informes realizados por EPAL.	m	471	\$ 38,834	\$ 18,761,814		\$		\$		\$	0,00	\$	471,00	\$ 18,761,814
12.26	Llave de buena de abastecimiento	hora	24	\$ 335,365	\$ 8,042,760		\$		\$		\$	0,00	\$	24,00	\$ 8,042,760
13.1	PERFORACIÓN (CONCRETO ARMADO)	m³	743	\$ 78,655	\$ 58,582,255		\$		\$		\$	0,00	\$	743,00	\$ 58,582,255
13.2	Excavación mecánica material común tamaño <2m, mezclada con arena, para la instalación de tuberías de PVC de 1200mm, en carpas y bolada de material.	m³	318	\$ 100,435	\$ 31,937,694		\$		\$		\$	0,00	\$	318,00	\$ 31,937,694
13.3	Embarcos e bichos en madera temporal	m³	3071	\$ 56,952	\$ 174,889,592		\$		\$		\$	0,00	\$	3071,00	\$ 174,889,592
13.4	Materiales granular tipo base granular RINVAS para compactación y relleno tridimensional de las áreas compactadas al 98% del punto. Incluye transporte interno y compactación con densidad social, igual o mayor al 50% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.	m³	137	\$ 194,066	\$ 26,714,452		\$		\$		\$	0,00	\$	137,00	\$ 26,714,452
13.5	Llave final de abastecimiento RINVAS, para 1200mm, incluye en su estructura: tuberías de PVC de 1200mm, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m³	565	\$ 108,417	\$ 61,020,095		\$		\$		\$	0,00	\$	565,00	\$ 61,020,095
13.6	Transporte y colocación de tuberías PVC 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	78	\$ 129,075	\$ 10,068,247		\$		\$		\$	0,00	\$	78,22	\$ 10,068,247
13.7	Sumidero, transporte y colocación de tuberías PVC 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	286	\$ 187,364	\$ 49,573,217		\$		\$		\$	0,00	\$	286,20	\$ 49,573,217
13.8	Sumidero, transporte y colocación de tuberías PVC 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	227	\$ 222,432	\$ 50,482,064		\$		\$		\$	0,00	\$	227,00	\$ 50,482,064
13.9	Continuación de alfilerado de oficina diámetro 1,20m, incluye tuberías necesarias para su conexión y funcionamiento, no necesario para su correcta instalación.	un	4	\$ 5,610,271	\$ 22,441,084		\$		\$		\$	0,00	\$	4,00	\$ 22,441,084
13.10	Continuación de cámara de salida diámetro 300mm, incluye tuberías necesarias para su conexión y funcionamiento, no necesario para su correcta instalación.	un	7	\$ 1,070,088	\$ 7,490,716		\$		\$		\$	0,00	\$	7,00	\$ 7,490,716
13.11	Sumidero, transporte y colocación de tuberías PVC 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	16	\$ 1,543,289	\$ 24,692,624		\$		\$		\$	0,00	\$	16,00	\$ 24,692,624
13.12	Continuación de BASE Y CARPUELA de 28 MPa, para cámara de inspección, incluye tuberías necesarias para su conexión y funcionamiento, no necesario para su correcta instalación.	un	16	\$ 855,861	\$ 13,693,776		\$		\$		\$	0,00	\$	16,00	\$ 13,693,776
13.13	Sumidero, transporte y colocación de tuberías PVC 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	48	\$ 1,759,512	\$ 84,456,576		\$		\$		\$	0,00	\$	48,00	\$ 84,456,576
13.14	Sumidero, transporte e instalación de CONO PREFABRICADO en concreto 28 MPa, para cámara de inspección de diámetro 1,20m.	un	16	\$ 1,118,002	\$ 17,944,512		\$		\$		\$	0,00	\$	16,00	\$ 17,944,512
13.15	Perforación y embudo de pared para cámara de inspección	un	51	\$ 173,204	\$ 8,833,404		\$		\$		\$	0,00	\$	51,00	\$ 8,833,404
13.16	Sumidero, transporte e instalación de garbajo galvanizado para cámara de inspección	un	192	\$ 103,180	\$ 19,810,592		\$		\$		\$	0,00	\$	192,00	\$ 19,810,592
13.17	Labores de abastecimiento para labores plomero, mano de obra y en medio digital a EPAL.	un	23	\$ 111,640	\$ 2,567,720		\$		\$		\$	0,00	\$	23,00	\$ 2,567,720
13.18	Telefonación de redes de abastecimiento para diagnóstico con equipo operado mediante cámara (Cincocho corredo de telefonía), incluye inspección y calificación de la red con los informes realizados por EPAL.	m	691	\$ 39,834	\$ 23,956,964		\$		\$		\$	0,00	\$	691,42	\$ 23,956,964
13.19	Llave final de abastecimiento	hora	24	\$ 335,365	\$ 8,042,760		\$		\$		\$	0,00	\$	24,00	\$ 8,042,760
14.1	PERFORACIÓN (CONCRETO ARMADO)	m³	51	\$ 223,142	\$ 11,380,242		\$		\$		\$	0,00	\$	51,00	\$ 11,380,242
14.2	Excavación mecánica material común tamaño <2m, mezclada con arena, para la instalación de tuberías de PVC de 1200mm, en carpas y bolada de material.	m³	35	\$ 348,078	\$ 12,182,730		\$		\$		\$	0,00	\$	35,00	\$ 12,182,730
14.3	Embarcos e bichos en madera temporal	m³	1700	\$ 53,541	\$ 91,019,700		\$		\$		\$	0,00	\$	1700,00	\$ 91,019,700
14.4	Materiales granular tipo base granular RINVAS para compactación y relleno tridimensional de las áreas compactadas al 98% del punto. Incluye transporte interno y compactación con densidad social, igual o mayor al 50% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.	m³	1448	\$ 107,467	\$ 155,397,282		\$		\$		\$	0,00	\$	1448,00	\$ 155,397,282
14.5	Llave final de abastecimiento RINVAS, para 1200mm, incluye en su estructura: tuberías de PVC de 1200mm, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m³	290	\$ 182,751	\$ 47,515,266		\$		\$		\$	0,00	\$	290,00	\$ 47,515,266
14.6	Llave y apilamiento de tuberías y plomos con accesorios	m³	100	\$ 142,575	\$ 14,257,500		\$		\$		\$	0,00	\$	100,00	\$ 14,257,500
14.7	Alaque de tuberías en concreto	m³	18	\$ 1,134,720	\$ 20,424,960		\$		\$		\$	0,00	\$	18,00	\$ 20,424,960
14.8	Sumidero, transporte y montaje canalización en tubería PVC de 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	50	\$ 28,108	\$ 1,405,400		\$		\$		\$	0,00	\$	50,00	\$ 1,405,400
14.9	Sumidero, transporte y montaje canalización en tubería PVC de 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	2550	\$ 41,646	\$ 106,197,300		\$		\$		\$	0,00	\$	2550,00	\$ 106,197,300
14.10	Sumidero y montaje canalización en tubería PVC de 1200mm, en concreto de 28 MPa, para cámara de inspección, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	2070	\$ 63,680	\$ 131,844,510		\$		\$		\$	0,00	\$	2070,00	\$ 131,844,510
14.11	Sumidero, transporte y montaje poses de concreto de 12m, 75% de mediana, según norma EIA-026, incluye limpieza y densidad de mediana para su correcta funcionamiento.	un	8	\$ 2,322,902	\$ 18,583,216		\$		\$		\$	0,00	\$	8,00	\$ 18,583,216

1102

LECTA DE OSTA

Abstract

References

CONTRATO DE OBRAS No. 22										ACTA DE OBRA No.2	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL QUE UNIFICARÁ EL TRÁFICO EN LA CARRETERA DE LA VÍA DE LA V											

Jesus Enrique Acevedo
Jesus Enrique Acevedo
 Representante Legal
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA

Alvaro Hernandez Vera
Alvaro Hernandez Vera
 Representante Legal
 CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



CONTRATO N° DESUR-IA-168-2025

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 2

En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de febrero de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GAVIRIA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO, representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de febrero de 2026:

JUSTIFICACION

Item 6.1 - Construcción de carpeta asfáltica a máquina con mezcla semidensa en caliente tipo msc-25, compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte y colocación de material tipo capa de rodadura: Se realiza el ajuste en menores cantidades teniendo en cuenta el cambio en el diseño presentado para el eje vial 11 y eje vial 12 donde la estructura de pavimento no contempla el uso de este material asfáltico, permitiendo el balance en las cantidades y presupuesto de obra, sin afectar la actividad.

Item 2.3 - DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio. Teniendo en cuenta que las áreas correspondientes al desmonte y limpieza del sector entre los apoyos 2 - 3 - 4 del puente y el eje vial 3, son mayores que las presupuestadas, se requiere la adición de cantidades para esta actividad.

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6.1	Construcción de carpeta asfáltica a máquina con mezcla semidensa en caliente tipo msc-25, compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte y colocación de material tipo capa de rodadura.	m3	-1,20	\$ 1.210.640,00	-\$ 1.451.892,00
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					-\$ 1.451.892,00

OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.3	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m2	136,20	\$ 10.660,00	\$ 1.451.892,00
TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA					\$ 1.451.892

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA					\$ -

TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA \$ 1.451.892,00

DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA \$ -

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empresa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESUR-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

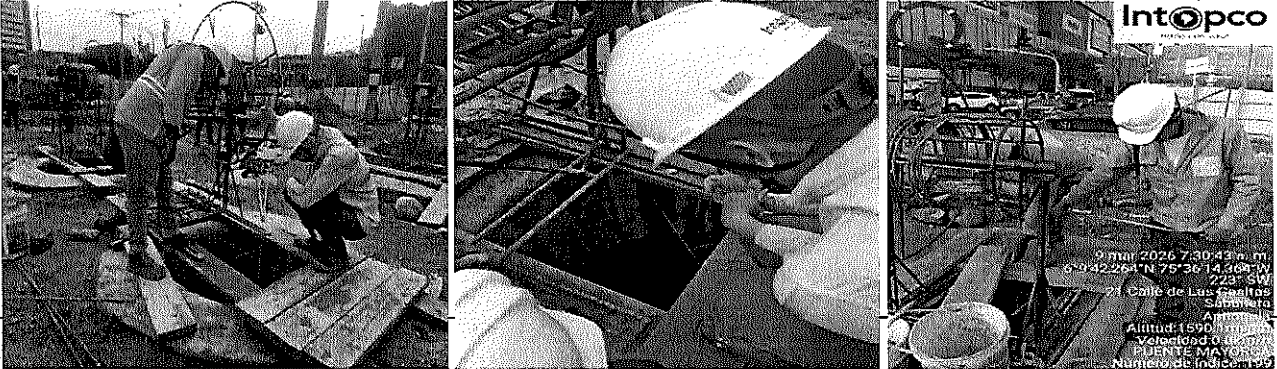

Para constancia firman:



ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente



EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

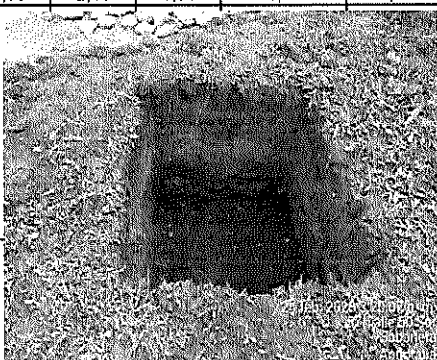


JESUS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA



ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025



		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°S DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	540,00	
1,1												Cant. Adicional	0,00	
Unidad	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)											Cant. Total	540,00	
dia												Saldo por Ejecutar	497,00	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	43,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026													
23,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad		Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total		
2	10/03/2026	Localizacion, trazado y replanteo.		Levantamiento general del proyecto				20,00				20,00		
														
												TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2	20,00	
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.000,00	
2,3	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio.											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	1.000,00	
m2												Saldo por Ejecutar	240,28	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	759,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	10/03/2026	759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total						
2	10/03/2026	Carreteable	Carreteable glorieta	759,72				759,72						
														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2														
								759,72						
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8.160,00
2,8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.											Cant. Adicional	0,00
Unidad m3												Cant. Total	8.160,00
												Saldo por Ejecutar	8.157,40
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2,60
	10/03/2026												
0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad		Detalle				Cant	Largo	Ancho	Alto	Total	
2	10/03/2026	Demolicion de concreto		Caisson eje 3				2,60				2,60	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2													2,60
OBSERVACIONES:													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	3.384,00	
3,1	Excavación manual en tierra de 0 a 2m bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	3.384,00	
m3												Saldo por Ejecutar	3.366,35	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	17,65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	10/03/2026	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle		Cant	Largo	Ancho	Alto	Total					
2	10/03/2026	Apique	Glorieta Costado occidental		13,82	4,70	4,20	0,70	13,82					
2	10/03/2026	Apique	Glorieta Costado occidental		3,83	2,13	0,90	2,00	3,83					
  														
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2														
													17,65	
OBSERVACIONES:														
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	912,00
3,2	Excavación manual en tierra de 2 a 4m bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.											Cant. Adicional	0,00
Unidad m3												Cant. Total	912,00
												Saldo por Ejecutar	911,71
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0,00	10/03/2026	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total					
2	10/03/2026	Apique	Glorieta Costado occidental	0,29	2,13	0,90	0,15	0,29					
													
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2													
													0,29
OBSERVACIONES:													
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025	
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150,00
3,3	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0,3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (0-2,5 m)											Cant. Adicional	0,00
Unidad												Cant. Total	150,00
m3												Saldo por Ejecutar	112,90
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10/03/2026												
10,60	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle					Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total	
2	10/03/2026	Excavacion de caisson	Eje 3 - eje 4					26,50				26,50	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												26,50	
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILSA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													


	CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 	
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150,00
3,4	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2,5-5 m)											Cant. Adicional	0,00
Unidad												Cant. Total	150,00
m3												Saldo por Ejecutar	133,28


Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	16,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026													
	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Registro Fotográfico /Plano / Esquema									
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diámetro	Ancho	Alto	Total	
2	10/03/2026	Excavacion de caisson	Eje 3 - eje 4	16,72				16,72	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2								16,72	





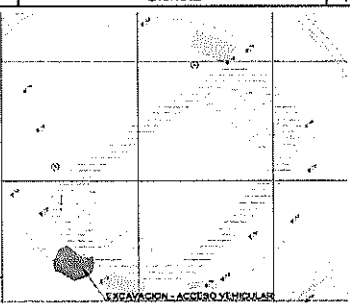
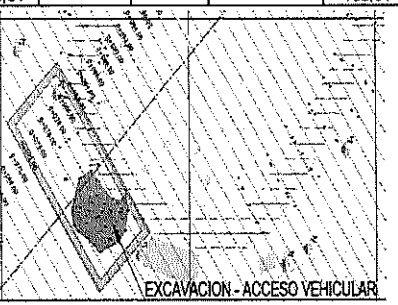
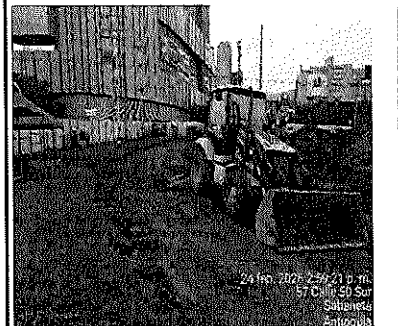
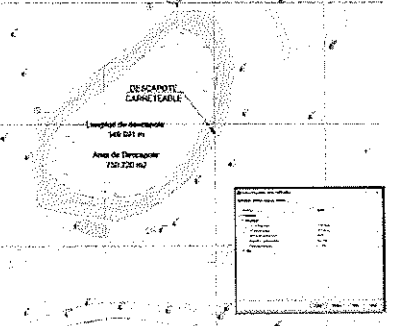

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA









CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	150,00	
3,5	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (5-7,5 m)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad m3												Cant. Total	150,00	
												Saldo por Ejecutar	136,75	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	10/03/2026													
	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico /Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle				Cant	Diámetro	Ancho	Alto	Total			
2	10/03/2026	Excavacion de caisson	Eje 3 - eje 4				13,25					13,25		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												13,25		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.										DESur-IA-168-2025			
Item No	DESCRIPCIÓN										Cant. Contractual	150,00	
3,6	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (7,5-10 m)										Cant. Adicional	0,00	
Unidad											Cant. Total	150,00	
m3											Saldo por Ejecutar	145,58	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		4,42
	10/03/2026												
	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico /Plano / Esquema													
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad		Detalle		Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total			
2	10/03/2026	Excavacion de caisson		Eje 3 - eje 4		4,42				4,42			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												4,42	
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 																																															
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO																																																											
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025																																															
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	10,878,00																																														
3,12	Excavación mecánica hasta 4,00m de profundidad, incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones											Cant. Adicional	0,00																																														
Unidad												Cant. Total	10,878,00																																														
m3												Saldo por Ejecutar	10,682,97																																														
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	195,03																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
	10/03/2026																																																										
0,00	195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00																																														
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
Registro Fotográfico /Plano / Esquema																																																											
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad					Detalle					Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total																																											
2	10/03/2026	Excavacion - Acceso vehicular					Glorieta costado sur					12,02				12,02																																											
2	10/03/2026	Excavacion - carreteable					Glorieta					183,01				183,01																																											
  																																																											
Tabla Volumen total <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estacion</th> <th>Area de lleno</th> <th>Area de corte</th> <th>Volumen de lleno</th> <th>Volumen de corte</th> <th>Volumen de lleno acumulado</th> <th>Volumen de corte acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G+0+74.00</td> <td>0.05</td> <td>0.01</td> <td>0.03</td> <td>0.01</td> <td>0.05</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>G+0+75.00</td> <td>0.02</td> <td>2.62</td> <td>0.07</td> <td>2.63</td> <td>0.12</td> <td>2.63</td> </tr> <tr> <td>G+0+78.00</td> <td>0.30</td> <td>2.75</td> <td>0.32</td> <td>5.38</td> <td>0.44</td> <td>8.02</td> </tr> <tr> <td>G+0+80.00</td> <td>0.02</td> <td>0.62</td> <td>0.31</td> <td>3.38</td> <td>0.75</td> <td>11.40</td> </tr> <tr> <td>G+0+82.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.02</td> <td>0.62</td> <td>0.77</td> <td>12.02</td> </tr> </tbody> </table>																		Estacion	Area de lleno	Area de corte	Volumen de lleno	Volumen de corte	Volumen de lleno acumulado	Volumen de corte acumulado	G+0+74.00	0.05	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	G+0+75.00	0.02	2.62	0.07	2.63	0.12	2.63	G+0+78.00	0.30	2.75	0.32	5.38	0.44	8.02	G+0+80.00	0.02	0.62	0.31	3.38	0.75	11.40	G+0+82.00	0.00	0.00	0.02	0.62	0.77	12.02
Estacion	Area de lleno	Area de corte	Volumen de lleno	Volumen de corte	Volumen de lleno acumulado	Volumen de corte acumulado																																																					
G+0+74.00	0.05	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01																																																					
G+0+75.00	0.02	2.62	0.07	2.63	0.12	2.63																																																					
G+0+78.00	0.30	2.75	0.32	5.38	0.44	8.02																																																					
G+0+80.00	0.02	0.62	0.31	3.38	0.75	11.40																																																					
G+0+82.00	0.00	0.00	0.02	0.62	0.77	12.02																																																					
 																																																											
  																																																											
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2														195,03																																													
																																																											
CONSORCIO MAYORGA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA														CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernandez Vera INTERVENTORIA																																													

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA										 		
		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO												
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	337,00	
15,3	CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pilas, incluye colocación de concreto 3000 psi (Incluye suministro, transporte, formaleta, colocación del concreto, molinete, motobomba, acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción.)											Cant. Adicional	0,00	
Unidad m3												Cant. Total	337,00	
												Saldo por Ejecutar	317,53	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	19,47
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	10/03/2026	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad			Detalle			Cant	Díametro	Ancho	Alto	Total		
2	10/03/2026	Anillos de revestimiento			Eje 3 - eje 4			19,47				19,47		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2												19,47		
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

		CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO										 		
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.												DESUR-IA-168-2025		
Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	861.540,00	
16.1	Acero de refuerzo de fy=60.000 psi. Suministro, transporte e instalación. Acero según especificaciones particulares y de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero pdr-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos (herramienta menor), transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. Incluye separadores que garanticen el recubrimiento mínimo especificado.											Cant. Adicional	0,00	
Unidad												Cant. Total	861.540,00	
kg												Saldo por Ejecutar	854.859,28	
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	6680,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0,00	6680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	0,00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Registro Fotográfico / Plano / Esquema														
Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total						
2	10/03/2026	Acero de refuerzo	Anillos de caisson eje 3 - eje 4	1403,56	1/2"; 3/8"			1403,56						
2	10/03/2026	Acero de refuerzo	Fustes eje 3	5277,16	1"; 3/8"			5277,16						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 2													6680,72	
 CONSORCIO MAYORCA CONECTA Ing. Jorge Restrepo Sulez CONTRATISTA  CONSORCIO METROPOLITANO ILA Ing. Alvaro Hernando Vera INTERVENTORIA														

**FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO identificada con C.C. 42.961.311 de Medellín y con Tarjeta Profesional No 9622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. identificada con Nit 811006928-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ABURRÁ SUR, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en el Municipio de Envigado a los siete (07) días del mes mayo del año 2026.

Atentamente,




NOMBRE: MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO

CARGO: REVISOR FISCAL de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. en nombre de FM CONASESORES S.A.S

C.C. 42.961.311 de Medellín

Tarjeta Profesional No 9622-T



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito revisor fiscal de **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, identificada con **NIT 900.240.169-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al personal vinculado y contratado por Servicios Profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la firma de dicha certificación, y a la fecha de este certificado se encuentra al día en sus pagos y respectivos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 7 días del mes de mayo del 2026.

JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C 98.578.337
T.P 106587-T

Medellín, 02 de mayo de 2026.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.


Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6. certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,



Daniel Flórez Osorio
Revisor fiscal

T.P. 237007-T

Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A



+57 604 266 6474
+57 301 208 5777



www.ochgroup.co



Calle 16 #41-210. Oficina 901.
Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A identificada con NIT 800.014.246-8, declaro bajo la gravedad de juramento, que la sociedad ha cumplido en los últimos meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Medellín Antioquia, a los seis (06) día de mayo de 2026.

Cordialmente,



Raúl A. Menco V.

Revisor fiscal designado por Auren Consultores Medellín
Tarjeta Profesional No. 66200-T
C.C. 19.872.348 de Magangué Bolívar



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal del **Consorcio Mayorca Conecta** identificado con nit 901.999.695 - 4, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089**, y el suscrito contador público, **CARLOS MARIO ALVAREZ CANO** identificado con cédula de ciudadanía **1.152.185.206**, certifican que el consorcio en mención se encuentra al día a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (7) siete días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

Camilo Angel Machado.
Representante legal.
Consorcio Mayorca Conecta

Carlos Mario Alvarez Cano.
Contador Público.
T.P 207249 – T



Nro Planilla: 84917154

Fecha de creación del

martes, 14 de abril de 2026 03:20:13 PM

Período de Cotización: 2026-03

Período de Servicio: 2026-04

SuAporte|Constancia de Pago Afiliados

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 13/04/2026

Se certifica que en la fecha 2026-04-13, la empresa CONSORCIO CONECTA MAYORCA con documento de identificación NI901999695, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENIA	9. Pagó ESP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1001233778	OCHOA MORALES EDUARDO SMITH	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1003003720	MERCADO ALVAREZ CARLOS ALFREDO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1019039747	HERNANDEZ QUINCHARA DIEGO ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1028010718	TERAN SANTOS FADIER LUIS	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1039286649	RODRIGUEZ CASTRILLON JHONNY ALEXANDER	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1045706551	JULIO ACOSTA HAROLD	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1045706551	JULIO ACOSTA HAROLD	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1046833263	RIOS CARDONA EDISON ANDRES	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 10598020423	CASTAÑEDA GIRALDO HECTOR HERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1072751599	CANIZALES AVILA HON SEBASTIAN	PROTECCION	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1129429470	ARANGO ESPINAL JORGE EMILIO	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1193076337	ALTAMIRANDA LONDOÑO JULIAN STIVEN	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 1193076337	ALTAMIRANDA LONDOÑO JULIAN STIVEN	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 702281174	ECHAVARRIA MEJIA ALEJANDRO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 70421223	MONTAÑA VASQUEZ WILLMAR	PORVENIR	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 70952073	VELASQUEZ RIVERA OTONIEL DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 71215420	YEPEZ CASTRO HUMBERTO HERNAN	COLFONDOS	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 72153375	DEL CAMPO MARTELO WILLIAM	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 74180099	CARDENAS CHAPARRO GEOVANNY VAIR	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 76006560	RUIZ MUÑOZ YOHANN ENRIQUE	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 78303055	DORIA HERNANDEZ JORGE LUIS	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC 91180240	VEGA ARDILA ANIELFO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



Se certifica que en la fecha 2026-04-13, la empresa CONSORCIO CONECTA MAYORCA con documento de identificación NI901999695, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó CBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 91180240	VEGA ARDILA ANDELFO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 91623846	CORONEL PABON FREDY ARMANDO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 91523846	CORONEL PABON FREDY ARMANDO	PROTECCION	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 98478799	OCHOA TORRES JESUS MARIA	COLPENSIONES	SAUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 98610281	FIGUEROA BERMUDEZ FRANCISCO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 98610281	FIGUEROA BERMUDEZ FRANCISCO	COLPENSIONES	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	CONFENALCO ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



Certificación Bancaria


Señores
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/04/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefania Niño Piza
